BOGOTA	ALCALDIA DE BOGOTA FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANGATIVA GEODINAMICA INGENIERIA S.A. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO				
			VERSION				
			FECHA	29	12	22	
			PAGINA:		1		
			DE:		2		

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 2 DEL jueves, 22 de diciembre de 2022 AL miércoles, 28 de diciembre de 2022

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 14 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 228 DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO


A la fecha se está a la espera del cronograma de actividades por parte del Consultor.
De acuerdo con el tiempo estipulado del contrato que es de 34 semanas, a la fecha se debería llevar una ejecución del 6%, ya que han transcurrido 2 semanas desde la firma del acta de inicio.
El avance físico al corte del presente informe es de 2%

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	1	2
Porcentaje de avance financiero programado		
Valor de avance financiero programado		

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	1	2
Porcentaje de avance financiero ejecutado		
Valor de avance financiero ejecutado		

Semanas	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)
0	0	0
1	1	1
2	2	2

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO

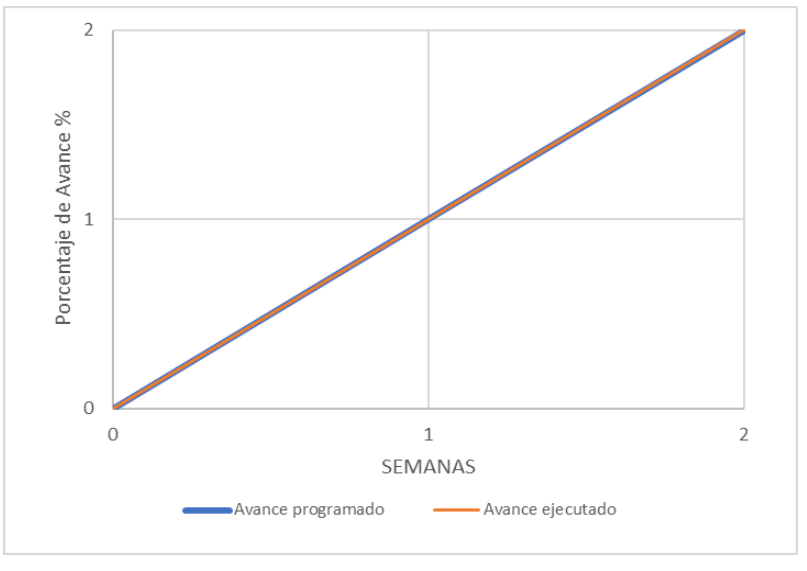

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se continuó con la revisión de la documentación del contrato de consultoría

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Iniciar el posicionamiento de los GPS para los primeros 30 CIVs del proyecto parte de la Consultoria
2. Revisar el CIV 10000726, el cual no tiene información completa.
3. Actualizar por parte de la Interventoría y de la Consultoría, las pólizas a partir de la fecha del acta de inicio.
4. Consultoría entregará a Interventoría, los certificados de calibración de los equipos.
5. Consultoría hará entrega a Interventoría del cronograma para los primeros 15 días de enero de 2023.

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe se ha recibido información por parte de la supervisión y se está revisando la documentación del contrato, tanto de interventoría como del Consultor.

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
