OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 3 DEL jueves, 29 de diciembre de 2022 AL miércoles, 4 de enero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 21 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 221 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO

A la fecha se está a la espera del cronograma de actividades generales por parte del consultor por parte del Consultor, para poder establecer un porcentaje de avance entre lo programado y lo ejecutado.
De acuerdo con el tiempo estipulado del contrato que es de 34 semanas, a la fecha se debería llevar una ejecución del 3%, sin embargo se tiene una ejecución del 2%.

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	1	3
Porcentaje de avance financiero programado		
Valor de avance financiero programado		

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	0	2
Porcentaje de avance financiero ejecutado		
Valor de avance financiero ejecutado		

Semana	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	2

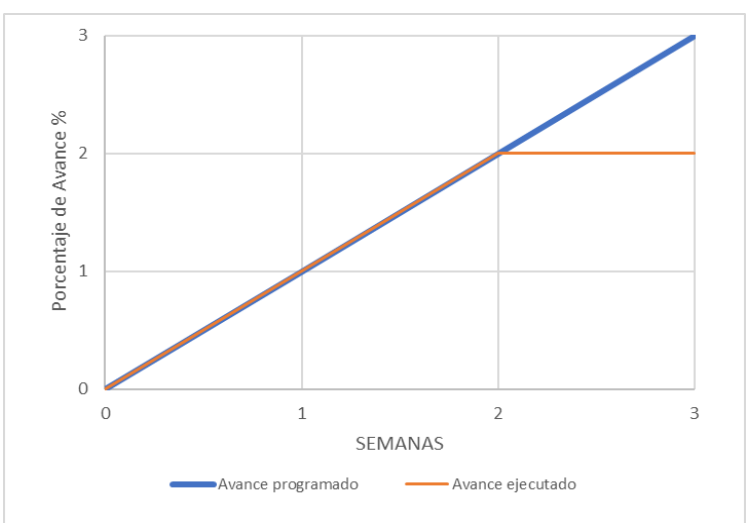

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se verificó la existencia de los segmentos 10000726 y 10000736, los cuales están registrados en el SIGIDU pero les falta información
2. Se solicitó a la empresa de seguros, la actualización de las pólizas de la Interventoría
3. Se asistió al comité del 29 de diciembre de 2022
4. Se recibió de parte del Consultor los oficios de solicitud de información a varias entidades
5. Se remitió a la Supervisión y al Consultor, el acta del comité del 22 de diciembre de 2022
6. Se remitió a la Supervisión y al Consultor, el acta del comité N°2

BOGOTA	**ALCALDIA DE BOGOTA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA** **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022**	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO VERSION FECHA 5 1 23 PAGINA: 2 DE: 2

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de certificados de calibración de equipos de topografía por parte de la Consultoria
2. Enviar a Interventoría cronograma y metodología de topografía por parte del Consultor.
3. Actualizar por parte de la Interventoría y de la Consultoría, las pólizas a partir de la fecha del acta de inicio.
4. Comenzar por parte de la Consultoría, los trabajos de topografía.

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe se están preparando las actividades iniciales por parte del Consultor, para dar comienzo a las actividades de campo del proyecto.

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
