## OBJETO DE CONTRATO:

**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".**

## 1. INFORMACION CONTRACTUAL

| CONTRATO DE CONSULTORIA | | CONTRATO DE INTERVENTORIA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO INCOL-ALEPH | INTERVENTOR: | GEODINAMICA S.A. |
| CONTRATO No: | 402-2022 | CONTRATO No: | 496-2022 |
| VALOR INICIAL: | $ 2.272.158.031,00 | VALOR INICIAL: | $ 272.694.419,00 |
| VALOR ADICIONAL: | NR | VALOR ADICIONAL: | N.R. |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 2.272.158.031,00 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 272.694.419,00 |
| FECHA DE INICIO: | jueves, 15 de diciembre de 2022 | FECHA DE INICIO: | jueves, 15 de diciembre de 2022 |
| FECHA TERMINACION: | lunes, 14 de agosto de 2023 | FECHA TERMINACION: | lunes, 14 de agosto de 2023 |
| PLAZO INICIAL: | 8 MESES | PLAZO INICIAL: | 8 MESES |
| PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS: | | PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS: | |
| PLAZO CONSTRUCCION: | | PLAZO CONSTRUCCION: | |
| PLAZO ADICIONAL: | NR | PLAZO ADICIONAL: | NR |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 8 MESES | PLAZO ACTUALIZADO: | 8 MESES |

## 2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 4 DEL jueves, 5 de enero de 2023 AL miércoles, 11 de enero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 28 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 214 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO

Se recibió el cronograma de actividades del componente topografía, se revisó y se hicieron observaciones. Se está a la espera del cronograma general, para poder establecer el porcentaje de avance entre lo programado y lo ejecutado.
De acuerdo con el tiempo estipulado del contrato que es de 34 semanas, a la fecha se debería llevar una ejecución del 4%, sin embargo se tiene una ejecución del 3%, según el cronograma preliminar presentado por el Consultor.

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Porcentaje de avance físico programado | 1 | 4 |
| Porcentaje de avance financiero programado | | |
| Valor de avance financiero programado | | |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Porcentaje de avance físico ejecutado | 1 | 3 |
| Porcentaje de avance financiero ejecutado | | |
| Valor de avance financiero ejecutado | | |

| Semana | Avance programado (%) | Avance ejecutado |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 3 |

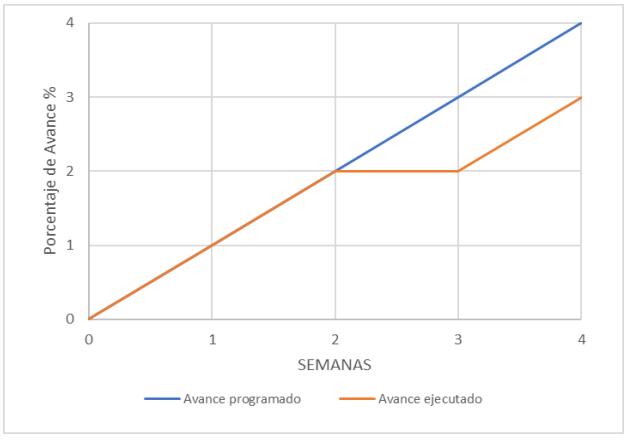

## 3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se recibió de parte de la Consultoría la metodología y el cronograma preliminar de topografía
2. Se recibió de parte del Consultor, los certificados de calibración de los equipos de topografía
3. Se recibió de parte del Consultor, el diseño de la leyenda de las placas de los GPS para aprobación
4. Se revisó la metodología y el cronograma preliminar de topografía del Consultor y se enviaron las observaciones
5. En compañía de la Supervisión, la Consultoría y la Interventoría se realizó un recorrido de campo por los CIVs: 10011691, 10007753,
6. Se remitió al Consultor, un oficio solicitando el cumplimiento de los compromisos contractuales.

## OBJETO DE CONTRATO:

**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".**

## 4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Entrega de cronograma general y plan de trabajo por parte del Consultor, para revisión y aprobación de la Interventoría.
2. Remitir al Supervisor y al Consultor, el acta del recorrido de campo del 11 de enero de 2023.Consultor.
3. Enviar por parte de la Consultoría, el listado de los primeros 71 CIVs que se va a diseñar.
4. Enviar por parte de la Consultoría, el posicionamiento de los GPS para los primeros 71 CIVs a diseñar.
5. Enviar por parte de la Consultoría, el listado de oficios faltantes, de consulta a entidades que tengan relación con el proyecto.
6. La Interventoría remitirá a la supervisión las hojas de vida aprobadas del Consultor.
7. La Consultoría y la Interventoría presentarán los primeros 3 informes semanales

## 5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe se están preparando las actividades iniciales por parte del Consultor, para dar comienzo a las actividades de campo del proyecto.

## 6. REGISTRO FOTGRAFICO



Recorrido de campo para reconocimiento de CIVs



Recorrido de campo para reconocimiento de CIVs

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
