OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 5 DEL jueves, 12 de enero de 2023 AL miércoles, 18 de enero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 35 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 207 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO

Se recibió el cronograma de actividades del componente topografía, se revisó y se hicieron observaciones. Se está a la espera del cronograma general, para poder establecer el porcentaje de avance entre lo programado y lo ejecutado.
De acuerdo con el tiempo estipulado del contrato que es de 34 semanas, a la fecha se debería llevar una ejecución del 5%, sin embargo lleva ejecutado el 4%, según el cronograma preliminar presentado.

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	1	5
Porcentaje de avance financiero programado		
Valor de avance financiero programado		

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	1	4
Porcentaje de avance financiero ejecutado		
Valor de avance financiero ejecutado		

Semanas	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	2
4	4	3
5	5	4

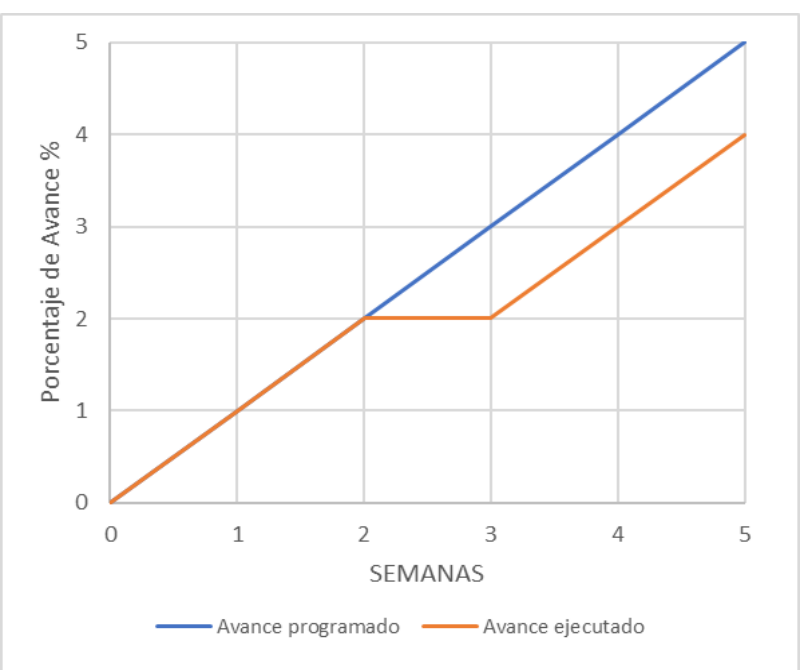

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Por medio del oficio CIA-E-DT-038-23, se recibió de parte de la Consutoría el cronograma preliminar de actividades V0
2. A través del comunicado 14-22-GDING-PROY187, se solicitó al Consultor entregar los informes semanales y mensual.
3. Por medio del oficio CIA-E-DT-0039-23, se recibió de parte del Consultor, un archivo excel con los oficios y sus radicados a diferentes entidades
4. A través del comunicado CIA-E-DT-0040-23, se recibió de parte del Consultor, los informes semanales 1, 2 y 3.
5. Se revisó la metodología preliminar de topografía V2 del Consultor y se enviaron las observaciones, mediante el oficio 15-22-GDING-PROY187
6. Se revisó el cronograma de actividades V0 del Consultor y se enviaron observaciones, mediante comunicado 17-22-GDING-
7. Se remitió el acta corregida del recorrido de campo realizado el 11 de enero de 2023, mediante correo del 13 de enero de 2023.
8. Se elaboró y remitió el acta del comité N° 3 realizado el 12 de enero de 2023, mediante correo del 16 de enero de 2023.
9. Se revisaron y enviaron observaciones de los informes semanales 1, 2 y 3 del Consultor, mediante oficio 18-22-GDING-PROY187
10. Se enviaron a la Supervisión los informes semanales 1, 2, 3 y 4 de Interventoría, mediante correo del 18 de enero de 2023.

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Enviar a Interventoría, por parte del Consultor, los oficios faltantes a entidades.
2. Remitir a Interventoría, por parte del Consultor, los informes semanales 1, 2, 3 y 4 corregidos.
3. Enviar a Interventoría y a Consultoría, por parte de la Supervisor, el modelo de volantes y de presentación de actividades sociales.
4. Remitir a Interventoría, por parte de la Consultoría, el formato de ficha técnica de visita a segmentos viales.
5. Enviar a Interventoría, por parte de la Consultoría, el Plan de Gestión Social del Consultor.
6. La Consultoría iniciará la materialización de los primeros puntos de GPS.
7. La Interventoría presentará los informes semanales 5 y 6.

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe el Consultor inició los trabajos de campo con la materialización de los primeros puntos de GPS.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

Coordinador de Interventoria EFRAIN ARAUJO

Apoyo a la Supervisión CRISTIAN ENCISO
