Fecha= 13 de febrero del 2023
Proyecto=Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista=Consorcio Torcaula.
Interventoria=Gavinco Ingenieros Consultores S.A. S
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Personal Social, Siso, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias, construccion de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura. Se hizo recorrido técnico para verificacion de entrega de materiales en las viviendas.
*Equipos y Herramientas= formaletas, Cerchas, gatos, Vistones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra.

Fecha= 14 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio Torcaula.
Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de interventoria, Personal Social, Siso, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberias hidraulicas y sanitarias, construccion de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, pintura, pañete.
Recorrido técnico para verificación
*Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, vistones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra.

Powered by CamScanner

Fecha= 15 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio Tuquila
Interventoria= Equinoco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Personal social, Sso, inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes
* Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura, aperturas.
* Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, Cutones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Contratista

Residente de Interventoria

Residente de obra-

Fecha= 16 de febrero del 2023.
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio Tuquila
Interventoria= Equinoco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Personal Social, Sso, inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad en obra= Entrega de materiales, a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura, Aperturas -
* Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, Cutones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Powered by CamScanner

Residente de Interventoría

Residente de obra.

Fecha= 17 de febrero de 2023.
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio TORQUIA
Interventoría= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoría, Personal social, SISO, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y Sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura, Apertura
*Equipos y Herramientas= Formaletas, cerchas, gatos, Estacas, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de obra-

Fecha= 18 de febrero del 2023
Proyecto=Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio Torquia.
Interventoría=Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoría, Personal social, SISO, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y Sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, Aperturas y entregas.
*Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, Estacas, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys-

y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra.

Fecha= 20 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento básico.
Contratista= Consorcio Turquia.
Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Personal social, SISO, inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias, Construccion de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura, Aperturas.
*Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, Cistones, pulidoras, cortadoras, motocamos, Camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra.

Fecha= 21 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
ContratistA= Consorcio Turquia
Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoria, Personal social, SISO, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias, Construccion de:

Powered by CamScanner

registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura.
* Equipos y Herramientas = Formaletas, Cerchas, gatos, Cistones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoría. Residente de obra.

Fecha = 22 de febrero del 2023
Proyecto = Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista = Consorcio TURQUIA -
Interventoría = Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
* Personal de obra = Residentes de obra, Residentes de interventoría, Personal social, SISO, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
* Actividad de obra: Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, pañete, pintura, Aperturas y entregas de unidades sanitarias con detalles mínimos.
* Equipos y herramientas: formaletas, cerchas, gatos, cistones, pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoría Residente de obra.

Fecha = 23 de febrero del 2023
Proyecto = Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista = Consorcio TURQUIA.
Interventoría = Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
Personal de obra = Residentes de obra, residentes de

Interventoría, Personal social, SISO, Inspectores, 36 oficiales y 24 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda excavaciones, instalación de tuberías, hidráulicas y sanitarias construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, entregas de unidades Sanitarias con detalles mínimos.
*Equipos y Herramientas= Formaletas, cerchas, gatos, listones, polidoras, cortadoras, motocamos, camiones, boggys y herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de obra.

Fecha= 24 de febrero del 2023.
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico
Contratista= Consorcio TORQUITA.
Interventoría= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de Interventoría, Personal social, SISO, Inspectores, 24 oficiales y 44 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías, hidráulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, Entregas de unidades sanitarias con detalles mínimos.
*Equipos y Herramientas= Formaletas, cerchas, gatos, listones, herramientas menores.

Residente de Interventoría

Residente de obra.

Fecha= 25 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico
Contratista= Consorcio Torquita
Interventoría= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S

* Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de interventoria, Personal social, SISO, inspectores, 24 oficiales y 44 ayudantes-
* Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías hidráulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, Entregas de unidades sanitarias con detalles mínimos.
* Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, listones, Pulidoras, cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra-

Fecha= 27 de febrero del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio TORQUETA
Interventoria= Equinco Ingenieros Consultores S.A.S
* Personal de obra= Residentes de obra, Residente de interventoria, Personal Social, SISO, inspectores, 20 oficiales y 44 ayudantes.
* Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalación de tuberías, hidraulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalación de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, entregas de unidades sanitarias con detalles mínimos.
* Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, gatos, listones, Pulidoras, Cortadoras, motocarros, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria — Residente de obra

Fecha= 28 de febrero del 2023.
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Contratista= Consorcio TURQUIA
Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de interventoria, Personal social, SISO, inspectores, 24 oficiales y 44 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalacion de tuberias, hidraulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, Entregas de unidades sanitarias con detalles mínimos.
*Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, listones, Pulidoras, Cortadoras, motocompresores, camiones, buggys y herramientas menores.

Residente de Interventoria

Residente de obra.

Fecha = 01 de MARZO del 2023
Proyecto= Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Basico.
Contratista= Consorcio Turquia
Interventoria= Gavinco Ingenieros Consultores S.A.S.
*Personal de obra= Residentes de obra, Residentes de interventoria, Personal Social, SISO, inspectores, 24 oficiales y 44 ayudantes.
*Actividad en obra= Entrega de materiales a cada vivienda, excavaciones, instalacion de tuberias hidraulicas y sanitarias, construcción de registros sanitarios, instalacion de tanque elevado, levante de muros, Pañete, Pintura, entregas y Aperturas.
*Equipos y Herramientas= formaletas, cerchas, Listones, Pulidoras, cortadoras, motocompresores, camiones, buggys.

Anexo 10. Relación de correspondencia

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
CONTRATISTA:	Consorcio Turquía
INTERVENTOR:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
SUPERVISOR:	Juan David Amon

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
29/03/2022	GA-DOMI-001-22	Solicitud documentacion inicial de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-002-22	Solicitud cumplimiento compromisos de entrega de la documentación inicial contrato	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/04/2022	GA-DOMI-003-22	Traslado correo electrónico, valla institucional para el proyecto de conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-004-22	Remisión documentos previos a la firma del Acta de Inicio - Grupo 1: Sincelejo,	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/04/2022	GA-DOMI-005-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-006-22	Remisión hoja de vida del contrato de Interventoría 2220585	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-007-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de Interventoría	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/04/2022	GA-DOMI-008-22	Remisión requisitos para suscripción de acta de inicio del contrato de obra N°.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/04/2022	GA-DOMI-009-22	Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/04/2022	GA-DOMI-010-22	Cambio hojas de vida Inspector 1, Inspector 3 y Auxiliar Social del Contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/04/2022	GA-DOMI-011-22	Remisión plan de inversión de anticipo del contrato de obra firmado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/04/2022	GA-DOMI-012-22	Remisión actualización pólizas del contrato de interventoría respecto al Acta de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-013-22	Remisión Informe Semanal No. 01 periodo del 13 al 24 de abril de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/04/2022	GA-DOMI-014-22	Codificación viviendas para diagnósticos del barrio El Poblado	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/04/2022	20222200064831	Socialización de los actores vinculados en la ejecución del Programa de Co-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071361	Aprobación del personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/04/2022	20222200071371	Entrega documentación para la ejecución del contrato de interventoría No.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
5/04/2022	CONS-TUR-SINC-008	Remisión de soportes preliminares para acta de inicio.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/04/2022	CONS-TUR-SINC-011	MINUTA DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA	CONSORICO TURQUIA	Enterritorio
29/04/2022	CONS-TUR-SINC-013	Entrega de Productos ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACION DE DISEÑO	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/04/2022	GA-DOMI-016-22	Solicitud entrega productos Actividad 1. Chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/05/2022	GA-DOMI-017-22	Remisión Informe Semanal No. 02 periodo del 25 de abril de 2022 al 01 de mayo de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/05/2022	GA-DOMI-018-22	Solicitud disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3. Ejecución de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/05/2022	GA-DOMI-019-22	Remisión Informe Mensual Técnico de Interventoría No. 01 periodo del 13 de abril	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-020-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-013, Entrega de Productos Actividad 1:	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-021-22	Solicitud remisión soportes de implementación de protocolo de bioseguridad	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/05/2022	GA-DOMI-022-22	Remisión actualización póliza RCE del contrato de interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/05/2022	GA-DOMI-023-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-017.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/05/2022	GA-DOMI-024-22	Solicitud Ajustes productos Actividad 1: chequeo y validación de diseño de los	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	GA-DOMI-025-22	Remisión Informe Semanal No. 03 periodo del 02 de mayo de 2022 al 08 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-026-22	Cambio hoja de vida personal del Contrato de Interventoría - Profesional HSEQ.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/05/2022	GA-DOMI-027-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-018.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/05/2022	GA-DOMI-028-22	Resp comunicación CONS-TUR-SINC-020	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/05/2022	GA-DOMI-029-22	Solicitud diagnosticos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/05/2022	GA-DOMI-030-22	Aprobación diseño estructural con observaciones - Actividad 1. Chequeo y	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-031-22	Remisión Informe Semanal No. 04 periodo del 09 de mayo de 2022 al 15 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/05/2022	GA-DOMI-032-22	Solicitud cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité de seguimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-033-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 1. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/05/2022	GA-DOMI-034-22	Segunda solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 5.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/05/2022	GA-DOMI-035-22	Remisión Informe Semanal No. 05 periodo del 16 de mayo de 2022 al 22 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/05/2022	GA-DOMI-036-22	Remision solicitud desembolso anticipo contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/05/2022	GA-DOMI-037-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Alcaldia Sincelejo
26/05/2022	GA-DOMI-038-22	Respuesta comunicaciones CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-028	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/05/2022	CONS-TUR-SINC-018	CAMBIOS EN EL DOCUMENTO INICIAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/05/2022	CONS-TUR-SINC-019	Entrega de planos y memorias de casetas tipo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	CANTIDADES DE OBRA – ELEMENTOS ESTRUCTURALES	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/05/2022	CONS-TUR-SINC-020	Entrega de diagnósticos Paquete 01.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
12/05/2022	CONS-TUR-SINC-021	Entrega de diagnósticos Paquete 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/05/2022	CONS-TUR-SINC-022	Entrega de diagnósticos Paquete 03.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	CONS-TUR-SINC-023	Entrega de diagnósticos Paquete 04.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/05/2022	CONS-TUR-SINC-024	Entrega de diagnósticos Paquete 05	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-025	Entrega de diagnósticos Paquete 06	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/05/2022	CONS-TUR-SINC-026	Robo de micromedidores Barrio El Poblado, Sincelejo –Sucre.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-027	Entrega de diagnósticos Paquete 07.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-028	Escasez de cerámica a nivel nacional	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/05/2022	CONS-TUR-SINC-029	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	CONS-TUR-SINC-030	Entrega de diagnósticos Paquete 08	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
27/05/2022	CONS-TUR-SINC-031	Cambio de especificación técnica ítems 3.27 y 3.28	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

27/05/2022	CONS-TUR-SINC-032	Cambio en planimetría enviada de Casetas 1, 2, 3 y 4.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/05/2022	20222200093481	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 1, correspondiente al mes	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/05/2022	GA-DOMI-039-22	Obligaciones actividad 3 ejecución de obra y forma de pago.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/05/2022	GA-DOMI-040-22	Complemento y aprobación actividad 1. Chequeo y Validación prototipos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/05/2022	GA-DOMI-041-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
31/05/2022	GA-DOMI-042-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-028, CONS-TUR-SINC-029 y CONS-TUR-SINC-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
1/06/2022	GA-DOMI-043-22	Remisión Informe Semanal No. 06 periodo del 23 de mayo de 2022 al 29 de mayo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	GA-DOMI-044-22	Almacenamiento inadecuado de materiales de construcción en viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-045-22	Solicitud mayor disponibilidad de materiales de construcción – Actividad 3.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-046-22	Atraso cronograma de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/06/2022	GA-DOMI-047-22	Recomendaciones para la ejecución de las obras	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/06/2022	GA-DOMI-048-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 02 periodo del 01 de mayo de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/06/2022	GA-DOMI-049-22	Comunicaciones CONS-TUR-SINC-034.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-050-22	Remisión Informe Semanal No. 07 periodo del 30 de mayo de 2022 al 05 de junio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/06/2022	GA-DOMI-051-22	Solicitud verificación predio en zona de riesgo – manzana 60 lote 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
8/06/2022	GA-DOMI-052-22	Solicitud cumplimiento compromisos comité de seguimiento N°. 8.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/06/2022	GA-DOMI-053-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/06/2022	GA-DOMI-054-22	Observaciones ejecución de la obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-055-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-035	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/06/2022	GA-DOMI-056-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/06/2022	GA-DOMI-057-22	Remisión Informe Semanal No. 08 periodo del 06 de junio de 2022 al 12 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-058-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-059-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
15/06/2022	GA-DOMI-060-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-040 del 13 de junio de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/06/2022	GA-DOMI-061-22	Compromiso de entrega de las 13 viviendas inicialmente intervenidas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/06/2022	GA-DOMI-062-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-045 del 17 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/06/2022	GA-DOMI-063-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 2. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/06/2022	GA-DOMI-064-22	Remisión Informe Semanal No. 09 periodo del 13 de junio de 2022 al 19 de junio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/06/2022	GA-DOMI-065-22	Aprobación cambio de especificaciones tecnicas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/06/2022	GA-DOMI-066-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/06/2022	GA-DOMI-067-22	Solicitud inclusión para nuevos posibles beneficiarios del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-068-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 04	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/06/2022	GA-DOMI-069-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-049	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/06/2022	GA-DOMI-070-22	Solicitud cumplimiento de dimensiones de las placas aéreas de soporte del tanque	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/06/2022	GA-DOMI-071-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	GA-DOMI-072-22	Solicitud inclusión N°. 7 para nuevos posible beneficiario del Programa de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-073-22	Solicitud verificación de predio en zona de riesgo No. 6	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-074-22	CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
1/07/2022	GA-DOMI-075-22	Cambio hojas de vida personal del Contrato de Interventoría.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-076-22	Respuesta oficio 20222200120441 plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/07/2022	GA-DOMI-077-22	Observaciones unidades de viviendas en ejecución para entrega.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
6/07/2022	GA-DOMI-078-22	Remisión Informe Semanal No. 11 periodo del 27 de junio de 2022 al 03 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/07/2022	GA-DOMI-079-22	Resp oficio 20222200118481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/06/2022	CONS-TUR-SINC-033	Envio Paquete 10 - Diagnosticos	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-034	Cambio especificaciones técnicas cerámica.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/06/2022	CONS-TUR-SINC-035	Envío de documentación para aprobación de desembolso de anticipo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/06/2022	CONS-TUR-SINC-036	Respuesta oficio GA-DOMI-044-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
9/06/2022	CONS-TUR-SINC-038	Entrega de diagnósticos Paquete 11.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
10/06/2022	CONS-TUR-SINC-039	Respuesta oficio GA-DOMI-046-22.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/06/2022	CONS-TUR-SINC-040	Solicitud de aprobación de hoja de vida de residente de obra Actividad 3.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-041	Envío diagnósticos Paquete 12	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
15/06/2022	CONS-TUR-SINC-042	Respuesta oficio GA-DOMI-047-22 - Recomendaciones para la ejecución de las	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/06/2022	CONS-TUR-SINC-044	Entrega de diagnósticos Paquete 13.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
17/06/2022	CONS-TUR-SINC-045	Respuesta oficio GA-DOMI-054-22 Observaciones ejecución de la obra.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
18/06/2022	CONS-TUR-SINC-046	Carta relación de beneficiarios que no cuentan con documento FOVIS	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
19/06/2022	CONS-TUR-SINC-047	Entrega de diagnósticos Paquete 14a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/06/2022	CONS-TUR-SINC-048	Entrega de diagnósticos Paquete 14b	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/06/2022	CONS-TUR-SINC-049	Cambio de Profesional Social Proyecto Conexiones Intradomiciliarias	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	CONS-TUR-SINC-050	Entrega de diagnósticos Paquete 15	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
23/06/2022	CONS-TUR-SINC-051	Entrega de diagnósticos Paquete 15a	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	CONS-TUR-SINC-052	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
25/06/2022	CONS-TUR-SINC-053	Entrega de diagnósticos Paquete 15c	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/06/2022	20222200117251	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
11/07/2022	GA-DOMI-080-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 03 periodo del 01 de junio de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/07/2022	GA-DOMI-081-22	Solicitud No. 7 de verificación de predio en zona de riesgo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-082-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/07/2022	GA-DOMI-083-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/07/2022	GA-DOMI-084-22	Remisión Informe Semanal No. 12 periodo del 04 de julio de 2022 al 10 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/07/2022	GA-DOMI-085-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-086-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-061	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

18/07/2022	GA-DOMI-087-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-053	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/07/2022	GA-DOMI-088-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-089-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 3. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/07/2022	GA-DOMI-090-22	Solicitud inclusión para nuevos posible beneficiario del Programa de Conexiones	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/07/2022	GA-DOMI-091-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/07/2022	GA-DOMI-092-22	Remisión Informe Semanal No. 13 periodo del 11 de julio de 2022 al 17 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/07/2022	GA-DOMI-093-22	Trabajadores laborando sin Elementos de Protección Personal, EPP requeridos. –	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/07/2022	GA-DOMI-094-22	Seguimiento ejecucion del contrato y plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-095-22	Solicitud materiales suficientes para terminación de viviendas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/07/2022	GA-DOMI-096-22	Remisión Informe Semanal No. 14 periodo del 18 de julio de 2022 al 24 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
27/07/2022	GA-DOMI-097-22	Aprobación ordenes de giro No. 01 y 02	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-098-22	Solicitud de entrega del estado de los 192 diagnósticos faltantes.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/07/2022	GA-DOMI-099-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-064	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/07/2022	GA-DOMI-100-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-066 y CONS-TUR-SINC-067 del 27 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/07/2022	GA-DOMI-101-22	Respuesta CONS-TUR-SINC-065	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/07/2022	CONS-TUR-SINC-053	Información Contrato de Alcantarillado barrio Puerto Arturo.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-056	Entrega de diagnósticos Paquete 16	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/07/2022	CONS-TUR-SINC-054	Oficio 053 - Respuesta comunicación GA-DOMI-071-22	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
6/07/2022	CONS-TUR-SINC-057	Información aprobación de micromedidores de ½"	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-059	Acompañamiento pruebas técnicas.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA ESP
11/07/2022	CONS-TUR-SINC-060	Entrega de diagnósticos Paquete 17	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
16/07/2022	CONS-TUR-SINC-061	Entrega de informes mensuales 01 y 02.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
21/07/2022	CONS-TUR-SINC-063	Entrega de diagnósticos Paquete 18	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
24/06/2022	20222200118481	Solicitud información sobre el cumplimiento del cronograma para el contrato de obra	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/06/2022	20222200120441	Solicitud información de acuerdo al plan de contingencia remitido mediante radi-	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
22/07/2022	20222200133451	Devolución Factura Electrónica de venta No. FV-2-1 del 21/07/2022	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/07/2022	20222200124601	Aprobación cambio de personal mínimo requerido para ejecución del contrato de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/08/2022	GA-DOMI-102-22	Remisión Informe Semanal No. 15 periodo del 25 de julio de 2022 al 31 de julio de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/08/2022	GA-DOMI-103-22	Solicitud materiales de obra.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/08/2022	GA-DOMI-104-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 15	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/08/2022	GA-DOMI-105-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-062 y CONS-TUR-SINC-068	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/08/2022	GA-DOMI-106-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/08/2022	GA-DOMI-107-22	Remision oficio 20222200141481	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/08/2022	GA-DOMI-108-22	Solicitud diagnosticos pendientes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/08/2022	GA-DOMI-109-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 04 periodo del 01 de julio de 2022 al	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-110-22	Solicitud de inclusion pendientes de respuesta	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/08/2022	GA-DOMI-111-22	Remisión Informe Semanal No. 16 periodo del 01 de agosto de 2022 al 07 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/08/2022	GA-DOMI-112-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
16/08/2022	GA-DOMI-113-22	Solicitud información contraloría general de la republica	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-114-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 4. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
17/08/2022	GA-DOMI-115-22	Remision actas de reunion Contraloria, Ministerio y enterritorio.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/08/2022	GA-DOMI-116-22	Remisión Informe Semanal No. 17 periodo del 08 de agosto de 2022 al 14 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/08/2022	GA-DOMI-117-22	Seguimiento Plan de Contingencia semana 17.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/08/2022	GA-DOMI-118-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/08/2022	GA-DOMI-119-22	Aprobación informe mensual 3 (1.Jul.22 al 31.Jul.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-120-22	Resp comunicacion CONS-TUR-SINC-077	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/08/2022	GA-DOMI-121-22	Acta de recibo parcial de obra No. 02.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/08/2022	GA-DOMI-122-22	PQR 192, 196 y 194 de solicitud de inclusión.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
24/08/2022	GA-DOMI-123-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-073	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-124-22	Remisión Informe Semanal No. 18 periodo del 15 de agosto de 2022 al 21 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	GA-DOMI-125-22	Seguimiento Plan de Contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
24/08/2022	GA-DOMI-126-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-076	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
29/08/2022	GA-DOMI-127-22	Solicitud exámenes de Egreso y certificados de paz y salvo con trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-128-22	Solicitud remisión Informe de accidente y reporte a la ARL	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/08/2022	GA-DOMI-129-22	Traslado petición del Sr. José Alfredo Pen Ayala	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/08/2022	GA-DOMI-130-22	Remisión Informe Semanal No. 19 periodo del 22 de agosto de 2022 al 28 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
31/08/2022	GA-DOMI-131-22	Viviendas priorizadas pendienes de entrega	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/08/2022	CONS-TUR-SINC-077	RUTA DE TRABAJO PARA ENTREGA DE MATERIALES E INICIO DE	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
29/08/2022	CONS-TUR-SINC-089	Entrega de diagnósticos Paquete 19B	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
20/07/2022	20222200131921	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 3, correspondiente al mes de	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
4/08/2022	20222200141471	Visita técnica solicitada por parte de la Contraloría General de la Nación	Enterritorio	CONSORICO TURQUIA
24/08/2022	20222200156751	Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 4, correspondiente al mes de julio	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
1/09/2022	GA-DOMI-132-22	Personal en obra laborando sin Elementos de Protección Personal (EPP)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-133-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-134-22	Solicitud cumplimiento compromisos del acta de seguimiento No. 24	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/09/2022	GA-DOMI-135-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-093	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Veolia
7/09/2022	GA-DOMI-136-22	Remisión Informe Semanal No. 20 periodo del 29 de agosto de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/09/2022	GA-DOMI-137-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-138-22	Fecha de radicación facturación - Septiembre 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/09/2022	GA-DOMI-139-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 05 periodo del 01 de agosto de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

12/09/2022	GA-DOMI-140-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 5. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/09/2022	GA-DOMI-141-22	Situaciones evidenciadas en obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
14/09/2022	GA-DOMI-142-22	Solicitud de pago a SSI y parafiscales	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/09/2022	GA-DOMI-143-22	Actualización Plan de contingencia ejecución actividad 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/09/2022	GA-DOMI-144-22	Remisión Informe Semanal No. 21 periodo del 05 de septiembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/09/2022	GA-DOMI-145-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/09/2022	GA-DOMI-146-22	Respuesta oficio SPM-1300.10.02.1414	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/09/2022	GA-DOMI-147-22	Solicitud de respuestas PQR 192, 193, 194.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
21/09/2022	GA-DOMI-148-22	Remisión Informe Semanal No. 22 periodo del 12 de septiembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/09/2022	GA-DOMI-149-22	Acta de recibo parcial de obra No. 03.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-150-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 28	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-151-22	Aprobación informe mensual 4 (1.Ago.22 al 31.Ago.22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/09/2022	GA-DOMI-152-22	Resp oficio 20222200162301	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/09/2022	GA-DOMI-153-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/09/2022	GA-DOMI-154-22	Aclaración de solicitud de inclusión emitido en el informe de visita técnica N°2.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
23/09/2022	GA-DOMI-155-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-105	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/09/2022	GA-DOMI-156-22	Solicitud de visita y concepto de linderos.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
27/09/2022	GA-DOMI-157-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-111	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-158-22	Remisión Informe Semanal No. 23 periodo del 19 de septiembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/09/2022	GA-DOMI-159-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 29	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/09/2022	GA-DOMI-160-22	Seguimiento Plan de Contingencia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/09/2022	GA-DOMI-161-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-119 del 29 de septiembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/09/2022	GA-DOMI-162-22	Solicitud acta de recibo parcial de obra No. 04 e informe mensual de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
1/09/2022	CONS-TUR-SINC-093	viviendas para instalación de micromedidores.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
13/09/2022	CONS-TUR-SINC-105	Entrega de diagnósticos Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
26/09/2022	CONS-TUR-SINC-114	Relación de códigos para apertura para la semana 26/09/2022 al 2/10/2022.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
2/09/2022	20222200162301	Observaciones visita de seguimiento del 09 al 12 de agosto de 2022.	Enterritorio	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
3/10/2022	GA-DOMI-163-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 30	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/10/2022	GA-DOMI-164-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-121 del 03 de octubre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-165-22	Remisión Informe Semanal No. 24 periodo del 26 de septiembre de 2022 al 02 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/10/2022	GA-DOMI-166-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-167-22	Remisión segundas observaciones paquete 20	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/10/2022	GA-DOMI-168-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-122	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/10/2022	GA-DOMI-169-22	Solicitud acompañamiento para verificación de predios.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
7/10/2022	GA-DOMI-170-22	Solicitud de visita y concepto a la vivienda ubicada en Mz 41 – Lote 1	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
10/10/2022	GA-DOMI-171-22	Llamado de atención por no terminación de viviendas priorizadas.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
13/10/2022	GA-DOMI-172-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 06 periodo del 01 de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-173-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 6. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/10/2022	GA-DOMI-174-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-175-22	Resp oficio CONS-TUR-SINC-127	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
12/10/2022	GA-DOMI-176-22	Remisión Informe Semanal No. 25 periodo del 03 de octubre de 2022 al 09 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/10/2022	GA-DOMI-177-22	Traslado comunicación CONS-TUR-SINC-134	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
14/10/2022	GA-DOMI-178-22	Remisión observaciones paquete 20 y paquete 20B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-179-22	Remisión Informe Semanal No. 26 periodo del 10 de octubre de 2022 al 16 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/10/2022	GA-DOMI-180-22	Solicitud ensayos de granulometría de materiales pétreos	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
20/10/2022	GA-DOMI-181-22	Solicitud certificados de nomenclatura	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/10/2022	GA-DOMI-182-22	Reconocimiento de la junta de Acción Comunal N°. 2 del barrio el Poblado del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	GOBERNACION SUCRE
21/10/2022	GA-DOMI-183-22	Respuesta aprobación informe mensual 5	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/10/2022	GA-DOMI-184-22	Solicitud de concertación y aprobación de vivienda con domiciliaria.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
21/10/2022	GA-DOMI-185-22	Situaciones evidenciadas en obra, octubre de 2022	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-186-22	Acta de recibo parcial de obra No. 04.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/10/2022	GA-DOMI-187-22	Recomendación aplicación clausula 16 apremio Informe presunto incumplimiento	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-188-22	Remisión Informe Semanal No. 27 periodo del 17 de octubre de 2022 al 23 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
26/10/2022	GA-DOMI-189-22	Solicitud remisión paquetes de viviendas ejecutadas Actas de Recibo Parcial 3 y 4.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-190-22	Alcance radicado 2022CO5829 del 20 de octubre de 2022 comunicación GA-DOMI-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
28/10/2022	GA-DOMI-191-22	Solicitud exámenes de egreso, certificados de paz y salvo del personal.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/10/2022	GA-DOMI-192-22	Personal laborando sin EPP	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/10/2022	GA-DOMI-193-22	Carta CONS-TUR-SINC-144	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
12/10/2022	CONS-TUR-SINC-132	Entrega de diagnósticos subsanados del Paquete 20	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
7/10/2022	CONS-TUR-SINC-126	Entrega del paquete 20B de diagnósticos para aprobación	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
8/11/2022	GA-DOMI-194-22	Respuesta oficio 20222200200761	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
2/11/2022	GA-DOMI-195-22	Remisión Informe Semanal No. 28 periodo del 24 de octubre de 2022 al 30 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
3/11/2022	GA-DOMI-196-22	Remisión observaciones paquete 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/11/2022	GA-DOMI-197-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 34	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
5/11/2022	GA-DOMI-198-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 7. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
4/11/2022	GA-DOMI-199-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-145	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-200-22	Solicitud liquidacion Contrato de Fiducia.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
8/11/2022	GA-DOMI-201-22	Solicitud informe mensual de obra - octubre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
9/11/2022	GA-DOMI-202-22	Solicitud entrega paquetes actas 3 y 4	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/11/2022	GA-DOMI-203-22	Remisión Informe Semanal No. 29 periodo del 31 de octubre de 2022 al 06 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

10/11/2022	GA-DOMI-204-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
11/11/2022	GA-DOMI-205-22	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
11/11/2022	GA-DOMI-206-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 07 periodo del 01 de octubre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
15/11/2022	GA-DOMI-207-22	Remisión observaciones paquete 20, 20B y 21.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-208-22	Observaciones en la ejecución de las unidades sanitarias próximas a entregar	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/11/2022	GA-DOMI-209-22	Solicitud de paz y salvo y comprobantes de pago	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-210-22	Observaciones SST	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-211-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-122 problemática de tipo social y de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/11/2022	GA-DOMI-212-22	Remisión Informe Semanal No. 30 periodo del 07 de noviembre de 2022 al 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/11/2022	GA-DOMI-213-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/11/2022	GA-DOMI-214-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 37	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-215-22	Observaciones emitidas por la entidad contratante ENTerritorio en el recorrido de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
21/11/2022	GA-DOMI-216-22	Remisión observaciones paquete 18B y 19B	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
22/11/2022	GA-DOMI-217-22	Comunicación CONS-TUR-SINC-163	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
22/11/2022	GA-DOMI-218-22	Remisión Informe Semanal No. 31 periodo del 14 de noviembre de 2022 al 20 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/11/2022	GA-DOMI-219-22	Aprobación informe mensual 7 (01 de octubre de 22 al 31 de octubre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/11/2022	GA-DOMI-220-22	Acta de recibo parcial de obra No. 05.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
23/11/2022	GA-DOMI-221-22	Llamado de atención por personal laborando sin afiliación a seguridad social	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/11/2022	GA-DOMI-222-22	Solicitud certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
28/11/2022	GA-DOMI-223-22	Remisión observaciones diagnóstico comunicacion CONS-TUR-SINC-164	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-224-22	Observaciones en la ejecución de unidades sanitarias por entregar y viviendas sin	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
29/11/2022	GA-DOMI-225-22	Remisión Informe Semanal No. 32 periodo del 21 de noviembre de 2022 al 27 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/11/2022	GA-DOMI-226-22	Alcance solicitud porroga y adicion interventoria	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
30/11/2022	GA-DOMI-227-22	Observaciones ejecución de unidades sanitarias	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/11/2022	GA-DOMI-228-22	Personal laborando sin afiliación a seguridad social integral.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
2/12/2022	GA-DOMI-229-22	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 8. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/12/2022	GA-DOMI-230-22	Acta de recibo parcial de obra No. 06.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-231-22	Aprobación informe mensual 8 (01 de noviembre de 22 al 30 de noviembre de 22)	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/12/2022	GA-DOMI-232-22	Remisión Informe Semanal No. 33 periodo del 28 de noviembre de 2022 al 04 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
7/12/2022	GA-DOMI-233-22	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 08 periodo del 01 de noviembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/12/2022	GA-DOMI-234-22	Observaciones vivienda	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/12/2022	GA-DOMI-235-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
15/12/2022	GA-DOMI-236-22	Remisión Informe Semanal No. 34 periodo del 05 de diciembre de 2022 al 11 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
19/12/2022	GA-DOMI-237-22	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-156	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-238-22	Solicitud respuesta requerimientos en buzón de sugerencias por no pago de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-239-22	Solicitud respuesta Derecho de Petición Veeduría barrio El Poblado.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
19/12/2022	GA-DOMI-240-22	Solicitud actualización link informativo Alcaldía de Sincelejo (Sucre).	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	ALCALDIA DE SINCELEJO
20/12/2022	GA-DOMI-241-22	Remisión Informe Semanal No. 35 periodo del 12 de diciembre de 2022 al 18 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-242-22	Respuesta oficio 202222003741	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/12/2022	GA-DOMI-243-22	Observaciones en la ejecución de las unidades de sanitarias en las viviendas del	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/12/2022	GA-DOMI-244-22	Remisión póliza de garantía única de Cumplimiento y de RCE del contrato de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-245-22	Remisión Informe Semanal No. 36 periodo del 19 de diciembre de 2022 al 25 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
29/12/2022	GA-DOMI-246-22	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/12/2022	GA-DOMI-247-22	Seguimiento compromisos comité de seguimiento No. 43	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
4/01/2023	GA-DOMI-248-23	Remisión Informe Semanal No. 37 periodo del 26 de diciembre de 2022 al 01 de enero de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
5/01/2023	GA-DOMI-249-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/01/2023	GA-DOMI-250-23	Solicitud actualización de la poliza de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-252-23	Remisión Informe Semanal No. 38 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
12/01/2023	GA-DOMI-253-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 09 periodo del 01 de diciembre de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/01/2023	GA-DOMI-254-23	Solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre de 2022.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
17/01/2023	GA-DOMI-255-23	Segunda solicitud planillas de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-256-23	Remisión Informe Semanal No. 39 periodo del 02 de Enero de 2023 al 08 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
18/01/2023	GA-DOMI-257-23	Solicitud remisión programada de capacitaciones y soportes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-258-23	Solicitud remisión vales y certificados de materiales.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-259-23	Seguimiento reprogramación de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-260-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-180	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-261-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-176	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-262-23	Solicitud liquidación del anticipo	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
18/01/2023	GA-DOMI-263-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 9. De Interventoría. Periodo facturado del 13 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
20/01/2023	GA-DOMI-264-23	Alcance comunicaciones GA-DOMI-184-22 y GA-DOMI-177-22 Solicitud de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	VEOLIA
23/01/2023	GA-DOMI-265-23	Observaciones paquetes de vivienda terminadas de la 1 a la 4 y remisión paquetes	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
23/01/2023	GA-DOMI-266-23	Aprobación de diagnosticas S-SC-EP-M01-693, S-SC-EP-M07-113, S-SC-EP-M71-	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
24/01/2023	GA-DOMI-267-23	Remisión Informe Semanal No. 40 periodo del 16 de Enero de 2023 al 22 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
25/01/2023	GA-DOMI-268-23	Observaciones de obra enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
25/01/2023	GA-DOMI-269-23	Solicitud de entrega de las unidades sanitarias con observaciones del acta 5 y 6.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
26/01/20223	GA-DOMI-270-23	Solicitud plan de contingencia	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
27/01/2023	GA-DOMI-271-23	Observaciones detalles actividades de obra manzanas 54, 58 y 62	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-272-23	Tercera solicitud de atención de observaciones paquetes de vivienda terminadas de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-273-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-260-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
30/01/2023	GA-DOMI-274-23	Solicitud respuesta comunicación GA-DOMI-261-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
31/01/2023	GA-DOMI-275-23	Remisión Informe Semanal No. 41 periodo del 23 de Enero de 2023 al 29 de enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio

	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA	CÓDIGO:	F-GG-11
enterritorio		VERSIÓN:	02
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-12-07

Informe No. **11** **Fecha Informe** **2/03/2023** **Periodo comprendido entre** **1/02/2023** **y** **28/02/2023**

31/01/2023	GA-DOMI-276-23	Atraso en las actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
3/02/2023	GA-DOMI-277-23	Formato de evaluación Consorcio Turquía.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/02/2023	GA-DOMI-278-23	Comunicación CONS-TUR-SINC-182	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
8/02/2023	GA-DOMI-279-23	Remisión Informe Semanal No. 42 periodo del 30 de Enero de 2023 al 05 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
9/02/2023	GA-DOMI-280-23	Solicitud de certificados de paz y salvo y comprobantes de pago de trabajadores.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/02/2023	GA-DOMI-281-23	Atraso en la actividad No. 3	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
10/02/2023	GA-DOMI-282-23	Remisión Acta de Recibo Parcial N° 10. De Interventoría. Periodo facturado del 13	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
10/02/2023	GA-DOMI-283-23	Remisión Informe Mensual de Interventoría No. 10 periodo del 01 de enero de 2023	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
13/02/2023	GA-DOMI-284-23	Respuesta derecho de petición JAC.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	JAC
13/02/2023	GA-DOMI-285-23	Solicitud respuesta comunicaciones GA-DOMI-260-23 y GA-DOMI-273-23	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
14/02/2023	GA-DOMI-286-23	Respuesta comunicación CONS-TUR-SINC-185	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/02/2023	GA-DOMI-287-23	Aprobación con observaciones informe mensual 9 y 10 (diciembre de 2022 y enero	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	CONSORICO TURQUIA
16/02/2023	GA-DOMI-288-23	Acta de recibo parcial de obra No. 07.	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
16/02/2023	GA-DOMI-289-23	Remisión Informe Semanal No. 43 periodo del 06 de febrero de 2023 al 12 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
21/02/2023	GA-DOMI-290-23	Remisión Informe Semanal No. 44 periodo del 13 de febrero de 2023 al 19 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/02/2023	GA-DOMI-291-23	Remisión Informe Semanal No. 45 periodo del 20 de febrero de 2023 al 26 de	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
28/02/2023	GA-DOMI-292-23	Solicitud de prorroga Contrato de obra	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS	Enterritorio
6/02/2023	CONS-TUR-SINC-182	informe del plan logístico, Plan de acción y Contingencia.	CONSORICO TURQUIA	GAVINCO Ingenieros Consultores SAS
28/02/2023	CONS-TUR-SINC-189	Remisión de Informe fotográfico de las intervenciones Domiciliarias de Alcantarillado y acueducto ejecutadas a la fecha.	CONSORICO TURQUIA	VEOLIA

Firma:

Nombre: Edgar Aragon

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo 11. Relación de documentos

Contratista

enterritorio	**RELACIÓN DE DOCUMENTOS**	CÓDIGO:	**F-GG-19**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2010-10-12**

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	1	1		Interventoria		X	X	
2	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN PROJECT CON SU FLUJO DE INVERSIÓN EN EXCEL.	1	1		Interventoria		X	X	
3	PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	1	1		Interventoria		X	X	
4	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	1	1		Interventoria		X	X	
5	PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL.	1	1		Interventoria		X	X	
6	PLAN DE CALIDAD	1	1		Interventoria		X	X	
7	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD APROBADO POR LA ARL Y RADICADO EN EL ENTE TERRITORIAL.	1	1		Interventoria		X	X	
8	ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO	1	1		Interventoria		X	X	
9	METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	
10	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LISTADO DE PRECIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS INSUMOS PRESENTADOS EN LA OFERTA ECONOMÍA PARA LA ACTIVIDAD 3	1	1		Interventoria		X	X	
11	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	1	1		Interventoria		X	X	
12	FLUJO DE INVERSIÓN DEL CONTRATO	1	1		Interventoria		X	X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	**RECIBE**
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 12 de abril de 2022	Fecha: 12 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Titulo del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	MATRIZ DE EVALUACION DE ENCUETAS PCI, SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R			x	
2	CARTA DE PRESENTACION PCI, MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
3	RESUMEN PROYECTO INTRADOMICILIARIAS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
4	CERTIFICACION ESTADO DE LEGALIDAD DE LOS BARRIOS.	1	1		Juan David Amon R		x	x	
5	CERTIFICADO NO ZONA DE RIESGO BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
6	CERTIFICADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BARRIO EL POBLADO	1	1		Juan David Amon R		x	x	
7	PLAN DE GESTION SOCIAL	1	1		Juan David Amon R	x		x	
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	1	1		Juan David Amon R	x		x	Especificaciones técnicas generales, Capitulo I, Capitulo II, Capitulo III, Capitulo IV,
9	FORMATOS PCI								PCI-001_Lista de chequeo para aprobación Diagnóstico
									PCI-002_Lista de chequeo para Aprobación Intervención
									PCI-003 Encuesta portanciales beneficiarios
									PCI-004_Carta de Compromiso Prop
									PCI-004a_Acta de rechazo
									PCI-005_Carta de Concertación propiet o poseedor
									PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio
									PCI-007_Plan de Intervención Beneficiario. Presupuesto
									PCI-008_Plan de intervención. Presupuesto
									PCI-009_Acta de concertacion para fa intervención
									PCI-010_Autorizacion inicio de obra
									PCI-011_Ajustes al Diagnóstico Inicial
									PCI-012 Cambio Plan de Intervención
									PCI-013_Acta de pruebas Técnicas
									PCI-014_Acta Recibo beneficiario6
									PCI-015_Acta de cierre e historico vivienda
									PCI-016_Verificación de viviendas visitadas
									PCI-017_Cronograma general de ejecución
									PCI-018_Cronograma especifico de ejecución
									PCI-019 Lineamientos para la inclusión de potenciales beneficiarios
									PCI-020 Plantilla Informe Quincenal
									PCI-021_Informe Mensual
									PCI-022_Lista de asistencia beneficiarios
									PCI-023_Lista de Convocatoria a beneficiarios
									PCI-024_ Solicitud del Ciudadano PQR
									PCI-025_Registro y Seguimiento PQR
									PCI-026_Criterios de planeación, Ej y Ev Reuniones con la comunidad
									PCI-027_Plantilla Agenda de Capacitación Educación Sanitaria
									PCI-028_Orientaciones y formatos MEMORIAS PCI
									PCI-029_Indicador de Empleo Mensual

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 06 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Entrega Informe Mensual de Interventoría

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	**INFORME MENSUAL N°. 11 V-0**	1	1		Juan David Amon R			X	
CONTENIDO INFORME MENSUAL N°. 11 V-0	1. RESUMEN EJECUTIVO	N/A						X	
	F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	N/A						X	
	2. INFORME BÁSICO	N/A						X	
	2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO	N/A						X	
	F-GG-04 - Acta de Vecindad	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato - Actas de aprobación.	N/A						X	
	F-GG-10 - Control de personal	N/A						X	
	F-GG-11 - Relación de correspondencia	N/A						X	
	PCI-009 - Actas de concertación	N/A						X	
	2.2. ANEXO TECNICO	N/A						X	
	F-GG-19 - Relación de documentos	N/A						X	
	F-GG-20 - Relación de planos	N/A						X	
	F-GG-24 - Control de seguridad industrial	N/A						X	
	F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Cumplimiento normatividad ambiental	N/A						X	
	2.3. ANEXO PRESUPUESTAL	N/A						X	
	F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	N/A						X	
	F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	N/A						X	
	Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto.	N/A						X	
	Informe de gestión social del proyecto.	N/A						X	
	Planillas de Seguridad Social	N/A						X	
ANEXOS INFORME MENSUAL N°. 11 V-0	Anexo 0. Aplicación y cumplimiento de requisitos del informe mensual de interventoría	N/A						X	
	Anexo 1. Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría (Formato F-GG-08)	N/A						X	
	Anexo 2. Contrato de Interventoría y Contratista	N/A						X	
	Anexo 3. Pólizas contrato de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 4. Acta de inicio contratos de Obra e Interventoría	N/A						X	
	Anexo 5. Análisis de Precios Unitarios	N/A						X	
	Anexo 6. Plan de inversión del anticipo	N/A						X	
	Anexo 7. Acta de seguimiento de contrato	N/A						X	
	Anexo 8. Formato de registro fotográfico	N/A						X	
	Anexo 9. Bitácora de Obra	N/A						X	
	Anexo 10. Relación de correspondencia	N/A						X	
	Anexo 11. Relación de documentos	N/A						X	
	Anexo 12. Relación de planos	N/A						X	
	Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social	N/A						X	
	Anexo 14. Control de personal	N/A						X	
	Anexo 15. Control de seguridad industrial	N/A						X	
	Anexo 16. Cumplimiento ambiental	N/A						X	
	Anexo 17. Informes semanales	N/A						X	
	Anexo 18. Informe de gestión social	N/A						X	
	Anexo 19. Diagnósticos aprobados.	N/A						X	
	Anexo 20. Certificaciones de materiales.	N/A						X	
	Anexo 21. Acta de Vecindad	N/A						X	
	Anexo 22. Actas de concertación	N/A						X	
	Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría	N/A						X	
	Anexo 24. Control de equipos	N/A						X	
	Anexo 25. Control de inspección y ensayos	N/A						X	
	Anexo 26. Cambio especificación	N/A						X	
	Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)	N/A						X	

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 02 días del el mes de marzo del 2023.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 02 de marzo de 2023	Fecha: 02 de marzo de 2023

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 12. Relación de planos

Contratista

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipologia caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JOSE IGNACIO CARDENAS MENESES (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría


Interventoría

eterritorio	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220585
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	CASETA	1		Tipología caseta Tipo I	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
2	CASETA	1		Tipología caseta Tipo II	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
3	CASETA	1		Tipología caseta Tipo III	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021
4	CASETA	1		Tipología caseta Tipo IV	N/A	N/A	Juan David Amon	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	**NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO (R/L)**
Fecha: 05 de abril de 2022	Fecha: 05 de abril de 2022



Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

	RELACIÓN DE PLANOS	CÓDIGO	F-GG-20
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-12

CONTRATO No. :	2220577
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
SUPERVISOR:	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

No.	Plano #	Versión	Fecha	Contenido	Remplaza Plano #	Nueva Versión	Aprobado por	Observaciones
1	PLANO 1-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2. Y DETALLES DE COLUMNA DE TANQUE.	N/A	N/A	Interventoría	Producto Actividad 1. Chequeo y validación de prototipos.
2	PLANO 2-2	1	abr-22	PLANTA DE CIMIENTOS, PLANTA DE VIGAS DE CUBIERTA, DETALLES DE VIGAS CIMIENTO Y DE CUBIERTA, CORTE ESTRUCTURAL, PLANTILLA, LOSA MACIZA Y MACHONES. DE CASETAS T1 Y T2	N/A	N/A	Interventoría	Planos proceso INA 032 2021

Para constancia de lo anterior, se firma en BOGOTA D.C. a los 05 días del mes abril del 2022.

ENTREGA	RECIBE
	
NOMBRE: LUZ ANDREA FAJARDO	**NOMBRE: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ**
Fecha: 31 de mayo de 2022	Fecha: 31 de mayo de 2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 13. Acreditación pagos al sistema de seguridad social

Contratista

CONSORCIO TURQUIA
NIT 901 570934-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES**, identificada con **C.C No 1.117.491.4706 DE FLORENCIA**, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO TURQUÍA** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, del periodo contractual correspondiente a los últimos seis (06) meses, así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF y SENA, toda vez que éste consorcio está conformado por una persona jurídica y una persona natural, la cual se encuentra cobijada por lo normado en el artículo 114-1 del estatuto tributario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002.

Por último, declaro que este consorcio, se encuentra a PAZ Y SALVO, por concepto de honorarios, salarios y liquidaciones del personal que se encuentra vinculado al mismo.

Dada en Sincelejo a los UN (01) días del mes de marzo de 2023

CONSORCIO TURQUIA
PCI TURQUIA

Cordialmente

JOSE IGNACIO CÁRDENAS MENESES
C.C No 1.117.491.4706 DE FLORENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TURQUIA

Calle 16 No 14 – 71 local 2 Sincelejo Sucre
Teléfono: 6052791552 - 3107321694
coordinadorturquiapci@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.117.491.406

NUMERO

CARDENAS MENESES

APELLIDOS

JOSE IGNACIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-ENE-1987

VALPARAISO

(CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 A+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

21-ENE-2005 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-4400100-67136291-M-1117491406-20050602 03288 05153A 02 182123745

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ISAIAS VARGAS GONZALEZ** Actuando en nombre propio, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.710.012, me permito certificar que he efectuado el pago y me encuentro a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos Laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 797 y 828 de 2003 y Decreto 510 de 2003.

Dada en Sincelejo a los UN (01) días del mes de marzo de 2023

Atentamente,




ISAIAS VARGAS GONZALEZ.
CC. 7.710.012 de Neiva Huila
Representante Legal



MARIA BERNARDA RAMOS JARABA
CC. 1102840197 de Sincelejo
CONTADOR PUBLICO
TP. 244730-T

TARJETA PROFESIONAL



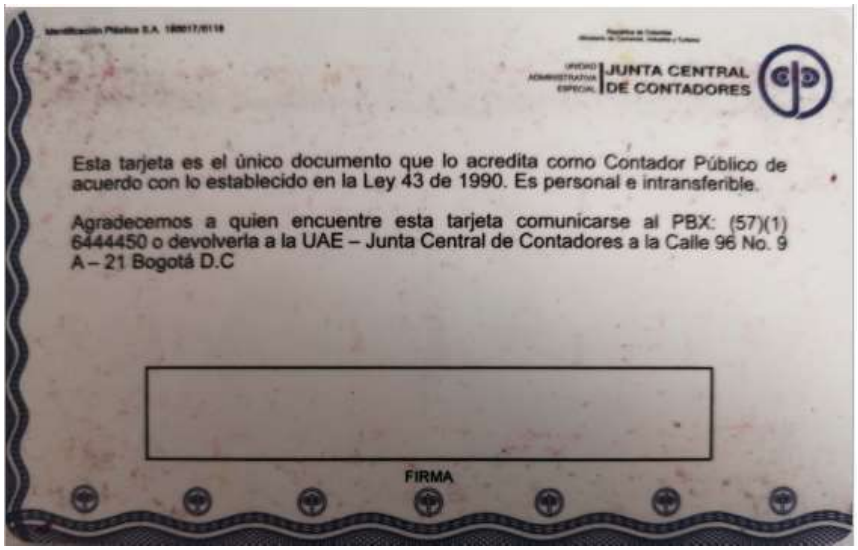

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6AA777 3854AEC2FF41

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA BERNARDA RAMOS JARABA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1102840197 de SINCELEJO (SUCRE) Y Tarjeta Profesional No 244730-TSI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

DOCUMENTO DE IDENTIDAD





LA SUSCRITA REVISORA FISCAL DE
V&M INGENIERIA SAS
YEMI PAOLA CARVAJAL CARCIA
T.P. 266148-T

CERTIFICA

Que la empresa V&M INGENIERIA SAS identificada con NIT: 900.062.688 – 7 representada legalmente por YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO identificado con cedula de ciudadanía No. 7.713.933 de Neiva (H), se encuentra al día con el pago de nóminas y liquidaciones de los trabajadores a su cargo al igual que con el pago de las obligaciones legales, con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos los empleados. Aclaramos que no realiza aportes al Sena ni al ICBF debido a que la Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 en el artículo 65 el cual dispone que "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes".

Para constancia de lo anterior firmo la presente a los UN (01) días del mes de marzo de 2023.

Firmado,



YEMI PAOLA CARVAJAL CARCIA
REVISORA FISCAL
T.P. 266148-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8097EE1631F0505 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YEMI PAOLA CARVAJAL GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1091059514 de CHITAGA (N. DE SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 266148-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.091.059.514
CARVAJAL GARCIA
APELLIDOS
YEMI PAOLA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1992
CHITAGA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-ENE-2010 CHITAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-5205000-00707706-F-1091059514-20150523
0044267173A 1
33356495

YEMI CARVAJAL
CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



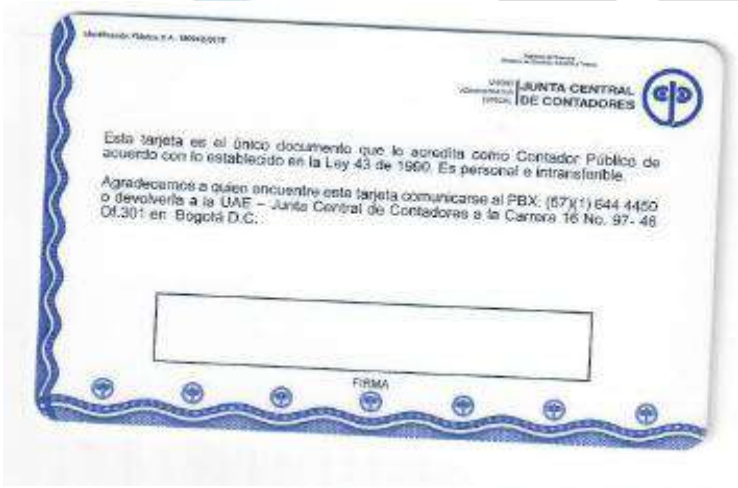

YEMI CARVAJAL
Contadora publica

CRA 11 10-66 SUR
CEL.3023765109
Correo: yemicarvjal25@gmail.com

Interventoría

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de sus empleados, durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los 06 días del mes de marzo del 2023.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T



FECHA DE NACIMIENTO 15-JUL-1995

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

19-JUL-2013 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1500150-00461133-F-1018477519-20130827 0034579202A 1 40169267

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.018.477.519

GARZON RUBIO

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



260106-T

MARIA ALEJANDRA
GARZÓN RUBIO
C.C. 1018477519
RES. INSCRIPCION 385 DEL 08/07/2019
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271024 **290395**

Escaneado con CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0D9426F95740220

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ALEJANDRA GARZÓN RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018477519 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 260106-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Anexo 14. Control de personal

Interventoría

	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2023 Y EL 28/02/2023 PLAZO: 11 meses

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS CONTRATO No. 2220577

SUPERVISOR JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA (INTERVENTORIA)

FECHA	MES 11																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Director de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Residente de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Especialista en Estructuras	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional Social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional HSEQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Profesional Costos y Presupuesto	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Auxiliar social	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
Inspector de Interventoría	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
PERSONAL CONTRATISTA	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**	**11**				**TOTAL PERIODO** 308

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región																																0	0,00%	
De fuera de la región																																0	0,00%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																**0**	**0,00%**	
De la región	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				140	45,45%	**S**
De fuera de la región	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				168	54,55%	**S**
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada																																0	0,00%	
Profesionales - Técnicos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				140	45,45%	**S**
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragon

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO identificado(a) con CC 1022363189

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA PATRICIA CONTRERAS NAVARRO identificado(a) con CC 1102854339

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:09.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL DARIO VERGARA DE LA OSSA identificado(a) con CC 11052258

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAFAEL ANTONIO LOPEZ MOLINA identificado(a) con CC 1102874551

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	15

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:14.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEIDER DE JESUS SUAREZ OZUNA identificado(a) con CC 1103109623

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	CCFC33	EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:13.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LEANDRA MARIA OROZCO TOUS identificado(a) con CC 1026565862

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:13.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JULY PAULIN RIOS ANAYA identificado(a) con CC 1102813002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:11.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ANDRES MEZA ROSAS identificado(a) con CC 13874430

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:10.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para JAIRO ALONSO ZORRO ROA identificado(a) con CC 1031120730

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ISAAC MANUEL MARTINEZ MARTINEZ identificado(a) con CC 92530837

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	ESSC07	MUTUAL SER	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF41	COMFASUCRE	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:14.

Certificado de Aportes

Se certifica que GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 900916608 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES identificado(a) con CC 1049796249

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30
9447803088	1950440552	E	2023-03-03	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30

Este certificado se expide el día 2023-03-08 a las 04:12.

Contratista

enterritorio	CONTROL DE PERSONAL	CÓDIGO:	F-GG-10
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2023 Y EL 28/02/2023 PLAZO: 11 meses

CONTRATISTA: Consorcio Turquia — CONTRATO No. 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO Ingenieros Consultores SAS — CONTRATO No. 2220585

PERSONAL DEL CONTRATISTA

FECHA	MES 11																														OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
CARGO																																
Especialista estructural	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 1, 2 y 3
Especialista Hidrosanitario	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 2 y 3
Profesional costos y presupuesto	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 1, 2 y 3
Profesional Social	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	NA	NA	NA	Actividad 1, 2 y 3
Director de obra	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 1, 2 y 3
Residente de obra	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	3	3	NA	3	3	3	NA	NA	NA	Actividad 2y 3
Profesional de calidad	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 2 y 3
Tecnico PGIO	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 2 y 3
oficiales	42	33	31	31	NA	39	38	40	40	38	35	NA	36	34	48	52	49	49	NA	49	53	50	52	51	NA	42	43	42	NA	NA	NA	Actividad 3
ayudantes	23	23	24	24	NA	26	23	24	23	24	20	NA	26	22	30	31	35	35	NA	35	32	28	30	32	NA	28	28	26	NA	NA	NA	Actividad 3
almacenista	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	Actividad 3
herrero	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	NA	NA	NA	Actividad 3
Auxiliar de bodega	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	NA	NA	NA	Actividad 3
																																Actividad 3
PERSONAL CONTRATISTA	**90**	**81**	**80**	**80**	**NA**	**90**	**86**	**89**	**88**	**87**	**80**	**NA**	**87**	**81**	**103**	**108**	**109**	**109**	**NA**	**109**	**110**	**103**	**107**	**108**	**NA**	**95**	**96**	**93**	**NA**	**NA**	**NA**	**TOTAL PERIODO**	**2269**

PROCEDENCIA / CONDICIÓN	MANO DE OBRA LOCAL Y POBLACIÓN VULNERABLE*																															SUMATORIA	PORCENTAJE	CUMPLE S/N
MANO OBRA NO CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	77	68	67	67	NA	77	73	76	75	74	67	NA	74	68	90	95	96	96	NA	96	97	90	94	95	NA	82	83	80	NA	NA	NA	1957	86,25%	
De fuera de la región	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	0	0	NA	0	0	0	NA	NA	NA	0	0,00%	
MANO OBRA CALIFICADA																																**0**	**0,00%**	
De la región	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	NA	NA	NA	312	13,75%	
De fuera de la región	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	24	1,06%	
PROFESIONALES - TÉCNICOS																																**0**	**0,00%**	
De la región	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	13	13	NA	13	13	13	NA	NA	NA	312	13,75%	
De fuera de la región	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	1	1	NA	1	1	1	NA	NA	NA	24	1,06%	
POBLACIÓN VULNERABLE																																**0**	**0,00%**	
En proceso de reinserción social																																0	0,00%	
En condición de desplazamiento																																0	0,00%	
MUJERES																																**0**	**0,00%**	
Mano de Obra no Calificada																																0	0,00%	
Mano de Obra Calificada	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	NA	NA	NA	144	6,35%	
Profesionales - Técnicos	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	6	6	NA	6	6	6	NA	NA	NA	144	6,35%	
PROVEEDORES																																		
Local																																		
Nacional																																		
Internacional																																		

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: Edgar Aragón

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

1 DOCUMENTOS - CONSORCIO TURQUIA

CONSORCIO TURQUIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2		2365738			COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25539191	E	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.592.000	0	Bancolombia
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	25539191	2023-02-10	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 26883989	GONZALEZ MEDINA CANDELARIA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5345433
2	CC 64699488	BENITEZ DIAZ ANDRY MARY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	4534532
3	CC 64700723	CABALLERO GUERRERO HELENA	1.160.000	F	X	X														0			15	15	15	15	COLPENSION ES-25-14	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	CCF DE SUCRE-CCF41	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5123456
4	CC 79534510	DEMERA GACHARNA CARLOS AUGUSTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
5	CC 92548981	ARRIETA GUTIERREZ JOSE LUIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
6	CC 1102829998	GONGORA TOVAR HENRY ANDRES	1.160.000	F	X	X														0			15	15	15	15	PROTECCION -230201	580.000	92.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	580.000	23.200	CCF DE SUCRE-CCF41	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5123456
7	CC 1102850002	PATERNINA VITOLA ESTEFANY	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5234567
8	CC 1102863131	SUAREZ MARTINEZ JESUS DAVID	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5123456
9	CC 1102863514	MANJARREZ CALDERA SUANY DEL CARMEN	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5234567
10	CC 1115690243	RODRIGUEZ MACANA MARLY DAYANA	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567
11	CC 1117491406	CARDENAS MENESES JOSE IGNACIO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.160.000	185.600	0	0	MIN001 - ADRES-MIN001	1.160.000	46.400	CCF DE SUCRE-CCF41	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	1234567

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901570934	7	CONSORCIO TURQUIA	B	2	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4220	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CARRERA 4 2 85 KM 3-2	2365738	COORDINADORTURQUIAPCI@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-02	25539191	E	2023-02-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.592.000	0	Bancolombia

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	25539191		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	1.856.000	0	0	0	1.856.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	278.400	0	0	0	278.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	742.400	0	0	0	742.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	185.600	0	0	0	185.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	649.600	0	0	0	649.600
EPS(Administradoras: 5)				11	464.000	0	0	0	464.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	46.400	0	0	0	46.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	139.200	0	0	0	139.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	46.400	0	0	0	46.400
MIN001 - ADRES	MIN001	901037916	1	1	46.400	0	0	0	46.400
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	185.600	0	0	0	185.600
ARP(Administradoras: 1)				11	808.000	0	0	0	808.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	808.000	0	0	0	808.000
CCF(Administradoras: 1)				11	464.000	0	0	0	464.000
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	11	464.000	0	0	0	464.000
Gran Total					3.592.000	0	0	0	3.592.000

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

3 DOCUMENTOS - ISAIAS VARGAS GONZALEZ

CONSORCIO TURQUIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISAIAS VARGAS GONZALEZ
IDENTIFICACION:	CC-7710012
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	000
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	isaias vargas
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-20
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-03
FECHA DE PAGO:	2023-01-20
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25193322
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25193322
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500	$ 212.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.000	$ 272.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.700.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500	$ 41.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.000	$ 526.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/03/2023

"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMADECONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONSORCIO TURQUIA

2 DOCUMENTOS - V&M INGENIERIA S.A.S

CONSORCIO TURQUIA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 25434523
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-02-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	VYM INGENERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900062688	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 9 17 18	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	GARZON
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	2018AFILIACIONES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6335646
FAX	8643535	SUCURSAL	01oficina	NOMBRE SUCURSAL	01oficina
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	7713933	PRIMER APELLIDO	CAMACHO	SEGUNDO APELLIDO	LADINO
PRIMER NOMBRE	YERSON	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 01	Año: 2023	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		$7.656.001		25434523

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-7713933	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	CAMACHO LADINO YERSON FERNANDO	$1.160.000
CC-36312881	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	MONJE FLOR LINA CONSTANZA	$1.160.000
CC-7714529	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	MURCIA HERNANDEZ ALBEIRO	$1.160.000
CC-52033387	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	ROBAYO GUZMAN ALEJANDRINA	$2.320.000
CC-1084923149	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	SANCHEZ RIVERA HERMIDES	$1.160.000
CC-1077865751	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	TOVAR PIMENTEL ESMERALDA	$1.160.000
CC-1084869075	01	No	No	No	41	1	5742101	Fijo	TRUJILLO PERDOMO LUIS FERNANDO	$1.160.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 7713933																													0		
CC - 36312881	X	2023-01-15																											0		
CC - 7714529	X	2023-01-15																											0		
CC - 52033387																													0		
CC - 1084923149																													0		
CC - 1077865751																													0		
CC - 1084869075	X	2023-01-15																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 7713933	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 36312881	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 7714529	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0
CC - 52033387	COLPENSIONES	30	$2.320.000	0.1600000	$371.200	$0	$0	$371.200	$0	$0	$0
CC - 1084923149	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1077865751	PORVENIR	30	$1.160.000	0.1600000	$185.600	$0	$0	$185.600	$0	$0	$0
CC - 1084869075	PORVENIR	16	$618.667	0.1600000	$99.000	$0	$0	$99.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 7713933	SANITAS	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 36312881	SANITAS	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100
CC - 7714529	SANITAS	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100
CC - 52033387	SANITAS	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	$0	0	$0	0	$0	30	$2.320.000	1	0.0052200	$12.200
CC - 1084923149	ESSC ASMET SALUD	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1077865751	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	$0	0	$0	0	$0	30	$1.160.000	5	0.0696000	$80.800
CC - 1084869075	EPS ECOOPSOS S.A.S	16	$618.667	0.0400000	$24.800	$0	0	$0	0	$0	16	$618.667	5	0.0696000	$43.100

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-7713933	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36312881	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-7714529	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-52033387	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.320.000	0.0400000	$92.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084923149	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1077865751	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.160.000	0.0400000	$46.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1084869075	COMFAMILIAR DEL HUILA	16	$618.667	0.0400000	$24.800	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$371.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$371.200
PORVENIR	6	$853.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$853.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	4	$188.800	$0	0	$0	0	$0	$188.800	0	$0	$0	$188.800	$0	0	$0	$0	$188.800	$0	$0	$188.800
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
ESSC ASMET SALUD	1	$46.400	$0	0	$0	0	$0	$46.400	0	$0	$0	$46.400	$0	0	$0	$0	$46.400	$0	$0	$46.400
EPS ECOOPSOS S.A.S	1	$24.800	$0	0	$0	0	$0	$24.800	0	$0	$0	$24.800	$0	0	$0	$0	$24.800	$0	$0	$24.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	$383.900	0	$0	$0	$383.900	0	$0	$383.900	0	$0	$0	$383.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$306.400	0	$0	$306.400
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$306.400
PENSIONES	2	$1.225.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$383.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$306.400
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.221.700


Anexo 15. Control de seguridad industrial

	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	CÓDIGO:	F-GG-24
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA					
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/02/2023	**Y EL**	28/02/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES					

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		El Contratista mantuvo durante el periodo tres camiones y dos camionetas que distribuyen los materiales desde la bodega principal hacia puntos de acopio localizados directamente en el barrio El Poblado o a las viviendas intervenidas. También mantuvo dos motocarros en obra, los cuales distribuyen los materiales desde los diferentes puntos de acopios temporales hacia las viviendas intervenidas. En el periodo utilizó cortadoras y pulidoras para el corte de ladrillos, acero, ceramica, estos se encontraban en buen estado.
- Regularidad del mantenimiento	x		
- Vibraciones /Ruidos	x		Para el controlde ruido Los trabajadores utilizan proteccion auditiva en el uso de cortadoras y pulidoras que son los equipos que mas generan este impacto en el proyecto.
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios	x		Los conductores de vehiculos cuentan con la licencia de conduccion respectiva
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		El Contratista cuenta con punto de primeros axilios en el campamento principal y extintores para el control de posibles generacion de conatos o incendios.
- Buen estado	X		El campamento se mantuvo durante el periodo ordenado y aseado. Se observó un correcto almacenamiento de materiales.
- Fácil acceso y operación	X		El campamento principal cuenta con facil acceso
DOTACIÓN DEL PERSONAL			

- Dotación completa	X		Sin embargo, en recorridos de obra realizado por interventoría, se han presentado casos puntuales en algunas viviendas en intervención, en donde algunos trabajadores no contaban con los EPP requeridos para la ejecución de actividades constructivas, razón por la cual la Interventoría mediante correo electrónico de fecha 16 de febrero de 2023, solicitó al Contratista retirar de la obra a estos trabajadores hasta tanto no se les suministrara los EPP necesarios para el desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento al SGSST con el fin de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
- Buen estado	X		
- Uso según zona de trabajo	X		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Parcialmene. En las actividades donde se realizan excavaciones se requere mejorar la delimitacion y demarcacion de areas y dar cumplimiento total al procedimiento de manejo de excavaciones establecido en el SGSST
- Uso según zona de trabajo	X		
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	X		Se mantuvo personal suficiente para la vigilancia en el area administrativa y en el campamento principal.
- Diurna	X		
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia	X		
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		El personal que ingresó a trabajar en el mes de febrero de 2023 en el proyecto fue afiliado a seguridad social integral

Firma: 

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA


Anexo 16. Cumplimiento ambiental

CONTROL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA				
NÚMERO DE CONTRATO:	2220585	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1/02/2023	**Y EL**	28/02/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA				
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES				

DESCRIPCIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES			
Se cuenta con licencia ambiental y registro minero de las canteras donde se extare el material petereo	x		Durante el periodo se mantuvieron los proveedores que suministran los materiales pétreos utilizados en el proyecto, se mantienen vigentes los permisos, autorizaciones, licencias ambientales vigentes, de las canteras donde se extraen estos materiales.
Cuenta con autorizacion para la disposicion de RCD	x		Se generan pocos RCD en el proyecto, Los escombros y material sobrante de excavacion son donados a la comundad o propietarios de vivienda para rellenos de patios o lotes, lo anterior con previa solicitud del propietario.
MAJEJO DE SEÑALIZACION			
Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y demarcados	X		Sin embargo aun persisten casos puntuales donde se requiere reforzar la demarcacion y delimitacion de areas de excavacion.
Los materiales almacenados en los frentes de obra están ubicados y acordonados dentro de la señalización del frente de obra y no deberán obstaculizar el tránsito vehicular y peatonal.	X		Se evidencio mejoras en el almacenamiento de materiales dentro de las vviendas intervenidas.
Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el tránsito peatonal.	X		
MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS			
Los vehículos que se encuentran operando actualmente en el proyecto cuentan con las revisiones técnico-mecánicas, vigentes y expedidas en un sitio autorizado por la autoridad competente.	X		Los vehiculos cuentan co revision tecnomecanica vigente.
Las volquetas utilizan carpas para cubrir los materiales para la construccion el transporte de los mismos.	X		Las volquetas que realizaron el transporte de materiales hasta la bodega principal y hacia los puntos de acopio localizados en el Barrio el Poblado, utilizaron carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría tránsito Municipal y de la Resolución N° 0472 de 2017 y Resolución N° 1257 de 2021 de Minambiente, para la realización de esta actividad.
Las operaciones de mantenimiento de la maquinaria se adelantan únicamente en sitios autorizados	X		
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS			
Se cuenta con recipientes adecuados para el almcacenamiento y separacion de los residuos solidos que se generen en el proyecto.	X		Para el almacenamiento y separación de los residuos sólidos que se generan en el proyecto, se cuentan con puntos ecológicos tanto en el área administrativa como en el punto de atención dispuesto en campo. Así mismo dada las características y condiciones del proyecto se les indica a los trabajadores tener cultura ambiental a la hora de disponer los residuos.
se realiza disposicion final adecuada de los residuos generados en el proyecto	X		
CONTROL DE AGREGADOS PETREOS			
Se realiza un correcto almacenamiento de los materiales petreos que se utilizan en la ejecucion de actividades constructivas.	X		Durante el periodo los materiales petreos fueron trasladado directamente a los puntos de acopio localizados en el Barrrio El Poblado para su posterior trslado a las viviendas intervenidas.
Los materiales dispuestos temporalmente serán cubiertos para evitar emisiones a la atmosfera y arrastre por efectos de la lluvia	X		Parcialmete.

Los sitios de acopio de materiales granulares se encuentran retirados de cuerpos de agua o zonas de vegetación.	X		
El cemento es acopiado en un lugar seco y aislados del suelo.	X		Se cumple con este aspecto.
CAMPAMENTOS Y AREA DE ALMACENES			
El campamento o almcenes se encuentran ordenados, aseados y señalizados de forma correcta	X		El campamento mantuvos buenas condiciones de orden y aseo.
El campamento cuenta con equipos para control de incendios –extintores	X		Se cuentan con extintores y punto de atencion de primeos auxilios.
El campamento cuenta con punto de atencion de primeros auxilios	X		Se cuenta con punto de primeros auxilios
MANEJO DE ESCOMBROS			
Ese realiza un manejo adecuado de los escombros que se generan en el proyecto	X		Los escombros son reutilizados para el relleno de patios o lotes. Se generan pcos escombros en el proyecto.
CAPACITACIONES			
Se realiza capacitación permanente, para sensibilizar y evitar acciones que atenten contra el equilibrio ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto.	X		Se realizan charlas permanentes a los trabajadores

Firma: 

Nombre: Edgar Aragon Otero

Director de Interventoria

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 3/02/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Enelvis Ruiz estrada, identificado con CC 1102829594 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manza 72 Vivienda 549 y los cuales serán utilizados para:

estabilizacion y relleno del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Enelvis Ruiz

FIRMA

CC: 1102829594

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Enelvis Ruiz estrada Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1102829594 de Sincelejo y Andry Mary Benítez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,8m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 2 días del mes Dic de 2022

Enelvis Ruiz

Nombre y firma de quien recibe.

1102829594

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 27/12/22
CIUDAD: Sincelejo

Yo Jose de Jesus Perez Rivero identificado con CC 92.546.692 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los resíduos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 50 Casa 606 y los cuales serán utilizados para:

Rellenos y estabilizacion del terreno

Agradezco la atencion Prestada

.JOSE

FIRMA

CC: .92546692

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Jose de jesus Toro Pivon Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 92546692 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 9,7m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 27 días del mes Dic de 2022

JOSE

Nombre y firma de quien recibe.
92546692

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 25/12/2022

CIUDAD: Sincelejo

Yo María Arroyo Arrieta, identificado con CC 1005441167 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 62 casa 495 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno.

Agradezco la atencion Prestada

María Arroyo.

FIRMA

CC: 1005441167.

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) María Amaya Arrieta Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1005441167 de Sincelejo y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 94m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022

María Arroyo

Nombre y firma de quien recibe.

1005441167

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 26/12/2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Sixto Manuel Fuente Sneider identificado con CC 4.835.943 de Tierra Alta solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA,** contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)",** que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Casa 564 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del terreno

Agradezco la atencion Prestada

Sixto

FIRMA

CC: 4.835.943

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Sixto Ramon Benitez Fuentes identificado con Cedula de Ciudadanía N° 4.835.913 de Tierra alta y Endry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,7 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 26 días del mes Dic de 2022.

SIXTO RAMON BENITEZ FUENTES

Nombre y firma de quien recibe.

4.835913

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Powered by CamScanner

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 7- 02 - 2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Zoyka Inés Meza Alvarez identificado con CC 64 701 261 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CORDOBA (BOLIVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 32 Lote 11 C 14 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización de terreno

Agradezco la atencion Prestada

Zoyka Inés Meza Alvarez

FIRMA

CC: 64 701 261

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Zoila Inés Mesa Alvarez identificado con Cedula de Ciudadanía N° 64.701.261 de Bucaramanga y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TUROUIA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TUROUIA. El volumen dispuesto es 0,3 m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 10 días del mes Febrero de 2023

Zoila Inés Mesa Alvarez

Nombre y firma de quien recibe.

64 701 261

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Codigo: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 08 - 03 - 2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Ana Patricia Martinez, identificado con CC 64.524.759 de San Onofre solicito formalmente al CONSORCIO TURQUIA, contratista de las obras "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR). EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)", que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Km 170 Gun - 43 y los cuales serán utilizados para:

Relleno de Terreno y estabilización

Agradezco la atencion Prestada

ANA PATRICIA

FIRMA

CC: 64524759

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACIÓN	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Ana Patricia Martinez identificado con Cedula de Ciudadanía N° 64 524 359 de Cali Valle y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUIA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propetario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUIA. El volumen dispuesto es 6,2 m³

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 10 días del mes Febrero de 2023

ANA PATRICIA

Nombre y firma de quien recibe.

64524759

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 14-02-2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Yilena Gonzalez Padilla, identificado con CC 1006533274 de Sincelejo solicito formalmente al **CONSORCIO TURQUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221065" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 66 Lote 16 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y Estabilización de Terreno

Agradezco la atencion Prestada

Yilena Gonzalez

FIRMA

CC: 1006533274

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Codigo: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Yilena Gonzalez identificado con Cedula de Ciudadania N° 1005573274 de Concejo y Andry Mary Rondon en calidad de Tecnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,2 m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 16 días del mes Febrero de 2023

Yilena Gonzalez

Nombre y firma de quien recibe

1005573274

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 16-03-2023

CIUDAD: Sincelejo

Yo Isabel Cristina Toro A., identificado con CC 43288267 de Antioquia solicito formalmente al **CONSORCIO TUROUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221095" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generados por las actividades de construcción sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 56 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y Estabilización del Terreno

Agradezco la atención Prestada

Isabel Cristina Toro A

FIRMA

cc: 43288267

	ACTA DE ENTREGA DONACIÓN DE MATERIAL	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Isabel Cristina Toro identificado con Cedula de Ciudadanía N° 43288267 de Antioquia y Andrea María Restrepo en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUIA con el fin de entregar por parte de la Empresa material de Escombro Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna de la Empresa. El volumen dispuesto es 0,4m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 24 días del mes Febrero de 2023

Isabel Cristina Toro R

Nombre y firma de quien recibe
43288267

Nombre y firma de quien entrega
Cargo: Técnico PGIO

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-01 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION

FECHA: 17 - 08 - 2022
CIUDAD: Sincelejo

Yo Betty Maria Macea O. identificado con CC 30576394 de Sahagún solicito formalmente al **CONSORCIO TURCUIA**, contratista de las obras **"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005" GRUPO 1: SINCELEJO (SUCRE)"**, que los residuos de escombros y/o excavación generadas por las actividades de construccion sean donados y dispuestos en la siguiente dirección: Manzana 45 Lote 16 Cll 14 y los cuales serán utilizados para:

Relleno y estabilización del Terreno.

Agradezco la atencion Prestada

Betty macea

FIRMA

CC:- 30576394

	ACTA DE SOLICITUD DE ESCOMBROS Y RESIDUOS DE EXCAVACION	Código: FR-PMA-02 Fecha: 09/05/2022 Página 1 de 1

ACTA DE ENTREGA DONACION DE MATERIAL

Se reunieron el Señor (a) Betty Maria Macea Identificado con Cedula de Ciudadanía N° 30.576.394 de Sabaguin y Andry Mary Benitez en calidad de Técnico PGIO en nombre de CONSORCIO TURQUÍA, con el fin de entregar por parte del Consorcio material de Escombro. Este material es solicitado por el Señor (a) en mención, así mismo el propietario del predio donde se dispondrá este material deberá cumplir con los siguientes compromisos:

1. La conformación del material donado estará a cargo del propietario del predio.
2. El beneficiario no podrá acopiar el material en lugares donde pueda afectar a fuentes hídricas o causar daños al medio ambiente.
3. Los materiales no pueden ser negociados o vendidos a terceros.
4. El propietario será el único responsable de afectación o daños a terceros ya sea económica y/o ambientalmente.
5. Teniendo en cuenta que el material no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para la construccion de obras de infraestructura como viviendas, locales comerciales entre otros, no se podrá utilizar para tal fin.

Quien recibe el material se compromete a darle un manejo adecuado al mismo, en su predio sin responsabilidad alguna del CONSORCIO TURQUÍA. El volumen dispuesto es 0,4m3

Se entrega a satisfacción del propietario sin reclamo alguno en tiempos posteriores.

Se firma a los 21 días del mes Febrero de 2023

Betty macea

Nombre y firma de quien recibe.

30576394

Nombre y firma de quien entrega

Cargo: Técnico PGIO

Anexo 17. Informes semanales

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 8/02/2023
HORA: 3:46:43 p. m.
20234300044662

Bogotá D.C, 08 de febrero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 42 periodo del 30 de Enero de 2023 al 05 de febrero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 42 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 30 de enero de 2023 al 06 de febrero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 42; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,



EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** | Fecha **6/01/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	263		78,74%
Días remanentes del Contrato	66		19,76%
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	263		78,74%
Días remanentes del Contrato	66		19,76%
Acumulado a última acta pagada	$ 442.373.612,60		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.658.715.460,52	72,67%	$ 3.316.516.276,96	65,87%	-$ 342.199.183,56	-6,80%
Durante el Periodo	$ 185.976.555,61	3,69%	$ 98.164.806,73	1,95%	-$ 87.811.748,88	-1,74%
Acumulado a la Fecha	$ 3.844.692.016,12	**76,36%**	$ 3.414.681.083,69	**67,82%**	-$ 430.010.932,44	**-8,54%**

Semáforo

Desviación en días: -21 Días

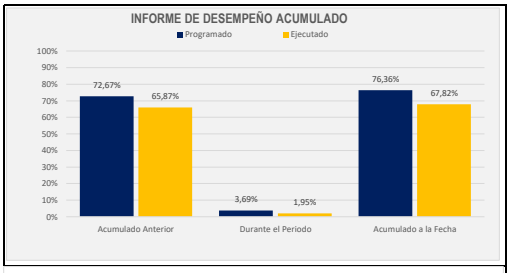

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 496 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 78 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 144 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

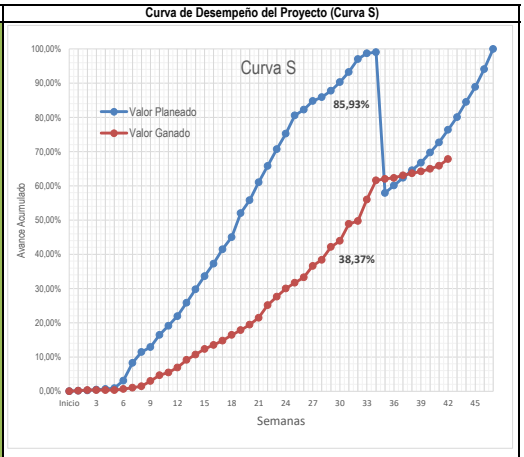

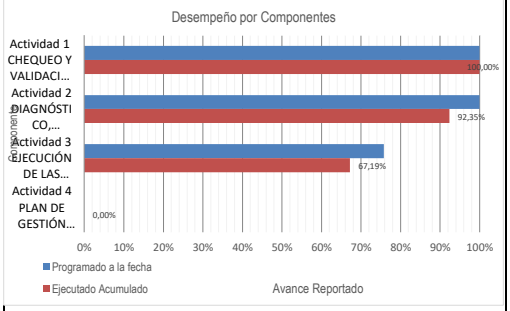

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	72,67%	65,87%	-6,80%	
Durante el Periodo	3,69%	1,95%	-1,74%	
Acumulado a la Fecha	**76,36%**	**67,82%**	**-8,54%**	

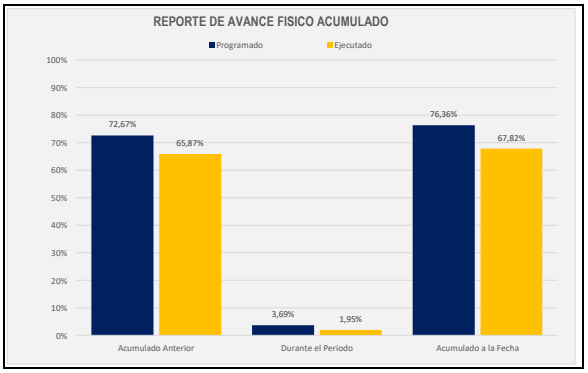


AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
9	$ 442.373.612,60	63,85%	8	$ 339.826.050,90	49,05%	12/12/2022	$ 54.489.396,32







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 496 viviendas, de las cuales 418 están terminadas, 78 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 144 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 500
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 78
Viviendas totales iniciadas: 496

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 02 de febrero de 2023 mediante la comunicación GA-DOMI-276-23 y de acuerdo con el seguimiento realizado por Interventoría a las actividades de ejecución de las obras, se procedió a solicitar un plan de contingencia donde se muestre las acciones correctivas que permitan minimizar el el atraso que ya se presenta en la ejecuccion de la obra.

* El día 30 de enero de 2023 con carta GA-DOMI-272-23, se realizó por Interventoría la reiteración de la solicitud de atención de observaciones emitidas a los paquetes de viviendas terminadas que fueron reconocidas en las actas de recibo parcial de obra de la 1 a 4. Así mismo, se solicitó la entrega de los paquetes de las actas 5 y 6 debidamente suscritas para revisión.

* Con la comunicación GA-DOMI-273-23 del día 30 de enero de 2023 se solicitó al consorcio Turquía remitir el informe mensual No. 9 de obra atendiendo las observaciones emitidas por Interventoría con carta GA-DOMI-260-23 del día 18 de enero de 2023.

* Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha remitido los documentos de la liquidación de la fiducia donde se consignó el valor concerniente al anticipo, se procedió por Interventoría con carta GA-DOMI-274-23 del día 30 de enero de 2023.

* Teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Interventoría con las comunicaciones GA-DOMI-259-23 del día 18 de enero de 2023 y GA-DOMI-270-23 del día 26 de enero de 2023, de las cuales no se ha recibido respuesta por parte del Consorcio Turquía. Se informó nuevamente con carta GA-DOMI-276-23 del día 02 de febrero de 2023 al contratista de obra que conforme a la reprogramación de obra entregada con la comunicación CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022 correspondiente a la prórroga de tres (3) meses otorgada por la Entidad Contratante, a corte al 29 de enero de 2023 se tiene un porcentaje programado de 72,67% y ejecutado de 65,87%, lo cual representa un atraso del 6,80%.

Así mismo, se solicitó tomar las medidas al interior del contratista de obra con el fin de que se incluya mayor personal de mano de obra para la ejecución de las actividades, la apertura de nuevas viviendas que permitan subsanar el atraso y la remisión del plan de contingencia para subsanar el atraso reportado.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 30 de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 30 de enero de 2023 se realizaron cuatro (4) aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M52-VE-377, S-SC-EP-M56-VE-392, S-SC-EP-M63-VE-479 y S-SC-EP-M63-VE-480.
* El día 31 de enero de 2023, el contratista continuó con las actividades de excavaciones para cimentaciones, instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 31 de enero de 2023 no se realizaron aperturas.
* El día 01 de febrero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 01 de febrero de 2023 no se realizaron aperturas.
* El día 02 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 02 de febrero de 2023 no se realizaron aperturas.

* El día 03 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado.
* El día 04 de febrero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. para este día se realizaron treinta y uno (31) aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M09-VE-214, S-SC-EP-M09-VE-219, S-SC-EP-M09-VE-220, S-SC-EP-M52-VE-381, S-SC-EP-M52-VE-383, S-SC-EP-M52-VE-384, S-SC-EP-M52-VE-387, S-SC-EP-M52-VE-388, S-SC-EP-M52-VE-389, S-SC-EP-M63-VE-470, S-SC-EP-M63-VE-471, S-SC-EP-M63-VE-472, S-SC-EP-M63-VE-473, S-SC-EP-M63-VE-475, S-SC-EP-M63-VE-476, S-SC-EP-M63-VE-477, S-SC-EP-M63-VE-478, S-SC-EP-M63-VE-482, S-SC-EP-M63-VE-483, S-SC-EP-M63-VE-485, S-SC-EP-M63-VE-486, S-SC-EP-M63-VE-487, S-SC-EP-M63-VE-488, S-SC-EP-M52-VE-605, S-SC-EP-M68-VE-621, S-SC-EP-M01-VE-645, S-SC-EP-M01-VE-649, S-SC-EP-M63-VE-659, S-SC-EP-M25-VE-670, S-SC-EP-M29-VE-672 y S-SC-EP-M54-VE-686.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	214	0	214	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16j - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepcionó dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote .	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSIÓN AL PCI

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACION DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA










9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 42

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **30/01/2023** al **5/02/2023** Fecha **6/01/2023**

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3
Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 418
Viviendas en ejecución: 78
Viviendas iniciadas: 496

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de cuatrocientos noventa y seis (496) viviendas, de las cuales cuatrocientos dieciocho (418) están terminadas y setenta y ocho (78) en ejecución. En la semana se realizaron 39 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 67,82% y un porcentaje programado acumulado de 76,36%, lo que incide en un retraso del 8,54%. Es importante mencionar que teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Interventoría con las comunicaciones GA-DOMI-259-23 del día 18 de enero de 2023 y GA-DOMI-270-23 del día 26 de enero de 2023, de las cuales no se ha recibido respuesta por parte del Consorcio Turquía. Se informó nuevamente con carta GA-DOMI-276-23 del día 02 de febrero de 2023 al contratista de obra que conforme a la reprogramación de obra entregada se ha aumentado el atraso de la obra respecto a semanas anteriores.

Así mismo, se solicitó tomar las medidas al interior del contratista de obra con el fin de que se incluya mayor personal de mano de obra para la ejecución de las actividades, la apertura de nuevas viviendas que permitan subsanar el atraso y la remisión del plan de contingencia para subsanar el atraso reportado.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 16 de febrero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 43 periodo del 06 de febrero de 2023 al 12 de febrero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 43 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 06 de febrero de 2023 al 12 de febrero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 43; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 17/02/2023
HORA: 8:13:23 a. m.
20234300054082

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** | Fecha **13/02/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577			
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.			
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO**	SUCRE	**MUNICIPIO**	SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1			
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ			
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.			

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días	100,00%	
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	300	89,82%	
Días remanentes del Contrato	28	8,38%	
Acumulado a última acta pagada	$ 2.820.263.489,10		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días	100,00%	
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	300	89,82%	
Días remanentes del Contrato	28	8,38%	
Acumulado a última acta pagada	$ 467.566.163,69		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 3.844.692.016,12	76,36%	$ 3.414.697.645,41	67,82%	-$ 429.994.370,71	-8,54%
Durante el Periodo	$ 185.976.555,61	3,69%	$ 345.728.330,65	6,87%	$ 159.751.775,04	3,17%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.030.668.571,73**	**80,05%**	**$ 3.760.425.976,06**	**74,69%**	**-$ 270.242.595,67**	**-5,37%**

Semáforo

Desviación en días: -13 Días

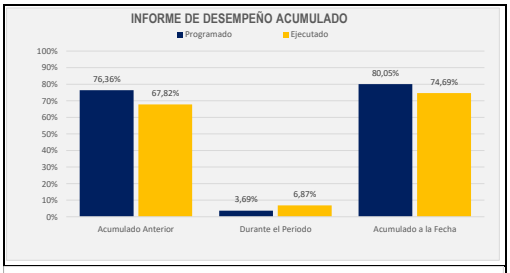

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 532 viviendas, de las cuales 485 están terminadas (65 tienen observaciones postventa),47 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 108 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

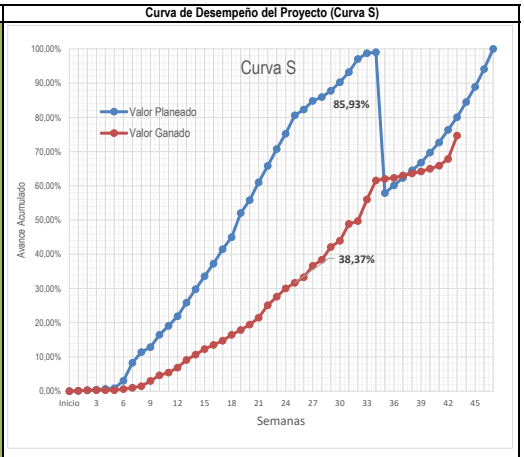

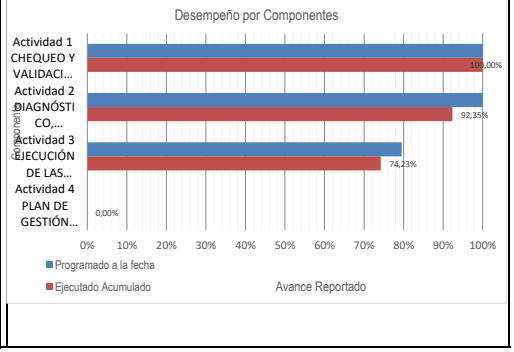

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	76,36%	67,82%	-8,54%	
Durante el Periodo	3,69%	6,87%	3,17%	
Acumulado a la Fecha	**80,05%**	**74,69%**	**-5,37%**	

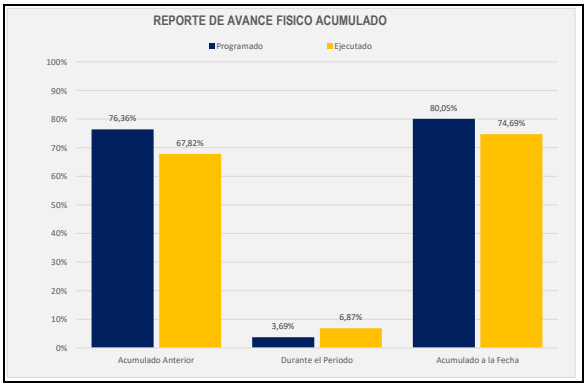

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 841.887.956,54	$ 140.068.257,06

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
10	$ 467.566.163,69	67,49%	9	$ 442.373.612,60	63,85%	27/01/2023	$ 102.547.561,70







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 532 viviendas, de las cuales 485 están terminadas, 47 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 108 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 525
Viviendas terminadas: 485 (65 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 47
Viviendas totales iniciadas: 532

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

* El día 06 de febrero de 2023 el contratista de obra mediante carta CONS-TUR-SINC-182 da respuesta a la solicitud de la interventoría con comunicación GA-DOMI-276-23 el día 02 de febrero, donde se muestra las acciones correctivas que permitan minimizar el atraso en la ejecución de la obra.
* Con la comunicación GA-DOMI-273-23 del día 30 de enero de 2023 se solicitó al consorcio Turquía remitir el informe mensual No. 9 de obra atendiendo las observaciones emitidas por Interventoría con carta GA-DOMI-260-23 del día 18 de enero de 2023.
* Teniendo en cuenta que el contratista de obra no ha remitido los documentos de la liquidación de la fiducia donde se consignó el valor concerniente al anticipo, se procedió por Interventoría con carta GA-DOMI-274-23 del día 30 de enero de 2023.
* El día 10 de febrero de 2023 carta GA-DOMI-281-23 se realizó seguimiento a las actividades de ejecución de las unidades de vivienda de la actividad 3, evidenciado tiempos de intervención mayores a los permitidos contractualmente lo cual se ve reflejando en el atraso de la programación de obra. Por lo tanto, se solicitó al Consorcio Turquía tomar las medidas pertinentes y correctivas por medio de un plan de contingencia que subsane los atrasos reportados en la terminación de las unidades sanitarias en los tiempos, así como también la inclusión de mayores materiales, aperturas de viviendas, mayor personal de mano de obra, entre otros.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 06 febrero de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 05 de febrero no se realizaron aperturas.
* El día 07 de febrero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 07 de febrero de 2023 se realizaron diez (10) aperturas bajo los códigos de: S-SC-EP-M25-VE-094, S-SC-EP-M007-VE-113, S-SC-EP-M12-VE-126, S-SC-EP-M12-VE-223, S-SC-EP-M50-VE-354, S-SC-EP-M52-VE-382, S-SC-EP-M52-VE-385, S-SC-EP-M65-VE-525, S-SC-EP-M71-VE-598, S-SC-EP-M71-VE-599.
* El día 08 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 08 de febrero de 2023 se realizaron once (11)aperturas bajo los códigos: S-SC-EP-M009-VE-165, S-SC-EP-M009-VE-213, S-SC-EP-M009-VE-215, S-SC-EP-M009-VE-216, S-SC-EP-M009-VE-217, S-SC-EP-M009-VE-218, S-SC-EP-M012-VE-227, S-SC-EP-M12-VE-228, S-SC-EP-M38-VE-257, S-SC-EP-M52-VE-386, S-SC-EP-M12-VE-650. Para el día de hoy se realizó recorrido de obra con el director de interventoría con el fin de verificar las unidades sanitaras que están en ejecución.
* El día 09 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 09 de febrero de 2023 no hubo aperturas. En el día de hoy se continúa con el recorrido de obra en compañía del director de interventoria.
* El día 11 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 11 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	214	0	214	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 43

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **6/02/2023** al **12/02/2023** Fecha **13/02/2023**

Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 485 (65 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 47
Viviendas iniciadas: 532

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de quinientos treinta y dos (532) viviendas, de las cuales cuatrocientos ochenta y cinco (485) terminadas (sesenta y cinco (65) tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron 36 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.

A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 74,69% y un porcentaje programado acumulado de 80,05%, lo que incide en un retraso del 5,37%. Es importante mencionar que teniendo en cuenta los requerimientos realizados por la Interventoría con las comunicaciones GA-DOMI-259-23 del día 18 de enero de 2023 y GA-DOMI-270-23 del día 26 de enero de 2023, de las cuales no se ha recibido respuesta por parte del Consorcio Turquía. Se informó nuevamente con carta GA-DOMI-276-23 del día 02 de febrero de 2023 al contratista de obra que conforme a la reprogramación de obra entregada se ha aumentado el atraso de la obra respecto a semanas anteriores.

Así mismo, se solicitó tomar las medidas al interior del contratista de obra con el fin de que se incluya mayor personal de mano de obra para la ejecución de las actividades, la apertura de nuevas viviendas que permitan subsanar el atraso y la remisión del plan de contingencia para subsanar el atraso reportado.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Bogotá D.C, 21 de febrero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 44 periodo del 13 de febrero de 2023 al 19 de febrero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 44 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 13 de febrero de 2023 al 19 de febrero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 44; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,



EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.



INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** | Fecha **20/02/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE — **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.			2220577
Contratista			CONSORCIO TURQUIA
Valor inicial			$ 5.034.941.972,00
Adición No. 1			N/A
Valor actual			$ 5.034.941.972,00
Variación del valor			$ -
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial (Días)			244 Días
Prorroga No. 1			90 Días
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			13/03/2023
Tiempo Transcurrido (días)	307		91,92%
Días remanentes del Contrato	21		6,29%
Acumulado a última acta pagada			$ 3.309.495.698,44
Estimado ejecutado por llevar a acta			$ -

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.			2220585
Interventor			GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.
Valor inicial			$ 542.723.071,00
Adición No. 1			$ 150.072.084,00
Valor actual			$ 692.795.155,00
Variación del valor			$ 150.072.084,00
Fecha de Inicio			13/04/2022
Plazo inicial			244 Días
Prorroga No. 1			90 Días
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo			90 Días
Fecha Contractual de terminación			13/03/2023
Ejecución del Contrato	307		91,92%
Días remanentes del Contrato	21		6,29%
Acumulado a última acta pagada			$ 467.566.163,69
Estimado ejecutado por llevar a acta			$ -

3. ESTADO DEL PROYECTO

INFORME DE DESEMPENO


Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.030.668.571,73	80,05%	$ 3.760.598.158,89	74,69%	-$ 270.070.412,84	-5,36%
Durante el Periodo	$ 223.171.866,73	4,43%	$ 84.569.299,94	1,68%	-$ 138.602.566,79	-2,75%
Acumulado a la Fecha	**$ 4.253.840.438,45**	**84,49%**	**$ 3.845.167.458,83**	**76,37%**	**-$ 408.672.979,63**	**-8,12%**

Semáforo

Desviación en días

-20 Días

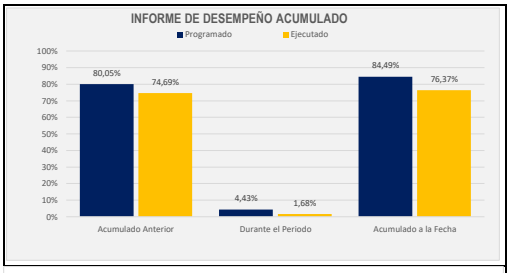

Observaciones al desempeño del proyecto


** **Actividad 1.** Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del día 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


** **Actividad 2.** Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

** **Actividad 3.** A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 557 viviendas, de las cuales 485 están terminadas (65 tienen observaciones postventa),72 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 83 para inicio de actividades.*

** **Actividad 4.** Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

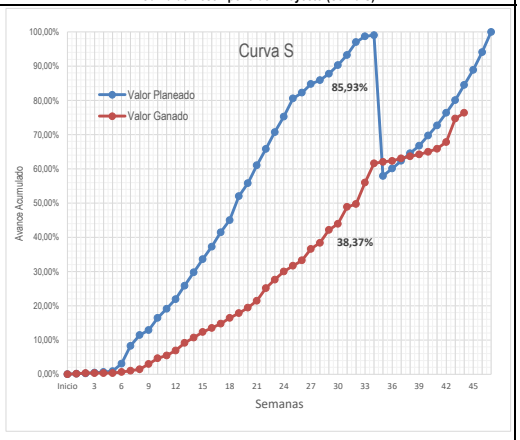

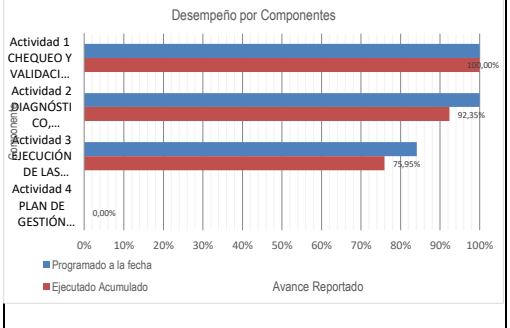

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquia con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	80,05%	74,69%	-5,36%	
Durante el Periodo	4,43%	1,68%	-2,75%	
Acumulado a la Fecha	**84,49%**	**76,37%**	**-8,12%**	

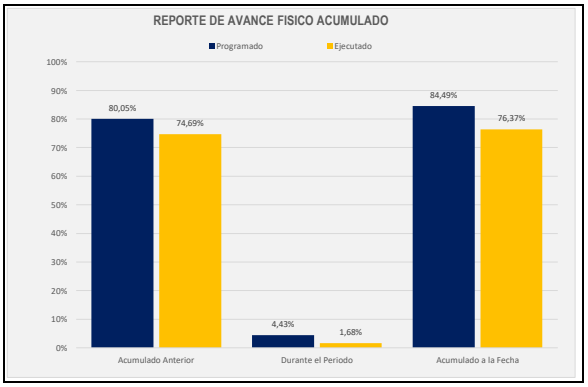

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 948.157.662,18	$ 33.798.551,42

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
7	$ 3.309.495.698,44	65,73%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
10	$ 467.566.163,69	67,49%	9	$ 442.373.612,60	63,85%	27/01/2023	$ 102.547.561,70







INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 557 viviendas, de las cuales 485 están terminadas, 72 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 83 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 555
Viviendas terminadas: 485 (65 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 72
Viviendas totales iniciadas: 557

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

*El día viernes 17 de febrero de 2023 se llevó a cabo el mite de seguimiento del proyecto de conexiones intradomiciliarias, donde el contratista ha reiterado la necesitas de una prórroga del contrato por dos meses para logara así la culminación de las actividades dd el mismo

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 13 febrero de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 13 de febrero no se realizaron aperturas.

* El día 14 de febrero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 14 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

* El día 15 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 15 de febrero de 2023 no se realizaron aperturas

* El día 16 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 16 de febrero de 2023 hubo aperturas once (11) bajo los codigos: S-SC-EP-M32-VE-091, S-SC-EP-M043-VE-286, S-SC-EP-M043-VE-289, S-SC-EP-M043-VE-290, S-SC-EP-M043-VE-291, S-SC-EP-M043-VE-292, S-SC-EP-M043-VE-293, S-SC-EP-M46-VE-315, S-SC-EP-M46-VE-316, S-SC-EP-M46-VE-317, S-SC-EP-M46-VE-318.

* El día 17 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 17 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

* El día 18 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 18 de febrero de 2023 hubo catorce (14) aperturas S-SC-EP-M46-VE-319, S-SC-EP-M46-VE-320, S-SC-EP-M46-VE-321, S-SC-EP-M46-VE-322, S-SC-EP-M46-VE-323, S-SC-EP-M46-VE-324, S-SC-EP-M46-VE-325, S-SC-EP-M46-VE-326, S-SC-EP-M45-VE-329, S-SC-EP-M45-VE-330, S-SC-EP-M45-VE-331, S-SC-EP-M45-VE-333, S-SC-EP-M45-VE-340, S-SC-EP-M45-VE-681.


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	214	0	214	100,00%



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por	Fecha		Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello	20 mayo del 2022		El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta	25 mayo del 2022		El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A	26 mayo del 2022		El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco	27 mayo del 2022		El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez	31 mayo del 2022		El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Marina Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomicilianas de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **13/02/2023** al **19/02/2023** Fecha **20/02/2023**

Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 485 (65 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 72
Viviendas iniciadas: 557

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de quinientos treinta y dos (557) viviendas, de las cuales cuatrocientos ochenta y cinco (485) terminadas (sesenta y cinco (65) tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron 25 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.
A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 76,37% y un porcentaje programado acumulado de 84,49%, lo que incide en un retraso del 8,12%. Es importante mencionar que la interventoría con las comunicaciones GA-DOMI-259-23 del 18 de enero de 2023, GA-DOMI-270-23 del 26 de enero de 2023, GA-DOMI-276-23 del 02 de febrero de 2023, GA-DOMI-281-23 del 10 de febrero de 2023 y GA-DOMI-286-23 del 16 de febrero de 2023, se solicitó al contratista de obra implementar un plan de contingencia y aumentar el personal de obra, con el fin de mitigar el atraso que se presenta a la fecha
Así mismo, se solicitó tomar las medidas al interior del contratista de obra con el fin de que se incluya mayor personal de mano de obra para la ejecución de las actividades, la apertura de nuevas viviendas que permitan subsanar el atraso y la remisión del plan de contingencia para subsanar el atraso reportado.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	**Firma**	**Firma**
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría



Bogotá D.C, 28 de febrero de 2023

Señor
JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
Supervisor
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio
Calle 26 N°. 13-19
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría N°. 2220585 "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre"**

Asunto: **Remisión Informe Semanal No. 45 periodo del 20 de febrero de 2023 al 26 de febrero de 2023**

Apreciado señor,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, anexo, se remite el informe semanal de Interventoría No. 45 del contrato de la referencia para el período comprendido entre el 20 de febrero de 2023 al 26 de febrero de 2023.

Anexo se remite como soporte al Informe Semanal N°. 45; bitácora de obra, Lista de chequeo seguimiento estado de salud de Interventoría y Obra, Informe social, Resumen de avance y Matriz Tres Momentos.

Cordialmente,

EDGAR ALFONSO ARAGÓN OTERO
Director de Interventoría
Anexos: Lo enunciado en treinta y ocho (38) folios y archivos en magnético.
C.C.: Ing. Juan David Amón – Supervisor del contrato Convenio Inter administrativo 221005; Enterritorio.
Archivo.
Elaboró: A.P.
Revisó: EAO.

INFORME SEMANAL

Cra. 48 No. 101A – 29 Bogotá, Colombia Tel: (57 1) 236 7974 – 621 5383
E-mail: info@gavinco.com www.gavinco.com

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** | Fecha **28/02/2023**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

código PROYECTO	2220577
OBJETO DEL PROYECTO	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** SUCRE — **MUNICIPIO** SINCELEJO
GERENCIA A CARGO	GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1
SUPERVISOR	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
ESTADO DEL PROYECTO	En ejecución.

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220577		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA		
Valor inicial	$ 5.034.941.972,00		
Adición No. 1	N/A		
Valor actual	$ 5.034.941.972,00		
Variación del valor	$ -		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial (Días)	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual (Días)	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Tiempo Transcurrido (días)	317		94,91%
Días remanentes del Contrato	13		3,89%
Acumulado a última acta pagada	$ 3.309.495.698,44		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

2.2 CONTRATO DE Interventoría

Contrato No.	2220585		
Interventor	GAVINCO Ingenieros Consultores S.A.S.		
Valor inicial	$ 542.723.071,00		
Adición No. 1	$ 150.072.084,00		
Valor actual	$ 692.795.155,00		
Variación del valor	$ 150.072.084,00		
Fecha de Inicio	13/04/2022		
Plazo inicial	244 Días		
Prorroga No. 1	90 Días		
Plazo actual	334 Días		100,00%
Variación en plazo	90 Días		
Fecha Contractual de terminación	13/03/2023		
Ejecución del Contrato	317		94,91%
Días remanentes del Contrato	13		3,89%
Acumulado a última acta pagada	$ 467.566.163,69		
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ -		

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPENO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 5.034.941.972,00

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 4.253.840.438,45	84,49%	$ 3.845.185.184,02	76,37%	-$ 408.655.254,44	-8,12%
Durante el Periodo	$ 223.171.866,73	4,43%	$ 131.989.257,38	2,62%	-$ 91.182.609,35	-1,81%
Acumulado a la Fecha	$ 4.477.012.305,18	88,92%	$ 3.977.174.441,40	78,99%	-$ 499.837.863,78	-9,93%

Semáforo

Desviación en días: -24 Días

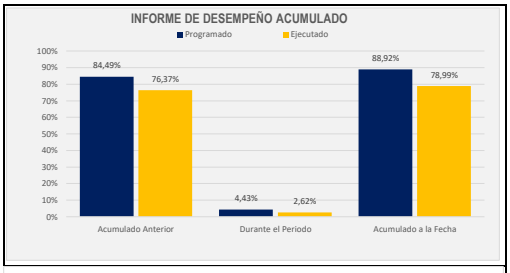

Observaciones al desempeño del proyecto


Actividad 1. *Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquia. Aprobado por interventoria con cartas GA-DOMI-040-22 del dia 31 de mayo de 2022 y radicado en ENTERRITORIO bajo el N°. 20224300206752 y GA-DOMI-030-22 radicado N°. 20224300189742.*


Actividad 2. *Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoria, por el Contratista de obra, un total de 64 4 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Hay 46 diagnósticos no efectivos y Tres (3) renuncias.*

Actividad 3. *A corte de este informe el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 570 viviendas, de las cuales 485 están terminadas (55 tienen observaciones postventa),85 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 70 para inicio de actividades.*

Actividad 4. *Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas, y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.*

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)

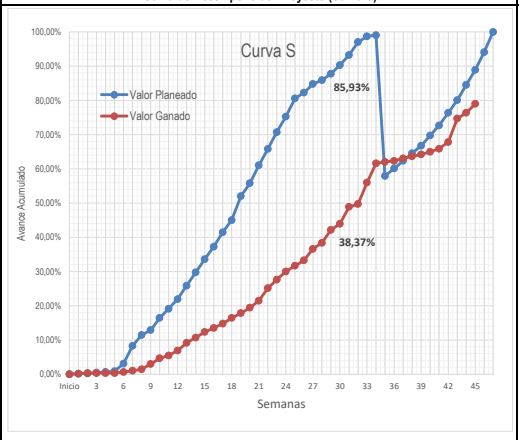

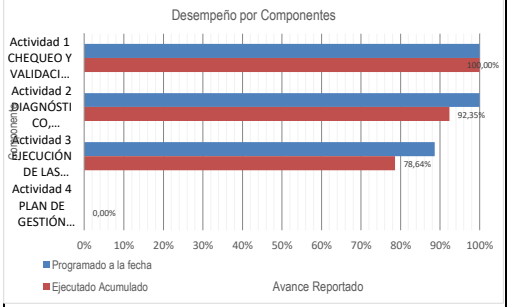

CONTROL DE CAMBIOS A LAS LÍNEAS BASE


DESCRIBA LOS CONTROLES CAMBIO QUE SE PUDIERON DAR EN EL PERIODO A LAS LÍNEAS BASE DEL PROYECTO (ALCANCE, TIEMPO Y COSTO)

* Se ajusta la curva S del proyecto conforme a la capacitación dada el 28 de abril de 2022 por parte del supervisor de ENTERRITORIO.
* La Entidad mediante la suscripción del Modificatorio No. 1 del 13 de diciembre de 2022 se da aval a ampliar el plazo de la ejecución de las obras hasta el día 13 de marzo de 2023, tiempo que no generará costos adicionales a la Entidad y el contratista de obra asume el costo de mayor permanencia de Interventoría. Por consiguiente se realiza el ajuste de la curva S de las actividades de obra conforme a la reprogramacion realizada por el Consorcio Turquía con carta CONS-TUR-SINC-163 del 21 de noviembre de 2022, la cual fue revisada por Interventoría y avalada con la comunicación GA-DOMI-217-22 del día 25 de noviembre de 2022 radicado No. 20224300453802.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	84,49%	76,37%	-8,12%	
Durante el Periodo	4,43%	2,62%	-1,81%	
Acumulado a la Fecha	**88,92%**	**78,99%**	**-9,93%**	

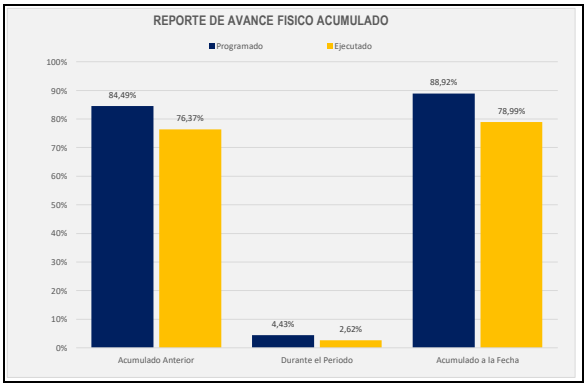

AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 5.034.941.972,00	$ 5.034.941.972,00	$ -	$ 981.956.213,60	$ 948.157.662,18	$ 33.798.551,42

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
7	$ 3.309.495.698,44	65,73%	6	$ 2.820.263.489,10	56,01%	9/12/2022	$ 769.913.798,72









AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 542.723.071,00	$ 692.795.155,00	$ 150.072.084,00	N/A	N/A	N/A

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
10	$ 467.566.163,69	67,49%	9	$ 442.373.612,60	63,85%	27/01/2023	$ 102.547.561,70







enterritorio	**INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA APROBADO.

* Actividad 1. Chequeo y Validación de Diseños de los Prototipos según norma NSR-10, se presenta un porcentaje programado acumulado de 100% y ejecutado acumulado de 100%, el producto de chequeo y validación de los prototipos de unidades sanitarias entregado por el Contratista Consorcio Turquía.

* Actividad 2. Se han realizado un total de 693 visitas a las viviendas priorizadas para la ejecución de los diagnósticos en el barrio El Poblado, con el fin de evidenciar si son efectivas para el programa de conexiones intradomiciliaria; a la fecha de corte del informe semanal se han presentado a esta Interventoría, por el Contratista de obra, un total de 644 diagnósticos, de los cuales se han aprobado 640 diagnósticos acumulados. Está pendiente de atención de observaciones de 3 diagnóstico y uno (1) por realizar la visita para diagnosticar la vivienda. De acuerdo al informe técnico entregado por el FOVIS de las manzanas 40A, 38A Y 38, hay once (11) diagnósticos que pasarían a ser no efectivos ya que las viviendas se encuentran en zona de riesgo, por lo tanto, el total de diagnósticos no efectivos se eleva a 46 y tres (3) renuncias.

* Actividad 3. A corte de este informe, el contratista de obra cuenta con el inicio de actividades en 570 viviendas, de las cuales 485 están terminadas, 85 en intervención y con un potencial con visto bueno de los diagnósticos de 70 para inicio de actividades.

* Actividad 4. Se ha realizado acompañamiento a las actividades programadas de diagnósticos de las viviendas priorizadas y se han realizado reuniones sectorizadas con el fin de brindar información a los beneficiarios acerca del Programa de Conexiones Intradomiciliaria en el barrio El Poblado.

Actividad 2.

Diagnósticos programación inicial: 693
Diagnósticos reprogramación: 693
Diagnósticos Aprobados acumulados: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas efectivas: 644
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

Actividad 3.

Viviendas programación inicial: 693
Viviendas reprogramación: 585
Viviendas terminadas: 485 (55 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 85
Viviendas totales iniciadas: 570

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

*El día viernes 24 de febrero de 2023 se llevó a cabo el mite de seguimiento del proyecto de conexiones intradomiciliarias, donde el contratista donde se comunica que no habra adicion del contrato pero una prorroga de mes y medio para poder culminar con las metas trazadas.

ACTIVIDADES EN CAMPO

* El día 20 febrero de enero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 20 de febrero no se realizaron aperturas.

* El día 21 de febrero de 2023, el contratista continuó con las actividades de instalación de tubería sanitaria, pañete interno y externo, levante de muros y fundida de vigas de las viviendas en intervención, instalación de enchape, pintura y atendiendo detalles de la casetas terminadas. El 21 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

* El día 22 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 22 de febrero de 2023 no se realizaron aperturas

* El día 23 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 23 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

* El día 24 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 24 de febrero de 2023 no hubo aperturas.

* El día 25 de febrero de 2023, el Contratista de Obra continuó con las actividades de excavación de zanjas para tuberías sanitaria, instalación de registros sanitarios, levante de muros, fundida de machones, excavación de cimentaciones, fundida de plantilla, armado de acero para las columnas, vigas y cimentaciones. El contratista continuo con la subsanación de detalles conforme las observaciones emitidas por esta Interventoría que permitan el recibo a satisfacción de los beneficiarios del barrio El Poblado. El día 25 de febrero de 2023 hubo trece (13) aperturas bajo los codigos: S-SC-EP-M09-VE-102, S-SC-EP-M013-VE-147, S-SC-EP-M13-VE-149, S-SC-EP-M13-VE-150, S-SC-EP-M10-VE-153, S-SC-EP-M10-VE-154, S-SC-EP-M10-VE-155, S-SC-EP-M10-VE-156, S-SC-EP-M10-VE-157, S-SC-EP-M38-VE-191, S-SC-EP-M12-VE-221, S-SC-EP-M41-VE-281, S-SC-EP-M52-VE-684.

ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

* Se continuará con la intervención de las viviendas en el barrio El Poblado en Sincelejo Sucre.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTION SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	155	0	155	72,4%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	35	0	35	16,4%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	8	0	8	3,7%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cuál? Orden público	16	0	16	7,5%
	Total	**214**	**0**	**214**	**100,00%**



En la semana no se presentaron lluvias.

GESTION SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
Tipología PQR	Radicado por		Fecha	Asunto	Dirigido a	Respuesta Alcaldía / FOVIS
Inclusión	No. de PQR 1 Yessica Cantello		20 mayo del 2022	El/La señor(a) Yessica Cantello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 2 Betilda Gonzales		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Betilda Gonzales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 40 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 3 Luz Dary Ruiz		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 4 Jorge Guerra Arrieta		25 mayo del 2022	El/La señor(a) Jorge Guerra Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45a 16i - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 5 Emir Elias Pren M		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Emir Elias Pren M solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 15 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 6 Andrea Beltran Vides		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Andrea Beltran Vides solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 4 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 7 Jader Perez Molina		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Jader Perez Molina solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17e 45 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 8 Oscar Gamarro		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Oscar Gamarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 50 - lote 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 9 Manuel Mercado A		26 mayo del 2022	El/La señor(a) Manuel Mercado A solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17d 45 -06.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 10 Humberto Atencia Sierra		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Humberto Atencia Sierra solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 62 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 11 Erika Blanco		27 mayo del 2022	El/La señor(a) Erika Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	El contratista reliza el cierre d ela solicitud teniendo en cuenta el concepto del FOVIS,
Inclusión	No. de PQR 12 Yuris Paola Suarez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Yuris Paola Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 38 lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	zona de riesgo.El predio tiene un area dentro de la vivienda que presenta
Inclusión	No. de PQR 13 Katerine Benitez Villalba		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Katerine Benitez Villalba solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 50 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 14 Jose Joaquin Florez		31 mayo del 2022	El/La señor(a) Jose Joaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 15 Ana Isabel Florez	31 mayo del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 16 Marileys Molina Alvarado	01 junio del 2022	El/La señor(a) Marileys Molina Alvarado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 17 Jeraldine Yepe Lasmar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Jeraldine Yepe Lasmar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 18 Enna Maria Lamar	01 junio del 2022	El/La señor(a) Enna Maria Lamar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 64 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 19 Nauded Alvarez Maurez	02 junio del 2022	El/La señor(a) Nauded Alvarez Maurez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 20 Henoc Jose Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Henoc Jose Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 F 45- 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 21 Brenda Galvan Mercado	03 junio del 2022	El/La señor(a) Brenda Galvan Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 61 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 22 Sindy Rodriguez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Sindy Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 23 Luz Dary Martinez	03 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Dary Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 24 Jose Juaquin Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Juaquin Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 1.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 25 Ana Milena Vergara	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Milena Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 20 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 26 Maria Alejandra Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Alejandra Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 27 Oswaldo jimenez Ramirez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Oswaldo jimenez Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 21 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 28 Hernan Jimenez Marin	06 junio del 2022	El/La señor(a) Hernan Jimenez Marin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 14 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 29 Carmen Carpintero	06 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 30 Ana Isabel Florez	06 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Isabel Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 22 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	Cabe aclarar que la PQR # 30 se recepciono dos veces, a nombre de la
Inclusión	No. de PQR 31 Edilma Torres	06 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 45 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 32 Silvio David Morelo	06 junio del 2022	El/La señor(a) Silvio David Morelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 57 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 33 Norelis Zabaleta	06 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Zabaleta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección MZ 59 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 34 Darin Blanco Fuentes	6 junio del 2022	El/La señor(a) Darin Blanco Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	definir con planeacion si esta en zona de riesgo.
Inclusión	No. de PQR 35 Deivi Jose Miranda	8 junio del 2022	El/La señor(a) Deivi Jose Miranda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 68 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 36 Gertrudis Lopez Herazo	8 junio del 2022	El/La señor(a) Gertrudis Lopez Herazo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 37 Sandra Cruz Peña	10 junio del 2022	El/La señor(a) Sandra Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 73.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 38 Gina Salcedo Ruiz	10 junio del 2022	El/La señor(a) Gina Salcedo Ruiz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 39 Yesica Cabrera Lora	10 junio del 2022	El/La señor(a) Yesica Cabrera Lora solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 40 Walter Arrieta	10 junio del 2022	El/La señor(a) Walter Arrieta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 41 Ana Luisa Contreras	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Luisa Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45 - 32.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 42 Andres Bruno Benavidez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Bruno Benavidez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 21.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 43 Bertina Montes	15 junio del 2022	El/La señor(a) Bertina Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 39 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 44 Emistocle Bertel Avila	15 junio del 2022	El/La señor(a) Emistocle Bertel Avila solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 14.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 45 Griseida Arrieta Betin	15 junio del 2022	El/La señor(a) Griseida Arrieta Betin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 53 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 46 Nadin Carvajal	15 junio del 2022	El/La señor(a) Nadin Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 47 Carmen Carpintero	15 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Carpintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 48 Martha Regino Herrera	15 junio del 2022	El/La señor(a) Martha Regino Herrera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 2 - lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 49 Blanca Avilez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Blanca Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 50 Luz Marina Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Manna Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 46 - lote 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 51 Gabriel Julio Pacheco	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Julio Pacheco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 43 - lote 15.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 52 Luis rodriguez Rivero	16 junio del 2022	El/La señor(a) Luis rodriguez Rivero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 48.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 53 Maria Monroy	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Monroy solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 54 Dani Velazquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Dani Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 55 Edith Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 9.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 56 Maryiris Navarro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Maryiris Navarro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 57 Santiago Troncoso Reyes	16 junio del 2022	El/La señor(a) Santiago Troncoso Reyes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45A - 157.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 58 Milagro Niebles Castro	16 junio del 2022	El/La señor(a) Milagro Niebles Castro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 28 - lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 59 Elena Peña Pineda	16 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Peña Pineda solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 60 Ever Luis Marquez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ever Luis Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 121.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 61 Ramona Rosa Diaz	16 junio del 2022	El/La señor(a) Ramona Rosa Diaz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 42 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 62 Andres Murillo Perez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Andres Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 54 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 63 Heriberto Fernandez Lopez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Heriberto Fernandez Lopez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 17A 45B 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 64 Gabriel Gonzalez	16 junio del 2022	El/La señor(a) Gabriel Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16I 45C 74.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 65 Denys Herrera Alvarez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Denys Herrera Alvarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 66 Alicia Conde Morales	16 junio del 2022	El/La señor(a) Alicia Conde Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16I 45 A 65.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 67 Gregoria Marzan Solar	17 junio del 2022	El/La señor(a) Gregoria Marzan Solar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 01.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 68 Lina Martinez Zuñiga	17 junio del 2022	El/La señor(a) Lina Martinez Zuñiga solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 69 Carmerlo Castro Novoa	17 junio del 2022	El/La señor(a) Carmerlo Castro Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 48 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 70 Nicolasa Padilla	17 junio del 2022	El/La señor(a) Nicolasa Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 20A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 71 Jose Miguel Lopez Bravo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Miguel Lopez Bravo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 59 - lote 20.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 72 Vicente Villamizar Campo	17 junio del 2022	El/La señor(a) Vicente Villamizar Campo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 73 Ely Causil Martinez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Ely Causil Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 51 - lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 74 Padro Ramos	17 junio del 2022	El/La señor(a) Padro Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 75 Dagoberto Mendoza Mercado	17 junio del 2022	El/La señor(a) Dagoberto Mendoza Mercado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 58 - lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	PRESENTA RIESGO POR DESLIZAMIENTO , NO CUMPLE CON
Inclusión	No. de PQR 76 Iris Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 7.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 77 Maria Carlota Menco	17 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Carlota Menco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 78 Iris Murillo Perez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Iris Murillo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 79 Edilsa Soto Florez	17 junio del 2022	El/La señor(a) Edilsa Soto Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 80 Alejandra Loaiza Corrales	17 junio del 2022	El/La señor(a) Alejandra Loaiza Corrales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 29 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 81 Grey Montes Rodriguez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Grey Montes Rodriguez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 82 Marlenys arroyo Quintero	21 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenys arroyo Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 47 - lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 83 Rodolfo Gonzalez	21 junio del 2022	El/La señor(a) Rodolfo Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 41 - lote 38.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 84 Elida Pinto Morales	21 junio del 2022	El/La señor(a) Elida Pinto Morales solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 85 Nelfi Calle Mejia	21 junio del 2022	El/La señor(a) Nelfi Calle Mejia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 86 Jorge Ramos Osorio	21 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Ramos Osorio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 40 - lote 8.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 87 Manuel Solano Almario	21 junio del 2022	El/La señor(a) Manuel Solano Almario solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 88 Carmen Perez Contreras	21 junio del 2022	El/La señor(a) Carmen Perez Contreras solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 45.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 89 Estefany Buelvas	21 junio del 2022	El/La señor(a) Estefany Buelvas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 22 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 90 Omaida Villadiego	22 junio de(2022	El/La señor(a) Omaida Villadiego solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 41.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 91 Rosa Isabel Alba Llanares	22 junio de(2022	El/La señor(a) Rosa Isabel Alba Llanares solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 92 Carmen Arroyo Ramos	22 junio de(2022	El/La señor(a) Carmen Arroyo Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 28.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 93 Alvaro Macea Rivera	22 junio de(2022	El/La señor(a) Alvaro Macea Rivera solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 12 - lote 16.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 94 Maria Quiroz Goez	23 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Quiroz Goez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrea 17f 45B - 29.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 95 Luis Alberto Quiroz	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Alberto Quiroz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 64 - lote 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 96 Aracelis Zuñiga Salcedo	23 junio del 2022	El/La señor(a) Aracelis Zuñiga Salcedo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 59.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 97 Luz Velazquez Villareal	23 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Velazquez Villareal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 60 - lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 98 Luis Felipe Galeano	24 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Felipe Galeano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 99 Rosalba Barragan Barbosa	24 junio del 2022	El/La señor(a) Rosalba Barragan Barbosa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 100 Teresa Santana Peralta	24 junio del 2022	El/La señor(a) Teresa Santana Peralta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45A - 46.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 101 Etelvina Lobo Cuello	24 junio del 2022	El/La señor(a) Etelvina Lobo Cuello solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 38 - lote 2.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 102 Maria Gonzalez	24 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 16 - lote	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 103 Elena Perez Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Elena Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 104 Edith Quintero	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edith Quintero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 31 - lote 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 105 Edilma Gonzalez	27 junio del 2022	El/La señor(a) Edilma Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C 53.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 106 Karen Campo Cruz	27 junio del 2022	El/La señor(a) Karen Campo Cruz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16c 46B - 69.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 107 Libia Solar Orozco	27 junio del 2022	El/La señor(a) Libia Solar Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 108 Irma Baquero Fuentes	27 junio del 2022	El/La señor(a) Irma Baquero Fuentes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 -19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 109 Yuliet Perez Mendoza	27 junio del 2022	El/La señor(a) Yuliet Perez Mendoza solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 - 16C - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 110 Ibeth Vergara	29 junio del 2022	El/La señor(a) Ibeth Vergara solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 19A - lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 111 Josefa Lazo Solano	29 junio del 2022	El/La señor(a) Josefa Lazo Solano solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 112 Grisela Videz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Grisela Videz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 36.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 113 Juan Velazquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Velazquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 60.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 114 Inogenes Carmona	29 junio del 2022	El/La señor(a) Inogenes Carmona solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46C - 52.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 115 Jesus Beltran Franco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jesus Beltran Franco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16B 46A - 51.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 116 Marina Benitez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marina Benitez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 117 Jorge Hoyos Otero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Hoyos Otero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 12.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 118 Yasmira Tovar Aguas	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yasmira Tovar Aguas solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 119 Yerlis Salas Tovar	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Salas Tovar solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 84.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 120 Jose Peñate Orozco	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Peñate Orozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 121 Jorge Petro	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jorge Petro solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C 66.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 122 Francisco Romero	29 junio del 2022	El/La señor(a) Francisco Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46 - 37.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 123 Luz Pajaro Garcia	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pajaro Garcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 55.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 124 Marlenis Delgado	29 junio del 2022	El/La señor(a) Marlenis Delgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 72.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 125 Miguel Galindo	28 junio del 2022	El/La señor(a) Miguel Galindo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 40.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 126 Rubiela Gonzalez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Rubiela Gonzalez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 48 B - 81.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 127 Norelis Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 55 - lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 128 Nohelia Noriega Ramirez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Nohelia Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Mz 6 - lote 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 129 Esmeralda Marquez	28 junio del 2022	El/La señor(a) Esmeralda Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 130 Gil Blanco Yubis	28 junio del 2022	El/La señor(a) Gil Blanco Yubis solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 23.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 131 Adis Arias Carvajal	29 junio del 2022	El/La señor(a) Adis Arias Carvajal solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 76.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 132 Jaime Galindo Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime Galindo Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 54.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

Inclusión	No. de PQR 133 Luisa Noriega Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Luisa Noriega Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 134 Silvia Ramirez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Silvia Ramirez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 6 - Lote 34.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 135 Vianey Pelaez Vasquez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Vianey Pelaez Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 145C - 62.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 136 Yalitza Meza Montes	29 junio del 2022	El/La señor(a) Yalitza Meza Montes solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 47.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 137 Fredy Florian Pornnefz	29 junio del 2022	El/La señor(a) Fredy Florian Pornnefz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16J 45A - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 138 Segundo Novoa	29 junio del 2022	El/La señor(a) Segundo Novoa solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 35 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 139 Eduardo de Hoyo	29 junio del 2022	El/La señor(a) Eduardo de Hoyo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 140 Nohemi Perez	29 junio del 2022	El/La señor(a) Nohemi Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 47 - 49.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 141 Yeline Molina Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeline Molina Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 45 - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 142 Yeison Ozuna Jimenez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yeison Ozuna Jimenez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 11 - Lote 10.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 143 Henry Contrera Rios	30 junio del 2022	El/La señor(a) Henry Contrera Rios solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 04.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 144 Dorys Yepez Suarez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dorys Yepez Suarez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17D 45 - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 145 Jaime de Avila Syago	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jaime de Avila Syago solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17E 45B - 11.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 146 Hernando Trujillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Hernando Trujillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 30.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 147 Karina Marrugo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karina Marrugo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 78.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 148 Elisena Solar Orrozco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elisena Solar Orrozco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 149 Bilma Salgado	30 junio del 2022	El/La señor(a) Bilma Salgado solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45B - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 150 Luz Fernandez Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Fernandez Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 50.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 151 Keider Avilez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keider Avilez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45B - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 152 Rafael Bertel Bertel	30 junio del 2022	El/La señor(a) Rafael Bertel Bertel solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 27.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 153 Luz Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 43 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 154 Karol Pacheco Blanco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Karol Pacheco Blanco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17A 45B - 136.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 155 Pabla Teran Romerin	30 junio del 2022	El/La señor(a) Pabla Teran Romerin solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16H 45 - 22.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 156 Yadira Basilio Castillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yadira Basilio Castillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46a - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 157 Marqueza Padilla	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marqueza Padilla solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 36 - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 158 Ruth Perez Perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ruth Perez Perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46C - 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 159 Jose Carey Julio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Carey Julio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46A - 90.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 160 Maria Manjarrez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Maria Manjarrez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 47 16C - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 161 Marleidis Bolaño	30 junio del 2022	El/La señor(a) Marleidis Bolaño solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 162 Luis Manuel Murillo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Manuel Murillo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 3.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 163 Juan Perez Muslaco	30 junio del 2022	El/La señor(a) Juan Perez Muslaco solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 46A - 99.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 164 Keila Marquez Acosta	30 junio del 2022	El/La señor(a) Keila Marquez Acosta solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 33 - Lote 3A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 165 Nalfis Marquez David	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nalfis Marquez David solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 19.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 166 Yorlenis Tapia Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yorlenis Tapia Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18A - Lote 6.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 167 Ana Maria Tamara Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Maria Tamara Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46C - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 168 Elkin Zabala Vasquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Elkin Zabala Vasquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 46A - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 169 Eder Hurtado Carpio	30 junio del 2022	El/La señor(a) Eder Hurtado Carpio solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 03.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 170 Dionicio Nieto	30 junio del 2022	El/La señor(a) Dionicio Nieto solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 8 - Lote 5.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 171 Nerys Cruz Peña	30 junio del 2022	El/La señor(a) Nerys Cruz Peña solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 45A - 39.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 172 Consuelo Florez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Consuelo Florez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17F 45B - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 173 Yonadis Tapias	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yonadis Tapias solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 16 - Lote 24.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 174 Jose Banquet perez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jose Banquet perez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 34 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 175 Alma Almentero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alma Almentero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 176 Luz Estela Escorcia	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luz Estela Escorcia solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17 A 45A - 58.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 177 Celia Vega Torres	30 junio del 2022	El/La señor(a) Celia Vega Torres solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 136 - Lote 17.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 178 Norelis Ortiz Rodelo	30 junio del 2022	El/La señor(a) Norelis Ortiz Rodelo solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16B 47 - 42.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 179 Luis Julio Romero	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Julio Romero solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 48 - Lote 4.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 180 Carmelina Gomez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Carmelina Gomez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 64 - Lote 29A.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 181 Yerlis Muñoz	30 junio del 2022	El/La señor(a) Yerlis Muñoz solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 17H 45A - 35.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 182 Andry Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Andry Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16E 46 - 18.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 183 Emid Vega Bula	30 junio del 2022	El/La señor(a) Emid Vega Bula solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Manzana 18 - Lote 13.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 184 Jhon Peña Ramos	30 junio del 2022	El/La señor(a) Jhon Peña Ramos solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16G 45C - 07.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 185 Alfonso Dieteben Ortega	30 junio del 2022	El/La señor(a) Alfonso Dieteben Ortega solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45A - 114.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 186 Luis Rosario Marquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Luis Rosario Marquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16A 47 - 31.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 187 Frank Martinez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Frank Martinez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección carrera 16G 48A - 111.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	NO CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE FOCALIZACION DEL PCI
Inclusión	No. de PQR 188 Ana Delgado Bohorquez	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Delgado Bohorquez solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 46B - 33.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 189 Ana Sofia Beltran	30 junio del 2022	El/La señor(a) Ana Sofia Beltran solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Calle 45A 16G - 05.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI
Inclusión	No. de PQR 190 Etilsa Suarez Ciprian	30 junio del 2022	El/La señor(a) Etilsa Suarez Ciprian solicitó la inclusion al programa de conexiones intradomiciliarias de la vivienda ubicada en la Dirección Carrera 16C 45C - 43.	Area técnica del contratista Consorcio Turquía.	VIVIENDA APROBADA PARA INCLUSION AL PCI

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

7. PROBLEMATICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATEGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA
Atraso en las actividades de ejecución de obra	Plan de contingencia	Teniendo en cuenta los atrasos que se presentaban en obra, se dio inicio al proceso de incumplimiento al Consorcio Turquía mediante mesa de trabajo del 21 de noviembre de 2022.	Consorcio Turquía	Plan de contingencia carta CONS-TUR-SINC-045 Actualización Plan de Contingencia GA-DOMI-071-22 Mesa de trabajo con aseguradora y aprobacion de modificatorio No. 01 del contrato de obra, mediante el cuals e prorroga por tres (3) meses más, es decir hasta el 13/03/2023.	13/12/2022
Mal estado de vías de acceso.	Solicitud adecuación de vías por parte de Alcaldía.	* Teniendo en cuenta la reunión realizada el día 31 de mayo de 2022 se concertó con la Alcaldía, a través del Ministerio de Vivienda, la disponibilidad de la maquinaria para llevar a cabo las adecuaciones de las vías de acceso al barrio El Poblado.	Alcaldía Sincelejo	El 22 de junio 2022 hizo presencia la maquinaria de la Alcaldía de Sincelejo para el inicio de las adecuaciones en la carrera 16 I con	22/06/2022
Contrato de acueducto	Coordinación entre contratos	El Contratista realizó los acercamientos pertinentes, no obstante a la fecha no se ha definido el fecha de inicio y fin de intervención de la vía 16 J	Alcaldía Sincelejo	N/A	N/A

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA








9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y trámites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

* El Consorcio Turquía continuó con la Actividad 2 en las visitas de los diagnósticos de las viviendas objeto del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el barrio El Poblado, por lo tanto, a la fecha de corte del presente informe semanal se tiene aprobado seiscientos cuarenta (640) diagnósticos acumulados.

* De acuerdo con las diferentes reuniones sostenidas con el Contratista e Interventoría para la revisión de la Matriz Inicial, se realizó el balance de los posibles beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en el municipio de Sincelejo - Sucre, en contraste con los recorridos de verificación en campo, plano del barrio El Poblado de caracterización de zonas de riesgo y los diferentes informes emitidos por el FOVIS, se obtuvo un potencial neto de 644 viviendas efectivas, 46 no efectivas y 3 renuncias, tal y como se muestra a continuación:

Viviendas efectivas: 644
Viviendas diagnóstico aprobado: 640
Viviendas con observaciones de diagnóstico: 3
Viviendas no efectivas: 46
Renuncias: 3

INFORME SEMANAL DE Interventoría No. 44

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **21/02/2023** al **26/02/2023** Fecha **28/02/2023**

Viviendas Pendientes por diagnosticar: 1
Viviendas terminadas: 485 (55 con observaciones)
Viviendas en ejecución: 85
Viviendas iniciadas: 570

* Para la Actividad 3 se han iniciado un total de quinientos setenta (570) viviendas, de las cuales cuatrocientos ochenta y cinco (485) terminadas (cincueta y cinco (55) tienen observaciones de detalles). En la semana se realizaron 13 aperturas.

* Con respecto a la Actividad 4, se han recibido ciento noventa (190) solicitudes de inclusiones, de las cuales ciento cinco (105) han sido avaladas por la Alcaldía de Sincelejo, ochenta y cuatro (84) no fueron aprobadas y una (01) en la cual el FOVIS no dio una respuesta clara de aprobación. Se continuará con las visitas vivienda a vivienda así como reuniones sectorizadas para dar a conocer a los potenciales beneficiarios toda la información referente a este proyecto.
A corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje ejecutado acumulado de 78,99% y un porcentaje programado acumulado de 88,92%, lo que incide en un retraso del 9,93%. Es importante mencionar que la interventoría con las comunicaciones GA-DOMI-259-23 del 18 de enero de 2023, GA-DOMI-270-23 del 26 de enero de 2023, GA-DOMI-276-23 del 02 de febrero de 2023, GA-DOMI-281-23 del 10 de febrero de 2023 y GA-DOMI-286-23 del 16 de febrero de 2023, se solicitó al contratista de obra implementar un plan de contingencia y aumentar el personal de obra, con el fin de mitigar el atraso que se presenta a la fecha
Así mismo, se solicitó tomar las medidas al interior del contratista de obra con el fin de que se incluya mayor personal de mano de obra para la ejecución de las actividades, la apertura de nuevas viviendas que permitan subsanar el atraso y la remisión del plan de contingencia para subsanar el atraso reportado.

Nota: Hace parte y requisito dentro del presente informe el anexo de la bitácora de obra y el acta inspección interna de obra, solo aplica para contratos que se encuentren en la etapa de ejecución de obra.

Firma	Firma	Firma
Nombre EDGAR ALFONSO ARAGON OTERO	Nombre HECTOR MAURICIO JUNCO MORALES	Nombre
Director de Interventoría o Representante legal <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Profesional Costos y Presupuesto <NO se admiten firmas diferentes a las solicitadas.	Supervisor

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

Anexo 18. Informe de gestión social

Municipio	Sincelejo	**Contrato:**		2220577
Contratista de obra	Consorcio Turquía	**Contratista de interventoría**		GAVINCO ingenieros consultores
Fecha:	28 febrero 2023	**Elaboró**	Candelaria Gózales Medina	**Revisó:** July Paulin Rios Anaya

1. LÍNEA DE COMUNICACIÓN

Acompañamiento a Visitas de obra:

Durante el periodo del mes de enero del año en curso, se realizaron visitas de socialización casa a casa en las aperturas de viviendas, hasta la fecha de cierre de este informe se tiene un total de 120 viviendas visitadas en el barrio el Poblado para el mes de febrero, en la actividad de socialización casa a casa en las aperturas. Esta actividad se realizó con el acompañamiento del área técnica y social de la interventoría y de la veeduría

Cabe resaltar que los beneficiarios se encuentran muy interesados y felices con la llegada del Programa a sus viviendas, los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría realizan explicación clara y veraz del alcance del Programa a los beneficiarios. Asimismo, se concertó el lugar de intervención en cada vivienda.

Fecha	Barrios	Asistentes	Lugar	Acciones y Principalesresultados	Responsable	Evidencias
Del 1 al 28 de febrero	El Poblado	Contratistas de obra e interventoría Veedores	El Poblado	Socialización del PCI, se despejaron dudas e inquietudes	Contratistas Interventoría	asistencia y registro fotográficos

Diseñar, publicar y distribuir material publicitario:

Durante este periodo se llevó a cabo entregas, folletos informativos y volantes de invitación, con el fin de invitar a la comunidad a la capacitación sectorizada en educación sanitaria, se realizó convocatoria casa a casa, con entregas de volantes de invitación.

Por otra parte, se continuó con la entrega de folletos informativos en las diferentes actividades realizada, como son las socializaciones y capacitaciones sectorizadas.

Material Utilizado	Descripción medio de divulgación implementado	Relación de las Evidencias
Material para las socializaciones	N/A	---------
Material para las Capacitaciones	Folletos y volantes	Folletos escáner del volante
Material Informativo y/o de convocatoria	N/A	----------
Otras actividades de divulgación: Cuñas radiales, prensa local, perifoneo, entre otras)	N/A	----------

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Punto de Atención: El punto de atención la profesional social brinda atención personalizada, a 2 personas que se acercaron porque tenían dudas e inquietudes por la fecha de entrega de materiales e intervención de sus viviendas, a lo cual el área social suministra toda la información solicitada, dejando claridad sobre las dudas presentadas, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Cabe informar que durante este periodo se realizó la atención casa a casa con el fin de poder validar la percepción de los beneficiarios y cubrir la totalidad de las manzanas del barrio.

Los puntos de atención se encuentran ubicados en la calle 9 manzana 32- lote 38, casa del beneficiario José tuiran y el segundo punto de atención se encuentra ubicado en la dirección Carrera 17 D# 45 A 05, en la casa de la beneficiaria Luz Mery Rivera. las atenciones a la comunidad se están brindando los días lunes, martes y jueves de 8:00am a 12:00pm y de 2:00 a 4:00 pm. De igual forma se cuenta con un número de contacto para que la comunidad pueda comunicarse a la línea 3015973080 con el fin de evitar aglomeraciones y minimizar el riesgo de contagio.

Adicionalmente, es de señalar que los Puntos de Atención a la Comunidad dispone de un cartel Informativo para que la comunidad tenga orientación donde están ubicadas las instalaciones del Programa, en el mismo se encuentran plasmados los días y horario de atención. (Debidamente validado por ENTerritorio).

Barrios	Punto de información	PQRS recibidas	PQRS atendidas	PQRS pendientes oen trámite	Producto	Observaciones
El Poblado	Calle 9 MZ 32-lote 38 Carrea 17D # 45ª -05	195	195	0	Formato PCI 024 .	Por solicitud de inclusión hay 3 en traite y por quejas 3 abiertas, las cuales deben ser atendidas por el Fovis, para poder cerrarlas a satisfacción

BUZÓN DE PQRS:

Para este periodo no se encontró ninguna PQR en el buzón de sugerencias, cabe resaltar que el mismo se revisa semanalmente con el acompañamiento de la veeduría
Relación de evidencias: registro fotográfico

Recepción y trámite de las PQRS: En el mes de febrero del año en curso, no se realizó recepción de PQRS.

A la fecha de cierre de este informe se cuenta con un consolidado de la relación de las PQR recepcionadas durante el tiempo de ejecución del Programa, Total de PQR, recepcionadas en el barrio el Poblado, (195) de las cuales (190) correspondientes a solicitudes de inclusión y (5) por quejas de aspectos técnicos, donde la comunidad las ha interpuesto por inconformidad antes mencionada. De las (190) solicitudes para inclusión. Cabe, informar, que todas las PQR se encuentran cerradas.

Periodo Registrado	N° PQR recepcionadas		N° PQR cerradas	N° PQR en tramite	Reporte PQR en trámite del periodo anterior			Observación general / motivo
3er. Informe	9		0	9	N° de PQR	Estado		
4° Informe	24		0	24	9	Abiertas	Solicitud de inclusión	
5° informe	54		7	54	24	Abiertas	Solicitud de inclusión	
6° informe	0		41	0	54	cerrada	Solicitudes de inclusión	
7° informe	0		41	0	0	Cerradas	Solicitud de inclusión	
8° informe	0		41	149	149	Abiertas	Solicitud de inclusión	
9° informe	5		85	6	149	Cerradas	Solicitud de inclusión y quejas	
TOTAL	195		195	0	195	Cerradas	Solicitud y quejas	

Cuadro acumulativo de PQRS:

Recorrido de Obra:

El 23 de febrero del año 2023, se realizó acompañamiento a un recorrido de obra liderado por la Alcaldía Municipal, se contó con la participación de los profesionales técnicos y sociales de obra e interventoría, miembros del comité veedor, se logró visitar 50 viviendas en diferentes etapas de intervención, de igual forma, se evidencio la satisfacción del beneficiario
Relación de evidencia: registro fotográfico.

Capacitación sectorizada y casa a casa en Educación Sanitaria e instalación de Acrílico

Se realizó una capacitación sectorizadas el 28 de febrero, en donde se socializaron a los beneficiarios las líneas de intervención que conforma el Plan de Gestión Social y los conceptos claves en Educación Sanitaria como lo son la salud, la higiene, con una ayuda didáctica como fueron los folletos informativos, donde se les explicó las diferentes intervenciones y los concejos e iniciativas de mejoramiento. Seguidamente las profesionales sociales de obra continuaron, con las capacitación realizando recomendaciones para el cuidado de los equipos que contienen agua como son, no usar productos ácidos o detergentes agresivos para la limpieza, no golpear los equipos, también se habló del manejo adecuado de las casetas, como lo es limpiar el baño regularmente, cerrar la tapa del inodoro, no usar el inodoro como caneca de basura, de igual forma también es importante el mantenimiento básico de los equipos sanitarios de agua como lo es la revisión de la instalación, las reparaciones e implementar métodos sencillos que puedan establecer si existe algún escape de agua. Otro tema a tratar fue el almacenamiento, manipulación y uso adecuado del agua potable.
se realizaron (44) capacitaciones casa a casa e instalación de acrílicos.
Relación de evidencias: Acta, asistencias y registro fotográfico

Capacitación Masiva/ Sectorizada /Casa a Casa	Fecha	Barrio	N° de Asistentes	Entidades de Apoyo	Relación Evidencias
Capacitaciones sectorizadas	28 de febrero del 2023	El Poblado	11	Contratista e Interventoría. Veeduría	Acta, Asistencia, Registro Fotográfico.
Capacitación Casa a Casa	1-28 de febrero del 2023	El Poblado	44	Contratista e Interventoría.	Asistencia, Registro Fotográfico.

Generación de Empleo

Durante este periodo el Contratista de obra viene vinculando personal de mano de obra no calificada al Proyecto aportando al desarrollo económico del municipio y minimizando la tasa de desempleo en la región, generado satisfacción ante la comunidad beneficiada.

Cuadro 8. Empleo.

Barrios	No. de trabajadores	No. de empleos generados	No. empleos indirectos generados
El Poblado	80	80	80

Mes	No. de MONC del municipio	No. de MONC femenino	No. MONC en condición de desplazamiento
11	77	1	5

.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Se recomienda la articulación permanente con Entes Territoriales con el fin de lograr los objetivos propuestos en la ejecución del PCI
Es importante mencionar que se necesita más acto de presencia y apoyo por parte de los Entes Territoriales frente a la problemática que se está presentando con los directivos de la JAC y la señora Doris Upegui.

CONCLUSIONES:

Se concluye que para este periodo se ha dado continuidad a las actividades programadas en cada una de las líneas de intervención, para la implementación del PGS, lo cual ha permitido la articulación entre la comunidad, veedores, líderes de JAC y el contratista de obra e Interventoría.

Se contó con el apoyo de la veeduría en todas las actividades realizadas y/o acompañamiento a los equipos técnicos y sociales de obra.

En este periodo, se dio continuidad a las estrategias del cronograma de actividades del PGS, entre ellas el acercamiento con los líderes de la JAC. Cabe informar que muy a pesar de todos los esfuerzos del equipo social y técnico por avanzar en el buen desarrollo del Proyecto, el mismo se ve entorpecido por el vicepresidente de la JAC, Álvaro Montesino, quien, con su comportamiento inadecuado con todos los profesionales, veedores y beneficiarios, no permite avanzar con seguridad y tranquilidad con las actividades en la obra.

Candelaria

González Medina — **Profesional social de obra**

July Paulin Rios Anaya — **Profesional social Interventoría**

Anexo 19. Diagnósticos aprobados.

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 20. Certificaciones de materiales.

Dirección
Autopista Sur No. 71-75 Bogotá, Colombia.
Telefonos
+57(1) 782 5000 Ext.1101 01 8000 912286
Sitio Web
www.pavcowavin.com.co

CERTIFICADO DE CALIDAD

Señores: NEGOCIOS E INVERSIONES MONTESU **Fecha: 27.02.2023**
Producto: TB SAN 4 6M LINEA NOVATEC **Nro: 1073-22**
Trazabilidad: 62211540-2023
Norma de referencia: NTC 1087 TUBOS DE POLI (CLORURO DE VINILO) (PVC) RÍGIDO PARA USO SANITARIO - AGUAS LLUVIAS Y VENTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD	UM	REQUISITO MÍNIMO	REQUISITO MÁXIMO	RESULTADOS
DIMENSIONES				
Diámetro Exterior Promedio	mm	114.07	114.53	114.30
Ovalamiento Diametro	mm		2.40	1.06
Espesor de Pared -P	mm	3.30	3.80	3.63
Longitud del tubo	mm	6000.00	6012.00	6004.00
Resistencia al Impacto	J	81.00		81.00
Presión de Rotura 23°C	MPa	2.48		2.60
ENSAYOS FÍSICO - MECÁNICOS				
Aplastamiento		No debe haber agrietamiento o rotura		CUMPLE
Calidad Extrusión		No debe presentar descascaramiento		CUMPLE
ENSAYOS FRECUENCIA TIPO (ANUAL)				
Resistencia Química		No debe presentar ataque químico		CUMPLE
Absorción de Agua		No debe presentar aumento de masa > 0,5%		CUMPLE
INSPECCIÓN VISUAL				
Homogeneidad de Superficie		HOMOGENEA		CUMPLE
Grietas, Poros, Inclusiones		AUSENCIA		CUMPLE
Color		HOMOGENEO		CUMPLE

CONTROL DE CALIDAD
Este certificado no requiere una firma original por ser un documento electrónico.

orbia
Advancing life together

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS** Fecha Impresión 02-01-2023
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL** No. Remisión: 2458124-2023
Teléfono: **2743303** Página: 1 DE 3

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% C**	**% Mn**	**% Si**	**% S**	**% P**	**% Nb**	**% Ce**	**% Cr**	**% Ni**	**% Cu**
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140578Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140513X	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140545Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140514Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140517Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140517Z	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140518Y	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A2	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A5	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A6	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK140571A7	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14054A8	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14058B1	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.07	0.23	0.017	0.015	0.001	0.46	0.050	0.020	0.03
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244375D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.26	0.007	0.022	0.001	0.46	0.060	0.030	0.05
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244378E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.27	1.11	0.26	0.007	0.022	0.001	0.46	0.060	0.030	0.05

DATOS GENERALES	PROPIEDADES QUIMICAS

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS**
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL**
Teléfono: **2743303**

Fecha Impresión 02-01-2023
No. Remisión: 2458124-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte
					mm	mm	Kg/m	mm
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A6	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A7	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051A8	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK14051B1	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.1	6.2	0.575	0.53
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244372D	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	6.2	0.578	0.50
8007443	BARRA COR 3/8"(No.3) 6m NTC2289/G60	BDK244375E	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.3	6.2	0.578	0.50

Declaración de Incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 3771 psi / ± 26.0 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 3771 psi / ± 26.0 Mpa

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **CONCREACEROS SAS**
Dirección: **CL 38 4A150 PARQUE INDUSTRIAL**
Teléfono: **2743303**

Fecha Impresión 02-01-2023
No. Remisión: 2458124-2023

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Alargamiento	± 0.351 %
Altura Resalte	± 0.013 mm
Separación entre extremos	± 0.020 mm
Espaciamiento	± 0.016 mm
Angulo de Resalte	± 0.404 °
Peso metro (masa)	± 0.009 kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS									
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	% C	% Mn	% Si	% S	% P	% Nb	% Ce	% Cr	% Ni	% Cu
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355923	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355924	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355928	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355929	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355931	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355932	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355933	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355939	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.28	1.06	0.16	0.004	0.006	0.000	0.46	0.01	0.01	0.00

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES QUIMICAS	
MATERIAL	**DESCRIPCION**	**LOTE**	**NORMA.PRODUCTO**	**FABRICANTE**	**% V**	**% Mo**
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355923	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355924	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355928	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355929	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355931	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355932	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355933	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355934	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355939	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	0.003	0.003

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

DATOS GENERALES					PROPIEDADES DIMENSIONALES			
MATERIAL	DESCRIPCION	LOTE	NORMA.PRODUCTO	FABRICANTE	Separación Extremos	Espaciamiento	Peso Metro (Masa)	Altura Resalte
					mm	mm	Kg/m	mm
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355942	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355943	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355944	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355945	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355964	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355974	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355975	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83
8001348	BARRA COR 1/2"(No.4) 6m NTC2289/G60	BTY0355976	NTC 2289 GR60	Ternium Atlántic	2.2	8.5	0.983	0.83

Declaración de Incertidumbre de la medición

Los resultados de los ensayos en barras corrugadas para refuerzo de concreto cumplen con los métodos descritos en las normas:

* Tracción: NTC 2289: 2020 Num. 9 y 15.2 (Caída de la curva, método de desplazamiento) NTC 3353: 2019 Num. 6, 8, 13 y 14 NTC 2: 2018

* Dimensionales: NTC 2289: 2020 Num. 7 y 8

* Variación permisible en peso: NTC 2289: 2020 Num. 11.

Con la siguiente evaluación de incertidumbre de medición:

Variable	Incertidumbre Expandida(1)

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

INFORME DE ENSAYOS

Razón Social: **Ternium del Atlantico S.A.S.** Página Web: **www.ternium.com.co**
NIT: **901131909-1**
Teléfono: **01 8000 423 724**
Dirección: **Palmar de Varela-Ponedera (ruta 25) km PR48+600**

INFORMACION GENERAL

Cliente: **EL CONSTRUCTOR INVERSIONES S A**
Dirección: **CL 31 A LOTE 5 AVDA PEDRO HEREDIA**
Teléfono: **6633633**

Fecha Impresión 09-01-2023
No. Remisión: 45871214-2023

Variable	Incertidumbre Expandida(1)
Resistencia a la Fluencia	± 767 psi / ± 5.29 Mpa
Resistencia a la Tracción	± 767 psi / ± 5.29 Mpa
Alargamiento	± 0.442 %
Altura Resalte	± 0.017 mm
Separación entre extremos	± 0.031 mm
Espaciamiento	± 0.035 mm
Angulo de Resalte	± 0.462 °
Peso metro (masa)	± 0.008 Kg/m

(1) La incertidumbre expandida se basa en una incertidumbre estándar multiplicada por un factor de cobertura k = 2, con un nivel de confianza de 95%.

Autoriza
Eivy Dayan Jerez Salazar
Jefe Sector Verificaciones y Laboratorios

Los datos del presente informe de ensayos, han sido revisados por el área de Verificaciones y Laboratorio.
La conformidad de los resultados de ensayo está basada en aceptación simple.
Los resultados reportados en este informe de ensayos se relacionan únicamente a los materiales ensayados, aquí descritos.
No se debe reproducir información parcial del informe de ensayos, excepto, si se hace en su totalidad con la aprobación escrita del laboratorio emisor.

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO
ULTRACEM S.A.S

CEMENTO GRIS TIPO UG DE USO GENERAL

F.V: 01-03-2017

VERSIÓN 3.

Código LOTE No 14578-2023

PLANTA:	ULTRACEM S.A.S
DIRECCIÓN:	Km 2.5 VIA CORDIALIDAD,GALAPA
FECHA DE PRODUCCIÓN:	20/01/2023 — 28/02/2023
PRESENTACIÓN:	GRANEL/ENSACADO
CLIENTE:	CONSORCIO TURQUIA

ENSAYOS FÍSICOS	METODO DE ENSAYO	RESULTADO	NTC 121	ASTM C 1157	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	8,00	Max. 12,0	Max. 12,0	Max. 12,0
Finura (permeabilidad al aire), cm^2/g	NTC 33	5148	—	—	—
Finura en tamiz N° 325 (45µm), %	NTC 294	93,09	—	—	—
Expansión en autoclave, %	NTC 107	0,01	Max. 0,80	Max. 0,80	Max. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	0,006	Max. 0,020	Max. 0,020	Max. 0,020
Resistencia a la Compresión					
1 Día, MPa (psi)	NTC 220	6,2 (900)	—	—	—
3 Días, MPa (psi)	NTC 220	13,5 (1960)	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)	Min. 8,0 (1160)
7 Días, MPa (psi)	NTC 220	18,8 (2730)	Min. 15,0 (2176)	Min. 20,0 (2900)	Min. 15,0 (2176)
28 Días, MPa (psi)	NTC 220	0 ()	Min. 24,0 (3481)	Min. 28,0 (4060)	Min. 24,0 (3481)
Tiempo de Fraguado (Vicat) METODO A					
Tiempo inicial de fraguado, min	NTC 118	230	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420	Min. 45; Max. 420
Tiempo final de fraguado, min	NTC 118	340	—	—	—

Se certifica que el CEMENTO ULTRACEM GRIS TIPO USO GENERAL cumple con la norma Técnica Colombiana NTC 121 para Cemento tipo UG.

Los resultados expresados han sido obtenidos aplicando los métodos de muestreo y ensayos de acuerdo con las frecuencias e instructivos establecidos en el PLAN DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PARA LA GESTIÓN DE PRODUCCIÓN DE CEMENTO de Ultracem S.A.S. Aplica para las producciones realizadas durante el periodo comprendido en "Fecha de Producción".

FIRMA: 

Cargo: Gerente de Calidad Cementos

SELLO DE CALIDAD DE PRODUCTO

Contamos con Sello de Calidad de Producto para el Cemento Gris UG y ART en cumplimiento a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 121, lo que avala nuestro compromiso con la calidad de productos

icontec
Sello de Calidad

Ultracem S.A.S no se hace responsable por los perjuicios que se puedan ocasionar por el mal uso de sus productos. La información contenida en este documento es de carácter estrictamente comercial y no constituye recomendación técnica por parte de Ultracem S.A.S



Código LOTE No 14578-2023

CEMENTO GRIS
USO GENERAL · TIPO UG

El Cemento Ultracem Gris tipo GU de uso general es un producto de excelente desempeño y resistencia mecánica, fabricado con materias primas seleccionadas, ideal para la producción de morteros, concretos y elementos prefabricados en general.

Cumple:
NTC 121 Tipo UG

PRESENTACIONES

50 kg | 42.5 kg | Big Bag | Granel

APLICACIONES Y USOS

- Elaboración de morteros de pega y pañete.
- Elaboración de morteros para nivelación de pisos.
- Elaboración de concreto para muros, vigas y losas de comportamiento normal.
- Reparaciones y aplicaciones domésticas.


BENEFICIOS

- Tiempo de fraguado controlados que facilitan la manejabilidad de las mezclas producidas.
- Producción de concretos de excelente plasticidad.
- Regularidad en sus propiedades y desempeño.


ENSAYOS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121	ULTRACEM
Contenido de Aire en volumen, %	NTC 224	Máx. 12	Máx. 12
Finura (permeabilidad al aire), cm 2/g	NTC 33		
Finuraen Tamiz Nº 325 (45um), %	NTC 294		
Expansión en autoclave, %	NTC 107	Máx. 0,80	Máx. 0,80
Expansión barras de Mortero (14 dias), %	NTC 4927	Máx. 0,020	Máx. 0,020
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN			
1 dia, MPa (PSI)	NTC 220		Min. 6,9 (1000)
3 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 8,0 (1160)	Min. 13,0 (1890)
7 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 15,0 (2175)	Min. 20,0 (2900)
28 dias, MPa (PSI)	NTC 220	Min. 24,0 (3480)	Min. 24,0 (3480)
TIEMPO DE FRAGUADO VICAT			
Tiempo de fraguado inicial, min	NTC 118	Min. 45 - Max 420	Min. 45 - Max 420

Cerámicas El Cinco
Ladrillos bien hechos

BLOQUE # 4



SECCION




ISOMETRICO



Precorte
APLICACION




Pieza con Precorte

Nota: En un paquete (estiba) pueden ir hasta el 6% de piezas con precorte.

A celda = 19,71 cm2/Un

Dimensiones en cm.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones	**Largo**	**Ancho**	**Alto**
	33,0 cm	9,0 cm	23,0 cm
Tolerancia Dimensional	± 6 mm	± 3 mm	± 6 mm
Color	**TERRACOTA CLARO (Según muestras)**	El color varia dentro de una gama similar a la que se observa en la foto de aplicación	
Textura	ESTRIADO POR SUS CUATRO (4) CARAS		
Paredes y Perimetrales	± 10,0 mm	**Tabiques**	± 8,5 mm
Peso / Unidad	**5,7 kg.** (Aprox.)		
Rendimiento con dilatación de 1cm	**12,25 Unidades/m2**		
Peso / m2	69,83 Kg/m2 de muro		
Aplicación	**Muros Divisorios**		
Clasificación	Tipo **PH**	Unidad de Mampostería de Perforación	
	Promedio 5 Unidades	Individual	
Resistencia a la compresión (Mínima)	3,0 MPa (30 Kgf/cm2)	2,0 MPa (20 Kgf/cm2)	
Absorción de Agua (Máxima)	13%	14%	
Normas Aplicadas	ICONTEC	**NTC 4205-2**	
	AIS	**NSR 10**	
	ASTM	C56, C212, C216	

Recomendaciones de Almacenamiento:
Se recomienda que las piezas de arcilla se almacenen en obra en un sitio plano, seco, aislado del terreno, y protegido de la escorrentía, las zonas de escombros, el almacenamiento de arenas y sitios de preparación de mezclas de mortero y concreto.

Recomendaciones de Diseño e Instalación:
En la aplicacipon como muros divisorios se deben cumplir los requisitos de la ***NSR10 Capitulo A.9 Elementos No Estructurales,*** en su diseño y anclaje a la estructura.
El diseño comprende columnetas y viguetas, similar a una mampostería confinada. Seguir recomendaciones del "*Manual de Diseño - Muros divisorios y de fachada en mampostería según normas colombianas de diseño y construcción sismo resistente*"
Durante la construcción se procurará mantener el muro lo más limpio posible, esto facilitará la limpieza posterior.

Recomendaciones de lavado:
Generalmente los muros divisorios construidos con estas piezas llevan algún tipo de acabado, por lo que no se acostumbra el lavado.

El muro deberá estar seco. **No usar Acido Muriático**. Para la aplicación de la solución de lavado, previamente se deben retirar los excesos de mortero y polvo, y **pre humedecer el muro** (esto evita la penetración del ácido en la pieza de arcilla). Después de refregar el muro con la solución de lavado, esta se debe retirar con abundante agua.

	Vo. Bo. OPERACIONES	Vo. Bo. CALIDAD	Vo. Bo. COMERCIAL
PREPARO: Area Técnica Comercial **REVISO:** **FECHA**: Febrero de 2023			

ROMA

DECLARACION DE CONFORMIDAD	AÑO:2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CORDIAL SALUDO

SENCO COLOMBIANA S.A.S es una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de porcelana sanitaria, bajo la marca **ROMA** nuestro propósito es tener relaciones estrechas con nuestros aliados estratégicos y clientes finales, con productos que satisfagan sus necesidades, teniendo en cuenta el cumplimiento de los requisitos de la norma ICONTEC NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

Todos los productos de porcelana sanitaria marca **ROMA.** En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto estará amparado por su respectiva garantía siempre se cumplan todas las condiciones previstas, se reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada

En el cuadro anexo se encuentran descritos los porcentajes permitidos por la norma NTC 920 “APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA”

y la conformidad de los productos ROMA respecto a la norma

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

FICHA APARATOS SANITARIOS DE CERAMICA NTC-920

CARACTERISTICAS	NORMA NTC 920	SENCO COLOMBIANA
ABSORCION	MENOR O IGULA A 0.5%	0.3% - 0.5%
CUARTEADO	NO SE PERMITE	NO PRESENTA
ESPESOR	MAYOR O IGUAL A 6mm	TAZA MIXTA 12 – 13 mm LAVAMANOS 8.5-9mm TANQUES 12 – 13 mm PEDESTAL 8.5-9.5mm
AGUJEROS, AMPOLLAS Y PUSADURAS BURBUJAS, MANCHAS Y PECAS	NO MAS DE 5 TOTAL NO MAS DE 5 EN CUADRADO DE ALFARERIA, TOTAL 10	CUMPLE POR INSPECCION VISUAL SEGÚN NORMA DISTANCIA 24 PULG.
CARGA (MOR)	2.2KN	CUMPLE
ESPEJO DE AGUA	125mm x 100mm	CUMPLE
DIAMETRO DE PASO DE BOLA POR SIFON	BOLA DE 38mm DE DIAMETRO	CUMPLE
ALTURA TAZA	343mm	CUMPLE (390.5mm)
TAMAÑO DE ACOPLE	TAZA OPERADAS POR VALVULA FLUXOMETRO 38 mm o 32 mm ORIFICIOS PARA CUBIERTAS 14mm	CUMPLE (63.4mm) 13.8mm
HUECOS LAVAMANO	PERFORACIONES PARA GRIFERIA DE LLAVES Min 25 mm - Max 38. mm	LAV. OCEANO 30 mm LAV. Gaira 36 mm LAV. Vessel 37 mm
HUECOS TANQUES	TANQUES POR GRAVE- DAD ACOPLADOS: VAL- VULA DE DESCARGA 60 – 70 mm	TANQ. OCEANO 63 mm TANQ. AWA 63 mm
CONSUMO DE AGUA	ALTA EFICIENCIA 4.5 LTS	4.5 LTS / DESCARGA
DESACARGA MISO		Min 350 Gr – Max 700 Gr Dependiendo de la referencia.

Especificaciones Técnicas:

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

Material	Porcelana Sanitaria
Rango de presión de agua	20 PSI – 100 PSI
Sistema descarga	Descarga por Gravedad
Consumo de Agua	4.5 Lpf – 4.8 Lpf
Espejo de Agua	190 mm x 200 mm
Altura de Sello	60 mm
Medida Instalación	30,5 cm (Pared Terminada)
Dimensión Producto Empacado	0.080 M 3
Peso Empacado	19 Kg +/- 1 Kg

Requisitos Técnicos Cerámicos

a. Porcelana:

- Absorción de Agua: el valor obtenido es inferior al 0.5 %.
- Núcleo Negro: La producción debe estar libre de este defecto de cocción

b. Esmalte:

- Resistencia al Ataque Químico: Determinación de la Resistencia a Sustancias Químicas ASTM C650-04
- Acople pasta / esmalte: compresión, por lo cual debe pasar la Prueba de Craquelado

Grifería Tanque

- GARANTIA: 18 meses por defectos de fabricación o defecto significativo. No cubre daños físicos o mecánicos generados por errores en instalación del producto o daños por instalar con herramientas.
  No aplica garantía, a los componentes que sufren desgaste por el funcionamiento normal del producto como son empaques y partes que sufren manipulación

- Los repuestos de la Grifería, Válvula de entrada, Agua stop entre otros son homologados con otras marcas, así mismo a nuestros sanitarios le sirve griferías nacionales como ; Gerfor, Grival, Gricol

Senco Colombiana S.A.S
NIT: 890.926.628-9
PBX: + 60 4 475 45 60
sencolombiana@sencolombiana.com
KM 25 Autopista Medellín – Bogotá, Guarne - Antioquia

ROMA

GARANTIA PORCELANA SANITARIA

¡Felicitaciones! Usted acaba de adquirir un Producto ROMA 100 % colombiano diseñado y fabricado por SENCO COLOMBIANA S.A.S el Producto objeto de la garantía está libre de defectos de fabricación y su desempeño cumple las normas de calidad colombiana NTC -920 SANITARIOS DE CERAMICA y la Norma Internacional ASME A 112.19.2 - 2008

Con el propósito de dar validez a su garantía le solicitamos tenga en cuenta las siguientes apreciaciones:

Instrucciones de instalación y mantenimiento

- **El sanitario deberá ser instalado con brida o anillo de cera y en la unión entre la taza y el piso deberá utilizar selladores a base de Silicón.**
- **Por ningún motivo utilice cemento para la instalación y cemento y/o yeso para sellar la unión, ya que existe el riesgo de romper la taza ó que esta misma presente fisura por la contracción del cemento sobre la porcelana.**
- **En caso de requerir levantar la taza ó sanitario para hacer reparaciones por taponamiento ocasionados por agentes externos ó pruebas de funcionalidad se corre el riesgo de quebrar la taza al ser instalada con cemento, El no seguir esta instrucción de instalación anula por completo la garantía del producto.**
- **Siga las instrucciones de instalación expresadas en los documentos entregados con los productos correspondientes.**
- **Para el mantenimiento, limpie las superficies externas con una solución de agua jabonosa y el área interna de la taza ó pozo con un limpiador no abrasivo, Las áreas de acabados cromados deben limpiarse con jabón suave y el secado y brillo con un paño de algodón limpio y no deben estar expuestos a la intemperie.**

Cobertura de la Garantía.

La GARANTIA cubre todos los productos de marca ROMA en porcelana sanitaria, sobre cualquier defecto relacionado con la calidad intrínseca e idoneidad del producto, es decir por la calidad ofrecida y por su capacidad de funcionamiento y los acabados de los componentes cerámicos siempre y cuando se cumplan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.

Obligación de SENCO COLOMBIANA S.A.S

En caso de presentarse un defecto de fabricación o mal desempeño del Producto amparado por la presente garantía y de cumplirse todas las condiciones previstas, SENCO COLOMBIANA S.A.S reparará o remplazará a su discreción y criterio técnico, el respectivo Producto y/o pieza objeto de la reclamación una vez esta le sea notificada, con productos y/o piezas iguales o similares, de acuerdo a la disponibilidad en su inventario.

Tiempo de la Garantía.

Todos los productos de porcelana sanitaria ROMA están garantizados de por vida en su funcionamiento, siempre y cuando sean instalados de acuerdo con los procedimientos y normas especificados en los manuales de instalación adjuntos y sean utilizados dentro de las condiciones para las cuales fueron diseñados.

A los componentes producidos por otros fabricantes y representados ó distribuidos por SENCO COLOMBIANA S.A.S tales como: Porcelana sanitaria importada (de por vidad), asientos sanitarios (1 año), griferías y/o herrajes de tanque y griferías para lavamanos (1 año) y accesorios plásticos (1 año) les aplicará el tiempo de la garantía ofrecida por el respectivo fabricante siempre y cuando se sigan las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento de cada uno de ellos.

Exoneraciones.

ROMA, no asumirá daños indirectos, incidentales o que sean consecuencia de algún imperfecto que se genere como consecuencia de:

- **Culpa exclusiva del cliente y/o de terceros.**
- **Hechos ocasionados por caso fortuito o fuerza mayor, es decir cualquier hecho u concurrencia imprevisible no imputable a SENCO COLOMBINA S.A.S y que no sea consecuencia de culpa suya ni concurra con ella, y que coloque a SENCO COLOMBIANA S.A.S en la imposibilidad absoluta de cumplir la garantía.**
- **No aplicara la garantía por Mal funcionamiento en los herrajes del tanque u otros componentes del Producto cuando sean causados ya sea por sedimentos generados por la falta de purga inicial de las tuberías, uso de cloraminas, sedimentos u otros minerales no retirados en el tratamiento de los abastecimientos de agua pública o por limpiadores de taza tipo tanque que contengan hipoclorito cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos, utilización de pegantes o siliconas en la instalación de los herrajes que deterioran los sellos de caucho o por un mal funcionamiento de los mismos al no seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.**
- **Accesorios de grifería cromados como, Push del tanque , llave de lavamanos, no podrán ser limpiados con hipoclorito de cálcico (cloro), acido fluorhídrico y/u otros productos químicos tipo abrasivo ; puestos afectan la apariencia final de la pieza**
- **Daños que ocurran al Producto durante su transporte o instalación y que no hayan estado a cargo de SENCO COLOMBIANA S.A.S**
- **Los reclamos relativos a la apariencia, forma y color deben ser previos a la instalación.**

COMO HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Para hacer efectiva la Garantía es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- **El Producto se debe haber instalado conforme a las instrucciones indicadas por ROMA**
- **El mantenimiento y limpieza del Producto debe haberse hecho evitando elementos abrasivos o químicos fuertes (ácidos y/o cloro y/o derivados del cloro y/o amoniacos usados en el tratamiento de abastecimiento de agua o para limpieza de tanques sanitarios, bases o disolventes).**
- **Comunicarse con la línea de servicio al cliente: (57) (4) 4754560 , CEL : 315.300.51.67**
- **Presentar la factura de compra o comprobante de compra de los productos para verificar la fecha de adquisición.**

La responsabilidad que vincula a SENCO COLOMBIANA S.A.S con cada uno de sus DISTRIBUIDORES es de naturaleza contractual con base en el acto de ejecución que le dio origen; en tanto que con cualquier tercero que llegare a reclamar será de naturaleza extracontractual, surgida exclusivamente por ser el fabricante o productor del bien en cuestión, sin perjuicio, adicionalmente, de la responsabilidad contractual que llegare a existir entre ese tercero y el DISTRIBUIDOR de quien adquirió el producto…

AGREGADOS Y CANTERAS DEL NORTE S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CLIENTE:

Creada para satisfacer las necesidades de abastecimiento del sector de la construcción de obras civiles y de arquitectura, Nuestra cantera de extracción del Material identificada con licencia Minera FF142 expedida por el Ministerio de minas y la resolución 1054 del 22 de noviembre del 2010 expedida por CARSUCRE. Certifica como cliente al CONSORCIO TURQUÍA identificado con NIT: 901 570934-7, a quien se le ha suministrado material granular y fino relacionado a continuación:

MATERIAL	M3	No de Viajes	CANTERA
Arena	245	35	MARÍA DEL CARMEN FADUL CHADID
Gravilla ¾"	196	28	

Expedido en Sincelejo a los Tres 03 días de mes de marzo de 2023 a solicitud del cliente.

MARÍA DEL CARMEN FADUL CHADID
Representante Legal

153

CARSUCRE

Libertad y Orden.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
República de Colombia.

300.28
EXP. 865

RESOLUCIÓN (22 NOV 2010) **№ 1054**

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y su Decreto Reglamentario No. 1220 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No.0556 de 17 de marzo de 2010, se acogió la liquidación realizada por la Subdirección de Gestión Ambiental para la cancelación de los costos de evaluación y seguimiento del proyecto Explotación de un Yacimiento de Caliza, dolomita, arcilla y materiales ubicado en la vía Toluviejo - Macaján, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($739.793), los cuales fueron consignados mediante recibo de caja No.452 de 223 de marzo de 2010.

Que mediante Auto No.0691 de 6 de abril de 2010, se remite el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental para que funcionarios de dicha dependencia practiquen visita de inspección ocular y Técnica y emitan Concepto.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten Concepto Técnico No.0400 de 3 de mayo de 2010, el que expresa la viabilidad del permiso, previa las siguientes consideraciones:

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Localización: El proyecto está localizado en jurisdicción del municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan, el polígono del área de concesión se enmarca dentro de las coordenadas:

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
P.A	852.090,00	1.542.415,00
1	853.373,90	1.541.529,60
2	853.373,90	1.539.684,00
3	853.127,00	1.539.524,00
4	852.710,00	1.539.458,70
5	852.707,00	1.539.457,60
6	852.702,00	1.539.457,60
7	852.702,00	1.539.460080
8	852.700,00	1.539.460,00
9	852.683,00	1.539.724,00

22 NOV 2010

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
10	852.662,00	1.540.060,00
11	852.660,00	1.540.056,00
12	852.681,00	1.540.153,00

Área del Titulo FFU – 142: 109.71 Hectáreas

Descripción De Procesos y Operaciones:
Se empleará el sistema de explotación a cielo abierto, conformando bancos escalonados de dos (2) metros de altura por el ancho que permita la pendiente inicial del terreno en el momento de empezar la explotación, el cual debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito normal del equipo de explotación, cargue y transporte.

Descapote. Para realizar la operación de explotación es requisito previo llevar a cabo la labor de descapote, siendo necesario remover los materiales fracturados y sueltos que hace parte del banco de recebo, diseminada en una matriz limo arcillosa, útil para ser empleada en la fabricación de ciclópeos y/o base para trituración. Además hay que hacer remoción de las limolitas arenosas que suprayacen el banco de recebo, almacenándose en botadero seleccionado para tal fin.

Perforación y Voladura
En el arranque del arterial se empleará perforación neumática Y voladura con explosivos teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el PMA.

Equipos de Cantera. Los equipos a utilizaran las labores de explotación son:
- Un compresor portátil de 260 CFM a 100 psi
- Un buldózer tipo Cat D6, alquilado.
- Un cargador tipo Cat 930

Seguridad Minera e Industrial. Durante el desarrollo de las operaciones mineras y de beneficio se tendrá muy en cuenta el aspecto de seguridad, cumpliendo con la reglamentación existente tanto en Seguridad Social como de Riesgos Profesionales, haciendo énfasis en el cumplimiento de las normas para manejo y uso de explosivos en explotaciones a cielo abierto

SISTEMA DE BENEFICIO
Se empleará una planta trituradora que produzca los tamaños de material más utilizada en la región así:

- **Gruesa:**	Con diámetros entre 1" y 1 ½"	25%
- **Triturado:**	Con tamaño entre ½" y 1"	43%
- **Fina:**	Entre ¼" y ½"	25%
- **Polvillo:**	Por debajo de **1** mm de diámetro	7%

La planta para triturar la roca obtenida en la explotación, estará ubicada en sitio estratégico asignado para tal fin, operará con energía eléctrica de 440 V durante ocho (8) horas diarias de lunes a sábado.

TECNOLOGÍAS
La tecnología minera aplicar es típica de una explotación semimecanizada, al alcance de la titular, que permita obtener rendimientos acordes con la utilización de medianos equipos de perforación, empleando explosivos convencionales, realizando una explotación técnica y racional con criterios de desarrollo sostenible, causando del menor daño posible a la naturaleza y recuperando las áreas afectadas.

MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS

- Dos volquetas de 12 t de capacidad.
- Un transformador eléctrico de 112.5 KVA
- Sistema de contactores y arrancadores para trituradora,.
- Cable para instalación eléctrica a 220 V y 440 V.
- Una trituradora de quijadas o mandíbula de 10" x 20".

MANEJO POST – EXPLOTACIÓN.

Una vez realizada la explotación y verificado que ya no existe posibilidad de encontrar más roca, o que las condiciones técnico económicas actuales no permiten la extracción de más caliza, se procederá al abandono siguiendo en orden el siguiente plan.

- Determinación área a recuperar
- Construcción de zanjas para drenaje
- Traslado de materia vegetal hacia el sitio de recuperación
- Fertilización del suelo
- Montaje Sistema de regadío para vegetación a plantar
- Plantación de especies vegetales
- Cuidado y mantenimiento de las especies plantadas

LINEA BASE AMBIENTAL

Geologia, geomorfologia geotecnia y otros

Regionalmente el yacimiento de caliza hace parte del costado occidental del anticlinal de Toluviejo, donde afloran varios cuerpos de rocas sedimentarias, discordantes, con formaciones superficiales costeras, véase plano 6 y columna estratigráfica. La zona montañosa, presenta un perfil generalizado constituido por conglomerados. Areniscas, arcillolitas, lutitas, margas, calizas, limolitas y sedimentos cuaternarios coluvio – aluviales, que van desde la cota 50 msnm, hasta la 300 msnm. Localmente, el reconocimiento geológico se hizo mediante la construcción de una serie de trincheras y de accesos al sector mineralizado; encontrando una serie de estratos de calizas y de marga, orientados en dirección N 20° E y buzamiento 35° a 45° NW, cuyas proyecciones en profundidad tienen un comportamiento que varía desde anticlinal a sinclinal.

Geotecnia. Las áreas del Contrato FFU – 142 son muy estables, tienen pendientes fuertes, moderadas y suaves, como se observa en el plano de los titulos. La actividad minera a desarrollar en la ejecución del proyecto causará un impacto técnicamente manejable y garantiza mejorar la estabilidad, al manejar adecuadamente la explotación, aguas escorrentías y disposición de estériles.

Hidrografia. Dentro del área del proyecto se encuentran pequeñas quebradas o arroyos (Arroyo Grande), donde ninguno de los cuales poseen flujo permanente, es decir que solo conducen aguas en tiempo lluvioso, descendiendo desde el cerro hacia la parte plana.

Suelos: Los suelos de la región, se caracterizan por sus pendientes suaves a fuertes en el cerro, mientras que en la parte baja son bastante planas; con erosión mínima, sin alcanzar una perfecta madurez, ya que en algunos casos sus horizontes no se encuentran claramente definidos.

Los suelos de la parte baja se utilizan hoy en día en pastizales para ganaderia y hay varias parcelas donde los campesinos siembran pequeños cultivos propios de la región. En la ladera se encuentra bosque y algunos frentes de extracción minera.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La metodologia utilizada en el presente estudio consiste en matrices, tablas de doble entrada donde en un eje aparecen actividades y operaciones y en el otro las listas de chequeo de indicadores de posibles impactos. Solo se consideran los impactos generados por la explotación y transformación del material calcáreo en el sitio del estudio, tales como: alteración del suelo, erosión, alteración de cursos de aguas de escorrentía, calidad de aire, cambios en el valor de la tierra, emisión de gases y partículas sólidas, generación de empleo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se incluye fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos atribuibles a la explotación de los sitios establecidos. El plan incluye los diseños tipos de acciones de manejo ambiental, sus costos, así como un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general del proyecto, evitando con esto la generación de impactos secundarios o la agravación de los previstos. Con base en los riesgos y en los impactos generados durante el proyecto, a continuación se dan las medidas de control que deberán realizarse durante cada una de las actividades del proyecto.

MEDIDAS DE IMPLEMENTACION DEL PMA

- Prevención de contaminación por derrame de combustibles
- Prevención de efectos sobre el suelo
- Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos
- Reducción de emisiones atmosféricas y ruido
- Conservación de sitios arqueológicos
- Recuperación de comunidades vegetales
- Mitigación de impactos sobre la fauna y flora
- Mejoramiento de calidad visual
- Protección de taludes
- Señalización de áreas de trabajo
- Plan estratégico de gestión social
- Educación ambiental

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El costo del plan de manejo es de $8.120.000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental tendrá una duración igual a la vida útil del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

Establece acciones de prevención para los eventos que generen riesgos y comprende planes con respecto a accidentes de trabajo.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nº 1054
(22 NOV 2010)

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Considerando que el proyecto cuenta con concesión de 30 años para hacer la exploración técnica y explotación económica, se realizarán dos (2) visitas anuales por el Equipo Técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, para Evaluación de Aspectos Técnicos y Físicos.

Que se hará explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción de acuerdo al contrato de concesión No FFU – 142, el cual cuenta con un área de 109.71 Hectáreas.

Las actividades que se plantean ocasionaran efectos negativos sobre los recursos naturales renovables que allí se encuentran y sobre el medio ambiente, sin embargo, éstos pueden ser mitigados por ser transitorios y de valoración baja.

Las actividades de exploración técnica, explotación económica y beneficio se realizaran de acuerdo al Programa de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por el INGEOMINAS.

El proyecto generará fuentes de empleo en todas sus fases.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase Licencia Ambiental a la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en calidad de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, para las actividades de "Exploración y explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción" la cual está localizada en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan en jurisdicción del municipio de Toluviejo, por considerar que los efectos negativos que se causaran a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el contrato Nº FFU - 142 del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, permite la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción.

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, deberá adecuar las vías del predio donde se realizara la extracción de material, con la seguridad vial que el caso amerita, ello se puede realizar con maquinarias en buen estado o con otros elementos que garanticen tal objetivo, sin deteriorar el paisaje.

ARTÍCULO CUARTO: El proyecto tiene un contrato de concesión tendrá una duración total de (30) treinta años, y el plan de manejo ambiental tendrá una duración igual la vida útil, sin embargo las actividades de mantenimiento y seguimiento serán rutinarias.

ARTÍCULO QUINTO: El peticionario deberá cumplir con el Plan de Trabajos y Obras, las construcciones, instalaciones y montajes mineros deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en este.

ARTÍCULO SEXTO: Que la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID**, deberá adoptar las medidas y disponer del personar y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas al proyecto de acuerdo a los normas sobres seguridad e higiene y salud ocupacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante la Operación se desarrollara el plan de monitoreo haciendo énfasis en los análisis de las aguas superficiales con el fin de garantizar la eficacia de las medidas diseñadas en el PMA.

ARTÍCULO OCTAVO: El responsable del proyecto deberá darle cumplimiento a las medidas contenidas en el EIA aprobado por CARSUCRE.

ARTÍCULO NOVENO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las siguientes obligaciones y medidas:

9.1. Llevar un registro e inventario actualizado de la producción en boca de mina y en sitios de acopio para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio.

9.2. Demarcarán con cintas amarillas las zonas donde se esté realizando cualquier tipo de excavación.

9.3. La maquinaria y equipos a emplear en la obra, no deben presentar fugas de aceite, combustibles y contar con sus respectivos filtros de aire y silenciadores.

9.4. El transporte de materiales se hará cumpliendo lo estipulado en el Articulo 2 de la Resolución 541/94, en cuanto al cargue, descargue y transporte de material de construcción.

9.5. Los cortes de suelo que se tengan que realizar, se ejecutará mediante impregnación previa, con lo que se evitará una excesiva emisión de material Particulado en verano y en invierno evitar el arrastre de material

9.6. Por ningún motivo se dispondrá material excedente producto de las excavaciones en lotes vecinos o cuerpos de aguas.

9.7. Se tendrá especial control en hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial, con el fin de prevenir accidentes.

9.8. Proyectar actividades de Revegetalización en las áreas perimetrales, cumpliendo con el programa descrito en el PMA.

9.9. Sensibilizar a los operarios del sistema en temas ambientales de manera que se logre una buena sostenibilidad de los recursos naturales.

9.10. Presentar semestralmente la información general referente a la evolución de las fases de construcción y operación en cumplimiento con el PMA.

9.11. Los trabajos deberán realizarse de tal forma que no causen daño a cualquier estructura, cultivos o propiedades cuya destrucción o deterioro no estén contemplados dentro del Plan de Manejo, ni sean necesarios para la construcción de las obras. El contratista será responsable por todo daño o perjuicio resultante de a contravención de estas normas.

9.12. Las reforestaciones a realizar deberán hacerse con especies nativas, recuperadoras de suelos o fijadoras de nitrógeno y que soporten este tipo de suelos. En las zonas aledañas a los cuerpos de agua utilizar aquellas que se adapten a estas condiciones con la finalidad de proteger los mismos.

9.13. En las denominadas zonas críticas se hace necesario realizar obras de restauración, mitigación y/o compensación con vegetación nativa en las cantidades y condiciones que la interventoría del proyecto lo requiera.

9.14. Las labores de descapote de la capa vegetal deberá hacerse te tal forma que en lo posible se conserve ésta y pueda ser almacenada y conservada adecuadamente en forma de cespedones cuando las condiciones lo permitan.

9.15. Establecer un vivero dentro del área de influencia de acuerdo con lo establecido en el EIA para la producción de semillas.

9.16. Se debe mantener siempre plateado alrededor de la planta en un diámetro de 1 m. Los fertilizantes a aplicar deben tener mayores cantidades de potasio y nitrógeno, sin olvidar los demás elementos. A los tres meses de sembrada la plántula se debe fertilizar nuevamente la zona de plateo con 20 gr de abono, a los 6 meses con 60 gr de abono y al año con 100 gr de abono.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las medidas y obligaciones que contienen la presente Resolución, se verificarán mediante visitas de seguimiento por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Para el uso de explosivos en las actividades de explotación de la caliza, se deberá acatar las disposiciones del Código de Minas en esta materia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El peticionario del proyecto deberá efectuar un seguimiento ambiental en forma directa o a través de una Interventoría contratada con una firma especializada, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas Plan de Manejo Ambiental. La Interventoría Ambiental deberá presentar a CARSUCRE informes semestrales acerca del avance y cumplimiento de los respectivos Planes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier afectación que ocurra a los recursos naturales renovables y del medio ambiente en desarrollo del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de concesionario del contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Cualquier modificación que sufra el proyecto, deberá ser notificada a CARSUCRE, en forma inmediata, para que la Subdirección de Gestión Ambiental, tome las decisiones del caso.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las normas ambientales vigentes y aquellas que posteriormente sufran modificaciones

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN
(22 NOV 2010) № 1054
"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario de la presente Resolución debe adelantar ante las autoridades o entidades que así lo exijan los permisos, autorizaciones o licencias, concesiones o adjudicaciones que no sean de competencia de la autoridad ambiental necesarias para llevar a cabo el presente proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Procuraduría Judicial y Agraria, y Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y 45 del Código Contencioso Administrativo, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Corporación, a costa del interesado quien debe consignar en la cuenta número 650-04031-4 del Banco Popular de la ciudad de Sincelejo, a favor de CARSUCRE, la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 12.779,00) por cada página, y entregar el recibo de consignación correspondiente en la Secretaría General para ser agregado al expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado por:
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE

Proyectó: Ruby De la Ossa Gracia
Revisó: YURI DE ARCO ROBLES/Secretaria General

153

CARSUCRE

Libertad y Orden.
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
República de Colombia.

300.28
EXP. 865

RESOLUCIÓN (22 NOV 2010) **№ 1054**

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE-CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y su Decreto Reglamentario No. 1220 de 2005, y

CONSIDERANDO

Que mediante Auto No.0556 de 17 de marzo de 2010, se acogió la liquidación realizada por la Subdirección de Gestión Ambiental para la cancelación de los costos de evaluación y seguimiento del proyecto Explotación de un Yacimiento de Caliza, dolomita, arcilla y materiales ubicado en la vía Toluviejo - Macaján, municipio de Toluviejo, departamento de Sucre, equivalente a la suma de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($739.793), los cuales fueron consignados mediante recibo de caja No.452 de 223 de marzo de 2010.

Que mediante Auto No.0691 de 6 de abril de 2010, se remite el expediente a la Subdirección de Gestión Ambiental para que funcionarios de dicha dependencia practiquen visita de inspección ocular y Técnica y emitan Concepto.

Que funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental emiten Concepto Técnico No.0400 de 3 de mayo de 2010, el que expresa la viabilidad del permiso, previa las siguientes consideraciones:

DESCRIPCION DEL PROYECTO.

Localización: El proyecto está localizado en jurisdicción del municipio de Toluviejo, Departamento de Sucre, en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan, el polígono del área de concesión se enmarca dentro de las coordenadas:

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
P.A	852.090,00	1.542.415,00
1	853.373,90	1.541.529,60
2	853.373,90	1.539.684,00
3	853.127,00	1.539.524,00
4	852.710,00	1.539.458,70
5	852.707,00	1.539.457,60
6	852.702,00	1.539.457,60
7	852.702,00	1.539.460080
8	852.700,00	1.539.460,00
9	852.683,00	1.539.724,00

22 NOV 2010

PUNTO INICIAL	COORDENADAS	
	X	Y
10	852.662,00	1.540.060,00
11	852.660,00	1.540.056,00
12	852.681,00	1.540.153,00

Área del Titulo FFU – 142: 109.71 Hectáreas

Descripción De Procesos y Operaciones:
Se empleará el sistema de explotación a cielo abierto, conformando bancos escalonados de dos (2) metros de altura por el ancho que permita la pendiente inicial del terreno en el momento de empezar la explotación, el cual debe ser lo suficientemente amplio para garantizar el tránsito normal del equipo de explotación, cargue y transporte.

Descapote. Para realizar la operación de explotación es requisito previo llevar a cabo la labor de descapote, siendo necesario remover los materiales fracturados y sueltos que hace parte del banco de recebo, diseminada en una matriz limo arcillosa, útil para ser empleada en la fabricación de ciclópeos y/o base para trituración. Además hay que hacer remoción de las limolitas arenosas que suprayacen el banco de recebo, almacenándose en botadero seleccionado para tal fin.

Perforación y Voladura
En el arranque del arterial se empleará perforación neumática Y voladura con explosivos teniendo en cuenta las especificaciones contempladas en el PMA.

Equipos de Cantera. Los equipos a utilizaran las labores de explotación son:
- Un compresor portátil de 260 CFM a 100 psi
- Un buldózer tipo Cat D6, alquilado.
- Un cargador tipo Cat 930

Seguridad Minera e Industrial. Durante el desarrollo de las operaciones mineras y de beneficio se tendrá muy en cuenta el aspecto de seguridad, cumpliendo con la reglamentación existente tanto en Seguridad Social como de Riesgos Profesionales, haciendo énfasis en el cumplimiento de las normas para manejo y uso de explosivos en explotaciones a cielo abierto

SISTEMA DE BENEFICIO
Se empleará una planta trituradora que produzca los tamaños de material más utilizada en la región así:

- **Gruesa:**	Con diámetros entre 1" y 1 ½"	25%
- **Triturado:**	Con tamaño entre ½" y 1"	43%
- **Fina:**	Entre ¼" y ½"	25%
- **Polvillo:**	Por debajo de **1** mm de diámetro	7%

La planta para triturar la roca obtenida en la explotación, estará ubicada en sitio estratégico asignado para tal fin, operará con energía eléctrica de 440 V durante ocho (8) horas diarias de lunes a sábado.

TECNOLOGÍAS
La tecnología minera aplicar es típica de una explotación semimecanizada, al alcance de la titular, que permita obtener rendimientos acordes con la utilización de medianos equipos de perforación, empleando explosivos convencionales, realizando una explotación técnica y racional con criterios de desarrollo sostenible, causando del menor daño posible a la naturaleza y recuperando las áreas afectadas.

MAQUINARIA, EQUIPO Y ACCESORIOS

- Dos volquetas de 12 t de capacidad.
- Un transformador eléctrico de 112.5 KVA
- Sistema de contactores y arrancadores para trituradora,.
- Cable para instalación eléctrica a 220 V y 440 V.
- Una trituradora de quijadas o mandíbula de 10" x 20".

MANEJO POST – EXPLOTACIÓN.

Una vez realizada la explotación y verificado que ya no existe posibilidad de encontrar más roca, o que las condiciones técnico económicas actuales no permiten la extracción de más caliza, se procederá al abandono siguiendo en orden el siguiente plan.

- Determinación área a recuperar
- Construcción de zanjas para drenaje
- Traslado de materia vegetal hacia el sitio de recuperación
- Fertilización del suelo
- Montaje Sistema de regadío para vegetación a plantar
- Plantación de especies vegetales
- Cuidado y mantenimiento de las especies plantadas

LINEA BASE AMBIENTAL

Geologia, geomorfologia geotecnia y otros

Regionalmente el yacimiento de caliza hace parte del costado occidental del anticlinal de Toluviejo, donde afloran varios cuerpos de rocas sedimentarias, discordantes, con formaciones superficiales costeras, véase plano 6 y columna estratigráfica. La zona montañosa, presenta un perfil generalizado constituido por conglomerados. Areniscas, arcillolitas, lutitas, margas, calizas, limolitas y sedimentos cuaternarios coluvio – aluviales, que van desde la cota 50 msnm, hasta la 300 msnm. Localmente, el reconocimiento geológico se hizo mediante la construcción de una serie de trincheras y de accesos al sector mineralizado; encontrando una serie de estratos de calizas y de marga, orientados en dirección N 20° E y buzamiento 35° a 45° NW, cuyas proyecciones en profundidad tienen un comportamiento que varía desde anticlinal a sinclinal.

Geotecnia. Las áreas del Contrato FFU – 142 son muy estables, tienen pendientes fuertes, moderadas y suaves, como se observa en el plano de los titulos. La actividad minera a desarrollar en la ejecución del proyecto causará un impacto técnicamente manejable y garantiza mejorar la estabilidad, al manejar adecuadamente la explotación, aguas escorrentías y disposición de estériles.

Hidrografia. Dentro del área del proyecto se encuentran pequeñas quebradas o arroyos (Arroyo Grande), donde ninguno de los cuales poseen flujo permanente, es decir que solo conducen aguas en tiempo lluvioso, descendiendo desde el cerro hacia la parte plana.

Suelos: Los suelos de la región, se caracterizan por sus pendientes suaves a fuertes en el cerro, mientras que en la parte baja son bastante planas; con erosión mínima, sin alcanzar una perfecta madurez, ya que en algunos casos sus horizontes no se encuentran claramente definidos.

Los suelos de la parte baja se utilizan hoy en día en pastizales para ganaderia y hay varias parcelas donde los campesinos siembran pequeños cultivos propios de la región. En la ladera se encuentra bosque y algunos frentes de extracción minera.

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

La metodologia utilizada en el presente estudio consiste en matrices, tablas de doble entrada donde en un eje aparecen actividades y operaciones y en el otro las listas de chequeo de indicadores de posibles impactos. Solo se consideran los impactos generados por la explotación y transformación del material calcáreo en el sitio del estudio, tales como: alteración del suelo, erosión, alteración de cursos de aguas de escorrentía, calidad de aire, cambios en el valor de la tierra, emisión de gases y partículas sólidas, generación de empleo.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En este plan se incluye fundamentalmente, la articulación espacial y temporal de las medidas de manejo ambiental tendientes a la prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos negativos atribuibles a la explotación de los sitios establecidos. El plan incluye los diseños tipos de acciones de manejo ambiental, sus costos, así como un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general del proyecto, evitando con esto la generación de impactos secundarios o la agravación de los previstos. Con base en los riesgos y en los impactos generados durante el proyecto, a continuación se dan las medidas de control que deberán realizarse durante cada una de las actividades del proyecto.

MEDIDAS DE IMPLEMENTACION DEL PMA

- Prevención de contaminación por derrame de combustibles
- Prevención de efectos sobre el suelo
- Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos
- Reducción de emisiones atmosféricas y ruido
- Conservación de sitios arqueológicos
- Recuperación de comunidades vegetales
- Mitigación de impactos sobre la fauna y flora
- Mejoramiento de calidad visual
- Protección de taludes
- Señalización de áreas de trabajo
- Plan estratégico de gestión social
- Educación ambiental

COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El costo del plan de manejo es de $8.120.000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
El Plan de Manejo Ambiental tendrá una duración igual a la vida útil del proyecto.

PLAN DE CONTINGENCIA

Establece acciones de prevención para los eventos que generen riesgos y comprende planes con respecto a accidentes de trabajo.

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN Nº 1054
(22 NOV 2010)

"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Considerando que el proyecto cuenta con concesión de 30 años para hacer la exploración técnica y explotación económica, se realizarán dos (2) visitas anuales por el Equipo Técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE, para Evaluación de Aspectos Técnicos y Físicos.

Que se hará explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción de acuerdo al contrato de concesión No FFU – 142, el cual cuenta con un área de 109.71 Hectáreas.

Las actividades que se plantean ocasionaran efectos negativos sobre los recursos naturales renovables que allí se encuentran y sobre el medio ambiente, sin embargo, éstos pueden ser mitigados por ser transitorios y de valoración baja.

Las actividades de exploración técnica, explotación económica y beneficio se realizaran de acuerdo al Programa de Trabajo y Obras (PTO) aprobado por el INGEOMINAS.

El proyecto generará fuentes de empleo en todas sus fases.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Concédase Licencia Ambiental a la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en calidad de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, para las actividades de "Exploración y explotación de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción" la cual está localizada en la intersección del arroyo Grande con la vía Toluviejo – Macajan en jurisdicción del municipio de Toluviejo, por considerar que los efectos negativos que se causaran a los recursos naturales renovables y al medio ambiente pueden ser mitigables y compensables.

ARTÍCULO SEGUNDO: Mediante el contrato Nº FFU - 142 del Instituto Colombiano de Geología y Minería –INGEOMINAS, permite la exploración técnica y explotación económica de un yacimiento de caliza, dolomita, arcilla y materiales de construcción.

ARTÍCULO TERCERO: La señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de de concesionario del contrato Nº FFU - 142 de INGEOMINAS, deberá adecuar las vías del predio donde se realizara la extracción de material, con la seguridad vial que el caso amerita, ello se puede realizar con maquinarias en buen estado o con otros elementos que garanticen tal objetivo, sin deteriorar el paisaje.

ARTÍCULO CUARTO: El proyecto tiene un contrato de concesión tendrá una duración total de (30) treinta años, y el plan de manejo ambiental tendrá una duración igual la vida útil, sin embargo las actividades de mantenimiento y seguimiento serán rutinarias.

ARTÍCULO QUINTO: El peticionario deberá cumplir con el Plan de Trabajos y Obras, las construcciones, instalaciones y montajes mineros deben tener las características, dimensiones y calidades señaladas en este.

ARTÍCULO SEXTO: Que la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID**, deberá adoptar las medidas y disponer del personar y de los medios materiales necesarios para preservar la vida e integridad de las personas vinculadas al proyecto de acuerdo a los normas sobres seguridad e higiene y salud ocupacional.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Durante la Operación se desarrollara el plan de monitoreo haciendo énfasis en los análisis de las aguas superficiales con el fin de garantizar la eficacia de las medidas diseñadas en el PMA.

ARTÍCULO OCTAVO: El responsable del proyecto deberá darle cumplimiento a las medidas contenidas en el EIA aprobado por CARSUCRE.

ARTÍCULO NOVENO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las siguientes obligaciones y medidas:

9.1. Llevar un registro e inventario actualizado de la producción en boca de mina y en sitios de acopio para establecer en todo tiempo los volúmenes de los minerales en bruto y de los entregados a las plantas de beneficio.

9.2. Demarcarán con cintas amarillas las zonas donde se esté realizando cualquier tipo de excavación.

9.3. La maquinaria y equipos a emplear en la obra, no deben presentar fugas de aceite, combustibles y contar con sus respectivos filtros de aire y silenciadores.

9.4. El transporte de materiales se hará cumpliendo lo estipulado en el Articulo 2 de la Resolución 541/94, en cuanto al cargue, descargue y transporte de material de construcción.

9.5. Los cortes de suelo que se tengan que realizar, se ejecutará mediante impregnación previa, con lo que se evitará una excesiva emisión de material Particulado en verano y en invierno evitar el arrastre de material

9.6. Por ningún motivo se dispondrá material excedente producto de las excavaciones en lotes vecinos o cuerpos de aguas.

9.7. Se tendrá especial control en hacer cumplir todas las normas sobre seguridad industrial, con el fin de prevenir accidentes.

9.8. Proyectar actividades de Revegetalización en las áreas perimetrales, cumpliendo con el programa descrito en el PMA.

9.9. Sensibilizar a los operarios del sistema en temas ambientales de manera que se logre una buena sostenibilidad de los recursos naturales.

9.10. Presentar semestralmente la información general referente a la evolución de las fases de construcción y operación en cumplimiento con el PMA.

9.11. Los trabajos deberán realizarse de tal forma que no causen daño a cualquier estructura, cultivos o propiedades cuya destrucción o deterioro no estén contemplados dentro del Plan de Manejo, ni sean necesarios para la construcción de las obras. El contratista será responsable por todo daño o perjuicio resultante de a contravención de estas normas.

9.12. Las reforestaciones a realizar deberán hacerse con especies nativas, recuperadoras de suelos o fijadoras de nitrógeno y que soporten este tipo de suelos. En las zonas aledañas a los cuerpos de agua utilizar aquellas que se adapten a estas condiciones con la finalidad de proteger los mismos.

9.13. En las denominadas zonas críticas se hace necesario realizar obras de restauración, mitigación y/o compensación con vegetación nativa en las cantidades y condiciones que la interventoría del proyecto lo requiera.

9.14. Las labores de descapote de la capa vegetal deberá hacerse te tal forma que en lo posible se conserve ésta y pueda ser almacenada y conservada adecuadamente en forma de cespedones cuando las condiciones lo permitan.

9.15. Establecer un vivero dentro del área de influencia de acuerdo con lo establecido en el EIA para la producción de semillas.

9.16. Se debe mantener siempre plateado alrededor de la planta en un diámetro de 1 m. Los fertilizantes a aplicar deben tener mayores cantidades de potasio y nitrógeno, sin olvidar los demás elementos. A los tres meses de sembrada la plántula se debe fertilizar nuevamente la zona de plateo con 20 gr de abono, a los 6 meses con 60 gr de abono y al año con 100 gr de abono.

ARTÍCULO DÉCIMO: Las medidas y obligaciones que contienen la presente Resolución, se verificarán mediante visitas de seguimiento por funcionarios de la Subdirección de Gestión Ambiental de CARSUCRE.

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Para el uso de explosivos en las actividades de explotación de la caliza, se deberá acatar las disposiciones del Código de Minas en esta materia.

ARTÍCULO DUODÉCIMO: El peticionario del proyecto deberá efectuar un seguimiento ambiental en forma directa o a través de una Interventoría contratada con una firma especializada, con el fin de supervisar las actividades y verificar el cumplimiento de las obligaciones señaladas Plan de Manejo Ambiental. La Interventoría Ambiental deberá presentar a CARSUCRE informes semestrales acerca del avance y cumplimiento de los respectivos Planes.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Cualquier afectación que ocurra a los recursos naturales renovables y del medio ambiente en desarrollo del proyecto, será responsabilidad única y exclusiva de la señora **MARIA DEL CARMEN FADUL CHADID,** en su calidad de concesionario del contrato.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Cualquier modificación que sufra el proyecto, deberá ser notificada a CARSUCRE, en forma inmediata, para que la Subdirección de Gestión Ambiental, tome las decisiones del caso.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El responsable del proyecto deberá cumplir con las normas ambientales vigentes y aquellas que posteriormente sufran modificaciones

CONTINUACIÓN RESOLUCIÓN
(22 NOV 2010) № 1054
"POR LA CUAL SE CONCEDE UNA LICENCIA AMBIENTAL Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES"

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El beneficiario de la presente Resolución debe adelantar ante las autoridades o entidades que así lo exijan los permisos, autorizaciones o licencias, concesiones o adjudicaciones que no sean de competencia de la autoridad ambiental necesarias para llevar a cabo el presente proyecto.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Envíese copia de la presente Resolución a la Procuraduría Judicial y Agraria, y Subdirección de Gestión Ambiental para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, y 45 del Código Contencioso Administrativo, publíquese la presente resolución en el Diario Oficial de la Corporación, a costa del interesado quien debe consignar en la cuenta número 650-04031-4 del Banco Popular de la ciudad de Sincelejo, a favor de CARSUCRE, la suma de DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($ 12.779,00) por cada página, y entregar el recibo de consignación correspondiente en la Secretaría General para ser agregado al expediente.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Original firmado por:
ORLANDO DE LA OSSA NADJAR
Director General
CARSUCRE

Proyectó: Ruby De la Ossa Gracia
Revisó: YURI DE ARCO ROBLES/Secretaria General

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

FECHA DE CALIBRACIÓN: *Date of Calibration*	26 de enero de 2022
SOLICITANTE: *Customer*	INGENIERÍA GEOTECNIA Y SUELOS S.A.S.
DIRECCIÓN: *Address*	CR 27 # 11-24
CIUDAD: *City*	Sincelejo, Sucre
INSTRUMENTO: *Instrument*	Máquina De Ensayo a Compresión
MARCA: *Brand*	Coltest
MODELO: *Model*	C-256
SERIE: *Serial*	524
TIPO: *Type*	Digital
CAPACIDAD: *Capacity*	100,0 - 1000,0 kN
NÚMERO DE PAGINAS: *Number of Pages*	TRES (3)
PATRÓN DE REFERENCIA: *Reference Standard*	TRANSDUCTOR DE FUERZA FABRICANTE: ELE MODELO: HP2 7HB SERIE: 1-052-9-2 029 CERTIFICADO No.CNM-6917-85/19

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente
This certificate is an accurate record of the perfomed measurements results. This certificate may not be partially or totaly reproduced,
El usuario es responsable de la recalibración de sus instrumentos a intervalos apropiados.
The user is responsable for having his instruments calibrated at appropiate intervals.
Los patrones de de calibración son trazados por la empresa Meister Ingeniería SAS

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

COLTEST INGENIERIA S.A.S
EL PRINCIPIO DE LA CALIDAD

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

MÉTODO: COMPARACIÓN
División de Escala: 0,1 kN

TEMPERATURA: 20°C
HUMEDAD RELATIVA: 72%

RESULTADO DE LA CALIBRACIÓN

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO BAJO PRUEBA (1000,0kN)				
INSTRUMENTO		PATRÓN		
(%)	(kN)	(kN)	(kN)	(kN)
10	100,0	99,0	99,2	99,3
20	200,0	200,3	199,	201,6
30	300,0	300,1	298,4	302,0
40	400,0	402,8	40,5	401,1
50	500,0	503,2	506,2	501,7
60	600,0	604.1	603,1	604,0
70	700,0	704,9	701,7	704,7
80	800,0	807.6	803,1	805,0
90	900,0	904,9	903,2	905,2
	CERO	0,0	0,0	0,0

Promedio	Exactitud	Repetibilidad	Resolución	Reversibilidad	Incertidumbre
(kN)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
99,20	0,81	0,40	0,10	-	0,44
200,55	-0,27	0,75	0,05	-	0,53
300,10	-0,03	0,47	0,03	-	0,64
401,40	-0,35	0,25	0,02	-	0,53
501,80	-0,36	0,68	0,02	-	0,61
604,05	-0,67	0,12	0,02	-	0,45
705,75	-0,81	0,01	0,01	-	0,57
805,95	-0,74	0,41	0,01	-	0,68
906,25	-0,69	0,10	0,01	-	0,57

Según los errores anteriores, y de acuerdo con la NTC 7500-1:2007, la maquina se encuentra en **CLASE 1**, desde el 10% hasta el 90% de su capacidad total

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Calibration Certificate

NÚMERO: NC 2565
Number

MAGNITUD: FUERZA
Magnitude

La incertidumbre reportada se ha determinado multiplicando la incertidumbre estándar combinada, por el factor de cubrimiento k = 2, con el cual se logra un nivel de confianza del 95,45 %, aproximadamente.

TRAZABILIDAD

COLTEST INGENIERÍA, asegura el mantenimiento de la trazabilidad de los patrones de trabajo, utilizados en las mediciones, los cuales han sido certificados por el CENAM.

OBSERVACIONES

Una nueva calibración se deberá llevar a cabo cuando el instrumento sea sometido a reparaciones, ajustes ó uso inapropiado; independientemente del tiempo transcurrido desde la presente calibración.

Calibró:

HUGO ERNESTO FERNANDEZ TORRES
Metrólogo

Aprobó:

NICOLAS HERNANDEZ
Director de Gestión y Calidad

FIN DE CERTIFICADO

Calle 24F No. 100B-08 Bogotá -TEL 287 86 47 - 315 6089819
Email: coltestingenieria@homtail.com / coltestingenieria@gmail.com

Anexo 21. Acta de Vecindad

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 22. Actas de concertación

NO SE APROBARON DIAGNÓSTICOS EN EL PERIODO DEL INFORME MENSUAL

Anexo 23. Acta de recibo parcial y balance presupuestal de interventoría

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 10

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220585

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA : Gavinco Ingenieros Consultores SAS

SUPERVISOR: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ

PERÍODO A PAGAR: **DEL 13/01/2023 AL 13/02/2023**

En Bogotá D.C., a los trece (15) días del mes de febrero del año 2023 se reunieron Luz Andrea Fajardo Corredor Representante legal de Interventoría y Juan David Amón Rodriguez Supervisor del Contrato , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	11	$ 21.170.211,00	$ 232.872.321,01	9,00	1,00	10,00	$ 190.531.899,00	$ 21.170.211,00	$ 211.702.110,00	1,00	$ 21.170.211,01
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 291.090.401,26	$ 291.090.401,26	0,6225	-	0,6225	$ 181.210.632,60	$ -	$ 181.210.632,60	0,38	$ 109.879.768,66
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 58.218.080,25	$ 58.218.080,25	-	-	-	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 58.218.080,25
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 582.180.802,52**				**$ 371.742.531,60**	**$ 21.170.211,00**	**$ 392.912.742,60**		**$ 189.268.059,92**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 110.614.352,48**				**$ 70.631.081,00**	**$ 4.022.340,09**	**$ 74.653.421,09**		**$ 35.960.931,39**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				N/A	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19%**			$ 110.614.352,48				$ 70.631.081,00	$ 4.022.340,09	$ 74.653.421,09		$ 35.960.931,39
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 692.795.155,00**				**$ 442.373.612,60**	**$ 25.192.551,09**	**$ 467.566.163,69**		**$ 225.228.991,31**

Nota 1: A partir de la presente acta se ajustan los valores de los ítems de interventoría en vitud del Otrosí No.1 suscrito el 13 de diciembre de 2022

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRA	**$ 542.723.071,00**	**V/R ANTICIPO:**	**N/A**
V/R ADICIONES:	$ 150.072.084,00	**% ANTICIPO :**	**N/A**
V/R ACTUAL CONTR	$ 692.795.155,00	**% RETEGARANTIA :**	**N/A**

Valor Actividad No.3 del Clo de Obra	**$ 4.909.791.068,00**
Valor Acumulado Actividad No. 3 ejecutado según Acta Parcial No. 6 del Clo de Obra	**$ 3.096.574.287,03**
Porcentaje de Avance Actividad No. 3	**62,25%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de abril de 2022 al 13 de mayo de 2022	3-may.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 515.586.917,45	3,9169%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de mayo de 2022 al 13 de junio de 2022	6-jul.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 488.450.763,90	7,8338%
3	Acta No. 03 de pago del 40% del Mes 3 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de junio de 2022 al 12 de julio de 2022	3-ago.-22	$ 27.136.153,55	3,9169%	N/A	N/A	N/A	$ 27.136.153,55	$ 461.314.610,35	11,7507%
4	Acta No. 04 de pago del 40% del Mes 4 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de julio de 2022 al 12 de agosto de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 13 de abril de 2022 al 01 de agosto de 2022	5-sep.-22	$ 36.878.032,68	5,3231%	N/A	N/A	N/A	$ 36.878.032,68	$ 424.436.577,67	17,0738%
5	Acta No. 05 de pago del 40% del Mes 5 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de agosto de 2022 al 12 de septiembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 02 de agosto de 2022 al 21 de agosto de 2022	3-oct.-22	$ 48.329.489,48	6,9760%	N/A	N/A	N/A	$ 48.329.489,48	$ 376.107.088,20	24,0498%
6	Acta No. 06 de pago del 40% del Mes 6 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de septiembre de 2022 al 12 de octubre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 21 de agosto de 2022 al 19 de septiembre de 2022	28-oct.-22	$ 49.224.982,54	7,1053%	N/A	N/A	N/A	$ 49.224.982,54	$ 326.882.105,66	31,1551%
7	Acta No. 07 de pago del 40% del Mes 7 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de octubre de 2022 al 12 de noviembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de septiembre de 2022 al 19 de octubre de 2022	28-nov.-22	$ 69.495.689,24	10,0312%	N/A	N/A	N/A	$ 69.495.689,24	$ 257.386.416,42	41,1863%
8	Acta No. 08 de pago del 40% del Mes 8 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de noviembre de 2022 al 13 de diciembre de 2022 y 50% de avance de obra del periodo del 20 de octubre de 2022 al 21 de noviembre de 2022	15-dic.-22	$ 54.489.396,32	7,8652%	N/A	N/A	N/A	$ 54.489.396,32	$ 202.897.020,10	49,0514%
9	Acta No. 09 de pago del 40% del Mes 9 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de diciembre de 2022 al 13 de enero de 2023 y 50% de avance de obra del periodo del 22 de noviembre de 2022 al 09 de diciembre de 2022.	27-ene.-23	$ 102.547.561,70	14,8020%	N/A	N/A	N/A	$ 102.547.561,70	$ 250.421.542,40	63,8535%
10	Acta No. 10 de pago del 40% del Mes 10 de Interventoría comprendido al periodo del 13 de enero de 2023 al 13 de febrero de 2023.		$ 25.192.551,09	3,6364%	N/A	N/A	N/A	$ 25.192.551,09	$ 225.228.991,31	67,4898%
	TOTAL		**$ 467.566.163,69**	**67,4898%**	-	-	-	**$ 467.566.163,69**	**$ 202.897.020,10**	**67,4898%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 15 de febrero de 2023

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Aprobó

Firma:
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Anexo 24. Control de equipos

enterritorio	**CONTROL DE EQUIPOS**	CÓDIGO	**F-GG-22**
		VERSIÓN	**01**
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	**2020-10-19**


INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2023 **Y EL** 28/02/2023 **FECHA INICIO** 13/04/2022

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA **CONTRATO No.** 2220577

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **CONTRATO No.** 2220585

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CORTADORA MARCA MAKITA M 2401 120V-15A (50 -60 Hz)	X	X	X		Bodega principal	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	
PULIDORA 1 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.
PULIDORA 2 MARCA INCCO 8600 RPM	X	X	X		Bodega ubicada en el Barrio El Poblado.	Corte de acero, alambres, ladrillos, ceramimica	Este equipo tambien se traslada a las viviendas intervenidas donde se requiera su uso para la actividad descrita.



Firma:

Nombre: Edgar Aragon Otero

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

M2401B *Tronzadora*



203 191953-5

Potencia de entrada	2.000 W
Diámetro del disco	355 mm (14")
Velocidad sin carga (rpm)	3,8
Dimensiones (L x A x A)	500 x 280 x 620 mm
Peso	1.2 kg
Cable de conexión	2.5 m

Disco de corte, llave.

PULIDORA 9" INDUSTRIAL

DWE490

Potencia	2200W
Voltaje	120V
Velocidad (RPM)	6.500
Tamaño Disco	9" (230 mm)
Velocidad Variable	No
Peso	5,2 Kg



INCLUYE: Guarda Protectora, Flanges y Mango Lateral.

GARANTÍA HERRAMIENTA

3 AÑOS Garantía Limitada

1 AÑO Mantenimiento Gratis

90 DÍAS Satisfacción Garantizada

DEWALT

Anexo 25. Control de inspección y ensayos

	CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	CÓDIGO:	F-GG-23
enterritorio		VERSIÓN:	1
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-19

FECHA DE PRESENTACIÓN:		**INFORME MENSUAL DEL**	**1-feb**	**AL**	**28-feb**	
CONTRATO No. :	INA-032-2021					
OBJETO:	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre					
CONTRATISTA:	CONSORCIO TURQUIA					
INTERVENTOR:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.					
SUPERVISOR:	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERROTORIO					

MEDIANTE EL PRESENTE FORMATO, EL INTERVENTOR CERTIFICA QUE LOS ÍTEMS DE PROYECTO QUE SE PAGARÁN, CUMPLEN EN TODOS LOS CASOS CON TODAS LAS NORMAS TÉCNICAS APLICABLES Y CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1595 DE 2015 LOS QUE LE MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

1. Si para el producto (bien o servicio), proceso o procedimiento se exigen requisitos por un Reglamento Técnico, decreto o ley (página web del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo), obligatoriamente se declarará la conformidad y será entregable verificado previa presentación del certificado de conformidad de producto, sello de calidad o ensayos en laboratorio acreditado.

2. Si el producto (bien o servicios) proceso o procedimiento no está regido por un Reglamento técnico obligatorio, decreto o ley pero el contrato en su texto, en una especificación, el diseño, los planos u otro documento o requisito contractual cualquiera que sea se indica el cumplimiento de una norma (NTC, internacional, nacional o sectorial) o requisito particular o general, para declarar conforme ese bien o servicio y declararse entregable verificado, debe contar obligatoriamente con ensayo o cumplimiento de protocolo donde conste la conformidad con el requisito exigido.

1. LABORATORIOS ACREDITADOS Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

La Interventoría de Contrato CERTIFICA que la totalidad de los resultados de conformidad que se relacionan en este informe y anexan (anexo digital), se obtuvieron: en laboratorios acreditados cuando el bien o servicio está especificado y/o normado por un Reglamento Técnico Obligatorio, ley o decreto; cuando el proceso, procedimiento, bien o servicio no esta regido por un Reglamento técnico obligatorio, ley o decreto pero el Contrato lo exige, la conformidad de calidad se declaró mediante ensayo realizado con equipos de medición calibrados o verificación de cumplimiento de protocolo, bajo el control y seguimiento de un profesional capacitado e idóneo quien suscribe el registro del ensayo o protocolo en particular (anexo digital); en este último caso, se incluye en este formato la acreditación del laboratorio (anexo digital) si así lo exige el Contrato o acuerdo entre las partes. A continuación se relacionan los laboratorios acreditados y no acreditados donde se realizaron los ensayos y certificados de calibración de equipos utilizados (anexo digital).

1. 1. LABORATORIOS ACREDITADOS -EXIGIDO CUANDO EL BIEN O SERVICIO SE RIGE POR REGLAMENTO TÉCNICO OBLIGATORIO, LEY O DECRETO

Laboratorio		Certificado de Acreditación	Vigencia de la acreditación		Ensayos realizados en este laboratorio
Código (1)	Nombre		Desde	Hasta	
N/A	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	NO APLICA	N/A	N/A	COMPRESION DE CILINDROS
	Adicione las filas necesarias				

(1) Para efectos de trazabilidad y control, asignar a cada laboratorio un código LAC (Laboratorio Acreditado) seguido de un número consecutivo, sin repetir y sin anular desde el inicio del proyecto hasta el final.

1.1.1. EQUIPOS - Certificados de calibración

Laboratorio (3)	Serial equipo (2)	Descripción del equipo	Número de Certificado de Calibración	Vigencia certificado de calibración	
				Desde	Hasta
N/A	1-052-9-2-029	TRANSDUCTOR DE FUERZA	No. CNM-6917-85/19	26/01/2022	26/01/2022

(2) Para efectos de trazabilidad y control, relacionar el serial del equipo calibrado, sin repetir desde el inicio del proyecto hasta el final.
(3) Indique en esta casilla, el código del laboratorio donde se encuentra el equipo cuyo certificado de calibración se está informando.

2. ENSAYOS, SELLOS DE CALIDAD, CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD O REGISTRO DE ENSAYO EN LABORATORIO Y/O PROTOCOLOS APLICADOS

Los resultados de ensayos realizados y que se pagan parcial o totalmente en este periodo o períodos posteriores, son los que a continuación se relacionan.

Con el fin de tener trazabilidad de los ensayos, estos se numeran con dos dígitos XX-YY donde XX es el número del periodo del mes de ejecución del Proyecto y YY es el número en estricto orden cronológico del ensayo o certificado; para el primer informe el número de orden XX será 01, para el segundo informe 02 y así sucesivamente.

2.1. ENSAYOS REALIZADOS y/o PROTOCOLOS APLICADOS EN ESTE PERÍODO

No. de Orden			Ensayo			Resultado del Ensayo
XX	YY	Fecha ensayo o aplicac. protocolo	Norma, protocolo o requisito técnico aplicable (exigido)	Nombre de la norma, protocolo o requisito	Código de Laboratorio donde se realizó el ensayo	Observaciones (la observación no pude condicionar la conformidad)
01	4	2/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-366 para un 10,388% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
02	4	2/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-369 para un 10,583% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
03	4	3/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-382 para un 10,506% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
04	4	3/03/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-13	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-383 para un 10,336% De la resistencia CARGA (KN) PARA 28 DIAS**
05	4	21/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-14	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-366 para un 86,83% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**
06	4	21/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-369 para un 89,13% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**

07	4	22/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-382 para un 89,94% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**
08	4	22/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-383 para un 89,16% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**
09	4	23/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-15	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-385 para un 87,92% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**
10	4	25/02/2023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	INV E-410-16	GEOTECNIA Y PAVIMENTOS	**VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-385 para un 88,05% De la resistencia CARGA (KN) PARA 14 DIAS**

2.2. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Y SELLOS DE CALIDAD RECIBIDOS EN ESTE PERIODO

No. de orden		No. Certificado o sello de calidad	Vigencia del Certificado o del sello de calidad		Certificador (entidad acreditada para expedir certificado)	Este sello de calidad o certificado de conformidad ampara los siguientes
XX	YY		Desde	Hasta		
		Certificado 82441679 Acero de refuerzo de 3/8" y 1/2"	3/06/2022	N/A	Ternium	NTC 2289 GR60
		Tanque Plastico Ecoplast	N/A	N/A	ECOPLAST	Norma Tecnica Colombiana NTC 4384
		205 Certificado de calidad cemento gris tipo UG de uso general	N/A	N/A	ULTRACEM	Norma Tecnica Colombiana NTC 121
		Ficha tecnica Bloque No. 04	N/A	N/A	Ceramicas el Cinco	ICONTEC NTC 4205-4017
		Certificado MAL-38045 Acero No. 04	N/A	N/A	Grupo Siderurgico Reyna	NTC 2289
		Tubos de Presion 1/2" RDE 13,5	20 de agosto de 2021	N/A	DURMAN	NTC- 382
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 2"	7/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087
		TUBOS SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS 4"	15/05/2022	N/A	DURMAN	NTC- 1087

CONTROL DE CONFORMIDAD DE CALIDAD POR ÍTEMS DE CONTRATO OBJETO DE PAGO

A continuación se relacionan los ítems de contrato que el Interventor avala para pago en este período, para lo cual se requiere como condición previa que la Interventoría los haya declarado entregables verificados mediante certificados de conformidad de producto y/o sellos de calidad recibidos y/o los ensayos que recibió de un laboratorio acreditatado.

A continuación se resumen los requisitos y trazabilidad de conformidad de los ítems que cumplen calidad para pago en el presente período

Ítems de contrato que se incluirán en el acta y/o factura y/o cuenta del presente período		Normas técnicas (ley, decreto, resolución, reglamento) exigidas a cada ítem en particular		La conformidad con la norma se demuestra mediante	Número de orden del documento (certificado, ensayo, sello) que evidencia objetivamente
# del ítem según contrato	Descripción del ítem	Numero de norma (4)	Descripción de la norma, reglamento, ley, decreto, resolución u otro exigible		

(4) Si un ítem está sujeto a mas de una norma o protocolo, utilice tantas filas como sean necesarias e indique una sola norma o protocolo por fila.
(5) El número de orden puede ser de ensayo, protocolo o certificado obtenido en este período o periodos anteriores.
(6) El Interventor llevará control de las cantidades, baches o volúmenes de productos, procesos o procedimientos que certifica que cumplen calidad, de manera que garantice la trazabilidad de calidad para cada entregable evitando que se aplique un certificado vencido, o se aplique un ensayo excediendo su alcance en frecuencia, cantidad o tiempo. El Supervisor ENTerritorio exigirá esta trazabilidad en cualquier momento.

TRAZABILIDAD: Para efectos de trazabilidad, el Interventor anexa a este formato un archivo digital que contiene una carpeta denominada "Control inspección y ensayo Periodo XXX) con la información del período. Esta carpeta contiene tantas subcarpetas como subcapítulos contiene este formato y en cada una de esas subcarpetas se están incluyendo la totalidad de documentos que soportan lo certificado. El Interventor declara que no ha aceptado ningún laboratorio acreditado, calibración de equipo o ensayo del cual no dispone de trazabilidad que anexa a este informe. No se aceptan excepciones ni entregas de trazabilidad posteriores a la radicación de este formato. Este formato incluye como ítems verificados para pago únicamente aquellos que cumplen todos los requisitos establecidos.

Firma	**Firma**
NOMBRE Edgar Aragon Otero	NOMBRE: CARLOS AUGUSTO DEMERA GACHARNÁ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")	DIRECTOR DE OBRA (no se acepta firma "por" o "en nombre de")

GEOTECNIA Y PAVIMENTOS

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETOS
NTC - 673 2010

CODIGO: FT - LAB - 043

VERSION: 00

APROBADO: 2018-01-05

CLIENTE: CONSORCIO TURQUÍA

FECHA DE INFORME: 6/03/2023

PROYECTO: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL BARRIO EL POBLADO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL POBLADO

Nro.	ELEMENTO	FECHA FUNDICIÓN	DIAMETRO PROMEDIO CILINDRO 6"	FECHA ENSAYO A LOS 7 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 14 DIAS	FECHA ENSAYO A LOS 28 DIAS	ESPECIFICACION DEL CONCRETO	TIPO DE CONCRETO	CARGA (KN) PARA 7 DIAS	CARGA (KN) PARA 14 DIAS	CARGA (KN) PARA 28 DIAS	ESFUERZO A LA COMPRESION (PSI)		
												EDAD DEL CILINDRO		
												7	14	28
1	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-366	2/02/2023	15,24	9/02/2023	16/02/2023	2/03/2023	3000	NORMAL	249,36	243,20	354,13	2019,8	2626,6	3116,4
												67,33%	87,55%	103,88%
2	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-369	2/02/2023	15,24	9/02/2023	16/02/2023	2/03/2023	3000	NORMAL	245,38	244,52	360,79	1987,6	2640,8	3174,9
												66,25%	88,03%	105,83%
3	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-382	3/02/2023	15,24	10/02/2023	17/02/2023	3/03/2023	3000	NORMAL	244,85	248,94	358,14	1983,3	2688,6	3151,7
												66,11%	89,62%	105,06%
4	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-383	3/02/2023	15,24	10/02/2023	17/02/2023	3/03/2023	3001	NORMAL	247,76	242,91	352,36	2006,8	2623,4	3100,8
												66,89%	87,45%	103,36%
5	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-366	6/02/2023	15,24	14/02/2023	21/02/2023		3002	NORMAL	253,48	241,20		2053,2	2605,0	
												68,44%	86,83%	
6	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-369	6/02/2023	15,24	14/02/2023	21/02/2023		3003	NORMAL	253,38	247,58		2052,3	2673,8	
												68,41%	89,13%	
7	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-382	7/02/2023	15,24	15/02/2023	22/02/2023		3004	NORMAL	250,48	249,82		2028,9	2698,1	
												67,63%	89,94%	
8	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-383	7/02/2023	15,24	15/02/2023	22/02/2023		3000	NORMAL	243,07	247,67		1968,9	2674,8	
												65,63%	89,16%	
9	MACHÓN S-SC-EP-M52-VE-385	9/02/2023	15,24	16/02/2023	23/02/2023		3000	NORMAL	240,23	244,22		1945,9	2637,6	
												64,86%	87,92%	
10	VIGA CORONA S-SC-EP-M52-VE-385	11/02/2023	15,24	18/02/2023	25/02/2023		3000	NORMAL	247,30	244,57		2003,1	2641,4	
												66,77%	88,05%	

TIPOS DE FALLA:



GEOTECNIA Y PAVIMENTO S.A.S. NIT 900.862.824-5

I.C JEISSON ESPAÑA DIAZ DIR. TÉCNICO
DIR TECNICO

Anexo 26. Cambio especificación

enterritorio	**ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES**	CÓDIGO:	**F-GG-29**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

Nota: este formato aplicará cuando el cambio de especificacion no implique ajuste al precio. El insumo a modificar debe ser de calidad equivalente al inicialmente propuesto.

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220577 **DE** **OBRA** **FECHA INICIO** **11/04/2022** **FECHA TERMINACIÓ** **11/11/2022**

OBJETO DEL CONTRATO: Chequeo, validación de prototipos y diagnostico, concertación, intervención y gestion social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre

CONTRATISTA: CONSORCIO TURQUIA

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

SUPERVISOR: Ing. Juan David Amón

Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con las siguientes consideraciones:

B. ESPECIFICACIÓN INICIAL VS. CAMBIO PROPUESTO

ESPECIFICACIÓN INICIAL					CAMBIO PROPUESTO				
Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Ítem	Unidad	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario
3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11	3,1	un	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lava- manos)	1	$ 4.225.606,11
3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61	3,2	un	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 3.761.340,61
3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39	3,3	un	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	1	$ 4.767.497,39
3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93	3,4	un	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta	1	$ 4.898.390,93
3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO FOR. 20*20	1,05	$ 51.443,02	3,27	m2	ENCHAPE PARED BLANCO ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 51.443,02
3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE FOR. 20*20	1,05	$ 62.169,00	3,28	m2	ENCHAPE DE PISO - ANTIDESLIZANTE ACUARELA BLANCO 40X40	1,05	$ 62.169,00

C. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

La instalación de este producto se realizará en la pared de la zona de ducha con 4 hiladas completas desde el piso hacia arriba. (1.60m). En el piso se iniciara desde el piso de la ducha en la pared posterior a la ubicación de los puntos hidraulicos hacia el acceso del baño para garantizar la linea de juntas.

D. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN EL CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN PROPUESTO

Debido a la pandemia que azotó en el año 2020 y 2021 a nivel mundial se presentaron diferentes factores a nivel de producción que afectaron de manera considerable la fabricación de diferentes elementos a sectores productivos. Este fenomeno ha causado inconveniente en la producción en masas de materiales para la construcción, mas especificamente la ceramica y que por demanda el formato con referencia 20,5cm x 20,5cm ha presentado escases en su producción, lo que dificulta el desarrollo y terminación del proyecto que se ejecuta.

E. REGISTROS DE SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

Solicitante	No. Oficio	Fecha
CONSORCIO TURQUIA	CONS-TUR-SINC-031	27/05/2022
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S		

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

F. AVAL Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, a los seis ( ) días, del mes junio del año 2022.

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

Anexo 27. Acta de Recibo parcial y cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados (Matriz Tres Momentos Ejecución)

enterritorio	**ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL**	CÓDIGO:	**F-GG-32**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-20**

ACTA No. **7 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SINCELEJO, SUCRE**

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220577

OBJETO: "Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el Municipio de Sincelejo, Departamento de Sucre"

CONTRATISTA : CONSORCIO TURQUÍA (NIT: 901.390.795 - 7)

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. (NIT: 901.390.795 - 7)

PERÍODO A PAGAR: **DEL 10 de diciembre de 2022 al 19 de febrero de 2023**

En Sincelejo, Sucre, a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año 2023 se reunieron José Ignacio Cárdenas Meneses Representante Legal del Contratista y Luz Andrea Fajardo Corredor Representante Legal de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 144.902,5392

Nota 2: Consorcio Turquía autoriza a Enterritorio, descontar el 50% de la adición de Interventoría por $150.072.084, valor derivado de la mayor permanencia por la modificación contractual No. 01 correspondiente a la prorroga de 3 meses del contrato de interventoría, es decir en la presente acta se autoriza el descuento de $75,036.042, para el pago de la Interventoría.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1,1	CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1,00	$ 4.759.770,59	$ 4.759.770,59	1,00	-	1,00	$ 4.759.770,59	$ -	$ 4.759.770,59	-	-
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 904.356,41				$ 904.356,41	$ -	$ 904.356,41		$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5.664.127,00**				**$ 5.664.127,00**	**$ -**	**$ 5.664.127,00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	693	$ 144.902,5392	$ 100.417.459,66	414,00	71,00	485,00	$ 59.989.651,23	$ 10.288.080,28	$ 70.277.731,51	208	$ 30.139.728,15
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 19.079.317,34			-	$ 11.398.033,73	$ 1.954.735,25	$ 13.352.768,99	-	$ 5.726.548,35
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 119.496.777,00**				**$ 71.387.684,96**	**$ 12.242.815,53**	**$ 83.630.500,49**	-	$ 35.866.276,51
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS												
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 14.370,00	$ 14.370,00	7.482,27	1.266,00	8.748,27	$ 107.520.219,90	$ 18.192.420,00	$ 125.712.639,90	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 57.385,00	$ 57.385,00	4.018,62	773,00	4.791,62	$ 230.608.508,70	$ 44.358.605,00	$ 274.967.113,70	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 29.682,00	$ 29.682,00	597,03	98,50	695,530	$ 17.721.044,46	$ 2.923.677,00	$ 20.644.721,46	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS			-									
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1,00	$ 123.661,00	$ 123.661,00	411,00	71,00	482,00	$ 50.824.671,00	$ 8.779.931,00	$ 59.604.602,00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1,00	$ 150.802,00	$ 150.802,00	412,00	71,00	483,00	$ 62.130.424,00	$ 10.706.942,00	$ 72.837.366,00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 110.519,00	$ 110.519,00	411,00	71,00	482,00	$ 45.423.309,00	$ 7.846.849,00	$ 53.270.158,00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 116.841,00	$ 116.841,00	53,00	4,00	57,00	$ 6.192.573,00	$ 467.364,00	$ 6.659.937,00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 185.833,00	$ 185.833,00	44,00	3,00	47,00	$ 8.176.652,00	$ 557.499,00	$ 8.734.151,00	-	-
	APARATOS			-									
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 192.852,00	$ 192.852,00	412,00	71,00	483,00	$ 79.455.024,00	$ 13.692.492,00	$ 93.147.516,00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1,00	$ 148.176,00	$ 148.176,00	412,00	71,00	483,00	$ 61.048.512,00	$ 10.520.496,00	$ 71.569.008,00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1,00	$ 239.081,00	$ 239.081,00	53,00	4,00	57,00	$ 12.671.293,00	$ 956.324,00	$ 13.627.617,00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1,00	$ 228.983,00	$ 228.983,00	44,00	3,00	47,00	$ 10.075.252,00	$ 686.949,00	$ 10.762.201,00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			-									
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 226.866,00	$ 226.866,00	362,70	65,50	428,20	$ 82.284.298,20	$ 14.859.723,00	$ 97.144.021,20	-	-
	UNIDADES SANITARIAS			-									
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.325.416,00	$ 3.325.416,00	2,00	-	2,00	$ 6.650.832,00	$ -	$ 6.650.832,00	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 2.960.054,00	$ 2.960.054,00	103,00	12,00	115,00	$ 304.885.562,00	$ 35.520.648,00	$ 340.406.210,00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.751.867,00	$ 3.751.867,00	248,00	54,00	302,00	$ 930.463.016,00	$ 202.600.818,00	$ 1.133.063.834,00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.854.876,00	$ 3.854.876,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN			-									
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 16.092,00	$ 16.092,00	5,46	-	5,46	$ 87.862,32	$ -	$ 87.862,32	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 49.479,00	$ 49.479,00	161,28	37,08	198,36	$ 7.979.973,12	$ 1.834.681,32	$ 9.814.654,44	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS			-									
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 704.327,00	$ 704.327,00	99,867	11,57	111,437	$ 70.339.024,51	$ 8.149.063,39	$ 78.488.087,90	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1,00	$ 6.655,00	$ 6.655,00	11.686,54	1.499,25	13.185,79	$ 77.773.923,70	$ 9.977.508,75	$ 87.751.432,45	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1,00	$ 68.432,00	$ 68.432,00	130,73	7,16	137,89	$ 8.945.978,50	$ 489.973,12	$ 9.435.951,62	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1,00	$ 71.036,00	$ 71.036,00	260,80	27,20	288,00	$ 18.526.188,80	$ 1.932.179,20	$ 20.458.368,00	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 235.590,00	$ 235.590,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	MAMPOSTERIA			-									
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1,00	$ 35.344,00	$ 35.344,00	354,36	84,99	439,35	$ 12.524.499,84	$ 3.003.886,56	$ 15.528.386,40	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1,00	$ 8.032,00	$ 8.032,00	7,00	-	7,00	$ 56.224,00	$ -	$ 56.224,00	-	-
	MORTEROS			-									
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 16.234,00	$ 16.234,00	681,75	98,33	780,08	$ 11.067.529,50	$ 1.596.289,22	$ 12.663.818,72	-	-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 17.058,00	$ 17.058,00	514,84	87,24	602,08	$ 8.782.140,72	$ 1.488.139,92	$ 10.270.280,64	-	-

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											CÓDIGO:	F-GG-32
												VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS											VIGENCIA:	2020-10-20

3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 20.301,00	$ 20.301,00	41,94	-	41,94	$ 851.423,94	$ -	$ 851.423,94	-	-
	ELEMENTOS												
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1,00	$ 383.416,00	$ 383.416,00	59,00	5,00	64,00	$ 22.621.544,00	$ 1.917.080,00	$ 24.538.624,00	-	-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1,00	$ 59.183,00	$ 59.183,00	59,00	5,00	64,00	$ 3.491.797,00	$ 295.915,00	$ 3.787.712,00	-	-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 246.067,00	$ 246.067,00	163,00	17,00	180,00	$ 40.108.921,00	$ 4.183.139,00	$ 44.292.060,00	-	-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	UN	1,00	$ 24.525,00	$ 24.525,00	110,00	5,00	115,00	$ 2.697.750,00	$ 122.625,00	$ 2.820.375,00	-	-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1,00	$ 65.320,00	$ 65.320,00	16,45	-	16,45	$ 1.074.514,00	$ -	$ 1.074.514,00	-	-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1,00	$ 25.877,00	$ 25.877,00	4,00	-	4,00	$ 103.508,00	$ -	$ 103.508,00	-	-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1,00	$ 40.300,00	$ 40.300,00	373,00	65,00	438,00	$ 15.031.900,00	$ 2.619.500,00	$ 17.651.400,00	-	-
	ACABADOS			-									
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1,00	$ 41.074,00	$ 41.074,00	5,53	3,60	9,13	$ 227.139,22	$ 147.866,40	$ 375.005,62	-	-
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1,00	$ 26.000,00	$ 26.000,00	361,81	63,45	425,26	$ 9.407.060,00	$ 1.649.700,00	$ 11.056.760,00	-	-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1,00	$ 20.215,00	$ 20.215,00	171,41	36,58	207,99	$ 3.465.053,15	$ 739.464,70	$ 4.204.517,85	-	-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 40.484,00	$ 40.484,00	250,16	19,80	269,96	$ 10.127.477,44	$ 801.583,20	$ 10.929.060,64	-	-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 48.925,00	$ 48.925,00	166,31	14,87	181,18	$ 8.136.765,68	$ 727.514,75	$ 8.864.280,43	-	-
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 6.616,00	$ 6.616,00	1.008,63	106,46	1.115,09	$ 6.673.096,08	$ 704.339,36	$ 7.377.435,44	-	-
	CONEXIONES												
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 155.488,00	$ 155.488,00	24,00	-	24,00	$ 3.731.712,00	$ -	$ 3.731.712,00	-	-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UN	1,00	$ 171.923,00	$ 171.923,00	1,00	-	1,00	$ 171.923,00	$ -	$ 171.923,00	-	-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 36.602,00	$ 36.602,00	4,00	-	4,00	$ 146.408,00	$ -	$ 146.408,00	-	-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 35.954,00	$ 35.954,00	2,00	-	2,00	$ 71.908,00	$ -	$ 71.908,00	-	-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 101.003,00	$ 101.003,00	146,10	-	146,10	$ 14.756.538,30	$ -	$ 14.756.538,30	-	-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 17.875,00	$ 17.875,00	28,50	-	28,50	$ 509.437,50	$ -	$ 509.437,50	-	-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UN	1,00	$ 209.226,00	$ 209.226,00	14,00	-	14,00	$ 2.929.164,00	$ -	$ 2.929.164,00	-	-
	INTERVENCIONES VARIAS			-									
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1,00	$ 91.825,00	$ 91.825,00	-	-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN			-									
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 305.967,00	$ 305.967,00	29,50	-	29,50	$ 9.026.026,50	$ -	$ 9.026.026,50	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 3.835.167.214,50**				**$ 2.387.575.603,08**	**$ 415.051.185,89**	**$ 2.802.626.788,97**		**$ 1.032.540.425,53**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 1.074.613.853,50**				**$ 668.998.683,95**	**$ 116.297.342,29**	**$ 785.296.026,24**		**$ 289.317.827,26**
	ADMINISTRACIÓN	**21,07%**			$ 808.069.732,10				$ 503.062.179,56	$ 87.451.284,87	$ 590.513.464,43		$ 217.556.267,67
	IMPREVISTOS	**1,0%**			$ 38.351.672,14				$ 23.875.756,03	$ 4.150.511,86	$ 28.026.267,89		$ 10.325.404,25
	UTILIDAD	**5%**			$ 191.758.360,72				$ 119.378.780,14	$ 20.752.559,29	$ 140.131.339,43		$ 51.627.021,29
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 36.434.088,54				$ 22.681.968,22	$ 3.942.986,27	$ 26.624.954,49		$ 9.809.134,05
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**$ 4.909.781.068,00**				**$ 3.056.574.287,03**	**$ 531.348.528,18**	**$ 3.587.922.815,21**		**$ 1.321.858.252,79**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3					**$ 5.034.941.972,00**				**$ 3.133.626.098,99**	**$ 543.591.343,71**	**$ 3.677.217.442,70**		**$ 1.357.724.529,29**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 5.034.941.972,00**	**V/R ANTICIPO:**	**$ 981.956.213,60**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**20%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 5.034.941.972,00	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 167.258.412,19	3,3220%	-	$ 35.208.027,34	$ 946.748.186,26	$ 132.050.384,85	$ 4.867.683.559,81	3,3220%
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 2 - SINCELEJO	9-sep.-22	$ 353.326.921,98	7,0175%	-	$ 134.266.614,91	$ 812.481.571,35	$ 219.060.307,07	$ 4.514.356.637,83	10,3395%
3	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 3 - SINCELEJO	5-oct.-22	$ 368.027.756,01	7,3095%	-	$ 119.882.487,52	$ 692.599.083,83	$ 248.145.268,49	$ 4.146.328.881,82	17,6489%
4	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 4 - SINCELEJO	4-nov.-22	$ 706.246.363,04	14,0269%		$ 153.322.521,78	$ 539.276.562,05	$ 552.923.841,26	$ 3.440.082.518,78	31,6758%
5	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 5 - SINCELEJO	2-dic.-22	$ 455.490.237,16	9,0466%		$ 148.415.885,42	$ 390.860.676,63	$ 307.074.351,74	$ 2.984.592.281,62	40,7224%
6	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 6 - SINCELEJO	27-dic.-22	$ 769.913.798,72	15,2914%		$ 250.792.419,57	$ 140.068.257,06	$ 519.121.379,15	$ 2.214.678.482,90	56,0138%
7	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 7 - SINCELEJO		$ 489.232.209,34	9,7167%		$ 106.269.705,64	$ 33.798.551,42	$ 382.962.503,70	$ 1.725.446.273,56	65,7306%
					-					
TOTAL			**$ 3.309.495.698,44**	**65,7306%**	**-**	**$ 948.157.662,18**	**$ 33.798.551,42**	**$ 382.962.503,70**	**$ 1.725.446.273,56**	**65,7306%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 19 DE FEBRERO DE 2023

Elaboró
CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: JOSÉ IGNACIO CÁRDENAS MENESES
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO TURQUIA

Aprobó
INTERVENTOR:
Firma:
Nombre: LUZ ANDREA FAJARDO CORREDOR
REPRESENTANTE LEGAL
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: No Aplica

Anexo 28. Formatos diarios de inspeccion

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	06-02-2023	Codigo vivienda	S-SC-EF-M-74	VE	347	Tipologia	MDE
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		falta conectarla al tanque
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas				NO APLICA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado			✓	Sin ejecutar
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque			✓	" "
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento			✓	NO APLICA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin Instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica		✓		NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				NO APLICA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	70	✓		falta mano de Pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	06 - 02 - 2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-(83)	VE	75	Tipologia	T3		
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Pañete fisurado
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		" "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	Sin Instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	60	✓		falta terminar enchape
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-73	VE	596	Tipologia	T3
Fecha de inspeccion	06 - 02 - 2023	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	80	✓		Tubería expuesto, llave de paso dañada
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	90	✓		Pañete Presenta Fisura
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	90	✓		" " "
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domicillaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domicillaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	06 - 02 - 2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-	71	VE	607	Tipologia	T3	
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	90	✓		Tubería expuesta
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estander**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	70	✓		Falta mano de pintura
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion		**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-57	VE	433	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	95	✓		Subsanar Fuga Y llave de Paso
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario **(Inodoro)**	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario **(ducha)**	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de **(lavamanos con pedestal)**	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de **(lavadero estandar)**				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de **(Lavaplatos)**				// //
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario **(inodoro)**	100	✓		
3,2	Instalacion de **(ducha)**	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				// //
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	95	✓		corregir cerradura de Puerta
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				// //
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				// //
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	90	✓		Detalles de acabado
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	07-02-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-69	**VE**	439	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	07-02-2022	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-44 VE 448 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1.1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"			✓	Sin Instalar
1.2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2.4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2.5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2.6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2.7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2.8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3.1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Instalar
3.2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3.3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3.4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3.5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3.6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin Instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	07 - 02 - 2023	**Codigo vivienda**		**S-SC-EP-M-**	081	**VE**	503	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"			✓	Sin Instalar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	30	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)			✓	Sin Instalar
3,2	Instalacion de (**ducha**)			✓	" "
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**			✓	" "
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO Aplica
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	40	✓		En ejecución
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño			✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño			✓	Sin Instalar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020			✓	Sin Ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020			✓	" "
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior			✓	" "
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	40	✓		En ejecucion
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria			✓	Sin ejecutar
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"			✓	" "
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m			✓	Sin ejecutar

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	03-02-22	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-07	VE	217	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		Sin desnivel
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	NO	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	08-02-23	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M- 67	VE	218	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domicilieria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collorin de dorivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	05-02-23	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-017	VE	165	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	Sin ejecutar
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	Sin ejecutar
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	08-02-23	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-09	VE	2/6	Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tubería sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre Sandra Contreras N
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
Ingenieros Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09-02-2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-23	VE	667	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	✓		Falta terminar de instalar tubería
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			✓	Sin Instalar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura			✓	" "
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	90	✓		Cambiar enchape Partido
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	✓		Terminar acabado
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"				NO APLICA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Conte
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	04 - 02 - 2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 61	VE	350	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	95	/		cobrir Tuberia
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				ND Aplica
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	/		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				ND Aplica
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	90	/		Pegar Tapa de registro
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	/		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	/		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura			/	Sin Instalar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				ND Aplica
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	90	/		Terminar enchape
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	70	/		Terminar acabado
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				ND Aplica
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael López
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONTRATISTAS

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	09 - 02 - 2023	**Codigo vivienda**	B-SC-EP-M-61	**VR**	538	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	50	/		Falta instalar el tanque
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	/		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	/		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	/		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	/		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	/		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	/		
3,2	Instalacion dc (**ducha**)	100	/		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	/		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	90			
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	/		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	/		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	/		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	/		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	/		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	/		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	90	/		Falta cubrir acero de losa
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	/		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	/		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	/		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt			/	Falta instalar tanque
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	/		Pintar Puerta y colocar cerradura
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	/		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	90	/		Terminar Enchape
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	50	/		Terminar acabado
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Rafael Lopez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	01-02-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-57	**VE**	436	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)				NO APLICA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)				" "
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**				NO APLICA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**				" "
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	90	✓		cobrir acero de losa
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	90	✓		El tanque Presenta Fuga
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica				NO APLICA
5,2	Recuperacion de piso en concreto				" "
5,3	Recuperacion de piso esmaltado				" "
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	90	✓		enchape hueco
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria				
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria				
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"				NO APLICA
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"				
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"				
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m				

Nombre: Sandra Cabrera
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Rafael López
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Finalizado.

Fecha de inspección	13-02-23	Código vivienda	S-SC-SP-SI-63	VIS	Casa	Tipología	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervención					
Interventoría	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervención					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de Sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 3"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estander**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 0,60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Entregada.

Fecha de inspeccion		Codigo vivienda	B-SC-EP-M- 62 VII 606 Tipologia T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Entregada.

Fecha de inspeccion	13-02-23	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-	82	VIS	509	**Tipologia** T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1"2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	NIA
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	NIA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓		
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100	✓		
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	100	✓		
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1"2"	0		✓	NIA
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1"2"	0		✓	NIA
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	100	✓		

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidy Ruiz.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-03-23	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-55	VE	411	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar por
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	falta de materiales
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓	✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin materiales
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	Sin materiales
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin material
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin material.
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin ejecutar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	"
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	"
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	"
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0			
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Sin Materiales.

Nombre: Sandra Cardona
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Nuñez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de ob

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-02-23	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-31	VII	CR	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**lavadero**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Peñete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Falta resane interno.
4,6	Peñete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin enchape
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50		✓	Baldosas Hecas
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-02-23	Codigo vivienda	B-SC-EP-M-67	VIS	624	Tipologia	A
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	Sin material
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	11
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	Sin material
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**			✓	11
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	//
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	//
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	//
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	Paralizada por materiales
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin materiales
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100			
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100			
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	11
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obr

GAVINCO
Ingeniería Consultores

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	14-02-23	Codigo vivienda	S-SC-EF-M-67	VII	626	Tipologia	Aseo
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	"
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	0		✓	"
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	0		✓	parcialmente por metrado.
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye anl, y pintura	0		✓	"
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	sin ejecutar
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	"
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	"
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	"
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	"
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	"
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	"

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obr

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-Feb-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-50	**VE**	349	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		Existente
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n° 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		1 pieza baño
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	15-JUN-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-53 VE 477 Tipologia T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 12"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		No sale agua. falta resane.
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Tejas sueltas
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 12"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 12"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

No se recibe.

Fecha de inspeccion	15-feb-2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-57	VE	431	Tipologia 4 de
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	100	✓		
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	100	✓		
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	100	✓		Dilatacion de muros.
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	100	✓		Falta boya.
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	0		✓	N/A
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	0		✓	
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	0		✓	//
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Falta remate filos
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		falta acabado y limpieza.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		se encharca, (empotramiento)
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domicillaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domicillaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	16-FEB-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 73	VE	688	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		NO cierra adecuadamente
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	100		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

No se recibe.

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-71	VE	546	Tipologia	T3
Fecha de inspeccion	16-FEB-2023	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Con figura.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sanderson Tenorio

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	16-feb-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-72	VE	552	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	N/A
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortaro 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	N/A
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		NO cierra adecuadamente
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

No se recibe

Fecha de inspeccion	17-Feb-2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-45	VE	338	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Tejas sueltas, falta embon colindancia.
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		falta embonquillar en puerta.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra carsen
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

NO Recibida.

Fecha de inspeccion	14/06-2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-50	VE	350	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	NIA
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Sin dilatacion - Acta beneficiario
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	NIA
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100	✓		
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	NIA
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Yeider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Entregada.

Fecha de inspeccion	17-feb/2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 50	VE	349	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilles	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre

Cargo: residente / Inspector

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13/06/2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M-74	VE	571	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		separacion 5cm con el muro.
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		Acero expuesto
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Yeider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	13/06/2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-74	VE	542	Tipologia	73
Contratista	CONSORCIO PURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	NIA
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	NIA
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	NIA
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	NIA
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	NIA
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	NIA
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre:
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	18/12/2013	Codigo vivienda		S-SC-EP-M- 71	VE	620	Tipologia	73
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de celados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		(Con pisvera)
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Luz entre teja y columna.
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		1 pieza hueca.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: _____
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre _____
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Paralizada por falta de agua

Fecha de inspeccion	28-Feb-2023	Codigo vivienda	S-SC-SF-M-1	VIS	271	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	//
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	//
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	//
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		Paralizada por falta de agua
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	0		✓	
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	0		✓	
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	0		✓	Sin ejecutar
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	//
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	//
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	//
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 6" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Yeider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Paralizada sin agua.

Fecha de inspeccion	22-FEB-2023	Codigo vivienda		B-SC-EP-M-12	VE	228	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion						
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre							

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	0		✓	Sin ejecutar
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	0		✓	//
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	0		✓	
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	0		✓	
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	0		✓	//
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	//
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	90	✓		paralizado sin agua
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	0		✓	Sin ejecutar
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	//
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	//
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Jaider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	20 Feb- 2017	**Codigo vivienda**	S-SC-SP-M- 09	VE	214	**Tipologia**	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	0		✓	
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin material
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	0		✓	Sin tejas
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin tanque
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	0		✓	Sin puerta
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		/	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		/	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		/	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		/	//
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	//
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		/	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		/	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"	0		/	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		/	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		/	//

Sin materiales - paralizada

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider S.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obr

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21-Feb-23	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-04	VE	2/3	Tipologia	3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	0		✓	Sin ejecutar
3,2	Instalacion de (**ducha**)	0		✓	//
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	0		✓	//
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	//
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	//
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0		✓	//
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	Sin ejecutar
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	0		✓	Sin ejecutar
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	1
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	Sin ejecutar
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	0		✓	Sin material para pego.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	31 - 08 - 2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-07	VII	165	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0	✗	✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regilas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	0		✓	
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓	✗	
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	100		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	100		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	100		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	0		✓	sin material de pegante
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	50	✓		paralizada sin pegante.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	100	✓	✗	Ejecutando
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" x 6" para domiciliaria	0		✓	sin ejecutar
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	sin tuberia.
6,4	Suministro e instalacion de collerin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	N/A
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	N/A
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	sin ejecutar

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	21-06-2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-09	VIS	215	Tipologia	T5
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	0	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		Acero expuesto
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	0		✓	Sin suministrar
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0	✗	✓	Sin ejecutar
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	N/A
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0			
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0			
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0			
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0			
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0			

Nombre: Sandra Cortes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Laila Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	27/06/2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-	72	VE	345	Tipologia	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		sin pintar, sin cerradura.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre: Eduardo Cotes
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23/11/2023	Codigo vivienda	S-SC-SP-M-77	VE	547	Tipologia	T2
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	Fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	Fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Sin pintar - Sin Cerradura.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	N/A
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	100	✓		
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: (Sinteneno Estudiante contenc)
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leidy Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

		Codigo vivienda	S-SC-EP-M-70	VE	524	Tipologia	T7
Fecha de inspeccion	21/06/2023	fecha de inicio de la intervencion					
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha final de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES						
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Rec intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Rec intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Rec intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	N/A
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	N/A
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**Inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	N/A
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	N/A
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Con fisural.
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	N/A
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	//
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	//
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Baldosa Area. y Sucia.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Ivan T.
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	23/02/2023	Codigo vivienda	S-SC-EP-M- 62 VE 512 Tipologia T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion	
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion	
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre		

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1'2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	PUNTOS HIDROSANITARIOS				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	APARATOS				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	UNIDAD SANITARIA				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		pendiente pintura, cerradura
5	ACABADOS Y PINTURA				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		pieza1 lavaplatos
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		pieza1 lavadero
6	CONEXIONES DOMICILIARIA				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	//
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	//
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1'2"	0		✓	//
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1'2"	0		✓	//
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de .60 m x 0,60 m	0		✓	//

Nombre: Cargo: Residente de Interventoria

Nombre Cargo: Inspector de interventoria

Nombre Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28/06/2023	**Codigo vivienda**		S-SC-EP-M-	70	VE	584	Tipologia	T1
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion							
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion							
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre								

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		Ajustando.
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Tejas sucias
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant. y pintura	100	✓		falta pintar y cerradura
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	N/A
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collorin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0,60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cardenas
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28/03/2023	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M-50	VE	355	Tipologia	77
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla n°4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	50	✓		Sin ejecutar pintura.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	0		✓	Sin ejecutar.
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Contreras
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez
Cargo: Inspector de interventoria

Nombre:
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner

GAVINCO
INGENIEROS CONSULTORES

CONTROL DIARIO DE OBRA

Fecha de inspeccion	28/06/2017	**Codigo vivienda**	S-SC-EP-M- 55	VE	053	**Tipologia**	T3
Contratista	CONSORCIO TURQUIA	fecha de inicio de la intervencion					
Interventoria	GAVINCO INGENIERO CONSULTORES	fecha final de la intervencion					
Objetivo	Chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Sincelejo, departamento de sucre						

LISTA DE ACTIVIDADES POR UNIDADES SANITARIAS

ITEM	DESCRIPCION	%	EJECUTADO SI	EJECUTADO NO	OBSERVACIONES
1	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
1,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2"	100	✓		
1,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4"	100	✓		
1,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2"	100	✓		
2	**PUNTOS HIDROSANITARIOS**				
2,4	Punto Hidrosanitario (**Inodoro**)	100	✓		
2,5	Punto Hidrosanitario (**ducha**)	100	✓		
2,6	Punto Hidrosanitario de (**lavamanos con pedestal**)	100	✓		
2,7	Punto Hidrosanitario de (**lavadero estandar**)	0		✓	
2,8	Punto Hidrosanitario de (**Lavaplatos**)	0		✓	
3	**APARATOS**				
3,1	Instalacion de sanitario (**inodoro**)	100	✓		
3,2	Instalacion de (**ducha**)	100	✓		
3,3	Instalacion de **lavamanos con pedestal**	100	✓		
3,4	Instalacion de **lavadero estandar**	0		✓	
3,5	Instalacion de **lavaplatos de sobreponer**	0		✓	
3,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto	100	✓		
4	**UNIDAD SANITARIA**				
4,1	Excavacion para cimentacion	100	✓		
4,2	Cimentacion en concreto, incluye colocacion de acero de refuerzo	100	✓		
4,3	Mamposteria en bloque de arcilla nº 4	100	✓		
4,4	Suministro e instalacion de calados tipo regillas	100	✓		
4,5	Pañete interno con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,6	Pañete externo con mortero 1:4 y 0,02mt espesor	100	✓		
4,7	Excavacion y Zapata en concreto reforzado	100	✓		
4,8	Losa en concreto reforzado para apoyo de tanque	100	✓		
4,9	Concreto para plantilla de piso baño	100	✓		
4,10	Suministro e instalcion de juego de incrustaciones para baño	100	✓		
4,12	Suministro e instalacion de cubierta en teja ondulada fibrocemento	100	✓		Hay entre tejas y Columnas
4,13	Suministro e instalacion de tanque aereo plastico de 500lt	100	✓		
4,14	Suministro e instalacion de puerta metalica incluye ant, y pintura	100	✓		Sin pintar sin cerradura.
5	**ACABADOS Y PINTURA**				
5,1	Recuperacion de piso en ceramica	0		✓	
5,2	Recuperacion de piso en concreto	0		✓	
5,3	Recuperacion de piso esmaltado	0		✓	
5,4	Enchape para pared blanco 0,20*,020	100	✓		
5,5	Enchape piso antideslizante blanco 0,20*,020	100	✓		Empotramiento.
5,6	Pintura con carburo blanco para muro exterior y interior	100	✓		
6	**CONEXIONES DOMICILIARIA**				
6,1	Excavacion para domiciliaria	0		✓	
6,2	Suministro e instalacion de kit silla ye de 6" a 8" para domiciliaria	0		✓	
6,3	Suministro e instalacion de Tuberia sanitaria PVC de 6"	0		✓	
6,4	Suministro e instalacion de collarin de derivacion de 4" x 1/2"	0		✓	
6,5	Suministro e instalacion de micromedidor de 1/2"	0		✓	
6,6	Construccion de caja de inspeccion en concreto de 60 m x 0.60 m	0		✓	

Nombre: Sandra Cantero
Cargo: Residente de Interventoria

Nombre: Leider Suarez.
Cargo: Inspector de Interventoria

Nombre
Cargo: residente / Inspector de obra

Powered by CamScanner
