RACK DE COMUNICACIONES PLANTA TELEFONICA IPES (R1)

UR

45

PATCH PANEL ESPEJO PISOS 2 Y 3 (48 PUERTOS CAT 5E)

44 / 43 — PPES1 — Cat.5e

42

ORGANIZADOR SIN TAPA

PATCH PANEL ESPEJO PISO 4 (48 PUERTOS CAT 5E)

41 / 40 — PPES2 — AMP Cat.5e

39

ORGANIZADOR SIN TAPA

PATCH PANEL ESPEJO PISO 5 (48 PUERTOS CAT 5E)

38 / 37 — PPES3 — AMP Cat.5e

PATCH PANEL ESPEJO PISO 6 (48 PUERTOS CAT 5E)

36 / 35 — PPES4 — Cat.5e

PLANTA TELEFONICA

34 / 33 / 32

Connector 1

Connector 2

FAN UNIT

31 / 30 / 29 / 28 / 27 / 26 / 25

DC/DC

ANFENOL

ANFENOL

ANFENOL

AASTRA

24

ORGANIZADOR SIN TAPA

19

PATCH PANEL DE EXTENSIONES (48 PUERTOS CAT 5E)

23 / 22 — PPEX1 (MARCACION NUEVA) — AMP Cat.5e

21 / 20

ORGANIZADOR SIN TAPA


PATCH PANEL DE EXTENSIONES (48 PUERTOS CAT 5E)

19 / 18 — PPEX2 (MARCACION NUEVA) — AMP Cat.5e

17

PATCH PANEL DE EXTENSIONES (48 PUERTOS CAT 5E)

16 / 15 — PPEX3 (MARCACION NUEVA) — AMP Cat.5e

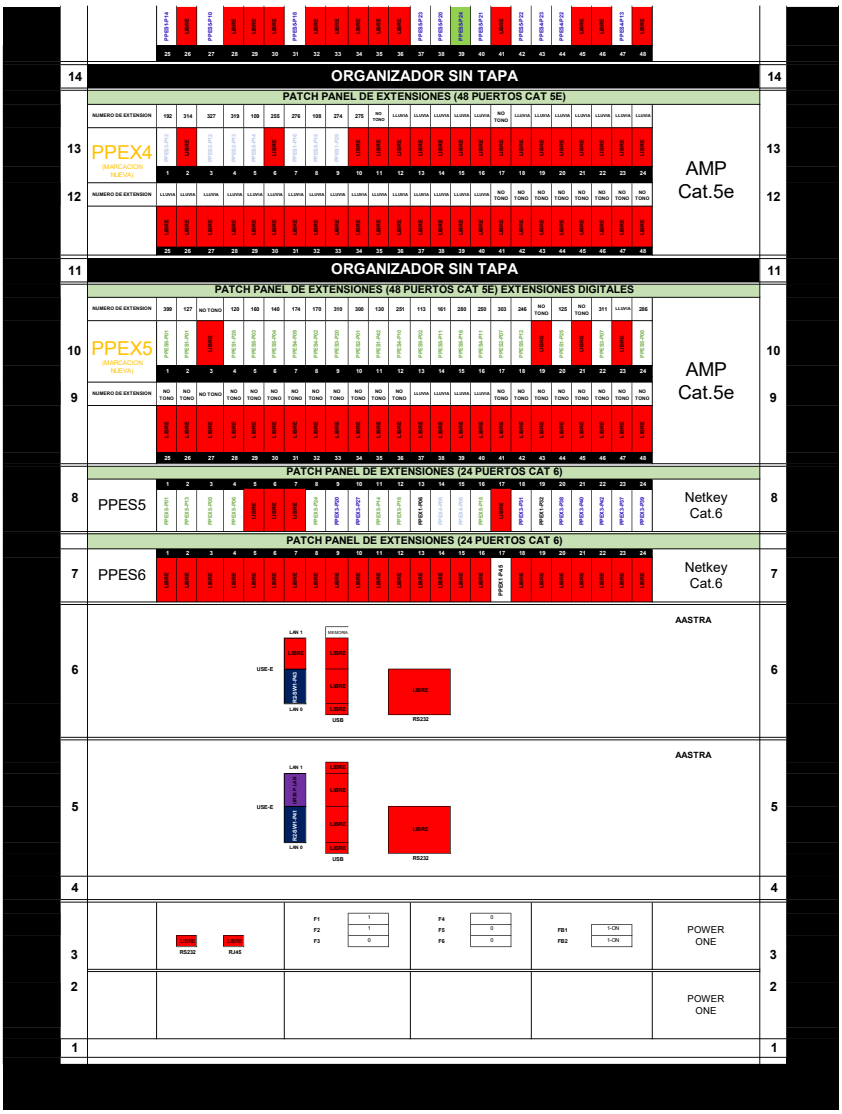

CONVENCIONES	
	PUERTO LIBRE
PPES	PATCH PANEL ESPEJOS HACIA CENTROS DE CABLEADO
PPEX	PATCH PANEL EXTENSIONES
	SE REQUIERE CAMBIAR PATCH CORD
	PATCH CORD GRIS 2 PARES LLEGA DIRECTO DE MULTIPAR
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFO
	CONEXIÓN DE PATCH CORD DE TARJETAS PLANTA TELEFONICA A SWITCH R2 (SERVIDORES)
	CONEXIÓN DE CABLES NEGROS CON CONECTOR BNC DESDE CONVERSOR (BNC-RJ45) TARJETAS 0 PLANTA TELEFONICA A A R3 UR14-15 REGLETA LLEGADA PROVEEDOR DE INTERNET (ETB)
	EXTENSION SIN TONO PERO ESTA ADMINISTRADA, NO SE DEBERIA CABLEAR
NO TONO	NO SE ENCIENDE LA PANTALLA DEL TELEFONO
LLUVIA	SE ENCIENDE LA PANTALLA DEL TELEFONO PERO NO TIENE TONO Y SE ESCUCHA COMO LLUVIA
UR	UNIDAD DE RACK

ELABORO	VALIDO	FECHA	
		25/01/2023	P&P INGENIEROS
DIEGO VALENCIA	FREDDY DIAZ		

NOTAS: - Existen 4 patch panel de espejos de 48 Puertos.(UR 35-36;37-38;40-41 y 43-44).
- Existen 2 patch panel de espejos de 24 Puertos. (UR 7y 8).
- Existen 5 patch panel de extensiones de 48 Puertos.(UR 9-10;12-13;15-16;18-19 y 22-23).
