GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**4**			FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023		
PERIODO:	DEL	12	de	ENERO	de	2022	AL	11	de	FEBRERO	de	2023

CONTRATO No:	**1858**	DE	2022	REGISTRO BP Y P No	**2021 00415 0276**

OBJETO:

REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA

LOCALIZACION:

PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

9. Edificaciones, espacios públicos adaptados al medio ambiente

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSTRUCTORA PAIS	**JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES YAMBIENTALES - CEINTERS S.A.S	**Arq. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
	NA		
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 1.417.122.618,89	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.417.122.618,89

FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	25	de	ENERO	de	**2023**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	11	de	JUNIO	de	**2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**39,0%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**39,0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**38,0%**



GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

No PÓLIZA	39-44-1011388638	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							2	11	2022

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	10	2022	13	6	2024	$ 212.568.392,83
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	10	2022	14	6	2026	$ 212.568.392,83
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	12	6	2023	11	6	2028	$ 283.424.523,78
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12	10	2022	12	10	2023	$ 425.136.785,67

No PÓLIZA	39-40-101036643	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							2	11	2022

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12	10	2022	14	6	2026	$ 300.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Durante el presente mes predomino el tiempo seco, con algunas lluvias intensas en horas de la noche, pero en horas laborales por lo general el clima fue soleado sin presencia de lluvias que impidieran el normal desarrollo de las actividades en la obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
INICIO DE OBRA	12	10	2022

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Mejoramiento de piso con material de afirmado y compactado, se han ejecutado 36,78 m3.	Costado superior Frente a la iglesia y Juegos infantiles
Construccion de Rampas de acceso al parque en concreto estriado 2500. en total se construyeron dos rampas para un total de 3,36 m2	Costado superior Frente a la iglesia y Juegos infantiles
Construccion de Bordillo fundido en sitio en total van 143,8 ml	Costado superior Frente a la iglesia y Juegos infantiles
Construccion de muro de cimentacion Cantilever en concreto 3000 calculo parcial 7,28 m3	Costado Alcaldia (Tarima)
Concreto de Zapatas 21MPa + Formaleta se fundieron 8,25 m3 en total	Costado Alcaldia (Tarima)

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**4**		FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

Demolicion muro existente (bordillo) en el mes 25,67 m2	Costado Alcaldia (Tarima)
Excavacion de cortes y canales en total fueron en el mes 94,46 m3	Costado puestos de ventas. Tarima
Construcción de andenes en loseta de colores incluye línea con estoperol y base en arena cemento, acumulado son 263,25 m2.	Costado posterior tarima y juegos infantiles

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se solicita documentación del personal técnico, operativo y administrativo para la ejecución del contrato de obra conforme a lo determinado dentro de la propuesta presentada, referente a contratos y afiliaciones a seguridad social para permitir el desarrollo de las actividades de obra.	Costado lado alcaldia, tarima y costado juegos infantiles
Se remiten los informes semanales del avance de obra, realizados por el contratista de obra y por interventoría, conforme a las obligaciones contractuales.	
Se desarrolla comité de obra 5 para exponer las situaciones del contrato de obra.	
Se realiza vigilancia y control de las actividades desarrolladas en obra, conforme a lo determinado en diseños y especificaciones técnicas. En tal sentido, medición de las cantidades ejecutadas por el contratista de obra, de tal manera que el producto ejecutado sea conforme a lo diseñado.	
Se toman las respectivas muestras de concreto y se lleva a laboratorio para determinar la resistencia de este, asi como tambien control y seguimiento de las dosificaciones de agregados y aditivos para elaboracuion del mismo.	

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Vibro Compactador de tiro Tipo Rana	Mejoramiento de andenes con material de afirmado	20%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales
Vlqueta (Placa SUL -171)	Retiro de material producto de excavacion	20%	Cumple con normas especificas del PMA
Mezcladoras de Cncreto Cap. 1 ½ Bultos	Cncreto para Muros, rampas y Bordillos	50%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales
Martillo Percutor electrico Industrial	Demolicion de Andenes, muros, sardineles existentes	30%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales
Vibradores Electricos Para Concreto	Concreto Para Bordillos, zapatas y muros.	30%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

Taladros Electricos Manuales marca Bosh	Herramienta basica para adecuaciones y construcciones en General dentro de la obra	30%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales
Pulidora Electrica marca Bosh	Corte de baldosas y corte de hierro para figurar	30%	Equipo en buen estado y cumple con las normas tecnicas y ambientales

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Loseta 40X40 cm	KREATOS	Sensible a las manchas y rayones
Cemento Gris Marca Argos	Directamente de la Fabrica	Se almacena en un lugar seco y bien tapado

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Vehiculo Marca Chevrolet 2021	Transporte del personal y Representante legal	100%	Ninguna

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	20	10	2022	$ 425.136.785,67
ACTA DE RECIBO PARCIAL 01 (AMORTIZADA)	15	12	2022	$ 47.161.078,55
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**$ 472.297.864,22**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				$ 0,00
ACTA PARCIAL No.				$ 0,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS	No Aplica			**$ 0,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
Enero 12/01/ de 2023	CONSTRUCTORA PAÍS SAS	ENTREGA AJUSTE DE DISEÑO MUROS PROYECTO "REMODELACION Y ADECUACION PARQUE PRINCIPAL MUNICIPIO DE OTANCHE"	Información para conocimiento y gestión.
Enero 13/ 01/ de 2023	CONSTRUCTORA PAÍS SAS	AADGC F037. Acta de Suspensión	Información para conocimiento y gestión.
Enero 18/ 01/ de 2023	CONSTRUCTORA PAÍS SAS	OFCM-2325-049. Primer alerta incumplimiento administrativo	Información para conocimiento y gestión.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**4**		FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023	

Enero 20/ 01/ de 2023	CONSTRUCTORA PAÍS SAS	OFCM-2325-051. Primer alerta sobre los atrasos en la programacion del cronograma de actividades de la obra contrato 1858 de 2022	Información para conocimiento y gestión.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

APELLIDOS Y NOBRES	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO					
					DESDE			HASTA		
					dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
CLISMAN GUERRERO VEGA	1.055.553.590	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
BRAYAN YECID PARA CASTRO	1.002.624.167	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
JAIME PRIETO CASAS	9.497.715	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
ALEXANDER TEJEDOR BERMUDEZ	9.438.713	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
JONATHAN JAVIER TORRES PULIDO	9.499.128	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
EDWARD DAVID BENITEZ FLOREZ	1.055.550.005	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
JOSE HERNANDO BENITEZ VARGASA	9.497.035	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
LUIS FERNEY CASTRO	71.174.786	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
NELSON GERMAN HERNANDEZ CASTILLO	6.655.308	X	X	X	1	1	2023	31	1	2023
ELVER ALFONSO BELTRAN VEGA	1.055.551.012	X	X	X	1	1	2023	1	2	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	si	X	no	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de obra	Isduar Humberto Páez Ramos	4158923
Residente de obra	Juan Carlos Velásquez Forero	80217561
Asesor estructural	Jimmy Vergara Silva	74321878
Especialista en geotecnia	Jimmy Vergara Silva	74321878
Asesor ambiental	Iván Ferley Cañón Páez	7314941
Asesor en recursos hídricos	Víctor Manuel Camacho Reyes	9658759
Asesor en iluminación publica	Jairo Alejandro Rodríguez Niño	79598573
Asesor y/o supervisor en seguridad y salud ocupacional	Yudy Jimena Rocha Torres	52898867

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	si	X	no	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
Director de interventoría	Oscar Javier Godoy Bautista	79049924
Residente de interventoría	Yenner Francisco Cardenas Comas	1015429618
Auxiliar de ingenieria	Cesar Augusto Rojas Bernal	75078312
Asesor estructural	Juan Camilo Calderon	1070608699
Profesional HSEQ	Sergio Alexander Leon Guiza	1090425911

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Se realiza verificación en la implementación y uso de los elementos de protección personal en cada una de las actividades de la obra, encontrando que todo el personal cumple con el requerimiento , tambien se verifico que el personal de la obra usa los uniformes establecidos por la Gobernación de Boyacá, señalizacion y acciones complementarias para el cumplimiento de este.	Costado posterior a tarima y costado juegos infantiles.
En lo que respecta al componente ambiental, se realiza verificación de la licencia ambiental y permiso minero de la cantera en la cual se extrae el material granular para el desarrollo del mortero y concreto; verificación de la certificación del sitio de acopio de material producto de excavación y RCD expedida por el Ingeniero Elkin Alzate Araque, Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio de Otanche. No obstante, el cumplimiento en la implementación del PMA se realiza conforme al instrumento aprobado, se hace verificacion del uso del punto ecológico, campamento, señalización dentro de la obra, y demás acciones complementarias para el desarrollo de los programas de Plan aprobado.	
Se realiza verificación de las fichas técnicas de los materiales tanto granulares como aditivos y otros suministros a implementar en los procesos consructivos, dentro de estos, losetas, material de cantera y diseño de mezcla de concreto para bordillos. Se realiza control y verificación de las tomas de muestras de concreto para la fundida de la zarpa y el vastago del muro cantilever y bordillo instalado realizadas en compañia del contratista de obra, en las cuales a la fecha de corte sólo se obtuvo el resultado de laboratorio a los 7 y 28 días, cumpliendo con lo dispuesto por la norma técnica de construcción.	Costado alcaldia Municipal, Tarima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Por parte de la interventoria, se realiza la entrega del informe de seguimiento mensual de implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que comprende los soportes de las actividades realizadas por parte de la empresa CEINTERS SAS, en lo que respecta a seguimiento, charlas diarias, inducción, examanes de ingreso, nomina, seguridad social, entre otros soportes.	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Compresión inconfinada	27	1	2023	Zarpa de muro cantilever, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 y 14 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 3300 psi
Compresión inconfinada	28	1	2023	Rampas de acceso, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 y 14 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 2500 psi
Compresión inconfinada	3	2	2023	Vastago de muro cantilever, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 3000 psi

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Compresión inconfinada	27	1	2023	Zarpa de muro cantilever, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 y 14 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 3300 psi
Compresión inconfinada	28	1	2023	Rampas de acceso, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 y 14 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 2500 psi
Compresión inconfinada	3	2	2023	Vastago de muro cantilever, Se toman 3 muestras para verificar la resistencia a los 7, 14 y 28 días. A la fecha se obtiene resultado a los 7 días, cumpliendo con el porcentaje de la resistencia de 3000 psi

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Gravilla, recebo, arena de peña, afirmado.	Agregados El Triangulo	67,4	Se observa un material limpio, sin materia organica y con buena resistencia

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 4	17	1	2023	Recomendaciones al proyecto y plan de contingencia
Acta de Comité de Obra No 5	7	2	2023	Seguimiento y avance de obra, Ajuste y balance de cantidades

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe cero	5	8	2022	7	10	2022	
Informe Semanal 01	12	10	2022	18	10	2022	
Informe Semanal 02	19	10	2022	25	10	2022	
Informe Semanal 03	26	10	2022	1	11	2022	
Informe Semanal 04	2	11	2022	8	11	2022	
Informe Mensual 001	12	10	2022	11	11	2022	
Informe Semanal 05	9	11	2022	15	11	2022	
Informe Semanal 06	16	11	2022	22	11	2022	
Informe Semanal 07	23	11	2022	29	11	2022	
Informe Semanal 08	30	11	2022	6	12	2022	
Informe Mensual 002	12	12	2022	11	12	2022	
Informe Semanal 09	7	12	2022	13	12	2022	
Informe Semanal 10	14	12	2022	20	12	2022	
Informe Semanal 11	21	12	2022	27	12	2022	
Informe Semanal 12	28	12	2022	3	1	2023	
Informe Semanal 13	4	1	2023	10	1	2023	
Informe Semanal 14	11	1	2023	17	1	2023	
Informe Semanal 15	18	1	2023	24	1	2023	
Informe Mensual 003	12	12	2022	12	1	2023	
Informe Semanal 16	25	1	2023	31	1	2023	

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**4**				FECHA:		12	de	FEBRERO	de	2023		
Informe Semanal 17	1	2	2023	7	2	2023							

OBSERVACIONES:

En este mes se observa normalidad y continuo desarrollo de las actividades en obra. El contratista realizo el plan de contingencia solicitado por la interventoria como, haciendo cumplimiento a este plan, se ha venido nivelando en porcentaje de avance tanto programado como ejecutado en las actividades contractuales.

En cuanto al avance físico de las actividades en obra, se viene trabajando en tres frentes de trabajo (sector parque infantil, sector Tarima frente a la alcaldía y sector plazoleta de comidas) de manera simultánea. También se incremento el pie de fuerza con la vinculación de mas obraros y un maestro de obra que sin lugar a dudas van a darle mayor rendimiento y celeridad a los procesos constructivos.

El contratista viene trabajando en el desarrollo y presentación del ajuste de cantidades adicionales y el balance financiero solicitado para poder iniciar la construcción de las obras extracontractuales con relación al muro de mampostería en la plazoleta de comidas y otros ítem que están por ajustar dentro del contrato de obra.

Se viene cumpliendo con los diferentes planes de calidad Y seguridad y manejo ambiental requeridos para el desarrollo de la obra.

Por el momento no se evidencias retrasos o traumatismos causados por la ola invernal que en el pasado mes nos afecto para el avance de las actividades en obra, pues hasta el momento las precipitaciones en la zona han sido en horarios extra laborales mas exactamente en horas de la noche.


CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	**VERIFICACIÓN**	**FOLIOS No.**
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	**SI**	**12-29**
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	**SI**	**42-44**
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	**N.A.**	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	**N.A.**	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	**SI**	**45-61**
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	**N.A.**	
Amortización del anticipo	**N.A.**	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	**SI**	**62-63**
Copia de actas de pago generadas en el periodo	**N.A.**	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	**SI**	**64-129**
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	**YA SE RADICO**	
Memorias y planos de diseño aprobados	**N.A.**	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	4	FECHA:	12	de	FEBRERO	de	2023

Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	N.A.	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	130-132
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	133-141
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	31-31
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	142-172
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	YA SE RADICO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	173-185
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	186-227
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	N.A.	
Generales		
Registro fotográfico	SI	234-240
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	241-255

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA: 

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS S.A.S /JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE



Municipio de Otanche, enero 16 de 2023

OFCM-2325-058

SEÑORES.
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Atn: Arq. Rodrigo Eduardo Uricoechea Moraies
Supervisor

Referencia. Entrega informe mensual interventoría 004.

Cordial saludo,

Por medio del presente, y dando cumplimiento a las obligaciones adquiridas con la Gobernación de Boyacá, mediante la suscripción del contrato de interventoría No. 2325 de 2022 de objeto: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA", me permito presentar ante su despacho, la entrega de informe mensual 04 de interventoría entre el periodo comprendido desde el 12 enero hasta el 11 de febrero del 2023.

Lo anterior, con el fin de tener informada a la entidad sobre los avances en obra, detallando estado de ejecución, seguimiento por curva físico y financiero del proyecto según cronograma aprobado por esta interventoria.

Atentamente,

Ing. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
CEINTERS SAS

Aprobó: Ing. Oscar Javier Godoy Bautista
Director de Interventoría

Anexos.
Informe Mensual de Interventoría de 261 folios.

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL PERSONAL DE OBRA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	Y	07/02/2023	65339567	$242.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	242.400	242.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	242.400	242.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	012	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	Y	07/02/2023	65339567	$242.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	4158923	PAEZ RAMOS ISDUAR HUMBERTO	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	7314941	CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0
3	CC	9658759	CAMACHO REYES VICTOR MANUEL	59	0			N																		0	0	0	0	0	0		0	0	14-4	1.160.000	5	80.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
IDENTIFICACION:	CC-4158923
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-07
FECHA DE PAGO:	2023-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25283913
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25283913
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.000	$ 855.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	07/03/2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900725797	8	GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	cll 43a 7 03	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3138912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909469672	9446501518	E	2023/02/22	2023/02/09	BANCOLOMBIA	0	$928,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1053331112	GONZALEZ DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	74321878	VERGARA JIMMY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
3	CC	1053342402	HERNANDEZ IVAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$93,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900725797	8	GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	cll 43a 7 03	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3138912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1909469672	9446501518	E	2023/02/22	2023/02/09	BANCOLOMBIA	0	$928,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$93,000	$0	$0	$93,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$93,000	$0	$0	$93,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**3**	**$928,200**	**$0**	**$0**	**$928,200**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79598573	0	JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ NIÑO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 3 N 22 01 TORRE 7 AP 401		8628681			JARODRIGUEZN@UNAL.EDU.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25514183	I	2023-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25514183	2023-02-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 79598573	RODRIGUEZ NIÑO JAIRO ALEJANDRO	3.600.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSIONES-25-14	3.900.000	624.000	0	0	COMPENSAR-EPS-EPS008	3.900.000	487.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.900.000	20.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.131.900	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79598573	0	JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ NIÑO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 3 N 22 01 TORRE 7 AP 401		8628681			JARODRIGUEZN@UNAL.EDU.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25514183	I	2023-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25514183		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	624.000	0	0	0	624.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	624.000	0	0	0	624.000
EPS(Administradoras: 1)				1	487.500	0	0	0	487.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	487.500	0	0	0	487.500
ARP(Administradoras: 1)				1	20.400	0	0	0	20.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	20.400	0	0	0	20.400
Gran Total					1.131.900	0	0	0	1.131.900

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 79598573	RODRIGUEZ NIÑO JAIRO ALEJANDRO	3.600.000										X							0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	3.900.000	624.000	0	0	COMPENSAR -EPS-EPS008	3.900.000	487.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.900.000	20.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.131.900	N	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79598573	0	JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ NIÑO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 3 N 22 01 TORRE 7 AP 401		8628681			JARODRIGUEZN@UNAL.EDU.CO		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-01	2023-01	25514183	I	2023-02-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.900	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	25514183		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	624.000	0	0	0	624.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	624.000	0	0	0	624.000
EPS(Administradoras: 1)				1	487.500	0	0	0	487.500
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	487.500	0	0	0	487.500
ARP(Administradoras: 1)				1	20.400	0	0	0	20.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	20.400	0	0	0	20.400
Gran Total					1.131.900	0	0	0	1.131.900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7314941		CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 # 7-19	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7264400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1897361624	9446480229	I	2023/02/09	2023/02/03	BANCOLOMBIA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0			$570,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0			$570,000
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0			$570,000
1	CC	7314941	CAÑON IVAN								X									25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total	**Afiliados(1)**																				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0			$570,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7314941		CAÑON PAEZ IVAN FERLEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 # 7-19	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7264400	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1897361624	9446480229	I	2023/02/09	2023/02/03	BANCOLOMBIA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				**1**	**$570,000**	**$0**	**$0**	**$570,000**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL CAMACHO REYES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO 10 - 23	TELÉFONO:	6356149
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7868832853**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/02/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1896897244

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 608.000
SUBTOTALES:										**$ 608.000**	**$ 0**	**$ 608.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 475.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.000	$ 0	$ 0	$ 475.000
SUBTOTALES:													**$ 475.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 475.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.900	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 19.900
SUBTOTALES:									**$ 19.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 9658759	CAMACHO REYES VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 3.800.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 608.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.800.000	$ 475.000	$ 0	$ 475.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.800.000	9658759	$ 19.900		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.102.900**

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	YUDY JIMENA ROCHA TORRES
IDENTIFICACION:	CC-52898667
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-02-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-15
FECHA DE PAGO:	2023-02-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOOMEVA S.A.
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	25524286
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	25524286
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800	$ 80.800
CCF10	891800213	COMFABOY	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.200	$ 23.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.600	$ 434.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/03/2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS	CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65338531	$3.923.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	128.000	0		0		0	0	0	0	128.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	38.700	0		0		0	0	0	0	38.700	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	78.000	0		0		0	0	0	0	78.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	230.800	0		0		0	0	0	0	230.800	7
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	40.300	0		0		0	0	0	0	40.300	2
ESSC91	EPS ECOOPSOS S.A.S	901093846-0	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	6.200	0	0	0	0	0	0		6.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.709.300	0	0	0	0	0	0		1.709.300	11
231001	Colfondos	800227940-6	167.100	0	0	0	0	0	0		167.100	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.700	0	0	0	0	0	0		185.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	820.400				820.400	0	0	820.400			8.204	820.400	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	517.400	0	0	517.400	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65338531	$3.923.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	517.400	517.400
Pensión	4	2.068.300	2.068.300
Riesgos Laborales	1	820.400	820.400
CCF	1	517.400	517.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	3.923.500	3.923.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	E	07/02/2023	65338531	$3.923.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002624167	PARRA CASTRO BRAYAN YECID	1	0			S	X	X															230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS041	966.667	38.700	14-4	966.667	5	67.300	CCF10	966.667	38.700	0	0	0	0	0
2	CC	1018493978	CORTES ROZO LUIS CARLOS	1	0			S	X	X															230301	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS005	800.000	32.000	14-4	800.000	5	55.700	CCF10	800.000	32.000	0	0	0	0	0
3	CC	1053324568	RAMIREZ CASTELLANOS JULIAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	1	6.300	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
4	CC	1053341203	MENESES SANCHEZ JHONATAN BRAYAN	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	1055550005	BENITEZ FLOREZ EDWARD DAVID	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	5	72.700	CCF10	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
6	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-4	38.667	1	300	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0
7	CC	1055553590	GUERRERO VEGA CLISMAN NORBEY	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
8	CC	1057597804	SIERRA LEON JEISSON ARNULFO	1	0			S																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS037	1.200.000	48.000	14-4	1.200.000	5	83.600	CCF10	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
9	CC	71174786	CASTRO LUIS FERNEY	1	0			S	X																25-14	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS037	193.334	7.800	14-4	193.334	5	13.500	CCF10	193.334	7.800	0	0	0	0	0
10	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.949.501	312.000	0	0	0	0	EPS017	1.949.501	78.000	14-4	1.949.501	5	135.700	CCF10	1.949.501	78.000	0	0	0	0	0
11	CC	9497035	BENITEZ VARGAS JOSE HERNANDO	1	0			S	X																230301	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	5	72.700	CCF10	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
12	CC	9497715	PRIETO CASAS JAIME	1	0			S	X	X															25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS008	966.667	38.700	14-4	966.667	5	67.300	CCF10	966.667	38.700	0	0	0	0	0
13	CC	9498713	TEJEDOR BERMUDEZ ALEXANDER	1	0			S	X																231001	1.044.000	167.100	0	0	0	0	EPS037	1.044.000	41.800	14-4	1.044.000	5	72.700	CCF10	1.044.000	41.800	0	0	0	0	0
14	CC	9499128	TORRES PULIDO JHONATAN JAVIER	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS041	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0
15	PT	6655308	HERNANDEZ CASTILLO NELSON GERMAN	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	ESSC91	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65338531	07/02/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	N	09/02/2023	65437791	$2.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.400				2.400	0	0	2.400			24	2.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	2.400	2.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	2.400	2.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
65338531	07/02/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-01	N	09/02/2023	65437791	$2.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-4	38.667	5	2.700	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSTRUCTORA PAIS
Cumplimiento Total

NOMINA MES DE ENERO DE 2023 - CONSTRUCTORA PAIS S.A.S. NIT. 901.063.647-3

Nº	NOMBRE TERCERO	IDENTIFICACIÓN TERCERO	CARGO	VALOR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	4.158.923	DIRECTOR DE OBRA	$ 3.100.000	$ 3.100.000	
2	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80.217.561	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.949.501	$ 1.949.501	
3	JIMMY VERGARA SILVA	74.321.878	ASESOR ESTRUCTURAL	$ 2.100.968	$ 2.100.968	
4	IVAN FERLEY CAÑON PAEZ	7.314.841	ASESOR AMBIENTAL	$ 2.100.968	$ 2.100.968	IVÁN FERLEY CAÑÓN
5	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9.658.759	ASESOR RECURSOS HIDRICOS	$ 2.100.968	$ 2.100.968	Victor M Camacho
6	JAIRO ALEJANDRO RODRIGUEZ NIÑ	79.598.573	ASESOR ILUMINACIÓN	$ 2.100.968	$ 2.100.968	
7	YUDY JIMENA ROCHA TORRES	52.898 667	ASESOR SISO	$ 1.949.501	$ 1.949.501	JIMENA ROCHA.
				$ 15.402.874	**$ 15.402.874**	

Powered by CamScanner

CONSTRUCTORA PAIS
Cumplimiento Total

NOMINA MES DE ENERO DE 2023 - CONSTRUCTORA PAIS S.A.S. NIT. 901.063.647-3

N°	NOMBRE TERCERO	IDENTIFICACIÓN TERCERO	CARGO	VALOR	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	JOSE HERNANDO BENITEZ VARGAS	9,497,035	MAESTRO DE OBRA	$ 1,160,000	$ 1,160,000	
2	BRAYAN YECYD PARRA	1,002,624,167	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 500,000	
3	ALEXANDER TEJEDOR BERMUDES	9.498.713	MAESTRO DE OBRA	$ 1,160,000	$ 1,200,000	
4	EDWARD DAVID BENITEZ FLOREZ	1,055,550,005	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 1,160,000	
5	JAIME PRIETO CASAS	9,497,715	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 500,000	JAIME PRIETO
6	LUIS FERNEY CASTRO	71.174.786	MAESTRO DE OBRA	$ 1,160,000	$ 232,000	
7	NELSON GERMAN HERNADEZ CASTILLO	6.655.308	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 38,667	
8	ELVER ALFONSO BELTRAN VEGA	1.055.551.012	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 38,667	ELVER Beltran
9	JHONATAN JAVIER TORRES PULIDO	9,499,128	AYUDANTE DE OBRA	$ 1,160,000	$ 38,667	Javier Torres
10	CLISMAN NORBEY GUERRERO VEGA	1,055,553,590	PROFESIONAL DE APOYO	$ 1,200,000	$ 1,200,000	
				$ 11,640,000	**$ 6,068,001**	

Powered by CamScanner

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CONTRATISTA DE OBRA

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

Municipio de Otanche, febrero 12 de 2023.

SEÑORES.
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Atn. Rodrigo E. Uricoechea
Supervisor

CERTIFICACIÓN

Yo, OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.049.924 de Bogotá DC, en calidad de Director de Interventoría del contrato 2325 de 2018, certifico que revisadas y verificados los soportes de los respectivos pagos de las planillas de aportes parafiscales y seguridad social del personal a cargo del contratista de obra durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 1858 de 2022, cuyo objeto REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA, CUMPLEN para el mes de enero del año 2023.


Cumpliendo el contratista, con el pago total del personal administrativo, conforme el desglose de la administración, y con lo establecido en la ley 789 de 2002, en su artículo 50 y ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los aportes correspondientes a la seguridad social, para el período de enero de 2023.

Atentamente,

Ing. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 25202-089432 CND
CEINTERS SAS

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

CEINTERS

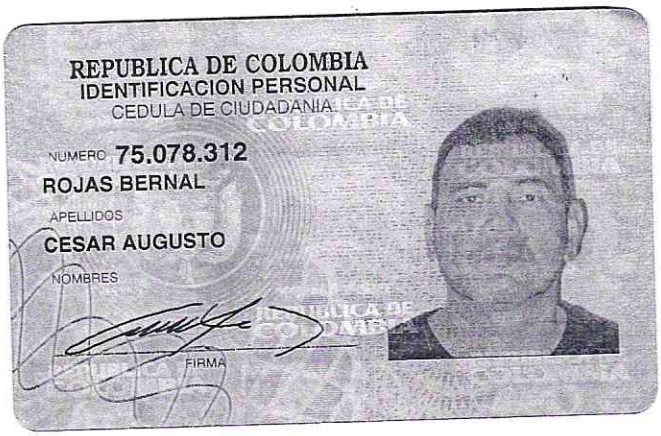

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 75.078.312

ROJAS BERNAL

APELLIDOS

CESAR AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-ABR-1973

HONDA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

01-OCT-1993 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2906400-00707905-M-0075078312-20150524 0044281315A 1 6543995240

NIT. 900331937-0
Cra. 4 No 21-05 Barrio Plan de Vivienda Puerto Boyacá - Boyacá
Cel. 311 455 1388 - 315 390 9559 - Tel. 7383858
E-mail. somedinipsltda@hotmail.com
servicioalcliente@somedinips.com
www.somedinips.com

SOMEDIN IPS
Salud Ocupacional y Medicina Integral

Código:	SS-F-05
Versión:	01
Fecha:	JULIO-13-2015



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 57.906

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
25 DÍA	01 MES	2023 AÑO	PUERTO BOYACÁ (BOYACÁ, COLOMBIA) Ciudad	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CENTERS SAS

Empresa en misión

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC. Cedula de Ciudadanía, CE. Cedula de Extranjería, TI. Tarjeta de Identidad, PT. Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Genero	Edad	Documento de Identificación	
ROJAS BERNAL CESAR AUGUSTO	MASCULINO	49 AÑOS 9 MESES 16 DÍAS	CC (Tipo)	75078312 (Número)

Cargo
AUXILIAR GENERAL

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos) **N/A**

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:


AUDIOMETRÍA	✓	CUADRO HEMÁTICO	✓
VISIOMETRÍA	✓	GLICEMIA	✓
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CON ÉNFASIS OSTEOMUSCULAR	✓	----------	

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
USAR GAFAS CORRECTIVAS PARA VISIÓN DE CERCA : DEBE ADQUIRIR GAFAS PARA VISION DE CERCA	PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL	HÁBITOS SALUDABLES
AUDIOMETRIA DE CONTROL DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS DEL PVE AUDITIVO DE LA EMPRESA	INCLUIR EN LOS PVE DE LA EMPRESA SEGÚN LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN	CONTROL DE PESO
VISIOMETRIA DE CONTROL DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS DEL PVE VISUAL DE LA EMPRESA		HACER DEPORTE
		DIETA BALANCEADA

OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados entes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico




Firma:

Nombre: BUELVAS BASTOS DALHEM DEL SOCORRO

R. M.: 6002/91 **L.S.O.:** 11273/2021

Código de Seguridad
V128B1H57906

Aspirante o Trabajador



Firma:

Nombre: ROJAS BERNAL CESAR AUGUSTO

CC: 75078312



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE UNA OBRA O LABOR CONTRATADA

Entre **CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL**, persona mayor de edad, identificado (a) con la cedula de ciudadanía No. 75.078.312 expedida en Manizales, domiciliado y residente en Honda, Tolima, y la empresa **CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INTERVENTORÍAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS SAS** con NIT. 900.849.991-3 y domicilio en la Calle 12 No. 5-66, y representada legalmente por la **ing. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE,** persona mayor de edad, quienes para los efectos legales se denominan el **TRABAJADOR**, la primera, y el **EMPLEADOR,** la segunda, acuerdan celebrar el presente **CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR LA DURACIÓN DE UNA OBRA O LABOR CONTRATADA,** regido por las siguientes cláusulas: **PRIMERA:** El empleador contrata los servicios personales del trabajador para desempeñar la labor de ***AUXILIAR DE INGENIERIA*** de los proyectos a cargo de la empresa, a partir del veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil veintitrés (2023), y éste se obliga: **a)** a poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de *conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR directamente o a través de* sus representantes. **b)** a no prestar directa e indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato; y **c)** guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o electrónicos informaciones y en general, sobre todos los asuntos y materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo. **SEGUNDA: REMUNERACIÓN.** EL EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios el salario de $ 1.500.000 pagadero mensualmente. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos dominicales y festivos de que tratan los Capítulos I, II Y III del Título VII del CTS. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Se cancelará adicional al salario $ 1.000.000 mensuales como bonificación o gratificación al empleado por llevar a éxito el proceso dentro de los términos contractuales, pago que no constituye salario, y que no forman parte de la base para el cálculo de las prestaciones sociales, aportes parafiscales ni de la seguridad social. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se reconocerá al TRABAJADOR la suma mensual de $ 600.000 para cubrir gastos en que se incurren para el cumplimiento de sus funciones fuera de la sede habitual, reconociendo principalmente gastos de transporte y alimentación en campo, esta denominada comisión o cualquier otra modalidad de salario variable, como remuneraciones a labor realizada, no se tendrá en cuenta como factor salarial para el pago de los aportes al sistema de seguridad social, ni como base para la liquidación de prestaciones sociales, **TERCERA: DURACIÓN DEL CONTRATO.** El presente contrato se celebra por el tiempo que dure la realización de la obra o labor contratada, de acuerdo con las condiciones generales que se señalan al principio del presente contrato. **CUARTA: PERIODO DE PRUEBA.** Los primeros treinta (30) días del presente contrato se consideran como periodo de prueba y por consiguiente, cualquiera de las partes podrá darlo por terminado unilateralmente en cualquier momento durante dicho periodo, sin que se cause indemnización. **QUINTA:** Son obligaciones especiales del trabajador: Realizar apoyo en el control adecuadamente los recursos invertidos por el contratista de obra, Asegurarse de que las obras ejecutadas cumplen los requisitos establecidos por la entidad contratante, realizar apoyo en la Verificación de cantidades de obra presentadas *por el contratista de obra, Realizar los informes de seguimiento semanal y mensual de interventoria*, Hacer reportes de avances de obra y entregar informes cuando sean solicitados por el director de interventoria, empleador o por la entidad contratante, Revisión y avance de la obra de acuerdo al Cronograma de obra, Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y ejecutar el contrato o convenio, igualmente, constatar – según el caso – la existencia de planos, diseños, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y ejecución del objeto contractual, Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario, Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que

no impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán someterse a la aprobación del Director de Interventoría y representante legal de la interventoría, una vez aprobadas las modificaciones, en cuanto a cantidades de obra deberán suscribir acta de modificación previa a la ejecución de éstas; los demás aspectos que se requieran modificar del contrato o convenio, deberán remitirse mediante comunicación interna a la oficina jurídica y de control interno del Municipio para la suscripción del respectivo documento, Controlar el avance de ejecución del contrato o convenio con base en el cronograma de ejecución presentado en la propuesta y aprobado por el Municipio y recomendar los ajustes a que haya lugar, Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos, Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el control de los mismos, Colocar al servicio del empleador toda su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva, en el desempeño de las funciones propias del cargo contratado y en las labores conexas y complementarias del mismo, en consideración con las órdenes e instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes. **SEXTA:** Como contraprestación por su labor, el empleador pagará al Trabajador el salario estipulado, el cual deberá cancelar en la fecha y lugar indicado, quedando establecido que en dicho pago se halla incluida la remuneración correspondiente a los descansos dominicales y festivos de que tratan los artículos 172 a 178 del Código Sustantivo del Trabajo. **SÉPTIMA:** Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con las modificaciones introducidas por el artículo 7° del Decreto 2351 de 1965. **OCTAVA:** Acuerdan las partes fijar como período de prueba los primeros treinta (30) días. En el caso de existir prórroga o un nuevo contrato entre las partes, se entiende que tampoco existirá nuevo período de prueba. Durante este lapso puede el empleador y/o trabajador darlo por terminado unilateralmente. Vencido el término de duración del contrato, sin que las partes lo hayan dado por terminado, se torna indefinido, siempre que subsistan las causas que lo originaron y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá dar por terminado unilateralmente este contrato, comunicando por escrito su decisión al empleador, con antelación no inferior a treinta (30) días. **NOVENA:** El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.

Para constancia se firma por las partes que han intervenido, en el Municipio de Puerto Boyacá, A los veinticinco (25) días del mes de enero del año dos mil veintitrés 2023.

EMPLEADOR
CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

César Rojas.

TRABAJADOR
CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL
CC. No. 75.078.312 expedida en Manizales

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	REGISTRO ENTREGA DOTACIÓN	CODIGO: FT-SST-017
		VERSION: 001 Fecha: 26/12/2022
		Página 1 de 1

PROYECTO: Contrato 130-DIFRA-20° – Otanche.	
NOMBRE DEL TRABAJADOR: CESAR AUGUSTO ROJAS.	**CÉDULA DE CIUDADANÍA:** 75.078.312.
CARGO: AUXILIAR INGENIERIA.	
FECHA DE INGRESO: 26-ENERO-2023	

ITEM	ELEMENTOS	FECHA ENTREGA	CANTIDAD	FIRMA TRABAJADOR
1	CAMISA	25-01-2023	3	
2	PANTALON	25-01-2023	2	
3	BOTAS DE SEGURIDAD	25-01-2023	1	
4	BOTAS DE CAUCHO			
5	CASCO	25-01-2023	1	
6	GAFAS DE SEGURIDAD	25-01-2023	1	
7	TAPAOIDOS DE INSERCION	25-01-2023	1	
8	TAPAOIDOS TIPO COPA			
9	GUANTES VAQUETA			
10	DOTACIÓN DE INVIERNO			
11				
ITEMS	**OBSERVACIONES:**			
1	Chaleco identificación. 4 + Portatil. DELL en buenas			
2	condiciones. de uso, quedando bajo Responsabilidad.			

NOMBRE RESPONSABLE HSEQ Jennifer Cantero FIRMA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Cesar Augusto Rojas FIRMA

Calle # 12 No. 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

Medellín, 20 de enero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000004 INTERVENTORÍA E INGENIERÍA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C75078312	ROJAS BERNAL CESAR AUGUSTO	26/01/2023		q3616191	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 20/01/2023 17:41:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.139.245.19, 192.230.104.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

O.P. 280235 04/16

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"Código Únicamente para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

C2420 Corretaje 2 FORMULARIO VÍA WEB

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE	2. TIPO DE AFILIACIÓN	3. RÉGIMEN
A. AFILIACIÓN ✔ B. REPORTE DE NOVEDADES	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia ✔ b) Beneficiario o afiliado adicional B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	C. Contributivo ✔ S. Subsidiado

4. TIPO DE AFILIADO	5. TIPO DE COTIZANTE	CÓDIGO	FECHA DE LA SOLICITUD
CO Cotizante ✔ CF Cabeza de Familia BE Beneficiario	A. Dependiente ✔ B. Independiente C. Pensionado		13 DÍA 02 MES 2023 AÑO

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO: ROJAS	SEGUNDO APELLIDO: BERNAL	PRIMER NOMBRE: CESAR	SEGUNDO NOMBRE: AUGUSTO

7.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	9. SEXO	10. FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. C.C. ✔ C.E. P.A. C.D. S.C.	75.078.312	F M	18 DÍA 04 MES 1989 AÑO

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ETNICO	12. DISCAPACIDAD	13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN	14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Código	Tipo F N M Condición T P			SURA

16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES	17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC	18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	ZONA	LOCALIDAD / COMUNA	BARRIO
COLPENSIONES	1.500.000	CALLE 116ª No. 15-127 cantabria	U. ✔ R.		

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	CÓDIGO IPS
PUERTO BOYACÁ	BOYACÁ		3115030200	rojasb_cesar@hotmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS			
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

20.TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	22. SEXO	23. FECHA NACIMIENTO	CÓDIGO IPS
T.I. C.C. C.E. P.A. C.D.		F M	DÍA MES AÑO	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	26. NÚMERO DE IDENTIDAD	27. SEXO F	27. SEXO M	28.. FECHA DE NACIMIENTO DÍA	MES	AÑO	29. PARENTESCO	30. ETNIA	31. DISCAPACIDAD Tipo	31. DISCAPACIDAD Condición
1		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
2		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
3		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.
4		CN RC TI CC CE PA SC									F. N. M.	T. P.

	32. DATOS DE RESIDENCIA Ciudad / Mpio.	Departamento	Zona	Teléfono Fijo	Teléfono Móvil	33. VALOR UPC AFILIADO ADICIONAL (Lo diligencia la EPS)	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud (IPS)	NIVEL DE SISBÉN	GRUPO POBLACIONAL
1			R. U.					I. II.	
2			R. U.					I. II.	
3			R. U.					I. II.	
4			R. U.					I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social	36. Tipo documento de identidad	37. Número documento de identidad	DV	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones
CEINTERS SAS	C.C. ✔ C.E. P.A. C.D. N.I.	900.849.991		

39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TELÉFONO FIJO	TELÉFONO MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO
CALLE 12 No. 5-66 B/ PROGRESO	BOGOTA	BOGOTA		3212605323	imagenytecnologiac@gmail.com

FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL	CARGO	SALARIO
26 DÍA 01 MES 2023 AÑO	AUXILIAR DE INGENIERIA	1.500.000

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD

1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS — Código
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR ✔
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO
11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS
13. MOVILIDAD — A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO — B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO
14. TRASLADO — A) MISMO RÉGIMEN — B) DIFERENTE RÉGIMEN
15. REPORTE DE FALLECIMIENTO
16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE
17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SEXO	FECHA NACIMIENTO
R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C.		F M	DÍA MES AÑO

42. FECHA (a partir de)	43. EPS ANTERIOR	44. MOTIVO DE TRASLADO	45. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES
DÍA MES AÑO	Código	Código	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(la) Señor(a)_____ Identificado(a) con _____ No. _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependen económicamente de mi.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad
49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. Firma de Cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. Firma y sello del empleador, aportante o Entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL	DANIELLIZARAZO

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad: — Total
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial	67. Datos del SISBÉN	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del Municipio / Código del departamento	Número de ficha / Puntaje / Nivel	DÍA MES AÑO	DÍA MES AÑO

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

VIGILADO Supersalud
IMPRESO POR CAYMAR EMPRESARIAL FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 492 2110

Recuerde que con la firma del formulario,el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

O.P. 280235 04/16

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

FORMULARIO VÍA WEB

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL identificado (a) con R.C. | T.I. | C.C. ✔ | C.E. | Otro: _____

número 75.078.312 de Honda/ Tolima, certifico que:

1. He recibido la carta de derechos y deberes	SÍ ☑ No ☐
2. He recibido la carta de desempeño con el ranking de NUEVA EPS	SÍ ☑ No ☐
3. Leí el contenido de la carta de derechos y deberes	SÍ ☑ No ☐
4. Leí el contenido de la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
5. Me fueron resueltas las dudas sobre el contenido de las cartas de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
6. Entendí y comprendí lo enunciado en la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño	SÍ ☑ No ☐
7. NUEVA EPS cuenta con canales disponibles y eficaces para resolver las dudas sobre el contenido de las cartas	SÍ ☑ No ☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. _____

y/o correo electrónico: _____

SÍ ☐ No ☐

Cordialmente

Firma: CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL

Tipo ID: CC No. ID: 75.078.312

Fecha (dd/mm/aaaa): 13/02/2023

Dirección: CALLE 116ª No. 15-127 cantabria

Tel: 3115030200 Municipio PUERTO BOYA

Departamento: BOYACA

Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____

Tipo ID: _____ No. ID: _____

Fecha (dd/mm/aaaa): _____

Dirección: _____

Tel: _____ Municipio _____

Departamento: _____

Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A. consúltela al reverso de este documento.

Información de NUEVA EPS

Asesor: GLORIA INES AREVALO PABON

Código C2420 Oficina _____

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. Para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.

Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

• Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros, datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.

• solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.

• Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.

• Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.

• Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.S., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.com.co
Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Línea Gratuita: 01 8000 954400
Línea de atención en Bogotá: 307 7022
Conmutador: (57 + 1) 4193000
Dirección Administrativa: Carrera 85k No. 46A – 66 Piso 2.

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 ''Hábeas Data''; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA		PRODUCTOR AGROPECUARIO	
			$	SÍ		Sí	
				NO		NO	

Nivel de Escolaridad									
Ninguno ☐	Secundaria ☐	Normalista ☐	Profesional ☐	Doctorado ☐
Preescolar ☐	Media académica o clásica (bachillerato básico) ☐	Técnica Profesional ☐	Especialización ☐	Último Grado
Básico Primaria ☐	Media técnica (bachillerato básico) ☐	Tecnológica ☐	Maestría ☐	Aprobado _____

Posición Ocupacional	Patrón/Empleador ☐	Contratista ☐	Trabaja por su Cuenta ☐
Inicio Contrato		Fin Contrato	

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD, EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 59 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación						Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
		NIT	C.C.	C.E.	P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del GESTOR o PROMOTOR	CÓDIGO GESTOR o PROMOTOR	Nombre DIRECTOR COMERCIAL	CÓDIGO DIRECTOR	Causal Inconsistencia y/o Observaciones	
					CIUDAD Y FECHA

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CESAR AUGUSTO ROJAS BERNAL** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **75078312,** se encuentra afiliado/a desde **01/10/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 20 de enero de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTROL DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS (Acta de aprobación Sec. De Contratación)

EL SECRETARIO DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Reconoce y aprueba el Anexo 6 de la Póliza de Cumplimiento No. 39-44-101138638, expedida el 24 de Noviembre de 2022, y el anexo 3 de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 39-40-101036643 expedida el 13 de octubre de 2022, por la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A Para amparar el Contrato de obra Pública No. 1858 de 2022, suscrito entre el Departamento de Boyacá y **COSTRUCTURA PAIS S.A.S,** Cuyo objeto es **"REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".** Con un valor de **($1.417.122.618,89)**.

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	V/R ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/10/2022	13/06/2024	$212.568.392,83
PRESTACIONES SOCIALES	12/10/2022	14/06/2026	$212.568.392,83
CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS*	SI AMPARA 5 AÑOS*	$283.424.523,78
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12/10/2022	12/10/2023	$425.136.785,67
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRAC	12/10/2022	14/06/2023	$300.000.000,00

Nota: *Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo se elabora el presente anexo para aclarar que los amparos de pago de salarios y prestaciones sociales y el buen manejo y correcta inversión del anticipo cubrirán los periodos de ejecución y se actualizan las vigencias según el acta de liquidación al contrato de obra pública No. 1858 de fecha 26 de mayo de 2022.

Se deja constancia que la verificación en línea de las pólizas la realizó VANESSA GARAVITO TOVAR (previa aprobación o rechazo) a efectos de verificar la validez, idoneidad, existencia y suficiencia de los documentos que se entregan como soporte de las garantías que amparan al contrato (se anexa reporte de verificación en página).

Dada en Tunja a los, dos (2) días del mes de noviembre de 2022.

SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO
Secretaria de Contratación

Proyectó: Vanessa Garavito Profesional externa
Reviso: Sara Camila Cipamocha Rodriguez. Profesional Externa.


SEGUROS DEL ESTADO
Consulta de pólizas
Datos de la póliza
Estado:
Vigente
Número de póliza:
39-44-101138638
Número de anexo:
6
Fecha de expedición:
jueves, 24 de noviembre de 2022
Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Asegurado:
DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tomador:
CONSTRUCTORA PAIS SAS
Inicio de vigencia:
miércoles, 12 de octubre de 2022
Fin vigencia:
martes, 12 de octubre de 2027
Valor total asegurado:
$ 1.133.698.095
Consultar de nuevo

BITÁCORA DE OBRA

MIERCOLES 11 de ENERO
INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 pm
personal en obra: residente de obra, residente
interventoria, 2 maestros 3 obreros
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, Polidora
ESTADO DEL TIEMPO: soleado en la mañana, nublado tard

ACTIVIDADES REALIZADAS

se continua con la demolicion del muro de contencion, de igual manera la demolicion de la placa de contra piso, se instalan las tapas de 5 cajas de inspeccion electrica.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 12 de ENERO
INICIO: 7:00 am FIN 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
2 maestros 3 obreros
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico
Estado del tiempo: nublado en la mañana, inicia a llover a la 1 y se inician actividades a las 2:00 PM

actividades realizadas

se continua con la demolicion de un muro de contencion, y demolicion de anden de contrapiso de igual manera demolicion de bordillo.

residente de obra residente interventoria

VIERNES 13 ENERO

INICIO: 7:00 am FIN 5:00 PM
Personal en obra: residente de obra, residente interventoria, 2 maestros 3 obreros.
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico
estado del tiempo: amanece lloviendo y se logra iniciar actividades a las 8:00am, inicia a llover a las 1 y se reinicia actividades a las 2:00 PM

Actividades realizadas

se continua continua con la demolicion de muro de contención demoliciones de anden de bordillo y se realiza instalacion de tapas de las cajas de inspeccion electrica.

Vobo. Dpto. Jur. Direct. Int.

residente de obra residente interventoria

Vobo Director de Obra

SABADO 14 ENERO
INICIO: 7:00 FIN: 1:00
PERSONAL en obra: residente interventoria, residente obra, 2 maestros, 3 obreros

MAQUNARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico, 1 volqueta, 1 retro escavadora (pajarito
ESTADO DEL TIEMPO: amanece lloviendo y se logra dar inicio a las 8:00 am
Reunion en secretaria de planeación con interventoria municipio y obra para definir muros de tarima y de zona de comidas
Planeación (Municipio) reitera el no estar de acuerdo con planteamiento de interventoria de suspender obra

Vobo Jef. Jur. Direct. Int.

Se def
para cim
tarima.
del cimien
Se plant
comidas

Se det
iniciar e


Obra

ACTIVIDAD
se conti
y de moli
material
1 retroexc
autoriza

RESIDE

Se define que el nivel de desplante para cimiento de muro de la zona de tarima. es el mismo para toda la sección del cimiento

Se plantea configura muro en la zona de comidas así:

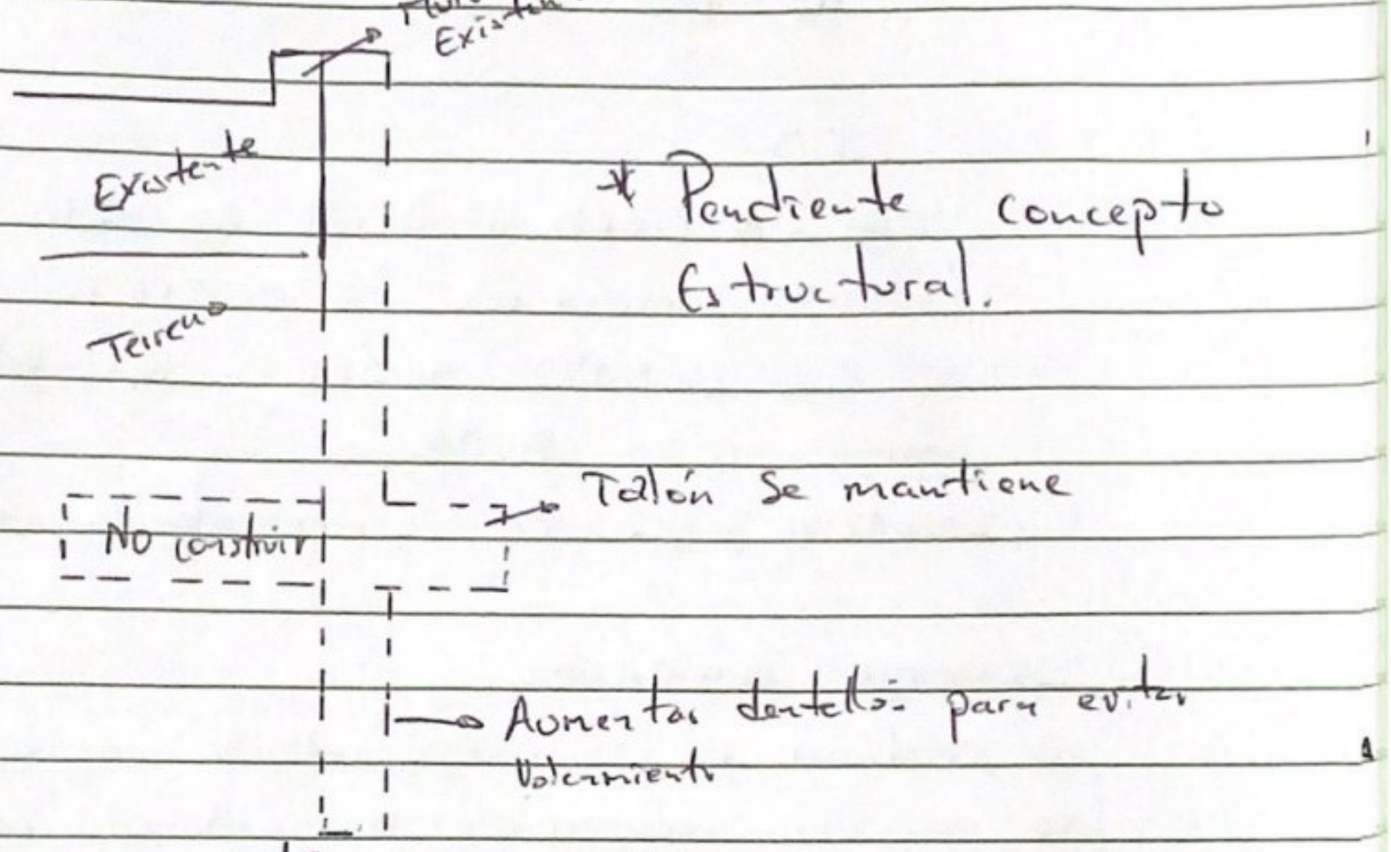

Se determina NO suspender y procurar iniciar el lunes con zona de tarima.

Obra

Interventoria

Municipio

ACTIVIDADES REALIZADAS

se continua con demolicion de muro de contención y demolicion de anden, Se realizó retiro de material sobrante de demoliciones con 1 volqueta y 1 retroexcavadora (cabrita) se disponе material en lugar autorizado por la Alcaldía.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 15 DE ENERO.

NO se labora segon progvamación

LUNES 16 DE ENERO

INICIO: 7:00 FIN: 5:00 Pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria, 2 maestros 3 obreros.
ESTADO DE TIEMPO: Amanece lloviendo y se logra dar inicio alos 8:00 am
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, pulidora, motosierra

ACTIVIDADES REALIZADAS:
se continua y termina Demolicion de muro de contención, se realiza excavacion de material comun amano para nivelación de piso para andenes en vasta, se realizo corte de tres arboles que se encuentran en area de intervención.

Vobo Residente Interventoria

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 17 DE
INICIÓ 7:00
PERSONAL EN OB
2 maestros, 3 obre
ESTADO DE TIEMPO:
a llover a la 1:
MAQUINARIA Y EC
1 volqueta, 1 retro

ACTIVIDADES REA
se realizo excava
instalacion de los
y se retira ma
realiza excavacio
zarpa de muro

Vobo Residente Interventoria

RESIDENTE DE

MIERCOLES 18 DE
INICIO 7:00
PERSONAL EN OBI
2 maestros, 3 obr
ESTADO TIEMPO:
8:00 am
MAQUINARIA Y EQU
ACTIVIDADES REA
se funden 5
rampas, de ir
po zapata de

RESIDENTE DE

).

programación

fin: 5:00 pm

e de obra, residente
obreros.
ce lloviendo y se logra

mientas menores, pulidora, motosierra

ion de muro de contención,
material comun a mano
para andenes en loseta,
arboles que se encuentran

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 17 DE ENERO
INICIÓ 7:00 FIN: 5:00
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
2 maestros, 3 obreros
ESTADO DE TIEMPO: nublado en la mañana, inicia a llover a la 1:00 pm y se logra dar inicio 2:30 pm
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, 1 Volqueta, 1 retroexcavadora (pala.la)

ACTIVIDADES REALIZADAS
se realiza excavación y nivelacion de terreno para instalacion de loseta, se realiza demolicion de sardinel y se retira material sobrante de excavacion, se realiza excavacion de cortes y canales para zarpa de muro de contencion en zona de tarima

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 18 DE ENERO
INICIO 7:00 FIN: 5:00
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria, 2 maestros, 3 obreros.
ESTADO TIEMPO: AMANECE lloviendo y se logra dar inicio actividades 8:00 am
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, 1 volqueta, 1 pasavito
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se funden 5.6 ML de bordillo en concreto para rampas, se inicia con corte y doble de acero pa zapata de muro de contencion.

Vobo. Ing. Residente
Vobo. Interventoria

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 19 DE ENERO 2023
INICIO: 7:00 am FIN: 5:00pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
2 maestros, 3 obreros
ESTADO DE TIEMPO: nublado todo el dia
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores,
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se realizo excavacion de andes, corte de acero
y figurado para zarpa.

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 20 DE ENERO 2023
INICIO: 10:30 am FIN 5:00
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
2 maestros, 3 obreros
ESTADO DE TIEMPO: amanece lloviendo y se logro
dar inicio a las actividades 10 30 am
MAQUNARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores
se ~~con~~ inicia realizando actividades de, drenaje
de aguas estancadas y se continua
amarrando acero para zapata, de igual manera
se inicio cortando acero para el vastago del
muro de contención.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE ITERVENTORIA

SABADO 21 DE
INICIO: 7:00 am
PERSONAL EN OBRA
2 maestros, 3 obreros.
ESTADO DEL tiem
dar inicio a los
MAQUINARIA Y EQU

ACTIVIDADES REALIZA
se continuo con
el muro de cont
de igual manera
del acero para

RESIDENTE DE OBR

DOMINGO 22 DE E

DIA NO laboral

LUNES 23 DE E
INICIO: 7:00 am
PERSONAL EN OBRA
3 obreros, 2 maest
ESTADO DEL TIE
MAQUINARIA Y EQU
ACTIVIDADES REA
se inicia realiz
Vastago del m
acero de zarpa

RESIDENTE OBR

Fin: 5:00pm
do, residente interventoria
el día
menores,
corte de acero

INTERVENTORIA

Fin 5:00
a, residente interventoria
do y se logro
m
menores
les de drenaje
ontinua
de igual manera
el vastago del

ITERVENTORIA

SABADO 21 DE ENERO
INICIO: 7:00 am Fin: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE de obra, residente interventoria
2 maestros, 3 obreros:
ESTADO DEL tiempo. amanece lloviendo y se logra dar inicio a las actividades 8:30 am
MAQUINARIA Y EQUIPOS Herramientas menores

ACTIVIDADES REALIZADAS,
se continua con el amarre de la zapata para el muro de contencion, talon, puntera y dentellon, de igual manera se continua con el corte del acero para el vastago del muro de contencion

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 22 DE ENERO

DIA NO laboral segun programacion de obra

LUNES 23 DE ENERO
INICIO: 7:00 am Fin 5:00pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
3 obreros, 2 maestros
ESTADO DEL TIEMPO: nublado todo el dia
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se inicia realizando amarre de acero para el vastago del muro de contencion y amarrando a acero de zarpa.

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 24 ENERO
INICIO: 7:00 am Fin: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA; residente de obra, residente interventoria
2 maestros 3 obreros.
ESTADO TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se continua armando acero de zapa y vastago para el muro de contención, se realiza excavacion de anclajes para instalacion de losetas

RESIDENTE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 25 ENERO
INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA, residente obra, residente interventoria, 2 maestros, 3 obreros.
ESTADO DE TIEMPO: soleado todo el dia
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico
ACTIVIDADES REALIZADAS
Inicia demolicion de muro de contencion ubicado en puestos de Ventas, de igual manera se culmino figurado y amarrado de acero para zapata;

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 26 E
INICIO: 7:00 am
PERSONAL EN OF
2 maestros 3 obr
ESTADO DE TIEN
MAQUINARIA Y E
ACTIVIDADES REAL
se continua con
instalacion de
finalizo con
el vastago

RESIDENTE DE O

VIERNES 27 E
INICIO: 7:00 am
PERSONAL EN
interventoria, 3
ESTADO DEL TIE
MAQUINARIA Y E
vibrador para

ACTIVIDADES

Se funde za
para zona d
3.000 psi y
se vaciza pa
para la cons

RESIDENTE C

Fin: 5:00 pm
de obra, residente interventor

uentas menores

de zapa y vastago
, se realizo excavacion
en de los ste

RESIDENTE INTERVENTORÍA

Fin: 5:00 pm
obra, residente interventoria

todo el dia
ntas menores, martillo electrico

: contencion ubicado
igual manera se
odo de acceso todo

ESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 26 ENERO 2023
INICIO: 7:00 am Fin: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
2 maestros 3 obreros.
ESTADO DE TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientos menores.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se continua con la demolicio del muro de contencion
instalacion de malla electrosoldada, y se
finaliza con el amarre de acero para
el vastago del muro de contención.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 27 ENERO 2023
INICIO: 7:00 a m Fin 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente
interventoria, 2 maestros 3 obreros.
ESTADO DEL TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUIPOS Herramientos menores, mezcladora
vibrador para concreto.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se funde zapata DEL muro de contencion
para zona de tarima, con un concreto de
3.000 psi y se toman muestras de concreto,
se realiza prueba con el cono de abrams
para la consistencia del concreto

RESIDENTE OBRA

RESIDENTE INTERVENTO

SABADO 28 ENERO 2023

INICIO: 7:00 FIN: 7:00 pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria,
3 MAESTROS 3 obreros

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, mezcladora, vibrador conc

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se realiza instalacion de malla electrosoldada para rampas de acceso y se funden, se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado para andenes con loseta de colores.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 29 ENERO 2023

NO SE labora segun programacion de obra

LUNES 30 ENERO 2023

INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria,
3 maestros 1 obrero

ESTADO DEL TIEMPO: soleado.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se inicia a poner camillas para testerar muro de contencion sector tarima,

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 31 E

INICIO: 7:00 am

PERSONAL EN

3 maestros 4

ESTADO DEL T

MAQUINARIA

ACTIVIDADES

se continua

ubicado en

un martillo

testeriando, mu

RESIDENTE O

MIERCOLES

INICIO: 7:00 am

PERSONAL EN

3 maestros

ESTADO DE

MAQUINARIA Y E

ACTIVIDADES R

se continua

ubicado en

electrico, se

del parque,

muro de

RESIDENTE

Fin: 7:00 pm
...ra, residente interventoria,
...menores, mezcladora, vibrador concreto
...electrosoldada para
...e realizo mejoramiento
...modo paso andenes

...DENTE INTERVENTORIA

...obra

Fin: 5:00 pm
...dente interventoria,

...as menores
...sterar muro de

...NTE INTERVENTORIA

MARTES 31 ENERO 2023
INICIO: 7:00 am
FIN: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria, 3 maestros 4 obreros,
ESTADO DEL TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico
ACTIVIDADES REALIZADAS
se continua con demolición de muro de contencion ubicado en puestos de comida con 2 ayudantes y un martillo electrico, de igual manera se continua testeriando muro de contencion.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

MIERCOLES 1 FEBRERO 2023
INICIO: 7:00 am
FIN: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente Interventoria 3 maestros 4 obreros
ESTADO DEL TIEMPO: soleado
MAQUNARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electrico
ACTIVIDADES REALIZADAS

se continua con demolicion de muro de contencion ubicado en zona de comidas con 2 ayudantes y 1 martillo electrico, se funde 7.11 ML de bordillo para accesos del parque, y se continua con testeros para muro de contencion sector tarima.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 2 DE FEBRERO 2023
INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interven
3 maestros y obreros.
ESTADO DEL TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, martillo electr
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se realizo Nivelacion de formaleta para el muro de contencion, y se taqueteo con madera rolliza y tablon, de igual manera se continue con demolicion de muro de contencion ubicado en zona de comidas

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

VIERNES 3 DE FEBRERO 2023
INICIO: 7:00 am FIN 5:00pm
PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
3 maestros 4 obreros.
ESTADO DEL TIEMPO: soleado
MAQUINARIA Y EQUPOS: Herramientas menores, Vibrador de concreto, mezcladora
ACTIVIDADES REALIZADAS:
se realiza la fundida del muro de contencion, ubicado en la zona de rampa, se Toman las respectivas muestras de concreto con los cilindros respectivos, de igual manera se realiza ensayo con el cono de abrams para ver la consistencia del concreto

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 4 DE
INICIO: 7:00am
PERSONAL EN OBR
3 maestros, 4 obre
ESTADO DEL TIEM
MAQUINARIA Y EQ
(Pajarita) Herramien

ACTIVIDADES REAL

Se realiza Excavac
de comidas, y se
material de afirm

RESIDENTE DE O

DOMINGO 5 DE F

NO se labora s

LUNES 6 DE FEB
INICIO: 7:00 am
PERSONAL EN OBRA:
3 maestros, 5 obre
Estado de tiempo:
MAQUINARIA Y EQUIPO
Actividades realiza
se realiza nivelacio
que se realizo
fundido en sitio,
de afirmado en

RESIDENTE DE

23

Fin: 5:00 pm

e obra, residente interventor

as menores, martillo electric

oleta para el muro

nadera rolliza y tablones,

con demolicion de

n zona de comidas.

DENTE INTERVENTORIA

fin 5:00pm

; residente interventoria

menores, vibrador,

de contencion,

Toman las

n los comisers

a ensayo con el

ncia del concreto.

N+C INTERVENTORIA

SABADO 4 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00am Fin: 3:00pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria
3 maestros, 4 obreros

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1 volqueta sencilla, 1 retroexcavadora (pajarita) Herramientas menores, vibrocompactador tipo rana.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza excavacion de cortes y canales en zona de comidas, y se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 5 DE FEBRERO 2023

NO se labora segun programacion de OBRA.

LUNES 6 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am Fin: 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria,
3 maestros, 5 obreros

Estado de tiempo: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientos menores, Pulidora, Vibrocompactador

Actividades realizadas

se realiza nivelacion en la excavacion de cortes y canales, que se realizo en la zona de comidas, se realiza bordillo fundido en sitio, y se realiza mejoramien con material de afirmado en zona de los acceso.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MARTES 7 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 PM

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria, 3 maestros, 5 obreros

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientos menores, polidora, vibrocompactador

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se realizo desmonte de formaleta instalada para muro de contencion en zona de tarima, se realizo mejoramiento con material de afirmado en accesos al parque principal.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

MIERCOLES 8 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am FIN: 5:00 pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente de interventoria 3 maestros, 5 obreros.

ESTADO DEL TIEMPO: Amanece lloviendo

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientos menores, polidora, Vibrocompactador

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realiza mejoramiento de piso con material de afirmado e instalacion de loseta en area de los accesos, de igual manera se realizo nivelacion en zona de tarima y demolicion de zona de andenes, y bordillo en concreto.

RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

JUEVES 9 DE F

INICIO: 7:00 am

PERSONAL EN OBR

3 maestros 5 obreros

ESTADO DEL TIEMPO

MAQUINARIA Y EQU

ACTIVIDADES REALIZ

se continua con

y mejoramiento d

de igual manera

loseta de colores

RESIDENTE DE

VIERNES 10 DE

INICIO: 7:00 am

PERSONAL EN O

3 maestros 5 obrero

ESTADO DEL TIE

MAQUINARIA Y

ACTIVIDADES REALIZ

se realizo demolici

realizo bordillo

de andenes, con

cemento.

RESIDENTE DE

JUEVES 9 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am FIN: 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria 3 maestros 5 obreros.

ESTADO DEL TIEMPO: amanece lloviendo.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, Pulidora, Vibrocompactador

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se continua con demolicion de bordillo de zona de tarima y mejoramiento de piso con material de afirmado, de igual manera se realiza construccion de andenes con loseta de colores en base de arena cemento.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA.

VIERNES 10 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am FIN: 5:00pm

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interventoria, 3 maestros 5 obrero.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, pulidora, vibrocompactador

ACTIVIDADES REALIZADAS:

se realizo demolicion de placa en ZONA DE TARIMA para realizar bordillo, fundido en sitio, se realiza construccion de andenes, con loseta de colores a base de arena cemento.

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE INTERVENTORIA

SABADO 11 DE FEBRERO 2023

INICIO: 7:00 am

PERSONAL EN OBRA: residente de obra, residente interv
5 maestros obricos.

ESTADO DEL TIEMPO: soleado

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Herramientas menores, pulidora vibrocom

ACTIVIDADES REALIZADAS

se termina construccion de andenes en loseta c
una base de arena cemento y respectivo linea
de tortrol, de igual manera se instala
formaleta para fundir bordillo en zona de tarima


RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE INTERVENTORIA

DOMINGO 12 DE FEBRERO 2023

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES E INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

"CURVA S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

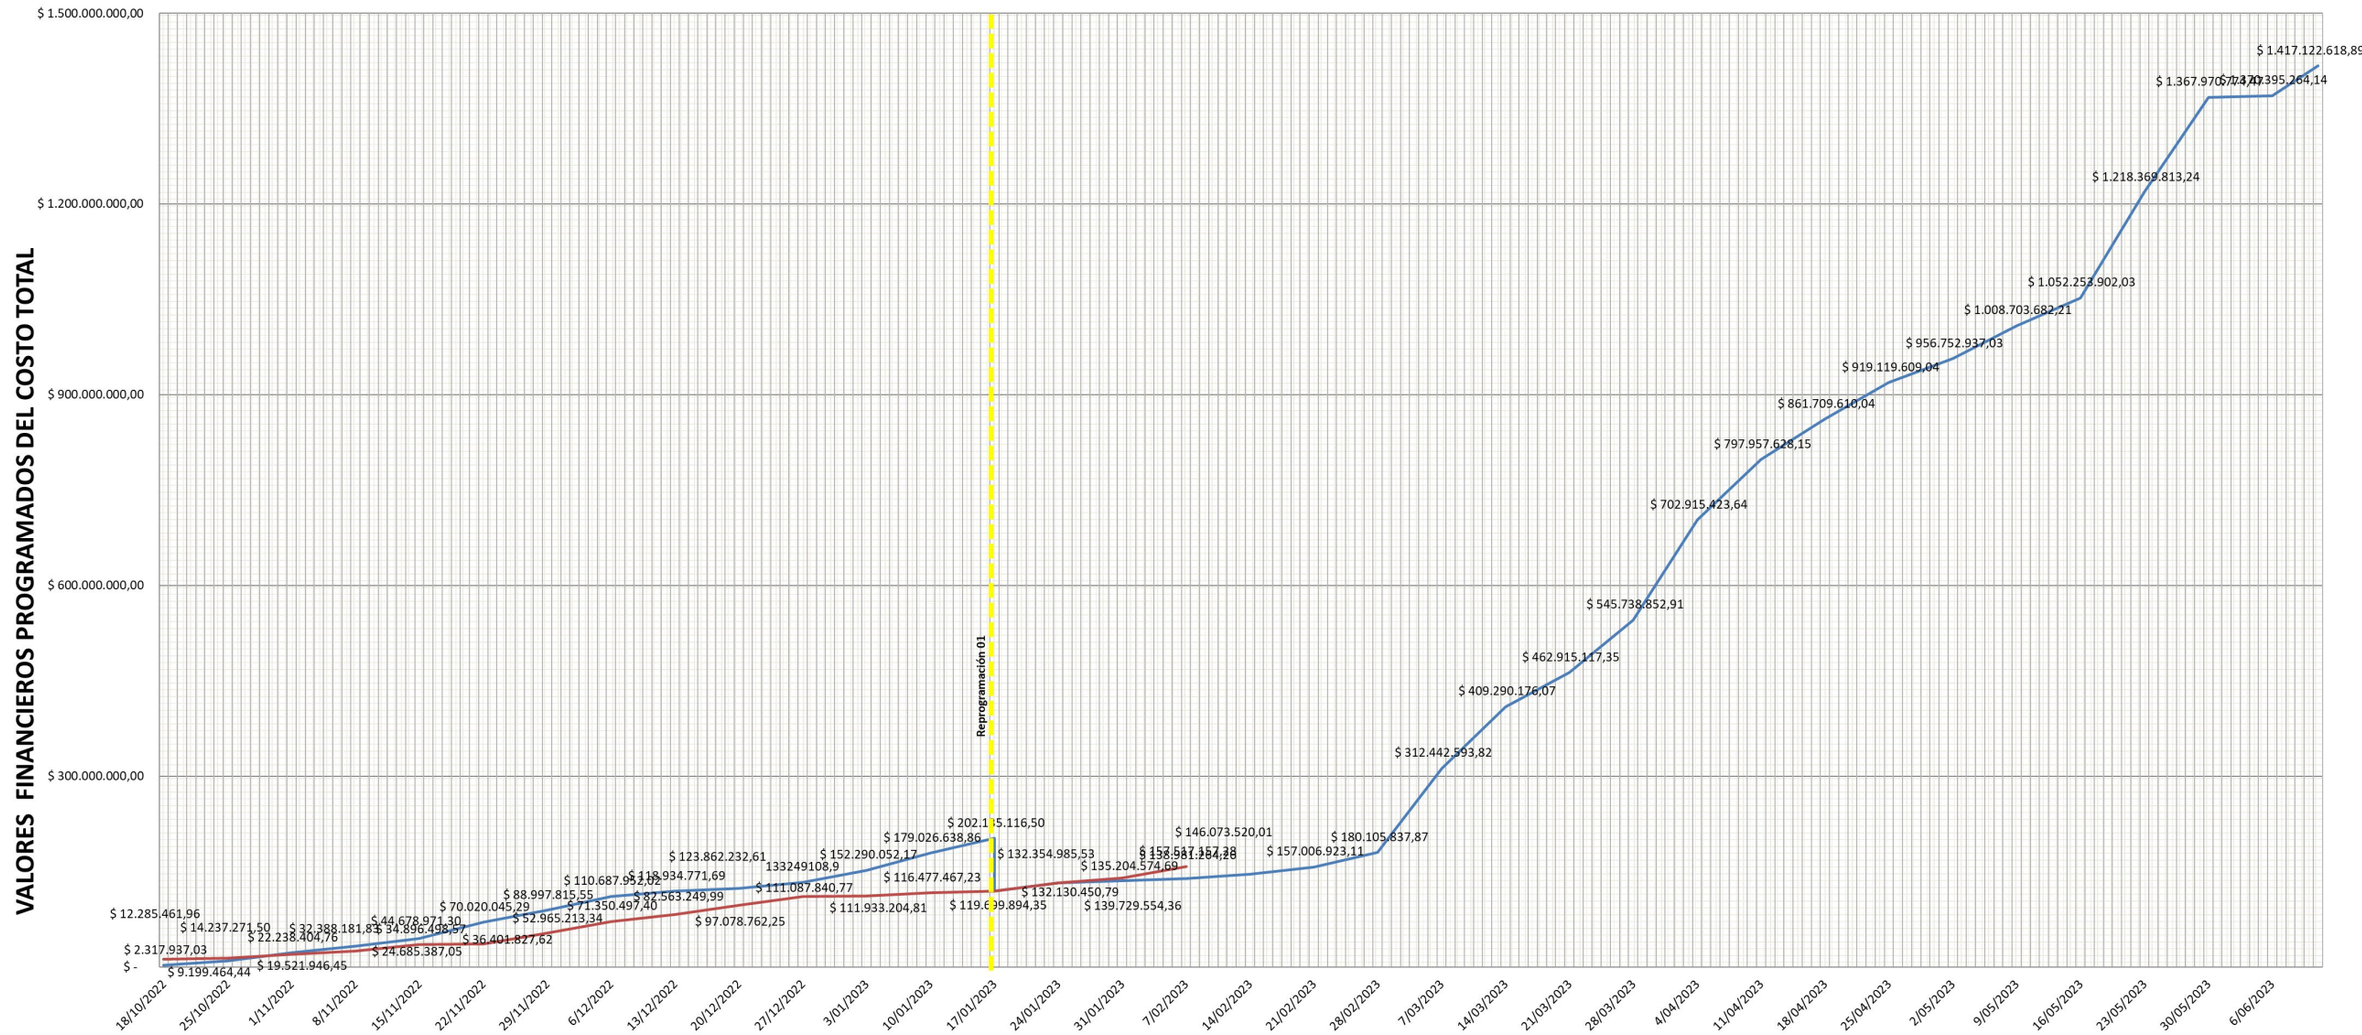

	18/10/2022	25/10/2022	1/11/2022	8/11/2022	15/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	6/12/2022	13/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	3/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	7/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	28/02/2023	7/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	4/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	2/05/2023	9/05/2023	16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	6/06/2023	11/06/2023
Financiero Programado Acum	$ 2.317.	$ 9.199.	$ 22.238	$ 32.388	$ 44.678	$ 70.020	$ 88.997	$ 110.68	$ 118.93	$ 123.86	$ 133.24	$ 152.29	$ 179.02	$ 202.13	$ 119.69	$ 132.13	$ 135.20	$ 138.98	$ 146.07	$ 157.00	$ 180.10	$ 312.44	$ 409.29	$ 462.91	$ 545.73	$ 702.91	$ 797.95	$ 861.70	$ 919.11	$ 956.75	$ 1.008.	$ 1.052.	$ 1.218.	$ 1.367.	$ 1.370.	$ 1.417.
Financiero Ejecutado Acum	$ 12.285	$ 14.237	$ 19.521	$ 24.685	$ 34.896	$ 36.401	$ 52.965	$ 71.350	$ 82.563	$ 97.078	$ 111.08	$ 111.93	$ 116.47	$ 119.69	$ 119.69	$ 132.35	$ 139.72	$ 157.51																		

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS

CEINTERS SAS
NIT. 900.849.991-3

Municipio de Otanche, febrero 12 de 2023.

SEÑORES.
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Atn. Rodrigo E. Uricoechea
Supervisor

CERTIFICACIÓN

Yo, OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.049.924 de Bogotá DC, en calidad de Director de Interventoría del contrato 2325 de 2018, certifico el cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas a cargo del contratista de obra durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 1858 de 2022, cuyo objeto REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA, para el período comprendido entre el 12 de enero de 2022 y 11 de febrero de 2023.

Atentamente,

Ing. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MP. 25202-089432 CND
CEINTERS SAS

Calle12 # 5-66 B/Progreso
Municipio de Puerto Boyacá
Email. ceinters@outlook.es
Contacto. 321 260 5323

INFORMES SEMANALES

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		11 de enero al 17 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		014

FECHA DE ELABORACIÓN 17/01/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO OBRA No:	1858 de 2022	**FECHA PERFECCIO/MTO:**	12/10/2022	**PLAZO EJEC. (MESES):**	OCHO MESES
OBJETO	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS				
INTERVENTOR R/L:	ING. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE				
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES				
FECHA DE INICIO	12/10/2022	**FECHA DE SUSP.**		**FECHA REINICIO**	**FECHA TERM.** 11/06/2023
PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	8	**PLAZO TRANSCURRIDO EN MESES**	3,27	**PORCENTAJE EN MESES**	40,83%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.417.122.618,89	**VALOR ADICIONALES**	$ -	**VR. TOTAL CONTRATO**	$ 1.417.122.618,89
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 425.136.785,67	**VALOR DE ACTAS PARCIALES NETO**	$ 67.372.969,36	**VALOR AMORTIZADO**	$ 20.211.890,81
VALOR DE ACTAS AMORTIZADAS	$ 47.161.078,55	**VALOR POR PAGAR**	$ 944.824.754,67	**VALOR POR EJECUTAR**	$ 1.349.749.649,53

II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	FECHA FIN EJECUCIÓN REAL	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
1	INICIO	mié 12/10/22	vie 14/10/22	vie 14/10/22	100,00%
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	vie 14/10/22	jue 25/05/23		70,00%
3	ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	vie 14/10/22	vie 25/11/22		91,00%
4	ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	lun 31/10/22	vie 9/12/22		69,00%
5	ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	lun 19/12/22	mar 21/02/23		38,00%
6	TARIMA	lun 12/12/22	mié 1/03/23		5,00%
7	PUESTOS DE VENTAS	mar 10/01/23	mié 29/03/23		6,00%
8	ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	mar 28/03/23	mié 26/04/23		10,00%
9	ANDEN PUESTOS DE VENTAS	lun 17/04/23	vie 26/05/23		22,00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS	mar 28/03/23	mar 9/05/23		4,00%
11	URBANISMO	lun 29/05/23	dom 11/06/23		2,00%
12	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	vie 14/10/22	dom 11/06/23		39,00%
13	RETIE	mié 10/05/23	mié 7/06/23		
14	PROVISION IMPLEMENTACION	dom 11/06/23	dom 11/06/23		

III. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	ITEM GOBERNACI	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	233,74	0	$ 41.795,00	$ 9.769.163,00
1,02	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3561,23	0	$ 4.829,00	$ 17.197.180,00
1,03	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro Cúbico	112,88	0	$ 16.320,00	$ 1.842.202,00
1,04	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	258,44	0	$ 66.142,00	$ 17.093.738,00
1,05	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	247,7	0	$ 82.433,00	$ 20.418.654,00
1,06	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	19,75	12	$ 114.144,00	$ 2.524.865,00
1,07	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	15,65	0	$ 27.067,00	$ 423.599,00

1,08	1.01.30	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	83,45	0	$ 66.374,00	$ 5.538.910,00
1,09	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	476,78	0	$ 16.281,00	$ 7.762.455,00
1,1	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	352,86	0	$ 3.588,00	$ 1.266.062,00
1,11	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	292,09	0	$ 4.676,00	$ 1.365.813,00
1,12	N/A	RETIRO DE BARANDA EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA	Cotizacion	Metro lineal	38,71	0	$ 12.500,00	$ 483.875,00
1,13	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-Km	15407,14	0	$ 1.656,00	$ 25.514.224,00
1,14	1.01.07	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	Precios Gober.	Unidad	14	0	$ 90.816,00	$ 1.271.424,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 112.472.164,00
							A	$ 24.743.876,00
							I	$ 3.374.165,00
							U	$ 5.623.608,00
2		ANDENES Y URBANISMO					TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35CM	Precios Gober.	Metro lineal	311,58	12	$ 56.443,00	$ 19.696.891,13
2,02	N/A	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LOSETA DE COLORES INCLUYE LINEA CON ESTOPEROL Y BASE EN ARENA CEMENTO	Cotizacion	Metro Cuadrado	785,34	0	$ 136.616,00	$ 107.290.009,44
2,03	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	11,25	12	$ 105.619,00	$ 1.330.799,40
2,04	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	Precios Gober.	Unidad	6	12	$ 471.963,00	$ 3.171.591,36
2,05	N/A	BANCA EN MADERA PLASTICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Unidad	10	0	$ 1.555.556,00	$ 15.555.560,00
2,06	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M OSO DE ANTEOJOS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.565.350,00	$ 6.565.350,00
2,07	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M MARIPOSA MORPHO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 5.739.175,00	$ 5.739.175,00
2,08	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M QUINCHA	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.122.750,00	$ 6.122.750,00
2,09	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 2,0M (ALTURA DEL CUERPO) HOMBRE MINERO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 19.956.700,00	$ 19.956.700,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 185.428.826,00
							A	$ 40.794.342,00
							I	$ 5.562.865,00
							U	$ 9.271.441,00
3		TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	1.02.24	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Precios Gober.	Metro Cúbico	29,07	12	$ 816.987,00	$ 26.599.789,54
3,02	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro Cúbico	37,58	12	$ 712.761,00	$ 29.999.825,39
3,03	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,47	12	$ 1.184.917,00	$ 623.740,31
3,04	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 66.938,00	$ 18.184.109,33
3,05	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 24.941,00	$ 6.775.372,30
3,06	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Precios Gober.	Kilogramo	501,82	12	$ 6.169,00	$ 3.467.214,89
3,07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	4,34	12	$ 1.230.801,00	$ 5.982.677,50
3,08	N/A	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Cotizacion	Kilogramo	6502,68	0	$ 8.492,00	$ 55.220.758,56
3,09	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30 * 30 * 1.7 CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 74.733,00	$ 13.171.183,07

3,1	1.11.28	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 15.598,00	$ 2.749.041,43
3,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED FORMATO 30 * 30 cm CALIDAD PRIMERA	Cotizacion	Metro Cuadrado	206,17	0	$ 75.000,00	$ 15.462.750,00
3,12	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Gober.	Metro lineal	22,89	12	$ 331.577,00	$ 8.500.573,23
3,13	1.02.08	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,86	12	$ 405.865,00	$ 390.929,17
3,14	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	6,96	12	$ 682.168,00	$ 5.317.635,99
3,15	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 17.935,00	$ 69.852.032,77
3,16	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 2.981,00	$ 11.610.198,48
3,17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA FERRARI MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	533,64	0	$ 412.500,00	$ 220.126.500,00
3,18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO CAL16 O 1.5MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	78,9	0	$ 620.342,00	$ 48.944.983,80
3,19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MESONES - LAMINA DE ALUMINIO CAL14 O 2MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	49,68	0	$ 753.992,00	$ 37.458.322,56
3,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD CARA SENCILLA, INCLUYE PINTURA FACHADA SEGUN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	128,58	0	$ 98.600,00	$ 12.677.988,00
3,21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 231.965,00	$ 2.783.580,00
3,22	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	Precios Gober.	Metro Cuadrado	42,48	12	$ 135.066,00	$ 6.426.116,12
3,23	1.12.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Precios Gober.	Metro Cuadrado	109,26	12	$ 176.691,00	$ 21.621.889,70
3,24	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro lineal	36,42	12	$ 75.218,00	$ 3.068.172,31
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 627.015.384,44
							A	$ 137.943.385,00
							I	$ 18.810.462,00
							U	$ 31.350.769,00
4		INSTALACIONES HIDRAULICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23,83	0	$ 33.242,00	$ 792.156,86
4,02	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 83.501,00	$ 1.122.253,40
4,03	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Precios Gober.	Metro lineal	65,93	12	$ 12.611,00	$ 931.216,40
4,04	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	93,22	12	$ 40.414,00	$ 4.219.480,25
4,05	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	Precios Gober.	Metro lineal	48	12	$ 50.633,00	$ 2.722.030,10
4,06	1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	17,02	12	$ 40.694,00	$ 775.725,31
4,07	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	5	12	$ 593.114,00	$ 3.321.438,40
4,08	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 88.036,00	$ 1.183.203,84

4,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 345.239,00	$ 345.239,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 15.412.743,56
							A	$ 3.390.804,00
							I	$ 462.382,00
							U	$ 770.637,00
5		INSTALACIONES ELECTRICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARCIAL DE TABLERO A CAJAS DE INSPECCION EN CABLE 3#4+1#4+1#4THHHNCU	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 73.626,00	$ 21.719.670,00
5,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INTALACION DE TABLERO Y TOMAS.	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 295.724,00	$ 295.724,00
5,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCCIÓN Y CONTROL ALUMBRADO	Cotizacion	Unidad	2	0	$ 4.531.640,00	$ 9.063.280,00
5,04	N/A	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA CD 2006 EBSA	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 773.910,00	$ 10.834.740,00
5,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE1".	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 97.755,00	$ 28.837.725,00
5,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOTENCIACION EN CAJAS DE INSPECCIÓN.	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 287.466,00	$ 4.024.524,00
5,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 711.976,00	$ 2.847.904,00
5,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CAJA DE INSPECCIÓN A POSTES EN UN DUCTO DE 1"	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 48.694,00	$ 2.921.640,00
5,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 PARA ILUMINARIAS	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 14.471,00	$ 868.260,00
5,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA BAJA TENSION AP	Cotizacion	Unidad	28	0	$ 73.678,00	$ 2.062.984,00
5,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 A 5METROS	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 1.235.870,00	$ 14.830.440,00
5,12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 2.193.241,00	$ 26.318.892,00
5,13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO LED CON IP 68.	Cotizacion	Unidad	16	0	$ 254.772,00	$ 4.076.352,00
5,14	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 229.047,00	$ 2.748.564,00
5,15	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA GFCI, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 275.178,00	$ 3.302.136,00
5,16	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Precios Gober.	Unidad	1	12	$ 355.872,42	$ 398.577,11
5,17	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 75.827,95	$ 1.019.127,65
5,18	1.07.57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 125.505,88	$ 1.686.799,03
5,19	N/A	REUBICACION DE LAMPARAS SOLARES	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 389.274,00	$ 1.557.096,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 139.414.435,00
							A	$ 30.671.176,00
							I	$ 4.182.433,05
							U	$ 6.970.722,00


COSTOS DIRECTO TOTAL		**$ 1.079.743.552,99**
ADMINISTRACIÓN (22%)		**$ 237.543.581,66**
IMPREVISTOS (3%)		**$ 32.392.306,59**
UTILIDAD (5%)		**$ 53.987.177,65**
OTROS COSTOS	**RETIE**	**$ 5.000.000,00**
	PMA	**$ 4.260.000,00**
	PROVISION IMPLEMENTACION	**$ 4.196.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.417.122.618,89**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		11 de enero al 17 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		014

IV. INDICADORES

Nº	INDICADORES	VALORES ($)	% SOBRE EL Vr. TOTAL	DIFERENCIA (+) o (-)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 202.135.116,50	14,26%	-$ 82.435.222,15
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría	$ 119.699.894,35	8,45%	
	VALOR TOTAL POR EJECUTAR COSTO TOTAL		**$ 1.297.422.724,54**	

"CURVA S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

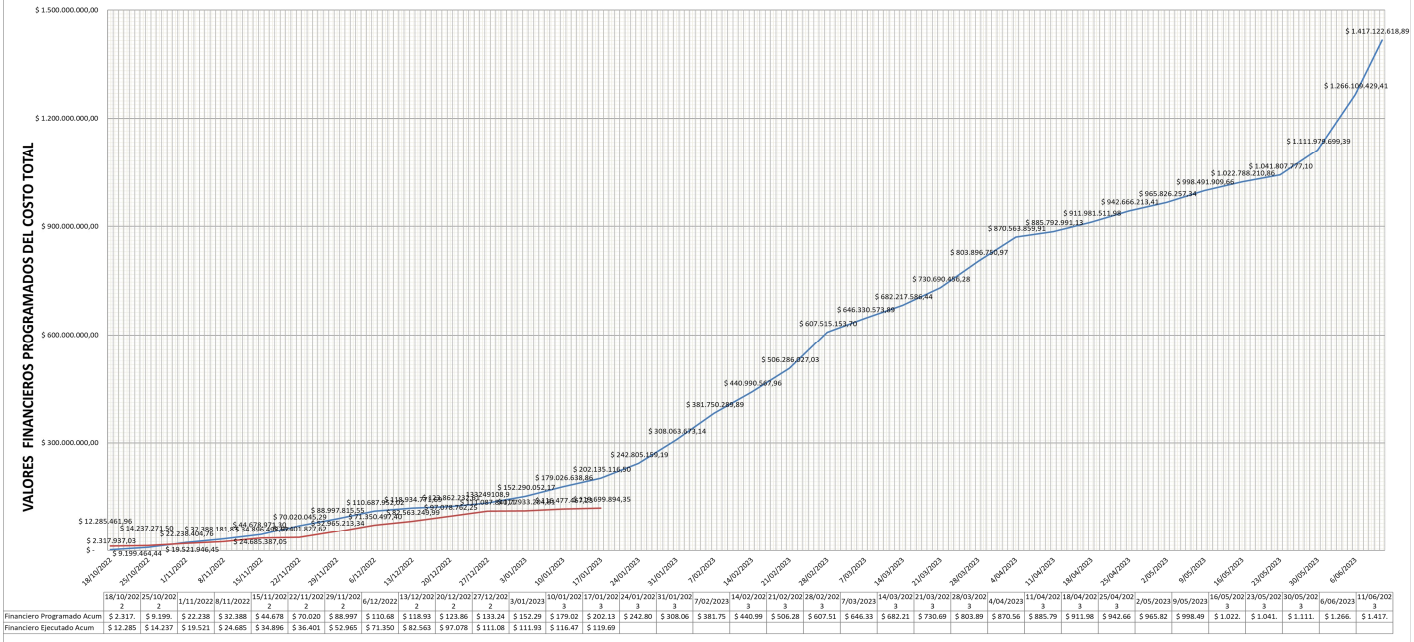

DATOS SEGUIMIENTOS SEMANALES					
Semana N°	Desde	Hasta	% Programado Acum	Financiero Programado Acum	Financiero Ejecutado Acum
1	12/10/2022	18/10/2022	0,16%	$ 2.317.937,03	$ 12.285.461,96
2	19/10/2022	25/10/2022	0,65%	$ 9.199.464,44	$ 14.237.271,50
3	26/10/2022	1/11/2022	1,57%	$ 22.238.404,76	$ 19.521.946,45
4	2/11/2022	8/11/2022	2,29%	$ 32.388.181,83	$ 24.685.387,05
5	9/11/2022	15/11/2022	3,15%	$ 44.678.971,30	$ 34.896.498,57
6	16/11/2022	22/11/2022	4,94%	$ 70.020.045,29	$ 36.401.827,62
7	23/11/2022	29/11/2022	6,28%	$ 88.997.815,55	$ 52.965.213,34
8	30/11/2022	6/12/2022	7,81%	$ 110.687.952,02	$ 71.350.497,40
9	7/12/2022	13/12/2022	8,39%	$ 118.934.771,69	$ 82.563.249,99
10	14/12/2022	20/12/2022	8,74%	$ 123.862.232,61	$ 97.078.762,25
11	21/12/2022	27/12/2022	9,40%	$ 133.249.108,87	$ 111.087.840,77
12	28/12/2022	3/01/2023	10,75%	$ 152.290.052,17	$ 111.933.204,81
13	4/01/2023	10/01/2023	12,63%	$ 179.026.638,86	$ 116.477.467,23
14	11/01/2023	17/01/2023	14,26%	$ 202.135.116,50	$ 119.699.894,35
15	18/01/2023	24/01/2023	17,13%	$ 242.805.159,19	
16	25/01/2023	31/01/2023	21,74%	$ 308.063.673,14	
17	1/02/2023	7/02/2023	26,94%	$ 381.750.289,89	
18	8/02/2023	14/02/2023	31,12%	$ 440.990.567,96	
19	15/02/2023	21/02/2023	35,73%	$ 506.286.027,03	
20	22/02/2023	28/02/2023	42,87%	$ 607.515.153,70	
21	1/03/2023	7/03/2023	45,61%	$ 646.330.573,89	
22	8/03/2023	14/03/2023	48,14%	$ 682.217.586,44	
23	15/03/2023	21/03/2023	51,56%	$ 730.690.456,28	
24	22/03/2023	28/03/2023	56,73%	$ 803.896.750,97	
25	29/03/2023	4/04/2023	61,43%	$ 870.563.859,91	
26	5/04/2023	11/04/2023	62,51%	$ 885.792.991,13	
27	12/04/2023	18/04/2023	64,35%	$ 911.981.511,98	
28	19/04/2023	25/04/2023	66,52%	$ 942.666.213,41	
29	26/04/2023	2/05/2023	68,15%	$ 965.826.257,34	
30	3/05/2023	9/05/2023	70,46%	$ 998.491.909,66	
31	10/05/2023	16/05/2023	72,17%	$ 1.022.788.210,86	
32	17/05/2023	23/05/2023	73,52%	$ 1.041.807.777,10	
33	24/05/2023	30/05/2023	78,47%	$ 1.111.979.699,39	
34	31/05/2023	6/06/2023	89,34%	$ 1.266.109.429,41	
35	7/06/2023	11/06/2023	100,00%	$ 1.417.122.618,89	

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 11 de enero al 17 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 014

V. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSA


NO REGISTRA/ NO APLICA

VI. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - OBJETIVO: ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN
NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA

VII. CURVA "S"

CURVA "S": PROGRAMADO, EJECUTADO

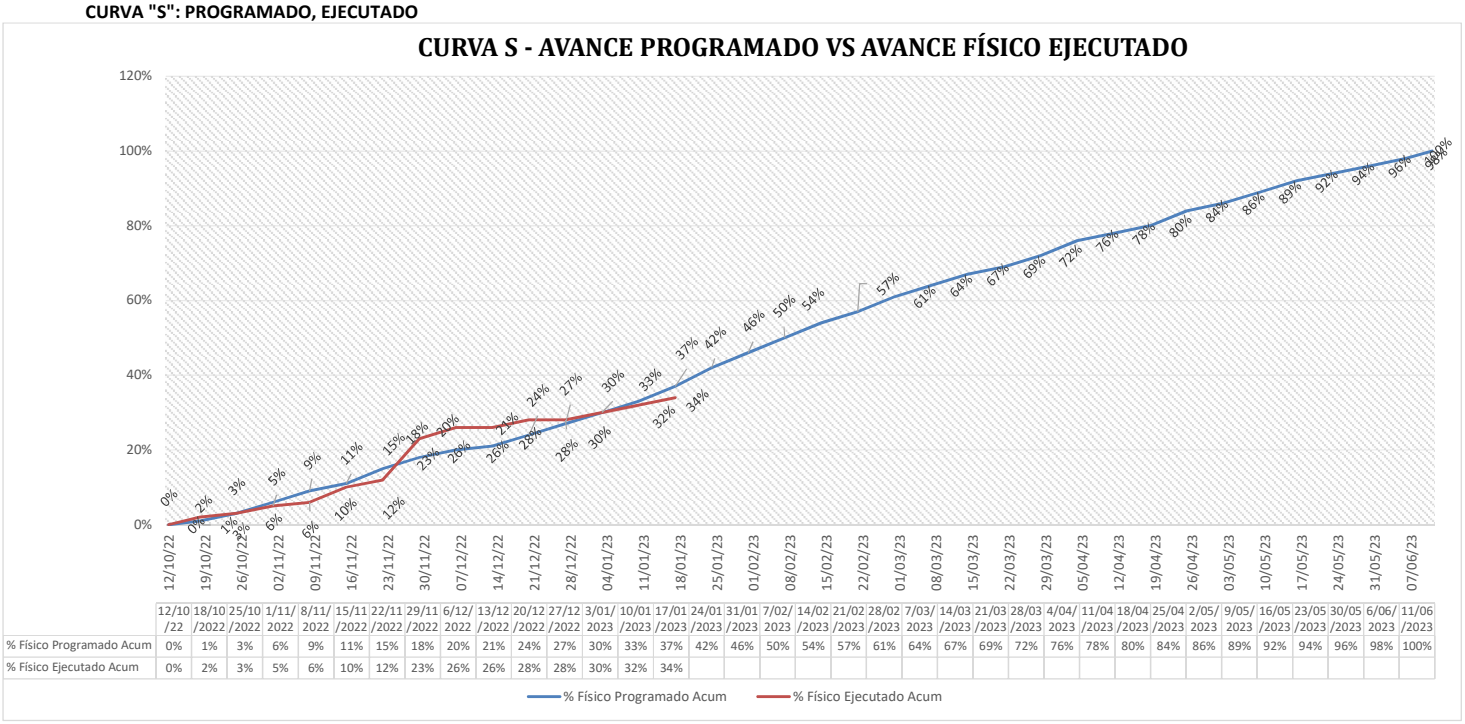

	12/10/22	19/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	09/11/2022	16/11/2022	23/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	04/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	08/02/2023	15/02/2023	22/02/2023	01/03/2023	08/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	29/03/2023	05/04/2023	12/04/2023	19/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	10/05/2023	17/05/2023	24/05/2023	31/05/2023	07/06/2023
% Físico Programado Acum	0%	1%	3%	6%	9%	11%	15%	18%	20%	21%	24%	27%	30%	33%	37%	42%	46%	50%	54%	57%	61%	64%	67%	69%	72%	76%	78%	80%	84%	86%	89%	92%	94%	96%	98%	100%
% Físico Ejecutado Acum	0%	2%	3%	5%	6%	10%	12%	23%	26%	26%	28%	28%	30%	32%	34%																					

AVANCE FÍSICO DE OBRA					
% PROGRAMADO DE AVANCE	37,00%	% EJECUTADO DE AVANCE	34,00%	% DESVIACION	-3,0%

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se continúa por el costado posterior de la tarima, por el costado de juegos infantiles y costado frente a la alcaldía, con el desarrollo de las siguientes actividades:

Localización y replanteo, se efectúa la ubicación de los postes de iluminación del parque y definición de niveles de excavación para conformación de andenes y bordillos. Se tiene un área acumulada levantada de 2492,86m2. Lo anterior, acorde a los diseños del proyecto aprobado.

Cerramiento perimetral, acumulado a la presente semana se reconocen 231,05m.

Demolición de andenes, se ejecutaron 156,3m2, acumulado a la presente semana son 476,78m2.

Desmonte de adoquín prefabricado, en la presente semana se ejecutaron 46,12m2.

Demolición de sardinel, se ejecutaron 25,29ml, acumulado a la presente semana son 256,31ml.

Demolición de muro, se ejecutaron 12,41m2.

Retiro de baranda en tubería metálica, en la presente semana se ejecutaron 38,71ml.

Corte de árbol, se cortan 5 arboles.

Excavación manual, se ejecutaron 7,41m3, acumulada la actividad se llevan 50,1m3.

Excavación de cortes y canales, se ejecutaron 30,29m3.

Se continua el acopio de material producto de excavación y RCD en el predio autorizado por la Alcaldía de Otanche.

Mejoramiento de piso con material de afirmado, acumulado a la presente semana son 29,81m3.

Bordillo fundido, acumulado a la presente semana son 123,96ml.

Construcción de andenes en loseta de colores incluye línea con estoperol y base en arena cemento, acumulado a la presente semana son 168,36m2.

Cajas de inspección eléctrica en cumplimiento a las especificaciones de la Normatividad de la EBSA, acumuladas se llevan 7 cajas de inspección eléctrica.

A la presente semana se cuenta muro en bloque para instalación de tablero y tomas.

Suministro e instalación de banco de ductos de caja de inspección a postes en un ducto de 1", acumulado a la presente semana son 5,43ml.

Finalmente, teniendo en cuenta que se presentan constantes lluvias, el respectivo control se reporta en bitácora de obra, para llevar la precisión en el cese de actividades que se generan en el desarrollo de la obra, situación que justifica el atraso especifico de algunas actividades ocasionado por esta condición climática variable.

VII. COMENTARIO Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Evaluando la ejecución del contrato, de acuerdo a la "Curva S - Avance Programado Vs. Avance físico ejecutado", se refleja un atraso respecto al porcentaje programado del 3%.

Por otra parte, se observa que en cuanto al control financiero que se hace por medio de la "Curva S - Avance financiero programado Vs. Avance financiero ejecutado" existe una diferencia por debajo de lo programado de -$ 82.435.222,15, equivalente al 5.82%, esto se debe a la necesidad de incluir ítems que no fueron detectados en la etapa de planeación inicial del proyecto pero que se requieren para la ejecución del contrato y otros ítems resultantes del trabajo de campo realizado a la fecha. Así mismo, el atraso se ve reflejado por la condición climática de lluvias de la zona.


Teniendo en cuenta que el atraso también ha sido ocasionado por los periodos de lluvias, la interventoría solicitará al contratista un plan de contingencia y reprogramación de obra para controlar el atraso evidenciado.

Es pertinente aclarar e informar a la entidad, que todo el personal se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, enviando digitalmente los soportes previos a esta interventoría para el desarrollo de las actividades. En lo que respecta al pago de la seguridad social, fue subsanada la totalidad de los aportes correspondiente a: salud, pensión y ARL, conforme a la base de cotización aprobada en el desglose del AIU.

La interventoría ha desarrollado vigilancia y control sobre las actividades desarrolladas por el contratista de obra, a través de la verificación de los niveles y dimensiones de demolición y excavación, verificando el cumplimiento con las cantidades ejecutadas. Para esto dispuso de su personal operativo, a fin de llevar el registro minucioso de estas actividades.

Finalmente, el contratista de obra continua con la implementación de los planes de manejo ambiental, SST y de calidad aprobados, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO

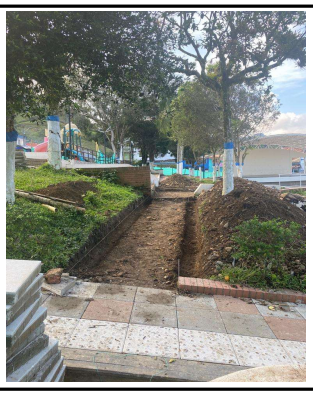


Registro Fotográfico No. 1- Excavación para anden perimetral Costado superior interno Tarima



Registro Fotográfico No. 2- Demolición de andén Puestos de ventas y corte de árbol



Registro Fotográfico No. 3- Corte de arboles costado Puestos de Ventas

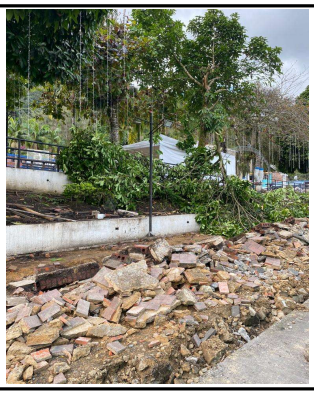


Registro Fotográfico No. 4- Corte de arboles costado Puestos de ventas




Registro Fotográfico No. 5- Demolición de muro




Registro Fotográfico No. 6- Vista general Puestos de ventas

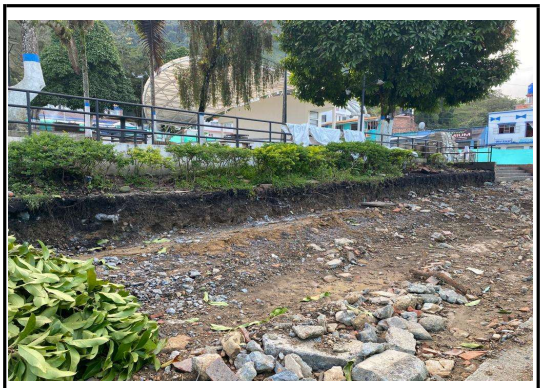

Registro Fotográfico No. 7- Vista general Puestos de ventas

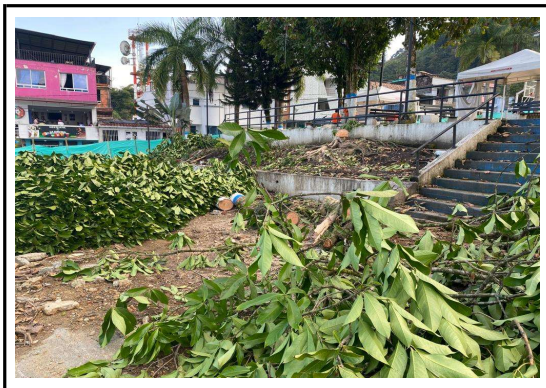

Registro Fotográfico No. 8- Corte de arboles Costado Puestos de Ventas

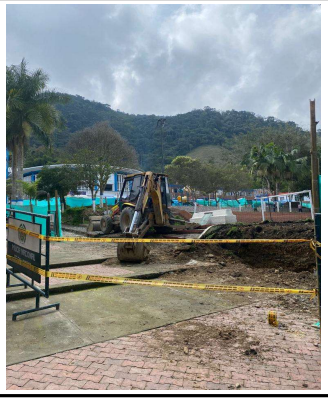

Registro Fotográfico No. 9- Excavación para desarrollo de muro de contencion Tarima



Registro Fotográfico No. 10- Excavación para desarrollo de muro de contencion Tarima



Registro Fotográfico No. 11- Excavación para desarrollo de muro de contencion Tarima



Registro Fotográfico No. 12- Excavación para desarrollo de muro de contencion Tarima

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Otanche a los diecisiete (17) día del mes de enero del año 2023.

ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCTORA PAIS *Cumplimiento Total*	**CONSTUCTORA PAIS** **GESTION DE CALIDAD** **INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. FECHA: **18-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — SEMANA No.: **14** del **11-ene-23** al **17-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. — FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

2022 **$ 1,417,122,619**

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		PROGRAMADA:	
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		EJECUTADA:	
OBRA:		**OBRA SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 202,135,116.50**	PROGRAMADA:	**$ 23,108,477.66**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 119,699,894.36**	EJECUTADA:	**$ 3,222,427.12**
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:		**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 202,135,116.50**	PROGRAMADA:	**$ 23,108,478**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 119,699,894.36**	EJECUTADA:	**$ 3,222,427.12**

III. AVANCE FÍSICO

	CUMPLIMIENTO A PROGRAMA DE OBRA	
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
INICIO	100	100
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	42	70
ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	100	91
ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	100	69
ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	38	38
TARIMA	53	5
PUESTOS DE VENTAS	4	6
ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS		10
ANDEN PUESTOS DE VENTAS		22
INSTALACIONES ELECTRICAS		4
URBANISMO		2
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	39	36
RETIE		
PROVISION IMPLEMENTACION		
AVANCE TOTAL	37	34

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANT
volqueta	1
retorexcavadora	1
Otros:	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CANTERA EL TRIANGULO - PAUNA BOYACA — PERMISO MINERO: SI **X** NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI **X** NO ___

NO ___

UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: se anexa licencia minera, licencia ambiental, de la cantera el triangulo, cantera en la cual se comprama agregados.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

PUNTO DE ACOPÍO	SI	**x**	NO		N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	**x**	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	**x**	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x	

OBSERVACIONES: Se acopia el material en sitio autorizado por la administración municipal.

PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: en desarrollo

OBSERVACIONES: en cumpliento y desarrollo

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS

OBSERVACIONES: De acuerdo con el alcance contractual, para el presente proyecto no aplica el desarrollo de gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS: las actividades realizadas esta semana comprenden de informes mensuales, se envia informe mensual de avane del pma, de igual manera se envia informe mensual de SST, informe mensual del plan de calidad, y registro fotografico, de igual manera cumpliendo con el tema administrativo se envia planillas de seguridad social del personal operativo y de los profesionales presentados en la propuesta, asi mismo se envia oficio con evidencia del avance que tienen las eculturas en sus respectivos talleres.

TECNICAS:

- Se realiza excavación de cortes y canales en el sector de la tarima en total 30.29 m3
- Excavación manual de material común incluyendo el respectivo retiro en total 7.41
- Se realiza demolición de muro de contención en el sector de los puestos de venta en total 12.41 m2
- Demolición de sardinel de concreto en total 25.29 ml
- Se realiza corte de 5 arboles
- Así mismo se retira material sobrante de excavación y demolición con 1 volqueta y 1 retroexcavadora se deja en área de disposición autorizado por el municipio.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA: **18-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEMANA No.: **14** del **11-ene-23** al **17-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- se proyecta realiza mejoramiento de piso con material de afirmado
- construcción de rampas de acceso
- acero figurado para muro de contención
- construcción de andenes en loseta de colores

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**

No. MAT: **15850-071015 BYC**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		18 de enero al 24 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		015

FECHA DE ELABORACIÓN 24/01/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO OBRA No:	1858 de 2022	**FECHA PERFECCIO/MTO:**	12/10/2022	**PLAZO EJEC. (MESES):**	OCHO MESES
OBJETO	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS				
INTERVENTOR R/L:	ING. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE				
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES				
FECHA DE INICIO	12/10/2022	**FECHA DE SUSP.**		**FECHA REINICIO**	**FECHA TERM.** 11/06/2023
PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	8	**PLAZO TRANSCURRIDO EN MESES**	3,50	**PORCENTAJE EN MESES**	43,75%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.417.122.618,89	**VALOR ADICIONALES**	$ -	**VR. TOTAL CONTRATO**	$ 1.417.122.618,89
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 425.136.785,67	**VALOR DE ACTAS PARCIALES NETO**	$ 67.372.969,36	**VALOR AMORTIZADO**	$ 20.211.890,81
VALOR DE ACTAS AMORTIZADAS	$ 47.161.078,55	**VALOR POR PAGAR**	$ 944.824.754,67	**VALOR POR EJECUTAR**	$ 1.349.749.649,53

II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	FECHA FIN EJECUCIÓN REAL	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
1	INICIO	mié 12/10/22	vie 14/10/22	vie 14/10/22	100,00%
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	vie 14/10/22	jue 11/05/23		70,00%
3	ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	vie 14/10/22	lun 6/03/23		91,00%
4	ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	lun 31/10/22	lun 6/03/23		70,00%
5	ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	mié 12/10/22	mié 26/04/23		38,00%
6	TARIMA	lun 12/12/22	lun 3/04/23		12,00%
7	PUESTOS DE VENTAS	mar 10/01/23	vie 12/05/23		5,00%
8	ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	mar 28/03/23	jue 20/04/23		10,00%
9	ANDEN PUESTOS DE VENTAS	lun 12/12/22	mar 16/05/23		23,00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS	mar 28/03/23	lun 1/05/23		5,00%
11	URBANISMO	mar 16/05/23	dom 11/06/23		2,00%
12	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	vie 14/10/22	dom 11/06/23		39,50%
13	RETIE	lun 1/05/23	mié 24/06/23		
14	PROVISION IMPLEMENTACION	dom 11/06/23	dom 11/06/23		

III. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	ITEM GOBERNACI	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	233,74	0	$ 41.795,00	$ 9.769.163,00
1,02	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3561,23	0	$ 4.829,00	$ 17.197.180,00
1,03	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro Cúbico	112,88	0	$ 16.320,00	$ 1.842.202,00
1,04	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	258,44	0	$ 66.142,00	$ 17.093.738,00
1,05	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	247,7	0	$ 82.433,00	$ 20.418.654,00
1,06	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	19,75	12	$ 114.144,00	$ 2.524.865,00
1,07	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	15,65	0	$ 27.067,00	$ 423.599,00

1,08	1.01.30	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	83,45	0	$ 66.374,00	$ 5.538.910,00
1,09	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	476,78	0	$ 16.281,00	$ 7.762.455,00
1,1	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	352,86	0	$ 3.588,00	$ 1.266.062,00
1,11	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	292,09	0	$ 4.676,00	$ 1.365.813,00
1,12	N/A	RETIRO DE BARANDA EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA	Cotizacion	Metro lineal	38,71	0	$ 12.500,00	$ 483.875,00
1,13	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-Km	15407,14	0	$ 1.656,00	$ 25.514.224,00
1,14	1.01.07	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	Precios Gober.	Unidad	14	0	$ 90.816,00	$ 1.271.424,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 112.472.164,00
							A	$ 24.743.876,00
							I	$ 3.374.165,00
							U	$ 5.623.608,00
2		ANDENES Y URBANISMO					TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35CM	Precios Gober.	Metro lineal	311,58	12	$ 56.443,00	$ 19.696.891,13
2,02	N/A	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LOSETA DE COLORES INCLUYE LINEA CON ESTOPEROL Y BASE EN ARENA CEMENTO	Cotizacion	Metro Cuadrado	785,34	0	$ 136.616,00	$ 107.290.009,44
2,03	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	11,25	12	$ 105.619,00	$ 1.330.799,40
2,04	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	Precios Gober.	Unidad	6	12	$ 471.963,00	$ 3.171.591,36
2,05	N/A	BANCA EN MADERA PLASTICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Unidad	10	0	$ 1.555.556,00	$ 15.555.560,00
2,06	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M OSO DE ANTEOJOS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.565.350,00	$ 6.565.350,00
2,07	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M MARIPOSA MORPHO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 5.739.175,00	$ 5.739.175,00
2,08	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M QUINCHA	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.122.750,00	$ 6.122.750,00
2,09	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 2,0M (ALTURA DEL CUERPO) HOMBRE MINERO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 19.956.700,00	$ 19.956.700,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 185.428.826,00
							A	$ 40.794.342,00
							I	$ 5.562.865,00
							U	$ 9.271.441,00
3		TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	1.02.24	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Precios Gober.	Metro Cúbico	29,07	12	$ 816.987,00	$ 26.599.789,54
3,02	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro Cúbico	37,58	12	$ 712.761,00	$ 29.999.825,39
3,03	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,47	12	$ 1.184.917,00	$ 623.740,31
3,04	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 66.938,00	$ 18.184.109,33
3,05	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 24.941,00	$ 6.775.372,30
3,06	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Precios Gober.	Kilogramo	501,82	12	$ 6.169,00	$ 3.467.214,89
3,07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	4,34	12	$ 1.230.801,00	$ 5.982.677,50
3,08	N/A	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Cotizacion	Kilogramo	6502,68	0	$ 8.492,00	$ 55.220.758,56
3,09	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30 * 30 * 1.7 CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 74.733,00	$ 13.171.183,07

3,1	1.11.28	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 15.598,00	$ 2.749.041,43
3,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED FORMATO 30 * 30 cm CALIDAD PRIMERA	Cotizacion	Metro Cuadrado	206,17	0	$ 75.000,00	$ 15.462.750,00
3,12	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Gober.	Metro lineal	22,89	12	$ 331.577,00	$ 8.500.573,23
3,13	1.02.08	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,86	12	$ 405.865,00	$ 390.929,17
3,14	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	6,96	12	$ 682.168,00	$ 5.317.635,99
3,15	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 17.935,00	$ 69.852.032,77
3,16	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 2.981,00	$ 11.610.198,48
3,17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA FERRARI MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	533,64	0	$ 412.500,00	$ 220.126.500,00
3,18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO CAL16 O 1.5MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	78,9	0	$ 620.342,00	$ 48.944.983,80
3,19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MESONES - LAMINA DE ALUMINIO CAL14 O 2MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	49,68	0	$ 753.992,00	$ 37.458.322,56
3,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD CARA SENCILLA, INCLUYE PINTURA FACHADA SEGUN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	128,58	0	$ 98.600,00	$ 12.677.988,00
3,21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 231.965,00	$ 2.783.580,00
3,22	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	Precios Gober.	Metro Cuadrado	42,48	12	$ 135.066,00	$ 6.426.116,12
3,23	1.12.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Precios Gober.	Metro Cuadrado	109,26	12	$ 176.691,00	$ 21.621.889,70
3,24	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro lineal	36,42	12	$ 75.218,00	$ 3.068.172,31
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 627.015.384,44
							A	$ 137.943.385,00
							I	$ 18.810.462,00
							U	$ 31.350.769,00
4		INSTALACIONES HIDRAULICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23,83	0	$ 33.242,00	$ 792.156,86
4,02	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 83.501,00	$ 1.122.253,40
4,03	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Precios Gober.	Metro lineal	65,93	12	$ 12.611,00	$ 931.216,40
4,04	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	93,22	12	$ 40.414,00	$ 4.219.480,25
4,05	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	Precios Gober.	Metro lineal	48	12	$ 50.633,00	$ 2.722.030,10
4,06	1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	17,02	12	$ 40.694,00	$ 775.725,31
4,07	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	5	12	$ 593.114,00	$ 3.321.438,40
4,08	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 88.036,00	$ 1.183.203,84

4,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 345.239,00	$ 345.239,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 15.412.743,56
							A	$ 3.390.804,00
							I	$ 462.382,00
							U	$ 770.637,00
5		INSTALACIONES ELECTRICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARCIAL DE TABLERO A CAJAS DE INSPECCION EN CABLE 3#4+1#4+1#4THHHNCU	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 73.626,00	$ 21.719.670,00
5,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INTALACION DE TABLERO Y TOMAS.	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 295.724,00	$ 295.724,00
5,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCCIÓN Y CONTROL ALUMBRADO	Cotizacion	Unidad	2	0	$ 4.531.640,00	$ 9.063.280,00
5,04	N/A	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA CD 2006 EBSA	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 773.910,00	$ 10.834.740,00
5,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE1".	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 97.755,00	$ 28.837.725,00
5,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOTENCIACION EN CAJAS DE INSPECCIÓN.	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 287.466,00	$ 4.024.524,00
5,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 711.976,00	$ 2.847.904,00
5,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CAJA DE INSPECCIÓN A POSTES EN UN DUCTO DE 1"	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 48.694,00	$ 2.921.640,00
5,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 PARA ILUMINARIAS	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 14.471,00	$ 868.260,00
5,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA BAJA TENSION AP	Cotizacion	Unidad	28	0	$ 73.678,00	$ 2.062.984,00
5,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 A 5METROS	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 1.235.870,00	$ 14.830.440,00
5,12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 2.193.241,00	$ 26.318.892,00
5,13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO LED CON IP 68.	Cotizacion	Unidad	16	0	$ 254.772,00	$ 4.076.352,00
5,14	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 229.047,00	$ 2.748.564,00
5,15	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA GFCI, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 275.178,00	$ 3.302.136,00
5,16	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Precios Gober.	Unidad	1	12	$ 355.872,42	$ 398.577,11
5,17	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 75.827,95	$ 1.019.127,65
5,18	1.07.57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 125.505,88	$ 1.686.799,03
5,19	N/A	REUBICACION DE LAMPARAS SOLARES	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 389.274,00	$ 1.557.096,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 139.414.435,00
							A	$ 30.671.176,00
							I	$ 4.182.433,05
							U	$ 6.970.722,00


COSTOS DIRECTO TOTAL		**$ 1.079.743.552,99**
ADMINISTRACIÓN (22%)		**$ 237.543.581,66**
IMPREVISTOS (3%)		**$ 32.392.306,59**
UTILIDAD (5%)		**$ 53.987.177,65**
OTROS COSTOS	**RETIE**	**$ 5.000.000,00**
	PMA	**$ 4.260.000,00**
	PROVISION IMPLEMENTACION	**$ 4.196.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 1.417.122.618,89**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		18 de enero al 24 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		015

IV. INDICADORES

Nº	INDICADORES	VALORES ($)	% SOBRE EL Vr. TOTAL	DIFERENCIA (+) o (-)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 132.130.450,79	9,32%	$ 224.534,73
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría	$ 132.354.985,53	9,34%	
	VALOR TOTAL POR EJECUTAR COSTO TOTAL		**$ 1.284.767.633,36**	

"CURVA S" AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO VS AVANCE FINANCIERO EJECUTADO

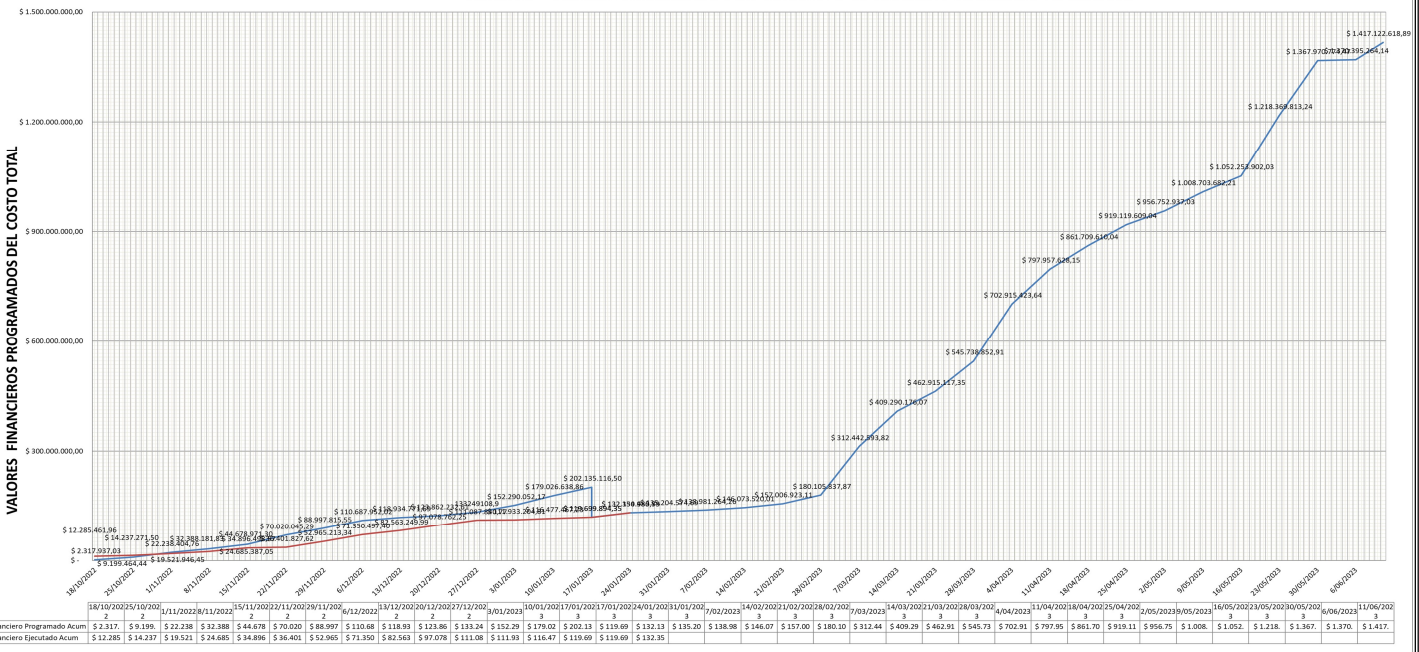

	18/10/2022	25/10/2022	1/11/2022	8/11/2022	15/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	6/12/2022	13/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	3/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	7/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	28/02/2023	7/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	4/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	2/05/2023	9/05/2023	16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	6/06/2023	11/06/2023
Financiero Programado Acum	$ 2.317.	$ 9.199.	$ 22.238	$ 32.388	$ 44.678	$ 70.020	$ 88.997	$ 110.68	$ 118.93	$ 123.86	$ 133.24	$ 152.29	$ 179.02	$ 202.13	$ 119.69	$ 132.13	$ 135.20	$ 138.98	$ 146.07	$ 157.00	$ 180.10	$ 312.44	$ 409.29	$ 462.91	$ 545.73	$ 702.91	$ 797.95	$ 861.70	$ 919.11	$ 956.75	$ 1.008.	$ 1.052.	$ 1.218.	$ 1.367.	$ 1.370.	$ 1.417.
Financiero Ejecutado Acum	$ 12.285	$ 14.237	$ 19.521	$ 24.685	$ 34.896	$ 36.401	$ 52.965	$ 71.350	$ 82.563	$ 97.078	$ 111.08	$ 111.93	$ 116.47	$ 119.69	$ 119.69	$ 132.35																				

—Financiero Programado Acum

	DATOS SEGUIMIENTOS SEMANALES					
	Semana N°	Desde	Hasta	% Programado Acum	Financiero Programado Acum	Financiero Ejecutado Acum
	1	12/10/2022	18/10/2022	0,16%	$ 2.317.937,03	$ 12.285.461,96
	2	19/10/2022	25/10/2022	0,65%	$ 9.199.464,44	$ 14.237.271,50
	3	26/10/2022	1/11/2022	1,57%	$ 22.238.404,76	$ 19.521.946,45
	4	2/11/2022	8/11/2022	2,29%	$ 32.388.181,83	$ 24.685.387,05
	5	9/11/2022	15/11/2022	3,15%	$ 44.678.971,30	$ 34.896.498,57
	6	16/11/2022	22/11/2022	4,94%	$ 70.020.045,29	$ 36.401.827,62
	7	23/11/2022	29/11/2022	6,28%	$ 88.997.815,55	$ 52.965.213,34
	8	30/11/2022	6/12/2022	7,81%	$ 110.687.952,02	$ 71.350.497,40
	9	7/12/2022	13/12/2022	8,39%	$ 118.934.771,69	$ 82.563.249,99
	10	14/12/2022	20/12/2022	8,74%	$ 123.862.232,61	$ 97.078.762,25
	11	21/12/2022	27/12/2022	9,40%	$ 133.249.108,87	$ 111.087.840,77
	12	28/12/2022	3/01/2023	10,75%	$ 152.290.052,17	$ 111.933.204,81
	13	4/01/2023	10/01/2023	12,63%	$ 179.026.638,86	$ 116.477.467,23
	14	11/01/2023	17/01/2023	14,26%	$ 202.135.116,50	$ 119.699.894,35
Reprogramación	14	11/01/2023	17/01/2023	8,45%	$ 119.699.894,35	$ 119.699.894,35
	15	18/01/2023	24/01/2023	9,32%	$ 132.130.450,79	$ 132.354.985,53
	16	25/01/2023	31/01/2023	9,54%	$ 135.204.574,69	
	17	1/02/2023	7/02/2023	9,81%	$ 138.981.264,26	
	18	8/02/2023	14/02/2023	10,31%	$ 146.073.520,01	
	19	15/02/2023	21/02/2023	11,08%	$ 157.006.923,11	
	20	22/02/2023	28/02/2023	12,71%	$ 180.105.837,87	
	21	1/03/2023	7/03/2023	22,05%	$ 312.442.593,82	
	22	8/03/2023	14/03/2023	28,88%	$ 409.290.176,07	
	23	15/03/2023	21/03/2023	32,67%	$ 462.915.117,35	
	24	22/03/2023	28/03/2023	38,51%	$ 545.738.852,91	
	25	29/03/2023	4/04/2023	49,60%	$ 702.915.423,64	
	26	5/04/2023	11/04/2023	56,31%	$ 797.957.628,15	
	27	12/04/2023	18/04/2023	60,81%	$ 861.709.610,04	
	28	19/04/2023	25/04/2023	64,86%	$ 919.119.609,04	
	29	26/04/2023	2/05/2023	67,51%	$ 956.752.937,03	
	30	3/05/2023	9/05/2023	71,18%	$ 1.008.703.682,21	
	31	10/05/2023	16/05/2023	74,25%	$ 1.052.253.902,03	
	32	17/05/2023	23/05/2023	85,97%	$ 1.218.369.813,24	
	33	24/05/2023	30/05/2023	96,53%	$ 1.367.970.774,47	
	34	31/05/2023	6/06/2023	96,70%	$ 1.370.395.264,14	
	35	7/06/2023	11/06/2023	100,00%	$ 1.417.122.618,89	

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 18 de enero al 24 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 015

V. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSA


La interventoría solicitó al contratista de obra un plan de contingencia y reprogramación de obra para controlar el atraso físico y financiero evidenciado que en parte se debe a los periodos lluviosos que se han presentado y que por esto se han atrasado las actividades secuenciales programadas. Por su parte, el contratista de obra remite estos documentos determinando como días laborales los sábados y festivos en adelante al 17/01/2023, por lo cual se aumentan los días de trabajo de tal manera que se cumpla con el plazo contractual pactado. Con la implementación de esta medida, se busca incluir más días para mitigar el cese de actividades que se puedan presentar por los periodos de lluvias.

VI. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - OBJETIVO: ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN
NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA

VII. CURVA "S"

CURVA "S": PROGRAMADO, EJECUTADO

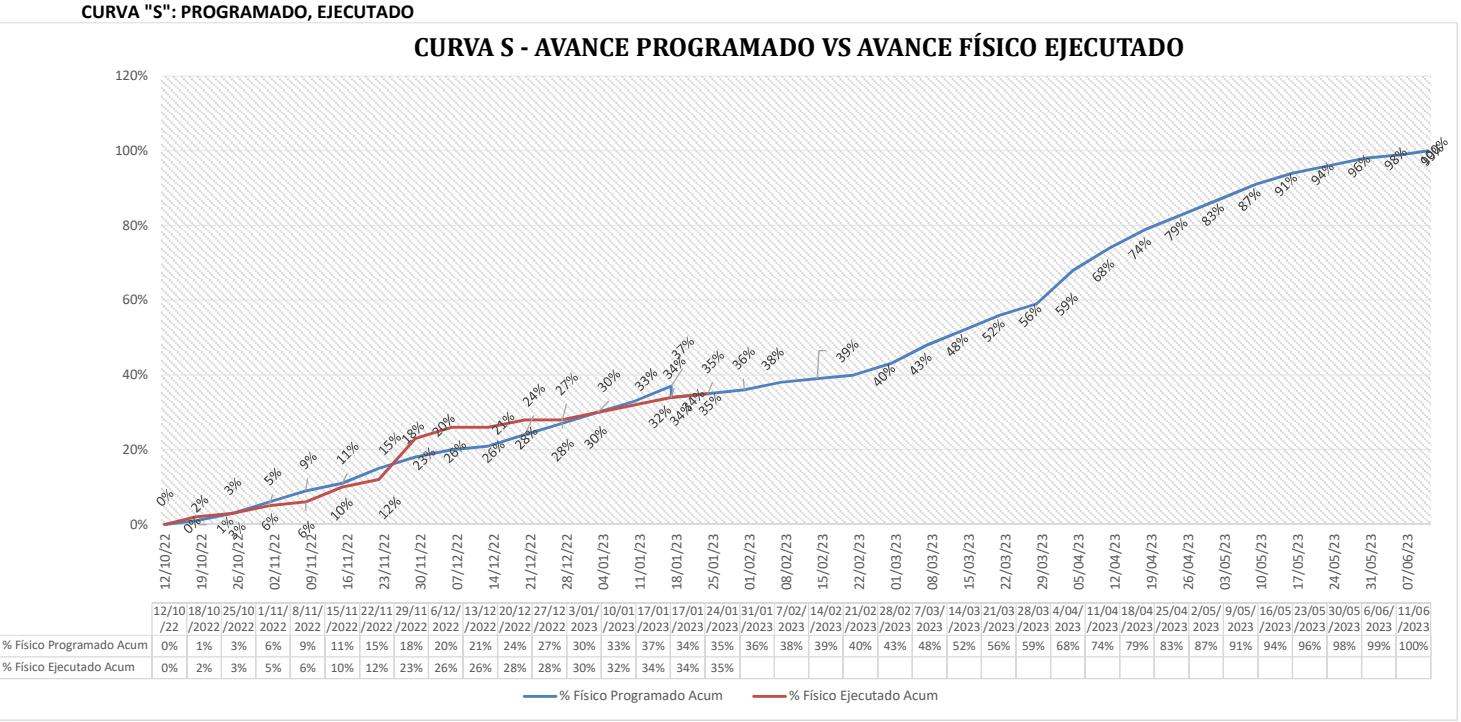

	12/10/22	19/10/22	26/10/22	02/11/22	09/11/22	16/11/22	23/11/22	30/11/22	07/12/22	14/12/22	21/12/22	28/12/22	04/01/23	11/01/23	18/01/23	25/01/23	01/02/23	08/02/23	15/02/23	22/02/23	01/03/23	08/03/23	15/03/23	22/03/23	29/03/23	05/04/23	12/04/23	19/04/23	26/04/23	03/05/23	10/05/23	17/05/23	24/05/23	31/05/23	07/06/23
% Físico Programado Acum	0%	1%	3%	6%	9%	11%	15%	18%	20%	21%	24%	27%	30%	33%	37%	35%	36%	38%	39%	40%	43%	48%	52%	56%	59%	68%	74%	79%	83%	87%	91%	94%	96%	98%	100%
% Físico Ejecutado Acum	0%	2%	3%	5%	6%	10%	12%	23%	26%	26%	28%	28%	30%	32%	34%	34%	35%																		

AVANCE FÍSICO DE OBRA					
% PROGRAMADO DE AVANCE	35,00%	% EJECUTADO DE AVANCE	35,00%	% DESVIACION	0,0%

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se continúa por el costado de juegos infantiles, costado frente a la alcaldía y costado puestos de ventas, con el desarrollo de las siguientes actividades:
Localización y replanteo, se efectúa la ubicación de los postes de iluminación del parque y definición de niveles de excavación para conformación de andenes y bordillos. Se tiene un área acumulada levantada de 2492,86m2. Lo anterior, acorde a los diseños del proyecto aprobado.
Cerramiento perimetral, acumulado a la presente semana se reconocen 231,05m.
Demolición de andenes, acumulado a la presente semana son 476,78m2.
Desmonte de adoquín prefabricado, en la presente semana se ejecutaron 46,12m2.
Demolición de sardinel, se ejecutaron 30ml, acumulado a la presente semana son 286,31ml.
Demolición de muro, se ejecutaron 12,41m2.
Retiro de baranda en tubería metálica, en la presente semana se ejecutaron 38,71ml.
Corte de árbol, se cortan 5 arboles.
Excavación manual, acumulada la actividad se llevan 50,1m3.
Excavación de cortes y canales, se ejecutaron 30,29m3.
Se continua el acopio de material producto de excavación y RCD en el predio autorizado por la Alcaldía de Otanche.
Mejoramiento de piso con material de afirmado, acumulado a la presente semana son 29,81m3.
Bordillo fundido, se ejecutaron 5,6ml, acumulado a la presente semana son 129,56ml.
Construcción de andenes en loseta de colores incluye línea con estoperol y base en arena cemento, acumulado a la presente semana son 168,36m2.
Acero Figurado 60000PSI, se desarrolla la figuración del muro de contención para la tarima en 1086,2Kg.
Suministro e instalación tubería sanitaria de desague PVC D=4", se ejecutaron 17ml.
Cajas de inspección eléctrica en cumplimiento a las especificaciones de la Normatividad de la EBSA, acumuladas se llevan 7 cajas de inspección eléctrica.
A la presente semana se cuenta muro en bloque para instalación de tablero y tomas.
Suministro e instalación de banco de ductos de caja de inspección a postes en un ducto de 1", acumulado a la presente semana son 5,43ml.

Finalmente, teniendo en cuenta que se presentan constantes lluvias, el respectivo control se reporta en bitácora de obra, para llevar la precisión en el cese de actividades que se generan en el desarrollo de la obra, situación que justifica el atraso especifico de algunas actividades ocasionado por esta condición climática variable.

VII. COMENTARIO Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

Mediante comité de obra del 17 de enero de 2023, el Municipio de Otanche, a través de la Secretaría de Planeación e infraestructura, hacen entrega del nuevo trazado del muro de contención de la tarima para su ejecución, lo anterior en pro de la conservación ambiental.

Evaluando la ejecución del contrato, de acuerdo a la "Curva S - Avance Programado Vs. Avance físico ejecutado", se refleja igualdad en la ejecución.

Por otra parte, se observa que en cuanto al control financiero que se hace por medio de la "Curva S - Avance financiero programado Vs. Avance financiero ejecutado" existe una diferencia por encima de lo programado de +$ 224.534,73, conforme a la Reprogramación 1 presentada.

Es pertinente aclarar e informar a la entidad, que todo el personal se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social, enviando digitalmente los soportes previos a esta interventoría para el desarrollo de las actividades.

La interventoría ha desarrollado vigilancia y control sobre las actividades desarrolladas por el contratista de obra, a través de la verificación de los niveles y dimensiones de demolición y excavación, verificando el cumplimiento con las cantidades ejecutadas. Para esto dispuso de su personal operativo, a fin de llevar el registro minucioso de estas actividades.

Finalmente, el contratista de obra continua con la implementación de los planes de manejo ambiental, SST y de calidad aprobados, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro Fotográfico No. 1- Figuración de acero de refuerzo de 60.000PSI para muro de conención de la Tarima



Registro Fotográfico No. 2- Figuración de acero de refuerzo de 60.000PSI para muro de conención de la Tarima



Registro Fotográfico No. 3- Figuración de acero de refuerzo de 60.000PSI para muro de conención de la Tarima



Registro Fotográfico No. 4- Demolición y descapote para desarrollo para tarima



Registro Fotográfico No. 5- Acopio de gravilla de cantera para desarrollo de concretos.



Registro Fotográfico No. 6- Acopio de recebo para llenos y nivelación de terreno.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Otanche a los veinticuatro (24) día del mes de enero del año 2023.

ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	ELABORÓ	APROBÓ
NOMBRE	ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCTORA PAIS *Cumplimiento Total*	**CONSTUCTORA PAIS** **GESTION DE CALIDAD** **INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. FECHA: **24-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — SEMANA No.: **15** del **18-ene-23** al **24-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. — FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

2022 **$ 1,417,122,619**

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		PROGRAMADA:	
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		EJECUTADA:	
OBRA:		**OBRA SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 132,130,450.79**	PROGRAMADA:	**$ 3,351,932.96**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 132,354,985.53**	EJECUTADA:	**$ 12,655,091.17**
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:		**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 132,130,450.79**	PROGRAMADA:	**$ 3,351,933**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 132,354,985.53**	EJECUTADA:	**$ 12,655,091.17**

III. AVANCE FÍSICO

	CUMPLIMIENTO A PROGRAMA DE OBRA	
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
INICIO	100	100
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	45	70
ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	93	91
ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	94	70
ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	43	38
TARIMA	12	12
PUESTOS DE VENTAS	14	5
ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	10	10
ANDEN PUESTOS DE VENTAS	47	22
INSTALACIONES ELECTRICAS	5	5
URBANISMO	2	2
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	38	39
RETIE		
PROVISION IMPLEMENTACION		
AVANCE TOTAL	35	35

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANT
volqueta	1
retorexcavadora	1
Otros:	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CANTERA EL TRIANGULO - PAUNA BOYACA — PERMISO MINERO: SI **X** NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI **X** NO ___

NO ___

UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: se anexa licencia minera, licencia ambiental, de la cantera el triangulo, cantera en la cual se comprama agregados.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

PUNTO DE ACOPÍO	SI	**x**	NO		N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	**x**	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	**x**	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x	

OBSERVACIONES: Se acopia el material en sitio autorizado por la administración municipal.

PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: en desarrollo

OBSERVACIONES: en cumpliento y desarrollo

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS

OBSERVACIONES: De acuerdo con el alcance contractual, para el presente proyecto no aplica el desarrollo de gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS: las actividades administrativas realizadas esta semana comprenden de plan de contigencia debido a los atrasados generados en obra por lluvias, se adjunta registro de lluvias, y la correspondiente programación y flujo de caja que se implementara de ahora en adelante, de igual manera se envia mediande oficio avance de las esculturas que se encuentran en proceso en su respectivo taller.

TECNICAS:

- Se realiza demolición de 30 ml de sardinel
- se realiza construcción de 5.65 ml de bordillo fundido en sitio
- Se realiza figurado de acero en total 1086.2 kg

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA: **24-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEMANA No.: **15** del **18-ene-23** al **24-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- se proyecta realiza mejoramiento de piso con material de afirmado
- construcción de rampas de acceso
- fundir zapata de muro de contención
- construcción de andenes en loseta de colores

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**

No. MAT: **15850-071015 BYC**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 25 de enero al 31 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 016

FECHA DE ELABORACIÓN 31/01/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO OBRA No:	1858 de 2022	**FECHA PERFECCIO/MTO:**	12/10/2022	**PLAZO EJEC. (MESES):**	OCHO MESES
OBJETO	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS				
INTERVENTOR R/L:	ING. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE				
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES				
FECHA DE INICIO	12/10/2022	**FECHA DE SUSP.**		**FECHA REINICIO**	**FECHA TERM.** 11/06/2023
PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	8	**PLAZO TRANSCURRIDO EN MESES**	3,73	**PORCENTAJE EN MESES**	46,67%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.417.122.618,89	**VALOR ADICIONALES**	$ -	**VR. TOTAL CONTRATO**	$ 1.417.122.618,89
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 425.136.785,67	**VALOR DE ACTAS PARCIALES NETO**	$ 67.372.969,36	**VALOR AMORTIZADO**	$ 20.211.890,81
VALOR DE ACTAS AMORTIZADAS	$ 47.161.078,55	**VALOR POR PAGAR**	$ 944.824.754,67	**VALOR POR EJECUTAR**	$ 1.349.749.649,53

II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	FECHA FIN EJECUCIÓN REAL	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
1	INICIO	mié 12/10/22	vie 14/10/22	vie 14/10/22	100,00%
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	vie 14/10/22	jue 11/05/23		70,00%
3	ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	vie 14/10/22	lun 6/03/23		91,00%
4	ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	lun 31/10/22	lun 6/03/23		70,00%
5	ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	mié 12/10/22	mié 26/04/23		38,00%
6	TARIMA	lun 12/12/22	lun 3/04/23		12,00%
7	PUESTOS DE VENTAS	mar 10/01/23	vie 12/05/23		5,00%
8	ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	mar 28/03/23	jue 20/04/23		10,00%
9	ANDEN PUESTOS DE VENTAS	lun 12/12/22	mar 16/05/23		23,00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS	mar 28/03/23	lun 1/05/23		5,00%
11	URBANISMO	mar 16/05/23	dom 11/06/23		2,00%
12	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	vie 14/10/22	dom 11/06/23		39,50%
13	RETIE	lun 1/05/23	mié 24/06/23		
14	PROVISION IMPLEMENTACION	dom 11/06/23	dom 11/06/23		

III. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	ITEM GOBERNACI	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	233,74	0	$ 41.795,00	$ 9.769.163,00
1,02	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3561,23	0	$ 4.829,00	$ 17.197.180,00
1,03	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro Cúbico	112,88	0	$ 16.320,00	$ 1.842.202,00
1,04	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	258,44	0	$ 66.142,00	$ 17.093.738,00
1,05	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	247,7	0	$ 82.433,00	$ 20.418.654,00
1,06	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	19,75	12	$ 114.144,00	$ 2.524.865,00

1,07	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	15,65	0	$ 27.067,00	$ 423.599,00
1,08	1.01.30	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	83,45	0	$ 66.374,00	$ 5.538.910,00
1,09	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	476,78	0	$ 16.281,00	$ 7.762.455,00
1,1	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	352,86	0	$ 3.588,00	$ 1.266.062,00
1,11	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	292,09	0	$ 4.676,00	$ 1.365.813,00
1,12	N/A	RETIRO DE BARANDA EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA	Cotizacion	Metro lineal	38,71	0	$ 12.500,00	$ 483.875,00
1,13	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-Km	15407,14	0	$ 1.656,00	$ 25.514.224,00
1,14	1.01.07	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	Precios Gober.	Unidad	14	0	$ 90.816,00	$ 1.271.424,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 112.472.164,00
							A	$ 24.743.876,00
							I	$ 3.374.165,00
							U	$ 5.623.608,00
2		ANDENES Y URBANISMO					TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35CM	Precios Gober.	Metro lineal	311,58	12	$ 56.443,00	$ 19.696.891,13
2,02	N/A	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LOSETA DE COLORES INCLUYE LINEA CON ESTOPEROL Y BASE EN ARENA CEMENTO	Cotizacion	Metro Cuadrado	785,34	0	$ 136.616,00	$ 107.290.009,44
2,03	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	11,25	12	$ 105.619,00	$ 1.330.799,40
2,04	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	Precios Gober.	Unidad	6	12	$ 471.963,00	$ 3.171.591,36
2,05	N/A	BANCA EN MADERA PLASTICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Unidad	10	0	$ 1.555.556,00	$ 15.555.560,00
2,06	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M OSO DE ANTEOJOS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.565.350,00	$ 6.565.350,00
2,07	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M MARIPOSA MORPHO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 5.739.175,00	$ 5.739.175,00
2,08	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M QUINCHA	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.122.750,00	$ 6.122.750,00
2,09	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 2,0M (ALTURA DEL CUERPO) HOMBRE MINERO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 19.956.700,00	$ 19.956.700,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 185.428.826,00
							A	$ 40.794.342,00
							I	$ 5.562.865,00
							U	$ 9.271.441,00
3		TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	1.02.24	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Precios Gober.	Metro Cúbico	29,07	12	$ 816.987,00	$ 26.599.789,54
3,02	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro Cúbico	37,58	12	$ 712.761,00	$ 29.999.825,39
3,03	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,47	12	$ 1.184.917,00	$ 623.740,31
3,04	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 66.938,00	$ 18.184.109,33
3,05	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 24.941,00	$ 6.775.372,30

3,06	1.02.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA U-84	Precios Gober.	Kilogramo	501,82	12	$ 6.169,00	$ 3.467.214,89
3,07	1.03.06	ESCALERAS MACIZA 21 MPa - (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	4,34	12	$ 1.230.801,00	$ 5.982.677,50
3,08	N/A	ACERO FIGURADO 60000 PSI	Cotizacion	Kilogramo	6502,68	0	$ 8.492,00	$ 55.220.758,56
3,09	1.11.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 30 * 30 * 1.7 CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 74.733,00	$ 13.171.183,07
3,1	1.11.28	PULIDA Y DESTRONADO DE PISO EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	157,36	12	$ 15.598,00	$ 2.749.041,43
3,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED FORMATO 30 * 30 cm CALIDAD PRIMERA	Cotizacion	Metro Cuadrado	206,17	0	$ 75.000,00	$ 15.462.750,00
3,12	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAS EN TUBERÍA METÁLICA AGUA NEGRA D=2", C. 0.80, SOLDADO, SEGUN DISEÑO, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	Precios Gober.	Metro lineal	22,89	12	$ 331.577,00	$ 8.500.573,23
3,13	1.02.08	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2500 PSI) RELACIÓN 60C/40P	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,86	12	$ 405.865,00	$ 390.929,17
3,14	1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	Precios Gober.	Metro Cúbico	6,96	12	$ 682.168,00	$ 5.317.635,99
3,15	3.13.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 17.935,00	$ 69.852.032,77
3,16	3.13.34	PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	Precios Gober.	Kilogramo	3477,44	12	$ 2.981,00	$ 11.610.198,48
3,17	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA FERRARI MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	533,64	0	$ 412.500,00	$ 220.126.500,00
3,18	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN LAMINA DE ALUMINIO CAL16 O 1.5MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	78,9	0	$ 620.342,00	$ 48.944.983,80
3,19	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MESONES - LAMINA DE ALUMINIO CAL14 O 2MM, MICROPERFORADA PUNZONADO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HORNEADA TIPO POLIESTER PARA EXTERIORES, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE.	Cotizacion	Metro Cuadrado	49,68	0	$ 753.992,00	$ 37.458.322,56
3,2	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE SUPERBOARD CARA SENCILLA, INCLUYE PINTURA FACHADA SEGUN DISEÑO	Cotizacion	Metro Cuadrado	128,58	0	$ 98.600,00	$ 12.677.988,00
3,21	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR 1 POCETA 60X40 CM ACERO INOXIDABLE INCLUYE GRIFO Y ACCESORIOS DE INSTALACION	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 231.965,00	$ 2.783.580,00
3,22	1.04.08	MESONES EN CONCRETO A=0.60 mts. 17.5 MPa - (2500PSI) INC. REFUERZO E:0.10	Precios Gober.	Metro Cuadrado	42,48	12	$ 135.066,00	$ 6.426.116,12
3,23	1.12.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA PANEL METÁLICO DE ALUZINC - ALUZINC CAL 26 TIPO SANDUCHE, CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, ACABADO EN PINTURA POLIESTER	Precios Gober.	Metro Cuadrado	109,26	12	$ 176.691,00	$ 21.621.889,70
3,24	1.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 D=0.75 CON PINTURA Y ANTICORROSIVO	Precios Gober.	Metro lineal	36,42	12	$ 75.218,00	$ 3.068.172,31
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 627.015.384,44
							A	$ 137.943.385,00
							I	$ 18.810.462,00
							U	$ 31.350.769,00
4		INSTALACIONES HIDRAULICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
4,01	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	23,83	0	$ 33.242,00	$ 792.156,86
4,02	2.04.56	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 83.501,00	$ 1.122.253,40
4,03	1.06.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO PVC-P 3/4" RDE 11	Precios Gober.	Metro lineal	65,93	12	$ 12.611,00	$ 931.216,40

4,04	1.02.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SANITARIA DE DESAGUE PVC D=4"	Precios Gober.	Metro lineal	93,22	12	$ 40.414,00	$ 4.219.480,25
4,05	1.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=6"	Precios Gober.	Metro lineal	48	12	$ 50.633,00	$ 2.722.030,10
4,06	1.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUA LLUVIA PVC 4"	Precios Gober.	Metro lineal	17,02	12	$ 40.694,00	$ 775.725,31
4,07	1.02.02	CAJAS DE INSPECCION DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MTS LADRILLO	Precios Gober.	Unidad	5	12	$ 593.114,00	$ 3.321.438,40
4,08	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3" Y 4"	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 88.036,00	$ 1.183.203,84
4,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS DE 0,60*0,60 MTS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 345.239,00	$ 345.239,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 15.412.743,56
							A	$ 3.390.804,00
							I	$ 462.382,00
							U	$ 770.637,00
5		INSTALACIONES ELECTRICAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
5,01	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARCIAL DE TABLERO A CAJAS DE INSPECCION EN CABLE 3#4+1#4+1#4THHHNCU	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 73.626,00	$ 21.719.670,00
5,02	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE PARA INTALACION DE TABLERO Y TOMAS.	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 295.724,00	$ 295.724,00
5,03	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE DISTRIBUCCIÓN Y CONTROL ALUMBRADO	Cotizacion	Unidad	2	0	$ 4.531.640,00	$ 9.063.280,00
5,04	N/A	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA NORMA CD 2006 EBSA	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 773.910,00	$ 10.834.740,00
5,05	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS 2 DUCTOS DE1".	Cotizacion	Metro lineal	295	0	$ 97.755,00	$ 28.837.725,00
5,06	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EQUIPOTENCIACION EN CAJAS DE INSPECCIÓN.	Cotizacion	Unidad	14	0	$ 287.466,00	$ 4.024.524,00
5,07	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 711.976,00	$ 2.847.904,00
5,08	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE DUCTOS DE CAJA DE INSPECCIÓN A POSTES EN UN DUCTO DE 1"	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 48.694,00	$ 2.921.640,00
5,09	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X12 PARA ILUMINARIAS	Cotizacion	Metro lineal	60	0	$ 14.471,00	$ 868.260,00
5,1	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME PARA BAJA TENSION AP	Cotizacion	Unidad	28	0	$ 73.678,00	$ 2.062.984,00
5,11	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 4 A 5METROS	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 1.235.870,00	$ 14.830.440,00
5,12	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 2.193.241,00	$ 26.318.892,00
5,13	N/A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA DE PISO LED CON IP 68.	Cotizacion	Unidad	16	0	$ 254.772,00	$ 4.076.352,00
5,14	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 229.047,00	$ 2.748.564,00
5,15	N/A	SALIDA MONOFASICA + TOMA GFCI, TUBO EMT COMPLETA	Cotizacion	Unidad	12	0	$ 275.178,00	$ 3.302.136,00
5,16	1.07.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.	Precios Gober.	Unidad	1	12	$ 355.872,42	$ 398.577,11
5,17	1.07.53	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO CABLE 12AWG THHN COBRE PVC 1/2". INCLUYE INTERRUPTOR	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 75.827,95	$ 1.019.127,65
5,18	1.07.57	SALIDA PARA LUMINARIA CABLE 12AWG THHN PVC 1/2	Precios Gober.	Unidad	12	12	$ 125.505,88	$ 1.686.799,03
5,19	N/A	REUBICACION DE LAMPARAS SOLARES	Cotizacion	Unidad	4	0	$ 389.274,00	$ 1.557.096,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 139.414.435,00
							A	$ 30.671.176,00
							I	$ 4.182.433,05
							U	$ 6.970.722,00


COSTOS DIRECTO TOTAL	**$**	**1.079.743.552,99**
ADMINISTRACIÓN (22%)	**$**	**237.543.581,66**
IMPREVISTOS (3%)	**$**	**32.392.306,59**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 25 de enero al 31 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 016

UTILIDAD (5%)		$ 53.987.177,65
OTROS COSTOS	RETIE	$ 5.000.000,00
	PMA	$ 4.260.000,00
	PROVISION IMPLEMENTACION	$ 4.196.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 1.417.122.618,89

IV. INDICADORES

Nº	INDICADORES	VALORES ($)	% SOBRE EL Vr. TOTAL	DIFERENCIA (+) o (-)
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 132.130.450,79	9,32%	$ 224.534,73
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la interventoría	$ 132.354.985,53	9,34%	
	VALOR TOTAL POR EJECUTAR COSTO TOTAL		**$ 1.284.767.633,36**	

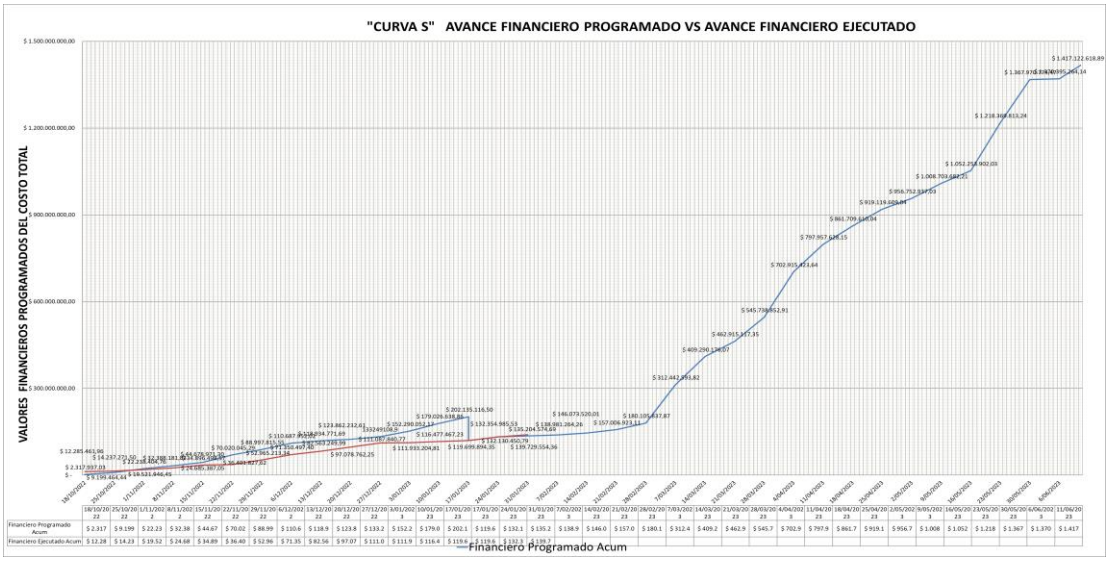

	DATOS SEGUIMIENTOS SEMANALES					
	Semana N°	Desde	Hasta	% Programado Acum	Financiero Programado Acum	Financiero Ejecutado Acum
	1	12/10/2022	18/10/2022	0,16%	$ 2.317.937,03	$ 12.285.461,96
	2	19/10/2022	25/10/2022	0,65%	$ 9.199.464,44	$ 14.237.271,50
	3	26/10/2022	1/11/2022	1,57%	$ 22.238.404,76	$ 19.521.946,45
	4	2/11/2022	8/11/2022	2,29%	$ 32.388.181,83	$ 24.685.387,05
	5	9/11/2022	15/11/2022	3,15%	$ 44.678.971,30	$ 34.896.498,57
	6	16/11/2022	22/11/2022	4,94%	$ 70.020.045,29	$ 36.401.827,62
	7	23/11/2022	29/11/2022	6,28%	$ 88.997.815,55	$ 52.965.213,34
	8	30/11/2022	6/12/2022	7,81%	$ 110.687.952,02	$ 71.350.497,40
	9	7/12/2022	13/12/2022	8,39%	$ 118.934.771,69	$ 82.563.249,99
	10	14/12/2022	20/12/2022	8,74%	$ 123.862.232,61	$ 97.078.762,25
	11	21/12/2022	27/12/2022	9,40%	$ 133.249.108,87	$ 111.087.840,77
	12	28/12/2022	3/01/2023	10,75%	$ 152.290.052,17	$ 111.933.204,81
	13	4/01/2023	10/01/2023	12,63%	$ 179.026.638,86	$ 116.477.467,23
	14	11/01/2023	17/01/2023	14,26%	$ 202.135.116,50	$ 119.699.894,35
Reprogramación	14	11/01/2023	17/01/2023	8,45%	$ 119.699.894,35	$ 119.699.894,35
	15	18/01/2023	24/01/2023	9,32%	$ 132.130.450,79	$ 132.354.985,53
	16	25/01/2023	31/01/2023	9,54%	$ 135.204.574,69	$ 139.729.554,36
	17	1/02/2023	7/02/2023	9,81%	$ 138.981.264,26	
	18	8/02/2023	14/02/2023	10,31%	$ 146.073.520,01	
	19	15/02/2023	21/02/2023	11,08%	$ 157.006.923,11	
	20	22/02/2023	28/02/2023	12,71%	$ 180.105.837,87	
	21	1/03/2023	7/03/2023	22,05%	$ 312.442.593,82	
	22	8/03/2023	14/03/2023	28,88%	$ 409.290.176,07	

	23	15/03/2023	21/03/2023	32,67%	$ 462.915.117,35	
	24	22/03/2023	28/03/2023	38,51%	$ 545.738.852,91	
	25	29/03/2023	4/04/2023	49,60%	$ 702.915.423,64	
	26	5/04/2023	11/04/2023	56,31%	$ 797.957.628,15	
	27	12/04/2023	18/04/2023	60,81%	$ 861.709.610,04	
	28	19/04/2023	25/04/2023	64,86%	$ 919.119.609,04	
	29	26/04/2023	2/05/2023	67,51%	$ 956.752.937,03	
	30	3/05/2023	9/05/2023	71,18%	$ 1.008.703.682,21	
	31	10/05/2023	16/05/2023	74,25%	$ 1.052.253.902,03	
	32	17/05/2023	23/05/2023	85,97%	$ 1.218.369.813,24	
	33	24/05/2023	30/05/2023	96,53%	$ 1.367.970.774,47	
	34	31/05/2023	6/06/2023	96,70%	$ 1.370.395.264,14	
	35	7/06/2023	11/06/2023	100,00%	$ 1.417.122.618,89	
	Valor Total del contrato				**$ 1.417.122.618,89**	

	ELABORO	APROBÓ
NOMBRE	ING. YENNER [illegible] CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		25 de enero al 31 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		016

V. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMATICAS - ANALISIS DE CAUSA


La interventoría solicitó al contratista de obra un plan de contingencia y reprogramación de obra para controlar el atraso físico y financiero evidenciado que en parte se debe a los periodos lluviosos que se han presentado y que por esto se han atrasado las actividades secuenciales programadas. Por su parte, el contratista de obra remite estos documentos determinando como días laborales los sábados y festivos en adelante al 17/01/2023, por lo cual se aumentan los días de trabajo de tal manera que se cumpla con el plazo contractual pactado. Con la implementación de esta medida, se busca incluir más días para mitigar el cese de actividades que se puedan presentar por los periodos de lluvias.

VI. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - OBJETIVO: ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DEL PROBLEMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA TERMINACIÓN
NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA	NO REGISTRA/ NO APLICA

VII. CURVA "S"

CURVA "S": PROGRAMADO, EJECUTADO

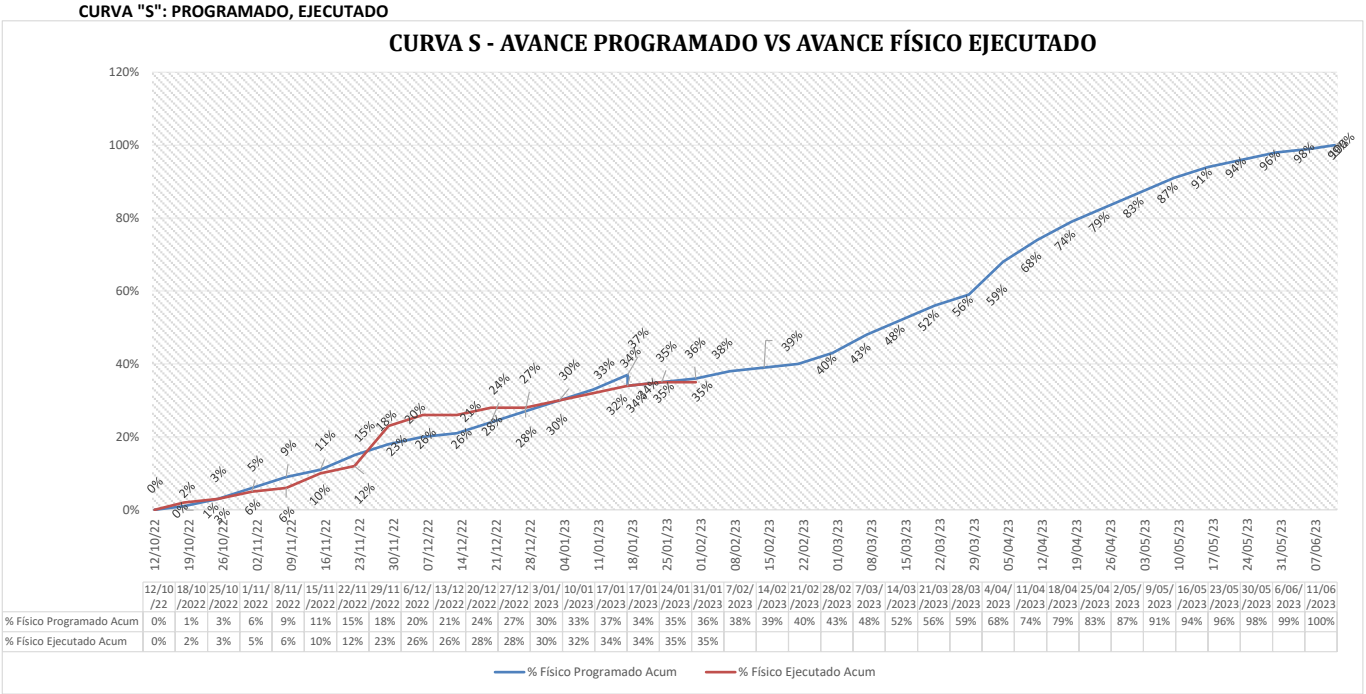

	12/10/22	18/10/2022	25/10/2022	1/11/2022	8/11/2022	15/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	6/12/2022	13/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	3/01/2023	10/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	7/02/2023	14/02/2023	21/02/2023	28/02/2023	7/03/2023	14/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	4/04/2023	11/04/2023	18/04/2023	25/04/2023	2/05/2023	9/05/2023	16/05/2023	23/05/2023	30/05/2023	6/06/2023	11/06/2023
% Físico Programado Acum	0%	1%	3%	6%	9%	11%	15%	18%	20%	21%	24%	27%	30%	33%	37%	34%	35%	36%	38%	39%	40%	43%	48%	52%	56%	59%	68%	74%	79%	83%	87%	91%	94%	96%	98%	99%	100%
% Físico Ejecutado Acum	0%	2%	3%	5%	6%	10%	12%	23%	26%	26%	28%	28%	30%	32%	34%	34%	35%	35%																			

AVANCE FÍSICO DE OBRA					
% PROGRAMADO DE AVANCE	35,00%	% EJECUTADO DE AVANCE	35,00%	% DESVIACION	0,0%

VI. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

En la presente semana se continúa con los procesos constructivos por el costado de juegos infantiles, costado frente a la alcaldía y costado puestos de ventas, con el desarrollo de las siguientes actividades:
Construcción de dos rampas de acceso al parque se ejecutaron dos Rampas para un total de 3,36 m2
Demolición del muro existente por el lado de la calle 4 (cocinas) se demolio un tramo de 10 metros para un area total en la semana de 7 m2
Fundida en concreto de 3000 PSI Zarpa para un total en la semana de 8,25 m3
Mejoramiento de piso con material de afirmado, por el lado del parque infantil, para un total en la semana de 1,26 m3
Se inicio a Formaletear el bastago del Muro cantiliever frente a la alcaldia llegando a un avance del 70%

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 25 de enero al 31 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 016

Como dato relevante se destaca que durante la semana no se han presentado precipitaciones que afecten el buen desarrollo de la obra.

VII. COMENTARIO Y RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

La interventoria solicito al contratista un ajuste y un balance de las obras teniendo en cuenta las cantidades y la programación de estas, las modificaciones en cuanto los diseños y flujo de caja. El contratista se compromete a entregar este informe a más tardar el 31 de Enero para dar viabilidad y avance a estas actividades. En el corte de la semana el contratista avanza en la construcción del muro cantiléver de la tarima y la demolición del muro de las cocinas. las lluvias disminuyeron considerablemente en esta semana por lo tanto ya no representa causa de atraso en las actividades programadas.

Queda aprobado el plan de contingencia solicitado con fecha 22 de enero del 2023.

En el corte de la semana, se tiene el ingreso de 4 obreros y 1 oficial y el retiro de 2 obreros.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Registro Fotográfico No. 1- fundida de zarpa muro Tarima concreto 3000 psi



Registro Fotográfico No. 2- Construccion de las dos Rampas zona Juegos infantiles



Registro Fotográfico No. 3- Demolicion Muro existente zona Cocinas



Registro Fotográfico No. 4- Rampa terminada lado parque infantil. Concreto 2500 psi

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL
		25 de enero al 31 de enero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N°
		016



Registro Fotográfico No. 5- Continuan testereada de Bastago Muro Cantiliever frente Alcaldia



Registro Fotográfico No. 6- Demolicion Muro zona Cocinas

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Otanche a los treinta y un (31) días del mes de enero del año 2023.

ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

	ELABORO	APROBO
NOMBRE	ING. YENNER FRANCISCO CARDENAS COMAS	ING. OSCAR JAVIER GODOY BAUTISTA
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSTRUCTORA PAIS *Cumplimiento Total*	**CONSTUCTORA PAIS** **GESTION DE CALIDAD** **INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA**	CÓDIGO			
		VERSIÓN			
		PÁGINA	1	DE	2

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. FECHA: **31-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ — SEMANA No.: **16** del **25-ene-23** al **31-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. — FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

II. AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS OBRA:

2022 **$ 1,417,122,619**

ESTUDIOS Y DISEÑOS:		**ESTUDIOS Y DISEÑOS SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:		PROGRAMADA:	
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:		EJECUTADA:	
OBRA:		**OBRA SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 135,204,574.69**	PROGRAMADA:	**$ 3,074,123.91**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 142,309,084.10**	EJECUTADA:	**$ 9,954,098.57**
TOTAL OBRA + EST Y DISEÑOS:		**TOTAL OBRA + E Y D SEMANAL:**	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	**$ 135,204,574.69**	PROGRAMADA:	**$ 3,074,124**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	**$ 142,309,084.10**	EJECUTADA:	**$ 9,954,098.57**

III. AVANCE FÍSICO

	CUMPLIMIENTO A PROGRAMA DE OBRA	
	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
INICIO	100	100
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	48	70
ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	93	92
ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	94	74
ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	43	38
TARIMA	12	19
PUESTOS DE VENTAS	18	6
ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	10	10
ANDEN PUESTOS DE VENTAS	47	22
INSTALACIONES ELECTRICAS	5	5
URBANISMO	2	2
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	41	41
RETIE		
PROVISION IMPLEMENTACION		
AVANCE TOTAL	36	37

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DESCRIPCION	CANT
Otros:	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: CANTERA EL TRIANGULO - PAUNA BOYACA — PERMISO MINERO: SI **X** NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI **X** NO ___

NO ___

UBICACIÓN: ___ — PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ — LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___

OBSERVACIONES: se anexa licencia minera, licencia ambiental, de la cantera el triangulo, cantera en la cual se comprama agregados.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL (PR 8 al PR 18)

PUNTO DE ACOPÍO	SI	**x**	NO		N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	**x**	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	**x**	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x	

OBSERVACIONES: Se acopia el material en sitio autorizado por la administración municipal.

PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)

ESTADO: en desarrollo

OBSERVACIONES: en cumpliento y desarrollo

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: ___
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ___
AVALÚOS APROBADOS: ___
PREDIOS ADQUIRIDOS: ___
INVERSIÓN POR COMPRA DE PREDIOS ___

OBSERVACIONES: De acuerdo con el alcance contractual, para el presente proyecto no aplica el desarrollo de gestión predial

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 9
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: ___

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
SEDES SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ___

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ADMINISTRATIVAS, LEGALES, FINANCIERAS: las actividades administrativas realizadas esta semana comprenden, del retiro de 2 ayudantes de obra y la filiciación y contratación de 3 ayudantes de obra. Y 1 maestro de obra

TECNICAS:

- Se realizo mejoramiento de piso con material de afirmado 1.26 m3
- Demoli ón de muro de contención 7 m2
- Concreto estirado rampas 3.36 m3
- Concreto de zapatas 8.25 m3
- Suministro e instalación de malla electrosoldada 3.36 kg

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA: **31-ene-23**

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

SEMANA No.: **16** del **25-ene-23** al **31-ene-23**

SUPERVISOR DEL PROYECTO: ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOCHEA MORALES

OBJETO: REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

FECHA DE INICIO: **12-oct-22**

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS			INTERVENTOR:	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES - CEINTERS SAS
INTEGRANTES				INTEGRANTES	
CONTRATO No.	1858 DE 2022	VALOR INICIAL:	**$ 1,417,122,618.89**	CONTRATO No.	2325 DE 2022
PLAZO INICIAL:	**8 MESES**	ADICIONES:			
PLAZO ACUMULADO:	**8 MESES**	VALOR ACUMULADO:	**$ 1,417,122,618.89**		

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- se proyecta realiza mejoramiento de piso con material de afirmado
- fundir bastago de muro de contención
- construcción de andenes en loseta de colores
- demolición de muro de contención

NOTA:

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE OBRA

FIRMA:

NOMBRE: **JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**

No. MAT: **15850-071015 BYC**

CEINTERS SAS NIT. 900.849.991-3	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA	PERIODO DEL 01 de febrero al 08 de febrero de 2023
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	INFORME N° 017

FECHA DE ELABORACIÓN 8/02/2023

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO OBRA No:	1858 de 2022	**FECHA PERFECCIO/MTO:**	12/10/2022	**PLAZO EJEC. (MESES):**	OCHO MESES
OBJETO	REMODELACION Y ADECUACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA PAIS SAS				
INTERVENTOR R/L:	ING. JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE				
SUPERVISIÓN DE LA INTERVENTORIA	ARQ. RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES				
FECHA DE INICIO	12/10/2022	**FECHA DE SUSP.**		**FECHA REINICIO**	**FECHA TERM.** 11/06/2023
PLAZO ACTUALIZADO (MESES)	8	**PLAZO TRANSCURRIDO EN MESES**	4,00	**PORCENTAJE EN MESES**	50,00%

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.417.122.618,89	**VALOR ADICIONALES**	$ -	**VR. TOTAL CONTRATO**	$ 1.417.122.618,89
VALOR DEL ANTICIPO 30%	$ 425.136.785,67	**VALOR DE ACTAS PARCIALES NETO**	$ 67.372.969,36	**VALOR AMORTIZADO**	$ 20.211.890,81
VALOR DE ACTAS AMORTIZADAS	$ 47.161.078,55	**VALOR POR PAGAR**	$ 944.824.754,67	**VALOR POR EJECUTAR**	$ 1.349.749.649,53

II. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE OBRA

Nº	DESCRIPCIÓN DE ITEMS	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA	FECHA FIN EJECUCIÓN REAL	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO
1	INICIO	mié 12/10/22	vie 14/10/22	vie 14/10/22	100,00%
2	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	vie 14/10/22	jue 11/05/23		70,00%
3	ANDENES - PARTE POSTERIOR A LA TARIMA	vie 14/10/22	lun 6/03/23		91,00%
4	ANDENES - ZONA JUEGOS INFANTIL	lun 31/10/22	lun 6/03/23		70,00%
5	ANDENES - FRENTE A LA ALCALDIA	mié 12/10/22	mié 26/04/23		38,00%
6	TARIMA	lun 12/12/22	lun 3/04/23		12,00%
7	PUESTOS DE VENTAS	mar 10/01/23	vie 12/05/23		5,00%
8	ANDEN PARTE SUPERIOR DE PUESTOS DE VENTAS	mar 28/03/23	jue 20/04/23		10,00%
9	ANDEN PUESTOS DE VENTAS	lun 12/12/22	mar 16/05/23		23,00%
10	INSTALACIONES ELECTRICAS	mar 28/03/23	lun 1/05/23		5,00%
11	URBANISMO	mar 16/05/23	dom 11/06/23		2,00%
12	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	vie 14/10/22	dom 11/06/23		39,50%
13	RETIE	lun 1/05/23	mié 24/06/23		
14	PROVISION IMPLEMENTACION	dom 11/06/23	dom 11/06/23		

III. PRESUPUESTO INICIAL

ITEM	ITEM GOBERNACI	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA
1,01	3.13.09	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1.50 M . DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M	Precios Gober.	Metro lineal	233,74	0	$ 41.795,00	$ 9.769.163,00
1,02	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	Precios Gober.	Metro Cuadrado	3561,23	0	$ 4.829,00	$ 17.197.180,00
1,03	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	Precios Gober.	Metro Cúbico	112,88	0	$ 16.320,00	$ 1.842.202,00
1,04	1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro Cúbico	258,44	0	$ 66.142,00	$ 17.093.738,00
1,05	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	247,7	0	$ 82.433,00	$ 20.418.654,00
1,06	2.01.06	RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	19,75	12	$ 114.144,00	$ 2.524.865,00

1,07	2.01.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	15,65	0	$ 27.067,00	$ 423.599,00
1,08	1.01.30	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO E=30CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	83,45	0	$ 66.374,00	$ 5.538.910,00
1,09	1.01.13	DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM	Precios Gober.	Metro Cuadrado	476,78	0	$ 16.281,00	$ 7.762.455,00
1,1	1.01.47	DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO	Precios Gober.	Metro Cuadrado	352,86	0	$ 3.588,00	$ 1.266.062,00
1,11	1.01.11	DEMOLICIÓN SARDINEL (INCLUYE RETIRO)	Precios Gober.	Metro lineal	292,09	0	$ 4.676,00	$ 1.365.813,00
1,12	N/A	RETIRO DE BARANDA EN TUBERIA METALICA AGUA NEGRA	Cotizacion	Metro lineal	38,71	0	$ 12.500,00	$ 483.875,00
1,13	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	Precios Gober.	M3-Km	15407,14	0	$ 1.656,00	$ 25.514.224,00
1,14	1.01.07	CORTE ARBOL (INCL.RAICES) H>3.0	Precios Gober.	Unidad	14	0	$ 90.816,00	$ 1.271.424,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 112.472.164,00
							A	$ 24.743.876,00
							I	$ 3.374.165,00
							U	$ 5.623.608,00
2		ANDENES Y URBANISMO					TIPO:	OBRA PÚBLICA
2,01	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35CM	Precios Gober.	Metro lineal	311,58	12	$ 56.443,00	$ 19.696.891,13
2,02	N/A	CONSTRUCCION DE ANDENES EN LOSETA DE COLORES INCLUYE LINEA CON ESTOPEROL Y BASE EN ARENA CEMENTO	Cotizacion	Metro Cuadrado	785,34	0	$ 136.616,00	$ 107.290.009,44
2,03	1.18.04	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	11,25	12	$ 105.619,00	$ 1.330.799,40
2,04	1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA EN MALLA METALICA M-120, INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO Y ANCLAJE	Precios Gober.	Unidad	6	12	$ 471.963,00	$ 3.171.591,36
2,05	N/A	BANCA EN MADERA PLASTICA SEGÚN DISEÑO	Cotizacion	Unidad	10	0	$ 1.555.556,00	$ 15.555.560,00
2,06	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M OSO DE ANTEOJOS	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.565.350,00	$ 6.565.350,00
2,07	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M MARIPOSA MORPHO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 5.739.175,00	$ 5.739.175,00
2,08	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 1,2M QUINCHA	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 6.122.750,00	$ 6.122.750,00
2,09	N/A	ESCULTURA EN FIBRA DE VIDRIO ACABADO EN RESINA Y PINTURA, CON SOPORTE Y PLACA CONMEMORATIVA SEGÚN ESPECIFICACIÓN ALTURA 2,0M (ALTURA DEL CUERPO) HOMBRE MINERO	Cotizacion	Unidad	1	0	$ 19.956.700,00	$ 19.956.700,00
							COSTO DIRECTO GRUPO	$ 185.428.826,00
							A	$ 40.794.342,00
							I	$ 5.562.865,00
							U	$ 9.271.441,00
3		TARIMA, CUBIERTA Y CASETAS					TIPO:	OBRA PÚBLICA
3,01	1.02.24	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI 1.01MTS H 2.00MTS	Precios Gober.	Metro Cúbico	29,07	12	$ 816.987,00	$ 26.599.789,54
3,02	1.02.11	CONCRETO DE ZAPATAS 21MPa + FORMALETA	Precios Gober.	Metro Cúbico	37,58	12	$ 712.761,00	$ 29.999.825,39
3,03	1.03.01	COLUMNAS EN CONCRETO 21 MPa - (3000 PSI), ALTURA MENOR A TRES METROSFORMALETA MADERA	Precios Gober.	Metro Cúbico	0,47	12	$ 1.184.917,00	$ 623.740,31
3,04	1.11.26	PLACA BASE EN CONCRETO E= 10 CM 2500 PSI	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 66.938,00	$ 18.184.109,33
3,05	1.11.04	ALISTADO PISO E= 4 CM - 1:5	Precios Gober.	Metro Cuadrado	242,55	12	$ 24.941,00	$ 6.775.372,30
