1. TIPO DE INFORME			
INFORME PARCIAL ☐		INFORME FINAL	X
Tipo de Contrato:			
OBRA	X	INTERVENTORÍA	☐
Informe Número: 2		Periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2022 hasta el 30 de enero de 2023	

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. 4152.010.26.1.690.2022	
Nombre Completo del Contratista: CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA	
Documento de identificación del contratista: 900.065.196-9	
Nombre (s) del Supervisor (es): Javier Arias Cerón	
Organismo: Secretaría de Movilidad	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 70%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 100%
Objeto del contrato: "Adquisición e instalación de señales verticales y demarcación en las vías de las comunas 3, 16, 17, 18 y 54 del Distrito de Santiago de Cali."	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
31/octubre/2022	30/enero/2023
Modificación del contrato: Modificación N°1 mediante la cual MODIFICAR: El plazo del contrato No.4152.010.26.1.690.2022 en la plataforma electrónica secop II y en el complemento al contrato así: CLAUSULA 14. PLAZO DEL CONTRATO El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones y se MODIFICA las fechas de las garantías de cumplimiento y responsabilidad Civil extracontractual conforme a este modificatorio de las pólizas Nos.CBC-100039295 / CBC-100006323 de Seguros Mundial.

Modificación N°2 mediante la cual se prorroga el contrato de obra N°.4152.010.26.1.690 hasta el 30 de enero de 2023.

Lo anterior sin causar desequilibrio económico del contrato No. 4152.010.26.1.690.2022

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada:

Acta de recibo final de obra: N°4152.023.11.03 del 30 de enero de 2023

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de TRESCIENTOS DOS MIILLONES NOVECIENTOS OCHENTA UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 302.981.939),

Adición: N/A

Prórroga: N°1 Desde el 1 de enero hasta el 30 de enero de 2023.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$302.981.939	$180.795.260	$122.186.679	$0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA: CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA. con NIT 900.354.406-0

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 8 de marzo de 2023, firmada por CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES representante legal y MARIA MERCEDES VILLADA JAIME Contador Público de CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y CIA LTDA.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

1. El contratista asistió a los comités técnicos citados por la Secretaría de Movilidad, consignados en las actas de reunión de mesas de trabajo número 17, 16, 18 y Buitrera en las actas No. 4173.418.3.62.39.
2. Elaboró, suscribió y presentó bajo su responsabilidad, las respectivas actas parciales de obra (informes semanales No 8,10, 11, 12, 13), con registro fotográfico se estableció el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la obra.
3. Atendió las recomendaciones que la entidad le hizo con el fin de lograr una adecuada ejecución del objeto contractual y sus obligaciones.
4. Abrió un libro (bitácora de obra) desde el día que se inició las actividades de obra, en que se consignó todas las observaciones o sugerencias como registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, controles de calidad a los materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el supervisor de la obra consideró necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones.
5. Suministró, transportó e instaló todos los materiales requeridos para la ejecución del item de construcción de reductores, los cuales fueron nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones, cuando éstas se especifiquen.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. Inició de actividades de construcción de reductores de velocidad Construcción de resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en calienta (MD-19) en las siguientes ubicaciones, calle 28 con carrera 50.
7. Realizó la instalación de señales verticales en las siguientes ubicaciones en la carrera 4 con calle 73, carrera 53 entre calle 11 y calle 11a.
8. Realizó el suministro e instalación de tachas para los reductores de velocidad en las siguiente direcciones:

Carrera 41f entre calle 38 y calle 40 sede Angélica Sierra, se instalaron la totalidad de 60 tachas.
Calle 44 entre carrera 42c y carrera 43 el punto a intervenir fue cambiado a la calle 46 con carrera 40 ya que la capa de rodadura se encontraba en mal estado y en el nuevo punto se procedió instalar la cantidad de 60 tachas.
Carrera 46c entre calle 38 y calle 39, las cantidades que se instalaron en su totalidad fueron de 80 tachas.
Carrera 47 a entre calle 44- 45 colegio Rodrigo Lloreda - sede principal, se instalaron la totalidad de 90 tachas.
Carera 50 entre carrera 60 y calle 42, las cantidades que se instalaron en su totalidad fueron de 30 tachas.
Calle 2 entre carrera 9 y carrera 10, se instalaron la totalidad de 30 tachas.
Carrera 3 norte con calle 24 - escuela el piloto se instalaron la totalidad de 60 tachas.
Carrera 14 con calle 8 oeste - centro recreativo los cristales, las cantidades que se instalaron en su totalidad fueron de 60 tachas.
Calle 4 entre carrera 73 y carrera 70 se instalaron la totalidad de 60 tachas
Vía la sirena, colegio Multiproceso sede Santa Luisa se procede instalar la cantidad de 30 tachas
Institución educativa Toledo se instalaron la totalidad de 60 tachas
Callejo de Anchicya se instaló 30 tachas
Calle 11 y 11 a carrera 53 señalética frente al colombo barrio Santa Anita se pegaron 60 tachas
Carrera 41b con calle 42 se instalaron 60 tachas

9. Realizó la implementación de señalización horizontal en M2 en las siguientes ubicaciones

Carrera 41b con calle 42, calle 28 con carrera 50, ID 3118 Carrera 69 entre calles 45 y 46 intervención de ID 3118, ID 3102 Institución Toledo, ID 3350 Calle 18 entre carrera 1 y carrera 2, ID 3109 Calle 19 con carrera 2, ID 3351 Carrera 3B entre calle 3 Oeste y calle 4 Oeste ID 3130 Carrera 80 con calle 42, carrera 83c entre calle 34 y calle 42 como fue pactado con el presidente del barrio, ID 3101, cruce de Colanta corregimiento la Buitrera, ID 3113 Carrera 13 entre calle 2 y calle 2a,ID 3125 Carrera 47 a entre calle 44 y 45

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas por el contratista para este periodo, de acuerdo con las disposiciones contractuales:

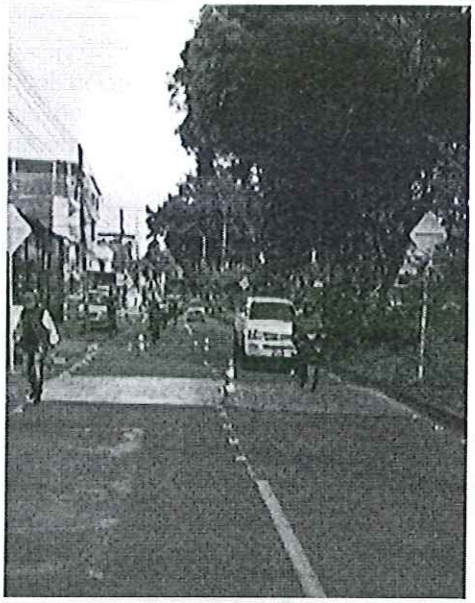
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD
Contratar la instalacion de cicloparqueaderos en Santiago de Cali				
1. PRELIMINARES				
1	1.1	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-25)	UND.	16
2	1.2	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-25A)	UND.	46
3	1.3	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-01)	UND.	3
4		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-26)	UND.	3
6		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi.	UND.	6
7		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi (DUPLEX) (SP-47A/SR-30/30KPH)	UND.	6
8		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-49)	UND.	3

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

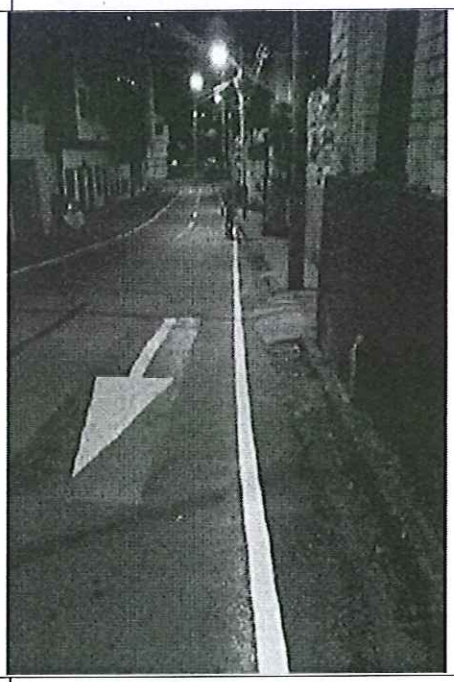
9		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-38) e (SR-20)	UND.	3
10		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaria o informativa de 75 cm, con plaqueta (alto mínimo de 37,7 cm), Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-47B)	UND.	8
11		Fabricación, suministro e instalación de señal informativa de rectángulo de long.DD de 72 x ancho 90cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi (SI-27)	UND	3
12		Construcción de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en caliente (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304, el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el manual de señalización vial 2015, Pintado según NTC 1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un ancho	UND	2
13		Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	M2	1750
14		Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para líneas longitudinales de 0.12 m de ancho (incluye micro esfera de vidrio) - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	MI	6966
15		Suministro e instalación de Tachas Reflectivas bidireccionales Norma NTC-4745.	UND.	770
16		Suministro y aplicación de pintura plástico en frio de larga duración para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	M2	58
17		Suministro y aplicación de pintura plástico en frio de larga duración para tráfico para líneas longitudinales de 0.12 m de ancho - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	MI	150

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

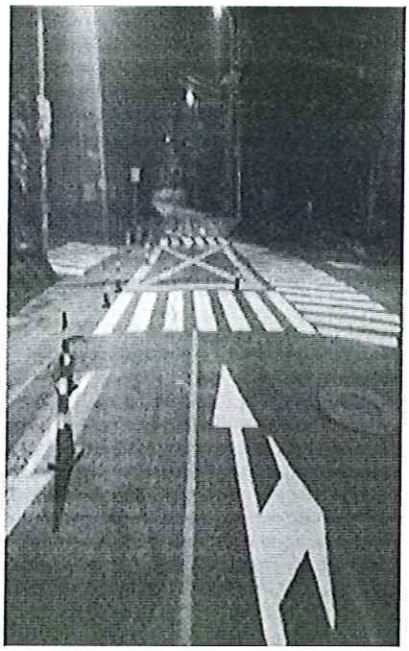
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 1	Descripción: Intervención de metro cuadrado (M2) y metro lineal (Ml) de la vía el Plan a la altura de colegio Toledo corregimiento Buitrera.	Foto No. 2	Descripción: Suministro e instalación de tachas en la carrera 41b con calle 42
			

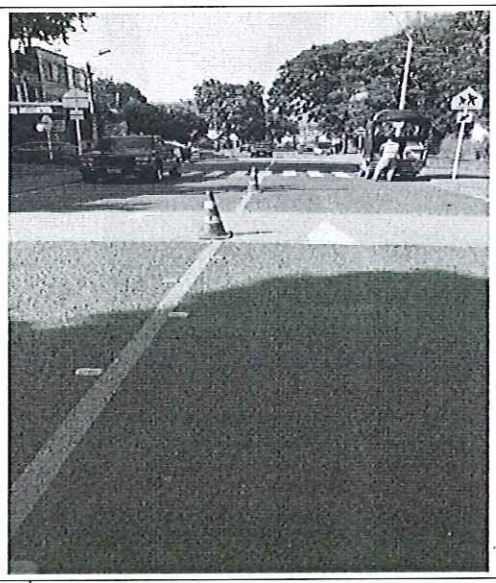
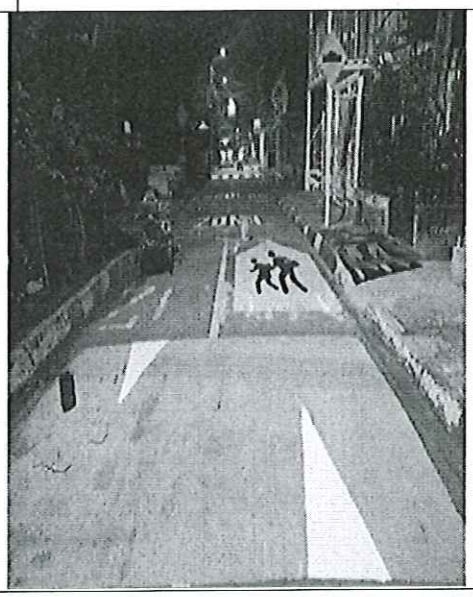
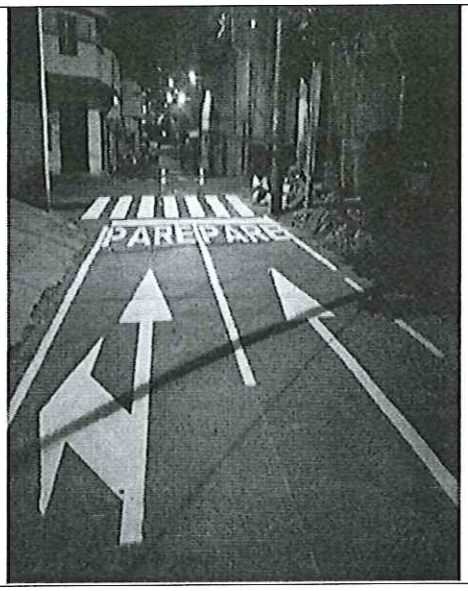
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No. 3	Descripción: Descripción: Intervención de metro cuadrado (M2) y metro lineal (Ml) en pintura base solvente acrílica del tramo vial carrera 13 entre calle 2 y 2a.	Foto No. 4	Descripción: Instalación de señal vertical SR-01 (Pare).
			
Foto No. 5	Descripción: Descripción: Intervención de metro cuadrado (M2) y metro lineal (Ml) en pintura base solvente acrílica del tramo vial calle 18 entre carrera 1 y carrera 2.	Foto No. 6	Descripción: Instalación de señal vertical SP-47B (Ubicación de cruce de escolar).

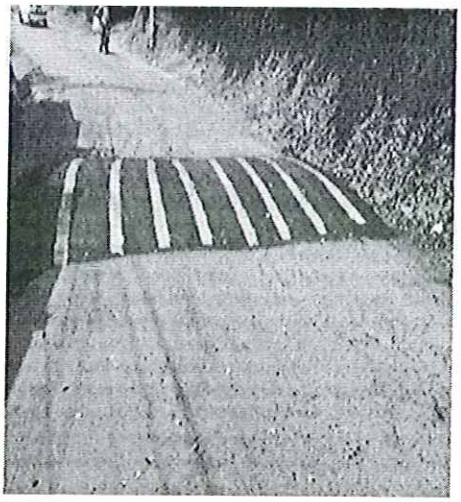
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 7	Descripción: Descripción: Intervención de metro cuadrado (M2) y metro lineal (Ml) en pintura base solvente acrílica del tramo vial avenida Guadalupe entre Carrera 54 y Carrera 55.	Foto No. 8	V Descripción: Instalación de señal vertical dúplex SP-47A/SR-30 (Proximidad a cruce escolar)(Velocidad máxima permitida).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 9	Descripción: Suministro e instalación de tachas en la calle 4 entre carrera 70 y carrera 73.	Foto No. 10	Descripción: Instalación de señal vertical SP-25 (Proximidad de resalto).
			

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Foto No. 11	Descripción: Preparación de mezcla asfáltica para instalación de reductores de velocidad	Foto No. 12	Descripción: Instalación de señales verticales SP-25 de proximidad a la ubicación de reductores.
			
Foto No. 13	Descripción: Descripción: Intervención de metro lineal (Ml) en pintura base solvente acrílica del tramo carrera 83 entre calle 34 y 42.	Foto No. 14	Descripción: Compactación de mezcla asfáltica para la elaboración de reductores de velocidad.

RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: Hace parte integral de este informe los informes semanales de obra presentados por el contratista con corte al 30 de enero de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

No se reportan recomendaciones para este periodo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JAVIER ARIAS CERON
Nombre y firma del Supervisor

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 14 de Marzo de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 21

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y		
NIT	890,399,011 - 3		
TELEFONO	(602) 6531063	**DIRECCION**	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali	**OBRA**	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			VENCIMIENTO		
15	03	2023	14	04	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-25)	16.00	374,302.00	5,988,832.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-25A)	46.00	374,302.00	17,217,892.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-01)	3.00	374,302.00	1,122,906.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SR-28)	3.00	374,302.00	1,122,906.00

CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS . M/CTE - . - . - .

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 21

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y		
NIT	890,399,011 - 3		
TELEFONO	(602) 6531063	**DIRECCION**	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali	**OBRA**	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			VENCIMIENTO		
15	03	2023	14	04	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi.	6.00	374,302.00	2,245,812.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (DUPLEX) (SP-47A/SR-30(30KPH))	6.00	631,586.00	3,789,516.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-49)	3.00	374,302.00	1,122,906.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria ó informativa de 60 cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple	3.00	340,733.00	1,022,199.00

CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS . M/CTE - . - . - .

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 21

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y		
NIT	890,399,011 - 3		
TELEFONO	(602) 6531063	**DIRECCION**	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali	**OBRA**	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			VENCIMIENTO		
15	03	2023	14	04	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3000 psi. (SR-38) o (SR-39)			
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva reglamentaria o informativa de 75 cm, con plaqueta (alto mínimo de 37,7 cm), Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi. (SP-47B)	8.00	442,615.00	3,540,920.00
Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva de rectángulo de longitud de 72 x ancho 90cm, Reflectivo de alta intensidad tipo IV o superior, en lámina galvanizada C-16, pedestal en ángulo de hierro monolítico de dos pulgadas (2") por dos pulgadas (2") por un cuarto de pulgada (1/4") con recubrimiento en postes, crucetas y anclajes en pintura electrostática al horno. Cimentación en concreto simple 3000 psi.(SI-27)	3.00	495,020.00	1,485,060.00
Construcción de dispositivos de reducción de velocidad tipo resalto parabólico, elaborado en mezcla asfáltica densa en caliente (MD-19) colocación y compactación, de una o más capas de mezcla asfáltica, preparada y colocada en caliente, de acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas, secciones y espesores indicados en la norma para ensayos (ASTM C295, INV E-218-07, INV E-238-07, INV E-224-07, INV E-749-07, INV E-220-07, AASHTO T-304, el elemento tendrá las dimensiones y profundidad contenidas en el manual de señalización vial 2015, Pintado según NTC 1360-1. Dimensiones 90% del ancho del carril aproximadamente 7 metros, pendiente longitudinal al 2%, un ancho 3,7 metros con pendiente transversal de 3.5%, altura máxima 0.10 metros	2.00	3,021,023.00	6,042,046.00

CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS . M/CTE - . - . - .

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑIA LIMITADA

OBRAS DE CONSTRUCCION Y URBANISMO

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTES AUTORETENEDORES DE IVA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4220
Resolución DIAN No 18764041461180 de 16 dic. 2022 - Prefijo FCCA Numerada Desde 19 al 1000 Autorizada.

NIT. 900,065,196-8
CARRERA 17 89-31 OF 601
TELS 9260705

CEL. 3206869505
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FCCA 21

SEÑORES	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORT, CUL, TUR, EMPR Y		
NIT	890,399,011 - 3		
TELEFONO	(602) 6531063	**DIRECCION**	AV 2 NORTE 10-70
CIUDAD	Cali	**OBRA**	CONTRATO No 4152.010.26.1.690.2022

FECHA			VENCIMIENTO		
15	03	2023	14	04	2023

FORMA DE PAGO
Credito

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	1,750.00	36,263.00	63,460,250.00
Suministro y aplicación de pintura acrílica base solvente para tráfico para líneas longitudinales de 0.12 m de ancho (incluye micro esfera de vidrio) -cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	6,966.00	2,165.00	15,081,390.00
Suministro e instalación de Tachas Reflectivas bidireccional Norma NTC-4745.	770.00	10,376.00	7,989,520.00
Suministro y aplicación de pintura plástico en frio de larga duración para tráfico para marcas viales - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	58.00	71,710.00	4,159,180.00
Suministro y aplicación de pintura plástico en frio de larga duración para tráfico para líneas longitudinales de 0.12 m de ancho - cumplimiento normas NTC 1360-1, 4744 y resolución 1885 de 2015.	150.00	3,633.00	544,950.00
ADMINISTRACION	1.00	32,624,710.00	32,624,710.00
IMPREVISTOS	1.00	5,437,451.00	5,437,451.00
UTILIDAD	1.00	6,796,814.00	6,796,814.00

CIENTO OCHENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS . M/CTE - . - . - .

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS CIA LTDA
CARLOS CORDOBA AVILES

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES identificado con CC 13.010.352 Y MARIA MERCEDES VILLADA JAIME TP 203506-T Representante legal y Contador Público de CCA INGENIEROS CONTRATISTAS Y COMPAÑÍA LIMITADA identificada con NIT 900.065.196-9, bajo la gravedad de juramento, certificamos que nos encontramos al día con el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar al instituto colombiano de bienestar familiar para el periodo de diciembre-enero 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la industria de construcción, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Dada el día 8 de marzo de 2023

Atentamente,

CARLOS CORDOBA AVILES
C.C. 13.010.352 de Ipiales
CCA Ingenieros Contratistas y Cia Ltda TP 203.506-T
Nit 900.065.196-9

MARIA MERCEDES VILLADA JAIME
Contador Público

CCA INGENIEROS CONTRATISTAS CIA LTDA
CARLOS CORDOBA AVILES
Edificio Gaia Carrera 17 No. 89-31 Oficina 602
Tel. (57-1) 926 0705 Cel: 320 686 9452 - 320 686 9505
gerencia@ccaingenieros.co
carloscordoba1312@hotmail.com
licitaciones@ccaingenieros.co
Bogotá D.C. - Colombia

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E81747AC47C5958

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA MERCEDES VILLADA JAIME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52911802 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 203506-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13010352		CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17 89 31 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	53300336	9430123607	I	2022/02/11	2022/02/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13010352	CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0		$290,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13010352		CORDOBA AVILES CARLOS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 17 89 31 OF 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	9260705	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	53300336	9430123607	I	2022/02/11	2022/02/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300
