INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERÍA S.A.SS&C INGENIERÍA S.A.S

CONTRATO No 1010 DE 2022

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022."

GRUPO 3

SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERÍA S.A.S.

FEBRERO 2023

CONTROL DE FIRMAS			
INFORME MENSUAL ÁREA TÉCNICO			
ELABORÓ:		REVISO	
Nombre y cargo Ing. Erick Veloza Residente de interventoria		Nombre y cargo Pedro Beltrán Director de Interventoria	
INFORME MENSUAL ÁREA SOCIAL			
ELABORÓ:		REVISO	
Nombre y cargo TS Lina Celeita Coordinadora social interventoria		Nombre y cargo Pedro Beltrán Director de Interventoria	
INFORME MENSUAL ÁREA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- SST			
ELABORÓ:		REVISO	
Nombre y cargo Aura María Alarcón Gómez Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo		Nombre y cargo Pedro Beltrán Director de Interventoria	
INFORME MENSUAL ÁREA AMBIENTAL			
ELABORÓ:		REVISO	
Nombre y cargo Cesar Granados Profesional Ambiental		Nombre y cargo Pedro Beltrán Director de Interventoria	

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS / GePM Mejoramiento Innovación y Calidad	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 6** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / SECRETARÍA DEL HÁBITAT / BOGOTÁ

MENSUAL No. 6 (Consecutivo) **DEL** 1/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 28/02/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

""CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.""

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022

(Indique el objeto del contrato de obra suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900.372.215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: S Y C INGENIERIA S.A.S (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.509.427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Valor Inicial	$ 431.990.875
Valor Adicional 1	194400000
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 626.390.875
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/9/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/1/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/4/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/4/2023

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	1620000000
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5.220.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	2,5 MESES
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/9/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/3/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/3/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON


(Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)


(Reportar avance aculado mensual (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

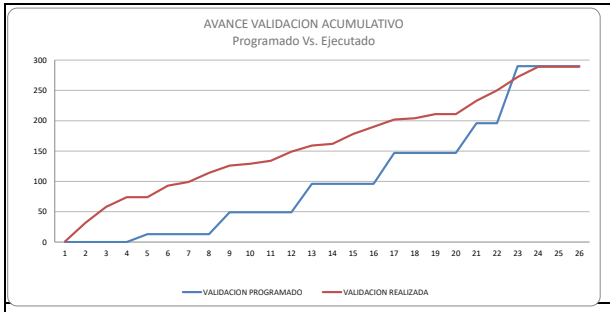

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

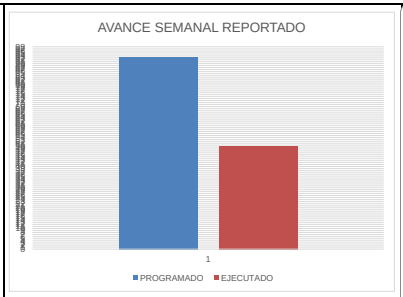

Avance semana mensual (Programado Vs. Ejecutado)

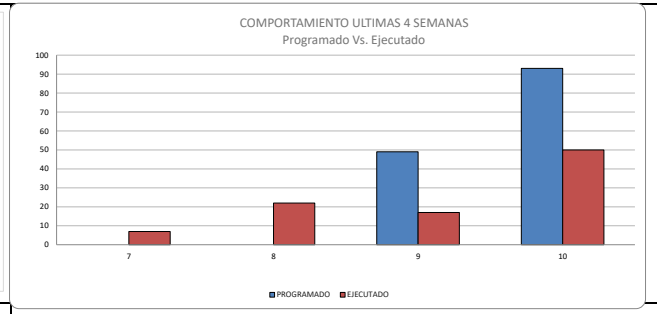

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
	289	**100**	**289**	**100,0**	**0**	**0**


Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
93	**50**	**0**	**0**


SEMANA	Pros.	Ejecutado	SEMANA	Pros.	Ejecutado	SEMANA	Pros.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado
23	**0**	**7**	24	**0**	**22**	25	**49**	**17**	26	**93**	**50**


2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

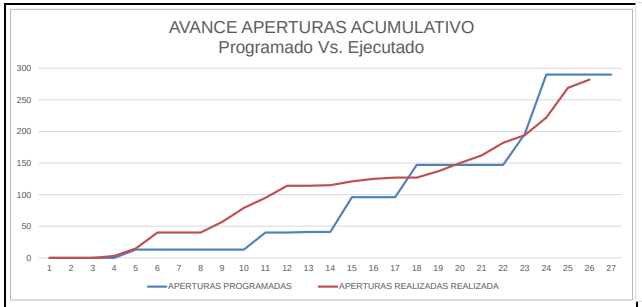

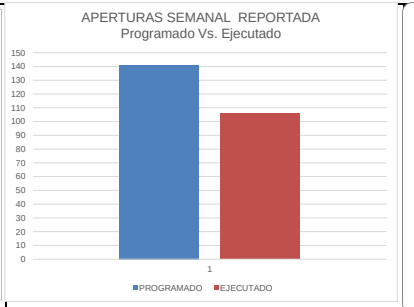

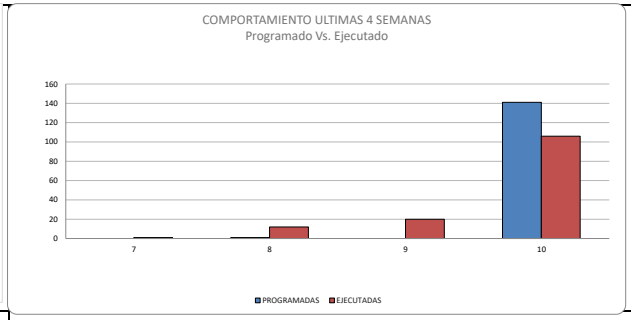

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**289**	**100%**	**273**	**94%**	**0**	**16**

Avance mensual reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
141	**106**	**0**	**35**


Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)


SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado
23	**0**	**1**	**24**	**1**	**12**	**25**	**0**	**20**	**26**	**141**	**106**


2.3. AVANCES DE CIERRES

AVANCE CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y mensual (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

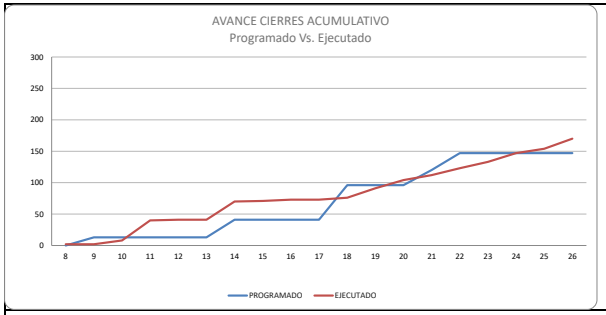

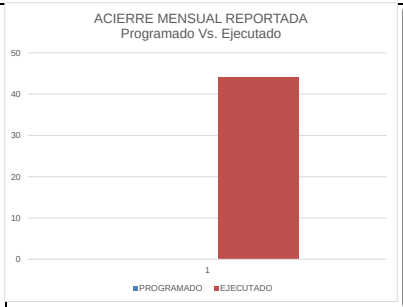

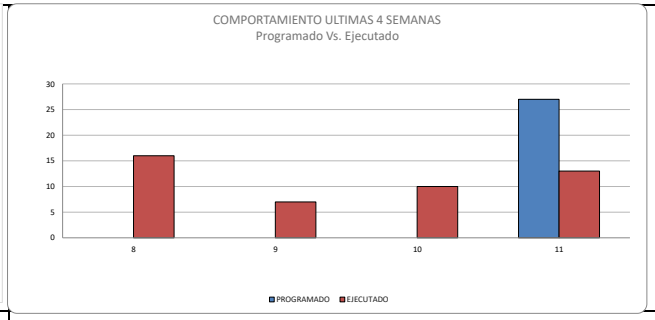

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso
Cantidad de Aperturas	**147**	**74%**	**161**	**56%**	**0**	**-14**

Avance mensual reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso
0	**44**	**0**	**0**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado	SEMANA	Prog.	Ejecutado
23	**0**	**16**	**24**	**0**	**7**	**25**	**0**	**10**	**26**	**27**	**13**


2.3.1. RESUMEN POR TECNICO

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							Fase 2: Ejecución de obras					
Territorio o barrio a intervenir	USME - CIUDAD BOLIVAR	Barrios	Predios	Total Predios	Validación		Ejecución					
					Validada	Por validar	En ejecución	Terminadas	RENUNCIAS O NO EJECUCION	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	Ing. Álvaro Solano	USME - CIUDAD BOLIVAR	75	296	37	35	32	35	3	5	12,4%	12
	Arq. Maritza Vega		69		26	42	26	42	1	0	14,5%	21
	Arq. José Robayo		78		35	42	26	40	1	11	14,4%	23
	Ing. Erick Veloza		74		29	44	28	44	1	1	15,1%	14
subtotal				296	127	163	112	161	6	17	56,3%	161

2.4. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

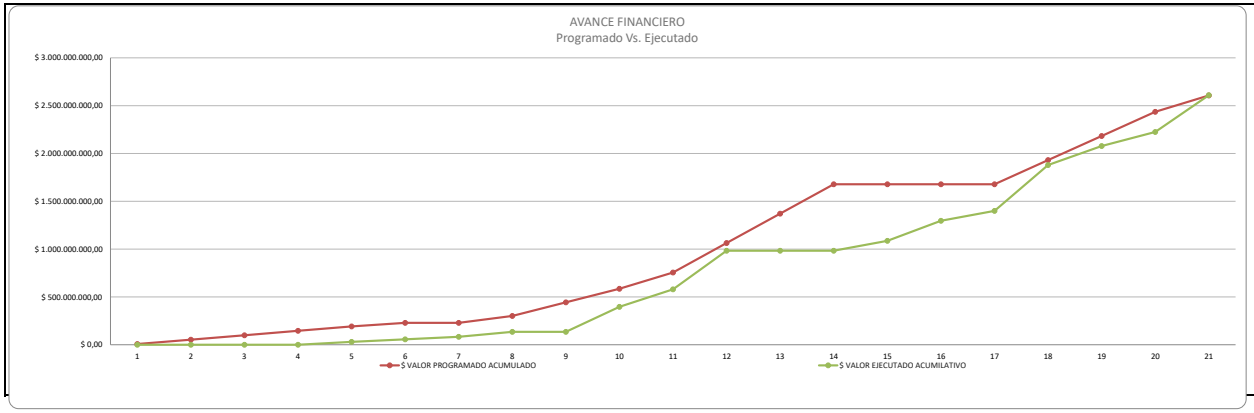

VALOR INVERSIÓN SEGÚN FLUJO DE CAJA		
INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 1.305.000.000,00		$ 1.470.474.000,00
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
25,00%		28,17%
}		
PROGRAMADA	VS	EJECUTADA
$ 3.862.800.000,00		$ 3.967.200.000,00
% AVANCE PROGRAMADO	VS	% AVANCE EJECUTADO
74,00%		76,00%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($)	-$ 104.400.000,00	ATRASO
ATRASO ADELANTE EN PRCENTAJE (%)	-2%	ATRASO

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizando a medida que se vayan realizado actividades frente a caso (ir adicionando semanalmente)
En todo caso se deberá adjuntar el documento "Matriz Seguimiento PQRS - por interventoría."

3. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORÍA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)	
OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:	
Gestión Administrativa	1) Se solicito al contratista ingresar al personal de obra necesario para finalizar el contrato de obra con las fechas contractuales.

9. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los

seis	6	días del mes del	marzo	de	2023
(Día en letras)	(Día en números)		(Mes en letras)		(Año de firma del informe)



Nombre: (Nombre) ING. Pedro Beltrán

Cargo: Director de Interventoría

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA 6	
	CONSULTORÍA	
	INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA GRUPO 3	

GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ

Contrato de Obra	993 del 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022"	Fecha de Terminacion	15/03/2023
		Plazo Inicial	6,5 MESES
		Valor del contrato	$ 5.220.000.000

S Y C INGENIERIA S.A.S

Contrato de interventoría	1010 - 2022	Fecha de Inicio	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Objeto	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022."	Fecha de Terminacion	15/04/2023
		Plazo Inicial	7,5 MESES
		Valor del contrato	$ 626.390.875

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION				EJECUCION				CIERRE		DIRECCION	NOMBRE
			PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	REAL		
1	MVAL_02252	ENTREGADA	16/09/2022	-1	15-sep	28	1/10/2022	12	13-oct	49	4-nov	1-dic	KR 7B ESTE 108 53 SUR	ORLINDA JURADO GARZON
2	MVAL_02253	ENTREGADA	16/09/2022	-4	12-sep	37	1/10/2022	18	19-oct	43	4-nov	1-dic	KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON
3	MVAL_02339	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	21	17-nov	-43	5-oct	37	9-dic	11-nov	KR 7F ESTE 108 27 SUR MJ	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN
4	MVAL_02347	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	21	17-nov	-43	5-oct	37	9-dic	11-nov	KR 7F ESTE 108 53 SUR	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ
5	MVAL_02356	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	49	17-nov	-15	2-nov	34	9-dic	6-dic	KR 7G ESTE 108 52 SUR	GRACIELA MARTINEZ CAÑON
6	MVAL_02363	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	58	17-nov	-6	11-nov	25	9-dic	6-dic	KR 7G ESTE 108 28 SUR MJ 1	ANA HILDA BUSTOS GAONA
7	MVAL_02403	ENTREGADA	2/11/2022	-50	13-sep	22	17-nov	-43	5-oct	37	9-dic	11-nov	KR 7I ESTE 108 41 SUR	MARIA INES BONILLA MORALES
8	MVAL_02408	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	49	17-nov	-15	2-nov	43	9-dic	15-dic	KR 7I ESTE 108 63 SUR	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO
9	MVAL_02409	ENTREGADA	2/11/2022	-51	12-sep	14	17-nov	-52	26-sep	46	9-dic	11-nov	CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
10	MVAL_02410	ENTREGADA	2/11/2022	-51	12-sep	23	17-nov	-43	5-oct	44	9-dic	18-nov	CL 109 SUR 7I 18 ESTE	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN
11	MVAL_02422	ENTREGADA	2/11/2022	-44	19-sep	44	17-nov	-15	2-nov	72	9-dic	13-ene	KR 7I ESTE 108 36 SUR	JUDITH IBAGUE VILLALBA
12	MVAL_02436	ENTREGADA	2/11/2022	-50	13-sep	50	17-nov	-15	2-nov	79	9-dic	20-ene	KR 8 ESTE 108 29 SUR	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA
13	MVAL_02466	ENTREGADA	2/11/2022	-51	12-sep	14	17-nov	-52	26-sep	32	9-dic	28-oct	KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ
14	MVAL_02470	ENTREGADA	16/09/2022	-2	14-sep	22	1/10/2022	5	6-oct	41	4-nov	16-nov	KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	ORVEIN QUINTERO
15	MVAL_02493	ENTREGADA	2/11/2022	-51	12-sep	14	17-nov	-52	26-sep	32	9-dic	28-oct	KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO
16	MVAL_02506	ENTREGADA	16/09/2022	-4	12-sep	31	1/10/2022	12	13-oct	35	4-nov	17-nov	CL 109 SUR 7B 09 ESTE	OLGA EDIT MORENO MORENO
17	MVAL_02511	ENTREGADA	16/09/2022	-4	12-sep	31	1/10/2022	12	13-oct	35	4-nov	17-nov	KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	VICTOR GABRIEL CONTRERAS
18	MVAL_02527	ENTREGADA	16/09/2022	-4	12-sep	37	1/10/2022	18	19-oct	29	4-nov	17-nov	KR 7D ESTE 109 15 SUR	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO
19	MVAL_02530	ENTREGADA	16/09/2022	-4	12-sep	23	1/10/2022	4	5-oct	42	4-nov	16-nov	KR 7D ESTE 109 29 SUR	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ
20	MVAL_02569	EJECUCION	16/09/2022	-2	14-sep	128	1/10/2022	111	20-ene		4-nov		KR 7H ESTE 109 13 SUR	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO
21	MVAL_02572	ENTREGADA	16/09/2022	-1	15-sep	25	1/10/2022	9	10-oct	36	4-nov	15-nov	CL 109 SUR 7H 23 ESTE	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO
22	MVAL_02575	ENTREGADA	16/09/2022	-3	13-sep	20	1/10/2022	2	3-oct	44	4-nov	16-nov	KR 7H ESTE 109 18 SUR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO
23	MVAL_02585	ENTREGADA	16/09/2022	-2	14-sep	63	1/10/2022	46	16-nov	78	4-nov	2-feb	KR 7I ESTE 109 24 SUR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA
24	MVAL_02589	ENTREGADA	16/09/2022	-2	14-sep	57	1/10/2022	40	10-nov	82	4-nov	31-ene	KR 8 ESTE 109 31 SUR	WILIAN GONZALEZ LLANO
25	MVAL_02590	ENTREGADA	16/09/2022	-3	13-sep	38	1/10/2022	20	21-oct	27	4-nov	17-nov	KR 8 ESTE 109 37 SUR	LUZ YAMILE MARIN
26	MVAL_02484	ENTREGADA	2/11/2022	-51	12-sep	60	17-nov	-6	11-nov	70	9-dic	20-ene	KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	LUIS EDUARDO MORA
27	MV_1595	ENTREGADA	1/12/2022	-66	26-sep	45	10-dic	-30	10-nov	27	2-ene	7-dic	CL 105A SUR 7B 54 ESTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA
28	MV_1598	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	44	10-dic	-29	11-nov	67	2-ene	17-ene	CL 105 SUR 7B 05 ESTE	GILBERTO JUNCO CICUA
29	MVAL_01739	ENTREGADA	2/11/2022	-43	20-sep	29	17-nov	-29	19-oct	48	9-dic	6-dic	CL 108 SUR 7B 16 ESTE	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ
30	MVAL_01767	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	43	10-dic	-38	2-nov	79	2-ene	20-ene	KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	ALFONSO BOGOTA MORENO
31	MVAL_01768	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	31	10-dic	-50	21-oct	25	2-ene	15-nov	KR 7C ESTE 107 39 ESTE	HERMENCIA MONSALVE MEJIA
32	MVAL_01787	ENTREGADA	1/12/2022	-66	26-sep	39	10-dic	-36	4-nov	14	2-ene	18-nov	KR 7D ESTE 105A 09 SUR	EVELIO CAICEDO ROBAYO
33	MVAL_01876	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	30	10-dic	-50	21-oct	28	2-ene	18-nov	CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	CLARA INES HERNANDEZ TORRES
34	MVAL_01879	ENTREGADA	1/12/2022	-69	23-sep	42	10-dic	-36	4-nov	11	2-ene	15-nov	KR 7H ESTE 106 62 SUR	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ
35	MVAL_01890	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	22	10-dic	-58	13-oct	33	2-ene	15-nov	KR 7I ESTE 106 47 SUR	ROSA ELENA CAMACHO CELIS
36	MVAL_01894	ENTREGADA	1/12/2022	-69	23-sep	28	10-dic	-50	21-oct	25	2-ene	15-nov	KR 7I ESTE 106 63 SUR	HERMELINDA BARBOSA PINZON
37	MVAL_01902	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	22	10-dic	-58	13-oct	57	2-ene	9-dic	KR 7I ESTE 106 44 SUR	BLANCA YANETH ANZOLA
38	MVAL_01913	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	22	10-dic	-58	13-oct	35	2-ene	17-nov	KR 8 ESTE 106 53 SUR	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA

39	MVAL_01914	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	21	10-dic	-59	12-oct	36	2-ene	17-nov	KR 8 ESTE 106 57 SUR	VICTOR MANUEL YATE YATE
40	MVAL_01915	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	21	10-dic	-59	12-oct	37	2-ene	18-nov	KR 8 ESTE 106 61 ESTE	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ
41	MVAL_01957	ENTREGADA	2/11/2022	-44	19-sep	53	17-nov	-6	11-nov	61	9-dic	11-ene	KR 8A ESTE 107 17 SUR	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO
42	MVAL_01959	ENTREGADA	2/11/2022	-44	19-sep	120	17-nov	61	17-ene	41	9-dic	27-feb	KR 8A ESTE 107 29 SUR	JOSE MIGUEL MORENO PARADO
43	MVAL_01977	ENTREGADA	2/11/2022	-48	15-sep	49	17-nov	-14	3-nov	36	9-dic	9-dic	KR 7I ESTE 107 54 SUR	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON
44	MVAL_01990	ENTREGADA	1/12/2022	-69	23-sep	28	10-dic	-50	21-oct	26	2-ene	16-nov	KR 7I ESTE 107 08 SUR	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA
45	MVAL_01998	ENTREGADA	2/11/2022	-48	15-sep	49	17-nov	-14	3-nov	34	9-dic	7-dic	KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	MARLENI LADINO DE LOPEZ
46	MVAL_02015	ENTREGADA	2/11/2022	-48	15-sep	36	17-nov	-27	21-oct	28	9-dic	18-nov	KR 7H ESTE 107 54 SUR	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ
47	MVAL_02017	ENTREGADA	2/11/2022	-44	19-sep	16	17-nov	-43	5-oct	37	9-dic	11-nov	KR 7H ESTE 107 44 SUR	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ
48	MVAL_02034	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	52	10-dic	-29	11-nov	63	2-ene	13-ene	KR 7I ESTE 107 13 SUR	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES
49	MVAL_02039	RENUNCIA											KR 7I ESTE 107 33 SUR	MILTON GONZALEZ RODRIGUEZ
50	MVAL_02043	ENTREGADA	2/11/2022	-48	15-sep	48	17-nov	-15	2-nov	34	9-dic	6-dic	KR 7I ESTE 107 55 SUR	CAROLINA CARRILLO
51	MVAL_02066	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	44	10-dic	-37	3-nov	34	2-ene	7-dic	CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	YAZMIN GARCIA VARGAS
52	MVAL_02079	ENTREGADA	2/11/2022	-43	20-sep	44	17-nov	-14	3-nov	36	9-dic	9-dic	KR 7H ESTE 107 55 ESTE	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ
53	MVAL_02083	EJECUCION	2/11/2022	-23	10-oct	60	17-nov	22	9-dic		9-dic		CL 108 SUR 7F 22 ESTE	MARIA HERCELIA CAPERA
54	MVAL_02089	ENTREGADA	2/11/2022	-43	20-sep	15	17-nov	-43	5-oct	43	9-dic	17-nov	KR 7F ESTE 107 46 SUR	FROILAN RUIZ BELTRAN
55	MVAL_02096	ENTREGADA	1/12/2022	-52	10-oct	10	10-dic	-51	20-oct	43	2-ene	2-dic	KR 7F ESTE 107 20 SUR	ROSAURA PATRON SOLANO
56	MVAL_02098	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	16	10-dic	-65	6-oct	34	2-ene	9-nov	CL 107 SUR 7F 13 ESTE	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS
57	MVAL_02100	RENUNCIA											CL 107 SUR 7F 21 ESTE	ANGELICA MARIA TAUTIVA POVEDA
58	MVAL_02113	ENTREGADA	2/11/2022	-48	15-sep	55	17-nov	-8	9-nov	9	9-dic	18-nov	KR 7D ESTE 107 64 SUR	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ
59	MVAL_02114	ENTREGADA	2/11/2022	-43	20-sep	16	17-nov	-42	6-oct	43	9-dic	18-nov	KR 7D ESTE 107 60 SUR	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ
60	MVAL_02115	ENTREGADA	1/12/2022	-66	26-sep	25	10-dic	-50	21-oct	28	2-ene	18-nov	KR 7D ESTE 107 54 SUR	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ
61	MVAL_02121	ENTREGADA	1/12/2022	-71	21-sep	50	10-dic	-30	10-nov	27	2-ene	7-dic	KR 7D ESTE 107 30 SUR	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA
62	MVAL_02165	ENTREGADA	1/12/2022	-66	26-sep	16	10-dic	-59	12-oct	37	2-ene	18-nov	KR 7D ESTE 107 23 SUR	ROMULO LOZANO
63	MVAL_02166	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	16	10-dic	-65	6-oct	40	2-ene	15-nov	KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	ARGELIA GUTIERREZ DURAN
64	MVAL_02169	ENTREGADA	1/12/2022	-72	20-sep	29	10-dic	-52	19-oct	28	2-ene	16-nov	KR 7D ESTE 107 43 SUR	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS
65	MVAL_02366	ENTREGADA	2/11/2022	-49	14-sep	65	17-nov	1	18-nov	56	9-dic	13-ene	KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARINA MOTTA MEDRANO
66	MV_01277	ENTREGADA	24/12/2022	-58	27-oct	61	3-ene	-7	27-dic	29	24-ene	25-ene	KR 7A ESTE 104 04 SUR	ANA ELVIA GALINDO DUARTE
67	MV_01288	ENTREGADA	24/12/2022	-58	27-oct	21	3-ene	-47	17-nov	56	24-ene	12-ene	KR 7A ESTE 104 58 SUR	RUBY ESTHELA GOMEZ REYES
68	MV_01581	ENTREGADA	24/12/2022	-65	20-oct	75	3-ene	0	3-ene	24	24-ene	27-ene	CL 105A SUR 7 32 ESTE	ROSALBA VARGAS VARGAS
69	MV_01670	ENTREGADA	24/12/2022	-56	29-oct	23	3-ene	-43	21-nov	67	24-ene	27-ene	CL 102 SUR 7D 11 ESTE	CARLINA PINEDA DE CAMELO
70	MV_01680	ENTREGADA	1/12/2022	-42	20-oct	19	10-dic	-32	8-nov	28	2-ene	6-dic	CL 104 SUR 7D 24 ESTE	RAMON BUSTAMANTE TARAZONA
71	MV_1279	ENTREGADA	24/12/2022	-56	29-oct	37	3-ene	-29	5-dic	46	24-ene	20-ene	KR 7A ESTE 104 14 SUR	JOAN SEBASTIAN PRECIADO VANEGAS
72	MV_1292	ENTREGADA	1/12/2022	-35	27-oct	21	10-dic	-23	17-nov	89	2-ene	14-feb	CL 105A SUR 7A 14 ESTE	JULIA ESTHER VANEGAS NOVOA
73	MV_1293	ENTREGADA	1/12/2022	-8	23-nov	40	10-dic	23	2-ene		2-ene	6-feb	KR 7B ESTE 105 39 SUR	ROSA DELIA CASTELLANOS ARIZA
74	MV_1299	ENTREGADA	1/12/2022	-33	29-oct	65	10-dic	23	2-ene		2-ene	6-feb	KR 7B ESTE 105 15 SUR	ANGELICA MARIA ORDOÑES FERNANDEZ
75	MV_1301	RENUNCIA											KR 7B ESTE 105 03 SUR	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ
76	MV_1316	ENTREGADA	24/12/2022	-71	14-oct	40	3-ene	-41	23-nov		24-ene	7-feb	KR 7B ESTE 103 05 SUR	LUIS ARNULFO PARADA NIÑO
77	MV_1317	ENTREGADA	24/12/2022	-71	14-oct	40	3-ene	-41	23-nov	68	24-ene	30-ene	KR 7B ESTE 101 51 SUR	ANA SILVIA RIVEROS GARZON
78	MV_1322	ENTREGADA	1/12/2022	-44	18-oct	30	10-dic	-23	17-nov	22	2-ene	9-dic	KR 7B ESTE 101 33 SUR	MARIBEL CASTRO MANRIQUE
79	MV_1323	ENTREGADA	1/12/2022	-43	19-oct	29	10-dic	-23	17-nov	20	2-ene	7-dic	KR 7B ESTE 101 29 SUR	BIBIANA ANGELICA MONROY
80	MV_1324	ENTREGADA	24/12/2022	-66	19-oct	27	3-ene	-49	15-nov		24-ene	7-feb	KR 7B ESTE 101 25 SUR	JULIO ALBERTO MORENO CRUZ
81	MV_1325	ENTREGADA	1/12/2022	-44	18-oct	24	10-dic	-29	11-nov	26	2-ene	7-dic	KR 7B ESTE 101 21 SUR	JOSE SANTOS TIQUE TIQUE
82	MV_1327	ENTREGADA	24/12/2022	-71	14-oct	34	3-ene	-47	17-nov	57	24-ene	13-ene	KR 7B ESTE 101 11 SUR	RODRIGO AREVALO AREVALO
83	MV_1336	ENTREGADA	24/12/2022	-71	14-oct	28	3-ene	-53	11-nov	42	24-ene	23-dic	TV 7D ESTE 100 33 SUR	VICTOR HUGO CAMPO ESPITIA
84	MV_1338	ENTREGADA	1/12/2022	-49	13-oct	29	10-dic	-29	11-nov	25	2-ene	6-dic	TV 7D ESTE 100 29 SUR	LUZ MARINA AMAYA ALEY
85	MV_14679	ENTREGADA	1/12/2022	-61	1-oct	40	10-dic	-30	10-nov	26	2-ene	6-dic	CL 101 SUR 7D 29 ESTE	ESPERANZA LIZARAZO ARCINIEGAS
86	MV_1470	ENTREGADA	24/12/2022	-60	25-oct	77	3-ene	7	10-ene	24	24-ene	3-feb	CL 105 SUR 7 40 ESTE	ALBA GLADYS VELOZA CASTRO
87	MV_1611	ENTREGADA	1/12/2022	-66	26-sep	45	10-dic	-30	10-nov	57	2-ene	6-ene	CL 105 SUR 7B 77 ESTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA
88	MV_1612	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	36	10-dic	-37	3-nov	15	2-ene	18-nov	CL 105 SUR 7B 70 ESTE	NEYLA VARGAS
89	MV_1614	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	37	10-dic	-36	4-nov	14	2-ene	18-nov	CL 105 SUR 7B 58 ESTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ
90	MV_1635	ENTREGADA	1/12/2022	-48	14-oct	35	10-dic	-22	18-nov	56	2-ene	13-ene	KR 7D ESTE 103 17 SUR	JUAN ISIDRO LOPEZ
91	MV_1638	ENTREGADA	1/12/2022	-48	14-oct	35	10-dic	-22	18-nov	53	2-ene	10-ene	CL 104 SUR 7B 26 ESTE	MARGARITA MARTIN CARDENAS
92	MV_1649	ENTREGADA	24/12/2022	-56	29-oct	26	3-ene	-40	24-nov	47	24-ene	10-ene	CL 102 SUR 7D 34 ESTE	OMAR ESLAVA

93	MV_1655	ENTREGADA	24/12/2022	-72	13-oct	28	3-ene	-54	10-nov	43	24-ene	23-dic	CL 101 SUR 7D 11 ESTE	JOSE HECTOR LESMES
94	MV_1660	ENTREGADA	24/12/2022	-52	2-nov	76	3-ene	14	17-ene	22	24-ene	8-feb	CL 103 SUR 7D 42 ESTE	DORIS ADRIANA OCHOA YAZO
95	MV_1668	ENTREGADA	24/12/2022	-56	29-oct	20	3-ene	-46	18-nov	55	24-ene	12-ene	CL 103 SUR 7D 12 ESTE	DIVA CARVAJAL CHILITO
96	MV_1669	ENTREGADA	24/12/2022	-53	1-nov	17	3-ene	-46	18-nov	55	24-ene	12-ene	CL 103 SUR 7D 06 ESTE	GLORIA PEÑALOZA GOMEZ
97	MV_1676	ENTREGADA	1/12/2022	-48	14-oct	26	10-dic	-31	9-nov	65	2-ene	13-ene	CL 104 SUR 7D 52 ESTE	ALIRIO URRUTIA CHAGUENDO
98	MV_01677	ENTREGADA	10/10/2023	-365	10-oct		4-nov		4-nov	32	6-dic	6-dic	CL 104 SUR 7D 42 ESTE	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ
99	MV_1682	ENTREGADA	1/12/2022	-50	12-oct	23	10-dic	-36	4-nov	32	2-ene	6-dic	CL 104 SUR 7D 18 ESTE	RAMIRO MEDINA BOLAÑOZ
100	MV_1684	ENTREGADA	1/12/2022	-50	12-oct	27	10-dic	-32	8-nov	31	2-ene	9-dic	CL 104 SUR 7D 06 ESTE	AMALIA NARANJO MOLANO
101	MV_1685	ENTREGADA	1/12/2022	-34	28-oct	69	10-dic	26	5-ene	25	2-ene	30-ene	CL 103 SUR 7D 05 ESTE	ANA FAYNED SANTAMARIA MURILLO
102	MV_1689	ENTREGADA	1/12/2022	-34	28-oct	26	10-dic	-17	23-nov	54	2-ene	16-ene	CL 103 SUR 7D 29 ESTE	JOSELIN BONILLA ACUÑA
103	MV_1690	ENTREGADA	24/12/2022	-57	28-oct	27	3-ene	-40	24-nov	54	24-ene	17-ene	CL 103 SUR 7D 35 ESTE	ROBINSON REYES HERNANDEZ
104	MV_1693	ENTREGADA	24/12/2022	-56	29-oct	20	3-ene	-46	18-nov	55	24-ene	12-ene	CL 103 SUR 7D 45 ESTE	LUZ MARY ALARCON
105	MV_1697	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	23	10-dic	-50	21-oct	26	2-ene	16-nov	CL 105 SUR 7D 48 ESTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA
106	MV_1698	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	57	10-dic	-16	24-nov	50	2-ene	13-ene	CL 105 SUR 7D 42 ESTE	EVANGELINA AMAYA ALEY
107	MV_1699	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	36	10-dic	45233	3-nov	68	2-ene	10-ene	CL 105 SUR 7D 36 ESTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA
108	MV_1701	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	36	10-dic	-37	3-nov	15	2-ene	18-nov	CL 105 SUR 7D 24 ESTE	CESAR GORDO BARRERO
109	MV_1705	ENTREGADA	1/12/2022	-52	10-oct	25	10-dic	-36	4-nov	35	2-ene	9-dic	CL 105 SUR 7D 08 ESTE	ELVIRA LOPEZ DIAZ
110	MV_1708	ENTREGADA	1/12/2022	-50	12-oct	22	10-dic	-37	3-nov	22	2-ene	25-nov	CL 104 SUR 7D 11 ESTE	OFELIA ALARCON ACEVEDO
111	MV_1711	ENTREGADA	1/12/2022	-52	10-oct	39	10-dic	-22	18-nov	19	2-ene	7-dic	CL 104 SUR 7D 35 ESTE	BLANCA NIEVES PEÑA DIAZ
112	MV_1716	ENTREGADA	1/12/2022	-50	12-oct	28	10-dic	-31	9-nov	28	2-ene	7-dic	CL 104 SUR 7D 53 ESTE	LEONARDO FABIO OSORIO BARRAGAN
113	MV_1724	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	23	10-dic	-50	21-oct	28	2-ene	18-nov	CL 105A SUR 7F 06 ESTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA
114	MV_1733	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	23	10-dic	-50	21-oct	49	2-ene	9-dic	CL 105 SUR 7D 23 ESTE	ELCIRA SANTOS TINOCO
115	MV_1735	ENTREGADA	1/12/2022	-64	28-sep	57	10-dic	-16	24-nov	81	2-ene	13-feb	CL 105 SUR 7D 35 ESTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA
116	MV_01446	ENTREGADA	24/12/2022	-58	27-oct	29	3-ene	-39	25-nov	54	30-ene	18-ene	KR 7 BIS A ESTE 104 38 SUR	YANETH ROCIO MERCHAN
117	MV_01451	ENTREGADA	24/12/2022	-33	21-nov	43	3-ene	0	3-ene	24	30-ene	27-ene	KR 7 BIS A ESTE 104 14 SUR	BLANCA LILIA CANTOR GAITAN
118	MV_01480	ENTREGADA	24/12/2022	-53	1-nov	24	3-ene	-39	25-nov	54	30-ene	18-ene	KR 7 BIS ESTE 104 52 SUR	JULIO BARRETO ROJAS
119	MV_01507	ENTREGADA	1/12/2022	-30	1-nov	22	10-dic	-17	23-nov	16	2-ene	9-dic	KR 7 BIS A ESTE 104 69 SUR	FREDY ALEXANDER SANCHEZ GIRALDO
120	MV_01508	ENTREGADA	24/12/2022	-53	1-nov	22	3-ene	-41	23-nov	49	24-ene	11-ene	CL 105 SUR 7 20 ESTE	SONIA RODRIGUEZ VALERO
121	MV_01541	ENTREGADA	24/12/2022	-53	1-nov	24	3-ene	-39	25-nov	56	30-ene	20-ene	KR 7 BIS ESTE 104 33 SUR	ROSA AURA ROJAS BERNAL
122	MV_01549	ENTREGADA	24/12/2022	-57	28-oct	21	3-ene	-46	18-nov	68	24-ene	25-ene	KR 7 BIS ESTE 104 53 SUR MJ	MYRIAM ELENA MERCHAN VILLAMIL
123	MV_1471	ENTREGADA	24/12/2022	-60	25-oct	83	3-ene	13	16-ene	24	24-ene	9-feb	CL 105 SUR 7 36 ESTE	CAMILO ORTIZ MORA
124	MV_1476	ENTREGADA	24/12/2022	-59	26-oct	47	3-ene	-22	12-dic	59	24-ene	9-feb	KR 7 BIS ESTE 104 68 SUR	ARSENIO RAMOS BERNAL
125	MV_1478	ENTREGADA	24/12/2022	-58	27-oct	22	3-ene	-46	18-nov	66	24-ene	23-ene	KR 7 BIS ESTE 104 64 SUR	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ
126	MV_1483	ENTREGADA	24/12/2022	-58	27-oct	29	3-ene	-39	25-nov	81	30-ene	14-feb	KR 7 BIS ESTE 104 38 SUR	NOREDIS RODRIGUEZ POLOCHE
127	MV_1485	ENTREGADA	24/12/2022	-52	2-nov	89	3-ene	27	30-ene	21	30-ene	20-feb	KR 7 BIS ESTE 104 32 SUR	EGMIDIO MARTINEZ MEDINA
128	MV_1487	ENTREGADA	24/12/2022	-44	10-nov	67	3-ene	13	16-ene		30-ene	14-feb	KR 7 BIS ESTE 104 16 SUR	JORGE GONZALEZ TRIVIÑO
129	MV_1499	ENTREGADA	24/12/2022	-44	10-nov	54	3-ene	0	3-ene		30-ene	6-feb	KR 7 BIS A ESTE 104 29 SUR	ROSA ADELINA CASTAÑEDA PEREZ
130	MV_1545	ENTREGADA	24/12/2022	-57	28-oct	26	3-ene	-41	23-nov	58	30-ene	20-ene	KR 7 BIS ESTE 104 45 SUR	ESNEDA CASTAÑEDA VARGAS
131	MV_1555	EJECUCION	24/12/2022	-44	10-nov	81	3-ene	27	30-ene		24-ene		KR 7 BIS ESTE 104 69 SUR	ROSALBA NARVAEZ DE MELENDEZ
132	MV_42865-IDU	EJECUCION	9/02/2023	-77	24-nov		21-feb		24-ene		10-mar		KR 18U BIS 67C 23 SUR	ERISINDA DURAN DE ECHEVERRI
133	MV_42881IDU	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		3-feb		10-mar		CL 63 SUR 18N 14	LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ
134	MV_42883IDU	ENTREGADA	9/02/2023	-77	24-nov		21-feb		24-ene		10-mar	28-feb	TV 618P BIS A 69A SUR 16	CLARA ISABEL ALDANA
135	MV_42885IDU	EJECUCION	9/02/2023	-77	24-nov		21-feb		24-ene		10-mar		DG 69 SUR 18N 70	FLOR ELISA ROMERO
136	MVBF_358	ENTREGADA	9/02/2023	-71	30-nov	15	21-feb	-68	15-dic	39	10-mar	23-ene	KR 27 G No. 73 D 71 SUR MJ	MARIA NELLY LOPEZ PEÑA
137	MVBF_360	ENTREGADA	9/02/2023	-56	15-dic	4	21-feb	-64	19-dic		10-mar	14-feb	K 27 G 73 D 95 SUR	JOSÉ DEL CARMEN MARTINEZ
138	MVBF_383	ENTREGADA	9/02/2023	-71	30-nov	14	21-feb	-69	14-dic	51	10-mar	3-feb	TV 27H 73D 78 SUR	LEIDY VIVIANA GONZALEZ CARO
139	MVBF_403	ENTREGADA	9/02/2023	-56	15-dic	4	21-feb	-64	19-dic		10-mar	6-feb	KR 27F 73D 57 SUR	JOSE IGNACIO RIASCOS
140	MVBF_412	ENTREGADA	9/02/2023	-71	30-nov	14	21-feb	-69	14-dic	22	10-mar	5-ene	KR 27 G 73D 48 SUR	JORGE HUMBERTO MARÍN
141	MVBF_437	ENTREGADA	9/02/2023	-71	30-nov	14	21-feb	-69	14-dic	40	10-mar	23-ene	CL 73D BIS B SUR 27B 83	LIDA FLOR MONTENEGRO QUINTANA
142	MVBF_440	ENTREGADA	9/02/2023	-57	14-dic	5	21-feb	-64	19-dic	46	10-mar	3-feb	CL 73D BIS B SUR 27B 95	NOHEMY PINTO
143	MVBF_447	ENTREGADA	9/02/2023	-56	15-dic	7	21-feb	-61	22-dic	28	10-mar	19-ene	CL 73D BIS SUR 27B 93	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ
144	MVBF_453	ENTREGADA	9/02/2023	-52	19-dic	7	21-feb	-57	26-dic	24	10-mar	19-ene	CL 73D BIS SUR 27B 81	JOSE ANTONIO CHACON CHAVES
145	MVBF-0424	ENTREGADA	9/02/2023	-71	30-nov	14	21-feb	-69	14-dic	48	10-mar	31-ene	CL 74B SUR 27F 10	CLAUDIA PATRICIA CHACON CHAVEZ
146	MVCB_4859	EJECUCION	9/02/2023	-154	8-sep	138	21-feb	-28	24-ene		10-mar		CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ

147	MVCB_5557	EJECUCION	9/02/2023	-77	24-nov		21-feb		24-ene		10-mar		KR 18Q BIS B 69 64 SUR	LUZ MARINA ZULUAGA OSORIO
148	MVJ_0003	EJECUCION	9/02/2023	-86	15-nov		21-feb		14-feb		10-mar		KR 48 73B 09 SUR	GLORIA YAMIL LEON PATIÑO
149	MVJ_0013	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		14-feb		10-mar		KR 46A 76 35 SUR	MARIO EDGAR DIAZ MORENO
150	MVJ_0019	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		21-feb		10-mar		TV 47A 76A 34 SUR	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ
151	MVJ_0024	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		14-feb		10-mar		KR 45 75A 55 SUR	MIRYAM CRUZ ARIZA
152	MVJ_0032	EJECUCION	9/02/2023	-65	6-dic		21-feb		17-feb		10-mar		CL 78 SUR 44B 24	MARGARITA HELENA BARON RODRIGUEZ
153	MVJ_0036	EJECUCION	9/02/2023	-65	6-dic		21-feb		21-feb		10-mar		KR 44B 77 43 SUR	CLARA ROCIO RODRIGUEZ AGUDELO
154	MVJ_0044	EJECUCION	9/02/2023	-65	6-dic		21-feb		14-feb		10-mar		KR 44B 78 24 SUR	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ
155	MVJ_0050	EJECUCION	9/02/2023	-45	26-dic		21-feb		21-feb		10-mar		KR 44A BIS 79 10 SUR	LILIANA MARIA RODRIGUEZ DURAN
156	MVJ_0072	EJECUCION	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		2-feb		10-mar		DG 69F SUR 48 70	ANGELICA GIRALDO MURILLO
157	MVJ_0102	EJECUCION	9/02/2023	-52	19-dic		21-feb		21-feb		10-mar		CL 77 SUR 44 03 MJ	LUZ MARINA ESPITIA SALAZAR
158	MVJ_0103	EJECUCION	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		2-feb		10-mar		KR 47 69 B 39 SUR	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS
159	MVJ_0110	EJECUCION	9/02/2023	-58	13-dic		21-feb		21-feb		10-mar		KR 40 76 47 SUR	HURDIS CARTAGENA HERNANDEZ
160	MVJ_0115	EJECUCION	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		2-feb		10-mar		KR 48 69B 16 SUR MJ 2	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARCIA
161	MVJ_0116	ENTREGADA	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		2-feb		10-mar	18-feb	CL 69B SUR 47 31 MJ 3	GLADYS INES BASTOS
162	MVJ_0120	EJECUCION	9/02/2023	-58	13-dic		21-feb		17-feb		10-mar		KR 44 76 39 SUR	HENRY VARGAS BARRETO
163	MVJ_0121	EJECUCION	9/02/2023	-56	15-dic		21-feb		3-feb		10-mar		CL 82B SUR 46A 18	RODRIGO JIMENEZ SAENZ
164	MVJ_0122	EJECUCION	9/02/2023	-148	14-sep		21-feb		28-feb		10-mar		CL 82A SUR 46A 37	RICAURTE GRAJALES
165	MVJ_0123	EJECUCION	9/02/2023	-56	15-dic		21-feb		3-feb		10-mar		KR 45B 82C 09 SUR	MARIA ALCIRA NUÑEZ
166	MVJ_0124	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		8-feb		10-mar		KR 45 80B 21 SUR	EFREN PRIETO MATIZ
167	MVJ_0127	EJECUCION	9/02/2023	-58	13-dic		21-feb		17-feb		10-mar		KR 44 77 22 SUR	EMILCE ALARCON DELGADO
168	MVJ_0128	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		21-feb		10-mar		TV 44A 78A 87 SUR	RAFAEL PINZON SANCHEZ
169	MVJ_0131	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		21-feb		10-mar		CL 79B SUR 42 44	ANA DELINA BAUTISTA POVEDA
170	MVJ_0132	EJECUCION	9/02/2023	-45	26-dic		21-feb		21-feb		10-mar		KR 42 80B 13 SUR	GLORIA YANET RODRIGUEZ RAYO
171	MVJ_0133	EJECUCION	9/02/2023	-70	1-dic		21-feb		3-feb		10-mar		CL 80A SUR 44A 12	HERMENCIA GACHA CALLEJAS
172	MVJ_0136	EJECUCION	9/02/2023	-56	15-dic		21-feb		21-feb		10-mar		CL 82C BIS SUR 44B 19	YAMILE SANDOVAL LUGO
173	MVJ_0138	VALIDADA	9/02/2023	-68	3-dic		21-feb				10-mar		KR 41 76 76 SUR	MIRIAM LOAIZA CHICO
174	MVJ_0139	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		21-feb		10-mar		CL 80B SUR 40 24 MJ	WENDY MICHEL CUASTUMAL
175	MVJ_0140	VALIDADA	9/02/2023	-56	15-dic		21-feb				10-mar		CL 82C BIS SUR 44 A 52 MJ	RUBY SOLEY ALZATE ORTIZ
176	MVJ_0141	EJECUCION	9/02/2023	-45	26-dic		21-feb		21-feb		10-mar		KR 39 79A 62 SUR	MARIA SERGINA AGUIRRE TORO
177	MVJ_0142	EJECUCION	9/02/2023	-56	15-dic		21-feb		3-feb		10-mar		CL 82 SUR 44A 49 MJ 1	ABEL MATEUS RUIZ
178	MVJ_0143	VALIDADA	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb				10-mar		DG 80A SUR 45 49	AMPARO ROMERO RODRIGUEZ
179	MVJ_137	EJECUCION	9/02/2023	-58	13-dic		21-feb		17-feb		10-mar		CL 78 SUR 43 05	MARIA HERMENCIA PAEZ DE JIMENEZ
180	MVJA_1405	NO EJECUCIÓN											CL 65 SUR 18R 42	CESAR CRUZ MOLANO
181	MVJE_1000	RENUNCIA											KR 46A 82A 35 SUR	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA
182	MVJE_807	RENUNCIA											KR 45A 75A 55 SUR	ARIEL QUITIAN MATEUS
183	MVPA_0133	EJECUCION	9/02/2023	-50	21-dic		21-feb		20-ene		10-mar		CL 71I SUR 27K 03	CARMENZA JUTINICO ROJAS
184	MVPA_0502	EJECUCION	9/02/2023	-70	1-dic		21-feb		13-feb		10-mar		CLL 71P SUR 27J 10	JOSE FERLEIN AMADO BERNAL
185	MVPA_0529	EJECUCION	9/02/2023	-70	1-dic		21-feb		2-feb		10-mar		KR 27K 71K 26 SUR	AURA MARIA SEPULVEDA CORONADO
186	MVPA_1009	EJECUCION	9/02/2023	-57	14-dic		21-feb		26-ene		10-mar		CL 71H BIS SUR 27L 72	GILDA IRLEY CASTILLO SERRANO
187	MVPA_1066	VALIDADA	9/02/2023	-20	20-ene		21-feb				10-mar		CL 71H SUR 27L 34 MJ 1	LUZ AMPARO PARRA ROSAS
188	MVPA_1205	ENTREGADA	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		17-ene		10-mar	13-feb	KR 27K 71D 81 SUR	ELSA MARIA VERA PORTELA
189	MVPA_1226	ENTREGADA	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		17-ene		10-mar	13-feb	KR 27J 71D 15 SUR	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO ROMERO
190	MVPA_1244	ENTREGADA	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		17-ene		10-mar	13-feb	KR 27K 71D 70 SUR	MARIA DORAIDA CARRILLO LOPEZ
191	MVPA_1298	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		20-ene		10-mar		CL 71I SUR 27N 34	ANA BEATRIZ CHAVES ZAMBRANO
192	MVPA_142	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		23-feb		10-mar		CL 71K SUR 27K 16	OLGA LUCIA BENITEZ FLORIAN
193	MVPA_144	EJECUCION	9/02/2023	-70	1-dic		21-feb		2-feb		10-mar		CL 71K SUR 27K 22	JOSE MARTIN DIAZ
194	MVPA_156	EJECUCION	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		31-ene		10-mar		KR 27L 71I 28 SUR MJ	CRUZ QUITORA CAPERA
195	MVPA_1909	EJECUCION	9/02/2023	-79	22-nov		21-feb		2-feb		10-mar		KR 27K 71D 58 SUR	JAIME MURILLO ROJAS
196	MVPA_1995	ENTREGADA	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb		20-ene		10-mar	13-feb	CL 71F BIS A SUR 27L 61	MARINELA MIRANDA PIÑEROS
197	MVPA_915	VALIDADA	9/02/2023	-44	27-dic		21-feb				10-mar		CL 71J SUR 27N 52	MARIA BELLA AVILA ANZOLA
198	MVPA_973	EJECUCION	9/02/2023	-57	14-dic		21-feb		2-feb		10-mar		CL 71H BIS SUR 27L 75	MARIA JACQUELINE GUEVARA ORDUÑA
199	MVPA_985	EJECUCION	9/02/2023	-70	1-dic		21-feb		31-ene		10-mar		CL 71H BIS SUR 27L 17	EMILIO CARO QUINTERO
200	MVTT_0320	ENTREGADA	9/02/2023	-86	15-nov		21-feb		24-ene		10-mar	22-feb	TV 73I 75B 25 SUR	MARIA MYRIAM MAHECHA CAMACHO

201	MV_068	RENUNCIA											CL 77 SUR 44 23	MARIA LEIDA BERNAL MOSCA
202	MVAL_02676	ENTREGADA	9/02/2023	-85	16-nov	9	21-feb	-88	25-nov		10-mar	8-feb	KR 8A BIS ESTE 108-18 SUR	JESÚS EDUARDO MONROY VIVAS
203	MVAL_02673	ENTREGADA	9/02/2023	-85	16-nov	9	21-feb	-88	25-nov	64	10-mar	28-ene	KR 8A BIS ESTE 108- 38 SUR	DAGOBERTO UNIVIO NÚÑEZ
204	MVAL_02701	ENTREGADA	9/02/2023	-78	23-nov	58	21-feb	-32	20-ene		10-mar	13-feb	CL 109 SUR 8A 09ESTE	LINDA AURA PAEZ ESQUIVEL
205	MVAL_02495	ENTREGADA	1/12/2022	-15	16-nov	7	1-dic	-8	23-nov	16	6-dic	9-dic	KR 8A BIS ESTE 108- 25 SUR	NOHORA RUIZ CAMARGO
206	MVAL_02641	ENTREGADA	9/02/2023	-52	19-dic		21-feb		31-ene		10-mar	14-feb	KR 8C ESTE 108 76 SUR	ROSIO HERNANDEZ PATIÑO
207	MVBF_494	ENTREGADA	9/02/2023	-49	22-dic	12	21-feb	-49	3-ene		10-mar	14-feb	CL 73 C SUR No. 27 B 85	MARIA NIDIA MANTILLA CAICEDO
208	MVBF_513	ENTREGADA	9/02/2023	-49	22-dic	12	21-feb	-49	3-ene		10-mar	6-feb	CL 73 C SUR 27B 91	FAUSTINO RODRIGUEZ
209	MVBF_514	ENTREGADA	9/02/2023	-44	27-dic	7	21-feb	-49	3-ene	31	10-mar	3-feb	TV 27H 73C 06 SUR	ISAIAS MORATO CASTIBLANCO
210	MVAL_02609	EJECUCION	26/01/2023	19	14-feb	10	7-feb	17	24-feb		6-mar		KR 8D ESTE 107A 11 SUR	RICARDINA MANQUILLOGUEVARA
211	MVAL_02621	VALIDADA	26/01/2023		13-feb		7-feb				6-mar		KR 8D ESTE 107A 24 SUR	BETSABE GONZALEZ VARGAS
212	MVAL_02655	EJECUCION	26/01/2023		7-feb		7-feb		27-feb		6-mar		KR 8D ESTE 108 21 SUR	ISABEL GALEANO GARCIA
213	MVAL_02657	EJECUCION	26/01/2023		9-feb		7-feb		23-feb		6-mar		KR 8D ESTE 108 35 SUR	ZORAIDA YASMIN MORENO ARIAS
214	MVAL_02680	VALIDADA	26/01/2023		30-ene		7-feb				6-mar		KR 8C ESTE 108 37 SUR	MARIA MARGARITA MENDIETA SIERRA
215	MVAL_02687	EJECUCION	24/12/2022		6-feb		3-ene		20-feb		30-ene		KR 8C ESTE 108 51 SUR	MARINA PAVA
216	MVAL_02594	EJECUCION	26/01/2023		6-feb		7-feb		9-feb		6-mar		CL 108 SUR 8B 08 ESTE	WILSON AGUIRRE
217	MVAL_02595	EJECUCION	26/01/2023		6-feb		7-feb		27-feb		6-mar		KR 8C ESTE 107A 47 SUR	MARIA ESNEDA HENAO
218	MVAL_02596	EJECUCION	26/01/2023		6-feb		7-feb		21-feb		6-mar		KR 8C ESTE 107A 41 SUR	ANA GRACIELA BAQUERO SUCUNCHOQUE
219	MVAL_02622	EJECUCION	26/01/2023		14-feb		7-feb		27-feb		6-mar		KR 8D ESTE 107A 18 SUR	HAROLD CARDOZO CARDOZO
220	MVAL_02639	EJECUCION	26/01/2023		7-feb		7-feb		17-feb		6-mar		KR 8D ESTE 108 16 SUR	MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA GARZON
221	MVAL_02612	EJECUCION	26/01/2023		9-feb		7-feb		24-feb		6-mar		KR 8D ESTE 107A 31 SUR	JENNY YAZMIN TORRES NUVAN
222	MVAL_02625	EJECUCION	26/01/2023		14-feb		7-feb		20-feb		6-mar		KR 8F ESTE 107A 05 SUR MJ	MARIA ENERIETH CARMONA HIDALGO
223	MVAL_02630	EJECUCION	26/01/2023		14-feb		7-feb		22-feb		6-mar		KR 8F ESTE 107A 37 SUR	ADELA RUIZ GOMEZ
224	MVAL_02650	EJECUCION	26/01/2023		9-feb		7-feb		21-feb		6-mar		KR 8C ESTE 108 12 SUR	ANTONIO DIAZ SEPULVEDA
225	MVAL_02604	VALIDADA	26/01/2023		27-feb		7-feb				6-mar		KR 8C ESTE 107A 26 SUR	NARIA CRISTINA ARANGO CHAVEZ
226	MVAL_01749	EJECUCION	24/12/2022		24-ene		3-ene		9-feb		30-ene		CL 108 SUR 7A 22 ESTE	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME
227	MVAL_01764	EJECUCION	26/01/2023		6-feb		7-feb		17-feb		6-mar		KR 7C ESTE 107 09 SUR	SANDRA CAROLINA HOYOS LEGUIZAMON
228	MVAL_01783	EJECUCION	26/01/2023		6-feb		7-feb		20-feb		6-mar		KR 7C ESTE 105A 20 SUR	LUCRECIA GONZALEZ CHAVEZ
229	MVAL_01800	EJECUCION	26/01/2023		3-ene		7-feb		15-feb		6-mar		KR 7D ESTE 105A 56 SUR	GABRIEL AGUILAR RUBIANO
230	MVAL_01830	EJECUCION	26/01/2023		13-feb		7-feb		20-feb		6-mar		KR 7F ESTE 105A 33 SUR	GLADYS BAQUERO PARRA
231	MVAL_01846	EJECUCION	26/01/2023		8-feb		7-feb		20-feb		6-mar		KR 7F ESTE 105A 44 SUR	CELIAR GARZON CASTAÑEDA
232	MVAL_01852	ENTREGADA	26/01/2023		19-ene		7-feb		25-ene		6-mar	13-feb	KR 7F ESTE 105A 28 SUR	AMPARO NAVARRO GARCIA
233	MVAL_01860	ENTREGADA	26/01/2023		18-ene		7-feb		27-ene		6-mar	27-feb	CL 105A SUR 7F 15 ESTE	LUDIA MAGDALENA MORENO
234	MVAL_01864	ENTREGADA	26/01/2023		18-ene		7-feb		25-ene		6-mar	13-feb	KR 7G ESTE 105A 17 SUR MJ	LILIA RUIZ PEDRAZA
235	MVAL_01865	ENTREGADA	26/01/2023		18-ene		7-feb		27-ene		6-mar	20-feb	KR 7G ESTE 105A 23 SUR	BERNARDO FUENTES
236	MVAL_01871	ENTREGADA	26/01/2023		19-ene		7-feb		30-ene		6-mar	27-feb	KR 7G ESTE 105A 45 SUR	JOSE DAVID ROMERO VELASCO
237	MVAL_01882	EJECUCION	26/01/2023		23-ene		7-feb		3-feb		6-mar		KR 7H ESTE 106 54 SUR	CLARIVEL LOPEZ RODRIGUEZ
238	MVAL_01916	EJECUCION	26/01/2023		17-ene		7-feb		17-feb		6-mar		KR 8A ESTE 106 45 SUR	LUZ MARY VIRACACHA MORENO
239	MVAL_01923	EJECUCION	26/01/2023		1-feb		7-feb		21-feb		6-mar		KR 8 ESTE 106 32 SUR	ESTHER COCA
240	MVAL_01924	EJECUCION	26/01/2023		30-ene		7-feb		17-feb		6-mar		KR 8 ESTE 106 28 SUR MJ	DIANA MARCELA RUBIO DELGADO
241	MVAL_01976	EJECUCION	26/01/2023		3-feb		7-feb		17-feb		6-mar		KR 7I ESTE 107 60 SUR	AZUCENA LOZADA
242	MVAL_02019	EJECUCION	26/01/2023		23-ene		7-feb		20-feb		6-mar		KR 7H ESTE 107 38 SUR	JULIA CECILIA TORRES GUEVARA
243	MVAL_02021	ENTREGADA	26/01/2023		25-ene		7-feb		1-feb		6-mar	24-feb	KR 7H ESTE 107 34 SUR	ELSA MARINA AVILA RONDON
244	MVAL_02028	EJECUCION	26/01/2023		23-ene		7-feb		9-feb		6-mar		CL 107 SUR 7H 03 ESTE	JAVIER OSWALDO OCHOA SANCHEZ
245	MVAL_02119	EJECUCION	26/01/2023		3-feb		7-feb		20-feb		6-mar		KR 7D ESTE 107 38 SUR	AMINTA NAVARRO
246	MVAL_02137	ENTREGADA	26/01/2023		27-ene		7-feb		7-feb		6-mar	24-feb	KR 7F ESTE 107 43 SUR	HUMBERTO URIBE GUTIERREZ
247	MVAL_02141	EJECUCION	26/01/2023		13-feb		7-feb		22-feb		6-mar		KR 7F ESTE 107 59 SUR	TARGELIA CORTES BENAVIDES
248	MVAL_02179	ENTREGADA	24/12/2022		24-ene		3-ene		8-feb		30-ene	24-feb	CL 108 SUR 7 21 ESTE	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO
249	MVAL_02213	EJECUCION	24/12/2022		24-ene		3-ene		16-feb		30-ene		CL 108 SUR 7A 17 ESTE	ALICIA SEGURA GOMEZ
250	MVAL_02230	EJECUCION	24/12/2022		8-feb		3-ene		17-feb		30-ene		KR 7A BIS ESTE 108 40 SUR	CARLOS AUGUSTO MANCERA BAQUERO
251	MVAL_02281	EJECUCION	24/12/2022		2-feb		3-ene		17-feb		30-ene		KR 7C ESTE 108 49 SUR	WILSON PARAMERO TORRES
252	MVAL_02323	EJECUCION	24/12/2022		13-feb		3-ene		20-feb		30-ene		CL 109 SUR 7D 26 ESTE	MARIA NANCY ESTEBAN VARGAS
253	MVAL_02447	EJECUCION	26/01/2023		30-ene		7-feb		23-feb		6-mar		KR 8 ESTE 108 44 SUR MJ	OLIVIA MATIZ MATIZ
254	MVAL_02478	EJECUCION	26/01/2023	-21	5-ene		7-feb		21-feb		6-mar		KR 8A ESTE 108 44 SUR MJ 1	WILSON CARRILLO GARCIA

255	MVAL_03453	EJECUCION	9/02/2023		11-feb		21-feb		22-feb		10-mar		KR 9B ESTE 106 52 SUR	SARA GARCIA MACHUCA
256	MVAL_03459	VALIDADA	9/02/2023		13-feb		21-feb				10-mar		KR 9B ESTE 106 14 SUR	MARTHA LILIA CORREALES RUEDA
257	MVAL_03466	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		7-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 45 SUR	CLEMENCIA CASTELBLANCO PARADA
258	MVAL_03567	NO EJECUCIÓN											KR 10 ESTE 106 23 SUR	MARIA AIDE TRIANA LEON
259	MVAL_03572	EJECUCION	9/02/2023		7-feb		21-feb		20-feb		10-mar		KR 10 ESTE 106 55 SUR	ROSA ELVIRA ACEVEDO CUELLAR
260	MVAL_03660	VALIDADA	9/02/2023		11-feb		21-feb				10-mar		CL 107 SUR 10A 24 ESTE MJ	NATALIA CELIS ANACONA
261	MVAL_03666	VALIDADA	9/02/2023		11-feb		21-feb				10-mar		KR 10A ESTE 106 78 SUR	JOSE NEFTALI GOMEZ GONZALEZ
262	MVAL_01825	ENTREGADA	26/01/2023		1-feb		7-feb		15-feb		6-mar	27-feb	KR 7F ESTE 105A 17 SUR	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA
263	MVAL_01831	EJECUCION	26/01/2023		13-feb		7-feb		17-feb		6-mar		KR 7F ESTE 105A 37 SUR	OSCAR ORLANDO LOPEZ
264	MVAL_01928	EJECUCION	26/01/2023		1-feb		7-feb		17-feb		6-mar		KR 8 ESTE 106 08 SUR	FABIAN AUGUSTO CALDERON CALDERON
265	MVAL_02101	ENTREGADA	26/01/2023		19-ene		7-feb		27-ene		6-mar	20-feb	CL 107 SUR 7F 25 ESTE	JOSE ELIECER OSPINA MENDOZA
266	MVAL_02134	EJECUCION	26/01/2023		3-feb		7-feb		15-feb		6-mar		KR 7F ESTE 107 27 SUR	MIGUELINA CORDOBA CORDOBA
267	MVAL_02136	ENTREGADA	26/01/2023		27-ene		7-feb		7-feb		6-mar	27-feb	KR 7F ESTE 107 39 SUR	ENELIZAR GUERRERO PEÑA
268	MVAL_02193	EJECUCION	24/12/2022		27-ene		3-ene		16-feb		30-ene		CL 108 SUR 7 53 ESTE	MERCEDES PINEDA
269	MVAL_02198	EJECUCION	24/12/2022		24-ene		3-ene		22-feb		30-ene		KR 7A ESTE 108 33 SUR	GUSTAVO INOCENCIO BELTRAN
270	MVAL_02235	EJECUCION	24/12/2022		27-ene		3-ene		22-feb		30-ene		KR 7A BIS ESTE 108 16 SUR	MARIA ANTONIA VASQUEZ MEDINA
271	MVAL_02243	EJECUCION	24/12/2022		27-ene		3-ene		16-feb		30-ene		KR 7B ESTE 108 25 SUR	MARTHA ESPERANZA CASTRO GOMEZ
272	MVAL_02267	EJECUCION	24/12/2022		2-feb		3-ene		17-feb		30-ene		KR 7B ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA
273	MVAL_02269	EJECUCION	24/12/2022		2-feb		3-ene		17-feb		30-ene		CL 108 SUR 7B 09 ESTE MJ 1	JOSE MANUEL BOGOTA MORENO
274	MVAL_02296	EJECUCION	24/12/2022		8-feb		3-ene		20-feb		30-ene		KR 7C ESTE 108 44 SUR	MARIA ABDONA AVILA
275	MVAL_02302	EJECUCION	24/12/2022		8-feb		3-ene		20-feb		30-ene		KR 7C ESTE 108 24 SUR	LIZETH STHEFANY TORRES HERNANDEZ
276	MVAL_02321	EJECUCION	24/12/2022		9-feb		3-ene		20-feb		30-ene		KR 7D ESTE 108 57 SUR	EMILCEN GUARNIZO CRUZ
277	MVAL_02407	EJECUCION	26/01/2023	-21	5-ene		7-feb		16-feb		6-mar		KR 7I ESTE 108 59 SUR	FABIO HERNAN UYAZA BELTRAN
278	MVAL_02424	EJECUCION	26/01/2023		25-ene		7-feb		7-feb		6-mar		KR 7I ESTE 108 32 SUR	MARIA NELLY GUERRERO MATUTE
279	MVAL_02453	EJECUCION	26/01/2023		30-ene		7-feb		17-feb		6-mar		KR 8 ESTE 108 18 SUR	MERY PARRA CASTELLANOS
280	MVAL_03442	VALIDADA	26/01/2023		13-feb		7-feb				6-mar		CL 106 SUR 9A 03 ESTE	RAUL RODRIGUEZ QUIMBAYO
281	MVAL_03443	EJECUCION	26/01/2023		13-feb		7-feb		21-feb		6-mar		CL 106 SUR 9A 07 ESTE	JAIRO GALLEGO VALENCIA
282	MVAL_03458	VALIDADA	9/02/2023		13-feb		21-feb				10-mar		KR 9B ESTE 106 24 SUR	NEILA GUTIERREZ PATARROYO
283	MVAL_03464	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		20-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 33 SUR	MARIA NOELIA LOPEZ DE QUINTERO
284	MVAL_03470	EJECUCION	9/02/2023		30-ene		21-feb		22-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 79 SUR	JOSE REINALDO GARZON JIMENEZ
285	MVAL_03556	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		9-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 44 SUR	VIRGELINA RAMIREZ LEON
286	MVAL_03557	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		20-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 32 SUR	ENERIET PULIDO TABARES
287	MVAL_03559	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		21-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 26 SUR	CRISTO JESUS PANQUEBA
288	MVAL_03569	EJECUCION	9/02/2023		7-feb		21-feb		20-feb		10-mar		KR 10 ESTE 106 41 SUR	JOSE YUBER CHACON
289	MVAL_03589	EJECUCION	9/02/2023		30-ene		21-feb		27-feb		10-mar		KR 10 ESTE 106 36 SUR	ORLANDO DE JESUS MOLINA HERRERA
290	MVAL_03594	VALIDADA	9/02/2023		11-feb		21-feb				10-mar		KR 10 A ESTE 106 29 SUR	YOLANDA GARCIA
291	MVAL_03604	EJECUCION	9/02/2023		7-feb		21-feb		22-feb		10-mar		KR 10A ESTE 106 77 SUR	GABRIELA NAIDENAMA FARIYAÑO
292	MVAL_02348	EJECUCION	24/12/2022		9-feb		3-ene		20-feb		30-ene		KR 7F ESTE 108 57 SUR MJ 1	RUTH ELIZABETH DIAZ SALCEDO
293	MVAL_03461	EJECUCION	9/02/2023		9-feb		21-feb		20-feb		10-mar		CL 106 SUR 9B 07 ESTE	GERONIMO SANTOS POBLADOR BELTRAN
294	MVAL_03467	EJECUCION	9/02/2023		26-ene		21-feb		7-feb		10-mar		KR 9C ESTE 106 51 SUR	FAVIO ALFREDO GARCIA OSPINA
295	MVAL_03607	VALIDADA	9/02/2023		11-feb		21-feb				10-mar		KR 10A ESTE 106 91 SUR	JENNY KATERINE ESPITIA RODRIGUEZ
296	MVAL_02233	EJECUCION	24/12/2022		27-ene		3-ene		22-feb		30-ene		KR 7A BIS ESTE 108 26 SUR	LUIS ALBERTO VELASCO HERNANDEZ
297	MVJ_00838	VALIDADA	8/02/2023		8-feb									LUCRECIA CHACON ALGARZA

NUMERO BENEFICIARIOS ENTREGADAS HABITAT	NUMERO VIVIENDAS VALIDADAS	NUMERO DE VIVENDAS POR VALIDAR	NUMERO VIVIENDAS EN EJECUCION	NUMERO DE VIVIENDAS POR INICIAR OBRAS	NUMERO VIVIENDAS ENTREGADAS	NUMERO VIVIENDAS POR ENTREGAR	NUMERO DE VIVIENDAS FACTURADA	NUMERO DE VIVIENDAS REMPLAZADAS	CASOS ESPECIALES RENUNCIAS
296	289	1	112	17	161	129	102	6	6

Fecha: 28 de febrero 2023	**Periodo:** Del 1 al 28 de febrero del 2023	**Informe No.:** Mensual No. 006
Proyecto: CONTRATO 1010 de 2022 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 1010 del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE		LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	993 del 2022
OBJETO	“CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.”
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ
PLAZO	4 meses
FECHA DE INICIO	1 de septiembre del 2022
	Adición de prorroga No 1
FECHA FINAL	15 de marzo del 2023
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	XIMENA SANTANA

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por la interventoría, entre el periodo del 1 al del 1 al 28 de febrero del 2023 como cumplimiento a las acciones de seguimiento en la ejecución por cada grupo de obra al contrato 993 de 2022 del Grupo Empresarial Pinzón Muñoz.

De esta forma y teniendo en cuenta las actividades de inicio propuestas por la fase de validación del anexo técnico, se dio cumplimiento al mismo, proporcionando espacios de participación y aprobación comunitaria por parte del contratista, interventoría y Secretaria Distrital de Hábitat – SDHT a la comunidad de los territorios priorizados.

OBJETIVO

Presentar las actividades ejecutadas por el Componente Social en el periodo del 1 al 28 de febrero del 2023 en cumplimiento a la planeación y a la fase de validación, apertura, ejecución y entrega de obra del contrato.

METODOLOGÍA

Para la ejecución de las actividades propuestas en el anexo técnico en esta fase se implementó la metodología de visitas de campo

Visita de campo: Se realizaron visitas de campo del grupo 3, al sector priorizado de la Localidad de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de tener acercamiento a los ciudadanos donde se socializaron aspectos generales del proyecto mejoramiento de vivienda.

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA:

a. Durante el mes reportado se realizaron los seguimientos de las viviendas que se encuentran en obras de mejoramiento de vivienda para hacer acompañamiento y vigilancia al proceso que se lleva a cabo en cada vivienda. Estas visitas de seguimiento permitieron evidenciar las siguientes situaciones:

b. Algunos atrasos en las programaciones se relacionan con la distribución oportuna de los materiales para la realización de actividades. Otra de las causas que se evidenció es la designación de personal de obra que en algunas ocasiones no realizan las actividades bajo las especificaciones técnicas determinadas por los residentes de obra ni tomando en cuenta los criterios de calidad a los que se debe dar cumplimiento. También se han evidenciado comportamientos inadecuados del personal de obra hacia los residentes de interventoría, ocasionando dificultad y atraso en el desarrollo de los mejoramientos.

c. Se realizó el seguimiento respectivo al caso especial MVAL_03567 MARIA AIDE TRIANA LEON, en este mismo orden se dio entrega de informe social y técnico de interventoría para evidenciar el proceso que se llevó a cabo frente a este caso. Al realizar la visita de validación de la vivienda se dio evidencia del actual y real estado en que se encontraba la vivienda, muy diferente de la estructuración de la vivienda que fue entregada por la entidad. las dificultades constructivas y estructurales de la vivienda dieron lugar a la solicitud del acompañamiento de SDHT para determinar el proceso de la vivienda. La beneficiaria es adulto mayor quien vive con su hijo actualmente por encontrarse en una situación socio económica altamente vulnerable. Se realizaron varias visitas con la SDHT al predio, una de ellas con el equipo de estructuración y se determinó que por el estado actual de la vivienda no se podrían llevar a cabo actividades de mejoramiento de vivienda y se establecería referenciación del caso a IDIGER y activar redes sociales de apoyo para la beneficiaria.
d. Se realizaron los respectivos seguimientos a las viviendas que se encuentran en ejecución, estas visitas se realizaron de manera constante para verificación de los avances de las labores constructivas, así como los controles referentes a la calidad de la ejecución. De esta manera se logra un acercamiento directo con los beneficiarios que permitió mitigar a tiempo cualquiera de las situaciones de inconsistencias en la ejecución y diferentes situaciones de dificultad que fueron intervenidas oportunamente por los profesionales sociales de interventoría y de contratista.
e. Se realizaron las respectivas jornadas de atención en PAC con el acompañamiento de interventoría.
f. Se realizó la solicitud referente a la ejecución que se lleva a cabo en el MVAL_03467 FABIO ALFREDO GARCIA OSPINA: La dirección y datos de la beneficiaria se encuentran en proceso de actualización en la base de datos, se solicitó a contratista revisar esta actualización de datos. La ejecución de las actividades en la vivienda ha presentado dificultades que han afectado de manera negativa al grupo familiar. A pesar de las solicitudes que se han realizado, los trabajadores asignados para las labores constructivas han presentado comportamientos groseros con los beneficiarios del hogar y conductas inapropiadas como lo es el consumo spa, dentro de la vivienda y en sus alrededores, causando además atrasos en la ejecución. En la vivienda se priorizó el cambio de cubierta, y la instalación presenta inconsistencias que han perjudicado a los beneficiarios del hogar, referente a filtraciones de agua lluvia y tejas mal amarradas que se sacuden todo el tiempo, además la instalación de cielo raso también presenta inconsistencias. Se solicitó por oficio al contratista subsanar estas dificultades presentadas y la afectación que ha tenido sobre el grupo familiar

ACTIVIDADES EN LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR:

g. Durante el periodo reportado se realizaron las visitas de seguimiento a las viviendas priorizadas referentes al grupo de IDU en la localidad de ciudad bolívar. Estos casos especiales recibieron el acompañamiento de SDHT para vigilancia constante de la ejecución de las obras. Desafortunadamente se presentaron diferentes dificultades para desarrollo de estos casos. La entrega de materiales no era puntual y generalmente no se entregaba completa de esta manera el personal no tenía posibilidad de avanzar constructivamente, a esto se suma que las condiciones laborales de estos trabajadores ocasionan inconformidad y esto influía en la ejecución de actividades de manera negativa, afectando además a los beneficiarios quienes no deben verse afectados por estas circunstancias.

Se suma también que las actividades realizadas no cumplen con la calidad y exigencia que se debe tener en el proyecto, se ocasionaron reprocesos y atrasos en las actividades. Estos seguimientos tenían el acompañamiento de la SDHT evidenciando ante ellos que la logística del contratista no tiene efectividad y causa una mala percepción del trabajo que los profesionales y residentes del proyecto. Por interventoría se han entregado los informes técnicos y sociales de las diferentes visitas y seguimientos realizados, así como las solicitudes al contratista para solución de estas dificultades y para actividades de subsanación.

h. Se realizaron los respectivos seguimientos a las viviendas que se encuentran en ejecución, estas visitas se realizaron de manera constante para verificación de los avances de las labores constructivas, así como los controles referentes a la calidad de la ejecución. De esta manera se logra un acercamiento directo con los beneficiarios que permitió mitigar a tiempo cualquiera de las situaciones de inconsistencias en la ejecución y diferentes situaciones de dificultad que fueron intervenidas oportunamente por los profesionales sociales de interventoría y de contratista.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el mes en mención del año en curso, se efectuó la primera actividad de acompañamiento y verificación por parte de la interventoría, en donde se realizó la división por cuatro grupos de profesionales, tanto técnicos y sociales en ocasiones el acompañamiento de las profesionales SST.

En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de los dos consorcios, se procede a realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la documentación de la persona a la cual se le otorga el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VALIDACIONES						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_01825	KR 7F ESTE 105A 17 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	1/02/2023	
2	MVAL_01928	KR 8 ESTE 106 08 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	FABIAN AUGUSTO CALDERON CALDERON	1/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por la esposa del beneficiario, quienremite autorización
3	MVAL_01923	KR 8 ESTE 106 32 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ESTHER COCA	1/02/2023	
4	MVAL_02269	CL 108 SUR 7B09 ESTE MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE MANUEL BOGOTA MORENO	2/02/2023	
5	MVAL_02267	KR 7B ESTE 108 14 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA	2/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por el esposo de la beneficiaria, quien remite autorización
6	MVAL_02281	KR 7C ESTE 108 49 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	WILSON PARAMERO TORRES	2/02/2023	
7	MVAL_02134	KR 7F ESTE 107 27 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MIGUELINA CORDOBACORDOBA	3/02/2023	
8	MVAL_02119	KR 7D ESTE 107 38 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	AMINTA NAVARRO	3/02/2023	
9	MVAL_01800	KR 7D ESTE 105A 56 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GABRIEL AGUILAR RUBIANO	3/02/2023	
10			BARRIO PUERTA AL LLANO			

	MVAL_01976	KR 7I ESTE 10760 SUR	SECTOR 1	AZUCENA LOZADA	3/02/2023	
11	MVAL_01764	KR 7C ESTE 107 09 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	SANDRA CAROLINA HOYOS LEGUIZAMON	6/02/2023	
12	MVAL_01783	KR 7C ESTE 105A 20 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUCRECIA GONZALEZCHAVEZ	6/02/2023	
13	MVAL_02687	KR 8C ESTE 108 51 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	MARINA PAVA	6/02/2023	
14	MVAL_02594	CL 108 SUR 8B08 ESTE	PUERTA AL LLANOII SECTOR	WILSON AGUIRRE	6/02/2023	
15	MVAL_02595	KR 8C ESTE 107A 47 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	MARIA ESNEDA HENAO	6/02/2023	
16	MVAL_02596	KR 8C ESTE 107A 41 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ANA GRACIELA BAQUERO SUCUNCHOQUE	6/02/2023	
17	MVAL_02655	KR 8D ESTE 108 21 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ISABEL GALEANO GARCIA	7/02/2023	
18	MVAL_02639	KR 8D ESTE 108 16 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA GARZON	7/02/2023	
19	MVAL_02621	KR 8D ESTE 107A 24 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	BETSABE GONZALEZ VARGAS	7/02/2023	
20	MVAL_03569	KR 10 ESTE 106 41 SUR	EL REFUGIO I Y II	JOSE YUBER CHACON	7/02/2023	
21	MVAL_03572	KR 10 ESTE 106 55 SUR	EL REFUGIO I Y II	ROSA ELVIRA ACEVEDO CUELLAR	7/02/2023	
22	MVAL_03604	KR 10A ESTE 106 77 SUR	EL REFUGIO I Y II	GABRIELA NAIDENA MA FARIYAÑO	7/02/2023	
23	MVAL_02230	KR 7A BIS ESTE 108 40 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CARLOS AUGUSTO MANCERA BAQUERO	8/02/2023	
24	MVAL_02302	KR 7C ESTE 108 24 SUR	ARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR1	LIZETH STHEFANY TORRES HERNANDEZ	8/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por la progenitora de la beneficiaria, quien remite autorización
25	MVAL_02296	KR 7C ESTE 108 44 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR	MARIA ABDONA AVILA	8/02/2023	

			1			
26	MVAL_01846	KR 7F ESTE 105A 44 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CELIAR GARZON CASTAÑEDA	8/02/2023	
27	MVJ_00838	KR47B 73C 47 SUR	JERUSALEN	LUCRECIA CHACON	8/02/2023	
28	MVAL_02321	KR 7D ESTE 108 57 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	EMILCEN GUARNIZO CRUZ	9/02/2023	
29	MVAL_02348	KR 7F ESTE 108 57 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	RUTH ELIZABETH DIAZSALCEDO	9/02/2023	
30	MVAL_02612	KR 8D ESTE 107A 31 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	JENNY YAZMIN TORRES NUVAN	9/02/2023	
31	MVAL_02650	KR 8C ESTE 108 12 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ANTONIO DIAZ SEPULVEDA	9/02/2023	
32	MVAL_02657	KR 8D ESTE 108 35 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ZORAIDA YASMIN MORENO ARIAS	9/02/2023	
33	MVAL_03461	CL 106 SUR 9B07 ESTE	EL REFUGIO I Y II	GERONIMO SANTOS POBLADOR BELTRAN	9/02/2023	
34	MVAL_03453	KR 9B ESTE 106 52 SUR	EL REFUGIO I Y II	SARA GARCIA MACHUCA	11/02/2023	
35	MVAL_03594	KR 10 A ESTE 106 29 SUR	EL REFUGIO I Y II	YOLANDA GARCIA	11/02/2023	
36	MVAL_03607	KR 10A ESTE 106 91 SUR	EL REFUGIO I Y II	JENNY KATERINE ESPITIA RODRIGUEZ	11/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por una amiga de la beneficiaria, quienremite autorización
37	MVAL_03666	KR 10A ESTE 106 78 SUR	EL REFUGIO I Y II	JOSE NEFTALI GOMEZGONZALEZ	11/02/2023	Validación efectiva,visita recibida por la hija del beneficiario,
38	MVAL_03660	CL 107 SUR 10A 24 ESTE MJ	EL REFUGIO I Y II	NATALIA CELIS ANACONA	11/02/2023	
39	MVAL_02323	CL 109 SUR 7D26 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA NANCY ESTEBAN VARGAS	13/02/2023	
40	MVAL_02141	KR 7F ESTE 107 59 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	TARGELIA CORTES BENAVIDES	13/02/2023	
41	MVAL_01831	KR 7F ESTE 105A 37 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	OSCAR ORLANDO LOPEZ	13/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por la conyugue del beneficiario quien remite autorización

42	MVAL_01830	KR 7F ESTE 105A 33 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GLADYS BAQUERO PARRA	13/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por el hijo de la beneficiaria quien remiteautorización
43	MVAL_03442	CL 106 SUR 9A03 ESTE	EL REFUGIO I Y II	RAUL RODRIGUEZ QUIMBAYO	13/02/2023	
44	MVAL_03443	CL 106 SUR 9A07 ESTE	EL REFUGIO I Y II	JAIRO GALLEGO VALENCIA	13/02/2023	
45	MVAL_03458	KR 9B ESTE 106 24 SUR	EL REFUGIO I Y II	NEILA GUTIERREZ PATARROYO	13/02/2023	
46	MVAL_03459	KR 9B ESTE 106 14 SUR	EL REFUGIO I Y II	MARTHA LILIA CORREALES RUEDA	13/02/2023	
47	MVAL_02609	KR 8D ESTE 107A 11 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	RICARDINA MANQUILLOGUEVARA	14/02/2023	
48	MVAL_02622	KR 8D ESTE 107A 18 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	HAROLD CARDOZO CARDOZO	14/02/2023	
49	MVAL_02625	KR 8F ESTE 107A 05 SUR MJ	PUERTA AL LLANOII SECTOR	MARIA ENERIETH CARMONA HIDALGO	14/02/2023	
50	MVAL_02630	KR 8F ESTE 107A 37 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ADELA RUIZ GOMEZ	14/02/2023	
51	MVAL_02604	KR 8C ESTE 107A 26 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	NARIA CRISTINA ARANGO CHAVEZ	27/02/2023	Validación efectiva, visita recibida por el hijo de la beneficiaria quien remite autorización

APERTURAS

Durante el periodo se realizó el inicio de las aperturas, en un primer momento, se procede a saludar , presentar a los profesionales, y mencionar el objetivo del encuentro; luego se procede a ingresar a la vivienda, seguidamente se procede a realizar socialización de carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social de inicio de obra, presupuesto de inicio, se brindan recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de la obra, el movimiento de enseres es responsabilidad del beneficiario y su grupo familiar, no se realizan intervenciones en conexiones de agua, luz o gas.
Se recuerda que el beneficiario es quien se compromete a generar espacio para almacenamiento de materiales y disposición de escombros dependiendo las condiciones del predio., se socializa la carta del trato digno. Finalmente se resuelven dudas e inquietudes del beneficiario (a). Se procede a solicitar al beneficiario las firmas en cada uno de los documentos socializados con anterioridad. Procede a firmar los profesionales del contratista e interventoría-

APERTURAS						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_02021	KR 7H ESTE 10734 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ELSA MARINA AVILA RONDON	1/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hija de labeneficiaria quien remite autorización
2	MVJ_0072	DG 69F SUR 4870	JERUSALEN	ANGELICA GIRALDO MURILLO	2/02/2023	
3	MVJ_0103	KR 47 69 B 39 SUR	JERUSALEN	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS		

					2/02/2023	
4	MVJ_0115	KR 48 69B 16 SUR MJ 2	JERUSALEN	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARCIA	2/02/2023	
5	MVJ_0116	CL 69B SUR 4731 MJ 3	JERUSALEN	GLADYS INES BASTOS	2/02/2023	
6	MVPA_1909	KR 27K 71D 58SUR	EL PARAISO	JAIME MURILLO ROJAS	2/02/2023	
7	MVPA_973	CL 71H BIS SUR27L 75	EL PARAISO	MARIA JACQUELINE GUEVARA ORDUÑA	2/02/2023	
8	MVPA_144	CL 71K SUR 27K22	EL PARAISO	JOSE MARTIN DIAZ	2/02/2023	
9	MVPA_0529	KR 27K 71K 26SUR	EL PARAISO	AURA MARIA SEPULVEDA CORONADO	2/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hija de labeneficiaria quien remite autorización
10	MVJ_0121	CL 82B SUR 46A18	JERUSALEN	RODRIGO JIMENEZ SAENZ	3/02/2023	
11	MVJ_0123	KR 45B 82C 09SUR	JERUSALEN	MARIA ALCIRANUÑEZ	3/02/2023	
12	MVJ_0142	CL 82 SUR 44A49 MJ 1	JERUSALEN	ABEL MATEUS RUIZ	3/02/2023	
13	MVJ_0133	CL 80A SUR 44A12	JERUSALEN	HERMENCIA GACHA CALLEJAS	3/02/2023	
14	MV_42881IDU	CL 63 SUR 18N14	ALTOS DEJALISCO	LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ	3/02/2023	
15	MVAL_01882	KR 7H ESTE 10654 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CLARIVEL LOPEZ RODRIGUEZ	3/02/2023	
16	MVAL_02137	KR 7F ESTE 10743 SUR	BARRIO PUERTA ALLLANO SECTOR 1	HUMBERTO URIBE GUTIERREZ	7/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Conyugue del Beneficiario quienremite autorización
17	MVAL_02136	KR 7F ESTE 10739 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ENELIZAR GUERRERO PEÑA	7/02/2023	
18	MVAL_02424	KR 7I ESTE 10832 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA NELLY GUERRERO MATUTE	7/02/2023	

19	MVAL_03466	KR 9C ESTE 10645 SUR	EL REFUGIO IY II	CLEMENCIA CASTELBLANCO PARADA	7/02/2023	
20	MVAL_03467	KR 9C ESTE 10651 SUR	EL REFUGIO IY II	FAVIO ALFREDO GARCIA OSPINA	7/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Progenitora del Beneficiario quienremite autorización
21	MVAL_02179	CL 108 SUR 7 21ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	8/02/2023	
22	MVJ_0124	KR 45 80B 21 SUR	JERUSALEN	EFREN PRIETO MATIZ	8/02/2023	
23	MVAL_01749	CL 108 SUR 7A22 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	9/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hija de la beneficiaria quienremite autorización
24	MVAL_02028	CL 107 SUR 7H03 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JAVIER OSWALDO OCHOA SANCHEZ	9/02/2023	
25	MVAL_02594	CL 108 SUR 8B08 ESTE	PUERTA ALLLANO II SECTOR	WILSON AGUIRRE	9/02/2023	
26	MVAL_03556	KR 9C ESTE 10644 SUR	EL REFUGIO IY II	VIRGELINA RAMIREZ LEON	9/02/2023	
27	MVPA_0502	CLL 71P SUR 27J10	EL PARAISO	JOSE FERLEIN AMADO BERNAL	13/02/2023	Apertura efectiva, visita recibida por la hermanadel beneficiario quien remite autorización
28	MVJ_0044	KR 44B 78 24 SUR	JERUSALEN	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ	14/02/2023	
29	MVJ_0024	KR 45 75A 55 SUR	JERUSALEN	MIRYAM CRUZ ARIZA	14/02/2023	
30	MVJ_0013	KR 46A 76 35 SUR	JERUSALEN	MARIO EDGAR DIAZ MORENO	14/02/2023	
31	MVJ_0003	KR 48 73B 09 SUR	JERUSALEN	GLORIA YAMIL LEON PATIÑO	14/02/2023	
32	MVAL_02134	KR 7F ESTE 10727 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MIGUELINA CORDOBACORDOBA	15/02/2023	
33	MVAL_01800	KR 7D ESTE 105A 56 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GABRIEL AGUILAR RUBIANO	15/02/2023	

34	MVAL_01825	KR 7F ESTE 105A 17 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	15/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Conyugue del Beneficiario quien remite autorización
35	MVAL_02193	CL 108 SUR 7 53ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MERCEDES PINEDA	16/02/2023	
36	MVAL_02213	CL 108 SUR 7A17 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ALICIA SEGURA GOMEZ	16/02/2023	
37	MVAL_02243	KR 7B ESTE 10825 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARTHA ESPERANZA CASTRO GOMEZ	16/02/2023	
38	MVAL_02407	KR 7I ESTE 10859 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	FABIO HERNAN UYAZA BELTRAN	16/02/2023	
39	MVJ_137	CL 78 SUR 43 05	JERUSALEN	MARIA HERMENCIA PAEZ DE JIMENEZ	17/02/2023	
40	MVJ_0032	CL 78 SUR 44B24	JERUSALEN	MARGARITA HELENA BARON RODRIGUEZ	17/02/2023	
41	MVJ_0127	KR 44 77 22 SUR	JERUSALEN	EMILCE ALARCON DELGADO	17/02/2023	
42	MVJ_0120	KR 44 76 39 SUR	JERUSALEN	HENRY VARGAS BARRETO	17/02/2023	Apertura efectiva, visita recibida por la hermanadel beneficiario quien remite autorización
43	MVAL_02230	KR 7A BIS ESTE108 40 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CARLOS AUGUSTO MANCERA BAQUERO	17/02/2023	
44	MVAL_02269	CL 108 SUR 7B09 ESTE MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE MANUEL BOGOTA MORENO	17/02/2023	
45	MVAL_02267	KR 7B ESTE 10814 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA	17/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por el Conyugue del beneficiario quien remite autorización
46	MVAL_02281	KR 7C ESTE 10849 SUR	BARRIO PUERTA AL	WILSON PARAMERO TORRES	17/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Conyugue de la beneficiaria quienremite autorización

47	MVAL_01764	KR 7C ESTE 10709 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	SANDRA CAROLINA HOYOS LEGUIZAMON	17/02/2023	
48	MVAL_01831	KR 7F ESTE 105A 37 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	OSCAR ORLANDO LOPEZ	17/02/2023	
49	MVAL_01976	KR 7I ESTE 10760 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	AZUCENA LOZADA	17/02/2023	
50	MVAL_01928	KR 8 ESTE 106 08 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	FABIAN AUGUSTO CALDERON CALDERON	17/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Conyugue del Beneficiario quien remite autorización
51	MVAL_01924	KR 8 ESTE 106 28 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	DIANA MARCELA RUBIO DELGADO	17/02/2023	
52	MVAL_01916	KR 8A ESTE 10645 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUZ MARY VIRACACHA MORENO	17/02/2023	
53	MVAL_02453	KR 8 ESTE 108 18 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MERY PARRA CASTELLANOS	17/02/2023	
54	MVAL_02595	KR 8C ESTE 107A 47 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	MARIA ESNEDA HENAO	17/02/2023	
55	MVAL_02639	KR 8D ESTE 10816 SUR	PUERTA AL LLANO IISECTOR	MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA GARZON	17/02/2023	
56	MVAL_02302	KR 7C ESTE 10824 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LIZETH STHEFANY TORRES HERNANDEZ	20/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por autorizada de la beneficiaria quien remite documentación
57	MVAL_02296	KR 7C ESTE 10844 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA ABDONAAVILA	20/02/2023	
58	MVAL_02321	KR 7D ESTE 10857 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	EMILCEN GUARNIZO CRUZ	20/02/2023	
59		KR 7F ESTE	BARRIO PUERTA ALLLANO SECTOR 1	RUTH ELIZABETH DIAZ		

	MVAL_02348	10857 SUR MJ 1		SALCEDO	20/02/2023	
60	MVAL_02323	CL 109 SUR 7D26 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA NANCY ESTEBAN VARGAS	20/02/2023	
61	MVAL_02119	KR 7D ESTE 10738 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	AMINTA NAVARRO	20/02/2023	
62	MVAL_01783	KR 7C ESTE 105A 20 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUCRECIA GONZALEZ CHAVEZ	20/02/2023	
63	MVAL_01830	KR 7F ESTE 105A 33 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GLADYS BAQUERO PARRA	20/02/2023	
64	MVAL_01846	KR 7F ESTE 105A 44 SUR	BARRIO PUERTA ALLLANO SECTOR 1	CELIAR GARZON CASTAÑEDA	20/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la Conyugue del Beneficiario quienremite autorización
65	MVAL_02019	KR 7H ESTE 10738 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JULIA CECILIA TORRES GUEVARA	20/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por autorizada de la beneficiaria quien remite documentación
66	MVAL_02687	KR 8C ESTE 10851 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	MARINA PAVA	20/02/2023	
67	MVAL_02625	KR 8F ESTE 107A 05 SUR MJ	PUERTA AL LLANO IISECTOR	MARIA ENERIETH CARMONA HIDALGO	20/02/2023	
68	MVAL_03461	CL 106 SUR 9B07 ESTE	EL REFUGIO IY II	GERONIMO SANTOS POBLADOR BELTRAN	20/02/2023	
69	MVAL_03464	KR 9C ESTE 10633 SUR	EL REFUGIO IY II	MARIA NOELIA LOPEZ DE QUINTERO	20/02/2023	
70	MVAL_03557	KR 9C ESTE 10632 SUR	EL REFUGIO IY II	ENERIET PULIDO TABARES	20/02/2023	
71	MVAL_03569	KR 10 ESTE 106 41 SUR	EL REFUGIO IY II	JOSE YUBER CHACON	20/02/2023	
72	MVAL_03572	KR 10 ESTE 106 55 SUR	EL REFUGIO IY II	ROSA ELVIRA ACEVEDO CUELLAR	20/02/2023	
73	MVAL_02650	KR 8C ESTE 10812 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ANTONIO DIAZ SEPULVEDA	21/02/2023	

74	MVAL_01923	KR 8 ESTE 106 32 SUR	BARRIO PUERTA ALLLANO SECTOR 1	ESTHER COCA	21/02/2023	
75	MVAL_02478	KR 8A ESTE 10844 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	WILSON CARRILLO GARCIA	21/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hermanadel beneficiario quien remite autorización
76	MVAL_02596	KR 8C ESTE 107A 41 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ANA GRACIELA BAQUERO SUCUNCHOQUE	21/02/2023	
77	MVAL_03443	CL 106 SUR 9A07 ESTE	EL REFUGIO IY II	JAIRO GALLEGO VALENCIA	21/02/2023	
78	MVAL_03559	KR 9C ESTE 10626 SUR	EL REFUGIO IY II	CRISTO JESUS PANQUEBA	21/02/2023	
79	MVJ_0019	TV 47A 76A 34SUR	JERUSALEN	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ	21/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por el hijo de labeneficiaria quienremite autorización
80	MVJ_0132	KR 42 80B 13 SUR	JERUSALEN	GLORIA YANET RODRIGUEZ RAYO	21/02/2023	
81	MVJ_0139	CL 80B SUR 4024 MJ	JERUSALEN	WENDY MICHEL CUASTUMAL	21/02/2023	
82	MVJ_0141	KR 39 79A 62 SUR	JERUSALEN	MARIA SERGINA AGUIRRE TORO	21/02/2023	
83	MVJ_0128	TV 44A 78A 87SUR	JERUSALEN	RAFAEL PINZON SANCHEZ	21/02/2023	
84	MVJ_0131	CL 79B SUR 4244	JERUSALEN	ANA DELINA BAUTISTA POVEDA	21/02/2023	
85	MVJ_0050	KR 44A BIS 79 10 SUR	JERUSALEN	LILIANA MARIA RODRIGUEZ DURAN	21/02/2023	
86	MVJ_0036	KR 44B 77 43 SUR	JERUSALEN	CLARA ROCIO RODRIGUEZ AGUDELO	21/02/2023	
87	MVJ_0102	CL 77 SUR 44 03 MJ	JERUSALEN	LUZ MARINA ESPITIA SALAZAR	21/02/2023	
88	MVJ_0138	KR 41 76 76 SUR	JERUSALEN	MIRIAM LOAIZA CHICO	21/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por el hijo de labeneficiaria quien remite autorización
89	MVJ_0110	KR 40 76 47 SUR	JERUSALEN	HURDIS CARTAGENA HERNANDEZ	21/02/2023	
90	MVAL_02198	KR 7A ESTE 10833 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GUSTAVO INOCENCIO BELTRAN	22/02/2023	

91	MVAL_02235	KR 7A BIS ESTE108 16 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA ANTONIA VASQUEZ MEDINA	22/02/2023	
92	MVAL_02233	KR 7A BIS ESTE108 26 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUIS ALBERTO VELASCO HERNANDEZ	22/02/2023	
93	MVAL_02141	KR 7F ESTE 10759 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	TARGELIA CORTES BENAVIDES	22/02/2023	
94	MVAL_02630	KR 8F ESTE 107A 37 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ADELA RUIZ GOMEZ	22/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hermanade la beneficiaria quien remite autorización
95	MVAL_03453	KR 9B ESTE 10652 SUR	EL REFUGIO IY II	SARA GARCIA MACHUCA	22/02/2023	
96	MVAL_03470	KR 9C ESTE 10679 SUR	EL REFUGIO IY II	JOSE REINALDO GARZON JIMENEZ	22/02/2023	
97	MVAL_03604	KR 10A ESTE 106 77 SUR	EL REFUGIO IY II	GABRIEL A NAIDENA MA FARIYAÑO	22/02/2023	
98	MVPA_142	CL 71K SUR 27K16	EL PARAISO	OLGA LUCIA BENITEZ FLORIAN	23/02/2023	Apertura efectiva, visita recibida por el hijo del beneficiario quien remite autorización
99	MVAL_02447	KR 8 ESTE 108 44 SUR MJ	BARRIO PUERTA ALLLANO SECTOR 1	OLIVIA MATIZ MATIZ	23/02/2023	Ninguna
100	MVAL_02657	KR 8D ESTE 10835 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ZORAIDA YASMIN MORENO ARIAS	23/02/2023	Ninguna
101	MVAL_02609	KR 8D ESTE 107A 11 SUR	PUERTA ALLLANO II SECTOR	RICARDINA MANQUILLOGUEVARA	24/02/2023	Ninguna
102	MVAL_02612	KR 8D ESTE 107A 31 SUR	PUERTA ALLLANO II SECTOR	JENNY YAZMIN TORRES NUVAN	24/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por el Conyugue de la Beneficiaria quienremite autorización
103	MVAL_02655	KR 8D ESTE 10821 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ISABEL GALEANO GARCIA	27/02/2023	Ninguna

104	MVAL_02622	KR 8D ESTE 107A 18 SUR	PUERTA AL LLANO IISECTOR	HAROLD CARDOZO CARDOZO	27/02/2023	Apertura efectiva, visitarecibida por la hermana del beneficiario quienremite autorización
105	MVAL_03589	KR 10 ESTE 106 36 SUR	EL REFUGIO IY II	ORLANDO DE JESUS MOLINA HERRERA	27/02/2023	
106	MVJ_0122	CL 82A SUR 46A37	JERUSALEN	RICAURTE GRAJALES	28/02/2023	

SEGUIMIENTO DE OBRA

Se realiza visita de seguimiento por parte de las áreas técnica y social tanto de contratista como de interventoría. Durante la visita se verifica el avance en las obras revisando el cumplimiento de los lineamientos técnicos para cada una de las intervenciones que se llevan a cabo. Las visitas permiten que área social de contratista e interventoría verifiquen si se presentan situaciones de intervención de los profesionales y la documentación de cada uno de estos casos si se presentan. También se deja consignado en la bitácora el proceso llevado a cabo durante la visita y los resultados de ésta. se atienden las diferentes inquietudes manifestadas por los beneficiarios sobre cada área correspondiente.

SEGUIMIENTOS					
ID_DMV	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA SEGUIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
MV_02083	CL 108 SUR 7F 22 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARÍA HERCILIA CAPERA	01 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento de obra e interventoría, la visita es atendida por la beneficiaria. En el predio se presentan inconformidades por el trabajador que está ejecutando las actividades, se solicita al contratista realizar cambio de personal. Se brindan medios de comunicación a la beneficiaria y se enfatiza en el uso adecuado. Se indica dejar cinco días para que la beneficiaria subsane el tema de la red hidrosanitaria del baño.
MVPA_1244	CR 27K 71D 70 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	MARÍA DORAIDA CARRILLO	02 DE FEBRERO 2023	Se resuelven dudas de la beneficiaria en torno a ubicación de gravilla lavada en boca puerta. Avance 70%.
MVPA_1205	CR 27K 71D 81 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	ELSA MARÍA VERA	02 DE FEBRERO 2023	Avance 85%
MVPA_1995	CLL 71F BIS A SUR 27L 61	BELLA FLOR Y PARAÍSO	MARINELA MIRANDA	02 DE FEBRERO 2023	Avance 70%
MVPA_1226	KR 27J 71D 15 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO	02 DE FEBRERO 2023	Avance 65%

MVAL_02701			LINDA AURA PÁEZ	02 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento desde el área técnica y social de interventoría y obra donde se evidencia un avance del 65%, Pendiente emboquillar las áreas intervenidas, instalación de lavaplatos; el predio en la actualidad está deshabitada; se deja nota en bitácora.
MVAL_01959	KR 8A ESTE 107 29 SUR	TPM ALFONSO LOPEZ	JOSÉ MIGUEL MORENO		Se realiza visita de seguimiento técnico social de obra interventoría, la visita es atendida por el beneficiario donde se llegan a acuerdos con el beneficiario. Se informa reanudar la obra El día martes de la siguiente semana, se rectifican áreas de intervención. Avance del 30%
MVBF_494	CL 73C SUR NO 27B 85	BELLA FLOR	MARÍA NIDIA MANTILLA	03 DE FEBRERO 2023	El Sr Luis Mantilla, hijo y autorizado de la beneficiaria, manifiesta su agradecimiento con las ejecuciones que se han realizado en la vivienda. Manifiestan estar satisfechos con el personal de obra y la calidad de los trabajos adelantados. La espera de material para enchape de piso para dar continuidad a esta actividad. Se solicita apoyo por parte del subcontratista. Avance 80%
MVBF_403	KR 27F 73D 57 SUR	BELLA FLOR	JOSÉ IGNACIO RIASCOS	03 DE FEBRERO 2023	La esposa del beneficiario manifiesta que una de las tejas presenta una fisura, no obstante, también comenta que soltó el amarre de una cubierta por gotera que se estaba presentando. Se solicita verificación al subcontratista
MVBF_494	CL 73C SUR NO 27B 85	BELLA FLOR	MARÍA NIDIA MANTILLA	06 DE FEBRERO 2023	Se realizó recomendación de subsanar hueco en teja sobre columna. por parte de beneficiario. Se deja anotación. Avance 85%
MVPA_1226	KR 27J 71D 15 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO	10 DE FEBRERO 2023	Se solicita instalación de manguera del tanque de inodoro, limpieza general, e instalación de llave jardín y luminarias para realizar entrega de obra. Avance 95%
MVPA_1909	CR 27J 71D 58 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	JAIME MURILLO	10 DE FEBRERO 2023	Se hizo entrega de material, pero no se ha iniciado obra ni se ha asignado personal. Se solicita apoyo del subcontratista para verificar el caso.

MVPA_1243	CR 27K 71D 70 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	MARIA DORAIDA CARRILLO	10 DE FEBRERO 2023	Avance 95%. Se generan correcciones por parte del área técnica para realizar entrega
MVPA_973	CLL 71H BIS SUR 27L 75	BELLA FLOR Y PARAÍSO	MARÍA JACQUELINE GUEVARA	10 DE FEBRERO 2023	Avance 5%
MVPA_985	CLL 71H BIS SUR 27L 17	BELLA FLOR Y PARAÍSO	EMILIO CARO QUINTERO	10 DE FEBRERO 2023	Se ha instalado la mitad de la cubierta. El beneficiario se encuentra de acuerdo en instalar teja traslúcida que cubra escaleras de acceso y cocina. Avance 20%
MVPA_1298	CLL 71I SUR 27N 34	BELLA FLOR Y PARAÍSO	ANA BEATRIZ CHÁVEZ ZAMBRANO	10 DE FEBRERO 2023	Se observa un retraso en obra, el día de ayer no se presentó personal y hoy llegó un solo maestro a la vivienda. Se observa material regado y escombro en varias áreas de la vivienda. No se han ejecutado áreas en orden, hay intervenciones en diferentes lugares de la obra. Se le aclara a la beneficiaria que el material puede movilizarse hacia otras viviendas, siempre y cuando se garantice lo necesario para la ejecución de su casa y se entrega obra terminada. Avance 30%
MVPA_0133	CLL 71I SUR 27K 03	BELLA FLOR Y PARAÍSO	CARMENZA JUTINICO	10 DE FEBRERO 2023	Se aclaran dudas de la beneficiaria entorno a realizar actividad de encoroce y mampostería de muro divisorio entre cocina y muro de escaleras de acceso. Frente a ello se le aclara que el presupuesto se ha llevado a tope y no es posible realizar esta actividad. Frente a ello, la beneficiaria manifiesta estar informada y tener claridad sobre lo anterior. Avance 40%
MVPA_156	CR 27L 71I 28 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	CRUZ QUITORA	10 DE FEBRERO 2023	Avance del 40%
MVPA_144	CLL 71K SUR 27K 22	BELLA FLOR Y PARAÍSO	JOSÉ MARTÍN DÍAZ	10 DE FEBRERO 2023	Se observa avance importante en obra. La esposa del beneficiario (autorizada) indica que se encuentran muy satisfecho con la obra y que el personal asignado es muy eficaz. Avance 45%
MVPA_0529	CLL 27K 71K 26 SUR	BELLA FLOR Y PARAÍSO	AURA MARIA SEPÚLVEDA	10 DE FEBRERO 2023	No se ha iniciado ejecución de obra; el día de ayer solo se le entregaron tejas para montaje de cubierta

MVAL_01749	CLL 108 SUR 7ª 22 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	13 DE FEBRERO 2023	Se aclaran dudas a la beneficiaria con relaciones a las actividades puntualmente en zona de ropas (dintel puerta). Avance del 5%
MVAL_02179	CLL 108 SUR 7 21 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	13 DE FEBRERO 2023	Avance 35%
MVAL_02083	CL 108 SUR 7F 22 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARÍA HERCILIA CAPERA	14 DE FEBRERO 2023	Avance 45%
MVAL_01959	KR 8A ESTE 107 29 SUR	TPM ALFONSO LOPEZ	JOSÉ MIGUEL MORENO	14 DE FEBRERO 2023	Avance 75%
MVAL_01749	CLL 108 SUR 7ª 22 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	15 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento en la cual se evidencia avance en construcción mesón cocina, inicio enchape sala comedora, pañete en zonas faltantes sala comedor. Avance 30%
MVAL_01749	CLL 108 SUR 7ª 22 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	17 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento en la cual se evidencia avance en construcción mesón cocina, inicio enchape sala comedor, pañete en zonas faltantes sala comedor. Avance 45%
MVAL_02179	CLL 108 SUR 7 21 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	22 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento para tomar medidas, se verifican pendientes por parte del área técnica. Avance 95%
MVAL_01749	CLL 108 SUR 7ª 22 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	22 DE FEBRERO 2023	se realiza visita de seguimiento en la cual se evidencia avance en pañetes terminados ,dinteles construidos y piso en habitaciones. Avance 60%
MVAL_02213	CLL 108 SUR 7ª 17 ESTE	TPM ALFONSO LOPÉZ	ALICIA SEGURA	22 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento en la cual tanto la beneficiaria cómo el personal de obra evidencia que no hay material para realizar intervención. Se solicita apoyo del subcontratista para garantizar material para ejecución de obra. Avance 10%
MVCB_557	KR 18Q BIS B 69 64 SUR	TRANSICION HABITARTE 2019	LUZ MARINA ZULUAGA	23 DE FEBRERO 2023	En visita se perciben baldosas de baño desportilladas, área técnica de Interventoría solicita cambio de baldosas. Se solicita desmonte de cielo raso en PVC en habitación posterior debido a que se instalaron dos tonalidades. Adicional a ello, se solicita toma de registro fotográfico

					en cubierta al realizar este desmonte pues no se completó instalación de teja en instalación de cubierta y se instaló flanche en esta parte vacía. Se hace revisión a cada uno de los puntos solicitados por Interventoría y se solicita ir culminando áreas puesto que la beneficiaria no cuenta con baño y cocina actualmente. Avance 50%
MV_42885IDU	DG 69 SUR 18N 70	TRANSICION HABITARTE 2019 / CONVENIO 1481 - IDU	FLOR ELISA ROMERO	23 DE FEBRERO 2023	Se verifican intervenciones realizadas. Se resuelven dudas de la beneficiaria en torno a pintura de habitación posterior. Se solicita corrección de gotera en amarre de cubierta en área de hall. A solicitud del hijo de la beneficiaria, días después de culminar actividad de PVC de baño, se instaló luminaria en un lugar diferente al espacio que se había contemplado para esto por parte del personal de obra, por cuanto, hay una lámina con un espacio pequeño. Adicional a ello, por solicitud de la beneficiaria, se dejó cielo raso en habitación posterior con una inclinación por altura de muro. Avance 95%
MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74	IIM HABITARTE 2019-MV	EVELIA MUÑOZ	23 DE FEBRERO 2023	Se evidencia avance en enchape de habitación principal, enchape en sala comedor, culminación pañetes en zona de cocina, inicio de intervención en área de ropas. Avance 40%
MVAL_02243	CRR 7B ESTE 108 25 SUR	TPM ALFONSO LÓPEZ	MARTHA ESPERANZA CASTRO	24 DE FEBRERO 2023	Quien atiende la visita es el esposo de la beneficiaria, a quien no se le ha entregado formato de autorización. Se solicitan documentos para oficializar su autorización respecto a su presencia durante ejecución de obra ante ausencia de la beneficiaria. Se solicita no intervenir piso de habitación #1; el área técnica verificara presupuesto para saber en qué parte se puede utilizar este rubro. Avance 10%
MVAL_02193	CLL 108 SUR 7 53 ESTE	TPM ALFONSO LÓPEZ	MERCEDES PINEDA	24 DE FEBRERO 2023	Se realiza visita de seguimiento en la cual la beneficiaria solicita que no se intervenga baño de apartamento posterior, sino aquel que se

					encuentra ubicado debajo de la escalera. El área técnica le indica que se revisará el tema para verificar la posibilidad de cambiar esta actividad. No hay personal en la vivienda, solo hay pegacor, cemento, perfilería, y cajas de enchape.
MVAL_00230	CRR 7ª BIS ESTE 108 40 SUR	TPM ALFONSO LÓPEZ	CARLOS MANCERA	27 DE FEBRERO 2023	Avance 25%
MVAL_02233	CRR 7ª BIS ESTE 108 26 SUR	TPM ALFONSO LÓPEZ	LUIS VELASCO	27 DE FEBRERO 2023	Avance 5%
MVAL_02193	CLL 108 SUR 7 53 ESTE	TPM ALFONSO LÓPEZ	MERCEDES PINEDA	27 DE FEBRERO 2023	Avance 20%
MVAL_02243	CRR 7B ESTE 108 25 SUR	TPM ALFONSO LÓPEZ	MARTHA ESPERANZA CASTRO	27 DE FEBRERO 2023	Avance 15%
MVJ_0050	KR 44A BIS 79 10 SUR	TPM JERUSALEN	LILIANA MARÍA RODRÍGUEZ	28 DE FEBRERO 2023	Avance 20%
MVJ_0128	TV 44A 78A 87 SUR	TRANSICION JERUSALEN	RAFAEL PINZÓN	28 DE FEBRERO 2023	Se le indica al beneficiario que ante su solicitud se hará un cambio de actividades a realizar en la vivienda. Se muestra agradecido y satisfecho con las actividades y el presupuesto a ejecutar. No se ha dado inicio a ejecución de obra por solicitudes del hogar.
MVJ_0131	CL 79B SUR 42 44	TPM JERUSALEN	ANA DELINA BAUTISTA	28 DE FEBRERO 2023	Se evidencia avance en alistado de pisos en habitaciones y enchape en muros y mesón de cocina. Avance 15%
MVJ_0132	KR 42 80B 13 SUR	TRANSICION JERUSALEN	GLORIA YANET RODRÍGUEZ	28 DE FEBRERO 2023	La beneficiaria indica que no realizarán demolición de muro en zona social, por cuánto, se verificará alcance para levantar mampostería en habitación #1 luego de revisar presupuesto. No se ha dado inicio a la ejecución de obra debido a este cambio pero ya está asignado personal
MVJ_0139	CL 80B SUR 40 24 MJ	TRANSICION JERUSALEN	WENDY MICHEL CUASTUMAL	28 DE FEBRERO 2023	La beneficiaria indica que se ha generado retraso en obra por falta de material puesto que el personal es eficiente. Se solicita apoyo del subcontratista para garantizar efectividad en obra. Avance 10%

MVJ_0141	KR 39 79A 62 SUR	TRANSICION JERUSALEN	MARIA SERGINA AGUIRRE	28 DE FEBRERO 2023	Se evidencia avance en pañetes en ambas alcobas. Avance 10%
MV_42865 IDU	KR 18U BIS 67C 23 SUR	JUAN PABLO II	ERISINDA DURAN DE ECHEVERRI	02/2023	Durante el mes de febrero de 2023 se realizaron visitas de seguimiento semanales para supervisión y revisión del proceso constructivo llevado a cabo en la vivienda. Durante el proceso de obras de mejoramiento, la parte de área técnica daba las especificaciones técnicas para el avance en vivienda. Por solicitud de los beneficiarios del hogar, se hizo entrega del espacio de habitación toda vez terminadas las actividades en esta área, para ser ocupada por uno de los integrantes de la familia debido a que se encuentra en una situación económica vulnerable. Las actividades se finalizaron en su totalidad, pero para entrega se encuentra pendiente subsanar inconsistencias de la instalación de la cubierta referente al corte de perfiles.
MV_42881 IDU	CL 63 SUR 18N 14	ALTOS DE JALISCO	LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ	02/2023	Durante el proceso de mejoramiento de vivienda se presentaron diferentes dificultades en la vivienda. Estas dificultades afectaron directamente el grupo familiar quienes manifestaron sus respectivas quejas ante la SDHT. Los primeros trabajadores no finalizaron las actividades dejando las obras a mitad de realización, y uno de los trabajadores que reparten el material en la vivienda se comportó de manera agresiva con el beneficiario. Las acciones de Interventoría se encaminaron a intermediar para solución de estas dificultades, teniendo como punto de orientación las solicitudes explícitas del beneficiario. En primer lugar, se realizó la visita al predio por área social de contratista e Interventoría concretando compromisos de subsanación de las situaciones presentadas referentes a personal de obra, horarios de trabajo y las especificaciones para terminar las actividades pendientes. Para la fecha de entrega del presente informe se encuentra en proceso de finalización de actividades de obras.
MV_42883 IDU	TV 618P BIS A 69A SUR 16	JUAN PABLO II	CLARA ISABEL ALDANA	02/2023	Durante el mes de febrero de 2023 se realizaron visitas de seguimiento mínimo una vez a la semana para verificación de la realización de las actividades. En la vivienda se realizó la visita de preentrega y proyección de entrega de la vivienda, se encontraba pendiente la entrega de ducha y recolección de escombros, y la instalación de conexión de lavamanos en área de baño. La visita de finalización y entrega de obras tuvo el acompañamiento de SDHT, fue necesario que se gestionara la instalación adecuada para el lavamanos que para esta entrega aún no se había subsanado. Se realiza la entrega

					de la vivienda y la beneficiaria manifestó estar conforme con las actividades que se realizaron.
MV_42885 IDU	DG 69 SUR 18N 70	JUAN PABLO II	FLOR ELISA ROMERO	02/2023	En la vivienda se priorizó el cambio de cubierta para actividad de mejoramiento de habitabilidad de la familia, la beneficiaria manifestó que tenían dificultades por alta filtración en la cubierta la cual evidenciaba alto deterioro. Las demás actividades se realizaron adecuadamente. La visita de preentrega permitió la proyección de entrega de la vivienda además de contar con la conformidad de la beneficiaria.
MVCB_485 9	CL 67D SUR 18U 74	JUAN PABLO II	EVELIA MUÑOZ	02/2023	La vivienda es caso especial, es un grupo familiar de jefatura femenina, la beneficiaria es la jefe de hogar, vive actualmente con su hijo y entre los dos asumen los gastos del hogar. El mejoramiento permitirá que su hija pueda vivir con ella y poder apoyarse económicamente como fortalecer el núcleo familiar. la ejecución del mejoramiento de vivienda ha tenido dificultades generadas desde el contratista referentes a la entrega oportuna de los materiales, el cumplimiento y asistencia del personal de obras, el tiempo de ejecución de las actividades. Todas las solicitudes de cumplimiento de interventoría se han consignado en la bitácora y se han realizado directamente a los profesionales residentes de la vivienda. Esta ejecución no evidencia el avance programado y se han afectado todas las actividades cotidianas del grupo familiar de manera negativa. Por parte del contratista no se han dado las respuestas efectivas a las solicitudes ni a los avances de obras.
MVCB_555 7	KR 18Q BIS B 69 64 SUR	JUAN PABLO II	LUZ MARINA ZULUAGA	02/2023	La ejecución de las actividades no ha dado el cumplimiento a la proyección realizada. Ha sido constante el seguimiento de la interventoría, en visitas al predio y por medio de llamadas telefónicas y también a través del constante acompañamiento de SDHT. Las solicitudes y requerimientos han sido constantes sin obtener la respuesta oportuna de parte de contratista, se en cuanto a la entrega de materiales, las instalaciones no cumplen las especificaciones técnicas de ejecución, no se cuenta con el cumplimiento y puntualidad de los trabajadores de obras. Todas las cotidianidades de la beneficiaria han sido afectadas de manera negativa.
MVJ_0121	CL 82B SUR 46A 18	JERUSALEN	RODRIGO JIMENEZ SAENZ	02/2023	Las visitas de seguimiento realizadas en la vivienda han permitido evidenciar el avance en la ejecución. El beneficiario manifestó estar confirme con las actividades en realización y que no se han presentado situaciones de dificultad. Áreas técnicas realizaron la revisión de actividades y los ajustes respectivos al desarrollo de obras.

MVJ_0123	KR 45B 82C 09 SUR	JERUSALEN	MARIA ALCIRA NUÑEZ	02/2023	Como actividad principal para el mejoramiento de vivienda se estableció el cambio de cubierta de la vivienda y la instalación y adecuación de áreas de baño y cocina. La vivienda carecía de área de baño y la cocina no tenía las condiciones necesarias para la habitabilidad de la beneficiaria, quien es adulto mayor en condiciones vulnerables y padecimientos de salud. Estas actividades de han llevado a cabo bajo la constante supervisión técnica de contratista e interventoría. Se dio respuesta a la solicitud manifestada por la beneficiaria referente al inicio de obras. Las visitas de seguimiento también a han contado con el acompañamiento de SDHT.
MVJ_0124	KR 45 80B 21 SUR	JERUSALEN	EREN PRIETO MATIZ	02/2023	Se realizó visita de área social de Interventoría y de contratista con el fin de dar alcance a la solicitud manifestada por el beneficiario vía telefónica. En esta visita se dio espacio de escucha asertiva referente a las solicitudes del beneficiario, entre las cuales estaba la instalación de divisiones al drywall mediante el subsidio de mejoramiento de vivienda, y la elección de algunos de los materiales de instalación fuera de los de la licitación y la ejecución de las obras. Se brindó claridad sobre el alcance presupuestal y del proyecto de mejoramiento de vivienda, y generalidades del proyecto. A pesar de no ser posible dar alcance a solitudes específicas del beneficiario, si fue posible hacer ajustes frente a las actividades de la vivienda logrando la conformidad del beneficiario. Las actividades se encuentran en realización.
MVJ_0133	CL 80A SUR 44A 12	JERUSALEN	HERMENCIA GACHA CALLEJAS	02/2023	Se realizó la visita de seguimiento evidenciando la entrega de materiales como la asignación del personal de obras, se dio inicio a las actividades en la vivienda.
MVJ_0136	CL 82C BIS SUR 44B 19	JERUSALEN	YAMILE SANDOVAL LUGO	02/2023	Se encuentra en proceso de aprobación la documentación y presupuesto inicial para inicio del proceso de apertura e inicio de obras de mejoramiento.
MVJ_0140	CL 82C BIS SUR 44 A 52 MJ	JERUSALEN	RUBY SOLEY ALZATE ORTIZ	02/2023	Se encuentra en proceso de aprobación la documentación y presupuesto inicial para inicio del proceso de apertura e inicio de obras de mejoramiento.
MVJ_0142	CL 82 SUR 44A 49 MJ 1	JERUSALEN	ABEL MATEUS RUIZ	02/2023	Se realizaron visitas de seguimiento semanales para verificación constante de las actividades en ejecución. Se llevaron a cabo las actividades siguiendo las especificaciones de área técnica. El beneficiario manifestó estar conforme con las actividades realizadas y no se evidenciaron actividades de dificultad durante el desarrollo de obras. El beneficiario es adulto mayor jefe de familia, se evidencia alta vulnerabilidad socio económica. La visita de preentrega tuvo el acompañamiento de SDHT y se dejaron las

					actividades para finalización y entrega de obras.
MVJ_0143	DG 80A SUR 45 49	JERUSALEN	AMPARO ROMERO RODRIGUEZ	02/2023	Se encuentra en proceso de aprobación la documentación y presupuesto inicial para inicio del proceso de apertura e inicio de obras de mejoramiento.
MVAL_03453		JERUSALEN	SARA GARCIA MACHUCA	02/2023	No se han iniciado actividades constructivas. La dirección y datos de la beneficiaria se encuentran en proceso de actualización en la base de datos, se solicitó a contratista revisar esta actualización de datos.
MVAL_03466		ALFONSO LOPEZ	CLEMENCIA CASTEBLANCO PARADA	02/2023	Durante el mes de febrero se realizaron varias visitas de seguimiento para verificación y acompañamiento a la ejecución del proyecto. Se encuentra en proceso de finalización y se están realizando actividades de terminación. La dirección y datos de la beneficiaria se encuentran en proceso de actualización en la base de datos, se solicitó a contratista revisar esta actualización de datos.
MVAL_03567	KR 10 ESTE 106 – 23 SUR	EL REFUGIO	MARIA AIDE TRIANA LEON	02/2023	Al realizar la visita de validación de la vivienda se dio evidencia del actual y real estado en que se encontraba la vivienda, muy diferente de la estructuración de la vivienda que fue entregada por la entidad. las dificultades constructivas y estructurales de la vivienda dieron lugar a la solicitud del acompañamiento de SDHT para determinar el proceso de la vivienda. La beneficiaria es adulto mayor quien vive con su hijo actualmente por encontrarse en una situación socio económica altamente vulnerable. Se realizaron varia s visitas con la SDHT al predio, una de ellas con el equipo de estructuración y se determinó que por el estado actual de la vivienda no se podrían llevar a cabo actividades de mejoramiento de vivienda y se establecería referenciación del caso a IDIGER y activar redes sociales de apoyo para la beneficiaria.
MVAL_03467		EL REFUGIO	FABIO ALFREDO GARCIA	02/2023	La dirección y datos de la beneficiaria se encuentran en proceso de actualización en la base de datos, se solicitó a contratista revisar esta actualización de datos. La ejecución de las actividades en la vivienda ha presentado dificultades que han afectado de manera negativa al grupo familiar. A pesar de las solicitudes que se han realizado, los trabajadores asignados para las labores constructivas han presentado comportamientos groseros con los beneficiarios del hogar y conductas inapropiadas como lo es el consumo spa, dentro de la vivienda y en sus alrededores, causando además atrasos en la ejecución. En la vivienda se priorizó el cambio de cubierta, y la instalación presenta inconsistencias que han perjudicado a los beneficiarios del hogar, referente a filtraciones de agua lluvia y tejas mal amarradas que se sacuden todo el

					tiempo, además la instalación de cielo raso también presenta inconsistencias. Se solicitó por oficio al contratista subsanar estas dificultades presentadas y la afectación que ha tenido sobre el grupo familiar.
MVAL_02101	CL 107 SUR 7F 25 ESTE	USME	JOSE ELIECER OSPINA MENDOZA	01/02/2023	Avance de obra del 40%
MVAL_01865	KR 7G ESTE 105A 23 SUR	USME	BERNARDO FUENTES	01/02/2023	Avance del 30%
MVAL__1660	CL 106 SUR 7 G 42	USME	DORIS ADRIANA OCHOA	01/02/2023	Sin novedad
MVAL_01865	KR 7G ESTE 105A 23 SUR	USME	BERNARDO FUENTES	06/02/2023	En esta visita se levantó acta social ya que el beneficiario solicito re proyectar actividad de cambio de cubierta por áreas locativas de mejoramiento.
MVAL_02019	KR 7H ESTE 107 38 SUR	USME	JULIA CECILIA TORRES	09/02/2023	Visita de re validación técnica social con apoyo de la SDHT, en la cual se levanta acta social generando compromiso con el hijo de la beneficiaria de desmonte de cubierta, arreglo de cables de electricidad para poder dar inicio a ejecución de obra
MVJ_0103	KR 47 69 B 39 SUR	CIUDAD BOLIVAR	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS	10/02/2023	En este visita no se evidencia maestros ni material de obra.
MVJ_0116	CL 69B SUR 47 31 MJ 3	CIUDAD BOLIVAR	GLADYS INES BASTO	10/02/2023	Avance de obra del 50%. Beneficiaria desocupo la vivienda para viabilizar obra
MVJ_0115	KR 48 69B 16 SUR MJ 2	CIUDAD BOLIVAR	LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ ARCIA	10/02/2023	Avance de obra del 40%. Beneficiario se muestra receptivo ante el proceso de obra sin embargo se evidencia poco material retrasando la obra.
MVTT_0320	TV 73I 75B 25 SUR	CIUDAD BOLIVAR	MARIA MIRIAM MAHECHA CAMACHO	14/02/2023	Avance de obra del 60%, por falta de material se ha retrasado la obra, se proyecta entrega con SDHT
MVAL_02137	KR 7F ESTE 107 43 SUR	USME	HUMBERTO URIBE GUTIÉRREZ 15/02/2023	15/02/2023	Avance de obra del 50%, por falta de material se ha retrasado la obra
MVJ_0103	KR 47 69 B 39 SUR	CIUDAD BOLIVAR	JESSON FERNANDO HERNANDEZ ARCIA	17/02/2023	Avance de obra del 45% . Se le recomienda al beneficiario tener cuidado con el material evitando alojar a los perros donde se encuentra en ejecución la obra
MVJ_0072	DG 69F SUR 48 70	CIUDAD BOLIVAR	ANGELICA GIRALDO	17/02/2023	Beneficiaria desocupo vivienda para viabilizar obra, se muestra receptiva,

					cuando no se encuentra atiende el hijo.
MVAL_ 01976	KR 7I ESTE 107 60 SUR	USME	AZUCENA LOZADA	22/02/2023	Avance de obra del 60%. Beneficiaria se muestra satisfecha y desocupo vivienda para optimizar obra

- **ENTREGAS**

Durante el proceso de entrega de obra se realiza anotación en bitácora donde queda estipulado el cierre de obra, donde se socializa presupuesto final, acta de entrega a satisfacción, acta de mayores y menores, acta social de cierre, registro fotográfico del antes- durante y después. Se entrega manual de uso, y mantenimiento de obras con recomendaciones generales de las obras realizadas, se hace entrega de kit ecológico.

Se recuerda que es importante que el beneficiario conserve el manual de uso y mantenimiento de obra ya que, en él, se encuentra el número de contrato del proyecto de mejoramiento de vivienda para reclamar en caso de hacer efectiva la garantía, la cual es de un año siempre y cuando no se hayan intervenido por parte del beneficiario o grupo familiar en los mismos espacios que se ejecutaron durante el mejoramiento de vivienda. Finalmente se firma por parte del beneficiario o persona autorizada la nota de cierre y demás documentos anteriormente mencionados. También firman los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría que acompañaron el proceso.

ENTREGAS DE OBRA					
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCION**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA ENTREGA DE OBRAS**
1	MVAL_02585	KR 7I ESTE 109 24 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA	2/02/2023
2	MV_1470	CL 105 SUR 7 40 ESTE	NUEVO PORVENIR	ALBA GLADYS VELOZACASTRO	3/02/2023
3	MVBF_383	TV 27H 73D 78 SUR	BELLA FLOR	LEIDY VIVIANA GONZALEZ CARO	3/02/2023
4	MVBF_440	CL 73D BIS B SUR 27B 95	BELLA FLOR	NOHEMY PINTO	3/02/2023
5	MVBF_514	TV 27H 73C 06 SUR	BELLA FLOR	ISAIAS MORATO CASTIBLANCO	3/02/2023
6	MVBF_513	CL 73 C SUR 27B 91	BELLA FLOR	FAUSTINO RODRIGUEZ	6/02/2023
7	MVBF_403	KR 27F 73D 57 SUR	BELLA FLOR	JOSE IGNACIO RIASCOS	6/02/2023
8	MV_1293	KR 7B ESTE 10539 SUR	PORTAL DEORIENTE	ROSA DELIA CASTELLANOS ARIZA	6/02/2023
9	MV_1299	KR 7B ESTE 10515 SUR	PORTAL DEORIENTE	ANGELICA MARIA ORDOÑES FERNANDEZ	6/02/2023
10	MV_1499	KR 7 BIS A ESTE 104 29 SUR	NUEVO PORVENIR	ROSA ADELINA CASTAÑEDA PEREZ	6/02/2023
11	MV_1324	KR 7B ESTE 10125 SUR	PORTAL DEORIENTE	JULIO ALBERTO MORENO CRUZ	7/02/2023
12	MV_1316	KR 7B ESTE 10305 SUR	PORTAL DEORIENTE	LUIS ARNULFO PARADA NIÑO	7/02/2023

13	MV_1660	CL 103 SUR 7D 42 ESTE	PORTAL DEORIENTE	DORIS ADRIANA OCHOAYAZO	8/02/2023
14	MVAL_02676	KR 8A BIS ESTE 108 18 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	JESUS EDUARDO MONROY VIVAS	8/02/2023
15	MV_1471	CL 105 SUR 7 36 ESTE	NUEVO PORVENIR	CAMILO ORTIZ MORA	9/02/2023
16	MV_1476	KR 7 BIS ESTE 104 68 SUR	NUEVO PORVENIR	ARSENIO RAMOS BERNAL	9/02/2023
17	MV_1735	CL 105 SUR 7D 35 ESTE	PORTAL DEORIENTE	ROSA MARIA TORRESGARCIA	13/02/2023
18	MVAL_02701	CL 109 SUR 8A 09 ESTE	PUERTA AL LLANOII SECTOR	LINDA AURA PAEZ ESQUIVEL	13/02/2023
19	MVPA_1226	KR 27J 71D 15SUR	EL PARAISO	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO ROMERO	13/02/2023
20	MVPA_1244	KR 27K 71D 70 SUR	EL PARAISO	MARIA DORAIDA CARRILLO LOPEZ	13/02/2023
21	MVPA_1205	KR 27K 71D 81 SUR	EL PARAISO	ELSA MARIA VERA PORTELA	13/02/2023
22	MVPA_1995	CL 71F BIS A SUR 27L 61	EL PARAISO	MARINELA MIRANDAPIÑEROS	13/02/2023
23	MVAL_01864	KR 7G ESTE 105A 17 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LILIA RUIZ PEDRAZA	13/02/2023
24	MVAL_01852	KR 7F ESTE 105A 28 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	AMPARO NAVARRO GARCIA	13/02/2023
25	MVBF_494	CL 73 C SUR No. 27 B 85	BELLA FLOR	MARIA NIDIA MANTILLA CAICEDO	14/02/2023
26	MVBF_360	K 27 G 73 D 95 SUR	BELLA FLOR	JOSÉ DEL CARMENMARTINEZ	14/02/2023
27	MV_1292	CL 105A SUR 7A 14 ESTE	PORTAL DEORIENTE	JULIA ESTHER VANEGAS NOVOA	14/02/2023
28	MV_1483	KR 7 BIS ESTE 104 38 SUR	NUEVO PORVENIR	NOREDIS RODRIGUEZ POLOCHE	14/02/2023
29	MV_1487	KR 7 BIS ESTE 104 16 SUR	NUEVO PORVENIR	JORGE GONZALEZ TRIVIÑO	14/02/2023
30	MVAL_02641	KR 8C ESTE 10876 SUR	PUERTA AL LLANOII SECTOR	ROSIO HERNANDEZ PATIÑO	14/02/2023
31	MV_1485	KR 7 BIS ESTE 104 32 SUR	NUEVO PORVENIR	EGMIDIO MARTINEZ MEDINA	20/02/2023
32	MVAL_01865	KR 7G ESTE 105A23 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	BERNARDO FUENTES	20/02/2023

33	MVAL_02101	CL 107 SUR 7F 25ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE ELIECER OSPINA MENDOZA	20/02/2023
34	MVTT_0320	TV 73I 75B 25 SUR	SIERRA MORENA	MARIA MYRIAM MAHECHA CAMACHO	22/02/2023
35	MVAL_02179	CL 108 SUR 7 21 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	24/02/2023
36	MVAL_02021	KR 7H ESTE 107 34 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ELSA MARINA AVILARONDON	24/02/2023
37	MVAL_02137	KR 7F ESTE 107 43SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	HUMBERTO URIBEGUTIERREZ	24/02/2023
38	MVAL_01959	KR 8A ESTE 10729 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE MIGUEL MORENO PARADO	27/02/2023
39	MVAL_02136	KR 7F ESTE 107 39 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ENELIZAR GUERRERO PEÑA	27/02/2023
40	MVAL_01825	KR 7F ESTE 105A 17 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	27/02/2023
41	MVAL_01860	CL 105A SUR 7F15 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUDIA MAGDALENAMORENO	27/02/2023
42	MVAL_01871	KR 7G ESTE 105A 45 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE DAVID ROMERO VELASCO	27/02/2023
43	MVJ_0116	CL 69B SUR 47 31 MJ 3	JERUSALEN	GLADYS INES BASTOS	28/02/2023
44	MV_42883IDU	TV 618P BIS A69A SUR 16	JUAN PABLO II	CLARA ISABEL ALDANA	28/02/2023

RENUNCIA

A la fecha se presenta 5 renuncias

PQRS

- MVCB_5557 13/02/2023 3/03/2023 LUZ MARINA ZULUAGA CIUDAD BOLÍVAR MVCB_5557 Luz Marina Zuluaga Osorio donde recorrido del equipo de profesionales de la supervisión evidenciaron “este no presenta un avance significativo en relación con la fecha de apertura en bitácora y las actividades evidenciado en visita del pasado 09 de febrero de 2023 por esta entidad,”. "El 10 de febrero del 2023, el equipo de profesionales de obra e interventoria realizo visita de seguimiento donde se llegaron acuerdos plasmados en un acta de reunión con el fin de dar agilidad a la solicitud en mención. Por otro lado, el 20 de febrero del 2023, se realizó radicación y envió al contratista de oficio HABITAT-GRUCONIG-ADM-106 LLAMADO DE ATENCION POR RETRASO EN EJECUCIÓN EN EL MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA OSORIO donde en calidad de interventoria se solicitó dar gestión y respuesta INMEDIATA a la ejecución de obra con los trabajadores y materiales pertinentes, para dar el cierre de actividades el día 24 de febrero del 2023 como se le informo a la beneficiaria y se dejó plasmado como compromiso en acta de reunión.

Asimismo, el 22 de febrero se realiza visita de seguimiento del equipo de profesionales de obra, interventoria y supervisión de se evidencia la subsanación de aspectos técnicos descritos en el acta de reunión y anexada a este documento.

Además, El 24 de febrero del 2023, se radica al contratista el oficio HABITAT-GRUCOING-ADM-112 INCUMPLIMIENTO A COMPROMISOS REALIZADOS EN VISITA DE SEGUIMIENTO EL DIA 10 DE FEBRERO EN EL MVAL_5557 LUZ MARINA ZULUAGA con el fin de solicitar la entrega inmediata y cierre actividades del mejoramiento de vivienda con las especificaciones de calidad del contrato, se anexa soporte.

El día 3 de marzo del 2023, se realiza el cierre de actividades de la vivienda haciendo la respetiva firma de satisfacción de la documentación y dando cierre a la PQRS"

- MVJ_0123 01/17/2023 2/02/2023 MARIA ALCIRA NUÑEZCIUDAD BOLÍVAR MV 0123 María Alcira Núñez donde por medio de ventanilla refirió la siguiente información “por favor inicien la obra, ya que estamos sequitos, lo que pasa cuando llueve se moja mi camita y las tejas están en mal estado”. Se informa que la vivienda se realizó la fase de validación el día 15 de diciembre del 2023, donde se realizó la actualización pertinente. El día 3 de febrero del 2023, el equipo de profesionales de obra e interventoria, procede a realizar el acercamiento a la vivienda con el previo agendamiento, con el fin de socializar el presupuesto inicial y ejecutar obra en la vivienda, con dicha vista se da respuesta a la solicitud realizada por la beneficiaria, se anexa registro fotográfico, formato de carta de trato digno y presupuesto inicial. Por otro lado, se menciona que el 10 de marzo del 2023, se realizó la visita de cierre y entrega de mejoramiento de vivienda donde se realiza la firma a satisfacción de la ejecución del mejoramiento de vivienda.

- MVJ_0120 21/02/2023 HENRY VARGAS BARRETO CIUDAD BOLÍVAR MV 0123 María Alcira Núñez donde por medio de ventanilla refirió la siguiente información “por favor inicien la obra, ya que estamos sequitos, lo que pasa cuando llueve se moja mi camita y las tejas están en mal estado”. "El 17 de febrero del 2023 , se realizo con el equipo de profesionales de obra e interventoria la vista de apertura e inicio de obras como demuestra el siguiente registro fotográfico donde se le explica nuevamente al hijo del beneficiario también erotizada el señor Oscar Vargas el desarrollo, especificaciones y generalidades del contrato, además se dio aval al inicio de eje cuin de obra con la firma a satisfacción de los documentos de dicha fase (acta de inicio de obras , presupuesto inicial y carta de trato digno , nota inicial de bitácora).

Ilustración 1Apertura de obra #157.MVJ_0120 Potosí Henry Vargas Barreto. Recibe autorizado el Hijo Oscar Vargas.
Asimismo, el día 21 de febrero y 1 de marzo de 2023 se recalcó nuevamente sobre las especificaciones del contrato, lo cual se discrimino en un acta de reunión por cada visita, en la última fecha se dio cumplimento a los requerimientos de la supervisión, dicho soportes están anexos a este documento. "

- MV_42881IDU 21/02/2023 10/03/2023 LUIS AURELIO ROJAS VELAZQUEZ CIUDAD BOLÍVAR Mv_42881 Idu Luis Aurelio Rojas Velásquez donde manifestó” Me empezaron a realizar los trabajos en la vivienda con personal poco calificado para realizar el trabajo, personal con una actitud de mal humor a la entrega de los materiales; Mi vivienda en este momento es un desastre Y párese más un parque de diversiones puesto que en los días que van a realizar algún trabajo. Ingresa alguien diferente.” "El 20 de febrero del 2023, se realizó radicación y envió a la contratista de oficio HABITAT-GRUCONIG-ADM-107 LLAMADO DE ATENCION POR RETRASO EN EJECUCIÓN EN EL MV_42881ID LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ donde en calidad de interventoria se solicitó dar gestión y respuesta INMEDIATA a la ejecución de obra con los trabajadores y materiales pertinentes, para dar el cierre de actividades lo más pronto posible, cumpliendo con los estándares de calidad del contrato.

Además, el 22 de febrero se realiza visita de seguimiento al predio con el equipo de profesiones de obra, interventoria y supervisión donde se dieron recomendaciones y correcciones en dicha visita la cual conto con acta de reunión y compromiso de entrega del 1 de marzo del 2023.
Por último, se realiza vista de cierre de PQRS el día 1 de marzo del 2023, donde se dio respuesta y gestión a las solicitudes mostrado por el beneficiario, se realiza acta de compromiso; el día 3 de marzo del 2023, se realiza el cierre de actividades de la vivienda haciendo la respetiva firma de satisfacción de la documentación"

- MVAL_02083 20/2/2023 02/03/23 MARIA HERCILIA CAPERA USME El día 20 de Febrero del año en curso, el Grupo Consultor e Ingenieros SAS, en adelante GRUCOING, solicitó acompañamiento a ejecución de obra de MV en mención, debido a que el día 17 y 20 de Febrero del año 2023 se realizó atención a la beneficiaria y su hijo quienes manifestaron inconformidades en los precios y materiales de la obra; solicitan de manera detallada una explicación de las actividades y los valores que han sido asignados para la ejecución del mejoramiento en su vivienda por parte de la Secretaria Distrital de Hábitat. Por lo anterior, se solicita acompañamiento de la entidad, para realizar visita técnico-social al predio el día 02 de marzo del año en curso. El grupo interventor GRUCOING, remite el oficio número 2-2023-11571, con asunto "Solicitud de acompañamiento visita de seguimiento al MVAL_02083 Maria Hercilia Capera, el cual es recibido por la Secretaria Disitrital de Hábitat con número de radicado 1-2023-7311, en el cual indica que se realizará el acompañamiento correspondiente para atender inquietudes y observaciones directamente sobre la ejecución de las obras de mejoramiento en la vivienda, el día 2 de Marzo del año en curso a las 9:30 am, por cuanto, solicitan la presencia de la beneficiaria para atender la visita.

- MV_1639 8/03/2023 14/03/2023 LUZ MARY ALARCÓN USME de MV_1693 Luz Mary Alarcón debido a que manifiesta “(...) favor realicen una visita al. inmueble. Que se realizó un mejoramiento de vivienda a la dirección calle 103 sur número 7, de 45, este barrio puerta al llano, ya que se presenta un inconveniente con el cielo raso ya en una filtración de agua. (...)”. "El 9 de marzo del 2023, se realiza visita de seguimiento desde el equipo. de profesionales de obra Interventoría donde se refirió que, desde el mejoramiento de vivienda, no se realizó intervención de cubiertas. debido a que no presentaba filtraciones visibles al momento de la fase de validación del contrato. En dicha visita, la familia de la beneficiaria indica que las filtraciones empezaron el 7 de marzo del 20 de 23, recalcando que el mejoramiento fue entregado y recibido a satisfacción por la beneficiaria el 12 de enero del 2023. Por lo cual, se le manifiesta la familia. la pérdida de garantía en la actividad de cielo raso, actividad que sí se realizó desde el mejoramiento de vivienda.

Asimismo, el día 13. de marzo del 2023, se realizó visita de cierre a la PQR desde el equipo de interventoría y supervisión, donde se le recalca la gestión realizada en la visita anteriormente mencionada, y se establece que los beneficiarios harán el desmonte del cielo raso. para hacer la subsanación en la cubierta; por lo cual, dicha actividad pierde la garantía.
Además, se enfatiza e invita al mantenimiento y el cuidado de las obras de acuerdo al manual de uso entregado al momento del cierre del predio"

CASO ESPECIAL.

MVAL_03567 AAA0146USUH Usme EL REFUGIO I Y II TPM ALFONSO LOPEZKR 10 ESTE 106 23 SUR MARIA AIDE TRIANA LEON 21134134

La vivienda actualmente se encuentra construida de dos áreas siendo las siguientes: el área frontal de la casa con (1) un piso distribuida en sala-comedor, cocina y baño con mampostería, pañete y pintura en estado de deterioro y humedad, la placa de contrapiso existente no cubre la totalidad del área presentando derrumbamiento y hundimiento en área de cocina y baño (la beneficiaria manifiesta que en esta zona frontal se hizo un relleno), no se evidencia buena ejecución en la construcción de esta placa, el piso en tierra observado se encuentra cubierto con bloque prefabricados en concreto sobrepuestos y la mampostería existente no se encuentra anclada a los muros perimetrales de la vivienda. El área posterior siendo (2) dos pisos conformados por dos habitaciones a nivel y un sótano; esta área cuenta con mampostería en bloque a la vista y estructura de columnas y vigas en concreto evidenciando la no existencia de una placa de contrapiso de concreto, se presenta un porcentaje del área en estructura en madera artesanal como piso cubierto por alfombra y demás área evidenciando una placa de concreto prefabricada sobre estructura de madera, esta estructura y placa se encuentra desplomada. Se radico oficio de no ejecución de actividades en el predio en HABITAT-GRUCOING-ADM-108 con numero de radicado 1-2023-7788.


CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	3
Caracterizaciones	289
Aperturas	273
Cierres PQR	14
Entregas	161
Renuncias	5
No ejecución	3

Lina Celeita.

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE
COORDINADORA SOCIAL INTERVENTORÍA

VALIDACIÓN

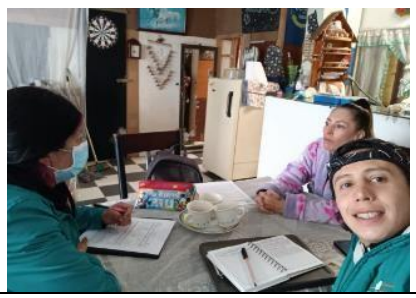	
MVAL_01825	**MVAL_01928**
	
MVAL_02269	**MVAL_02267**
	
MVAL_02134	**MVAL_02119**
	
MVAL_01800	**MVAL_01976**
	
MVAL_01764	**MVAL_01783**

	
MVAL_02687	MVAL_02594
	
MVAL_02595	MVAL_02596
	
MVAL_02655	MVAL_02639
	
MVAL_02621	MVAL_03569
	
MVAL_03572	MVAL_03604

	
MVAL_02230	**MVAL_02302**
	
MVAL_02296	**MVAL_01846**
	
MVAL_02321	**MVAL_02348**
	
MVAL_02612	**MVAL_02650**
	
MVAL_02657	**MVAL_03461**

	
MVAL_03453	MVAL_03594
	
MVAL_03607	MVAL_03666
	
MVAL_02323	MVAL_02141
	
MVAL_01831	MVAL_01830
	
MVAL_03442	MVAL_03443

	
MVAL_03458	MVAL_03459
	
MVAL_02609	MVAL_02622
	
MVAL_02625	MVAL_02630
	
MVAL_02604	MVJ_00838

APERTUTA

	
MVAL_01749	**MVAL_02028**
	
MVAL_02594	**MVAL_03556**
	
MVAL_02134	**MVAL_01800**
	
MVAL_02193	**MVAL_02213**
	
MVAL_02243	**MVAL_02407**


	
MVAL_02230	MVAL_02269
	
MVAL_02267	MVAL_02281
	
MVAL_01764	MVAL_01831
	
MVAL_01976	MVAL_01928
	
MVAL_01924	MVAL_01916

	
MVAL_02453	**MVAL_02595**
	
MVAL_02233	**MVAL_02141**
	
MVAL_02630	**MVAL_03453**
	
MVAL_03470	**MVAL_03604**

	
MVAL_02447	MVAL_02657
	
MVAL_02609	MVAL_02612
	
MVAL_02655	MVAL_02622
	
MVJ_0072	MVJ_0103
	
MVJ_0115	MVJ_0116


	
MVPA_1909	MVPA_973
	
MVPA_144	MVPA_0529
	
MVJ_0121	MVJ_0123
	
MVJ_0142	MVJ_0133
	
MVJ_0044	MVJ_0024

	
MVJ_0013	MVJ_0003
	
MVJ_137	MVJ_0032
	
MVJ_0127	MVJ_0120
	
MVJ_0019	MVPA_142
	
MVAL_01923	MVAL_02478

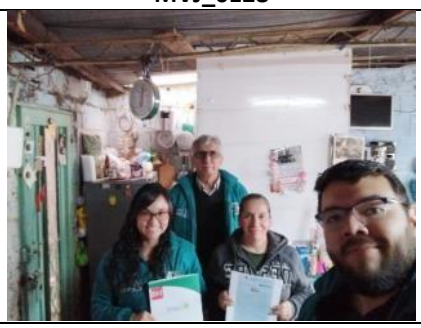
	
MVAL_02596	**MVAL_03443**
	
MVJ_0132	**MVJ_0139**
	
MVJ_0141	**MVJ_0128**
	
MVJ_0131	**MVJ_0050**
	
MVJ_0036	**MVJ_0102**

CIERRE

	
MVAL_01864	**MVAL_01852**
	
MVAL_02179	**MVAL_02137**
	
MVAL_02136	**MVAL_01825**
	
MVAL_01860	**MVAL_01871**

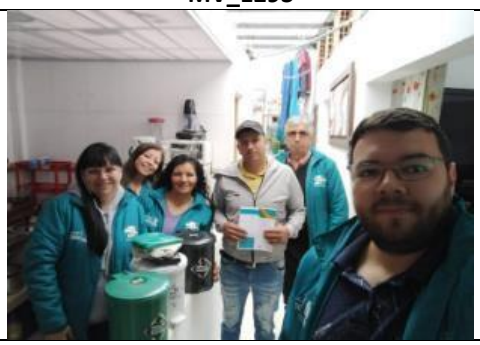	
MV_1293	MV_1299
	
MV_1324	MV_1316
	
MV_1660	MVAL_02676
	
MV_1471	MV_1476
	
MV_1471	MVAL_02701

	
MV_1292	**MV_1483**
 5509	
MV_1487	**MVAL_02641**
	
MVBF_383	**MVBF_440**
	
MVPA_1226	**MVPA_1244**

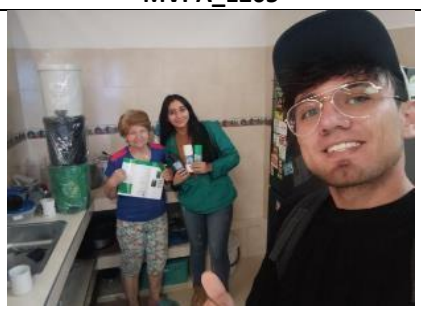	
MVPA_1205	**MVPA_1995**
	
MVJ_0116	MV_42883IDU
	
MVAL_01865	**MVAL_02101**


SEGUIMIENTOS


	
Visita de seguimiento, MV_02083, María Hercilia Capera, 01/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_1244, María Doraida Carrillo, 02/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_1205, Elsa María Vera, 02/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_1995, Marinela Miranda, 02/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_1226, German Hernando, 02/02/2023	Visita de seguimiento, MVAL_02701, Linda Aura Páez, 02/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVAL_01959, José Miguel Moreno, 02/02/2023	Visita de seguimiento, MVBF_494, María Nidia Mantilla, 02/02/2023



	
Visita de seguimiento, MVBF_403, José Ignacio Riascos, 03/02/2023	Visita de seguimiento, MVBF_494, María Nidia Mantilla, 06/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_1226, German Hernando Montenegro, 10/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_1909, Jaime Murillo, 10/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_1243, Doraida Carrillo, 10/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_973, María Jacqueline Guevara, 10/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_985, Emilio Caro Quintero, 10/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_1298, Ana Beatriz Chávez Zambrano, 10/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVPA_0133, Carmenza Jutinico, 10/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_156, Cruz Quitora, 10/02/2023

	
Visita de seguimiento, MVPA_144, José Martín Díaz, 10/02/2023	Visita de seguimiento, MVPA_0529, Aura Maria Sepúlveda, 10/02/2023
	
Visita de seguimiento, MVAL_01749, Clara Mercedes Melo Zutaneme, 13/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_02179, Luis Alberto Plazas Moreno, 13/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_02083, María Hercilia Capera, 14/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_01959, José Miguel Moreno, 14/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_01749, Clara Mercedes Melo Zutaneme, 15/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_01749, Clara Mercedes Melo Zutaneme, 17/02/23

	
Visita de seguimiento, MVAL_02179, Luis Alberto Plazas Moreno, 22/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_01749, Clara Mercedes Melo Zutaneme, 22/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_02213, Alicia Segura, 22/02/23	Visita de seguimiento, MVCB_557, Luz Marina Zuluaga, 23/02/23
	
Visita de seguimiento, MV_42885IDU, Flor Elisa Romero, 23/02/23	Visita de seguimiento, MVCB_4859, Evelia Muñoz, 23/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_02243, Martha Esperanza Castro, 24/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_02193, Mercedes Pineda, 24/02/23

	
Visita de seguimiento, MVAL_02083, Maria Hercelia Capera, 24/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_00230, Carlos Mancera, 27/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_02233, Luis Velasco,27/02/23	Visita de seguimiento, MVAL_02193, Mercedes Pineda, 27/02/23
	
Visita de seguimiento, MVAL_02243, Martha Esperanza Castro, 27/02/23	Visita de seguimiento, MVJ_0050, Liliana María Rodríguez, 28/02/23
	
Visita de seguimiento, MVJ_0128, Rafael Pinzón, 28/02/23	Visita de seguimiento, MVJ_0131, Ana Delina Bautista, 28/02/23


	
Visita de seguimiento, MVJ_0132, Gloria Yanet Rodríguez, 28/02/23	Visita de seguimiento, MVJ_0139, Wendy Michel Cuastumal, 28/02/23
	 
Visita de seguimiento, MVJ_0141, Maria Sergina Aguirre, 28/02/23	Visita de acompañamiento a Medios de Comunicación SDHT, MVAL_02585, beneficiaria Ana Bertilda Bellaizan Peña, Historia de Vida, 16/02/23
	
Jornada Punto de Atención al Ciudadano, Barrio Puerta al Llano, 11/02/23	*Jornada Punto de Atención al Ciudadano, Barrio Puerta al Llano,* 16/02/23
	
MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ	MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ
SEGUIMIENTOS FEBRERO 2 DE 2023	
	
MVAL_03567 MARIA AIDE TRIANA LEON	MVAL_03567 MARIA AIDE TRIANA LEON

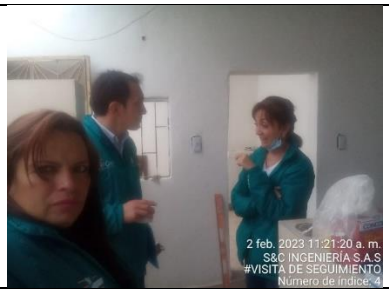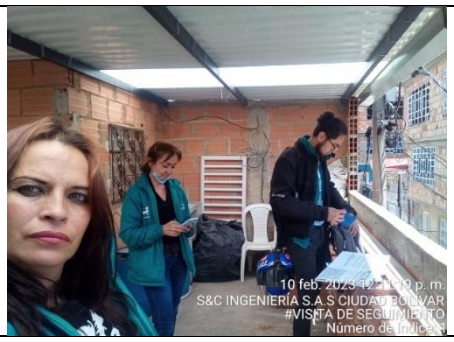
	
MVAL_1292 JULIA ESTHER VANEGAS PRE ENTREGA	MV_1299 ANGELICA MARIA ORDOÑEZ PRE ENTREGA
SEGUIMIENTOS FEBRERO 9 DE 2023	
	
MVAL_03567 MARIA AIDE TRIANA LEON ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVAL_03567 MARIA AIDE TRIANA LEON ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVAL_02641 ROSIO HERNANDEZ PATIÑO	MVAL_03556 VIRGELINA RAMIREZ LEON
SEGUIMIENTOS FEBRERO 10 DE 2023	
	
MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ	MV_42865 IDU ERISINDA DURAN
	
MV_428851 IDU FLOR ELISA ROMERO	MV_42883 IDU CLARA ISABEL ALDANA

	
MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA	MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA
SEGUIMIENTOS FEBRERO 13 DE 2023	
	
MVAL_03467 FABIO ALFREDO OSPINA	MVAL_03556 VIRGELINA RAMIREZ LEON
	
MVAL_03466 CLEMENCIA CASTEBLANCO	MVAL_03466 CLEMENCIA CASTEBLANCO
SEGUIMIENTOS FEBRERO 15 DE 2023	
	
MVJ_0133 HERMENCIA GCHA CALLEJAS	MVJ_0123 MARIA ALCIRA NUÑEZ
	
MVJ_0123 MARIA ALCIRA NUÑEZ	MVJ_00121 RODRIGO JIMENEZ SAENZ

	
MVJ_0142 ABEL MATEUS RUIZ	
SEGUIMIENTO FEBRERO 16 DE 2023	
	
MVAL_03567 AIDE TRIANA LEON ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVAL_03567 AIDE TRIANA LEON ACOMPAÑAMIENTO SDHT
SEGUIMIENTO FEBRERO 17 DE 2023	
	
MVAL_02569 NURIAN BALLEN SALCEDO	MVAL_02569 NURIAN BALLEN SALCEDO
SEGUIMIENTOS FEBRERO 22 DE 2023	
	
MV_42881 IDU LUIS AURELIO ROJAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MV_42881 IDU LUIS AURELIO ROJAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT

	
MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA ACOMPAÑAMIENTO SDHT
SEGUIMIENTO FEBRERO 23 DE 2023	
	
MVAL_02569 NURIAN BALLEN SALCEDO	
SEGUIMIENTOS FEBRERO 28 DE 2023	
	
CIERRE PQRS MVJ_0120 HENRY VARGAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT	CIERRE PQRS MVJ_0120 HENRY VARGAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVJ_0123 MARIA ALCIRA NUÑEZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVJ_0123 MARIA ALCIRA NUÑEZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVJ_0142 ABEL MATEUS RUIZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVJ_0142 ABEL MATEUS RUIZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT

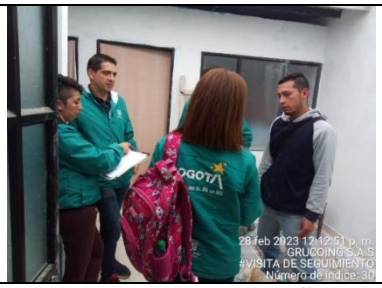	
MV_42881 IDU LUIS ROJAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MV_42881 IDU LUIS ROJAS ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVCB_5557 LUZ MARINA ZULUAGA ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT	MVCB_4859 EVELIA MUÑOZ ACOMPAÑAMIENTO SDHT
	
Visita de seguimiento con SDHT caso especial beneficiaria Julia Cecilia Torres MVAL_02019	Visita de seguimiento con SDHT caso especial beneficiaria Julia Cecilia Torres MVAL_02019
	
Visita de seguimiento MVAL_1660 Jesson fernando valencia olmos 10/02/2023	Visita de seguimiento Gladys Ines Basto MVAL_01865 10/02/2023

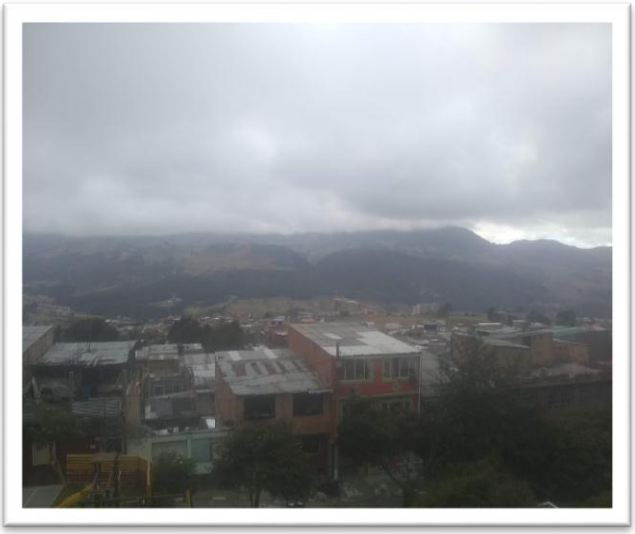

INFORME MENSUAL 06 SST

Contrato 1010 DE 2022

OBJETIVO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMIN IDTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.

INTERVENTORÍA

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	1010 DE 2022
OBJETIVO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.
INTERVENTORÍA	**GRUCOING SAS**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	ENERO 31 DE 2023
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022 CONTRATO **N°** 993-2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	DICIEMBRE 31 DE 2023
PRORROGA TERMINACIÓN CONTRATO	ADICIÓN PRÓRROGA N°1 AL CONTRAO DE OBRA N°993 DE 2022
PERIODO DE INFORME	Febrero 01 al 28 del 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ____ **4**

2. SEGUIMIENTO DE VALIDACIÓN ____ ***6***

3. SEGUIMIENTO INICIO DE OBRA ____ *8*

4. SEGUIMIENTO FINALIZACIÓN DE OBRA ____ *10*

5. PERSONAL DE OBRA ____ *11*

6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ____ *21*

7. CAPACITACIONES E INSPECCIONES ____ *21*

8. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP´S) ____ *22*

9. ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CUBIERTA ____ *22*

10. RETIRO DE PERSONAL ____ *35*

11. ANEXOS ____ *35*

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al contrato No 1010 de 2022, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1 - 2 Y 3 2022"; LA INTERVENTORÍA GRUCOING S.A.S.

Interventoría GRUCOING S.A.S, realiza el seguimiento, acompañamiento y verificación de estándares y los requisitos legales, normativos aplicables al desarrollo del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido 01 al 28 de febrero del 2023, en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar, las viviendas subsidiadas, en estas dos localidades para el grupo 03 corresponden a 290 viviendas que serán intervenidas.

Se realizó recorridos de seguimiento y supervisión por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM** e interventoría **GRUCOING S.A.S,** en los frentes de trabajo, siendo estos cada una de las viviendas en ejecución de obras.

Durante este mes se han realizado los seguimientos de seguridad y salud en el trabajo en compañía del personal SST del contratista e interventoría, se han realizado las visitas a las viviendas en ejecución de obra ciudad Bolívar barrios Bella Flor, Paraíso, Juan Pablo, y Usme, al personal operativo se le han realizado diferentes sensibilizaciones correspondientes al buen trato, recordar los canales de comunicación, dejando constancia en los formatos de capacitación, se verifica el uso de la dotación, se evidencia correctamente separación y recolección de los diferentes residuos de construcción, se ha verificado el acopio y uso de las lonas para el material particulado arenas amarilla de río, como recolección de los RCD´S para luego ser recogidos y llevados a Cemex de Tunjuelito para la disposición final de los mismos, de las herramientas y equipos las cuales estaban en uso durante los recorridos se les realizo su inspección y diligenciamiento de la lista de chequeo.

Se ha dejado en las bitácoras los registros de los seguimientos realizados en cada vivienda.

Durante este mes se han realizado validaciones de viviendas, previamente programado con los beneficiarios convenientes a la visita de levantamiento de plano y toma de medidas para realizar presupuesto de las zonas a intervenir, durante esta actividad el personal administrativo la parte técnica, social y sst. Ingresan a la vivienda se verifica el uso de la chaqueta correspondiente al contrato.

Se han realizado aperturas inicio de obras, el personal administrativo parte técnica, social, sst y el personal operativo o encargados de frentes se realiza inicio de obra, se hace la verificación al personal operativo ya ingresé a la vivienda con la dotación de dos piezas de cuerdo al manual de marca de la alcaldía, que se dé uso de elementos de protección personal gafas, botas de seguridad guantes y en cambio de cubierta casco de seguridad.

También se han realizado cierre de viviendas, culminando el mejoramiento de vivienda por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realiza verificación de aseo zonas intervenidas, recolección de los materiales sobrantes, dejar el frente de la vivienda sin lonas con material RCD´S.

USME Y CIUDAD BOLIVAR	**BARRIO**	**N° MEJORAMIENTOS**
USME	Puerta al Llano Sector 1	49
	Puerta al Llano Sector 2	16
	El Refugio 1 y 2	22
CIUDAD BOLIVAR	Bella Flor	03
TOTAL	**290**	

Tabla relación de viviendas adjudicadas en el sector

2. SEGUIMIENTO DE VALIDACIÓN

Identificación del beneficiario, ubicación del predio, en común acuerdo programación de visita para validar la vivienda, presentación del proyecto y del personal administrativo contratista e interventoría, diligenciamiento de formatos por parte de área social (verificación impuesto predial, ingreso núcleo familiar y verificación al sistema de salud) personal sst (acompañamiento al grupo) personal técnico (realiza verificación de las instalaciones, toma de medidas, se van revisando las actividades y áreas que se pueden ejecutar al interior de la vivienda, se realiza a mano alzada un esquema de la vivienda).

A la fecha se han realizado un total de 289 validaciones.

Durante este mes se llevaron a cabo 51 validaciones.

2.1 Validaciones- Número de Expediente

No	stickers	MV	NOMBRE	VALIDACION
1	254	MVAL_01923	ESTHER COCA	1/02/2023
2	237	MVAL_01825	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	1/02/2023
3	252	MVAL_01928	FABIAN AUGUSTO CALDERON CALDERON	1/02/2023
4	221	MVAL_02281	WILSON PARAMERO TORRES	2/02/2023
5	220	MVAL_02267	MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA	2/02/2023
6	219	MVAL_02269	JOSE MANUEL BOGOTA MORENO	2/02/2023
7	234	MVAL_01800	GABRIEL AGUILAR RUBIANO	3/02/2023
8	251	MVAL_01976	AZUCENA LOZADA	3/02/2023
9	231	MVAL_02119	AMINTA NAVARRO	3/02/2023
10	230	MVAL_02134	MIGUELINA CORDOBA CORDOBA	3/02/2023
11	259	MVAL_02687	MARINA PAVA	6/02/2023
12	261	MVAL_02594	WILSON AGUIRRE	6/02/2023
13	262	MVAL_02595	MARIA ESNEDA HENAO	6/02/2023
14	263	MVAL_02596	ANA GRACIELA BAQUERO SUCUNCHOQUE	6/02/2023
15	232	MVAL_01764	SANDRA CAROLINA HOYOS LEGUIZAMON	6/02/2023
16	233	MVAL_01783	LUCRECIA GONZALEZ CHAVEZ	6/02/2023
17	268	MVAL_02655	ISABEL GALEANO GARCIA	7/02/2023
18	270	MVAL_02639	MARIA CONSTANZA CASTAÑEDA GARZON	7/02/2023
19	290	MVAL_03572	ROSA ELVIRA ACEVEDO CUELLAR	7/02/2023
20	289	MVAL_03569	JOSE YUBER CHACON	7/02/2023
21	293	MVAL_03604	GABRIELA NAIDENAMA FARIYAÑO	7/02/2023
22	244	MVAL_01846	CELIAR GARZON CASTAÑEDA	8/02/2023
23	217	MVAL_02230	CARLOS AUGUSTO MANCERA BAQUERO	8/02/2023
24	223	MVAL_02296	MARIA ABDONA AVILA	8/02/2023
25	222	MVAL_02302	LIZETH STHEFANY TORRES HERNANDEZ	8/02/2023
26		MVJ_00838	LUCRECIA CHACON ALGARZA	8/02/2023
27	269	MVAL_02657	ZORAIDA YASMIN MORENO ARIAS	9/02/2023
28	266	MVAL_02612	JENNY YAZMIN TORRES NUVAN	9/02/2023
29	267	MVAL_02650	ANTONIO DIAZ SEPULVEDA	9/02/2023
30	224	MVAL_02321	EMILCEN GUARNIZO CRUZ	9/02/2023
31	225	MVAL_02348	RUTH ELIZABETH DIAZ SALCEDO	9/02/2023
32	280	MVAL_03461	GERONIMO SANTOS POBLADOR BELTRAN	9/02/2023
33	277	MVAL_03453	SARA GARCIA MACHUCA	11/02/2023
34	296	MVAL_03660	NATALIA CELIS ANACONA	11/02/2023
35	295	MVAL_03666	JOSE NEFTALI GOMEZ GONZALEZ	11/02/2023
36	292	MVAL_03594	YOLANDA GARCIA	11/02/2023
37	294	MVAL_03607	JENNY KATERINE ESPITIA RODRIGUEZ	11/02/2023
38	271	MVAL_02621	BETSABE GONZALEZ VARGAS	13/02/2023
39	236	MVAL_01830	GLADYS BAQUERO PARRA	13/02/2023
40	227	MVAL_02141	TARGELIA CORTES BENAVIDES	13/02/2023
41	226	MVAL_02323	MARIA NANCY ESTEBAN VARGAS	13/02/2023
42	279	MVAL_03459	MARTHA LILIA CORREALES RUEDA	13/02/2023
43	235	MVAL_01831	OSCAR ORLANDO LOPEZ	13/02/2023
44	275	MVAL_03442	RAUL RODRIGUEZ QUIMBAYO	13/02/2023
45	276	MVAL_03443	JAIRO GALLEGO VALENCIA	13/02/2023
46	278	MVAL_03458	NEILA GUTIERREZ PATARROYO	13/02/2023
47	265	MVAL_02609	RICARDINA MANQUILLOGUEVARA	14/02/2023
48	272	MVAL_02622	HAROLD CARDOZO CARDOZO	14/02/2023
49	273	MVAL_02625	MARIA ENERIETH CARMONA HIDALGO	14/02/2023
50	274	MVAL_02630	ADELA RUIZ GOMEZ	14/02/2023
51	264	MVAL_02604	NARIA CRISTINA ARANGO CHAVEZ	27/02/2023

3. SEGUIMIENTO INICIO DE OBRA

Programación de visita, se lleva la bitácora de la vivienda, se llevan los presupuestos los cuales el personal técnico socializa, estos corresponden a las actividades que se realizarán en la vivienda, se presenta al maestro o encargado de obra. Se realiza diligenciamiento del formato de autorización de la vivienda.

Personal técnico, informa basado en el presupuesto las actividades que se llevarán a cabo, se informan las áreas a intervenir a su vez para que el beneficiario pueda ir liberando zonas de trabajo

Personal Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta al beneficiario al maestro o encargado, quien va uniformado, se realiza inducción, personal debe ya debe tener o si es el caso se realiza la inducción y divulgación de riesgos.

A la fecha se han realizado un total de 273 inicios de obra.

Durante este mes se llevaron a cabo 106 inicios de obra.

3.1 Inicio de obra- Número de Expediente

No	stickers	MV	NOMBRE	APERTURA
1	247	MVAL_02021	ELSA MARINA AVILA RONDON	1/02/2023
2	163	MVJ_0072	ANGELICA GIRALDO MURILLO	2/02/2023
3	164	MVJ_0103	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS	2/02/2023
4	165	MVJ_0115	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARCIA	2/02/2023
5	166	MVJ_0116	GLADYS INES BASTOS	2/02/2023
6	168	MVPA_1909	JAIME MURILLO ROJAS	2/02/2023
7	174	MVPA_973	MARIA JACQUELINE GUEVARA ORDUÑA	2/02/2023
8	180	MVPA_144	JOSE MARTIN DIAZ	2/02/2023
9	182	MVPA_0529	AURA MARIA SEPULVEDA CORONADO	2/02/2023
10	135	MVJ_0121	RODRIGO JIMENEZ SAENZ	3/02/2023
11	136	MVJ_0123	MARIA ALCIRA NUÑEZ	3/02/2023
12	139	MVJ_0142	ABEL MATEUS RUIZ	3/02/2023
13	142	MVJ_0133	HERMENCIA GACHA CALLEJAS	3/02/2023
14	200	MV_42881IDU	LUIS AURELIO ROJAS VELAZQUEZ	3/02/2023
15	245	MVAL_01882	CLARIVEL LOPEZ RODRIGUEZ	3/02/2023
16	228	MVAL_02137	HUMBERTO URIBE GUTIERREZ	7/02/2023
17	229	MVAL_02136	ENELIZAR GUERRERO PEÑA	7/02/2023
18	250	MVAL_02424	MARIA NELLY GUERRERO MATUTE	7/02/2023
19	282	MVAL_03466	CLEMENCIA CASTELBLANCO PARADA	7/02/2023
20	288	MVAL_03467	FAVIO ALFREDO GARCIA OSPINA	7/02/2023
21	140	MVJ_0124	EFREN PRIETO MATIZ	8/02/2023
22	210	MVAL_02179	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	8/02/2023
23	213	MVAL_01749	CLARA MERCEDES MELO ZUTANEME	9/02/2023
24	246	MVAL_02028	JAVIER OSWALDO OCHOA SANCHEZ	9/02/2023
25	261	MVAL_02594	WILSON AGUIRRE	9/02/2023
26	285	MVAL_03556	VIRGELINA RAMIREZ LEON	9/02/2023
27	183	MVPA_0502	JOSE FERLEIN AMADO BERNAL	13/02/2023
28	149	MVJ_0044	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ	14/02/2023
29	158	MVJ_0024	MIRYAM CRUZ ARIZA	14/02/2023
30	161	MVJ_0013	MARIO EDGAR DIAZ MORENO	14/02/2023
31	162	MVJ_0003	GLORIA YAMIL LEON PATIÑO	14/02/2023
32	230	MVAL_02134	MIGUELINA CORDOBA CORDOBA	15/02/2023
33	234	MVAL_01800	GABRIEL AGUILAR RUBIANO	15/02/2023
34	237	MVAL_01825	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	15/02/2023
35	212	MVAL_02193	MERCEDES PINEDA	16/02/2023
36	214	MVAL_02213	ALICIA SEGURA GOMEZ	16/02/2023
37	218	MVAL_02243	MARTHA ESPERANZA CASTRO GOMEZ	16/02/2023
38	249	MVAL_02407	FABIO HERNAN UYAZA BELTRAN	16/02/2023
39	150	MVJ_137	MARIA HERMENCIA PAEZ DE JIMENEZ	17/02/2023
40	151	MVJ_0032	MARGARITA HELENA BARON RODRIGUEZ	17/02/2023
41	153	MVJ_0127	EMILCE ALARCON DELGADO	17/02/2023
42	157	MVJ_0120	HENRY VARGAS BARRETO	17/02/2023
43	217	MVAL_02230	CARLOS AUGUSTO MANCERA BAQUERO	17/02/2023
44	219	MVAL_02269	JOSE MANUEL BOGOTA MORENO	17/02/2023
45	220	MVAL_02267	MARGARITA RODRIGUEZ HERRERA	17/02/2023
46	221	MVAL_02281	WILSON PARAMERO TORRES	17/02/2023
47	232	MVAL_01764	SANDRA CAROLINA HOYOS LEGUIZAMON	17/02/2023
48	235	MVAL_01831	OSCAR ORLANDO LOPEZ	17/02/2023
49	251	MVAL_01976	AZUCENA LOZADA	17/02/2023
50	252	MVAL_01928	FABIAN AUGUSTO CALDERON CALDERON	17/02/2023
51	253	MVAL_01924	DIANA MARCELA RUBIO DELGADO	17/02/2023

52	255	MVAL_01916	LUZ MARY VIRACACHA MORENO	17/02/2023
53	256	MVAL_02453	MERY PARRA CASTELLANOS	17/02/2023

4. SEGUIMIENTO FINALIZACIÓN DE OBRA

Se realiza la verificación y culminación de todas las actividades de obra, se verifica la funcionalidad de los servicios público, las instalaciones de griferías, se verifica la recolección de materiales de obra sobrantes, se realiza la recolección y verificación de no dejar residuos de construcción o demolición en la vivienda, se realiza cierre de la bitácora la cual es firmada por el beneficiario, el personal administrativo del contratista y personal de interventoría.

Se realiza entrega del manual de uso y se realiza registro fotográfico de todo el personal en la entrega.

A la fecha se han realizado un total de 44 finalizaciones de obra.

Durante este mes se llevaron a cabo 161 finalizaciones de obra.

4.1 Finalización- Número de expediente

No	stickers	MV	NOMBRE	CIERRE FORMAL
1	3	MVAL_02585	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA	2/02/2023
2	186	MVBF_383	LEIDY VIVIANA GONZALEZ CARO	3/02/2023
3	190	MVBF_440	NOHEMY PINTO	3/02/2023
4	115	MV_1470	ALBA GLADYS VELOZA CASTRO	3/02/2023
5	209	MVBF_514	ISAIAS MORATO CASTIBLANCO	3/02/2023
6	189	MVBF_403	JOSE IGNACIO RIASCOS	6/02/2023
7	67	MV_1293	ROSA DELIA CASTELLANOS ARIZA	6/02/2023
8	68	MV_1299	ANGELICA MARIA ORDOÑES FERNANDEZ	6/02/2023
9	129	MV_1499	ROSA ADELINA CASTAÑEDA PEREZ	6/02/2023
10	208	MVBF_513	FAUSTINO RODRIGUEZ	6/02/2023
11	106	MV_1324	JULIO ALBERTO MORENO CRUZ	7/02/2023
12	110	MV_1316	LUIS ARNULFO PARADA NIÑO	7/02/2023
13	95	MV_1660	DORIS ADRIANA OCHOA YAZO	8/02/2023
14	203	MVAL_02676	JESUS EDUARDO MONROY VIVAS	8/02/2023
15	116	MV_1471	CAMILO ORTIZ MORA	9/02/2023
16	119	MV_1476	ARSENIO RAMOS BERNAL	9/02/2023

17	73	MV_1735	ROSA MARIA TORRES GARCIA	13/02/2023
18	204	MVAL_02701	LINDA AURA PAEZ ESQUIVEL	13/02/2023
19	167	MVPA_1226	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO ROMERO	13/02/2023
20	169	MVPA_1244	MARIA DORAIDA CARRILLO LOPEZ	13/02/2023
21	170	MVPA_1205	ELSA MARIA VERA PORTELA	13/02/2023
22	171	MVPA_1995	MARINELA MIRANDA PIÑEROS	13/02/2023
23	243	MVAL_01852	AMPARO NAVARRO GARCIA	13/02/2023
24	239	MVAL_01864	LILIA RUIZ PEDRAZA	13/02/2023
25	185	MVBF_360	JOSÉ DEL CARMEN MARTINEZ	14/02/2023
26	66	MV_1292	JULIA ESTHER VANEGAS NOVOA	14/02/2023
27	125	MV_1483	NOREDIS RODRIGUEZ POLOCHE	14/02/2023
28	131	MV_1487	JORGE GONZALEZ TRIVIÑO	14/02/2023
29	205	MVAL_02641	ROSIO HERNANDEZ PATIÑO	14/02/2023
30	207	MVBF_494	MARIA NIDIA MANTILLA CAICEDO	14/02/2023
31	128	MV_1485	EGMIDIO MARTINEZ MEDINA	20/02/2023
32	240	MVAL_01865	BERNARDO FUENTES	20/02/2023
33	242	MVAL_02101	JOSE ELIECER OSPINA MENDOZA	20/02/2023
34	132	MVTT_0320	MARIA MYRIAM MAHECHA CAMACHO	22/02/2023
35	247	MVAL_02021	ELSA MARINA AVILA RONDON	24/02/2023
36	228	MVAL_02137	HUMBERTO URIBE GUTIERREZ	24/02/2023
37	210	MVAL_02179	LUIS ALBERTO PLAZAS MORENO	24/02/2023
38	36	MVAL_01959	JOSE MIGUEL MORENO PARADO	27/02/2023
39	238	MVAL_01860	LUDIA MAGDALENA MORENO	27/02/2023
40	241	MVAL_01871	JOSE DAVID ROMERO VELASCO	27/02/2023
41	237	MVAL_01825	MIGUEL ANTONIO TELLEZ BORDA	27/02/2023
42	229	MVAL_02136	ENELIZAR GUERRERO PEÑA	27/02/2023
43	195	MV_42883IDU	CLARA ISABEL ALDANA	28/02/2023
44	166	MVJ_0116	GLADYS INES BASTOS	28/02/2023

5. PERSONAL DE OBRA

Personal contractual y activo en el presente frente de trabajo Grupo 03.



INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL 06

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
1	CUBILLOS GONZALEZ GUILLERMO	349097	30/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
2	VASQUEZ MARTINEZ JAVIER	1069747960	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	11/09/2022	SI	SI	27/06/2023
3	MALAGON BARRERO JIMMY FABIAN	1069744051	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	01/09/2022	SI	SI	27/06/2023
4	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON	11406871	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
5	FANDIÑO FLOREZ EMITZO	85469924	25/07/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
6	CANTILLO OCAMPO NEIL	72301746	23/07/2022	POSITIVA	COOPSALUD	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
7	MENDOZA GAMEZ LUIS CARLOS	17971346	25/07/2022	POSITIVA	ALIANSALUD	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
8	LOPEZ DIAZ FABIO NELSON	80124049	15/02/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
9	PARRA AYALA CRISTIAN ALEXANDER	1033741086	26/07/2022	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
10	CASSIANI MOLINA MANUEL	73266692	23/07/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
11	CARDENAS NARVAEZ DAIRO	1043606888	03/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
12	RAMIREZ PERALTA HELI	79734766	21/08/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	21/09/2022	SI	SI	
13	GUZMAN COLLANTE MARTIN	77165310	03/08/2022	POSITIVA	SURA	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
14	LOPEZ MOLINA BRAYAN STIVEN	1024602801	04/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
15	GUIO ROZO CARLOS	2965889	04/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
16	GOMEZ GALEANO YILVER	1033816602	07/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
17	LOZANO GUTIERREZ JHON	1108929715	07/08/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
18	OSORIO HERNANDEZ ANTONIO	79656535	07/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
19	SAIZ GOMEZ LUIS	80118884	07/08/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
20	CAÑON CARRILLO ALIRIO	1057014684	07/08/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
21	CASTILLO JESUS RAMON	PT 6745683	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
22	CASTILLO FIGUEROA SERGIO	PT 7063564	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
23	CASTILLO FIGUEROA RAFAEL	PT 6745484	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
24	BALDOVINO CARDEÑO LEYDER	1010052109	27/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
25	SAUMETH PALENCIA CARLOS	1081917695	23/09/2022	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION	CLINISUR	29/09/2022	SI	SI	
26	ALVAREZ ALFARO JHONATAN	1048467840	27/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
27	ACOSTA TOVAR ANDRES	80775180	28/09/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
28	CORTES PEÑA JOSE	3214339	28/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
29	RUBIO HERRERA FRANKLIN	1032388322	28/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
30	GOMEZ CASTILLO DEIVER	1033694434	29/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
31	SALGE RODRIGUEZ ANGEL	5084025	27/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
32	ROJAS ENDER	PT 2100970	03/10/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	03/10/2022	SI	SI	
33	CUELLAR GONGORA DALADIER	79637053	21/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	06/10/2022	SI	SI	
34	MERGAREJO VARGAS LUIS	1045309207	10/10/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	CLINISUR	06/10/2022	SI	SI	



N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
35	BLANCO VICTOR	PT 6683921	03/10/2022	POSITIVA	COOPSALUD	PORVENIR	CLINISUR	03/10/2022	SI	SI	
36	MENDEZ PORTALES EDWIN	PT 6688148	04/10/2022	POSITIVA	COOPSALUD	PORVENIR	CLINISUR	03/10/2022	SI	SI	
37	CESPEDES MIQUELENA ROBER	PT 5751410	12/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	pte por fecha	03/10/2022	SI	SI	
38	CAÑON CARRILLO JOSE	1010199482	07/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	06/10/2022	SI	SI	
39	ALEXANDER RAMIREZ CASTRO	79986225	20/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	06/10/2022	SI	SI	
40	ARIAS GONZALEZ WILLIAM	80063977	15/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	13/10/2022	SI	SI	
41	GUZMAN COLLANTE MARTIN	77165310	20/09/2022	POSITIVA	SURA	COLFONDOS	CLINISUR	13/10/2022	SI	SI	
42	TALAVERA MOTAS JONATHAN	PT 5961358	08/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	03/10/2022	SI	SI	07/04/2023
43	UBAQUE URREGO LUIS	79605327	15/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	13/10/2022	SI	SI	
44	VIZCAINO VENENCIA JORGE	72158125	24/09/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	CLINISUR	13/10/2022	SI	SI	
45	LOPEZ PORTILLA MIGUEL	PT5763050	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	13/10/2022	SI	SI	
46	VENENCIA SARABIA JOSE EDINSON	72120789	20/09/2022	POSITIVA	CAJACOPI	PORVENIR	CLINISUR	21/10/2022	SI	SI	
47	VENENCIA MORENO YOEDINSON	1101879446	20/09/2022	POSITIVA	COPSALUD	PORVENIR	CLINISUR	21/10/2022	SI	SI	
48	SOTO PEREZ JOHN ALEXANDER	79995662	21/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	18/10/2022	SI	SI	
49	CHAVES PARRA JORGE ENRIQUE	19428589	20/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	18/10/2022	SI	SI	
50	SALAZAR CARREÑO ROBERT JOSE	PT 5010117	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	29/01/2023
51	MORENO HUERTAS FERNANDO	3199429	16/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	21/10/2022	SI	SI	25/02/2023
52	HERNANDEZ ZAMBRANO GERARDO ANTONIO	11254309	23/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	IPS MEDICENTER	25/09/2022	SI	SI	
53	DIAZ VELANDIA ALIRIO	79570885	01/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
54	ORTIZ COMAS DAIRO	1081837233	30/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	IPS MEDICENTER	02/11/2022	SI	SI	09/04/2023
55	GALEON GUTIERREZ DUVAN STIVEN	1001274099	01/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLFONDOS	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
56	AMESTY REVEROL ENRIQUE	PT 5263506	03/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
57	QUIÑONES MEZA EVER	87431903	02/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
58	BUELVAS SIERRA GEOVANNY	1140822409	30/08/2022	POSITIVA	COOPSALUD	PORVENIR	IPS MEDICENTER	02/11/2022	SI	SI	17/04/2023
59	CUERVO HERRERA GERMAN	71379307	01/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
60	SANCHEZ LARA HERNAN	1022970444	01/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	JUAN CARLOS MARTINEZ OCUPACIONAL	02/11/2022	SI	SI	16/01/2023
61	PEREZ HERRERA HUGO	1033688834	01/11/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
62	GIL VASQUEZ JORGEN	PT 5692757	01/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
63	CARRILLO LEANDRO	72174994	01/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
64	CASTELLANOS CASTAÑEDA LUIS ANTONIO	79063927	04/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
65	RIZO MIRANDA VICTOR	1066097223	02/11/2022	POSITIVA	MULTUASER	PROTECCION	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
66	CALVO TORRES YORGELIS	PT 2832993	08/03/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
67	MENDOZA BARRIOS FEDERICO	PT 5474978	27/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	08/11/2022	SI	SI	
68	LOPEZ FRANCO FRANCISCO	7330725	26/07/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	OLAYA	08/11/2022	SI	SI	
69	GRAYSMITH CASTAÑEDA JOHAN	1077920758	09/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	08/11/2022	SI	SI	
70	PEDROZO QUIROZ LUIS FELIPE	1050782204	02/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	08/11/2022	SI	SI	06/10/2023
71	CARRASQUEL CARRASQUEL RICHART	PT 7423807	24/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	08/11/2022	SI	SI	
72	ALCIDES JOSE RODRIGUEZ LUJANO	6726606	01/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
73	BARBOSA GRANADOS BRALLAN	1001273885	04/10/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
74	GARCIA MORALES CRISTIAN	1122136788	18/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
75	ROMERO LOPEZ EDSON JHOAN	1024604236	17/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	12/08/2023
76	MERCADO DIAZ ESLEIDER	1002067206	28/09/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
77	MORAN PARADA FLOR	PT 5195260	09/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	15/11/2022	SI	SI	
78	ISRAEL BARBOSA	7490364	18/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	DR. UBSIMAR	17/11/2022	SI	SI	07/10/2023
79	ORTEGON BLANCO JHON STEVEN	1001271233	18/11/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
80	BARRERA BRICEÑO JOSE	80801214	04/10/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
81	HERAZO VALDES JUAN	79476251	16/09/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
82	AMAYA ALVAREZ NORBERTO	1033687438	10/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	15/11/2022	SI	SI	
83	GOMEZ SUAREZ PETER	1010189363	15/11/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	CLINISUR	15/11/2022	SI	SI	
84	QUIÑONES CABEZAS ARIZMENDI	1059446395	13/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
85	ESCAMILLA PEREZ RODRIGO MANUEL	72120459	29/09/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
86	PORRAS GONZALEZ SNEYDER	1070328301	15/11/2022	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	CLINISUR	15/11/2022	SI	SI	
87	TORRES FLORES WILFREDO	PT 7137076	08/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	02/11/2022	SI	SI	
88	HERAZO PEREZ WILLY JOSE	1051362748	16/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	CLINISUR	17/11/2022	SI	SI	
89	AMESTY GIL ADONIS	5169084	30/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
90	RAMIREZ CASTRO ALEXANDER	79986225	20/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
91	CORTES GUERRERO ANDRES	PT 5773861	18/11/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
92	SILVA RAMIREZ CRISTIAN	1001271816 S	21/11/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	24/11/2022	SI	SI	
93	VELASQUEZ ANGULO FABIO	80777897	30/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
94	BENITE PEREA FAIVER	1076816082	15/11/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
95	MENDOZA BARRIOS FEDERICO	PT 5474978	27/10/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
96	SANCHEZ SANDOVAL PEDRO FREDY	11523523	07/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
97	OVALLE YUNDA JHOAN	1000622069	15/11/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
98	VELASQUEZ ANGULO JHON	86065185	30/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
99	ROJAS QUINTERO JHONNY	5855467	26/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
100	ARIZA GALEANO JOSE ANGEL	79666063	16/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
101	DIAZ ORTIZ JOSE	1022992366	21/11/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	24/11/2022	SI	SI	
102	MARTINEZ ROJAS JOSE	1047425882	21/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	24/11/2022	SI	SI	
103	ROMERO LOPEZ LUIS	1065855982	26/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	STA HELENA SAS	01/12/2022	SI	SI	17/02/2023
104	SANCHEZ MOTTA LUIS	79950855	26/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
105	HURTADO MOSQUERA OFERNO	11936862	15/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
106	CAMPOS ROMERO OSCAR	PT 7215394	22/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
107	SANCHEZ CLAROS YEFERSON	1031133072	07/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	01/12/2022	SI	SI	
108	ROZO CARDENAS FREDY	80745351	30/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECION	CLINISUR	09/12/2022	SI	SI	
109	PEROZO ROMERO JUAN	PT 7082037	16/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	24/01/2023	SI	SI	
110	ZAVALA ALVAREZ WUILLIAN	PT 6069550	16/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	24/01/2023	SI	SI	
111	MERGAREJO VARGAS LUIS	1045309207	10/10/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	CLINISUR	24/01/2023	SI	SI	
112	PULIDO CONDE ALBEIRO	79607880	13/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
113	PERDOMO CABEZAS CESAR	93151016	13/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
114	RODRIGUEZ PANCHE EDWIN	1024510813	15/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
115	GARRIDO VIRGUEZ ERICK	6493955	15/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
116	BERNAL PARRA FABIO ISRAEL	1118540194	06/12/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
117	ORTIZ LOPEZ ISAAC	19017530	09/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	15/12/2022	SI	SI	
118	NARVAEZ PEREZ JOSE	1049947824	05/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
119	RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MERY	52456065	04/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	COMPENSALUD	13/02/2023	SI	SI	
120	QUIÑONES QUIÑONES GEOVANNY	87431985	26/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	13/02/2023	SI	SI	

GRUCOING
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT
BOGOTÁ

INFORME MENSUAL 06

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
121	QUIÑONES CABEZAS JORGE	87432150	26/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	13/02/2023	SI	SI	
122	SOLAR PERALTA FABER	84086165	10/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
123	LOZANO GUTIERREZ ANDREY	1024520452	09/08/2022	POSITIVA	COMPENSAR	COLFONDOS	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
124	PANCHE MARENTES GUSTAVO	80380671	13/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
125	ZAMBRANO LOZANO NELSON	80368960	21/09/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	MEDICENTER	18/12/2022	SI	SI	
126	HERNANDEZ FERRER GABRIELA	PT 6717014	15/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSALUD	16/12/2022	SI	SI	
127	LEYVA TORRES PABLO	1013589445	25/07/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
128	FONTALVO RUIZ JHONATAN	1118851715	10/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	CLINISUR	26/12/2022	SI	SI	
129	ROZO ACOSTA JORGE	1023881319	13/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
130	JIMENEZ SANCHEZ JOSE ALFREDO	79806500	04/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
131	NEGRETTE JUAN	PT 5296981	15/12/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
132	EPIEYU MONTIEL JULIO	PT 5623699	26/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
133	HERNANDEZ UZCATEGUI LILIBETH	PT 4917543	15/12/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	COMPENSALUD	26/12/2022	SI	SI	
134	GRAYSMITH CASTAÑEDA JOHAN	1077920758	09/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
135	AREVALO MARENTES MISAEL	80452915	13/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
136	ROSALES CABELLO SAMUEL DAVID	PT 6091466	16/01/2023	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023			
137	ANAYA CABALLERO PEDRO	PT 5639462	15/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
138	MORALES MARTINEZ ANDRES FRANCISCO	16015262	04/09/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
139	JIMENEZ RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	1001077238	04/10/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
140	QUEVEDO GONZALEZ JULIO CESAR	3061776	09/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
141	REINA PIRELA WINDER	PT 5334608	12/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COMPENSALUD	20/03/2023	SI	SI	
142	AREVALO PEDRO NELSON	80746077	13/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
143	MORALES PEÑA JHOAN SEBASTIAN	1000789879	08/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
144	OROZCO LINDAWBER	10013855	15/12/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	19/12/2022	SI	SI	
145	RAMIREZ VALDES MANUEL ENRIQUE	1236440480	26/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
146	LEITON ALVAREZ LUIS	1023863830	09/08/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
147	CALDERA PEROZO CLAUDIO VICENTE	1023863830	09/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
148	TOVAR ALVAREZ FREDY ALONSO	80894735	24/01/2023	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
149	BAUTISTA VALENCIA JEISON MANUEL	1023918212	03/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	COMPENSALUD	20/03/2023	SI	SI	
150	LOZANO GUTIERREZ JHON FREDY	1108929715	24/01/2023	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
151	CARO SUAREZ JOSE HUMBERTO	79057097	18/11/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
152	BARRIOS FONSECA KEVIN JOSE	1034311619	26/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
153	EPIAYU MONTIEL LUIS ARTURO	PT 6353981	26/11/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
154	ALVAREZ SANCHEZ MAIKEL ALEXANDER	PT 6141393	03/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
155	FERNANDEZ GONZALEZ RICHELL JOSE	1140371927	18/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
156	MONTAÑEZ LOPEZ SANTOS MIGUEL	5642281	17/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
157	ORTEGA CABRERA ANJEL ARLEY	80811761	10/02/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
158	VILLEGAS OCHOA DANY JAVIER	PT 5709178	10/02/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
159	VARGAS HERRERA EDWIN ANDRES	1006158053	03/02/2023	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
160	RAMOS YAGUARA JOHN FREDY	80748603	13/02/2023	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
161	VARGAS HERRERA JHONATAN	1193499046	13/02/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
162	RAVELO BLANCO JOSE HENRY	79769383	10/02/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
163	MENDOZA GAMEZ LUIS CARLOS	17971346	26/01/2023	POSITIVA	ALIANSALUD	PORVENIR	MEDICENTER	20/03/2023	SI	SI	
164	VARGAS HERRERA LUIS ALBERTO	1193492533	03/02/2023	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
165	SIERRA HERRERA OSNAIDER	1101449072	15/02/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
166	AGUIAR CAMPOS OVIER	93349859	15/02/2023	POSITIVA	FAMISANAR	COLFONDOS	CLINISUR	20/03/2023			
167	GODOY GOMEZ PEDRO SIMEON	PT 915785	17/01/2023	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
168	FIERRO PINILLA WILLIAN JAVIER	3129756	23/11/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	CONSULTORIO MEDICO RAFAEL GOMEZ	20/03/2023	SI	SI	
169	CASTELLANOS CASTAÑEDA LUIS ANTONIO	79063927			FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
170	CHAVES CASTILLO FABIAN ENRIQUE	80110636	14/10/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
171	MOLINA IBAÑEZ DUBAN FELIPE	1233913852	27/10/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
172	GUERRERO MACANA ALBEIRO	5996412	05/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
173	COBA CASTRO ANDRES AVELINO	3734768	07/10/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
174	WILLIAM ALEXANDER CUESTA ARCE	79978299	26/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
175	CASAS CHAVEZ CRISTHIAN GIOVANNY	1030525271	01/10/2021	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
176	HOYOS GARCES CRISTIAN ALFONSO	1033807092	15/10/2021	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
177	TANGARIFE SALAZAR CRISTIAN	1013682148	20/10/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
178	MARTINEZ AYALA DANIEL JOSE	1048291059	13/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
179	PUENTES NUÑEZ DAVID	80453177	05/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
180	PIRACOCA LOPEZ GIANCARLO	1000952382	01/10/2021	POSITIVA	SANITAS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
181	MOSQUERA MOSQUERA JAISON	11706561	20/10/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
182	ZERPA TOVAR JOAN MANUEL	M 922650031121978	29/09/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
183	BEJARANO FIGUEROA JOSE DANIEL	1106712934	15/10/2021	POSITIVA	ASMET SALUD	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
184	GONZALEZ MOLANO JOSE DE JESUS	79419331	13/10/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
185	MARTINEZ JOSE MILLER	79920132	30/10/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
186	GOMEZ YARA JUAN CARLOS	79663473	16/09/2021	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
187	CAMACHO OVALLE : MICHEL STEVEN	1033730393	13/10/2021	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
188	RODRIGUEZ ACOSTA MICHAEL DAVID	1000781120	29/09/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
189	MOISES DAVID MARTINEZ AYALA	1065664331	20/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
190	OSCAR LEONARDO ZAQUE NOVA	80250455	29/09/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
191	OSORIO RINCON RAUL	79669250	26/09/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
192	PRIETO CARVAJAL ULDARICO	17627361	18/11/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
193	RODRIGUEZ CELIZ WILMAR OTONIEL	1033769134	20/10/2021	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	
194	GARZON GUERRERO WILMER	1033686597	03/10/2021	POSITIVA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	CLINISUR	20/03/2023	SI	SI	

5.1 Personal Interventoría Administrativo

CARGO	NOMBRE	CÉDULA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY	91.158.371
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	JOSÉ ARMANDO ROBAYO PINTO	19.285.027
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	ERICK ALEXANDER VELOZA DÍAZ	1.014.256.912
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3	ÁLVARO SOLANO AGUILAR	91.276.127
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 4	MARITZA LUCÍA VEGA GONZÁLEZ	51.863.568
COORDINADORA SOCIAL	LINA ESTEFANIA CELEITA YATE	1.020.776.203
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 1	JULIÁN GERARDO AREVALO GIRALDO	1.013.604.823
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 2	ANA MARÍA PARDO CORTÉS	1.033.768.806
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 3	DIANA CAROLINA NAVARRO MARTÍNEZ	52.233.027
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 4	SANDRA MILENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	52.738.202
PROF. DE CALIDAD Y SISO INTER 1	AURA MARÍA ALARCÓN GÓMEZ	53.062.532
PROF. DE CALIDAD Y SISO INTER 2	CESAR AUGUSTO GRANADOS MANOSALVA	1.020.743.445
FINANCIERO	VIVIANA URIBE LÓPEZ	63.558.232
JURÍDICO	ROBERTO ARDILA CAÑAS	91.269.210

5.2 Personal Administrativo Contratista

CARGO	NOMBRE	CÉDULA
DIRECTORA DE OBRA	ADRIANA PAOLA MENDEZ NAVARRO	39.582.366
RESIDENTE DE OBRA 1	MAURICIO MARTÍNEZ JEREZ	1.019.004.481
RESIDENTE DE OBRA 2	DAVID JULIÁN FLÓREZ GAMBOA	1.022.332.591
RESIDENTE DE OBRA 3	JUAN ANDRÉS CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358
RESIDENTE DE OBRA 4	JUAN PABLO LEÓN GAONA	1.032.413.097
COORDINADORA SOCIAL	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883
PROFESIONAL SOCIAL 1	JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	1.014.258.624
PROFESIONAL SOCIAL 2	YULY ANDREA CASAS MERCHÁN	1.032.387.457
PROFESIONAL SOCIAL 3	SINDY YESENIA SIERRA MARÍN	1.030.563.658
PROFESIONAL SOCIAL 4	JULIANA CAROLINA GÓMEZ CHIQUIZA	1.033.775.288
PROF. DE CALIDAD Y SISO 1	JHOAN RODRIGO NOREÑA BÁEZ	1.031.148.566
PROF. DE CALIDAD Y SISO 2	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579

5.3 Personal Operativo Contratista

A la fecha se encuentran activos en territorio 194 trabajadores con los cargos de oficiales y ayudantes de la construcción.

Para este mes se reincorporaron los trabajadores retirados por parte del contratista enviaron nuevas carpetas de personal nuevo junto con el personal existente se completan 194 trabajadores activos.

6. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza verificación y se adjunta a este informe las carpetas individuales de cada trabajador contiene afiliaciones al sistema de seguridad social ARL POSITIVA, SURA, EPS, FONDO DE PENSIONES, otros documentos, fotocopia de la cédula de ciudadanía o de identificación, certificado médico, certificado de trabajo en alturas, notificación de riesgos, inducción, examen médico y entrega de Elementos de Protección Personal.

Total, carpeta personal administrativo 13
Total, carpeta personal operativo 194

7. CAPACITACIONES E INSPECCIONES

Por parte del personal seguridad y salud en el trabajo, el contratista realiza las inducciones y notificación de riesgos, de acuerdo con la guía GTC 45, de los siguientes riesgos: riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo físico, riesgo químico, riesgo psicosocial, condiciones de seguridad, riesgo fenómenos naturales y elementos de protección personal, se evidencia el registro en el formato inducción/reinducción (FT-SST-09), formato de notificación de riesgos (sin código) del contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM, se evidencia documento en las carpetas del personal operativo.

Inspección de Pulidora uso 01 - 03 al 22 de Febrero -2023 Equipos Bosch y Makita
Inspección de Taladro uso 09 al 18 Febrero -2023
Inspección andamio tubular 16 / 23 02-2023
Inspección de Andamio 16-02-2023 / 23-02-2023

1. Inducciones — TOTAL 76 trabajadores
2. Trabajo en alturas — 60 trabajadores
3. Uso EPP y Autocuidado — 64 trabajadores

8. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP´S)

Se evidencio uso de dotación chaqueta y pantalones de acuerdo al manual de marca de la alcaldía de Bogotá, junto con la entrega de elementos de protección al personal operativo, correspondientes a las actividades a realizar, tales como: casco de seguridad, gafas deseguridad lente claro, guantes de caucho, guantes de carnaza, acrílicos.

Se evidencio la entrega de dotación al personal nuevo.

9. ACTIVIDADES DE CAMBIO DE CUBIERTA

En los seguimientos y verificación al contratista en las actividades de cambio de cubiertas, se realiza revisión de la implementación de los diseños de ingeniería, de protección contra caídas o medidas colectivas de prevención que den lugar de acuerdo a la altura de la vivienda y sus condiciones estructurales, se implementan medidas preventivas de seguridad, individuales o colectivas que se generen para advertir o evitar la caída de personas y objetos.

Datos a tener presente es la altura de la vivienda, la altura de plataformas de trabajo (andamios, escaleras multifuncionales) y la altura del trabajador, verificando el requerimiento de claridad o espacio libre de caída.

Si se supera altura de trabajo de 2 metros se validará con el personal Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista e interventoría y trabajadores procedimiento para el trabajo en alturas, lineados en la resolución 4272 del 2021 establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Se diligencia Formato INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ENTREGA DE CUBIERTAS, este documento reposa en cada expediente.

ENTREGA DE CUBIERTAS

Mecanismos para ganar altura:

Se están empleando una sección de andamio

Escaleras tipo tijera y escaleras lineales

Plataforma en madera

A la fecha se cuenta con 10 trabajadores formados y con la documentación vigente certificación curso de alturas.

Cuadro: Relación personal activo y aprobado para trabajo en alturas cambio de cubiertas.

N°	DATOS PERSONALES	IDENTIFICACIÓN	FECHA COBERTURA	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	ALTURAS vigentes
1	TALAVERA MOTAS JONATHAN	PT 5961358	08/10/2022	CLINISUR	03/10/2022	07/04/2023
2	SALAZAR CARREÑO ROBERT JOSE	PT 5010117	27/09/2022	CLINISUR	26/09/2022	29/01/2023
3	MORENO HUERTAS FERNANDO	3199429	16/09/2022	CLINISUR	21/10/2022	25-02-2023
4	ORTIZ COMAS DAIRO	1081837233	30/08/2022	IPS MEDICENTER	02/11/2022	09/04/2023
5	BUELVAS SIERRA GEOVANNY	1140822409	30/08/2022	IPS MEDICENTER	02/11/2022	17/04/2023
6	SANCHEZ LARA HERNAN	1022970444	01/11/2022	JUAN CARLOS MARTINEZ OCUPACIONAL	02/11/2022	16/01/2023
7	PEDROZO QUIROZ LUIS FELIPE	1050782204	02/11/2022	CLINISUR	08/11/2022	06/10/2023
8	ROMERO LOPEZ LUIS	1065855982	26/11/2022	STA HELENA SAS	01/12/2022	17-02-2023
9	ROMERO LOPEZ EDSON JHOAN	1024604236	17/11/2022	CLINISUR	17-11-2022	12/08/2023
10	ISRAEL BARBOSA	7490364	18/11/2022	DR. UBSIMAR	17/11/2022	07/10/2023


EXPEDIENTES CAMBIO DE CUBIERTA

MVAL -03556	MVAL - 01959	MVJ - 0123
MVJ -0142	MVPA - 1205	MVPA - 985
MVPA- 0133	MVPA -0529	MVBF-403
MV – 42885 IDU	MV- 42865 IDU	MVCB-4859
MVAL- 4859	MVAL - 02101	MVAL - 01882
MVAL - 02424	MVAL - 03467	N/A

Relación de los expedientes donde se realizó cambio de cubierta:

Al informe mensual se realizó entrega de 17 viviendas con cambio de cubierta.


REGISTRÓ FOTOGRAFICOS

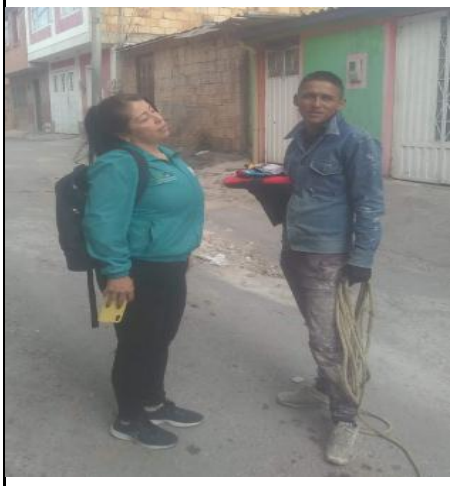ENTREGA DOTACIÓN	ENTREGA DOTACIÓN	ENTREGA DOTACIÓN
		

CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN	CAPACITACIÓN
		

ASEO Y RECOLECCIÓN	ASEO Y RECOLECCIÓN	ASEO Y RECOLECCIÓN
		

USO DOTACIÓN Y EPP	USO DOTACIÓN Y EPP	USO DOTACIÓN Y EPP
		

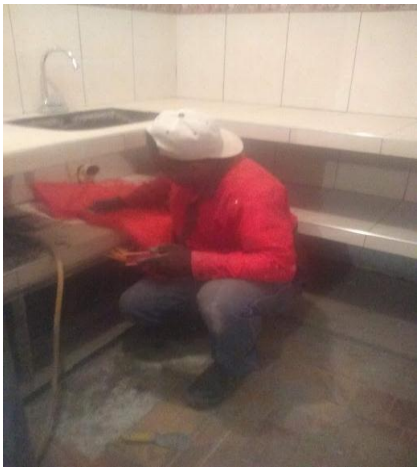USO DOTACIÓN Y EPP	USO DOTACIÓN Y EPP	USO DOTACIÓN Y EPP
		

CAMBIO CUBIERTA	CAMBIO CUBIERTA	CAMBIO CUBIERTA
		

CAMBIO CUBIERTA	CAMBIO CUBIERTA	CAMBIO CUBIERTA
		

PAÑETES	INSTALACIÓN PERFILES PVC	CAMBIO CUBIERTA
		

ACOPIO BODEGA	ACOPIO BODEGA	ACOPIO BODEGA
		

ACOPIO INTERIOR MV	ACOPIO INTERIOR MV	ACOPIO INTERIOR MV
		

ACOPIO INTERIOR MV	ACOPIO INTERIOR MV	ACOPIO INTERIOR MV
		

ENTREGA MATERIALES MV	ENTREGA MATERIALES MV	ENTREGA MATERIALES MV
		

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

VALIDACIONES	VALIDACIONES	VALIDACIONES
		

VALIDACIONES	VALIDACIONES	VALIDACIONES
		

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA
		

INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA
		

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOINTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA	INICIO DE OBRA
		

FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA
		

FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA
		

FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA	FINALIZACIÓN DE OBRA
		

10. RETIRO DE PERSONAL

Para este mes se realizo reincorporación del personal operativo e ingreso de personal nuevo.

Personal administrativo GEPM no se ha presentado retiros.


Consolidación para el sexto informe no se han presentado retiros de personal administrativo de interventoría GRUCOING SAS.

11. ANEXOS

1. FORMATO DE INDUCCION (Formato PDF)
2. FORMATO DE CAPACITACION AUTOCUIDADO – USO EPP
3. CARPETAS DE LA DOCUMENTACION PERSONAL ACTIVO
4. FORMATOS DE INSPECCIONES ANDAMIO- PULIDORA - TALADRO
5. INFORMES EJECUTIVOS DE CAMBIO DE CUBIERTAS (17)
6. INSPECCIÓN DE ANDAMIO
7. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL AHME Y GEPM

Elaborado por:

Aura María Alarcón Gómez



Profesional SST
GRUCOING S.A.S

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

INFORME MENSUAL 06 AMBIENTAL Contrato 1010 DE 2022	**OBJETIVO DEL CONTRATO:** REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMIN IDTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022. INTERVENTORÍA

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

DATOS DEL PROYECTO		
ELABORO	Nombre	Cesar Augusto Granados Manosalva
	Cargo	Ingeniero Ambiental S.A.S
	Firma	

Nº CONTRATO	1010 DE 2022
OBJETIVO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.
INTERVENTORÍA	**Grupo Consultor E Ingenieros S.A.S**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	MARZO 08 DE 2023

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DEOBRA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022 **CONTRATO N°** 993-2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	DICIEMBRE 31 DE 2022
PRORROGA TERMINACIÓN CONTRATO	
PERIODO DE INFORME	FEBRERO 28 2023

GRUCOING GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 06**

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Introducción**
2. **Ubicación**
3. **Objetivos**
4. **Desarrollo**
5. **Conclusiones**
6. **Registro Fotográfico**

1. ***Introducción:***

En la localidad de Ciudad Bolívar y Usme se adelantan trabajos de remodelación para las viviendas asignadas por el Habitat. Tomando en cuenta las actividades ambientales a desarrollar en la zona, se hará énfasis y/o análisis del buen manejo de los residuos de RCD, residuos peligrosos, capacitaciones y orden y aseo.


Se hace indispensable el debido seguimiento a la normatividad ambiental vigente, la cual puede variar considerablemente según las actividades y el tipo de residuo proveniente de cada casa. Por lo anterior, para llevar a cabo un proyecto de construcción de magnitud importante es necesario someterlo a una evaluación de impacto ambiental para minimizar daños en su área y su debido manejo de disposición.

Se tendrá en cuenta las medidas ambientales las cuales generan obligaciones para el contratista y en su entorno, así previniendo los impactos negativos de los residuos generados en obra.


2. ***Ubicación:***

A continuación, veremos la ubicación de la obra la cual se encuentra por medio de mapas señalizando las labores a realizar en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar:


Usme:

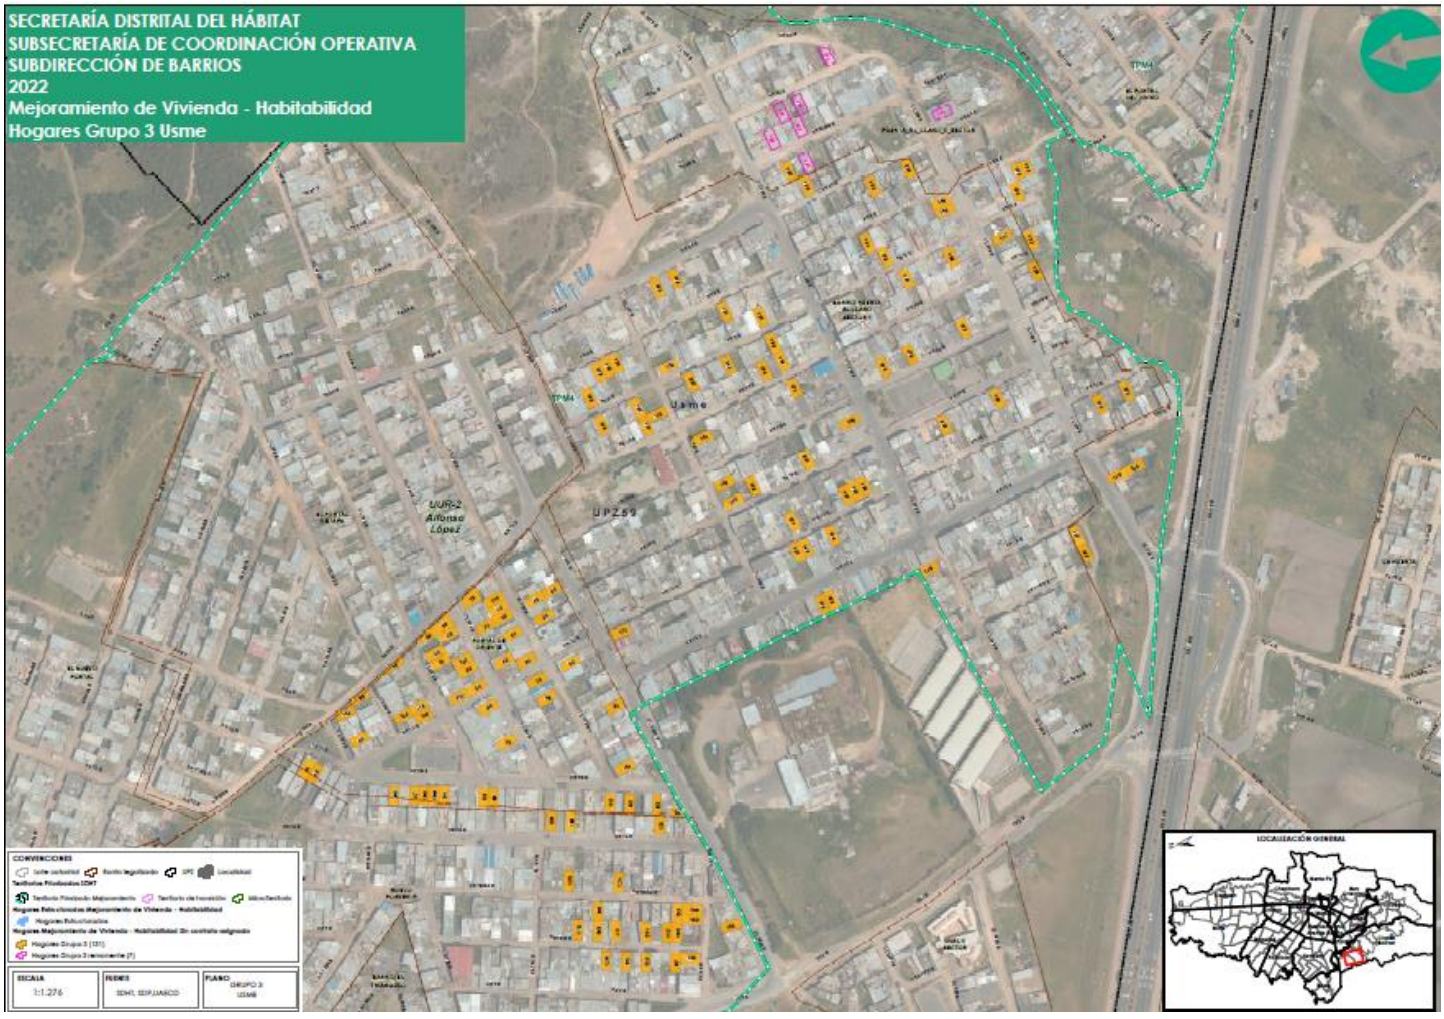


Ciudad Bolívar – Sierra Morena:

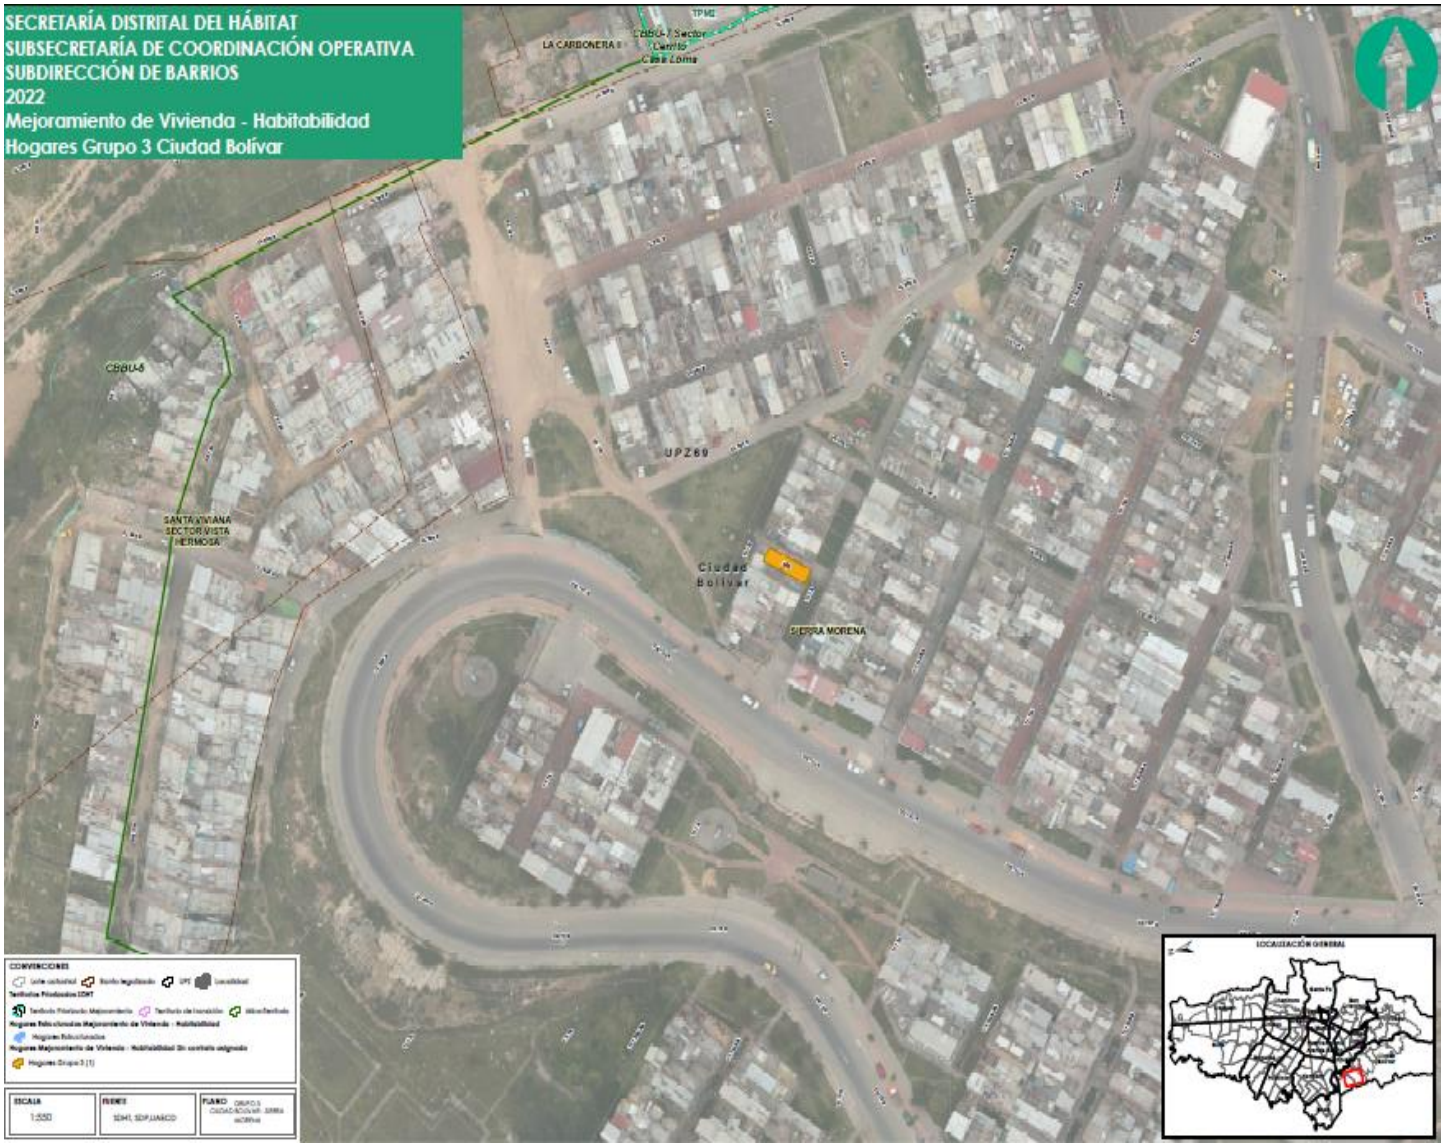


Ciudad Bolívar – Jerusalén:

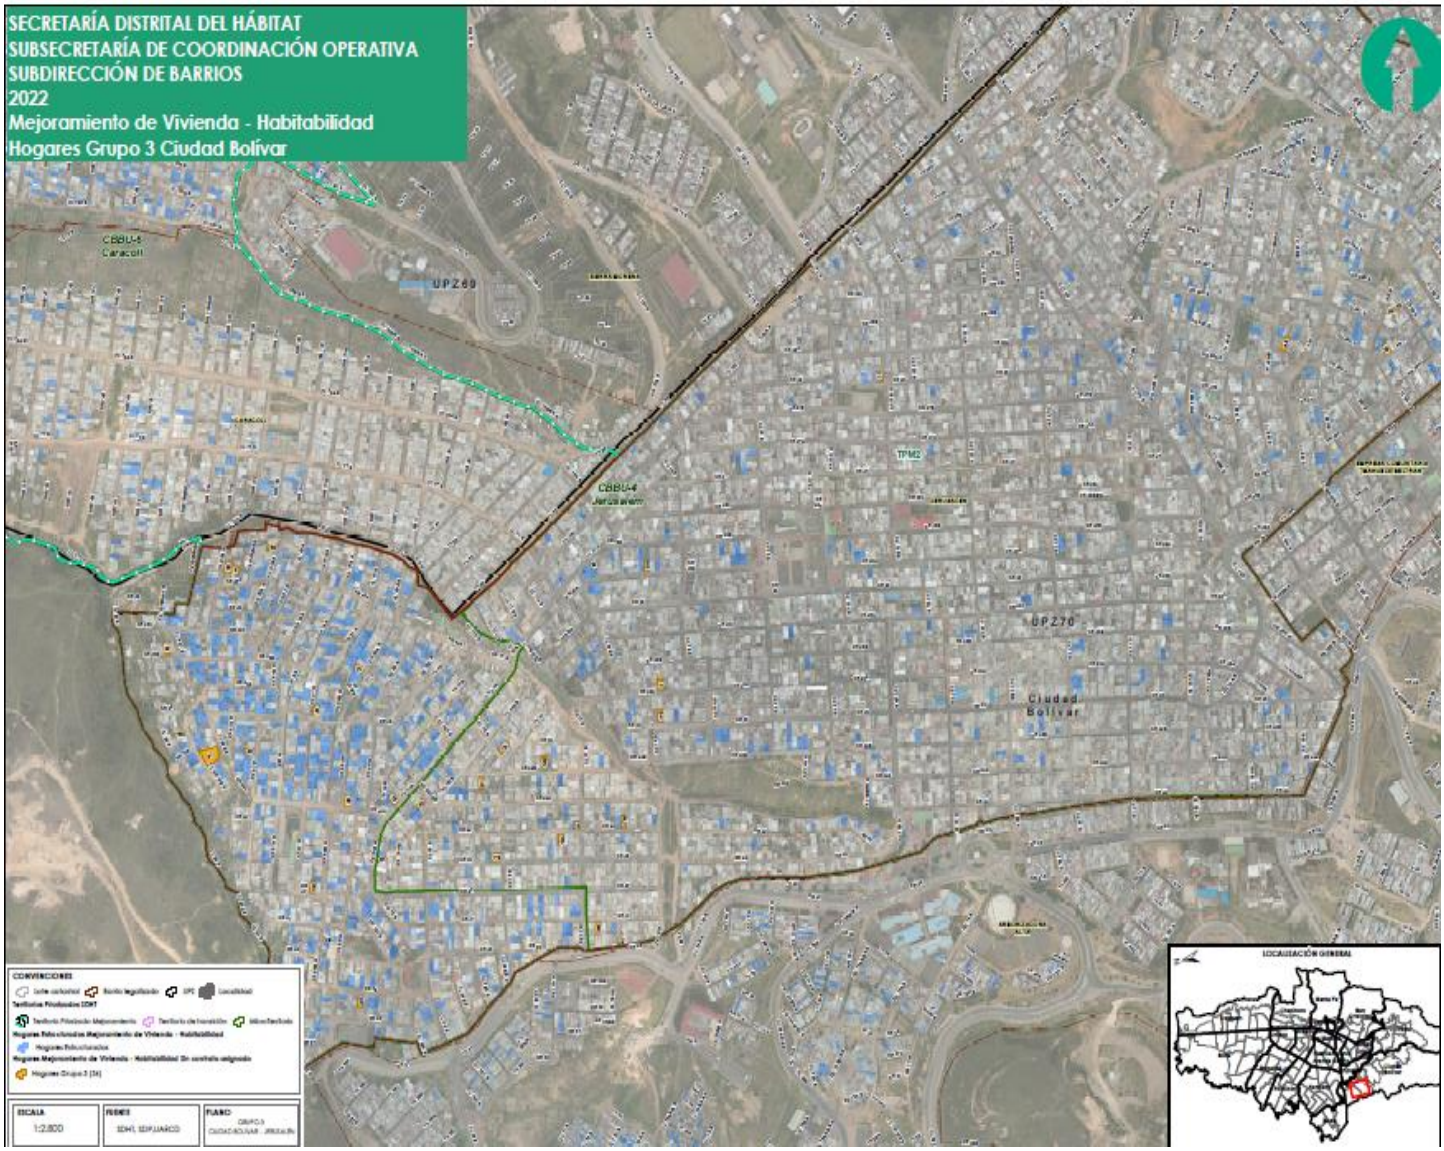

Ciudad Bolívar – Habitarte:

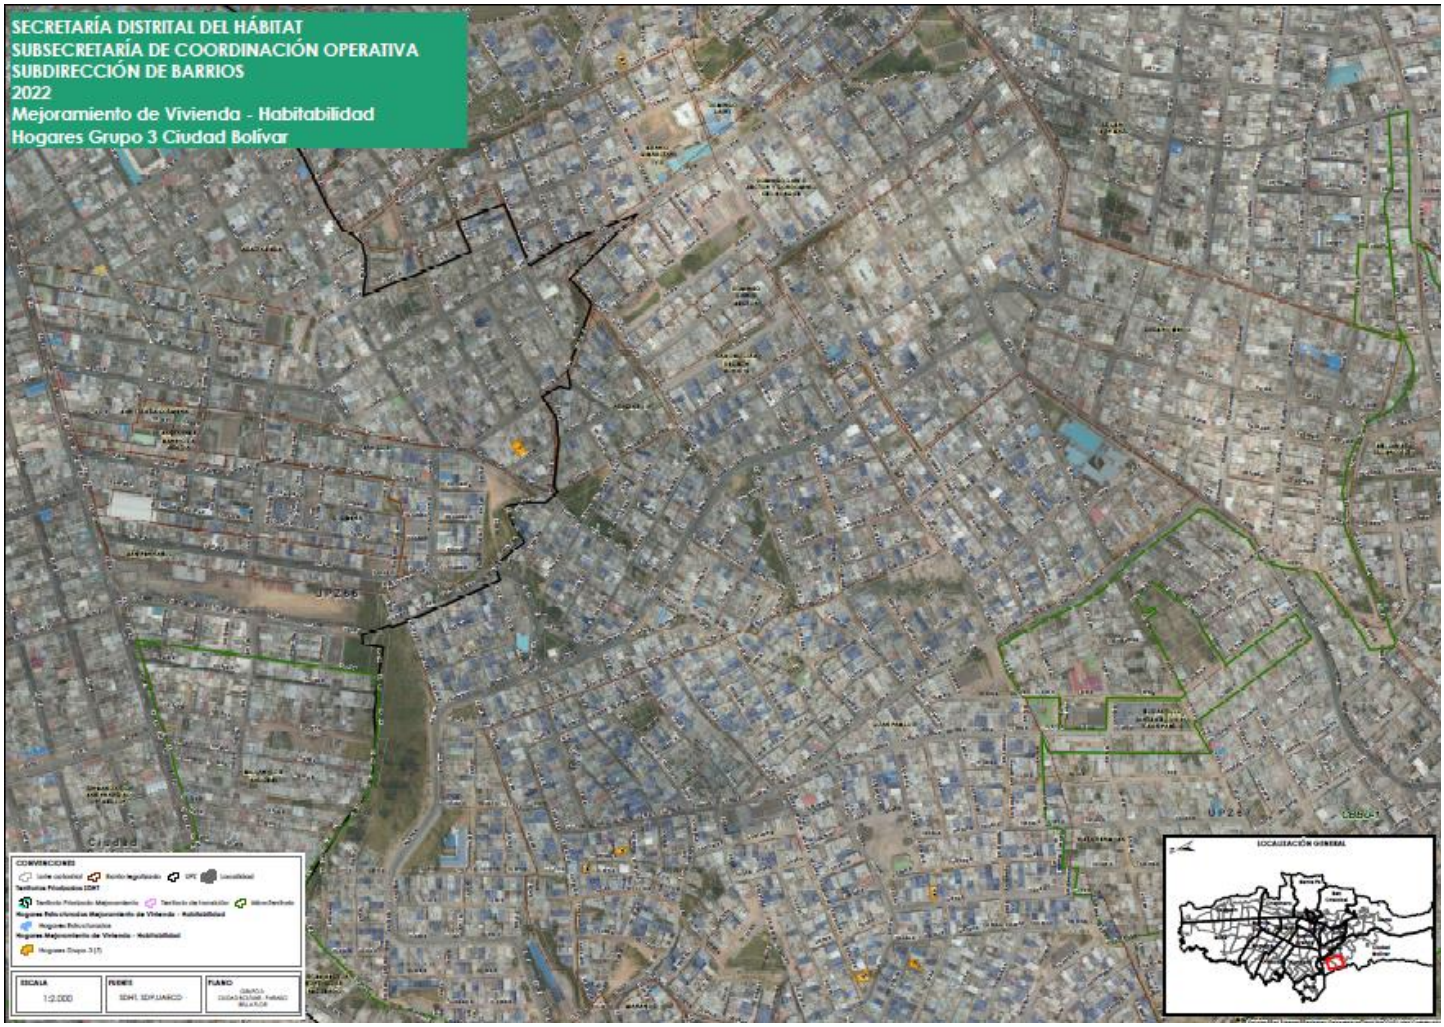

Ciudad Bolívar – Bella Paraíso:

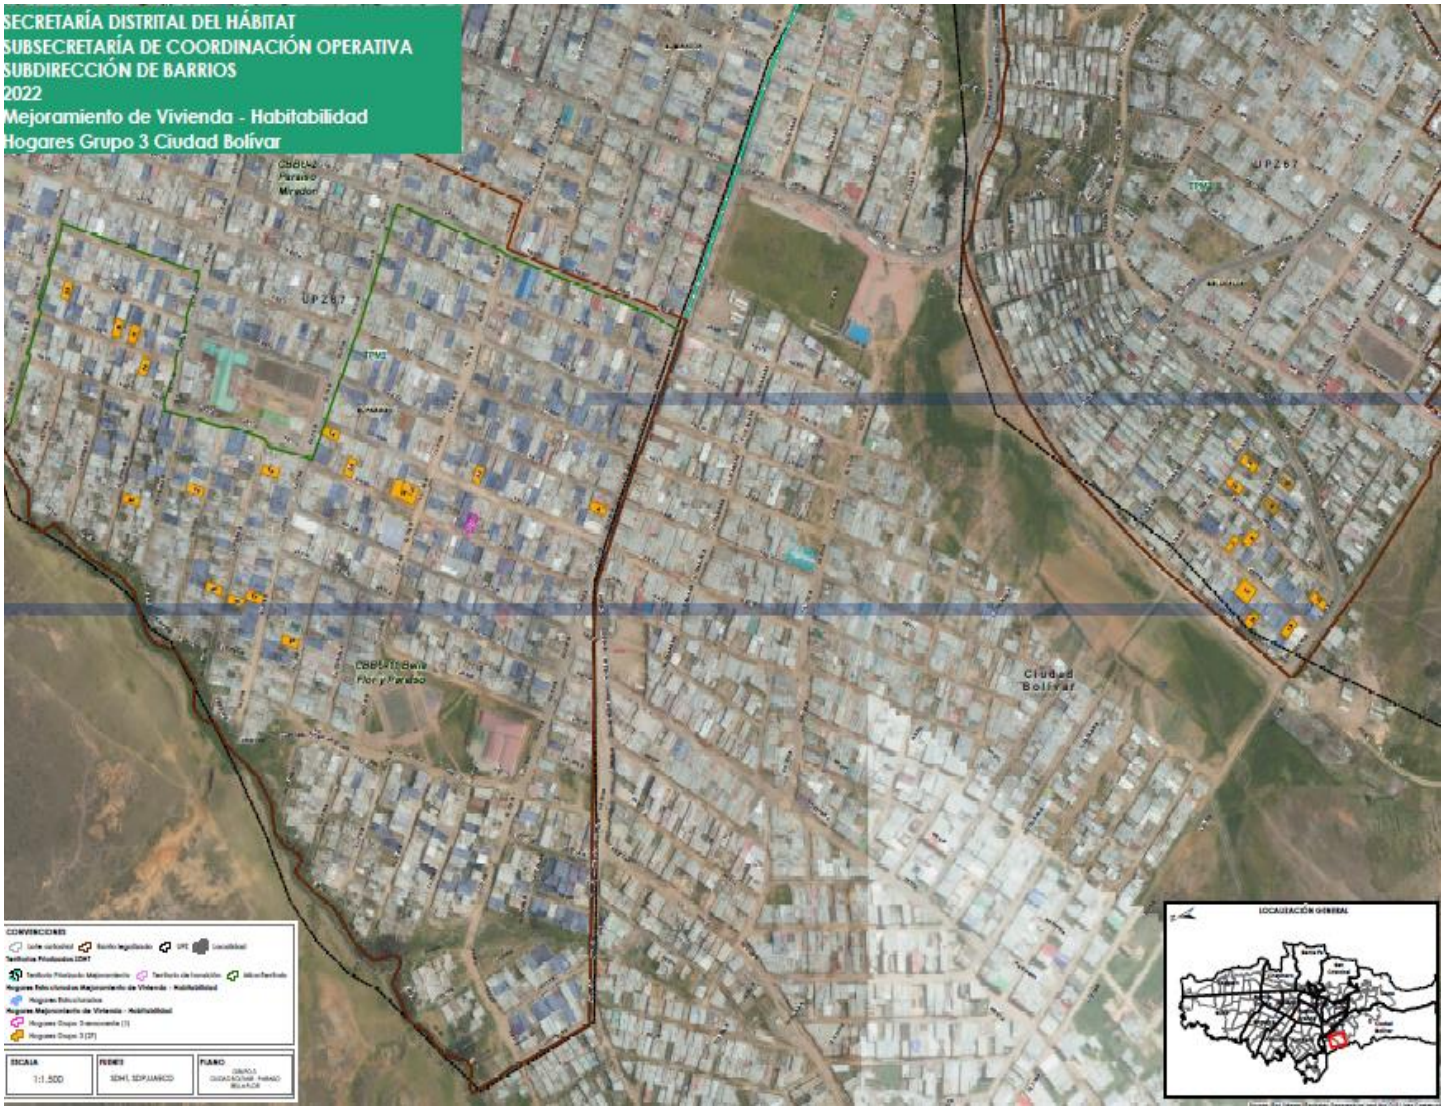

3. Objetivos

Objetivo General:

Brindar una mejora continua frente a las actividades en obra, para lo cual las medidas de prevención ambiental son importantes respecto a la extracción de material y su debida disposición, así como el aprovechamiento de los residuos el cual se hace con un buen manejo de aspectos e impactos ambientales.

Objetivos específicos:

- Recolectar los residuos generados en obra y la mitigación de los efectos sobre el ambiente que pudieran resultar de la ejecución del proyecto.

- Seguimiento a los impactos ambientales que se pueda generar frente a las actividades que el contratista vaya a desarrollar.

- Establecer un buen manejo de materiales y el adecuado almacenamiento de los residuos generados en obra lo cual conlleva a acciones asociadas a la disminución de residuos y a su fácil acceso de recolección.

4. ***Desarrollo***

- ***Manejo de materiales de construcción:***

En este mes de febrero de 2023 se realizaron varias remodelaciones y aperturas de viviendas, en las visitas técnicas con el acompañamiento del constructor, se evidenciaron que en algunas viviendas se presentaron residuos de RCD en la vivienda y material asignado acopiado; en algunas casas se realizaron las siguientes actividades tales como: cambio de pisos, pañetado y pintura de muros, enchape de muros en cocinas, cambio de tejas para cubiertas, cambio de algunos tramos de tuberías y sus respectivos accesorios, instalación de aparatos sanitarios y duchas, entre otros. Se realizó la recolección de residuos peligrosos en este mes, pero a la fecha no se entregado la certificación y su volumen de disposición.





En algunas viviendas se identificó el material de RCD lo cual se encontraba en área peatonal. Lo anterior se le informa al contratista la recolección evitando obstrucciones de paso y/o un impacto ambiental mayor en la zona. Para este mes se realizaron la recolección de 14m3 de RCD, lo cual justifica la recolección de 2 recolecciones de RCD por el gestor CEMEX, esta empresa está certificada por la parte ambiental para disposición final.

- Observaciones de Interventoría:
  - Para dar cumplimiento a la recolección de los residuos RCD se debe tener en cuenta la resolución 472 del 2017 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible

- ***Manejo de residuos peligrosos:***

Durante el mes de Febrero de 2023 se solicitó al constructor el protocolo de manejo de residuos peligrosos el cual llevan a cabo en la bodega de almacenamiento con la que se cuenta en obra, se identifica los residuos peligrosos de obra almacenados y que algunos residuos peligrosos fueron recolectados, a la fecha no se ha presentado el certificado de disposición del material, se recomienda orden y aseo se recomienda y realizar el respectivo rotulo y separación de los residuos con su cinta de peligro ya que se encuentran mezclados y pueden verse afectados diferentes materiales de acopio.







- <u>Observaciones de Interventoría:</u>
  - El contratista no entrega en su informe el protocolo solicitado por interventoría respecto del manejo de residuos peligrosos y manifiesta que se realizó la recolección de residuos peligrosos el cual a la fecha está a la espera de la remisión para poder tabularlo y seguimiento al respecto.

- ***Manejo de asbesto:***

Durante el periodo de Febrero de 2023 no se llevaron a cabo disposiciones de asbesto por parte del contratista debido a que no se llevaron a cabo actividades que involucraran la utilización de dicho material.


- Observaciones de Interventoría:
  - Se recomienda al contratista tener en cuenta que al momento de trabajar o realizar actividades relacionadas con dicho material, el personal deberá contar con los elementos de protección personal adecuados para dicha labor.
  - Se recomienda igualmente que al momento de realizar la disposición de dicho material en caso de utilizarse se deberá contar con el gestor autorizado para dicha disposición.

- ***Centro de acopio:***

Durante el periodo de Febrero de 2023 se evidencia que el contratista cuenta con un centro de acopio donde lleva a cabo el almacenamiento de diferentes materiales tanto material nuevo como residuos de obra. Ya que estos espacios nos ayudan para la separación de los residuos acorde a sus características, debe contar con un sistema de rotulo, y sirviendo como instrumento de prevención de la contaminación del medio ambiente a través de la correcta clasificación para evitar un daño al medio ambiente y al personal que se encuentra cerca, se recomienda realizar el buen manejo a estas bodegas. Y por consiguiente se realizaron la recolección de estos mismos, se recomienda orden y aseo ya que no cuenta con un rotulado y cinta de peligro para evitar accidentes de trabajo.





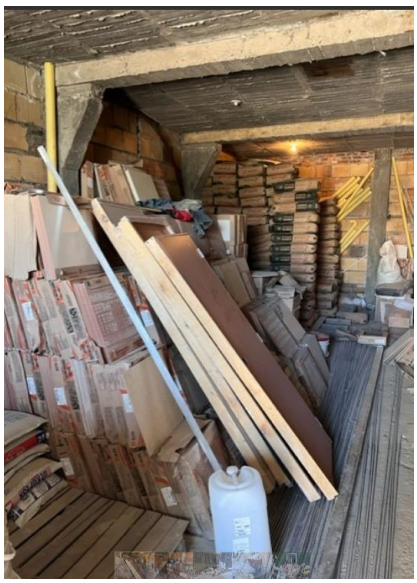

- Observaciones de interventoría
  - Se solicita al contratista no mezclar los materiales nuevos con los residuos de obra
  - Llevar un registro en obra de los residuos generados
  - Contar siempre en obra con la información adecuada para la disposición de los residuos.
  - La bodega de almacenamiento de los diferentes residuos debe llevar su rotulo.
  - Dentro de la bodega se debe contar con la información detallada de las sustancias que allí se acopien.
  - Los residuos que se almacenen en la bodega deben estar debidamente separados con su categorización de residuos.
  - Enviar previamente la información de los vales de recolección de material para su registro.

- ***Transporte y manejo de residuos:***

Durante el periodo de Febrero de 2023 el contratista llevó a cabo el manejo y disposición de residuos RCD teniendo en cuenta su debida categorización de entrega de material. Para lo anterior, se utilizaron los siguientes vehículos para entrega y recolección de material los cuales cumplen con todos los documentos exigidos por el ministerio de transporte para su movilización y el Plan de Gestión Ambiental.

No.	No. INTERNO	MAQUINARIA Y/O EQUIPO			CONTROL DE HORAS		PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
		Modelo	Tipo	Referencia	Período Actual	Acumulado	No. Hr.	Actividades a efectuar
1	1	1952	VOLQUETA	PLACA AJB 574	Febrero	35		RECOLECCION DE ESCOMBROS
2	2	1985	CAMION	PLACA GYB 750	Febrero	1248		ENTREGA DE MATERIAL
3	3	1978	CAMIONETA	PLACA LDI 361	Febrero	1248		ENTREGA DE MATERIAL

Control de recolección de RCD en la obra desde Octubre 2022 a Febrero 2023:

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN						
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados		Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
				Cantidad Generada[3]		
				Cargue Sencillo	Total m3	
26-10-2022	221824796	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
01-12-2022	223877612	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
12/12/2022	224422639	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
20/12/2022	224850758	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
22/12/2022	225005879	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
26/12/2022	225145914	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
04/01/2023	225621476	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
05/01/2023	7526	AJB-574	2115	X	7	CEMEX
11/01/2023	225942148	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
21/01/2023	2265266443	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
26/01/2023	225710643	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
07/02/2023	227335199	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
13/02/2023	227662751	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
Total					91	CEMEX

Recolección de Obra del mes de Febrero 2023:

CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN						
Fecha	Remision	Placa de Volqueta	Numero Pin De La Volqueta	Residuos de Construcción y Demolición Generados		Sitio en los que fueron dispuestos los RCD[5]
				Cantidad Generada[3]		
				Cargue Sencillo	Total m3	
07/02/2023	227335199	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
13/02/2023	227662751	SGH-284	2115	X	7	CEMEX
Total				X	14	CEMEX

Se adjunta a continuacion los certificados de disposicion final de la empresa CEMEX donde recibieron los residuos finales de obra:





REMISION / CARTA PORTE

CEMEX

CEMEX COLOMBIA, S.A.

FECHA

FOLIO

EXPEDIDA EN:

ESTE COMPROBANTE SE EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:

PEDIDO

PRODUCTO

CANTIDAD

OC

Concreto

RCD

13 FEB 2023

NOTAS

El presente documento presta mérito ejecutivo

	Cantidad	Revisiones	Densidades
Datos Finos			
Datos Humedos			
Datos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N. Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

CLIENTE

Fecha

Hora

www.cemexcolombia.com


El presente documento presta mérito ejecutivo

CEMEX

ORIGINAL

Capacitaciones correctivas:

Durante el periodo del mes de Febrero del 2023 se evidenció por parte del contratista que se llevaron a cabo las charlas ambientales requeridas para la recolección y acopio de RCD, residuos peligrosos y orden y aseo para el buen manejo de materiales y su almacenamiento a continuación veremos las charla y su formato.

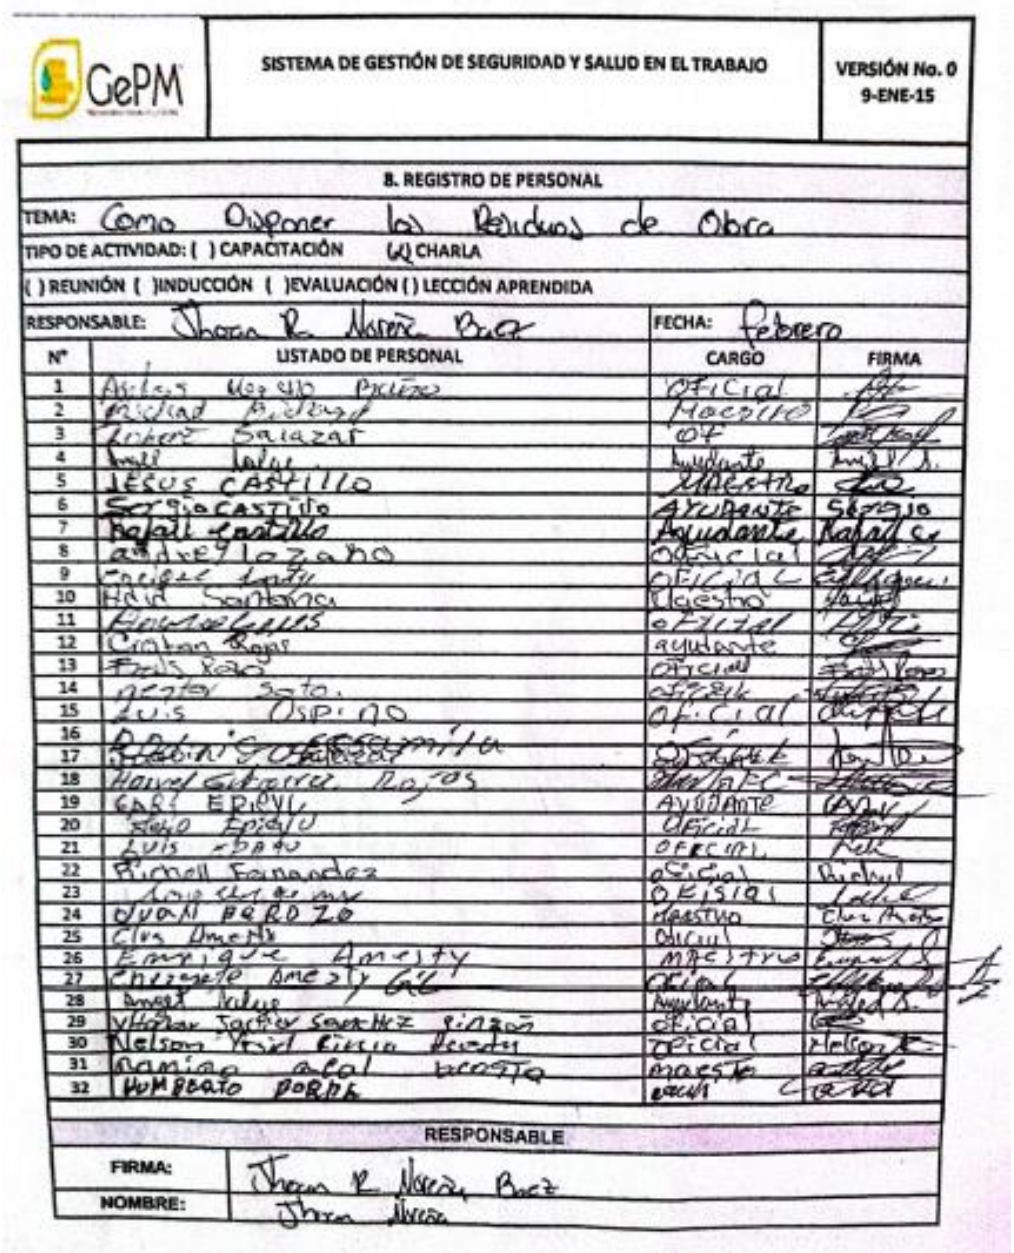

GePM | SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | VERSIÓN No. 0 9-ENE-15

8. REGISTRO DE PERSONAL

TEMA: Como Disponer los Residuos de Obra

TIPO DE ACTIVIDAD: ( ) CAPACITACIÓN (X) CHARLA

( ) REUNIÓN ( )INDUCCIÓN ( )EVALUACIÓN ( ) LECCIÓN APRENDIDA

RESPONSABLE: Thora R. Nieves Baez FECHA: Febrero

Nº	LISTADO DE PERSONAL	CARGO	FIRMA
1	Adelso Hernando Prieto	Oficial	
2	Miguel Bedoya	Maestro	
3	Fabian Salazar	Of	
4	Angel Tolua	Ayudante	
5	JESUS CASTILLO	Maestro	
6	Sergio Castillo	Ayudante	Sergio
7	Rafael Castillo	Ayudante	Rafael
8	Andres Lozano	Oficial	
9	Enrique Leal	Oficial	
10	Raul Santana	Maestro	
11	Hernan Leal	oficial	
12	Cristian Rojas	ayudante	
13	Fabio Rojo	Oficial	
14	Hector Soto	oficial	
15	Luis Ospino	Oficial	
16	Robinson Arrieta	Oficial	
17	Jhon Leal	Oficial	
18	Harol Gabriel Rojas	Maestro	
19	CARLOS EPIAYU	AYUDANTE	
20	PEDRO EPIAYU	OFICIAL	
21	LUIS EPIAYU	OFICIAL	
22	Richell Fernandez	oficial	
23	Jose [illegible]	OFICIAL	
24	JUAN PEREZ	MAESTRO	
25	Elvis Ume[illegible]	OFICIAL	
26	Enrique Amezty	MAESTRO	
27	Enrique Amezty Gil	Oficial	
28	Angel Tolua	Ayudante	
29	Victor Javier Sanchez Pinzon	oficial	
30	Nelson Yesid Fiesco Acosta	Oficial	
31	Ramiro Leal Acosta	maestro	
32	HUMBERTO PORRA	OFICIAL	

RESPONSABLE

FIRMA: Thora R. Nieves Baez

NOMBRE: Thora Nieves

- ***Medidas de manejo de residuos de reciclaje:***

Se evidencia en el informe que el contratista da un manejo de residuos por su clasificación, pero se recomienda realizar capacitaciones de orden y aseo, y charlas a los trabajadores obra sus labores de arreglo de vivienda, esta información relacionada ayuda a concientizar a los trabajadores para realizar mejor sus labores y mantenimientos locativos. Se realiza registro fotográfico de la entrega de puntos ecológicos en cada vivienda y su cartilla, sobre información de la manipulación de residuos que ayuda a saber su disposición.







- Observaciones de Interventoría:
  - Se recomienda al contratista realizar capacitación a los propietarios de la identificación de colores para la entrega de canecas.

Orden y Aseo:

Se evidencia durante el mes de febrero 2023 el constructor tiene que tener una planificación es importantísimo para evitar situaciones de riesgo relacionadas con las zonas de acopio y almacenamiento. No obstante, como pautas generales a tener en cuenta para mejorar el orden y limpieza de trabajo que podríamos destacar aspectos tales como:

1. Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil
2. Acondicionar los medios para guardar y localiza
3. Evitar ensuciar y limpiar después
4. Favorecer el orden y la limpieza

La aplicación de estas recomendaciones se verá reflejada en el estado global de la obra en materia de orden y limpieza. Por ello deberá ser tenido en cuenta siempre en las inspecciones de seguridad y salud y en las visitas técnicas de obra por parte de la interventoría. Influirá directamente en el nivel de riesgo de accidente, tal y como hemos comentado al principio.

También sería importante tener en cuenta, junto con los aspectos que hemos mencionado en este artículo, todo lo relacionado con la normativa específica de gestión de residuos**.** Se debe conocer bien cuáles son las disposiciones que aplican a cada trabajo y las responsabilidades derivadas de ello.

5. ***Conclusiones***

- La sostenibilidad en este proceso constructivo es muy importante ya que se identificó las actividades que se realizaron en las viviendas y la responsabilidad social y ambiental de toda la cadena productiva del proyecto.

- Para dar una certificación de los procesos de vivienda es muy importe tener un control de las actividades que se presentan para las buenas prácticas en torno a la implementación de una construcción sostenible.

- Se recomienda realizar prácticas de sostenibilidad de material y organización de puntos de acopio ya que se presentan muchas inconformidades, se recomienda realizar capacitaciones, orden y aseo en áreas de trabajo y revisión constante de las actividades de cada vivienda para tenerlas en un estado óptimo y satisfactorio.

- Los sistemas de seguimiento y evaluación deben orientarse no sólo hacia la aplicabilidad y eficiencia de las medidas, sino a todo el sistema de gestión ambiental con el fin de facilitar la planificación y toma de decisiones.

6. ***Registro fotográfico:***









Anexo:

Matriz de aspectos ambientales del avance de obra.
