COMITÉ No. 01

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 01

FECHA PRESENTE ACTA: AGOSTO 05 DE 2022

CONTRATO DE OBRA No. 116 de 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NÚMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA- BOYACÁ

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

1. VISITA AL LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL
2. VISITA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUMERO DOS
3. FIRMA DEL ACTA DE INICIO

DESARROLLO DEL COMITÉ

Con el fin de definir el inicio de la obra e identificar las características particulares del proyecto, se realiza la visita al lugar de obra (Planta del Acueducto Rural de la vereda Capilla "ACUACAPILLA"), el día cinco (05) de agosto de 2022, a dicha visita asiste el supervisor, el contratista, el interventor, presidente y representantes de la junta de acción comunal, se socializa el objeto y alcance del contrato adjudicado, así mismo, se procede a identificar a manera preliminar la localización de donde será construido el tanque de almacenamiento principal, se identifican las dificultades de la obra previas para determinar la fecha de acta de inicio.






La vía de acceso a la planta del Acueducto Rural de la vereda Capilla "ACUACAPILLA" donde se ejecutará la construcción del tanque de almacenamiento principal se encuentra en mal estado, no posee material de afirmado y en algunos sectores presenta empozamientos de agua, de igual forma, se observa que la vegetación es abundante y algunas ramas obstruyen el paso de los vehículos de carga que a futuro llevarán el concreto a la construcción del tanque principal, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico. Esto dificulta el ingreso de maquinaria pesada al lugar de obra, contemplando que dentro de las actividades de explanación se cuenta con la excavación mecánica en roca a una profundidad aproximada de tres (3.0M) metros, para lo cual se requiere el paso de maquinaria tipo retroexcavadora, camiones mixer y el paso de material mediante volquetas.







También, se realiza visita al tanque número dos, el cual se encuentra localizado a más de diez minutos del tanque principal, allí se encuentra proyectado realizar la recuperación de dicho tanque mediante actividades de impermeabilización, a partir de la instalación de una membrana tipo "PVC 12 NTR – Sikaplan". A diferencia de la anterior vía de acceso en mención, esta vía si se encuentra en buen estado, por lo que existe la posibilidad de iniciar la ejecución del contrato con la recuperación del tanque, a continuación, se puede observar el registro fotográfico del lugar.

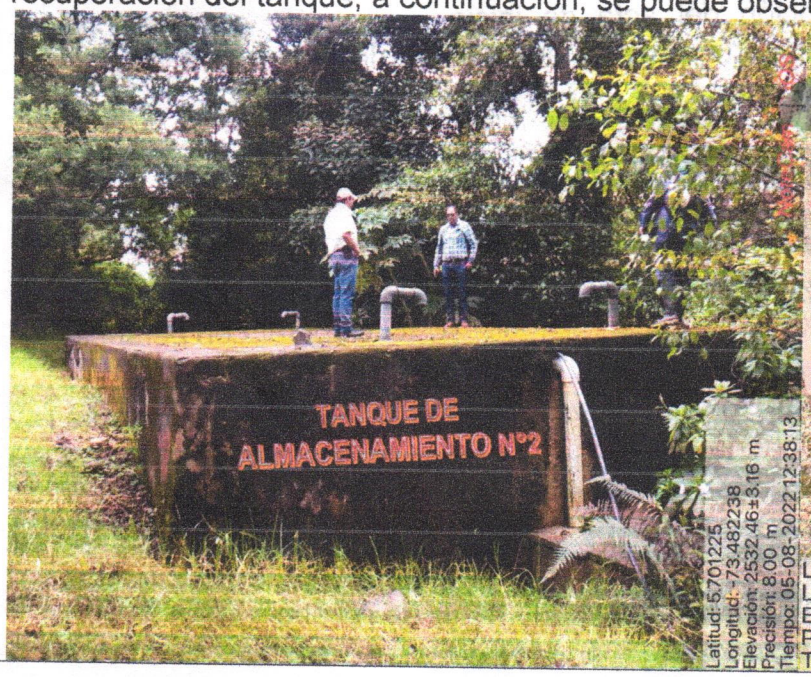







Según la visita realizada a los dos (2) frentes de trabajo el supervisor, contratista de obra e interventoría acuerdan prorrogar la suscripción del acta de inicio y posterior comienzo de actividades hasta que se tenga un avance importante en la adecuación de la vía de acceso al tanque principal.

COMPROMISOS:

- La junta de acción comunal del Acueducto Rural de la vereda Capilla "ACUACAPILLA", se compromete a realizar "Combite", por el cual se adelanten actividades preliminares de mejora vial y rocería donde se despeje la vía y facilite el acceso, así mismo, a colaborar con personal para el mejoramiento de la vía.
- La junta de acción comunal del Acueducto Rural de la vereda Capilla "ACUACAPILLA", se compromete a notificar a la Entidad (Secretaría de Infraestructura y obras Físicas), cuando dichas actividades se encuentren adelantadas.
- La Supervisión del contrato a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Físicas se compromete a mejorar las condiciones de la vía de acceso a la planta del Acueducto Rural de la vereda Capilla "ACUACAPILLA" mediante el maquinaria y material de recebo.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN		
No se fija fecha de próxima reunión.		
PARTICIPANTES		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS FÍSICAS	
FABIÁN SUAREZ	CONTRATISTA	
WILLIAM SÁNCHEZ	INTERVENTOR	
JOSÉ RUANO	PRESIDENTE DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA "ACUACAPILLA"	
