
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONTRATO 268/2022**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
2		**FASE 1**	**73 días**	**mié 28/12/22**	**vie 10/03/23**	
3		1. Acta de inicio	0 días	mié 28/12/22	mié 28/12/22	
4		1.1. Preeliminares	8 días	mié 28/12/22	mié 4/01/23	
5		1.2. Levantamiento arquitectónico, registro fotográfico actual, actas de vecindad y ajuste planimetrias	10 días	lun 2/01/23	mié 11/01/23	4CC+5 días
6		1.3. Primera aproximación arquitectónica	7 días	jue 12/01/23	mié 18/01/23	5
7		1.4. Reunión de avance Nº 1	1 día	jue 19/01/23	jue 19/01/23	6
8		1.5. Busqueda e investigación de referentes, presentación de bosquejos	3 días	jue 19/01/23	sáb 21/01/23	7CC-1 día
9		1.6. Reunión de avance Nº2 (Magistrados)	1 día	lun 23/01/23	lun 23/01/23	8CC
10		1.7. Esquema básico	5 días	mar 24/01/23	sáb 28/01/23	9
11		1.8. Revisión de diseños por parte de interventoría y entidad	2 días	sáb 4/02/23	dom 5/02/23	10
12		1.9. Ajuste a esquemas básicos	3 días	dom 5/02/23	mar 7/02/23	11FC-1 día
13		1.10. Anteproyecto Nº 1	7 días	mié 8/02/23	mar 14/02/23	12
14		**Presupuesto fase 2 (APUs, cronograma, especificaciones)**	25 días	vie 10/02/23	lun 6/03/23	13CC+2 días
15		1.11. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nº 1	5 días	mié 15/02/23	dom 19/02/23	13
16		1.12. Anteproyecto Nª 2	9 días	lun 20/02/23	mar 28/02/23	15
17		1.13. Revisión y ajuste a diseños presentados en anteproyecto Nª 2	3 días	mié 1/03/23	vie 3/03/23	16
18		1.14. Presentación de proyecto final (renders, memorias, planos y presupuesto)	7 días	sáb 4/03/23	vie 10/03/23	17
19		**Presentación final**	1 día	vie 10/03/23	vie 10/03/23	18FC-1 día;14

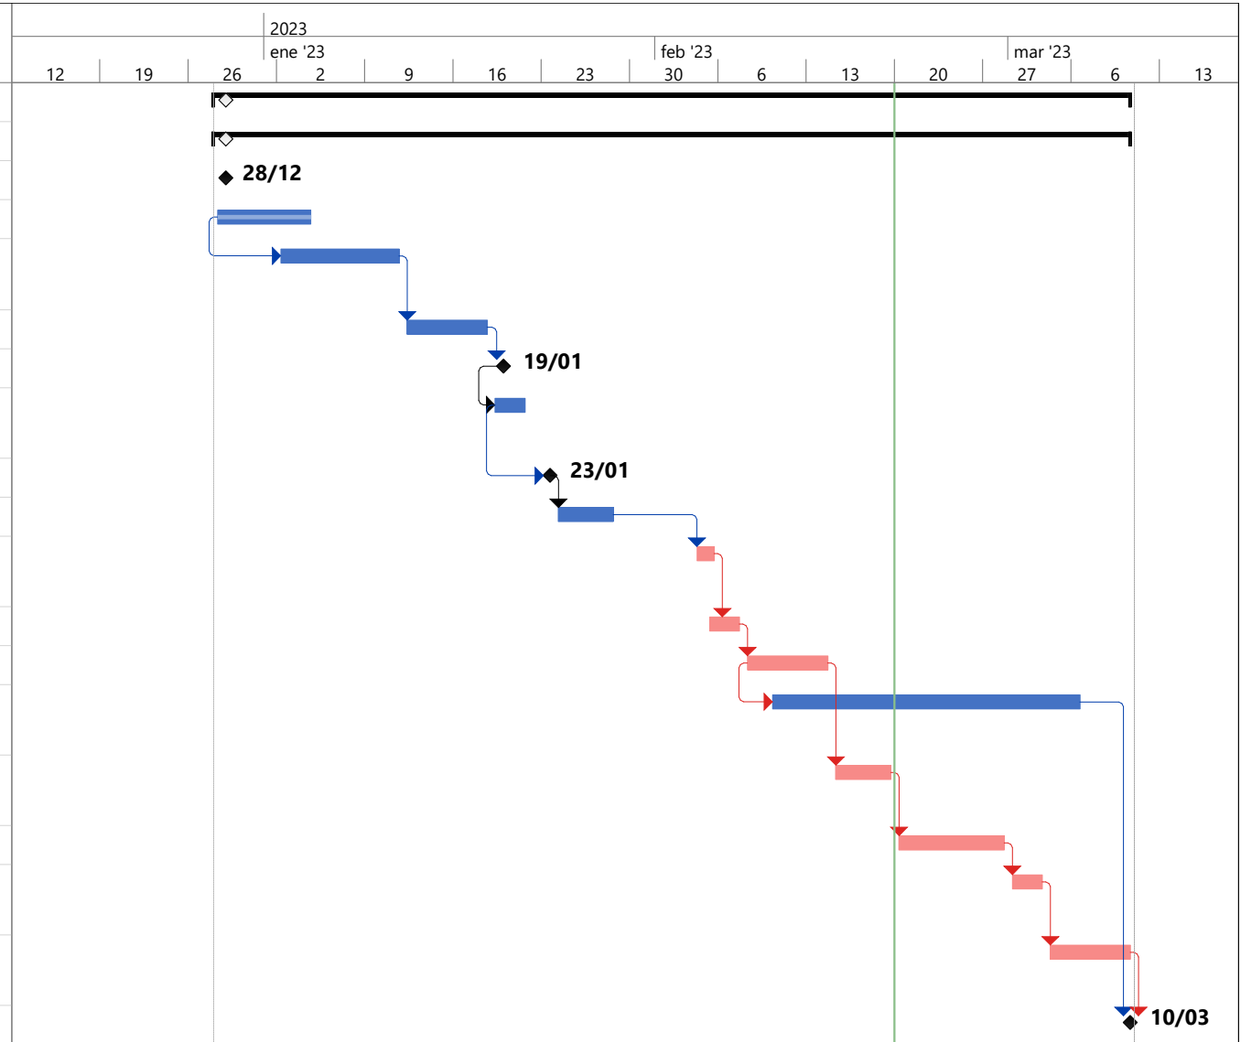

Proyecto: PROGRAMACIÓN DE
Fecha: lun 20/02/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
