UT GORGONA 2022

Santiago de Cali, 3 de abril de 2023

0047-UTGOR-22

Señores
FUNDACION EDIFICANDO COLOMBIANO - EDICOL
Atn. María Margarita Zapata – Rep. Legal
Interventoría

REFERENCIA: Contrato NACION 001 DE 2022
Objeto: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BUCEO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PNN GORGONA

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA, HASTA EL 4 DE MAYO DE 2023

Cordial saludo

Permito solicitar una prórroga al contrato de la referencia basado en el/los siguiente/s argumento/s:

- El brote de gripe aviar que en estos momentos tiene a la isla en cuarentena y el personal que labora allí, está comenzando a sentir afectaciones de salud, lo anterior basado en un comunicado de prensa.


El País

Ingrese | Regístrese | Zona Diamante | SUSCRÍBETE

Inicio | Noticias | Contenido Premium | Cali | El Corazón de la Salud | Opinión | Deportes | Clasificados | Palmira Contigo

POR $463 PESOS DIARIOS DURANTE 1 AÑO
Pago anual $169mil

Inicio › COLOMBIA

HOY: isla gorgona | ica | gripe aviar | influenza | Autoridades sanitarias | cierre temporal | pelícanos | cuarentena sanitaria

Ordenan cierre temporal del Parque Natural Gorgona por foco de gripe aviar; conozca la razón

Marzo 09, 2023 - 09:29 a. m. | Por: Redacción El País

UT GORGONA 2022

FUENTE:

https://www.elpais.com.co/colombia/ordenan-cierre-temporal-del-parque-natural-gorgona-por-foco-de-gripe-aviar-conozca-la-razon.html

"Este miércoles 8 de marzo el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA,) en el marco de las acciones de prevención, vigilancia y control adelantadas por las autoridades sanitarias de la isla, ordenó el cierre temporal del sitio tras comprobarse la presencia de influenza aviar en alrededor de 57 pelícanos que fueron hallados muertos el pasado 20 de febrero.

Siendo así, el ICA decretó cuarentena sanitaria en toda la isla por medio de la resolución No. 00001750: "Por medio de la cual se declara en cuarentena sanitaria el Parque Nacional Natural Isla Gorgona, ubicado en el municipio de Guapi, del departamento del Cauca, dada la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad"."

Por lo anterior, solicitamos que se tenga en cuenta esta solicitud.

Esperamos una respuesta positiva al respecto

Atentamente,

_____

JULIO CESAR JIMENEZ GIL
C.C. 91.291.901 de Bucaramanga
Rep. Legal UNION TEMPORAL GORGONA 2022

ANEXO: REPROGRAMACION (8) folios

UT GORGONA 2022

Anexo: 1


UT GORGONA 2022

REPROGRAMACION II GORGONA 2023

PLAZO (DIAS): 30


Duración del plan | Inicio real | % Completado | Real (fuera del plan) | % Completado (fuera del plan)

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
ACT	ABRIL	0	ABRIL	0	0%
MUROS EN MAMPOSTERÍA BLOQUE NO. 5.	4	8	6	2	100%
MUROS EN BLOQUE #5 O SIMILAR (APAREJO EN TABICÓN)	11	8	11	8	100%
PINTURA ACRÍLICA VINILTEX PARA MUROS (3 MANOS).	20	2	20	2	80%
PAÑETE LISO 1:3 SOBRE MUROS.	15	8	15	6	10%
PINTURA ACRÍLICA VINILTEX PARA MUROS (3 MANOS).	20	8	20	6	10%
LÁMINA DE FIBROCEMENTO SUPERBOARD DE ESPESOR 17 MM, BARRERA DE HUMEDAD, MASILLA EN JUNTAS, CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN EN ACERO AL CARBONO ZINCADO GALVANIZADO TIPO ROTHOBLAAS O SIMILAR PARA INTERIORES CON FY=1000 MPA	18	8	18	6	100%
MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 DE ESPESOR 5 CM IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1, INCLUYE INSTALACIÓN DE MALLA VENA GALVANIZADA CAL 34	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (DUCHA), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (POCETA DE ENJUAGUE DE EQUIPOS), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (ENJUAGUE DE EQUIPOS Y TANQUES), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (DUCHA INTERIORES Y EXTERIORES), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (BAÑOS), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
ENCHAPE CERÁMICO INSTITUCIONAL PARA ZONAS HÚMEDAS (COCINETA), INCLUYE PEGANTE PARA CERÁMICA Y BOQUILLA.	18	8	18	6	100%
SUM. E INST. SISTEMA DE INSONORIZACIÓN PARA ÁREA DE COMPRESORES Y COMPRESORES	12	8	12	8	100%

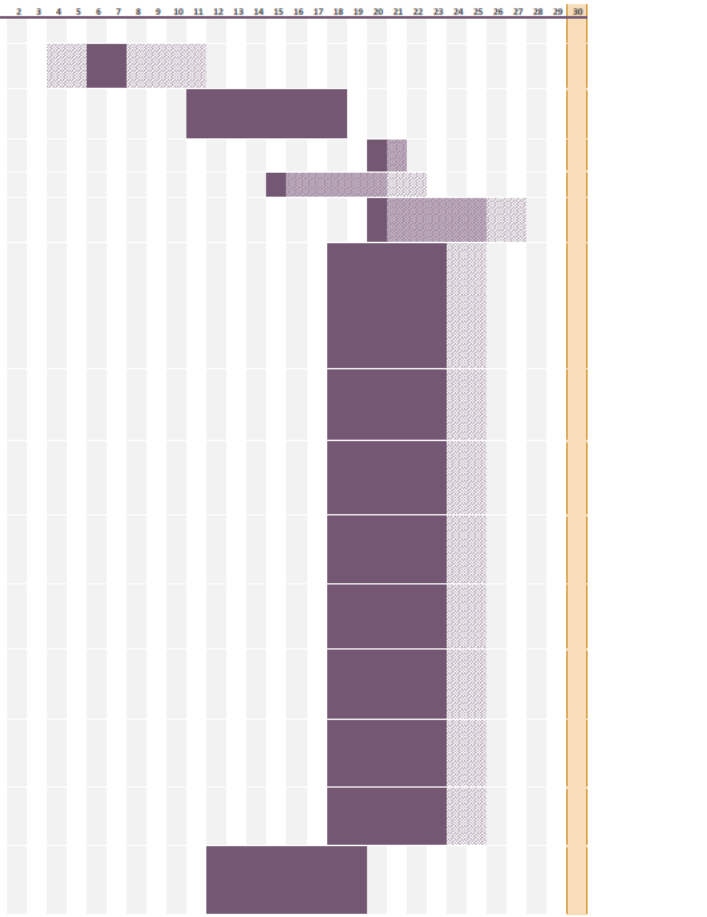


UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
VENTANA TIPO BASCULANTE INCLUYE MARCO, EN MADERA INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.6 KG/M3 TIPO OSMOSE, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. V.T1 (2,30M	23	8	23	8	100%
VENTANA TIPO BASCULANTE INCLUYE MARCO, EN MADERA INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.6 KG/M3 TIPO OSMOSE, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. V.T1 (0,50M	23	8	23	6	100%
VENTANA TIPO BASCULANTE INCLUYE MARCO, EN MADERA INMUNIZADA BAJO EL SISTEMA VACÍO PRESIÓN, CON SALES CCA 9.6 KG/M3 TIPO OSMOSE, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. V.T1 (0,80M	23	8	23	6	100%
PUERTA ENTAMBORADA DE 0,75M X 2,20M P-T1., MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE MARCO DE MADERA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	23	2	23	2	100%
PUERTA ENTAMBORADA DE 0,9M X 2,20M P-T2., MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE MARCO DE MADERA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. C	23	8	23	6	100%
PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA DE 0,9M X 2,20M P-T3., MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE MARCO DE MADERA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONA	23	8	23	6	100%
PUERTA PLEGABLE ENTAMBORADA DE 2,5M X 2,20M P-T4., MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE MARCO DE MADERA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONA	23	8	23	6	100%

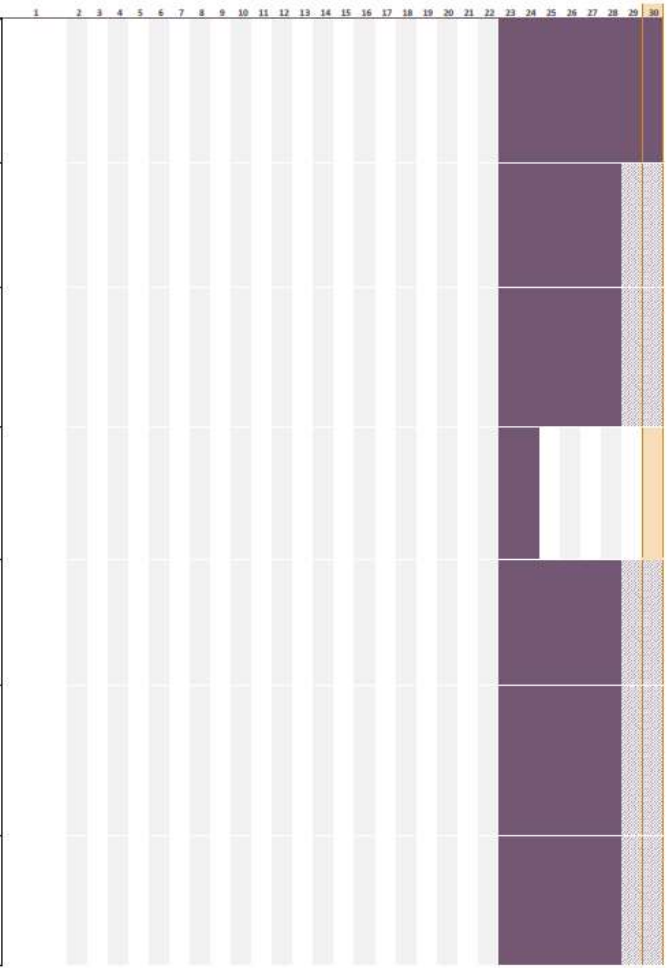


UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
MUEBLE TIPO PUESTA DE ATENCIÓN BOUTIQUE M.T1 (SEGÚN DETALLE ARQ.), MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMI	25	8	25	6	100%
MUEBLE MALETERO M.T2 (2,68M X 2,20M), MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	25	8	25	6	100%
MUEBLE MESÓN DE COCINETA M.T2 (1,95M X 0,90M), MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	25	8	25	6	100%
MUEBLE TIPO BARRA ÁREA DE CAPACITACIÓN M.T4 (2,50M X 0,40M X 1,1M), MADERA INMUNIZADA BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE PERMITAN DAR GARANTÍA CONTRA HONGOS, INSECTOS PERFORADORES Y PUDRICIÓN POR 20 AÑOS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAM	25	8	25	6	100%
MUEBLE TIPO JAULA EN MALLA ELECTROSOLDADA ZONA SECADO DE TRAJES M.T5 (SEGÚN DETALLE ARQ.),	25	8	25	6	100%
CUBIERTA EN POLICARBONATO CAL.8MM, INCLUYE CONECTORES, PERFILES Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	23	1	23	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE 30 MM ESPESOR CALIBRE 26, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, COLOR A CONVENIR CON EL AP, INCLUYE ACCESORIOS (CUMBRERA, LIMATESA, LIMAHOYA, BORDE PERIMETRAL, ENCUENTRO FRONTAL DE FALDÓN CON PA	12	3	12	3	100%
CAJA DE INSPECCIÓN 0,70M X 0,80M	18	8	18	6	100%
TAPAS REGISTRO 20 CM X 20 CM, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	18	8	18	6	100%

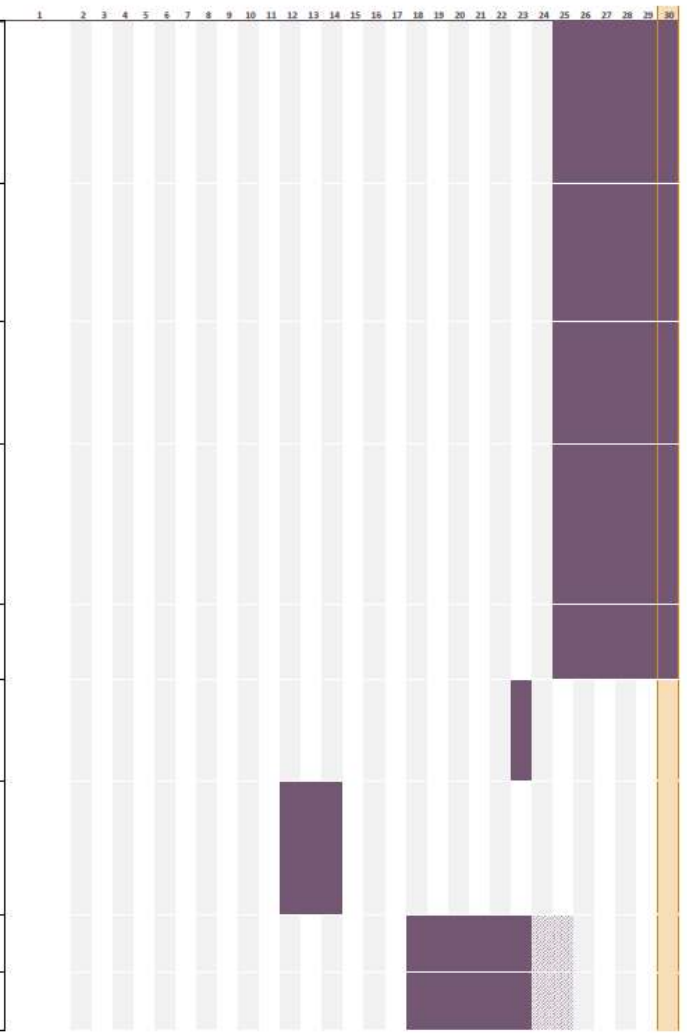


UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS	20	8	20	6	100%
LLAVES DE MANGUERA PARA POCETAS DE ENJUAGUE DE EQUIPOS, INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	25	8	25	6	100%
SALIDA SANITARIA INODORO 4 ". INCLUYE ACCESORIOS	15	8	15	6	100%
REGISTRO DE 1/2", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	15	8	15	6	100%
TUBERÍA DE REVENTILACIÓN PVC 3". INCLUYE ACCESORIOS	15	8	15	6	100%
SIFÓN SANITARIO DE 2", INCLUYE ELEMENTOS DE INSTALACIÓN	15	1	15	1	100%
TUBERÍA DE AGUAS RESIDUALES DE 2" PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y UNIONES	12	8	12	6	100%
GRIFERÍA DE LAVAPLATOS A.INOX MONOCONTROL, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	12	8	12	6	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO INCLUYE GRIFO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	28	1	28	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	28	1	28	1	100%

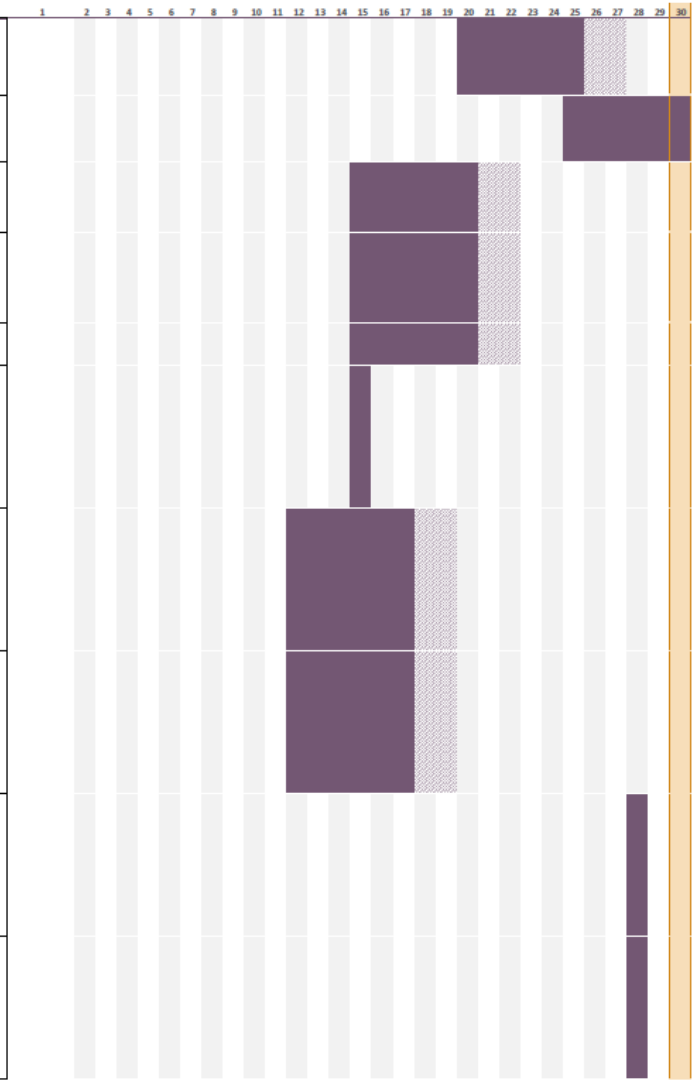


UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
GRIFERÍA PARA DUCHA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	28	1	28	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4MM CRISTAL PULIDO, BISELADO Y FLOTADO.	28	1	28	1	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE COMPLETA, (BLANCA), INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE, CABLEADO No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN PARA TIERRA, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIOS PA	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE GFCI, (BLANCA), INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE, CABLEADO No. 12 THHN / THWN, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MARCA	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE TIPO INTEMPERIE, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE, CABLEADO No. 12 THHN / THWN, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MARC	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA TOMACORRIENTE TRIFÁSICA PARA ALIMENTAR EL COMPRESOR, INCLUYE INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE, CABLEADO NO. 10 THHN / THWN, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, CAJAS DE PASO HASTA EL TABLERO DE PROTECCIONES, PASES	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA ILUMINACIÓN COMPLETA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL HERMÉTICO LED 12W LUZ CÁLIDA ACABADO EN MADERA, CABLEADO, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORREC	20	2	20	2	100%

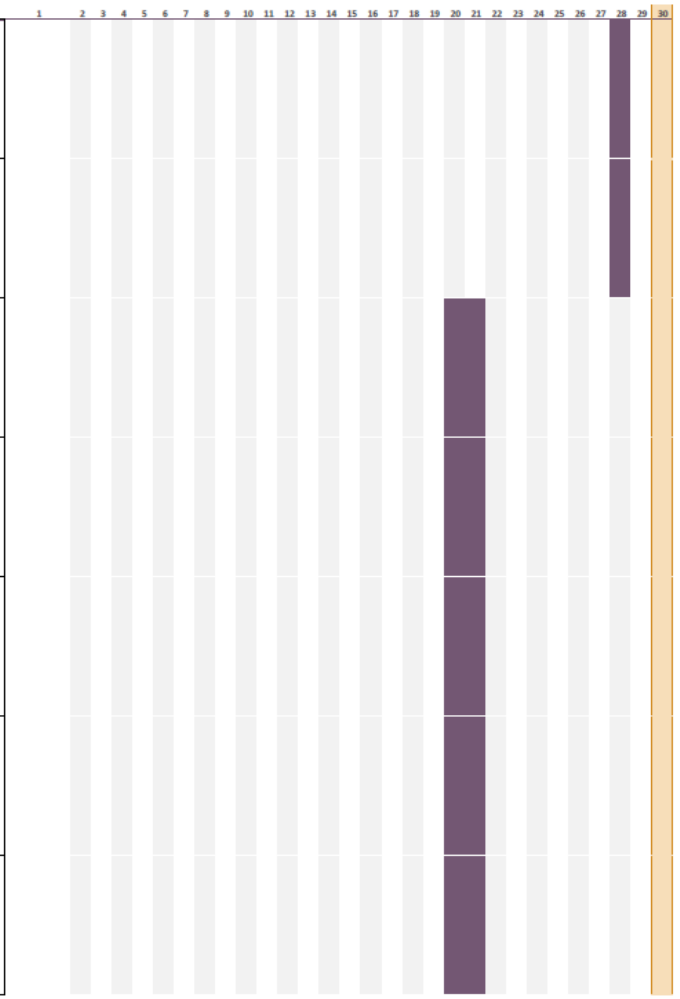


UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA ILUMINACIÓN TIPO EXTERIOR COMPLETA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO TORTUGA LED DE 12W, CABLEADO, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. CON	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR SENCILLO COMPLETA, (BLANCO), INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR, CABLEADO, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y MARCACIÓN RESPECTIVA. CON NORM	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR DOBLE COMPLETA, (BLANCA), INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR, CABLEADO NO. 12 THHN / THWN, NO. 12 THHN / THWN PARA TIERRA, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIOS P	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR TRIPLE COMPLETA, (BLANCA), INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR, CABLEADO NO. 12 THHN / THWN, NO. 12 THHN / THWN PARA TIERRA, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIOS	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE COMPLETA, (BLANCA), INCLUYE INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR, CABLEADO NO. 12 THHN / THWN, NO. 12 THHN / THWN PARA TIERRA, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, PASES A PLACA Y TODOS LOS	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS PARA TABLERO NORMAL DE 1 X 20 A. CON NORMATIVIDAD VIGENTE (RETIE).	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKERS PARA TABLERO NORMAL DE 3 X 40 A. CON NORMATIVIDAD VIGENTE (RETIE).	20	2	20	2	100%

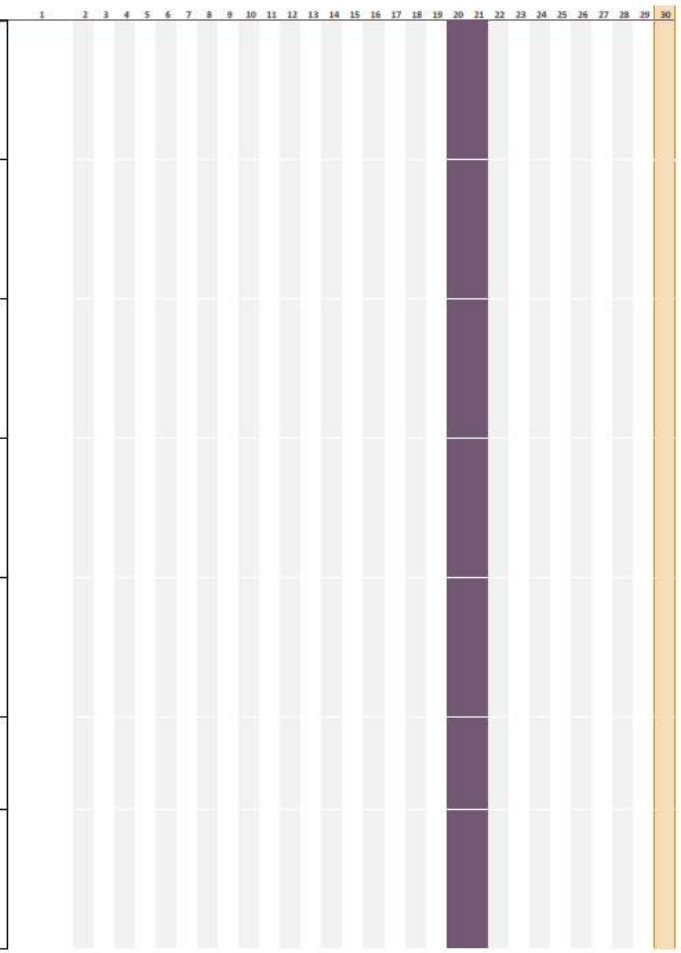

UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA 3#6 + 1#8(T) PARA ALIMENTACIÓN TABLERO NORMAL, INCLUYE INSTALACIÓN DE CABLEADO, TUBERÍA EMT O PVC SCH40 SEGÚN SE REQUIERA, CAJAS DE PASO HASTA EL TABLERO DE PROTECCIONES , PASES A PLACA Y TODOS LOS ACCESORIO	20	2	20	2	100%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON UNA VARILLA CU - CU 5/8"X8', INCLUYE CABLEADO CU N. 10 AWG, CONECTOR EN COBRE, TUBERÍA PVC Y CONEXIÓN. O SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA CON SISTEMA DE HIDROSOLTA. SE DEBE V	20	2	20	2	100%
ASEO, TRASIEGO DE SOBRANTES Y DEMOLICIONES HASTA SITIO DE ACOPIO EN PNN GORGONA Y EMPAQUE DE ESCOMBROS EN LONAS, INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL FUERA DEL ÁREA PROTEGIDA.	29	2	29	2	100%
TRANSPORTE MARÍTIMO DESDE EL PUERTO DE BUENAVENTURA HASTA ISLA GORGONA	12	1	12	1	100%
DESEMBARQUE.TRANSPORTE MARÍTIMO EN EMBARCACIÓN METRERA DESDE EL PUNTO DE ANCLAJE DEL BUQUE HASTA TIERRA.	13	1	13	1	100%
TRASIEGO. TRASLADO DE MATERIALES DESDE EL PUNTO DE DESEMBARQUE EN TIERRA HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, MEDIANTE ESFUERZO HUMANO DE FORMA DIRECTA.	13	1	13	1	100%
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	24	2	24	2	100%
DESCAPOTE	24	2	24	2	100%
DESMONTE CUBIERTA	24	2	24	2	100%
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA TIPO CERCHA	24	2	24	2	100%
DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA MADERA	24	2	24	2	100%
DESM. ESTRUCTURA MADERA EXISTENTE	24	2	24	2	100%

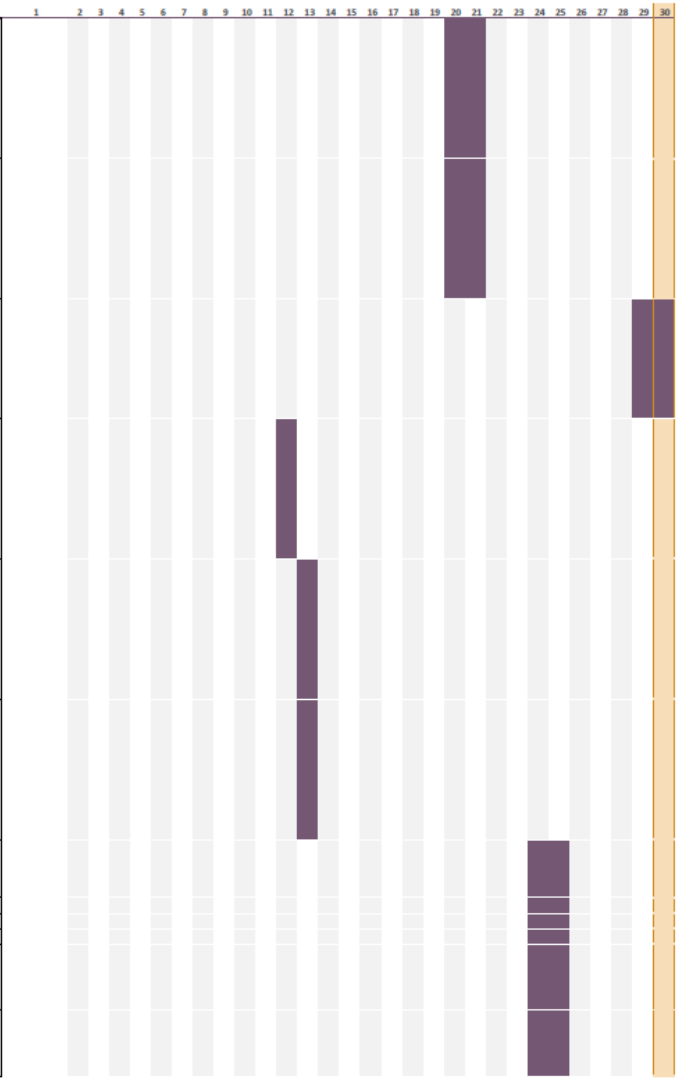

UT GORGONA 2022

ACTIVIDAD	FECHA INICIO DEL PLAN	DURACIÓN (DIAS)	INICIO REAL	DURACIÓN REAL(DIAS)	PORCENTAJE COMPLETADO
DESMONTE DE CIELO RASO	24	2	24	2	100%
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA E=25cm (incluye confinamiento)	24	2	24	2	100%
DEMOLICIÓN CONTRAPISO EN CONCRETO E=20CM	24	2	24	2	100%
DEMOLICIÓN CONTRAPISO EN CONCRETO E=40CM	24	2	24	2	100%
DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURA	24	2	24	2	100%
DEMOL. CÁRCAMO CONCRETO 3000PSI	24	2	24	2	100%
DEMOL. ESTRUCTURA CONCRETO DE SOPORTE DE TANQUES	24	2	24	2	100%
DEMOL.MURO CONCRETO E=15CM H=50CM. INC ALFAJÍA CONCRETO	24	2	24	2	100%
DESM. APARATO SANITARIO	24	2	24	2	100%
DESM. LAVAMANOS + SOPORTE EN VIDRIO	24	2	24	2	100%
DESM. DIVISIÓN DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO	24	2	24	2	100%
DESM. VENTANA - LUCETA EXISTENTE	24	2	24	2	100%
DESM. MARCO + NAVE SENCILLA	24	2	24	2	100%
DESM. ESPEJO	24	2	24	2	100%
RETIRO RED ELÉCTRICA (CABLEADO + TUBERÍA + APARATOS E ILUMINACIÓN)	24	2	24	2	100%
CERRAMIENTO PERIMETRAL EN POLISOMBRA H=2.00M CON BASE EN CONCRETO	24	2	24	2	100%

