FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 24/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 2/03/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8


CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 3.600.000.000,00	Valor Inicial	$ 432.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000,00	Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00
Valor Adicional 2	N.A	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5.202.000.000,00	Valor Actualizado	$ 624.240.000,00
Plazo Inicial	4 Meses	Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	2 Meses y 15 dias	Plazo Prorroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6 Meses 15 dias	Plazo Actualizado	7 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022	Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023	Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/03/2023	Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

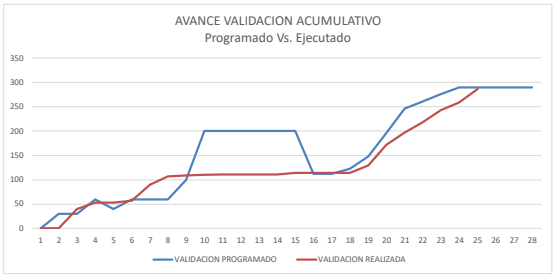



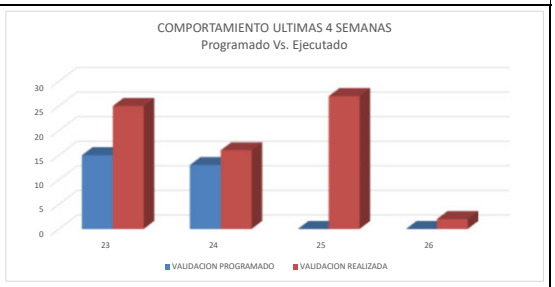


	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 23	Prog.	Ejec.	SEM 24	Prog.	Ejec.	SEM 25	Prog.	Ejec.	SEM 26	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	289	100,0%	286	99,0%	0,00%	-1,04%	0	2	0,69%	0,00%		15	25		13	16		0	27		0	2

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.


1. Se evidencia que segun la reprogramacion presentada por el Contratista de obra a la fecha se tiene un atraso del 1,04% en la etapa de validacion ya que segun dicha programacion a la fecha se debian haber validado la totalidad de las viviendas que consta de 289 viviendas en el territorio de Bella Flor y Usme que refiere al 100% de las cuales se tienen 286 con un 99,0% de avance general.
2. Con respecto a la grafica No. 2 la cual indica el porcentaje de validación durante la semana, esta presenta un avance del 0,69% debido a que en este periodo no se tenian contempladas validaciones, sin embargo se validaron 2 viviendas.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

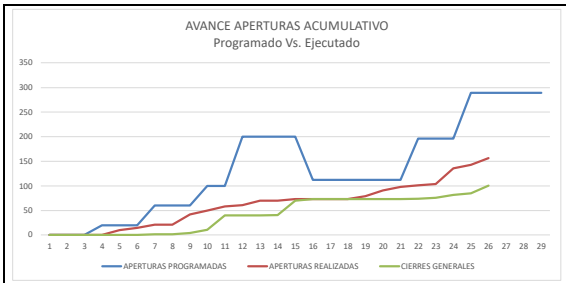



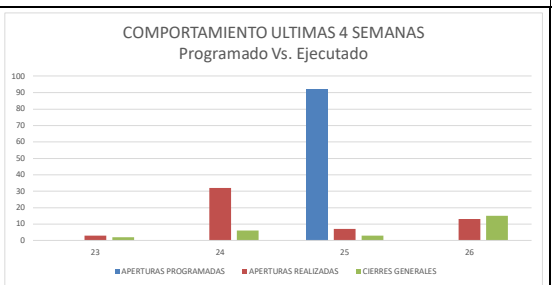

	Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)						Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 23	Prog.	Ejec.	SEM 24	Prog.	Ejec.	SEM 25	Prog.	Ejec.	SEM 26	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	289	100,0%	156	54,0%	0,0%	-46,02%	0	13	4,50%	0,00%		0	3		0	32		92	7		0	13

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. El Contratista de obra presenta 289 aperturas según la programacion. De las cuales se realizo la apertura de 156 viviendas, esto teniendo en cuenta la reprogramacion presentada por ellos, por lo tanto esto presenta un atraso del 46,02% frente a la etapa de ejecucion.
2. Según la reprogramación de obra que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener el 100% de las viviendas aperturas lo que hace referencia a 289 viviendas de las cuales se aperturaron 156 viviendas, teniendo 100 mv entregados a satisfaccion y 56 viviendas en ejecucion. Debido al poco avance en la ejecucion del contrato que se esta presentando por el Contratista de obra se solicita dar inicio a mas viviendas para mitigar los atrasos que se estan presentando a la fecha y de esta manera evitar futuros incumplimientos.

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO


EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 24/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 2/03/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

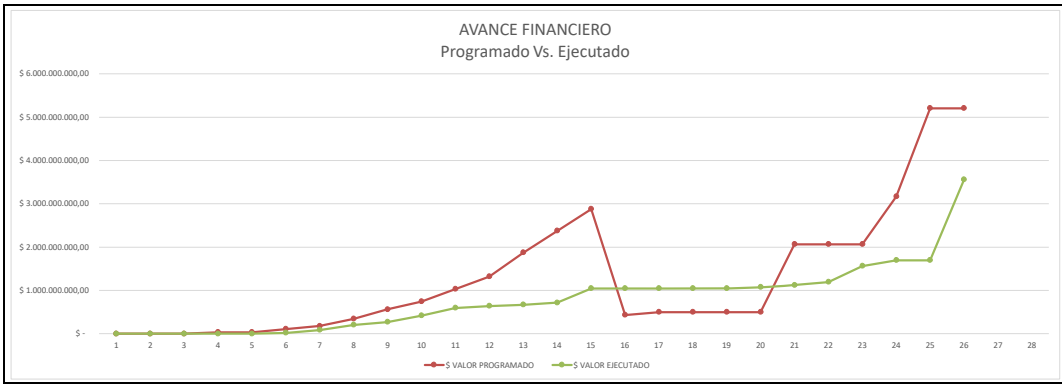

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA VS. EJECUTADA
$ 552.000.000 **$ 170.980.339,41**

% AVANCE PROGRAMADO VS. % AVANCE EJECUTADO
10,61% **3,29%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA VS. EJECUTADA
$5.202.000.000 **$ 3.556.144.517**

% AVANCE PROGRAMADO VS. % AVANCE EJECUTADO
100,0% **68,36%**

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($):
$ 1.645.855.482,27

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **45,72%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Según la reprogramación vigente la fecha y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, en el momento se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $ 1.645.855.482,27 lo que hace referencia a un45,72% de atraso frente al valor total del contrato.
2. Se debe tener en cuenta que el contratista de obra presento una programacion y flujo de caja ajustado según a la modificacion del contrato, por tal motivo se da la claridad de la disminucion de la inversion acumulada.

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA X				

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	BENEFICIARIA AMPARO TIQUE ROMERO IDENTIFICADA CON C.C. 52152205, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	BENEFICIARIA OLGA LUCIA LOZANO CERQUERA IDENTIFICADA CON C.C. 26473801, SE RECIBE INFORMACION DE RENUNCIA REALIZADA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA 19	MVBF_1014	Beneficiaria Luis Hernando Rodriguez Identificado con C.C. 79.213.212 , Se recibe información de renuncia a traves del equipo social en terriorotio Bella Flor Ciudad Bolivar el 13/01/2023	INP- SDHT-1009-2022- 107- 18/01/2023
SEMANA 21	MVBF_ 1049	Beneficiaria Yamile Darley Londoño Cardona Identificada con C.C. 1.024503.785 , Se recibe información de renuncia a traves del equipo social en terriorotio Bella Flor Ciudad Bolivar el 24/01/2023	INP- SDHT-1009-2022- 107 - 27/01/2023
SEMANA			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 23	MVBF_683	06/02/2023: El beneficiario muestra inconformidad, ya que desde el viernes no hay maestros y no se evidencia material para ejecutar actividades.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
	MVBF_0677	08/02/2023: La beneficiaria muestra inconformidad por las demoras en las obras del mejoramiento, hasta la fecha no se evidencia avance en actividades y únicamente se aplicó una mano de estuco en habitación y sala.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
	MVBF_ 0631	09/02/2023: La beneficiaria muestra inconformidad por el retraso que se presentan las obras del mejoramiento y por la falta de material.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
	MVBF_1000	07/02/2023: El beneficiario refiere que los maestros retiraron los materiales y no han regresado a trabajar, el estuco se encuentra en malas condiciones al igual que el pañete.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA

FORMATO

INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA

PROCESO

EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD
SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 24/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 2/03/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

SEMANA 24	MVBF_1000	07/02/2023: El beneficiario refiere que los maestros retiraron los materiales y no han regresado a trabajar, el estuco se encuentra en malas condiciones al igual que el pañete.	EL 13/02/2023 se realiza cierre de la PQR en visita de seguimiento se evidencian personal y material de obra.	CERRADA
	MVBF_ 645	Se realizó una visita de seguimiento a la beneficiaria MVBF_645 Maria Sixta Hurtado el día 26 de enero para llevar a cabo la apertura del proyecto, pero esta no fue posible debido a que la beneficiaria no estuvo de acuerdo con el presupuesto presentado por los profesionales técnicos. Posteriormente, se acordó con la beneficiaria un plazo de 8 días para pañetar las vigas de su vivienda y se programó una nueva visita para el 03 de febrero con el fin de verificar la actividad realizada. Sin embargo, en la visita de seguimiento no se pudo verificar la actividad, ya que la beneficiaria no atendió a la puerta y se han realizado varios intentos de contacto sin respuesta. El día 08 de febrero, finalmente se logró contactar con la beneficiaria, quien manifestó su inconformidad con las actividades programadas y su intención de renunciar al subsidio. Ante esto, la beneficiaria solicitó una nueva visita con la SDH para tomar una decisión informada. La beneficiaria envio el 9 febrero una solicitud de inconformidad a través del correo electrónico ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co, en la cual expresa su desacuerdo con el presupuesto presentado por el contratista de obra. La beneficiaria considera que no se están realizando todas las intervenciones que requiere en su vivienda y, por lo tanto, solicita una revisión del presupuesto y una reevaluación de las actividades que se están llevando a cabo.	El día 16/01/2023 se llevó a cabo una visita de seguimiento en la cual se atendieron las solicitudes de la beneficiaria con respecto a las intervenciones de Mejoramiento de Vivienda. Durante la visita, el contratista de obra se comprometió a reevaluar el presupuesto y a presentarlo nuevamente a la beneficiaria el 23/02/2023.	CERRADA
	MVBF_683	El 6/02/2023, durante una visita de seguimiento, el beneficiario manifestó su inconformidad debido a que desde el viernes no han habido maestros en el lugar y no se ha evidenciado la presencia de material necesario para llevar a cabo las actividades de construcción	EL 13/02/2023 se realiza cierre de la PQR en visita de seguimiento se evidencian personal y material de obra.	CERRADA
SEMANA 25	MVBF_0677	08/02/2023: La beneficiaria muestra inconformidad por las demoras en las obras del mejoramiento, hasta la fecha no se evidencia avance en actividades y únicamente se aplicó una mano de estuco en habitación y sala.	El día 24/02/2023, durante una visita de seguimiento realizada por el contratista e interventoría para el cierre de la PQRS, se observó personal ejecutando actividades en la cubierta de la vivienda. Además, la beneficiaria indicó estar satisfecha con las actividades ejecutadas hasta el momento.	CERRADA
	MVBF_0984	El 21/02/2023 la beneficiaria refiere refiere fisuras en pañete, la llave de la ducha tiene problemas para cerrar y el lavaplatos tiene fuga, se indica a beneficiaria que se asignará un trabajador para subsanar actividades.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	CERRADA
	MVBF_631	09/02/2023: La beneficiaria muestra inconformidad por el retraso que se presentan las obras del mejoramiento y por la falta de material.	obra para el cierre de la PQRS, se observó personal y material en la vivienda.	CERRADA
SEMANA 26	MVBF_0841	n la reunión convocada por la Junta de Acción Comunal el 25 de febrero en el salón comunal de Bella Flor, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, la beneficiaria Elizabeth Ospina manifestó que la pintura se encuentra levantada y que hay una gotera en la cubierta. Además, señaló que el lavamanos presenta moho y que la tapa del inodoro está partida.	El 1 de marzo se realiza visita a la vivienda, por parte del equipo profesional social y técnico, para verificar las inconformidades por parte de la beneficiaria donde manifiesta las siguientes: en zona de baño la pintura se levantó, rejilla de lavamanos se oxido, en la cubierta donde estala cometida eléctrica s14e filtra el agua. Se estipula que el día 2 de marzo se acudirá con el subcontratista para asignar maestro de obra para subsanar lo anteriormente mencionado. El 2 de marzo se asigna maestro de obra José Osorio para subsanar las inconformidades que presenta la beneficiaria. Se realiza visita de seguimiento donde se evidencia que el día 2 de marzo durante el día se subsanaron las actividades referidas con inconformidad por la beneficiaria, quien manifiesta estar conforme y recibe a satisfacción. Por ende, se cierra pqrs.	CERRADA
	MVBF_0840	En la reunión convocada por la Junta de Acción Comunal el 25 de febrero en el salón comunal de Bella Flor, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, la beneficiaria Maria Hemir Tapia reportó una filtración en la cubierta de la cocina. Además, señaló que la teja translúcida en el área del baño está deteriorada y que hay losetas partidas en el baño con filtración. En la zona del frente, la cubierta se encuentra caída.	El 1 de marzo se realiza visita a la vivienda, por parte del equipo profesional social y técnico, para verificar las inconformidades por parte de la beneficiaria donde manifiesta las siguientes: teja transducida hundida, cubierta parte izquierda queda mocha y se le entra el agua, amarres sueltos, en zona de baño tableta partida. Se estipula que el día 2 de marzo se acudirá con el subcontratista para asignar maestro de obra para subsanar lo anteriormente mencionado. Se realiza visita de seguimiento el 3 de marzo en horas de la mañana, donde se evidencia al maestro de obra el señor Osorio realizando las actividades pendientes por subsanar, quien refiere que en horas de la tarde quedaría todo subsanado. Se realiza llamada sobre las 2 pm, a la beneficiaria quien manifiesta que el maestro aún está realizando actividades en su vivienda. Por ende el día lunes se realizara seguimiento para dar por cerrado el pqrs.	ABIERTA
	MVBF_1195	En la reunión convocada por la Junta de Acción Comunal el 25 de Febrero en el salón comunal de Bella Flor, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolivar, la beneficiaria Dolly Rivera solicita que se realice socialización del presupuesto y activiades que se ejecutaron en la vivienda.	El 2 de marzo se realizó una visita para brindar información detallada sobre el presupuesto ejecutado durante la obra, se socializaron las actividades realizadas en cada una de las áreas intervenidas con la beneficiaria Dolly Rivera. La beneficiaria firmó su conformidad y, por lo tanto, se cerró la PQR.	CERRADA
	MVBF_1280	Durante una visita de seguimiento, la beneficiaria informó acerca de problemas de instalación del enchape.	Durante una visita social y técnica, se atendió la postventa de unas baldosas que presentaban problemas de instalación. Durante la visita, se observó que se estaban realizando las reparaciones necesarias y se procedió a cerrar el caso de postventa.	CERRADA
	MVBF_1076	La arrendataria Zulimar Tejada informó que el enchape del salpicadero del lavadero se encuentra afectado posiblemente debido a una instalación incorrecta de la llave. Además, el sanitario está suelto y le falta la boquilla.	El 3 de febrero se realiza cierre de post venta en la cual se evidencia que se instaló pieza de enchape en zona de ropas y se aplicó boquilla en sanitario.	CERRADA
	MVBF_1045	El 17 de enero, durante una visita de seguimiento técnico por parte del contratista de la obra y la interventoría, la beneficiaria Mariala Cardona reportó filtración en cubierta en la habitación y la cocina.	El 28 de febrero se llevó a cabo un cierre de postventa en el que se pudo constatar que se utilizó silicona para solucionar las filtraciones en la cubierta que se presentaban en la zona de la habitación y la cocina.	CERRADA
	MVBF_1128	Durante la visita de seguimiento realizada el 6 de febrero por parte de la interventoría y el contratista de obra, la beneficiaria expresó su preocupación debido a que se observaron fisuras en el pañete de algunos muros, así como una lámpara LED del baño que se encontraba dañada.	El 03 de marzo de 2023 se realizó una visita a la vivienda en compañía de las profesionales técnica y social, quienes verificaron el cumplimiento de las actividades pendientes por parte del contratista. Una vez se constató el cumplimiento de las mismas, se procedió a cerrar la visita satisfactoriamente para todas las partes involucradas.	CERRADA
	MVBF_1295	En la reunión convocada por la Junta de Acción Comunal el 25 de Febrero en el salón comunal de Bella Flor, ubicado en la Localidad de Ciudad Bolivar, la beneficiaria Virgelina Rodriguez reportó que en el área de la cocina hay filtraciones y que en el baño no se instalaron los accesorios correspondientes, además de que la llave de la ducha se encuentra en mal estado.	El 1 de Marzo se llevó a cabo una atención a la postventa, durante la cual la interventoría verificó la instalación de los accesorios del baño (toallero, jabonera y porta rollo). El porta rollo fue instalado bajo el lavamanos por solicitud de la beneficiaria, en acuerdo con su hijo Joaquín Valencia. Por solicitud de este último, él se encargará del arreglo de la filtración para garantizar que quede bien, por lo que no se permitió realizar el ajuste correspondiente en ese momento. Se procedió a dar cierre a la postventa.	CERRADA
	MVBF_ 793	Se realizó una visita a la vivienda y se presentó una PQRS debido a que los trabajadores no se han acercado desde la semana pasada para continuar con las labores correspondientes.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
	MVBF_0761	Se realizó una visita a la vivienda y se presentó una PQRS debido a la falta de presencia de trabajadores ejecutando la obra desde la apertura, a pesar de contar con el material necesario para iniciar las actividades.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
	MVBF_0760	Se realizó una visita a la vivienda y se presentó una PQRS debido a que no había trabajadores ejecutando la obra desde la apertura, a pesar de que se contaba con el material necesario para iniciar las actividades.	La interventoría notifica al contratista de obra de manera verbal y mediante oficio	ABIERTA
SEMANA				

Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	FORMATO **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 24/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 2/03/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: El contratista e interventoría realizaron atención al PAC (Punto de Atención al Ciudadano)los dias:
Bella Flor: Ciudad Bolívar
25 de febrero de 2023: Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.
27 de febrero de 2023: Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.
01 de Marzo de 2023: Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.
Durante el período no se ha presentado solicitudes de atención por parte de los beneficiarios.
Portal del Divino: Usme
27 de febrero de 2023: Se realiza atención al PAC, no se recibe ninguna novedad por parte de la comunidad.
Durante el período no se ha presentado solicitudes de atención por parte de los beneficiarios.

2. ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACIONES: Durante este periodo se validaron dos (2) viviendas en el barrio el Portal del Divino en Usme.
Portal del Divino Usme
MV_02749 - MV_02786

3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA: Durante este período se aperturaron trece (13) viviendas distribuidas asI: El Portal del Divino Usme cinco (5) y Bella Flor Ciudad Bolivar ocho (8)
Bella Flor Ciudad Bolivar
MVBF_1307 - MVBF_1306 - MVBF_1314 - MVBF_1276 - MVBF_1276 - MVBF_1234 - MVBF_0183 - MVBF_1007 - MVBF_0530 -
Portal del Divino Usme
MV_02940 - MV_03098 - MV_03062 -MV_03188 - MV_02942

4. ENTREGA DE VIVIENDAS: Durante el periodo se realizaron cinco (5) entregas en Bella Flor Ciudad Bolivar
Bella Flor Ciudad Bolivar
MVBF_1228 - MVBF_1315 - MVBF_805 - MVBF_650 - MVBF_683

5. SEGUIMIENTOS RELEVANTES:
Se realiza seguimiento, atiende el beneficiario, se evidencia personal de obra, adelantando actividades en la vivienda. No se presentan dudas ni inquietudes en el momento del seguimiento.
Bella Flor Ciudad Bolivar
MVBF_1347 - MVBF_1329 - MVBF_ 1240 - MVBF_745 - MVBF_0780 - MVBF_983 - MVBF_0793 - MVBF_0758- MVBF_749 -MVBF_0730 - MVBF_0761 - MVBF_0760 - MVBF_ 1121 - MVBF_094 - MVBF_ 096 - MVBF_113 - MVBF_117 - MVBF_107 - MVBF_232 - MVBF_223 - MVBF_1465 -MVBF_1000- MVBF_0837 - MVBF_0972 - MVBF_1329 -MVBF_1306 - MVBF_1240 - MVBF_1306 - MVBF_066 - MVBF_1306 - MVBF_1314 - MVBF_1240 - MVBF_0294 - MVBF_0985 - MVBF_106 - MVBF_0737 - MVBF_780 - MVBF_0985 - MVBF_1013 - MVBF_ 0669
Portal del Divino Usme
MV_03300 - MV_03397 - MV_03288 - MV_03171 - MV_03187 - MV_03189 -MV_03201 - MV_03061 -MV_03086 - MV_03067 - MV_03095 - MV_03101 - MV_03103 - MV_02928 - MV_02940 -MV_03290 -
Se observa que no hay ni personal y materiales :MVBF_0972 - MVBF_820 - MVBF_631 - MVBF_0679 - MVBF_645

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 26	**6 M3**	Se hizo disposición en CEMEX - Tunjuelo, RES.1480 Del 04 de diciembre de 2014 - ANLA	VALE _ FOLIO:03032023 228735231 PIN: 532 PLACA: OBD O20 CAPACIDAD 6 M3
MES	**MARZO**		
SECTOR	**USME**		
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**6**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**64**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA			
SEMANA 26	**0 M3**	Se evidencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega No se ha realizado disposición de RESPEL. Se solicitó nombre y licencia del gestor para disposición final.			
MES	**MARZO**				
SECTOR	**BF .USME**				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**		

•El personal administrativo y operativo recibe charlas con temas enfocados en el componente de SST y ambientales referentes a: Uso adecuado de las herramientas eléctricas, aprender a aprender, y medidas para evitar el aporte de residuos contaminantes al alcantarillado de las viviendas.
•Se hace acompañamiento SST-MA en los sectores de Usme y Bella Flor, al seguimiento técnico social, evidenciando el uso de dotación y EPP y botas de seguridad.
•Durante las caracterizaciones sociales, se observan los riesgos que puedan afectar el componente SST o ambiental en la ejecución de las actividades.
•Hubo ingreso de personal operativo es por ello que se realiza inducción, así mismo se les hace notificación de los riesgos a los que estará expuesto, se divulgan a cada uno las observaciones que se presenten en los exámenes médicos cuando se requiera, y se diligencian perfiles sociodemográficos con los datos de este personal.
•Hubo retiro del personal, por tal razón se procede a solicitar paz y salvo y a generar la carta de solicitud de examen de retiro.
•Se hace seguimiento de procedimiento de instalación de cubierta y trabajo a diferente nivel sin superar o alcanzar los 2 m. de igual manera, se les hace socialización de procedimiento, inspección correspondiente del andamio y área de trabajo, verificando que cuenten con sus EPP adecuados para la realización de la tarea.
•Se mantiene el acopio en la bodega de los RESPEL entre ellos: bolsas de cemento, bolsas de pegante, tarros de pintura y tarros de anticorrosivos para completar la cantidad solicitada por el proveedor contactado para su disposición final.
•Se realizan entregas de vivienda, verificando que las viviendas queden con el frente y el interior de la misma libre de escombros.
•Se recibe certificado de disposición por conductor de Volqueta OBD 020,PIN utilizado 532, Certificados número 03032023 228735231. Para el sector de USME
y se continua el acopio de los RCD en la bodega Bella flor, hasta completar nuevo viaje y la cantidad requerida
• Por parte de la interventoria se recibe charla de refuerzo en prevención lesiones de columna
• Verificacion en listado de SDA el pin utilizado de acuerdo a la placa de la volqueta OBD 020, encontrándolo activo en el listado.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	6	CAPACITACIONES REALIZADAS	6	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	1	CAPACITACIONES REALIZADAS	1	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			46	PERSONAL ADMINISTRATIVO	12						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	8	PERSONAL OBRERO	8	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA					14
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	11	PERSONAL OBRERO	11	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

SEMANA No. 26 (Consecutivo) **DEL** 24/02/2023 (dd-mm-aa) **AL** 2/03/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO
ANEXO 2: REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE SOCIAL

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los **OCHO** (Día en letras) **8** (Día en números) días del mes del **MARZO** (Mes en letras) de **2023** (Año de firma del informe)

Firma

Nombre (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	8-mar-23

BUILDING SAS			
Contrato de Obra	**994 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		Fecha de Terminacion Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Objeto	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"**	**Plazo Inicial**	CUATRO (4) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE MARZO DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($5.202.000.000) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.			
Contrato de interventoría	**1009 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		Fecha de Terminacion Inicial	31 DE ENERO DE 2023
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."**	**Plazo Inicial**	CINCO (5) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE ABRIL DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($624.240.000) M/Cte**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							**Fase 2: Ejecución de obras**					
					Validacion		**Ejecución**					
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Ejecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	**Arq Leonardo Solano**	ALFONSO LOPEZ	91	291	91	0	16	4	0	71	**41,25%**	4
		BELLA FLOR	17		17	0	0	17	0	0		17
	Arq Luisa Franco		61		61	0	15	32	0	14		32
	Ing Martha Neira		60		59	0	12	31	1	16		31
	Arq. Edwin Baez		62		61	0	9	21	1	31		21
Subtotal			**291**	**291**	**289**	**0**	**52**	**105**	**2**	**132**		**101**

AVANCE DE EJECUCION SEMANAL											**MARZO**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**		**Tiempo Programación**				**% ACUMULADO**	SEMANA DEL 25 AL 03
No. Etiq.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha Validacion	Fecha inicio	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 26**
BARRIO BELLA FLOR											
GRUPO No. 1											
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	$14.400.400,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	12 de enero de 2023	11 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$14.369.650,00	$14.395.216,00	19 de septiembre de 2022	12 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$13.769.930,00	$14.370.476,00	19 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	$14.396.371,00	$14.400.000,00	19 de septiembre de 2022	2 de noviembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$14.399.376,00	$14.399.379,00	20 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$14.358.554,00	$14.400.000,00	19 de septiembre de 2022	21 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$14.258.458,00	$14.399.470,00	20 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$14.381.322,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$14.397.146,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	21 de octubre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	$14.381.643,00	$14.400.000,00	19 de octubre de 2022	4 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO	$14.398.840,00	$14.400.000,00	19 de octubre de 2022	4 de noviembre de 2022	7 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	$14.373.000,00	$14.400.000,00	27 de octubre de 2022	7 de diciembre de 2022	14 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS	$14.372.322,00	$14.400.000,00	27 de octubre de 2022	6 de diciembre de 2022	14 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%

50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ	$14.398.427,00	$14.400.000,00	31 de octubre de 2022	21 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS	$14.399.498,00	$14.400.000,00	27 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$13.396.482,00	$14.352.138,00	13 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$14.400.000,00	$14.398.350,00	13 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
GRUPO No. 2											
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO	$14.400.000,00	$14.399.607,00	19 de septiembre de 2022	12 de enero de 2023	15 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	$14.400.000,00	$1.439.838,00	20 de septiembre de 2022	18 de enero de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	$14.398.521,00	$14.398.521,00	28 de septiembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	$14.394.664,00	$14.396.664,00	26 de septiembre de 2022	11 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$14.392.074,00	$14.395.263,00	26 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$14.397.445,00	$14.398.134,00	28 de septiembre de 2022	20 de octubre de 2022	25 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	$14.396.808,00	$14.400.000,00	26 de septiembre de 2022	18 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$14.399.088,00	$14.397.014,00	26 de septiembre de 2022	18 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$14.390.758,00	$14.399.950,00	26 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	11 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$14.000.000,00	$14.399.644,00	26 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$14.000.000,00	$14.026.240,00	28 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	21 de octubre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	$14.394.090,00	$14.399.367,00	26 de septiembre de 2022	16 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	$14.398.893,00	$14.398.893,00	26 de septiembre de 2022	11 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$14.397.782,00	$14.397.074,00	28 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	11 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$14.000.000,00	$14.268.863,00	25 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	$14.390.362,00	$14.392.796,00	19 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	$14.398.603,00	$14.398.603,00	19 de septiembre de 2022	11 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	$14.392.970,00	$14.398.864,00	19 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	$14.393.909,00	$14.398.643,00	19 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	$14.395.403,00	$14.392.809,00	18 de octubre de 2022	1 de noviembre de 2022	10 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	$14.396.904,00	$14.396.936,00	18 de octubre de 2022	1 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA	$14.000.000,00		18 de octubre de 2022	12 de enero de 2023		EJECUCION	55,00%	4,00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO	$14.394.679,00	$14.394.679,00	20 de octubre de 2022	11 de noviembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	19 de octubre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	$14.400.000,00		19 de octubre de 2022	23 de febrero de 2023		EJECUCION	20,00%	20,00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO			19 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%

67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA	$14.397.247,00	$14.383.897,00	19 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO	$14.398.620,00	$14.398.620,00	19 de octubre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO			28 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON			13 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	$14.400.000,00		27 de enero de 2023	21 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS			13 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA			23 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS			23 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	$14.399.430,00	$14.400.000,00	19 de septiembre de 2022	17 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	5,00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON	$14.386.084,00		21 de septiembre de 2022	15 de febrero de 2023		EJECUCION	15,00%	0,00%
120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	$14.400.000,00		23 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	50,00%	20,00%
121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	$14.400.000,00		20 de septiembre de 2022	15 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE	$14.400.000,00		20 de septiembre de 2022	7 de febrero de 2023		EJECUCION	60,00%	15,00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ	$14.400.000,00		20 de septiembre de 2022	15 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	$14.400.000,00	$14.400.000,00	21 de septiembre de 2022	17 de enero de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	6 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	30,00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	17 de enero de 2023	14 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY			25 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	$14.400.000,00	$14.400.000,00	20 de septiembre de 2022	17 de enero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	5,00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON			20 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS			30 de enero de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA	$14.400.000,00	$14.000.000,00	18 de enero de 2023	13 de febrero de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	40,00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	$14.400.000,00		16 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	45,00%	5,00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ	$14.400.000,00		19 de enero de 2023	15 de febrero de 2023		EJECUCION	30,00%	10,00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE	$14.400.000,00		17 de enero de 2023	24 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO	$14.400.000,00		19 de enero de 2023	15 de febrero de 2023		EJECUCION	25,00%	5,00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA	$14.400.000,00	$14.000.000,00	19 de enero de 2023	13 de febrero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	40,00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	$14.400.000,00		19 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	70,00%	5,00%

185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ	$14.400.000,00		18 de enero de 2023	15 de febrero de 2023		EJECUCION	15,00%	10,00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA	$14.400.000,00		20 de enero de 2023	15 de febrero de 2023		EJECUCION	55,00%	20,00%
GRUPO No. 3											
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	$14.398.932,00	$14.335.475,00	21 de septiembre de 2022	20 de enero de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	$13.947.172,00	$1.394.717.200,00	21 de septiembre de 2022	24 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO	$14.399.302,00	$14.400.000,00	21 de septiembre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO			19 de septiembre de 2022			RENUNCIA	0,00%	0,00%
30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$14.374.413,00	$14.227.821,00	20 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	$13.862.187,32	$14.399.456,00	20 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$14.400.000,00	$14.391.266,00	19 de septiembre de 2022	10 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	$14.152.874,42	$14.382.156,00	19 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	$14.003.597,43	$14.392.594,00	20 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	$14.400.000,00	$14.400.000,00	21 de octubre de 2022	11 de enero de 2023	9 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES	$14.381.900,00	$14.288.616,00	19 de octubre de 2022	11 de enero de 2023	3 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA	$14.375.117,00		19 de octubre de 2022	2 de marzo de 2023		EJECUCION	10,00%	10,00%
46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	$14.359.021,00	$14.359.021,00	19 de octubre de 2022	18 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	4,00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	$14.396.197,00		27 de octubre de 2022	27 de febrero de 2023		EJECUCION	30,00%	30,00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ	$14.385.765,00		20 de enero de 2023	2 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	$14.361.870,00		13 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	80,00%	30,00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS			20 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	$14.293.093,00		20 de enero de 2023	2 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS	$14.374.629,00	$14.374.629,00	19 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ	$14.372.084,00	$14.350.983,00	19 de octubre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO	$14.397.837,00	$14.397.384,00	19 de octubre de 2022	31 de octubre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS	$14.385.749,00	$14.397.804,00	19 de octubre de 2022	30 de enero de 2023	13 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	$14.323.880,00	$14.350.235,00	19 de octubre de 2022	30 de enero de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	$14.358.302,00	$14.377.649,00	19 de octubre de 2022	31 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO	$14.394.740,00	$14.394.740,00	1 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE			21 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%

94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR	$14.308.128,00	$14.350.402,00	21 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL	$14.309.042,00	$14.309.042,00	21 de octubre de 2022	16 de enero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	100,00%	10,00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	$14.389.630,00	$14.363.094,00	21 de octubre de 2022	1 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	$14.307.907,00	$14.370.157,00	21 de octubre de 2022	31 de octubre de 2022	27 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	$14.376.459,00	$14.376.459,00	21 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	$14.394.361,00		26 de octubre de 2022	27 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA	$14.171.779,00	$14.365.252,00	26 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO	$14.302.827,00	$14.400.000,00	12 de enero de 2023	25 de enero de 2023	24 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA	$14.390.090,00		12 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	30,00%	7,00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO	$14.194.616,00	$14.355.025,00	28 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	$14.399.708,00		13 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	27,00%	2,00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	$14.360.668,00	$14.363.094,00	28 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	$14.396.907,00	$14.387.990,00	28 de octubre de 2022	15 de noviembre de 2022	23 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$14.399.111,00		17 de enero de 2023	10 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	$14.316.470,00	$14.391.855,00	28 de octubre de 2022	23 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	$14.363.897,00	$14.393.655,00	28 de octubre de 2022	11 de enero de 2023	9 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON	$14.355.892,00		13 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	73,00%	18,00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE			12 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ	$14.376.352,00	$14.376.352,00	12 de enero de 2023	3 de febrero de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	$14.259.777,00		16 de enero de 2023	7 de febrero de 2023		EJECUCION	95,00%	19,00%
160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO			16 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO			27 de octubre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	$14.393.002,00		19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO			26 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO			7 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%

198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO			26 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES			25 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ			25 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
GRUPO No. 4											
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO	$14.350.659,00	$14.381.817,00	21 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$13.883.096,82	$14.389.392,00	21 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	9 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA			20 de septiembre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ	$14.329.132,00	$14.397.966,00	21 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	$14.388.713,09	$14.388.713,09	19 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	21 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS	$14.396.471,00	$14.396.471,00	19 de septiembre de 2022	29 de noviembre de 2022	21 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$14.128.717,42	$14.028.825,00	21 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	$14.397.127,18	$14.377.332,00	20 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	$14.365.960,30	$14.398.854,00	18 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA	$14.000.000,00	$14.397.361,00	20 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	$14.000.000,00	$14.216.473,00	18 de octubre de 2022	11 de enero de 2023	06 de marzo de 2023 UNILATERAL	ENTREGADA	99,00%	9,00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO			18 de octubre de 2022	3 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	$14.346.022,00	$14.398.500,00	18 de octubre de 2022	26 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ						RENUNCIA	0,00%	0,00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA	$14.000.000,00	$14.400.000,00	14 de diciembre de 2022	16 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	15,00%
79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS	$14.276.401,00		10 de enero de 2023	17 de febrero de 2023		EJECUCION	35,00%	35,00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA			14 de diciembre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	$14.000.000,00	$14.400.000,00	14 de diciembre de 2022	16 de enero de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	5,00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ			14 de diciembre de 2022			VALIDADA	0,00%	0,00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDINA MRTINEZ	$14.363.595,00	$14.396.067,00	12 de enero de 2023	24 de enero de 2023		EJECUCION	60,00%	15,00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	$14.394.860,00	$14.394.860,00	27 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO			20 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ			23 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ			20 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA			20 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%

113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA			27 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	$14.397.978,00	$14.397.978,00	20 de octubre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA			27 de octubre de 2022	3 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ	$14.245.243,00	$14.398.250,00	28 de octubre de 2022	16 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	$14.000.000,00	$14.398.607,00	27 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ	$14.000.000,00	$14.398.700,00	27 de octubre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100,00%**	0,00%
136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	$14.000.000,00		12 de enero de 2023	24 de enero de 2023		EJECUCION	30,00%	5,00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO			16 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA	$14.000.000,00	$14.400.000,00	12 de enero de 2023	24 de enero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	12,00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO	$14.369.445,00		12 de enero de 2023	23 de febrero de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO			16 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	$14.355.020,00	$14.400.000,00	10 de enero de 2023	24 de enero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	10,00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO	$14.321.453,00		10 de enero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	70,00%	25,00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	$14.376.746,00	$14.400.000,00	10 de enero de 2023	24 de enero de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100,00%**	10,00%
145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL			19 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA			7 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA			8 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS			9 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO			6 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ			6 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA			6 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO			6 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO			31 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO			1 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	$14.400.000,00		1 de febrero de 2023	13 de febrero de 2023		EJECUCION	75,00%	40,00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA	$14.393.928,00		30 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	75,00%	15,00%

169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ			1 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA			1 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
199	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO			9 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
200	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA			9 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
BARRIO ALFONSO LOPEZ											
GRUPO No. 1											
	MV_03049	CL 111A SUR 8 61 ESTE	MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA			8 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03061	CL 112 SUR 8 75 ESTE	JOSE LISANDRO COLO OYOLA	$14.398.413,00		20 de enero de 2023	17 de febrero de 2023		EJECUCION	30,53%	17,00%
	MV_03062	KR 8A ESTE 112 15 SUR	ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ	$9.430.540,00		23 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02928	CL 112 SUR 8A 68 ESTE	JOSE JACINTO CANTE	$14.397.681,00		27 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	40,76%	17,58%
	MV_02931	CL 112 SUR 8A 56 ESTE	ETELVINA CAMACHO VELASCO			26 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02940	CL 112 SUR 8A 26 ESTE	GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO	$14.396.181,00		26 de enero de 2023	27 de febrero de 2023		EJECUCION	31,47%	31,47%
	MV_02942	CL 112 SUR 8A 10 ESTE	MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES	$10.969.538,00		10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02952	CL 111A SUR 8A 29 ESTE	MARTHA MORENO TORRES			8 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02953	CL 111A SUR 8A 35 ESTE	HERMINDA CIPACON CIPACON			8 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02962	CL 111A SUR 8A 69 ESTE	HEBER TUMAL TUMAL			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02963	CL 111A SUR 8A 81 ESTE	NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02967	CL 111 SUR 8A 89 ESTE	JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02968	CL 111A SUR 8A 93 ESTE	MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02969	CL 111A SUR 8A 97 ESTE	FLORMABEL DIAZ GONZALEZ			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02977	CL 112 SUR 8C 86 ESTE	BENJAMIN TIQUE LONDOÑO						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03014	CL 112 SUR 9 48 ESTE	DELFA SUAREZ RUEDA			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03015	CL 112 SUR 9 44 ESTE	JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03016	CL 112 SUR 9 40 ESTE	NOHEMY GALLEGO ARIAS						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03017	CL 112 SUR 9 30 ESTE	YOLANDA RODRIGUEZ			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03019	CL 112 SUR 9 22 ESTE	MARCO ANTONIO ROBAYO						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03086	CL 112A SUR 8A 08 ESTE	OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA	$14.399.892,00		20 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	46,90%	18,91%
	MV_03095	CL 112 SUR 8A 33 ESTE	NIKOLL MARCELA IBARRA ESPINOSA	$14.383.554,00		27 de enero de 2023	22 de febrero de 2023		EJECUCION	28,79%	22,32%
	MV_03098	CL 112 SUR 8A 43 ESTE	ANA YANETH PEÑA VERANO	$14.390.874,00		23 de enero de 2023	2 de marzo de 2023		EJECUCION	0,00%	0,00%
	MV_03101	CL 112 SUR 8A 55 ESTE	EDGAR RINCON CASTAÑEDA	$14.393.346,00		23 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	35,73%	32,66%
	MV_03103	CL 112 SUR 8A 67 ESTE	MARGOTH SANCHEZ MENDOSA	$14.396.185,00	$14.396.819,00	26 de enero de 2023	22 de febrero de 2023		EJECUCION	83,07%	51,56%

	MV_03120	CL 112A SUR 8C 68 ESTE	MARIA NELY PAMO ANDRADE						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	JESUS MARIA PULIDO BERNAL			17 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03130	CL 112 SUR 8C 13 ESTE	JAIRO ALBERTO SIERRA CELY						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03171	CL 113 SUR 8A 66 ESTE	JOSE RICARDO TRIANA	$14.398.633,00		16 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	48,76%	13,28%
	MV_03213	CL 113 SUR 8C 04 ESTE	JAIRO JONNY SILVA			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03216	CL 112A SUR 8C 17 ESTE	JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03288	CL 113 SUR 8A 57 ESTE	MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO	$14.398.147,00	$14.394.584,00	16 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	88,41%	23,51%
	MV_03290	CL 113 SUR 8A 67 ESTE	MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS	$14.387.507,00	$14.391.019,00	16 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	84,74%	21,25%
	MV_03374	CL 114 SUR 8C 33 ESTE	VICTOR MANUEL ALDANA LESMES			16 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03401	CL 114A SUR 8B 41 ESTE	ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA			2 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02761	CL 111A SUR 10B 09 ESTE	LUIS CARLOS JEJEN JEJEN			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02995	CL 111A SUR 8C 31 ESTE	DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS			16 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03000	CL 111A SUR 8C 61 ESTE	NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03005	CL 111A SUR 8C 85 ESTE	URIEL CLAROS CHAVARRO			16 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03018	CL 112 SUR 9 26 ESTE	JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03024	CL 111A SUR 9 09 ESTE	LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03042	CL 111A SUR 10 17 ESTE	SMITH RUEDA SANCHEZ			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03139	KR 9 ESTE 112 09 SUR	LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03188	CL 112A SUR 8A 25 ESTE	CHERLY OSORIO MORA			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03201	CL 112A SUR 8A 87 ESTE	ANGELINA ORTIZ CARVAJAL	$14.398.920,00		19 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	53,39%	28,31%
	MV_03218	CL 112A SUR 8C 35 ESTE	BEATRIZ ELLIS ESCORCIA			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03241	CL 112A SUR 8D 21 ESTE	LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA			16 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03243	CL 112A SUR 9 07 ESTE	BLANCA AURORA NIÑO CASALLAS			9 de marzo de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03247	CL 112A SUR 9 33 ESTE	MESIAS ROMERO GARCIA			20 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03248	CL 112A SUR 9 39 ESTE	JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03262	CL 114 SUR 8B 36 ESTE	CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA			8 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03268	CL 114 SUR 8 38 ESTE	MARTHA CECILIA BARRETO QUINA			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03271	CL 114 SUR 8 18 ESTE	SANDRA YASMIN CASTILLO BELTRAN			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03020	CL 112 SUR 9 16 ESTE	YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02749	CL 111 SUR 10B 25 ESTE	FERLEIN MATEUS HERNANDEZ			3 de marzo de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03031	CL 111A SUR 9 51 ESTE	GLORIA PATRICIA GALLEGO						VALIDADA	0,00%	0,00%

	MV_03067	CL 112A SUR 8A 88 ESTE	MARTHA ARANDA	$14.397.071,00		19 de enero de 2023	17 de febrero de 2023		EJECUCION	40,80%	21,11%
	MV_03116	CL 112A SUR 8D 14 ESTE	NELSON RODRIGUEZ ROJAS			16 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03123	CL 112A SUR 8C 50ESTE	FANY LEONOR LOPEZ RIVERA						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03189	CL 112A SUR 8A 27 ESTE	NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ	$14.379.137,00		17 de enero de 2023	17 de febrero de 2023		EJECUCION	38,26%	16,11%
	MV_03190	CL 112A SUR 8A 35 ESTE	LIGIA BERNAL DE LEYTON			17 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03211	CL 113 SUR 8C 08 ESTE	GRACIELA CRUZ DIAZ			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03229	CL 113 SUR 8D 58 ESTE	LUIS ANTONIO GARCIA MORENO			13 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03231	CL 113 SUR 8D 40 ESTE	ISMAEL GAONA						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03239	CL 112A SUR 8D 15 ESTE	LUCILA OCHOA DE VEGA			13 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03258	CL 114A SUR 8B 66 ESTE	GIOVANNY ANDRES MEDINA			1 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03270	CL 114 SUR 8 26 ESTE	BETTY PAYAN ACEVEDO			30 de enero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03300	CL 114 SUR 8 44 ESTE	FABIOLA ALVARADO SANCHEZ	$10.632.668,00		30 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	70,92%	12,54%
	MV_03339	CL 113 SUR 8D 97 ESTE	SIXTO ABILIO PERALTA RINCON			17 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03352	CL 114 SUR 8B 09 ESTE	CARMEN MERCEDES TORRES RICO			1 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03359	CL 114 SUR 8B 57 ESTE	JAZMIN ALONSO MENDEZ			6 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_02748	KR 10B BIS ESTE 111 06 SUR	ANGELMIRA FUENTES FUENTES			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03215	CL 112A SUR 8C 11 ESTE	ANA BETULIA MESA LOPEZ			10 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03344	CL 114A SUR 8B 30 ESTE	ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO			2 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03150	CL 112A SUR 9 04 ESTE	MARTHA RUBIO DELGADO						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03317	CL 114 SUR 9 38 ESTE	JOSE DIAZ CRUZ						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03041	CL 111A SUR 10 11 ESTE	ELENA ULCUNCHE VARGAS						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03187	CL 112A SUR 8A 21 ESTE	VIRGINA GARCIA MORENO	$14.398.145,00		17 de enero de 2023	14 de febrero de 2023		EJECUCION	33,03%	30,38%
	MV_03232	CL 113 SUR 8D 22 ESTE	MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03314	CL 114 SUR 9 78 ESTE	CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03320	CL 114 SUR 8D 20 ESTE	MYRIAM NOVA GONZALEZ						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03321	KR 8D ESTE 113 20 SUR	JHULHTZAI GUEVARA OÑATE						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MV_03397	CL 114A SUR 8B 59 ESTE	LUZ STELLA AYA LOPEZ	$14.395.865,00		2 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023		EJECUCION	20,39%	8,80%
	MV_03399	CL 114A SUR 8B 47 ESTE	JORGE ELIECER TABARES GARCIA			2 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03125	CL 112A SUR 8C 44 ESTE	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES			17 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03328	CL 113 SUR 8D 25 ESTE	LUZ NELLY CARDONA JURADO						VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03403	CL 114A SUR 8B 21 ESTE	FELISA ALEJO ARDILA			2 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%

	MV_03040	CL 111A SUR 10 07 ESTE MJ	YAMIL TOVAR INFANTE			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_03072	CL 112A SUR 8A 62 ESTE	GERMAN SASCRITAN GONZALEZ			21 de febrero de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_02786	CL 110 SUR 9 70 ESTE	JUAN GABRIEL ALBERTO MOLANO MADRIGAL			3 de marzo de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%
	MVAL_00105	KR 6 ESTE 100 B 10 SUR	HERNAN MORENO HERNANDEZ			3 de marzo de 2023			VALIDADA	0,00%	0,00%

INPLAYCO S.A.S.
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES

ANEXO 2

Registro fotográfico componente social

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - CIUDAD BOLIVAR			
			
Actividad: Entrega MVBF_1228 Sandra Rey Vanegas. Fecha: 27/02/2023	Actividad: Entrega MVBF_1315 María Teresa Montoya De Bermúdez Fecha: 27/02/2023	Actividad: Entrega MVBF_805 Manuel Moncada Fandiño. Fecha: 27/02/2023	Actividad: Apertura MVBF_1307 Emperatriz Ramírez Bohórquez. Fecha: 27/02/2023
			
Actividad: Apertura MVBF_1306 Luz Stella Betancourt Giraldo. Fecha: 27/02/2023	Actividad: Apertura MVBF_1314 Mariela Sandoval Vera. Fecha: 01/03/2023	Actividad: Apertura MVBF_1234 Willians González Pedroza. Fecha: 01/03/2023	Actividad: Apertura MVBF_1276 Elizabeth Sepúlveda Díaz. Fecha: 01/03/2023
			
Actividad: Apertura MVBF_0183 Dori Hernández Hernández Fecha: 01/03/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0820 Luis Carlos Lombana Fecha: 23/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1240 Hébert Fredy Arias Beltrán Fecha: 03/03/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1329 Julio Cesar Builes Muriel Fecha: 24/02/2023

			
Actividad: Seguimiento MVBF_0972 Pablo Enrique Calderón Gaitán Fecha: 24/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_837 Sandra Patricia Rodríguez Ayala Fecha: 24/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1306 Luz Stella Betancourt Giraldo Fecha: 24/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_1314 Mariela Sandoval Vera. Fecha: 24/02/2023
			
Actividad: Seguimiento PQR MVBF_0841 Elizabeth Ospina Caicedo Fecha: 3/03/2023	Actividad: Seguimiento PQR MVBF_0840 María Hemir Hernández Tapia Fecha: 27/02/2023	Actividad: Atención PAC Fecha: 25/02/2023	Actividad: Seguimiento MVBF_745 Fecha: 27-02-2023
			
Actividad: Seguimiento MVBF_0730 Fecha: 27-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0749 Fecha: 27-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0780 Fecha: 27-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_983 Fecha: 27-02-2023

			
Actividad: Seguimiento MVBF_094 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_113 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_096 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_117 Fecha: 28-02-2023
			
Actividad: Seguimiento MVBF_232 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_223 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0294 Fecha: 28-02-2023	Actividad: Seguimiento MVBF_0985 Fecha: 28-02-2023
			
Actividad: PQR MVBF_0761 Fecha: 02-03-2023	Actividad: PQR MVBF_0760 Fecha: 02-03-2023	Actividad: PQR MVBF_0793 Fecha: 02-03-2023	Actividad: PQR MVBF_1128 Fecha: 03-03-2023

			
Actividad: Apertura de vivienda MVBF_530 Fecha: 03/03/2023	Actividad: Apertura de vivienda MVBF_1007 Fecha: 03/03/2023	Actividad: Entrega de vivienda MVBF_650 Fecha: 28/02/2023	Actividad: Entrega de vivienda MVBF_683 Fecha: 28/02/2023
			
Actividad: Seguimientos MVBF_1000 Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_1013 Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_0677 Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_631 Fecha:02/03/2023
			
Actividad: Seguimientos MVBF_0669 Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_660 Fecha: 02/03/2023	Actividad: Visita de seguimiento MVBF_0649 Fecha:02/03/2023	Actividad: Seguimientos MVBF_066 Fecha: 02/02/2023

			
Actividad: seguimientos MVBF_0679 Fecha:02/03/2023	Actividad: seguimientos MVBF_645 Fecha:02/03/2023	Actividad: Atención PAC Fecha:01/03/2023	

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES - USME			
			
Actividad: Seguimiento MV_03300 USME Fecha: 27/02/2023	Actividad: Seguimiento MV_03067 USME Fecha: 27/02/2023	Actividad: Seguimiento MV_03397 USME Fecha: 27/02/2023	Actividad: Seguimiento MV_ 03201 USME Fecha: 27/02/2023
			
Actividad: Seguimiento MV_03187 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03086 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03061 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03101 USME Fecha: 02/03/2023
			
Actividad: Seguimiento MV_03103 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_02928 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03201 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03290 USME Fecha: 02/03/2023

			
Actividad: Seguimiento MV_03171 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_03288 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_ 03300 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Seguimiento MV_02940 USME Fecha: 02/03/2023
			
Actividad: Seguimiento MV_03397 USME Fecha: 02/03/2023	Actividad: Apertura de obra MV_03062 USME Fecha: 03/03/2023	Actividad: Apertura de obra MV_03062 USME Fecha: 03/03/2023	Actividad: Apertura de obra MV_02942 USME Fecha: 03/03/2023
			
Actividad: Validación MVAL_02786 USME Fecha: 03/03/2023	Actividad: Validación MV_02749 USME Fecha: 03/03/2023	Atención al PAC 27/02/2023	
