2023 03 30 32,088,382.00

GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO

TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **********

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 30,736

Fecha : 30/marzo/2023 **Pagado a :** 15381471-4 GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO

La Suma de : TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE **********

Valor $ 32,088,382.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ

Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

POR CONCEPTO DE MATERIALES - MNTO SERVICIOS

No. 82,819.00 **Fact** **Valor Bruto $**30,958,400.00 **Valor Neto $** 32,088,382.00

Codigo	Descripcion	Valor
12	RETEIVA SERVICIOS	882,314.00
16	IVA DEL 19	5,882,096.00
3	SERVICIOS 4%	1,238,336.00
CUL	ESTAMPILLA PROCULTURA	309,584.00
EBA	ESTAMPILLA PRO ANCIANO	1,238,336.00
EPH	ESTAMPILLA PRO HOSPITALES	309,584.00
PDE	ESTAMPILLA PRODEPORTES	773,960.00

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

GIRO	OBLIGACION	REGISTRO	CDP	COD. ARTICULO	ARTÍCULO	VALOR
255	545	204	202	2120202005501	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	32,088,382.00

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO** Hora: 10:49

Usuario Imprime: YULIANA

Usuario Responsable: YULIANA

ESE HOSPITAL SANTA ISABEL - SAN PEDRO DE LOS MILAGROS

NIT. 800014405

COMPROBANTE DE EGRESO No. 30,736

Fecha : 30/marzo/2023 **Pagado a :** 15381471-4 GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO

La Suma de : TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE
****

Valor $ 32,088,382.00

Banco : 01 BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta : C1 980017297 **Cheque :** PE

TOTAL IMPUESTOS	TOTAL DESCUENTOS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
111090007	BANCO DE BOGOTA FONDOS COMUNES	0.00	32,088,382.00
240101001	BIENES Y SERVICIOS	32,088,382.00	0.00

Recibí: _____

Nombre: _____

C.C. No. _____ de _____

Firma: _____

Huella dactilar

OBSERVACIONES: PRESTACION DE SERVICIOS

Yuliana **ELABORADO** **REVISADO** **APROBADO** Hora: 10:49

Usuario Imprime: YULIANA
Usuario Responsable: YULIANA

Gustavo Gutiérrez
NIT 15.381.471-4
Calle 19 N°25-32 Local 22 Urbanización El Carmelo
Tel: (7) 3116029145
La Ceja - Colombia
montajeseinnovaciones@gmail.com
www.montajeseinnovaciones.com

Factura electrónica de venta
No. 10708

Señores	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL		
NIT	800.014.405-2	**Teléfono**	(604) 868 76 10 - Ext. 000
Dirección	Calle 43 A Nº 52 A-109	**Ciudad**	San Pedro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2023, 12:01
Expedición	28/03/2023, 12:12
Vencimiento	28/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Corte de obra a la fecha, según acta de seguimiento y corte de obra N°1, Contrato N°044-2023, cuyo objeto es el suministro e Instalación de 52 puntos de red con cableado estructurado en Cat. 6A con sus respectivos soportes, 6 switch de datos Aruba Instant On 1430 de 24 puertos y Certificación de puntos de red	1.00	30,958,400.00	30,958,400.00

Estam A 1.238.336
Estam C 309.584
Estam H 309.584
Estam D 773.960
Retefuente 1.238.336
Reteiva 882.314
total 32.088.382

E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA
CONTABILIZADO

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis millones ochocientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 36,840,496.00

Total Bruto	30,958,400.00
IVA 19%	5,882,096.00
Total a Pagar	**36,840,496.00**

Observaciones:
Cuenta bancaria para pagos:
Bancolombia Cuenta de Ahorros N°10302368820 a nombre de Gustavo Gutiérrez

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S NIT 830.113.123-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044200202 aprobado en 20230209 prefijo desde el número 10695 al 10850 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 10 por mil
CUFE 4215c0307d42f307522949ceb9406fa13bcb0ea8da8e5934f2fb7c3288c106987a6a4c22dcb33892291879ad328f03c6

Banco de Bogotá

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/03/30	2023/04/03
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CAH7297
Fecha	2023/03/30
Valor	$32,088,382.00
No. Autorización	16043527
Estado	EXI
Usuario Crea	YULIANA MARIA ZAPATA RODRIGUEZ
Usuario Aprueba/Rechaza	Aprueba: LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT Rechaza: N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Producto	*****7297
Fecha Pago	2023/03/30
Tipo de Identificación	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	15381471
Beneficiario	GUTIERREZ HENAO GUSTAVO ADOLFO
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	10302368820
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	30736
Información Adicional	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ ELIZABETH BEDOYA BETANCURT	2023/03/30 16:04:35	Aprobado

MONTAJES e INNOVACION

San Pedro, 28 de marzo de 2023

Doctora
Elizabeth Bedoya Betancur
Subdirectora Administrativa
E.S.E Hospital Santa Isabel
San Pedro de Los Milagros

ACTA DE SEGUIMINETO Y CORTE DE OBRA A LA FECHA N°1

CONTRATO N°044-2023

Suministro e Instalación de 52 puntos de red con cableado estructurado en Cat 6A con sus respectivos soportes, 6 switch de datos Aruba Instant On 1430 de 24 puertos y Certificación de puntos de red.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT. COTIZADA	CANT. INSTALADA	VALOR UNIT	TOTAL
1	Suministro e instalación cable UTP Cat.6A LSZH. 100% cobre	m	2600	1100	$ 5.900	$ 6.490.000
2	Suministro e instalación canaleta metálica blanca 10*4 con división. Incluye accesorios y elementos de fijación	m	150	76	$ 41.800	$ 3.176.800
3	Suministro e instalación ducto EMT 3/4". Incluye accesorios y elementos de fijación	m	260	120	$ 30.900	$ 3.708.000
4	Suministro e instalación conectores de red Cat 6A. Incluye jack, face plate, ponchada, acuñada y accesorios de fijación	Unid	52	24	$ 54.800	$ 1.315.200
5	Suministro e instalación caja metálica 12*12*5. Incluye accesorios y elementos de fijación	Unid	52	24	$ 12.600	$ 302.400
6	Suministro e instalación patch cord Cat.6A de 3FT	Unid	52	30	$ 29.500	$ 885.000
7	Suministro e instalación patch cord Cat.6A de 7FT	Unid	52	30	$ 35.500	$ 1.065.000
8	Suministro e instalación patch panel Cat.6A de 24 puertos	Unid	3	2	$ 392.000	$ 784.000
9	Suministro e instalación organizador de cables 2U	Unid	3	2	$ 59.000	$ 118.000
10	Suministro e instalación switch HP Aruba Instant On 1430 de 24 puertos Gigabit	Unid	6	6	$ 1.380.000	$ 8.280.000
11	Certificación puntos de red nuevos Cat.6A	Unid	52	0	$ 15.000	$ -
12	Certificación puntos de red Cat.6 existentes	GL	1	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
13	Marcación e identificación puntos de red Cat.6A	Unid	52	0	$ 9.000	$ -
14	Marcación canaleta	m	50	0	$ 10.000	$ -
15	Marcación ducto EMT 3/4"	m	87	0	$ 10.000	$ -
16	Piso elevado para Data Center de 1,50mx1,10m	Unid	0	1	$ 990.000	$ 990.000
17	Sumimistro e instalación badeja para Rack	Unid	0	2	$ 80.000	$ 160.000
18	Suministro e instalación multitoma horizontal regulado	Unid	0	2	$ 175.000	$ 350.000
19	Suministro e instalación equipo amplificador Wifi UP Unifi U6 Lite	Unid	0	1	$ 980.000	$ 980.000
20	Suministro e instalación patch cord Cat.6 de 3FT		0	20	$ 10.500	$ 210.000
21	Suministro e instalación patch cord Cat.6 de 7FT		0	0		$ -
22	Suministro e instalación ducto cerrado blanco 10*8. Incluye accesorios y elementos de fijación		0	24	$ 60.000	$ 144.000
						$ 30.958.400
SUBTOTAL						$ 5.882.096
IVA						

28-03-2023

MONTAJES e INNOVACIONES NIT: 15381471-4	CONTRATO N°044-2023 INSTALACIÓN PUNTOS DE RED CAT.6A	E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL San Pedro de los Milagros










Calle 19 N°25-32 Local 22 – Urbanización El Carmelo – Cel. 311602 9145 La Ceja Antioquia.
Email: ggutierrez@une.net.co
www.montajeseinnovaciones.com




BANCO 1
BANCO 2

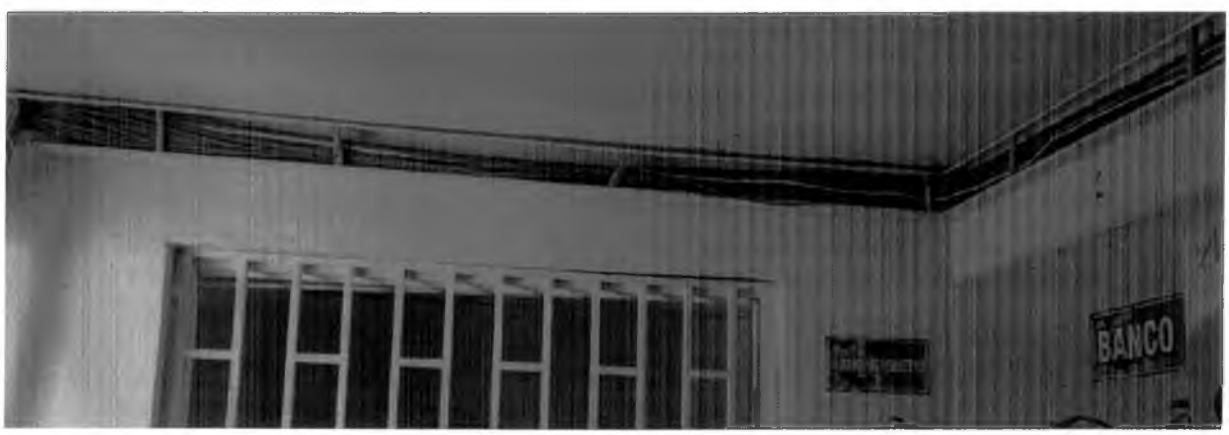

BANCO










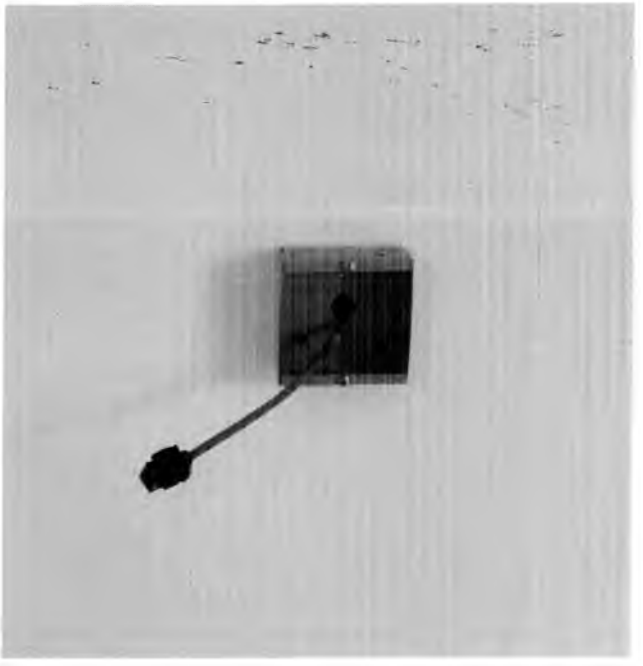

Access Point:

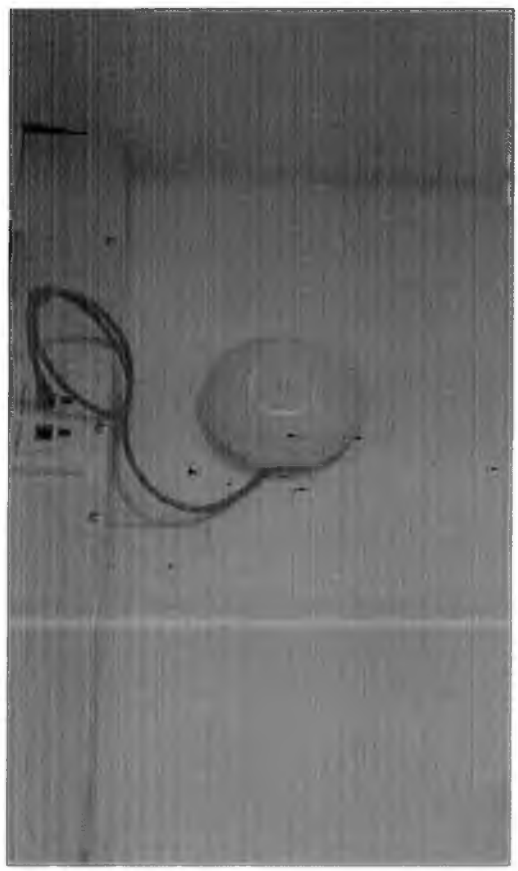





Piso Data Center:

ANTES



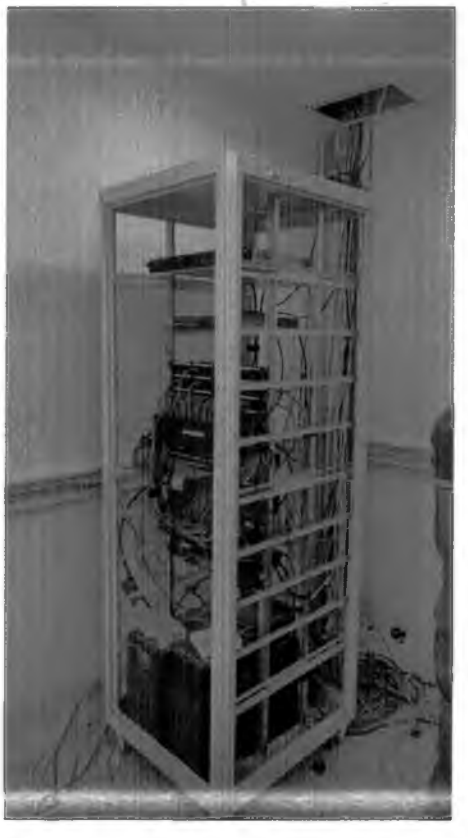

DESPUÉS

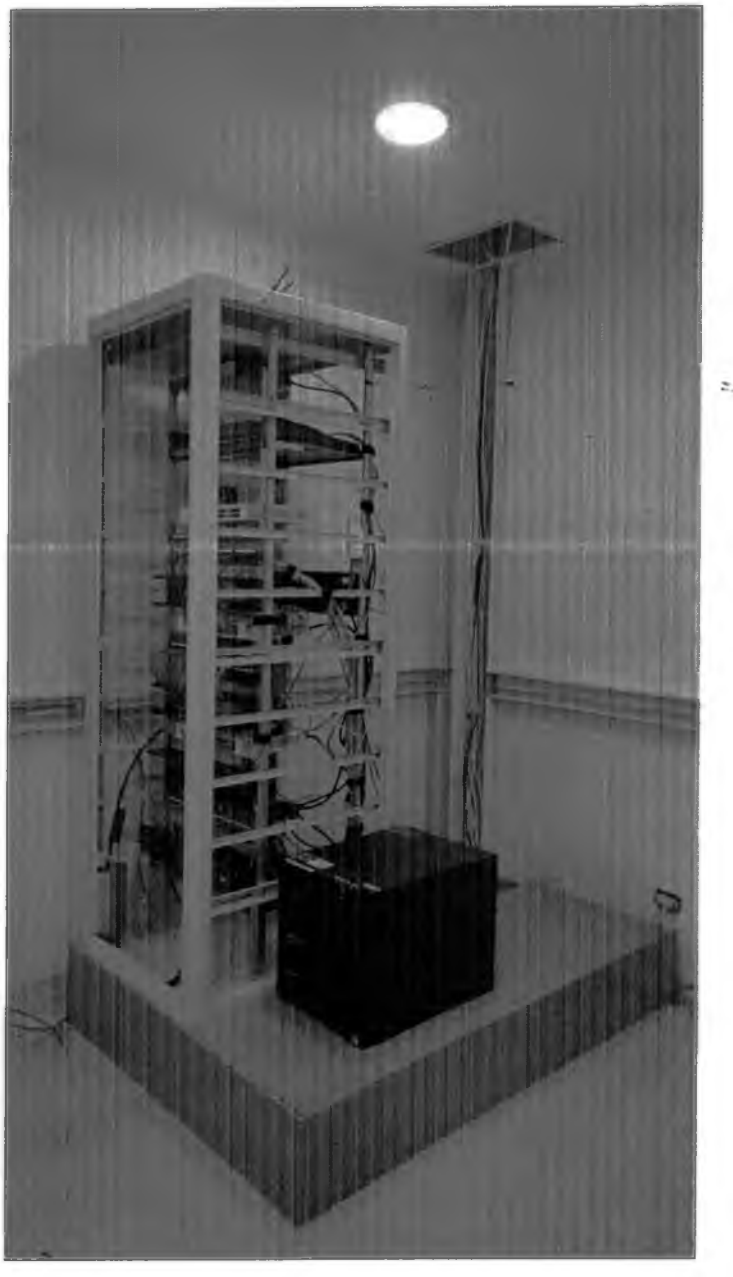

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
CEL. 311 602 9145

NIT: 15381471-4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Ceja, 13 de marzo de 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL
Teléfono: (604) 868 7610
Calle 43 A N°52 A–109
San Pedro de Los Milagros

Yo **GUSTAVO ADOLGO GUTIÉRREZ HENAO**, identificado con cédula de ciudadanía N°15381471, en mi condición de persona natural y representante legal de la empresa MONTAJES E INNOVACIONES, identificada con NIT 15381471-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, certifico que estoy a **PAZ Y SALVO** con los aportes del pago de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), correspondiente al mes de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ
CC: 15381471
REPRESENTANTE LEGAL
MONTAJES E INNOVACIONES
CEL. 311 602 9145

LINKWARE™ PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
PP2-D01	PASA	TIA Cat 6 Channel	59.8 m	2.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:47 AM
PP2-D02	PASA	TIA Cat 6 Channel	59.8 m	5.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:46 AM
PP2-D03	PASA	TIA Cat 6 Channel	58.1 m	5.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:49 AM
PP2-D04	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	6.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:32 AM
PP2-D05	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	4.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:33 AM
PP2-D07	PASA	TIA Cat 6 Channel	66.2 m	2.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:31 AM
PP2-D08	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	6.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:33 AM
PP2-D09	PASA	TIA Cat 6 Channel	66.0 m	2.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:31 AM
PP2-D10	FALLO	TIA Cat 6 Channel	54.4 m	-1.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:43 AM
PP2-D12	PASA	TIA Cat 6 Channel	72.2 m	4.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:25 AM
PP2-D13	PASA	TIA Cat 6 Channel	51.3 m	3.8 dB (NEXT)	04/03/2023 11:41 AM
PP2-D14	PASA	TIA Cat 6 Channel	49.9 m	5.3 dB (NEXT)	04/03/2023 11:41 AM
PP2-D15	FALLO	TIA Cat 6 Channel	57.1 m	5.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:44 AM
PP2-D16	PASA	TIA Cat 6 Channel	48.8 m	8.5 dB (NEXT)	04/03/2023 11:40 AM
PP2-D17	PASA	TIA Cat 6 Channel	49.4 m	4.8 dB (NEXT)	04/03/2023 11:37 AM
PP2-D18	PASA	TIA Cat 6 Channel	54.8 m	6.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:39 AM
PP2-D19	PASA	TIA Cat 6 Channel	55.0 m	5.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:39 AM
PP2-D20	PASA	TIA Cat 6 Channel	52.1 m	4.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:38 AM
PP2-D21	PASA	TIA Cat 6 Channel	52.3 m	6.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:38 AM
PP2-D28	FALLO	TIA Cat 6 Channel	15.3 m	-0.7 dB (NEXT)	04/03/2023 10:45 AM
PP2-D29	PASA	TIA Cat 6 Channel	9.1 m	2.5 dB (NEXT)	04/03/2023 10:46 AM
PP2-D30	PASA*	TIA Cat 6 Channel	17.0 m	1.8 dB (NEXT)	04/03/2023 10:39 AM
PP2-D31	FALLO	TIA Cat 6 Channel	38.3 m	N/A	04/03/2023 11:28 AM
PP2-D32	PASA	TIA Cat 6 Channel	36.8 m	3.5 dB (NEXT)	04/03/2023 11:26 AM
PP2-D34	PASA	TIA Cat 6 Channel	65.6 m	4.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:53 AM
PP2-D39	PASA	TIA Cat 6 Channel	28.5 m	4.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:13 AM
PP2-D40	PASA	TIA Cat 6 Channel	23.6 m	6.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:15 AM
PP2-D41	PASA	TIA Cat 6 Channel	19.7 m	5.3 dB (NEXT)	04/03/2023 11:21 AM
PP2-D42	PASA	TIA Cat 6 Channel	62.5 m	7.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:52 AM
PP3-D02	PASA	TIA Cat 6 Channel	61.9 m	3.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:51 AM
PP3-D03	PASA	TIA Cat 6 Channel	24.4 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 10:56 AM
PP3-D04	FALLO	TIA Cat 6 Channel	17.4 m	N/A	04/03/2023 11:19 AM
PP3-D05	PASA	TIA Cat 6 Channel	18.0 m	3.9 dB (NEXT)	04/03/2023 10:50 AM
PP3-D06	PASA	TIA Cat 6 Channel	29.2 m	5.6 dB (NEXT)	04/03/2023 10:54 AM
PP3-D07	PASA	TIA Cat 6 Channel	31.2 m	5.6 dB (NEXT)	04/03/2023 10:55 AM
PP3-D08	FALLO	TIA Cat 6 Channel	3.3 m	N/A	04/03/2023 11:03 AM
PP3-D09	PASA	TIA Cat 6 Channel	21.7 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:03 AM
PP3-D11	PASA	TIA Cat 6 Channel	19.2 m	2.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:04 AM
PP3-D12	PASA	TIA Cat 6 Channel	21.5 m	2.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:05 AM
PP3-D13	PASA	TIA Cat 6 Channel	22.3 m	3.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:06 AM

FLUKE networks

Longitud Total:	1705.8 m
Cantidad de Informes:	40
Cantidad de informes de paso:	34
Cantidad de informes de falla:	6
Numero de Advertencias de Reportes:	0
Documentacion Solamente:	0

EL SUSCRITO SUPERVISOR (a)

CERTIFICA QUE:

MONTAJES E INNOVACIONES identificado con NIT número. 15.381.471, ha dado cumplimiento-a satisfacción con la realización de las actividades en razón al Contrato de Prestación de Servicios NRO. 44, cuyo objeto es: Suministro e Instalación de 52 puntos de red con cableado estructurado en Cat 6ª con sus respectivos soportes, 6 switch de datos Aruba Instant On 1430 de 24 puertos y Certificación de puntos de red; entregó informe de actividades como sustento de ejecución de las acciones realizadas y presentó los soportes de pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tiempo que fue verificado y auditado el cumplimiento de las obligaciones por el Supervisor designado y se anexa la respectiva acta de avance y supervisión.

La cuenta de cobro y el presente certificado se envía a la Subdirección Administrativa, para que surta allí el trámite respectivo para su cancelación y se deja una copia igual, la cual se archiva en el legajo histórico o carpeta del contrato en mención, en cumplimiento del mismo, como soporte de seguimiento y supervisión.

Dado en el Municipio de San Pedro de los Milagros al 28 días del mes de marzo de 2023.

Comedidamente,

RAFAEL ZULUAGA

Supervisor

ACTA DE AVANCE Y SUPERVISIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 44 DE 2023 SUSCRITO ENTRE MONTAJES E INNOVACIONES Y LA E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS ANTIOQUIA.

Con el fin de realizar Acta de Avance y de Supervisión al contrato No. 44 del 2023, cuyo objeto es: Suministro e Instalación de 52 puntos de red con cableado estructurado en Cat 6ª con sus respectivos soportes, 6 switch de datos Aruba Instant On 1430 de 24 puertos y Certificación de puntos de red, se reunieron por parte del Contratista, MONTAJES E INNOVACIONES y por parte del Contratante, RAFAEL A. ZULUAGA en calidad de Supervisor del contrato delegado por la Gerencia del Hospital.

PLAZO DEL CONTRATO: Desde el 15 de marzo al 28 de abril de 2023.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 15 de marzo de 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $$ 60.427.962 incluido impuestos.
VALOR DE ADICIÓN: $

Periodo Intervenido: Primera mitad de la ejecución del contrato

El suscrito Supervisor certifica que el contratista MONTAJES E INNOVACIONES identificado con NIT 15.381.471, viene cumpliendo con lo programado en las obligaciones y el objeto del contrato No. 44 de 2023, el cual se ejecutó para la E.S.E. Hospital Santa Isabel y se pudo constatar la realización de las actividades.

Se realiza el pago según lo estipulado en la contratación y conforme a la realización de las actividades.


ACTA DE AVANCE: De acuerdo a la certificación adjunta de la supervisión designada, se constata que el contrato se encuentra en un avance de ejecución de la siguiente forma:

Periodo Acumulado Ejecutado: Del 15 marzo al 28 de marzo de 2023.

A	Valor inicial del Contrato más Adiciones	$ 60.427.962
B	Valor cancelado por el Hospital	$ 0
C	Valor Facturado en este informe	$ 36,840,496
D	Valor Glosado	0
E	Valor Facturado y Acumulado después de Supervisión	$ 36,840,496
F	Porcentaje de Ejecución (E*100/A)	50%

En conclusión, de acuerdo al cumplimiento del contrato, la suma a cancelar en la presente acta de avance es de $ 36,840,496

Para constancia se suscribe en el Municipio de San Pedro de los Milagros, al 28 día del mes de marzo de 2023



RAFAEL ZULUAGA
Supervisor

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ
INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS
CEL. 311 602 9145

MONTAJES e INNOVACIONES

NIT: 15381471-4

CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Ceja, 13 de marzo de 2023

Señores
E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL
Teléfono: (604) 868 7610
Calle 43 A Nº52 A–109
San Pedro de Los Milagros

Yo **GUSTAVO ADOLGO GUTIÉRREZ HENAO**, identificado con cédula de ciudadanía N°15381471, en mi condición de persona natural y representante legal de la empresa MONTAJES E INNOVACIONES, identificada con NIT 15381471-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, certifico que estoy a **PAZ Y SALVO** con los aportes del pago de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), correspondiente al mes de marzo de 2023, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 2 y demás normas concordantes en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

GUSTAVO ADOLFO GUTIÉRREZ
CC: 15381471
REPRESENTANTE LEGAL
MONTAJES E INNOVACIONES
CEL. 311 602 9145

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
PP2-D01	PASA	TIA Cat 6 Channel	59.8 m	2.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:47 AM
PP2-D02	PASA	TIA Cat 6 Channel	59.8 m	5.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:46 AM
PP2-D03	PASA	TIA Cat 6 Channel	58.1 m	5.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:49 AM
PP2-D04	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	6.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:32 AM
PP2-D05	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	4.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:33 AM
PP2-D07	PASA	TIA Cat 6 Channel	66.2 m	2.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:31 AM
PP2-D08	PASA	TIA Cat 6 Channel	70.7 m	6.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:33 AM
PP2-D09	PASA	TIA Cat 6 Channel	66.0 m	2.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:31 AM
PP2-D10	FALLO	TIA Cat 6 Channel	54.4 m	-1.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:43 AM
PP2-D12	PASA	TIA Cat 6 Channel	72.2 m	4.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:25 AM
PP2-D13	PASA	TIA Cat 6 Channel	51.3 m	3.8 dB (NEXT)	04/03/2023 11:41 AM
PP2-D14	PASA	TIA Cat 6 Channel	49.9 m	5.3 dB (NEXT)	04/03/2023 11:41 AM
PP2-D15	FALLO	TIA Cat 6 Channel	57.1 m	5.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:44 AM
PP2-D16	PASA	TIA Cat 6 Channel	48.8 m	8.5 dB (NEXT)	04/03/2023 11:40 AM
PP2-D17	PASA	TIA Cat 6 Channel	49.4 m	4.8 dB (NEXT)	04/03/2023 11:37 AM
PP2-D18	PASA	TIA Cat 6 Channel	54.8 m	6.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:39 AM
PP2-D19	PASA	TIA Cat 6 Channel	55.0 m	5.7 dB (NEXT)	04/03/2023 11:39 AM
PP2-D20	PASA	TIA Cat 6 Channel	52.1 m	4.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:38 AM
PP2-D21	PASA	TIA Cat 6 Channel	52.3 m	6.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:38 AM
PP2-D28	FALLO	TIA Cat 6 Channel	15.3 m	-0.7 dB (NEXT)	04/03/2023 10:45 AM
PP2-D29	PASA	TIA Cat 6 Channel	9.1 m	2.5 dB (NEXT)	04/03/2023 10:46 AM
PP2-D30	PASA*	TIA Cat 6 Channel	17.0 m	1.8 dB (NEXT)	04/03/2023 10:39 AM
PP2-D31	FALLO	TIA Cat 6 Channel	38.3 m	N/A	04/03/2023 11:28 AM
PP2-D32	PASA	TIA Cat 6 Channel	36.8 m	3.5 dB (NEXT)	04/03/2023 11:26 AM
PP2-D34	PASA	TIA Cat 6 Channel	65.6 m	4.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:53 AM
PP2-D39	PASA	TIA Cat 6 Channel	28.5 m	4.6 dB (NEXT)	04/03/2023 11:13 AM
PP2-D40	PASA	TIA Cat 6 Channel	23.6 m	6.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:15 AM
PP2-D41	PASA	TIA Cat 6 Channel	19.7 m	5.3 dB (NEXT)	04/03/2023 11:21 AM
PP2-D42	PASA	TIA Cat 6 Channel	62.5 m	7.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:52 AM
PP3-D02	PASA	TIA Cat 6 Channel	61.9 m	3.1 dB (NEXT)	04/03/2023 11:51 AM
PP3-D03	PASA	TIA Cat 6 Channel	24.4 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 10:56 AM
PP3-D04	FALLO	TIA Cat 6 Channel	17.4 m	N/A	04/03/2023 11:19 AM
PP3-D05	PASA	TIA Cat 6 Channel	18.0 m	3.9 dB (NEXT)	04/03/2023 10:50 AM
PP3-D06	PASA	TIA Cat 6 Channel	29.2 m	5.6 dB (NEXT)	04/03/2023 10:54 AM
PP3-D07	PASA	TIA Cat 6 Channel	31.2 m	5.6 dB (NEXT)	04/03/2023 10:55 AM
PP3-D08	FALLO	TIA Cat 6 Channel	3.3 m	N/A	04/03/2023 11:03 AM
PP3-D09	PASA	TIA Cat 6 Channel	21.7 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 11:03 AM
PP3-D11	PASA	TIA Cat 6 Channel	19.2 m	2.2 dB (NEXT)	04/03/2023 11:04 AM
PP3-D12	PASA	TIA Cat 6 Channel	21.5 m	2.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:05 AM
PP3-D13	PASA	TIA Cat 6 Channel	22.3 m	3.9 dB (NEXT)	04/03/2023 11:06 AM

Longitud Total:	1705.8 m
Cantidad de Informes:	40
Cantidad de informes de paso:	34
Cantidad de informes de falla:	6
Numero de Advertencias de Reportes:	0
Documentacion Solamente:	0

LINKWARE™PC
CABLE TEST MANAGEMENT SOFTWARE

ID. Cable	Sumario	Límite de prueba	Longitud	Paso Libre	Fecha / Hora
PP1-D01	FALLO	TIA Cat 6 Channel	22.8 m	-0.8 dB (NEXT)	04/03/2023 12:29 PM
PP1-D02	PASA	TIA Cat 6 Channel	53.2 m	5.0 dB (NEXT)	04/03/2023 12:50 PM
PP1-D03	PASA	TIA Cat 6 Channel	67.4 m	2.4 dB (NEXT)	04/03/2023 12:46 PM
PP1-D05	PASA	TIA Cat 6 Channel	18.0 m	1.7 dB (NEXT)	04/03/2023 12:23 PM
PP1-D06	PASA	TIA Cat 6 Channel	57.5 m	2.3 dB (NEXT)	04/03/2023 12:47 PM
PP1-D07	PASA*	TIA Cat 6 Channel	58.5 m	0.7 dB (NEXT)	04/03/2023 12:48 PM
PP1-D08	PASA	TIA Cat 6 Channel	55.0 m	4.0 dB (NEXT)	04/03/2023 12:51 PM
PP1-D09	PASA	TIA Cat 6 Channel	55.2 m	3.1 dB (NEXT)	04/03/2023 12:51 PM
PP1-D10	FALLO	TIA Cat 6 Channel	46.3 m	3.8 dB (NEXT)	04/03/2023 12:56 PM
PP1-D11	PASA	TIA Cat 6 Channel	48.0 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 12:54 PM
PP1-D12	PASA	TIA Cat 6 Channel	48.0 m	2.5 dB (NEXT)	04/03/2023 12:53 PM
PP1-D13	PASA	TIA Cat 6 Channel	47.8 m	3.7 dB (NEXT)	04/03/2023 12:55 PM
PP1-D14	PASA	TIA Cat 6 Channel	50.5 m	2.1 dB (NEXT)	04/03/2023 12:57 PM
PP1-D15	PASA	TIA Cat 6 Channel	24.0 m	3.0 dB (NEXT)	04/03/2023 12:25 PM
PP1-D16	PASA	TIA Cat 6 Channel	21.7 m	2.9 dB (NEXT)	04/03/2023 12:25 PM
PP1-D17	PASA	TIA Cat 6 Channel	24.2 m	4.3 dB (NEXT)	04/03/2023 12:26 PM
PP1-D18	PASA	TIA Cat 6 Channel	27.1 m	2.1 dB (NEXT)	04/03/2023 12:27 PM
PP1-D19	PASA	TIA Cat 6 Channel	44.7 m	2.8 dB (NEXT)	04/03/2023 12:58 PM
PP1-D20	PASA	TIA Cat 6 Channel	30.6 m	3.4 dB (NEXT)	04/03/2023 12:35 PM
PP1-D21	PASA	TIA Cat 6 Channel	31.9 m	3.1 dB (NEXT)	04/03/2023 12:34 PM
PP1-D22	PASA	TIA Cat 6 Channel	33.1 m	2.3 dB (NEXT)	04/03/2023 12:33 PM
PP1-D23	PASA	TIA Cat 6 Channel	35.2 m	1.5 dB (NEXT)	04/03/2023 12:32 PM
PP1-D25	PASA	TIA Cat 6 Channel	37.4 m	3.6 dB (NEXT)	04/03/2023 12:39 PM
PP1-D26	PASA	TIA Cat 6 Channel	60.0 m	4.5 dB (NEXT)	04/03/2023 12:44 PM
PP1-D27	PASA*	TIA Cat 6 Channel	27.9 m	0.2 dB (NEXT)	04/03/2023 12:30 PM
PP1-D28	PASA	TIA Cat 6 Channel	42.8 m	4.6 dB (NEXT)	04/03/2023 12:42 PM
PP1-D30	FALLO	TIA Cat 6 Channel	43.0 m	-0.1 dB (NEXT)	04/03/2023 12:37 PM
PP1-D31	FALLO	TIA Cat 6 Channel	36.0 m	-2.0 dB (NEXT)	04/03/2023 12:35 PM

FLUKE networks

Longitud Total:	1147.8 m
Cantidad de Informes:	28
Cantidad de informes de paso:	24
Cantidad de informes de falla:	4
Numero de Advertencias de Reportes:	0
Documentacion Solamente:	0
