Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO









INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación el tabaco rio Bogotá	HIDROMETEOROLÓGICA	Río Bogotá	Bogotá	N: 4,632	W: -74,239

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de temperatura y humedad y pantalla protectora	Campbell Scientefic	HygroVue10, RADE10	
Sensor de precipitación	Lambrecht	15189	
Instalación de estructura en L para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	ACERTA	N/A	
Instalación de estructura en L para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	ACERTA	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
22/12/2022	Actividades de obras civiles, Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación	
8/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 12 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 2 metros de altura, sensor de precipitaciónn a un 1 metro de altura.	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
22/12/2022	Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación   	Ninguna
8/03/2023	Instalación sensor dirección y velocidad del viento. 12 metros de altura  	Ninguna
	Instalación sensor de temperatura y humedad 	Ninguna
	Instalacion sensor precipitación 	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Guaymaral río Bogotá		Río Bogotá	Bogotá	N:	W:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS		
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**OBSERVACIONES**
26/12/2022	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras para mastil de 9 metros. Primera visita de acceso no fue posible por no otorgamiento de permiso.	Primera visita de acceso no fue posible por no otorgamiento de permiso.
10/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras para mastil de 9 metros.	Se realizaron las actividades programadas con normalidad.
13/03/2013	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de temperatura y humedad a 2 metros de altura, Inatlación de pantalla protectora para sensor de tmepetura y humedad.	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
10/01/2023	Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.   	
13/03/2013	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Instalacion de sensor de temperatura y humedad a 3 metros de altura, Inatlación de pantalla protectora para sensor de tmepetura y humedad, Instalación de mastil 9 metros tipo 1     	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación pasquilla	Meteorológica	Río Bogotá	Bogotá	N: 4,446	W: -74,155

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de dirección y velocidad del viento	GILL	GMX200	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
10/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.	
3/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
10/01/2023	Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.    	
3/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1  	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORMACIÓN ESTACIÓN				
PROPIETARIO	**DIRECCIÓN**	**CONTACTO**	**TELÉFONO**	**EMAIL**
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN					
NOMBRE DE LA ESTACIÓN	**TIPO DE ESTACIÓN**	**UBICACIÓN**	**MUNICIPIO**	**COORDENADAS**	
Estación La unión	Meteorológica	Usme	Bogotá	N: 4,343	W: -74,184

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS			
DESCRIPCIÓN	**MARCA**	**MODELO**	**OBSERVACIONES**
Sensor de dirección y velocidad del viento	GILL	GMX200	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

<table>
<tr><th colspan="3">ACTIVIDADES EJECUTADAS</th></tr>
<tr><th>FECHA</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th></th></tr>
<tr><td>28/12/2022</td><td>Actividades de obras civiles, Construcción de 3 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.</td><td></td></tr>
<tr><td>20/01/2023</td><td>Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1</td><td>Las Actividades progamadas para este dia no se alcanzaron a culinar el dia 20 de enero, se reprogramo una siguiente visita el día 27 de enero 2023</td></tr>
<tr><td>27/01/2023</td><td>Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1</td><td>Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estrucras</td></tr>
<tr><th colspan="3">REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>28/12/2022</td><td>Construcción de 3 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.

</td><td></td></tr>
<tr><td>20/01/2023</td><td>Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1

</td><td></td></tr>
<tr><td>27/01/2023</td><td>Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1


</td><td></td></tr>
</table>

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO







INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Doña Juana	Meteorológica	Usme	Bogotá	N: 4,501	W: -74,137

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de dirección y velocidad del viento	GILL	GMX200	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS

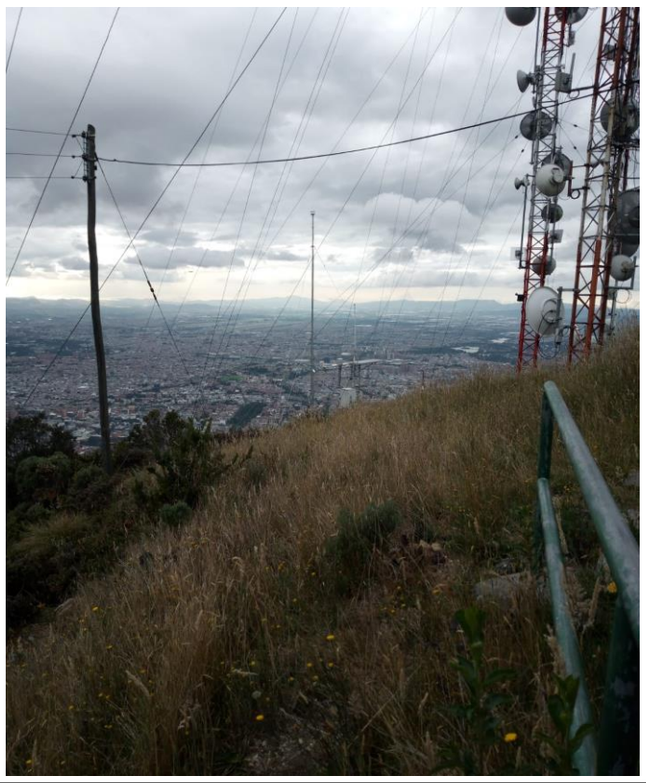
FECHA	DESCRIPCIÓN	
29/12/2022	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.	
9/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1, cableado de sensor de velocidad y direccion del viento hasta el gabinete de la estación	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estrucras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
29/12/2022	Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.     	
9/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1   	
9/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1, cableado de sensor de velocidad y direccion del viento hasta el gabinete de la estación    	

INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

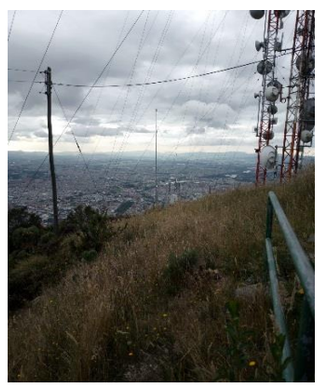
NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Cerro Cazadores	Meteorológica		Bogotá	N:	W:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y direccion del viento	GILL	GMX200	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	
5/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.	
03/032023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estrucras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
5/01/2023	Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.     	
03/032023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1    	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Vitelma	Meteorológica	La victoria	Bogotá	N: 4º 37´31.5	W: 74º 14´22.4

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y direccion del viento	GILL	GMX200	
Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	ACERTA	9 Metros	N/A

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	
4/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.	
2/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estrucras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
4/01/2023	Construcción de 4 dados de concreto para estructuras mastil de 9 metros.    	
2/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, instalacion de mastil 9 metros tipo 1    	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Chicu rio Bogotá	HIDROMETEOROLÓGICA	Río Bogotá	Bogotá	N: 4,754	W: -74,126

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de precipitación	Lambrecht	15189	
Instalación Mástil telecópico de 9 metros tipo 1	Acerta	N/A	
Sensor de temperatura y humedad y pantalla protectora	CAMPBELL SCIENTIFIC	RAD10E	
Instalación de estructura para sensor de precipitación			

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
3/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación	
28/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 12 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 2 metros de altura, sensor de precipitaciónn a un 1 metro de altura.	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
3/01/2023	Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación.   	Ninguna
	Construcción de dados de concreto para estructura para mastíl de 9 metros   	
	Instalación sensor dirección y velocidad del viento. 9 metros de altura 	Ninguna
28/02/2023	Instalacion sensor de temperatra y humedad 	
	Instalacion sensor precipitación 	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Ramada	HIDROMETEOROLÓGICA	Río Bogotá	Bogotá	N: 4,632	W: -74,239

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Sensor de precipitación	Lambrecht	15189		
Sensor de temperatura y humedad y pantalla protectora	N/A	N/A		
Instalación de SENSOR DE				
Instalación de estructura para sensor de precipitación				

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2/01/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación	
6/03/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 12 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 2 metros de altura, sensor de precipitaciónn a un 1 metro de altura.	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

<table>
<tr><th colspan="3">REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS</th></tr>
<tr><td>2/01/2023</td><td>Construcción de dado de concreto para estructura del sensor de precpitación.
 </td><td>Ninguna</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6/03/2023</td><td>Instalacion sensor de temperatra y humedad </td><td></td></tr>
<tr><td>Instalacion sensor precipitación </td><td>Ninguna</td></tr>
</table>

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Córdoba cll 134	Hidrológica		Bogotá	N: 4,721	W: -74,060

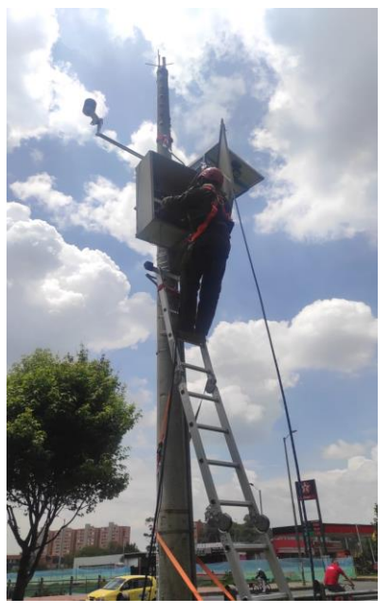
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIAL	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E		
Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad	ACERTA	N/A		
Bateria 80 AH - 12 VDC	CSB	12800		
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7/03/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	
	Instalación Bateria 80 AH- 12 VDC	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

7/03/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, instalación de bateria 80 AH - 12 VDC, Instalacion de sensor de humedad relativa para interires, Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.  	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Carrera 56 b	Hidrológica		Bogotá	N: 4,671	W: -74,076

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Sensor de precipitación	Lambrecht	15189		
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E		
Estructura en L para sensor de temperatura y humedad y sensor de precipitación	ACERTA	N/A		
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7/03/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

7/03/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad,, Instalacion de sensor de humedad relativa para interiores, Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad y sensor de precipitación.	





Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Juan Rey	Meteorológica	Juan Rey	Bogotá	N: 4,519	W: -74,088

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y	GILL	GMX200	
Instalación mastil 3 metros tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1/02/2023	Instalación mastil 3 metros tipo 2 , instalación de sensor de velocidad y dirección del viento	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1/02/2023	Instalación mastil 3 metros tipo 2 , instalación de sensor de velocidad y dirección del viento  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Paraiso	Meteorológica	El paraiso bajo	Bogotá	N: 4,628	W: -74,059

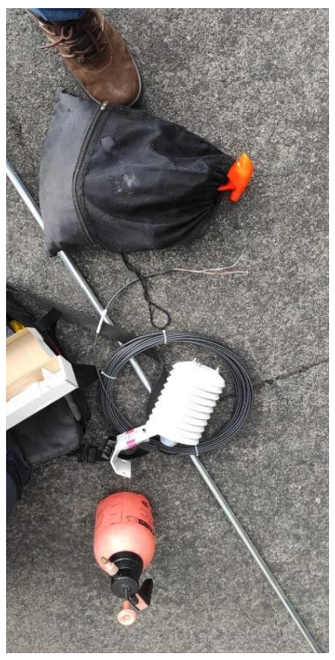
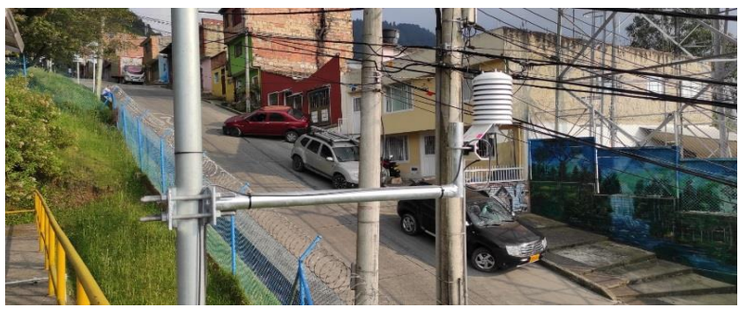
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	HigroVue10		
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E		
Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad y sensor de precipitación	ACERTA	N/A		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de temperatura y humedad	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1/02/2023	Instalación de sensor temperatura y humedad, instalaciónPantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.  	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Quiba	Meteorológica	El tesoro	Bogotá	N: 4,543	W: -74,156

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Instalación mastil 3 metros tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
13/02/2023	Instalación mastil 3 metros tipo 2 , instalación de sensor de velocidad y dirección del viento	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

13/02/2023	Instalación mastil 3 metros tipo 2 , instalación de sensor de velocidad y dirección del viento	Ninguna





Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Cerro Norte	Meteorológica	El tesoro	Bogotá	N: 4,535	W: -74,149

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Bateria 100 AH 12 VDC	CSB	GPL 121000	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientfic	HygroVue10	
Soporte para panel solar doble	Acerta	N/A	
2 Paneles Solares	SUNERA	TPS- 107S- 100W	
Instalación de brazo en L para sensr de T/H	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
27/02/2023	Instalación de 2 paneles solares y soporte, instalación de sensor de temperatura y humedad y soporte en L.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

27/02/2023	Instalación de 2 paneles solares y soporte, instalación de sensor de temperatura y humedad y soporte en L.  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Fucha K 12	Hidrológica	Restrepo	Bogotá	N: 4,583	W: -74,094

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
4 Bateria 9 AH 12 VDC	CSB	UPS12460F2		
Pantalla protectora para sensor de	campbell Scientific	RAD10E		
Instalacion de estructura en L para	ACERTA	N/A		
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
31/01/2023	Instalación de 4 baterias 9 AH 12 VDC	
	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

31/01/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.   	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Gravillera Río Tunjuelo	Hidrológica		Bogotá	N: 4,533	W: -74,125

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Sensor de precipitación	Lambrecht	15189		
Instalacion de estructura en L para sensor de precipitación	ACERTA	N/A		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9/03/2023	Instalación de estructura en L y sensor de precipitación.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

9/03/2023	Instalación de estructura en L y sensor de precipitación.   	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Friedrich Naumann	Meteorológica	El tesoro	Bogotá	N: 4,749	W: -74,023

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Instalación de soporte para sensor de temperatura tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

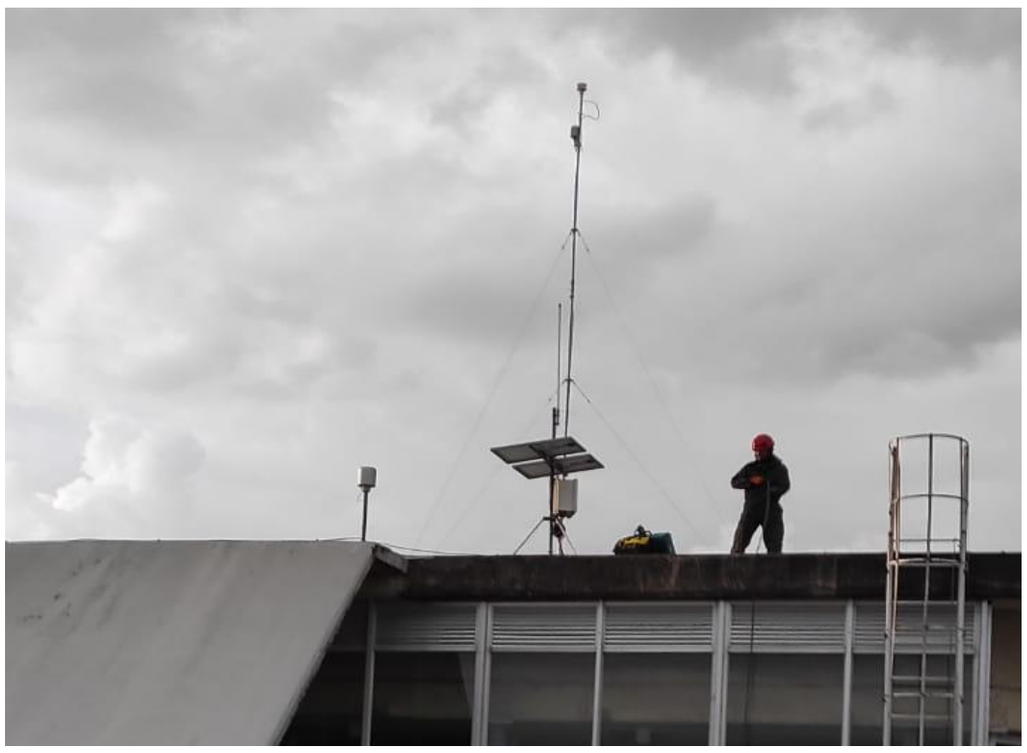
FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
24/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

24/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de temperatura tipo 2 	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Rodolfo Llinás (IED)	METEOROLÓGICA	BACHUE	Bogotá	N: 4,720	W: -74,108

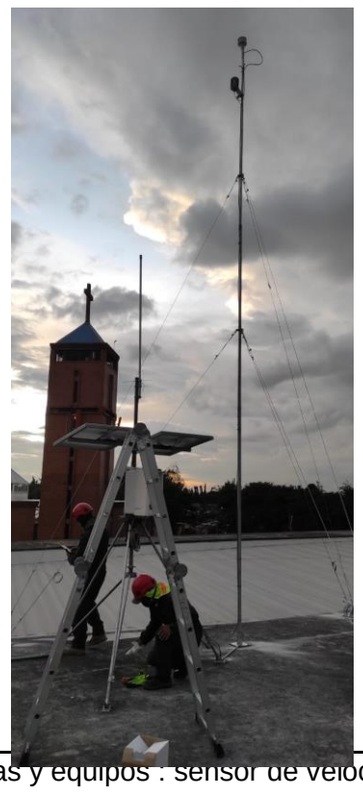
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10	
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	RAD10E	
2 Paneles Solares	SUNERA	TPS- 107S- 100W	
Regulador solar	Sunsaver	SS- 20L	
Bateria 100 AH - 12 VDC	CSB	GPL 121000	
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A	
Estructura en L para sensor de temperatura y humedad	Acerta	N/A	
Soporte para panel solar doble	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
17/02/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de estructuras para puntos de anclaje para mastil de 9 M tipo 1	
	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 8 metros de altura, 2 paneles solares, regulador solar, bateria 100 AH 12 VDC	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

	Actividades de obras civiles, Construcción de estructuras para puntos de anclaje para mastil de 9 M tipo 1 	
17/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 8 metros de altura, 2 paneles solares, regulador solar, bateria 100 AH 12 VDC  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Agustín Fernández	Meteorológica	MILAN	Bogotá	N: 4,729	W: -74,024

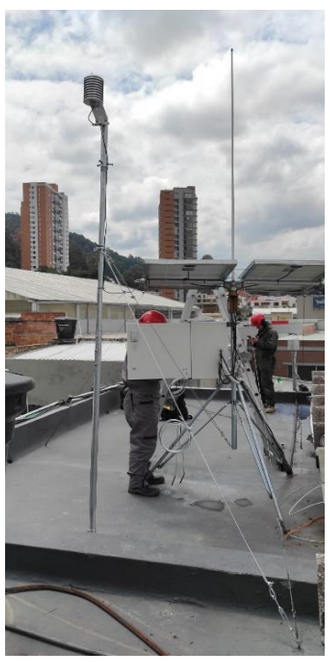
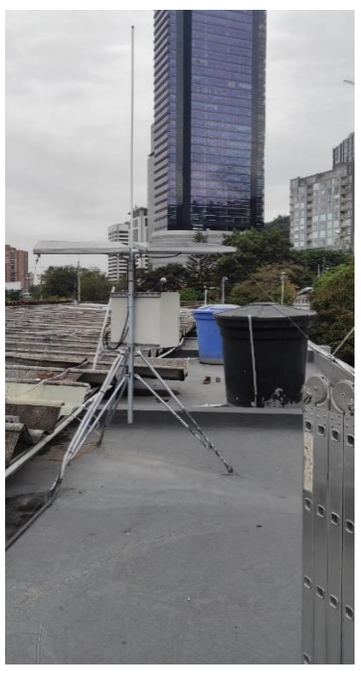
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Sensor de humedad relativa	campbell Scientific	CS210	
Instalación de mástil para sensor de temperatura tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
22/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

22/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de mastil temperatura tipo 2   	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Unión Colombia Sede A (IED)	METEOROLÓGICA	BACHUE	Bogotá	N: 4,760	W: -74,028

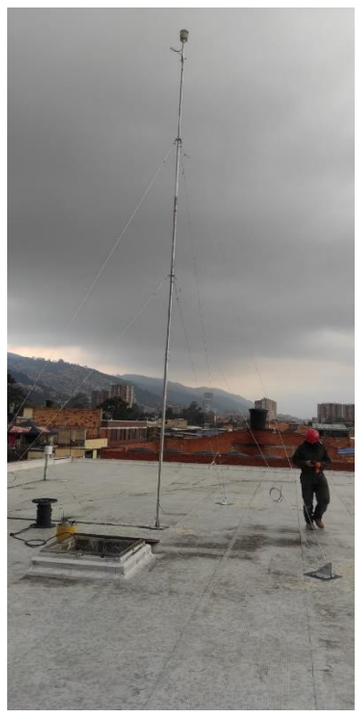
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
22/02/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de estructuras para puntos de anclaje para mastil de 9 M tipo 1	
	Actividades de instalación de estructuras y equipos : adecuaciuon de cableado al nuevo mastil 9 metros tipo 1. Sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

22/02/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de estructuras para puntos de anclaje para mastil de 9 M tipo 1. Actividades de instalación de estructuras y equipos : sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura    	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Ofelia Uribe (IED)	METEOROLÓGICA	LA ESPERANZA	Bogotá	N:	W:

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Pantalla protectora para sensor de	campbell Scientific	RAD10E		
Instalacion de estructura en L para	ACERTA	N/A		
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
14/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

14/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.  	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Paulo Freire (IED)	METEOROLÓGICA	USME	Bogotá	N: 4,533	W: -74,117

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200		
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10		
Pantalla protectora para sensor de temperatura y	Campbell Scientefic	RAD10E		
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A		
Estructura en L para sensor de temperatura y humedad	Acerta	N/A		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
6/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 3 metros de altura, inslatacion de brazo en L	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

6/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 3 metros de altura, inslatacion de brazo en L.     	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Los Alpes	METEOROLÓGICA	Nueva Espeña	Bogotá	N: 4,553	W: -74,084

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientefic	CS210	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10	
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	RAD10E	
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

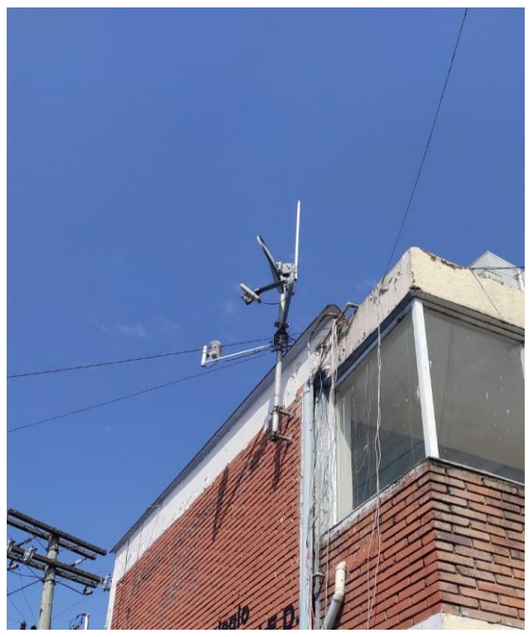
FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
10/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 5 metros de altura, inslatacion de brazo en L	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

10/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 5 metros de altura, 2 paneles solares, regulador solar, bateria 100 AH 12 VDC  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Molinos	METEOROLÓGICA	San Cristibal	Bogotá	N: 4,553	W: -74,108

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

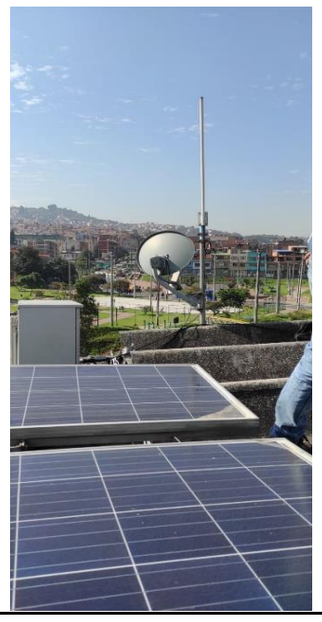
DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Estructura en L para sensor de temperatura y humedad y sensor de precipitación	ACERTA	N/A	
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

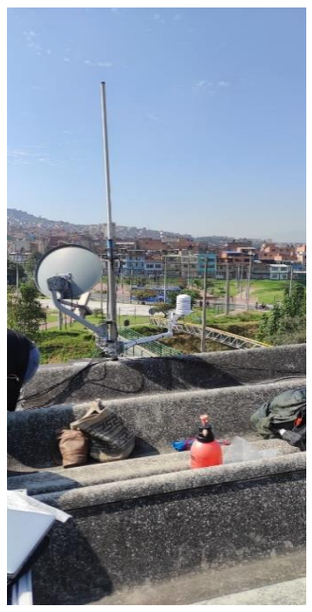
FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

1/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.	



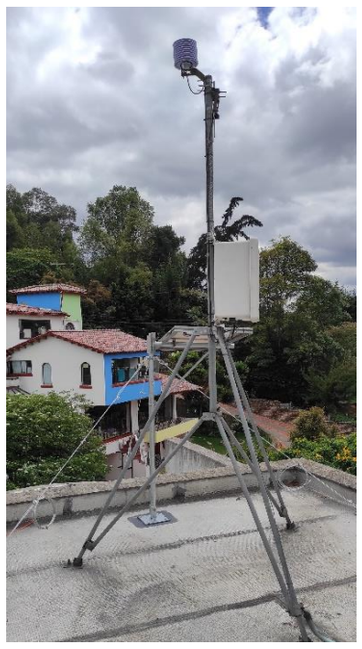




Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio 21 angeles (IED)	Meteorológica	SUBA	Bogotá	N: 4,749	W: -74,081

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10	
Instalación de mastil tipo 2 y anclajes	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
15/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de mástil tipo 2, Instalación de sensor de temperatura y humedad.	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

15/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de mástil tipo 2, Instalación de sensor de temperatura y humedad.	Ninguna











Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Alberto Lleras Camargo(IED)	METEOROLÓGICA	SUBA	Bogotá	N: 4,744	W: -74,102

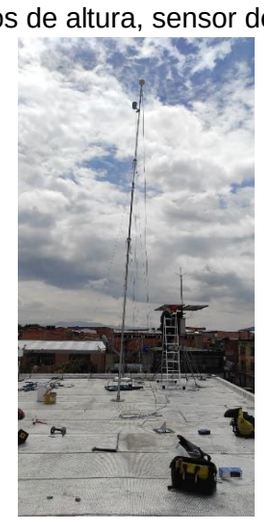
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210	
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10	
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	RAD10E	
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
16/02/2023	Actividades de obras civiles, Construcción de estructuras para puntos de anclaje para mastil de 9 M tipo 1	
	Actividades de instalación de estructuras y equipos :sensor de humedad relativa interiores, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 8 metros de altura.	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

16/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos :sensor de humedad relativa interiores, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 8 metros de altura.   	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Magdalena Ortega de Nariño (IED)	Meteorológica	SUBA	Bogotá	N: 4,687	W: -74,083

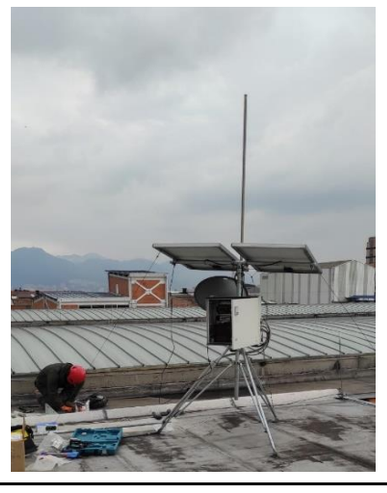
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Sensor de humedad relativa	campbell Scientific	CS210	
Mástil tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
20/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

20/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de mastil temperatura tipo 2  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Manuel Elkin Patarroyo	METEOROLÓGICA	SANTA FE	Bogotá	N:	W:

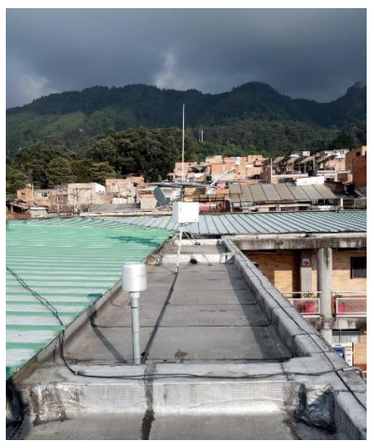
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES		
Bateria 100 AH - 12 VDC	CSB	GPL 121000			
Sensor de humedad relativa	campbell Scientific	CS210			
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E			
Estructura en L para sensor de temperatura y humedad y sensor de precipitación	ACERTA	N/A			

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
24/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad, Instalacion de bateria 100 Ah 12 VDC	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

24/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad, Instalacion de bateria 100 Ah 12 VDC   	

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio el tesoro de la Cumbre sede C (IED)	Meteorológica	EL TESORO	Bogotá	N: 4,535	W: -74,149

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Sensor de humedad relativa	campbell Scientific	CS210	
Mástil tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

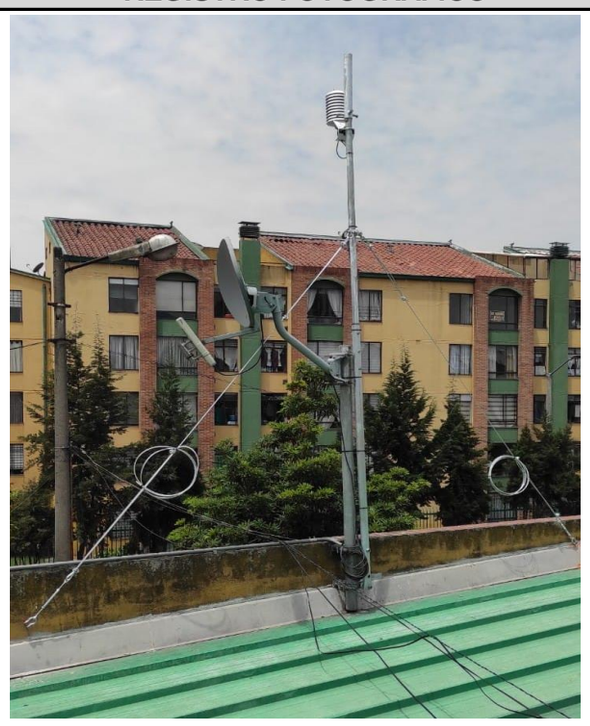
FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
13/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad,Sensor de humedad relativa, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

13/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad,Sensor de humedad relativa, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2 	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Chucua (IED)	Meteorológica	BOSA	Bogotá	N: 4,604	W: -74,149

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
Pantalla protectora para sensor de temperatura y	campbell Scientific	RAD10E		
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10		
Mástil tipo 2	Acerta	N/A		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
20/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

20/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad,Sensor de temepratura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2   	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Ciudad de Villavicencio (IED)	Meteorológica	EL REFUGIO	Bogotá	N: 4,487	W: -74,102

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Sensor de humedad relativa	campbell Scientific	CS210	
Mástil tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
8/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad,Sensor de humedad relativa, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

8/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad,Sensor de humedad relativa, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio Gabriel Garcia Márquez (IED)	METEOROLÓGICA	USME	Bogotá	N: 4,505	W: -74,092

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de velocidad y dirección del viento	GILL	GMX200	
Sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	HygroVue10	
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	Campbell Scientefic	RAD10E	
Mástil 9 metros tipo 1 para soportar sensor de velocidad y dirección del viento	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
9/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 3 metros de altura, inslatacion de brazo en L	Se ejecutaron todas las actividades de instalación de equipos y estructuras

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

9/02/2023	Actividades de instalación de estructuras y equipos : Mástil 9 metros de metros y soportes de vientos de anclaje, sensor de velocidad y dirección del viento a 9 metros de altura, sensor de temperatura y humedad a 3 metros de altura, 2 paneles solares, regulador solar, bateria 100 AH 12 VDC    	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio La Belleza	Meteorológica	Juan Rey	Bogotá	N: 4,531	W: -74,092

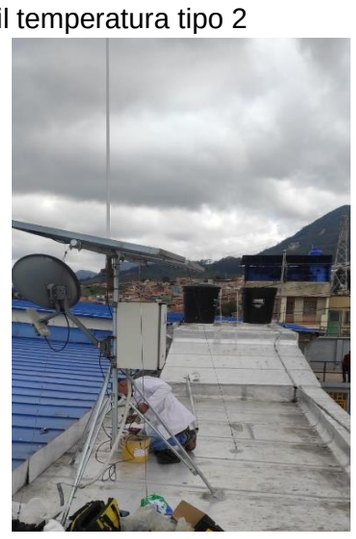
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	RAD10E	
Mástil tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
14/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

14/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de mastil temperatura tipo 2  	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



INFORMACIÓN ESTACIÓN

PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Fucha AV Cali	Hidrológica	hayuelos	Bogotá	N: 4,658	W: -74,136

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES	
4 Bateria 9 AH 12 VDC	CSB	UPS12460F2		
Pantalla protectora para sensor de	campbell Scientific	RAD10E		
Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad	ACERTA	N/A		
Sensor de humedad relativa	Campbell Scientific	CS210		

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
23/02/2023	Instalación baterias 9 AH 12 VDC	
	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad	
	Instalacion de estructura en L para sensor de temperatura y humedad sensor de precipitación.	
	Instalacion de sensor de humedad relativa	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

23/02/2023	Instalacion Pantalla protectora para sesor de temperatura y humedad, Instalación de sensor de humedad relativa para interiores, Instalación de estructura en L para sensor de temperatura y humedad.	

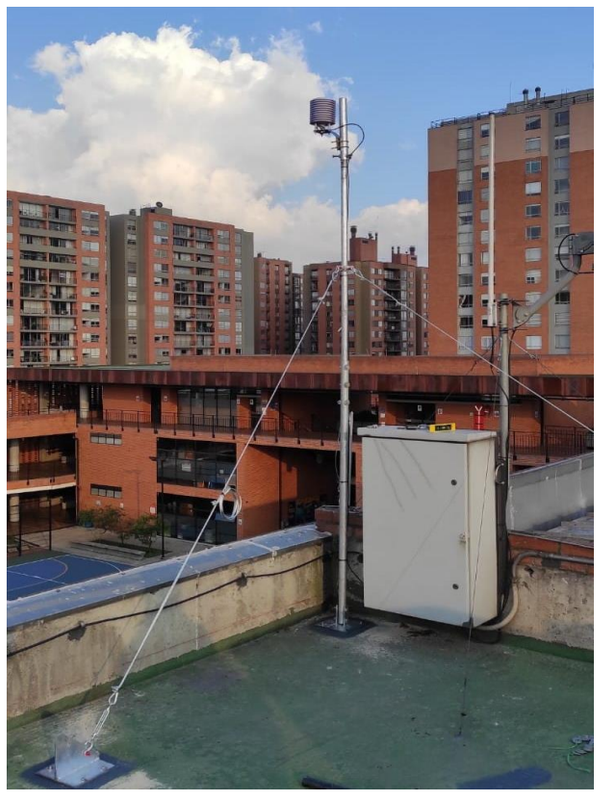






Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO



PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación Colegio La Belleza (IED)	Meteorológica	Juan Rey	Bogotá	N: 4,531	W: -74,092

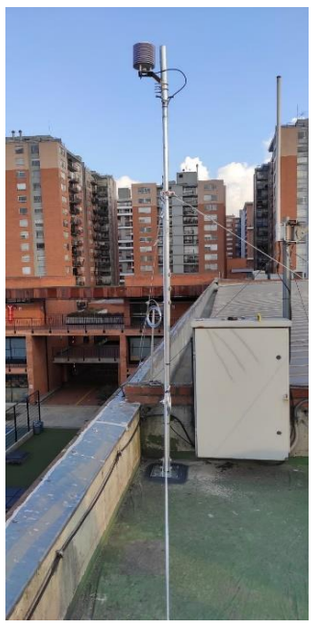
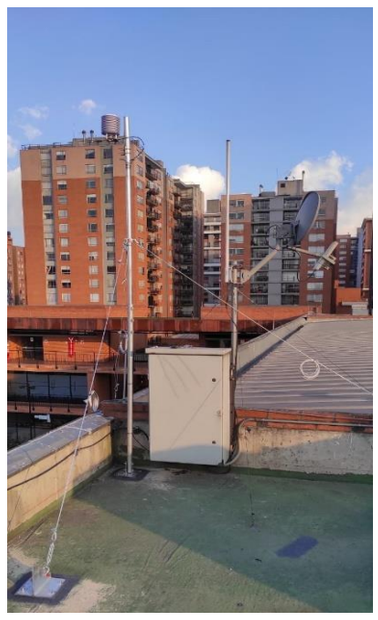
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Sensor de temperatura y humedad	campbell Scientific	HygroVue10	
Pantalla protectora para	campbell Scientific	RAD10E	
Mástil tipo 2	Acerta	N/A	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
23/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte mastil para sensor de temperatura tipo 2, Instalación de sensor de temperatura y humedad	

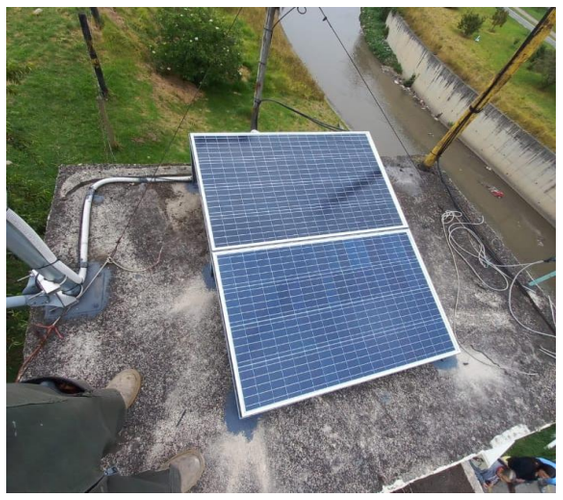
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

23/02/2023	Instalación Pantalla protectora para sensor de temperatura y humedad, Instalación de soporte para sensor de mastil temperatura tipo 2, Instalación de sensor de temperatura y humedad .   	Ninguna

Acerta	**INFORME DE ACTIVIDADES EN CAMPO**

REGISTRO FOTOGRAFICO





PROPIETARIO	DIRECCIÓN	CONTACTO	TELÉFONO	EMAIL
IDIGER	N/A	Ing. Ivan Bautista	3013922975	ibautista@igiger.gov.co

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LA ESTACIÓN

NOMBRE DE LA ESTACIÓN	TIPO DE ESTACIÓN	UBICACIÓN	MUNICIPIO	COORDENADAS	
Estación casas Fiscales Artilleria	Meteorológica	El tesoro	Bogotá	N: 4.556506	W: - 74.1249

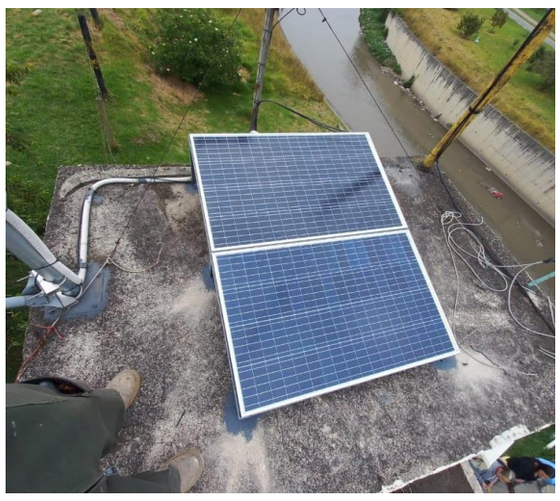
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS INSTALADOS

DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	OBSERVACIONES
Bateria 100 AH 12 VDC	CSB	GPL 121000	
Soporte doble para panel solar instalación en concreto	Acerta	N/A	
2 Paneles Solares	SUNERA	TPS- 107S- 100W	

ACTIVIDADES EJECUTADAS

FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
21/02/2023	Instalación de 2 paneles solares y soporte, Instalación de 2 paneles solares, Instalacio de regulador y baterias 100 AH 12 VDC	

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

21/02/2023	Instalación de 2 paneles solares y soporte, Instalación de 2 paneles solares, Instalacio de regulador y baterias 100 AH 12 VDC 	Ninguna
