MONTERÍA Gobierno de la GENTE	ALCALDIA DE MONTERIA	FECHA PRESENTE ACTA	
		16 FEBRERO 2023	
		DD MM AA	
	ACTA DE COMITÉ No. 18	PÁGINA	DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

5.3.FUERTES LLUVIAS EN LA REGION:
Se presentaron fuertes lluvias en la zona de desarrollo de actividades para el contrato de obra, lo cual incide directamente en nuestro rendimiento constructivo.
Desde el 26 de abril del 2022, inició la temporada de lluvias en esta región y hasta mediados del mes de noviembre del 2022 esta situación persistió, durante este periodo no se pudo garantizar los tiempos oportunos de entrega previamente pactados, muy en contra de nuestra voluntad. (ver bitácora con reporte de lluvias y registro del IDEAM correspondiente a las fechas reportadas- anexo)
Lo anterior, dio como consecuencia, entre otras cosas, la imposibilidad en el normal desarrollo de actividades claves como:
* Excavaciones en materiales común de las explanación y canales
* Mejoramiento con adición de materiales (tipo piedra rajón o similar)
* Extensión y compactación de Subbase granular clase c
* Instalación de geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares
* Dificultad en la consecución de materiales a ser utilizados en desarrollo del contrato, toda vez que por el invierno su explotación no es viable, adicionalmente no se daria cumplimiento a requerimientos técnicos, en lo referente a humedad óptima y compactación para su instalación.
Dejando también claro que todas las actividades de este contrato son a cielo abierto y queda todo el proyecto imposibilitado para la ejecución en la presencia de lluvias.
Las lluvias también ocasionaron la saturación del suelo lo que imposibilito por varios días la correcta realización de ensayos de densidad del suelo, lo que atrasa también la ejecución de las actividades.

5.4. FALTA DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO:
Mediante el RADICADO: LP-SPM-008-2022 – 012 del 10-08-22, se le informo a la interventoría la situación encontrada en campo, la cual una vez realizado el levantamiento topográfico, de la calle 2 Sur entre las carreras 8E Sur y 8F Sur y la carrera 8E Sur entre las calles 2 Sur y 9 Sur del barrio Alfonso López y los Araujos, se pudo evidenciar que varias terrazas de viviendas con o sin rejas se encuentran invadiendo espacio público, donde se impide la continuidad de las actividades de construcción de espacio público.
Las viviendas se encuentran fuera del paramento aproximadamente 70 cm quedando dentro del andén de la vía en construcción.
Se realizó tabla detallada con la ubicación de cada vivienda que se encuentran con dicho problema.
Se reiteró en el RADICADO: LP-SPM-008-2022 – 042 del 03 de octubre del 2022, donde se le solicito el apoyo a los señores de control urbano.
Así mismo se realizó una tabla detallada que contenía las autorizaciones y las No aprobaciones de los propietarios de las viviendas para la intervención, la cual fue entregada a la interventoría con el RADICADO: LP-SPM-008-2022 – 055 del 21 de octubre del 2022 y este remitido al municipio para seguir con el trámite con control urbano, a la fecha de este comunicado no se ha solucionado dicha situación.
Debido a que se hace necesario el acompañamiento por parte de la Secretaría de Planeación, mediante los profesionales designados por la Oficina de Espacio Público, no es posible la intervención en aquellos sectores que los propietarios han ocupado, hasta tanto dicha oficina no realice los requerimientos y/o acuerdos con la comunidad, en los correspondientes predios.
La demora en los tiempos de reacción de control urbano ha generado como consecuencia atraso en la construcción de espacio publico y retrasos en el cronograma de obra

5.5 DEMORA EN LA ENTREGA DE PERMISO DE TALA DE ARBOLES:
Dando cumplimiento al Diseño entregado por la entidad contratante se requiere en desarrollo del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022, efectuar tala de árboles en diferentes sectores a intervenir, siendo necesario contar con permiso por parte de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS, el cual debió ser tramitado por la entidad contratante ALCALDIA DE MONTERIA.
La Resolución de aprobación para tala de árboles fue entregada en fecha 21 de octubre del 2022, afectando fechas de inicio en la ejecución de las actividades de espacio público y excavaciones mecánicas para la conformación de la vía.

De acuerdo a las causales expuestas ,la firma interventora manifiesta:
5,1 PROBLEMAS DE FILTRACIÓN: Efectivamente se han presentado problemas de filtraciones provenientes del cerro aledaño a la vía en cuestión, lo cual ha atrasado actividades en desarrollo del contrato de obra.
5,2 SUMINISTROS DE MATERIALES PEDRAPLÉN Y SUBBASE: Se pudo evidenciar los diferentes cierres de vias en la región, manifestados por la firma contratista
5.3.FUERTES LLUVIAS EN LA REGION: Se presentan lluvias en la región lo cual es evidenciado con los registros del Ideam y el libro de obra
5.4. FALTA DE INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO: Luego de haber informado a la entidad contratante de los inconvenientes presentados con los dueños de predios, a la fecha no a ha dado solución por parte de la entidad contratante.
5.5 DEMORA EN LA ENTREGA DE PERMISO DE TALA DE ARBOLES: El contrato se inicio en fecha 9 de agosto del 2022 y la entidad entrego permiso de tala de arboles en fecha 21 de octubre del 2022, generando atrasos en las actividades descritas por la firma contratista
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la firma interventora ve viable la aprobación de la prórroga, por el termino solicitado, la cual esta sujeta aprobación por parte de la entidad contratante.

Se informa por parte de representantes de entidad contratante que se evaluará y emitirá concepto de solicitud realizada, teniendo en cuenta la necesidad de finalizar la totalidad de las obras objeto del contrato No. LP-SPM-008-2022

VIII. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entrega de actas de intervención - Octubre 21 de 2022	CONTRATISTA
Presentación Diseño Espacio Público - Octubre 24 de 2022	CONTRATISTA

VII. PROXIMA REUNION

FECHA [ ] DIA [ ] MES [ ] AÑO

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los

DIECISEIS(16) (Día en letras) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2.023 (Año de firma del acta)

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No. 17

FECHA PRESENTE ACTA			
14	febrero		2023
DD	MM		AA
PÁGINA	1	DE	2

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MONICA SEVERICHE	SUPERVISORA ALCALDIA DE MONTERIA	
MARIO TORRES	APOYO A LA SUPERVISION ALCALDIA DE MONTERIA	
PABLO CASTILLA NEGRETE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y AMBIENTALES	DISEÑADOR DEL PROYECTO	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
DURLEY DAZA MACEA	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

COMITÉ TECNICO CON CONSULTOR PABLO CASTILLAS NEGRETE

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1. EVALUACION DISEÑO GEOMETRICO SECTORES DE INTERSECCION
2. EVALUACION MANEJO AGUAS DE INFILTRACION
3. EVALUACION CONSTRUCCION CUNETAS MANEJO AGUAS ESCORRENTIA

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No. 17

FECHA PRESENTE ACTA			
14	febrero		2023
DD	MM		AA
PÁGINA	7	DE	2

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

1. EVALUACION DISEÑO GEOMETRICO SECTORES DE INTERSECCION

Teniendo en cuenta la solicitud realizada en lo relacionado con la variación de nivel de las intersecciones viales de las calles 3 - 4 - 5 - 6 con de la Carrera 8E Sur, el Ingeniero PABLO CASTILLA NEGRETE hace entrega de comunicado de fecha febrero 13 de 2023, donde se da alcance a lo requerido y se emite concepto de ajuste geométrico (Se anexa 15 folios)

2. EVALUACION MANEJO AGUAS DE INFILTRACION

Durante proceso de construcción de estructura de la via se observa en sectores excavadas, presencia de agua de infiltración que procede de la zona alta de los taludes, las cuales por gravedad llegan a lo largo del sector a intervenir (por zona de vias anexas sin pavimentar y/o viviendas), se hace necesario definir manejo de estas, con el fin de garantizar estabilidad de obras a ser ejecutadas.

Se informa por parte del Ingeniero PABLO CASTILLA NEGRETE, que debido a las condiciones técnicas de la zona en intervención, no se cuenta con Alcantarillado Pluvial, por lo que la recomendación será:

En aquellos sectores donde se evidencia presencia de aguas de infitración procedente de las áreas aferentes de la via en construcción se deberá incrementar el espesor del Pedraplén de diseño de 30 cm a 50 cm, variandose la cota de subrasante a -20 cm adicionales, garantizando con ello el manejo adecuado de las aguas que pudiesen infiltrarse en estos sectores.

Las demás condiciones de diseño No serán modificadas

3. EVALUACION CONSTRUCCION CUNETAS MANEJO AGUAS ESCORRENTIA

Se solicita evaluación de viabilidad de eliminación de construcción de cunetas para manejo de agua de escorrentia en los sectores indicados en los diseños:
CALLE 3 SUR: PR0+120: 12,45 m / PR0+128: 13,20 m
CALLE 4 SUR: PR0+185: 12,80 m / PR0+195: 13,20 m
CALLE 7 SUR: PR0+595: 12,00 m / PR0+601: 12,00 m
CALLE 8 SUR: PR0+643: 11,70 m / PR0+650: 10,50 m
Longitud total: 97,85 ml

Teniendo en cuenta que:
1. Las cunetas a ser construidas en desarrollo del contrato No. LP- SPM-008-2022, tendrá como punto de entrega final las cunetas construidas a lo largo de la Carrera 8F SUR, obteniéndose:
2. La interventoria realiza revisión y evaluación de estado de cunetas existentes en Carrera 8F SUR entre calles 2 SUR y 9 SUR, obteniéndose:
   - Cunetas localizadas en costados derecho, de ancho aproximado de 1,20 x 0,80 mt
   - Cunetas con tapas en concreto
   - Se observan presencia de agua estancada a todo lo largo de dichas cunetas
   - Las cunetas se observan totalmente colmatadas por material de sedimente de diferente clase, por lo cual no realizan el trabajo para la cual fueron construidas, que es la conducción de aguas hacia un punto de entrega, según diseños de alcantarillado del Municipio de Montería.
   - Se evidencia presencia de malos olores y criadero de zancudos
   - Las cunetas actualmente construidas en las calles por donde se va construir la carrera 8E SUR, se encuentran en su mayoría tapadas, toda vez que cuando llueve la cantidad de basura y material de arrastre que llega del cerro es bastante considerable

Se informa por parte del Ingeniero PABLO CASTILLA NEGRETE, que las cunetas diseñadas obedecen a una continuidad de las ya existentes en las calles anexas
En las Calles 3 Sur y 4 Sur no podrán ser construidas debido a la variación del nivel realiazado (comunicado de fecha febrero 13 de 2023), toda vez que quedarian por debajo de las cotas de entrega
En la Calle 7DSur, se deberán construir dando continuidad a la ya existente
En la Calle 8 Sur, no se evidencia la existencia de cuentas, por lo que se podrá omitir su construccion

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____ (DIA) _____ (MES) _____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Dia, en Montería Córdoba, a los

CATORCE (14) (Día en letras) días del mes de FEBRERO (Mes en que se firma el acta) de 2.023 (Año de firma del acta)

MONTERÍA
Epicentro de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.16

FECHA PRESENTE ACTA		
14	febrero	2023
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
DURLEY DAZA MACEA	REP. LEGAL CONTRATISTA	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
MARIO TORRES	APOYO A LA SUPERVISION	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

REINICIO AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1. SOLICITUD DE REINICIO CONTRATO DE OBRA
2. AJUSTES AL DISEÑO DE AL VIA

VI. DESARROLLO TEMAS

1. Solicitud de reinicio de obra:

1. La firma contratista Mediante oficio LP- SPM-008-2022-089 de fecha enero 27 de 2023, solicita reinicio del contrato de Obra No. LP-SPM-008-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

2.Se realiza comité de obra en fecha 14 de febrero del 2023, con la presencia de la supervisor, contratista e interventoria a fin de evaluar las condiciones que dieron motivo a la suspensión y las soluciones planteadas por la firma consultora en cuanto a los ajustes y/o optimización al diseño del proyecto cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	**ALCALDIA DE MONTERIA**	**FECHA PRESENTE ACTA**	
		14 / febrero / 2023	
		DD / MM / AA	
	ACTA DE COMITÉ No.16	PÁGINA	DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

2. Ajustes realizados al diseño del mejoramiento de vía :

Teniendo en cuenta los tramos viales del proyecto ya construidos y la necesidad de conducir el agua a través de las intersecciones, se suministra una propuesta donde se modifican las cotas del pavimento, mostradas a continuación:

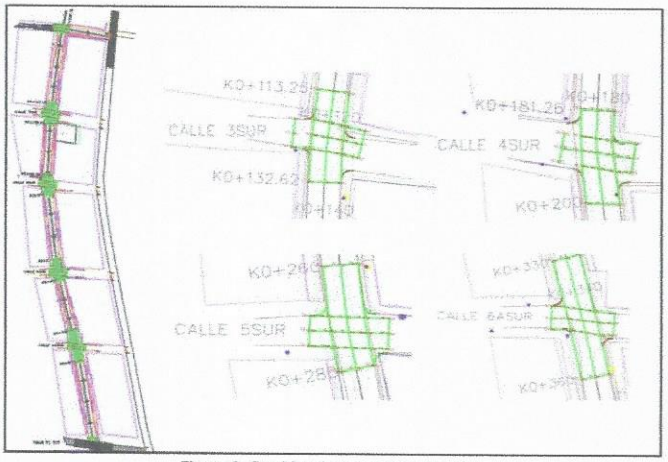


Figura 1. Cambios de cotas de pavimento.
Fuente: Suministrado por la presente consultoría.

Con los valores recomendados de cotas se realiza el ajuste al diseño geométrico, y se obtienen pendientes entre 0.22% y 3.81%, valores que se consideran adecuados

El perfil longitudinal ajustado se muestra a continuación:

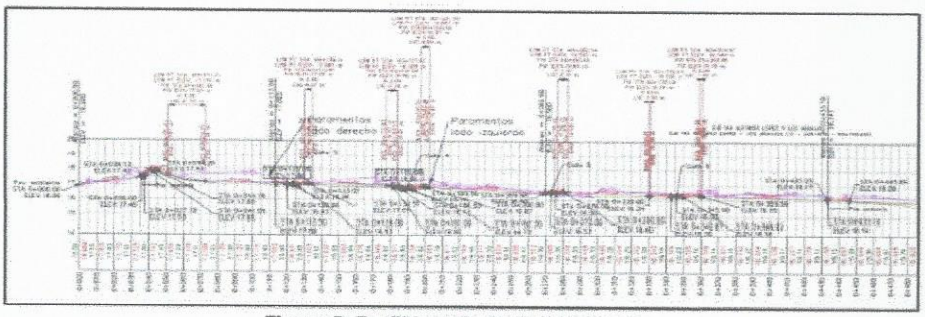


Figura 2. Perfil longitudinal actualizado.
Fuente: Elaborado por la presente consultoría.

Debido a los cambios de cotas en las intersecciones, se generan cambios de pendientes a los cuales se les diseñan curvas verticales con el fin de no generar afectaciones en la comodidad del tránsito de los vehículos.

Anexo a este documento se entrega los planos de diseño geométrico actualizado y las carteras de construcción.

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

2. Dentellón.

Teniendo en cuenta que la construcción del proyecto implica intersecciones con calles que no se encuentran pavimentadas (calle 3, 4, 5 y 6) y con el fin de evitar las afectaciones generadas por el agua de escorrentía, se recomienda la construcción de dentellones en las bocacalles de entrada y salida de las intersecciones, los cuales deben tener 0.50 m de
profundidad y 15° de inclinación.

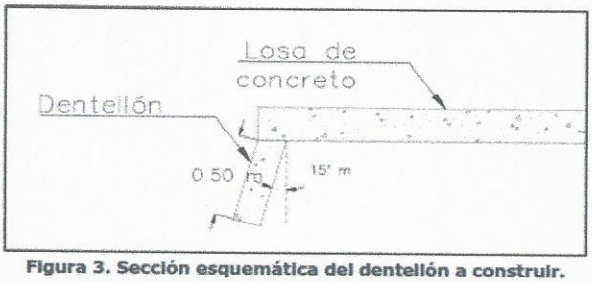


Figura 3. Sección esquemática del dentellón a construir.
Fuente: Elaborado por la presente consultoría.

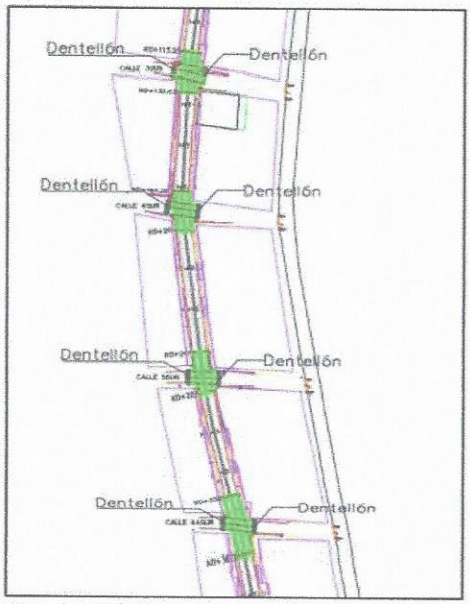


Figura 4. Localización en planta de los dentellones.
Fuente: Elaborado por la presente consultoría.

*Teniendo en cuenta los ajustes que expone la firma consultora para garantizar la calidad y estabilidad de las obras definidas en los Estudios y Diseños presentados por la entidad contratante, se da concepto favorable para el reinicio del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022 y por consecuente el contrato de interventoría No. CMA-SPM-007-2022"

*Así mismo la firma contratista deberá:

• Informar a la compañía de seguros que garantiza el contrato acerca de la presente suspensión y en consecuencia deberá remitir a la Entidad la respectiva póliza actualizada.

• Garantizar la adecuada señalización de los sectores, que lo requieran dando cumplimiento a la normatividad existente y al Plan de Manejo de Trafico aprobado por la entidad competente.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.16

FECHA PRESENTE ACTA			
14	febrero	2023	
DD	MM	AA	
PÁGINA		DE	

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA _____ (DIA) _____ (MES) _____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los _____ (Día en letras) días del mes de _____ (Mes en que se firma el acta) de _____ (Año de firma del acta)

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITE No. 15

FECHA PRESENTE ACTA		
31	Enero	2023
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	APOYO A LA SUPERVISION	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
DURLEY DAZA MACEA	REP. LEGAL CONTRATISTA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

AMPLIACIÓN No.3 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DE LOS CONTRATO DE OBRA E INTEREVNTORÍA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1. AMPLIACIÓN No.3 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
2. AMPLIACIÓN No.3 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

VI. DESARROLLO TEMAS

1. AMPLIACIÓN No.3 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

Teniendo en cuenta que, el presente contrato de obra LP-SPM-008-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, fue suspendido por las siguientes consideraciones:

-"Necesidad de revisión y/o concepto técnico por parte de la firma Consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, a fin de garantizar el adecuado manejo de aguas de infiltración y escorrentía, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de obras en los sectores que así lo requieran.
Las consultas técnicas a lo relacionado fueron remitidas a la entidad contratante mediante comunicados:
ESASIM-042-2022 Cunetas Manejo Aguas De Escorrentía, de fecha 19 de septiembre del 2022.
ESASIM-050-2022 Solicitud Diseñador Pavimento, de fecha 28 de septiembre del 2022.

Siendo necesario y de acuerdo con lo expuesto por la firma consultora un periodo prudencial de evaluación a fin de emitir el concepto técnico ajustado a las necesidades actuales de las zonas a intervenir.

-Necesidad de realizar acopio de materiales requeridos para la estructura del pavimento a ser construido, en volúmenes establecidos en diseños, toda vez que, por problemas de índole social y climático, se presentan afectaciones por cierre de vías de acceso a canteras, que impiden el normal flujo vehicular y cumplimiento en suministro de agregados en calidad y cantidad necesarias para cumplir con rendimientos programados"

Tomado textualmente del ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de obra LP-SPM-008-2022

Y, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se han resuelto las motivaciones que dieron origen a la Suspensión No. 01 del contrato de obra, ante la necesidad de garantizar la calidad y estabilidad de las obras definidas en los Estudios y Diseños presentados por la entidad contratante, la interventoría del proyecto, da concepto favorable para la ampliación al plazo de la suspensión del Contrato de Obra No. LP-SPM-008-2022, por un término de quince (15) días calendario, a fin de que se definan las soluciones técnicas por parte de la firma consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, que garanticen la ejecución de las obras con los rendimientos y calidades estipulados.

Así mismo la firma contratista deberá:
• Informar a la compañía de seguros que garantiza el contrato acerca de la presente suspensión y en consecuencia deberá remitir a la Entidad la respectiva póliza actualizada.

• Garantizar la adecuada señalización de los sectores, que lo requieran dando cumplimiento a la normatividad existente y al Plan de Manejo de Trafico aprobado por la entidad competente.

2. AMPLIACION No.3 DEL ACTA DE SUSPENSION No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

Por todo lo anteriormente expuesto, la interventoria la necesario efectuar SUSPENSION del Contrato de Interventoría CMA-SPM-007-2022, durante el mismo periodo que sea aprobada la suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022

VIII. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA

COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
TRAMITE A LA AMPLIACION DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	ALCALDIA

VII. PROXIMA REUNION

FECHA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los TREINTA Y UN (31) días del mes de ENERO de 2.023

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITE No.14

FECHA PRESENTE ACTA					
10		Enero		2023	
DD		MM		AA	
PÁGINA			DE		

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
DURLEY DAZA MACEA	REP. LEGAL CONTRATISTA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

AMPLIACIÓN No.2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DE LOS CONTRATO DE OBRA E INTEREVNTORÍA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1. AMPLIACIÓN No.2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
2. AMPLIACIÓN No.2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITE No.14

FECHA PRESENTE ACTA		
10	Enero	2023
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

1. AMPLIACIÓN No.2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

1.1 Teniendo en cuenta que, el presente contrato de obra LP-SPM-008-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, fue suspendido por las siguientes consideraciones:

•"Necesidad de revisión y/o concepto técnico por parte de la firma Consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, a fin de garantizar el adecuado manejo de aguas de infiltración y escorrentía, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de obras en los sectores que así lo requieran.
Las consultas técnicas a lo relacionado fueron remitidas a la entidad contratante mediante comunicados:
ESASIM-042-2022 Cunetas Manejo Aguas De Escorrentia, de fecha 19 de septiembre del 2022.
ESASIM-050-2022 Solicitud Diseñador Pavimento, de fecha 28 de septiembre del 2022

Siendo necesario y de acuerdo con lo expuesto por la firma consultora un periodo prudencial de evaluación a fin de emitir el concepto técnico ajustado a las necesidades actuales de las zonas a intervenir.

•Necesidad de realizar acopio de materiales requeridos para la estructura del pavimento a ser construido, en volúmenes establecidos en diseños, toda vez que, por problemas de índole social y climático, se presentan afectaciones por cierre de vías de acceso a canteras, que impiden el normal flujo vehicular y cumplimiento en suministro de agregados en calidad y cantidad necesarias para cumplir con rendimientos programados"

Tomado textualmente del ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 del contrato de obra LP-SPM-008-2022

- En fecha 22 de diciembre del 2022 se realizo ampliación No.1 a la suspensión No.1, toda vez que no se habían resuelto las motivaciones que dieron origen a la Suspensión No. 01 del contrato de obra.

Y, teniendo en cuenta que, a la fecha, no se han resuelto las motivaciones que dieron origen a la Suspensión No. 01 del contrato de obra, ante la necesidad de garantizar la calidad y estabilidad de las obras definidas en los Estudios y Diseños presentados por la entidad contratante, la interventoría del proyecto, da concepto favorable para la ampliación al plazo de la suspensión del Contrato de Obra No. LP-SPM-008-2022, por un término de veinte (20) días calendario, a fin de que se definan las soluciones técnicas por parte de la firma consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, que garanticen la ejecución de las obras con los rendimientos y calidades estipulados.

Así mismo la firma contratista deberá:
• Informar a la compañía de seguros que garantiza el contrato acerca de la presente suspensión y en consecuencia deberá remitir a la Entidad la respectiva póliza actualizada.

• Garantizar la adecuada señalización de los sectores, que lo requieran dando cumplimiento a la normatividad existente y al Plan de Manejo de Trafico aprobado por la entidad competente.

2. AMPLIACIÓN No.2 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

Por todo lo anteriormente expuesto, la interventoría la necesario efectuar ampliacion a la SUSPENSION del Contrato de Interventoría CMA-SPM-007-2022, durante el mismo periodo que sea aprobada la suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022

VIII. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
TRAMITE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	ALCALDIA

VII. PROXIMA REUNION

FECHA: DIA ____ MES ____ AÑO ____

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los DIEZ (10) (Día en letras) días del mes de ENERO (Mes en letras) de 2.023 (Año en letras)

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.13

FECHA PRESENTE ACTA				
21	noviembre		2022	
DD	MM		AA	
PÁGINA		DE		

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO	
ELKIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
DURLEY DAZA MACEA	REP. LEGAL CONTRATISTA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA E INTEREVNTORÍA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA
2. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.13

FECHA PRESENTE ACTA			
21	noviembre		2022
DD	MM		AA
PÁGINA		DE	

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA	
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

1. Solicitud de suspensión:

1. La firma contratista Mediante oficio LP- SPM-008-2022-067 de fecha noviembre 10 de 2022, solicita suspensión del contrato de Obra No. LP-SPM-008-2022, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA por un termino de 30 días calendario, a partir de fecha noviembre 21 de 2022.

1.1. Las causales que motivan dicha solicitud, las cuales a considerar serian:

•Necesidad de revisión y/o concepto técnico por parte de la firma Consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, a fin de garantizar el adecuado manejo de aguas de infiltración y escorrentía, con el fin de garantizar la calidad y estabilidad de obras en los sectores que así lo requieran.
Las consultas técnicas a lo relacionado fueron remitidas a la entidad contratante mediante comunicados:
ESASIM-042-2022 Cunetas Manejo Aguas De Escorrentía, de fecha 19 de septiembre del 2022
ESASIM-050-2022 Solicitud Diseñador Pavimento, de fecha 28 de septiembre del 2022

Siendo necesario y de acuerdo con lo expuesto por la firma consultora un periodo prudencial de evaluación a fin de emitir el concepto técnico ajustado a las necesidades actuales de las zonas a intervenir.

• Necesidad de realizar acopio de materiales requeridos para la estructura del pavimento a ser construido, en volúmenes establecidos en diseños, toda vez que, por problemas de índole social y climático, se presentan afectaciones por cierre de vías de acceso a canteras, que impiden el normal flujo vehicular y cumplimiento en suministro de agregados en calidad y cantidad necesarias para cumplir con rendimientos programados

• Fuerte invierno en la zona que afecta la calidad y rendimientos de obras programadas

---

2. Aval de la interventoría:
Mediante COMUNICADO ESASIM-074-2022 de fecha 11 de noviembre del 2022, la firma interventora teniendo en cuenta las causales que expone la firma contratista y ante la necesidad de garantizar la calidad y estabilidad de las obras definidas en los Estudios y Diseños presentados por la entidad contratante, da concepto favorable para la suspensión del contrato de obra No. LP-SPM-008-2022, por un término de treinta (30) días, a fin de que se definan las soluciones técnicas por parte de la firma consultora PABLO CASTILLA NEGRETE, Estudios Geotécnicos y Ambientales, que garanticen la ejecución de las obras con los rendimientos y calidades estipulados.

2.1. Así mismo la firma contratista deberá:
• Informar a la compañía de seguros que garantiza el contrato acerca de la presente suspensión y en consecuencia deberá remitir a la Entidad la respectiva póliza actualizada.

• Garantizar la adecuada señalización de los sectores, que lo requieran dando cumplimiento a la normatividad existente y al Plan de Manejo de Trafico aprobado por la entidad competente.

---

3. Solicitud de Suspensión interventoría:
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario efectuar SUSPENSION del Contrato de Interventoría CMA-SPM-007-2022, durante el mismo periodo que sea aprobada la suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022

* Se anexan a este comité los comunicados mencionados anteriormente

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
TRAMITE A LA SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	ALCALDIA

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____ (DIA) _____ (MES) _____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los

VEINTIUNO (21) (Día en letras) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2.022 (Año de firma del acta)

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.12

FECHA PRESENTE ACTA		
9	noviembre	2022
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

I. PARTICIPANTES	CARGO	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
MARIO TORRES	INGENIERO DE APOYO A LA SUPERVISION DEL PROYECTO	
.KIN ROJAS ANAYA	INGENIERO RESIDENTE INTERVENTORIA	
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	
DURLEY DAZA MACEA	REP. LEGAL CONTRATISTA	
JORGE CARRASCAL PÉREZ	INGENIERO DIRECTOR DE OBRA	

II. OBJETO

.LUACION E INFORME AVANCE CONTRARO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

N.A.

V. TEMAS TRATADOS

1, INTERVENCION DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022 POR SECTORES

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.12

FECHA PRESENTE ACTA		
9	noviembre	2022
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022


OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS


1. CONTRATO DE OBRA

Pavimento rígido: Ubicado en la carrera 8F Sur entre calle 9 Sur y calle 2 Sur
Longitud: Tramo 1: PR0+000 AL PR0+36, Longitud: 36 m, Ancho: 6 m
Tramo 2: PR0+044 AL PR0+645, Longitud: 601 m, Ancho: 6 m
Tramo 3: PR0+645 AL PR0+799, Longitud: 154 m, Ancho: 5,5 m

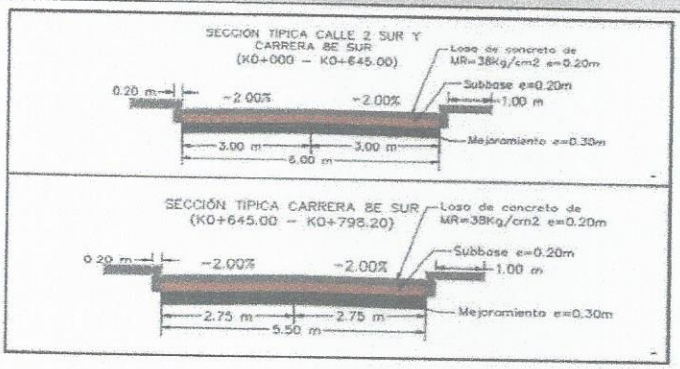


2. Intervención a la fecha:


CALLE 2 ENTRE CARRERA 8E Y 8F
A nivel de Pavimento PR0+000 AL PR0+036
Espacio Publico En Ejecución
Falta reubicación de medidor y terminar espacio publico

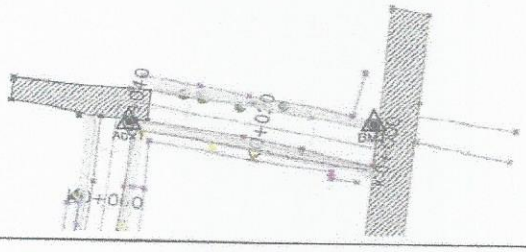


CARRERA 8E ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 3 SUR
A nivel de Pavimento PR0+044 AL PR0+113
Espacio Publico En Ejecución
Se debe definir que hacer con viviendas que no dejar hacer intervención de espacio publico



CARRERA 8E ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 4 SUR
A nivel de Pavimento desde PR0+130 A LA PR0+170
Instalación de bordillos Actualmente
Falta intersección entre calle 3, definir diseñador

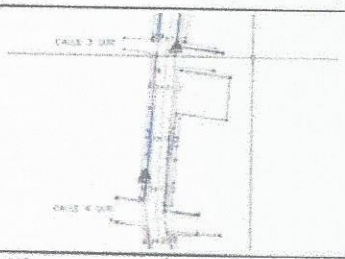

CARRERA 8E ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6E SUR
No se ha realizado intervención a la fecha

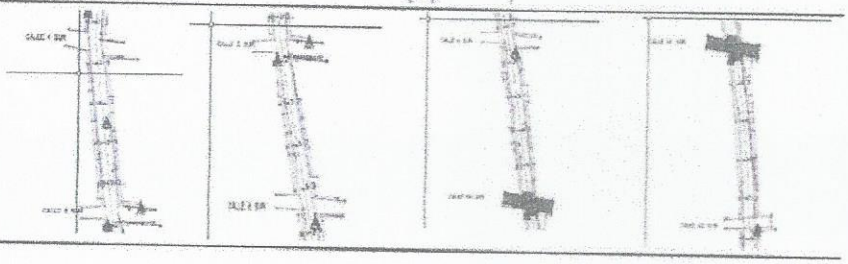

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.12

FECHA PRESENTE ACTA		
9	noviembre	2022
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022


CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:


MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS


CARRERA 8E ENTRE CALLE 9 SUR Y PR0+799
A nivel de Pavimento desde PR0+700 A LA PR0+799
Instalación de bordillos Actualmente

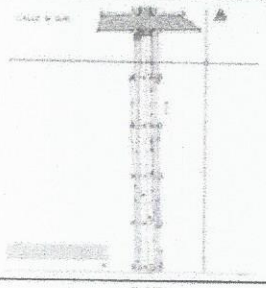


CARRERA 8E ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 8 SUR
A nivel de Pavimento desde PR0+690 AL PR0+654 Costado derecho
A nivel de material granular costado izquierdo desde PR0+690 AL PR0+650

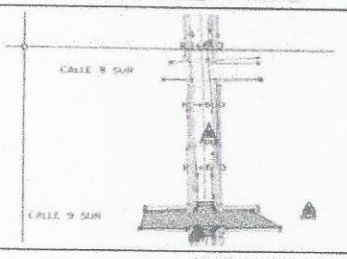

CARRERA 8E ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 8 SUR
A nivel de Material granular desde PR0+600 A LA PR0+650

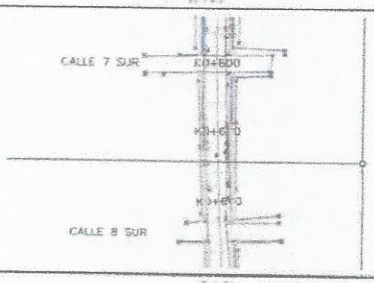


CARRERA 8E ENTRE CALLE 6E SUR Y CALLE 7 SUR
A nivel de Material granular desde PR0+530 A LA PR0+600

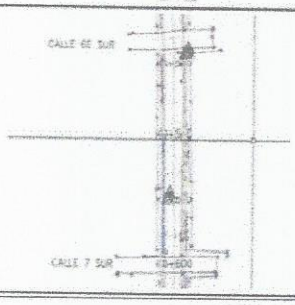

7. AVANCE CONTRATO - PROGRAMA DE OBRA

Programado: 78,32%, equivale a $ 2´047.177.459
Ejecutado: 27,48%, equivale a $ 718.294.098
Atraso: 50,84%, equivale a $ 1´328.883.361

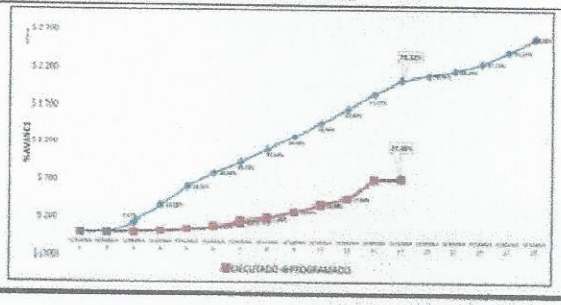

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

ACTA DE COMITÉ No.12

FECHA PRESENTE ACTA		
9	noviembre	2022
DD	MM	AA
PÁGINA		DE

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
REPRESENTANTE LEGAL	DURLEY DAZA MACEA
INTERVENTORIA	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022

CONTRATO INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

OBJETO DE CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VI. DESARROLLO TEMAS

3. DIFICULTADES PRESENTADAS:

*Presentación tardía de documentos contractuales.
*Falta disponibilidad de recursos, personal y equipo para el inicio de obra.
*Problemas de Suministro de materiales de subbase granular y rajón insuficientes para mejorar el terreno donde se realiza excavación
*luvias en la región durante el desarrollo del proyecto.
*Permiso tardío para tala de árboles, se debe hacer pago por concepto de Seguimiento ambiental al permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados y por tasa de aprovechamiento forestal.
*Se realiza Solicitud a la firma consultora diseñadora para cambios en niveles de pavimentos entre las intersecciones de las calles 3, 4, 5, 6 Sur sobre la carrera 8E Sur, así como eliminación de cunetas proyectadas en el diseño del pavimento, la cual a la fecha no se ha dado respuesta
*Manejo de Aguas de infiltración entre calles 2 Sur y calle 6c Sur sobre la carrea 8E Sur
*Se debe definir por parte de control urbano acción a tomar en viviendas que entran dentro del espacio publico diseñado

4. Documentos Pendientes

ITEM	RESPONSABLE	COMPROMISO	ESTADO
Informes Mensuales	Contratista	Entrega de informes mensuales a tiempo dentro de los tiempos contractuales	A la fecha falta por entregar informe No.3
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica.	Contratista	Entrega 24 de agosto del 2022 Entrega nuevamente correcciones el 19 de octubre del 2022	*En revisión
Permiso y/o Licencia Tala y Poda de Árboles	Alcaldía	Se entrega en fecha 20 de octubre del 2022 resolución No.222 de fecha 19 de octubre del 2022	*se debe hacer pago por concepto de Seguimiento ambiental al permiso de aprovechamiento forestal de arboles aislados y por tasa de aprovechamiento forestal. *Se debe presentar plan de compensación e indicar donde se va a realizar esta compensación
Implantación de planos de espacio publico	Contratista	Inmediata	Se deben presentar los siguientes planos de espacio publico a construir: Cra 8e Sur Pr0+0200 Al Pr0+280 Cra 8e Sur Pr0+0280 Al Pr0+350 Cra 8e Sur Pr0+350 Al Pr0+440 Cra 8e Sur Pr0+440 Al Pr0+530 Cra 8e Sur Pr0+530 Al Pr0+600 Cra 8e Sur Pr0+600 Al Pr0+650 Cra 8e Sur Pr0+650 Al Pr0+700 Cra 8e Sur Pr0+700 Al Pr0+798

4. Equipo y Personal en obra

Equipo: 1 Vibrocompactador, 1 Retrocargador de llantas, 1 Minicargador
Personal: 1 Maestro, 2 Oficios varios, 8 Ayudantes, 1 Celador, 4 Operadores de equipos, 3 conductores de volquetas, 1 Topógrafo, 1 Cadenero, 1 Aux SST, 1 Inspector de obra, 1 Ing. Auxiliar, 1 Social, 1 Director de obra, 1 Bodeguero

5. Solicitud de suspensión:

*La firma contratista solicitara suspensión al contrato de obra por 30 días calendario, teniendo en cuenta las solicitudes e inconvenientes realizadas a la firma consultora diseñadora desde el 5 de octubre del 2022 y a la fecha no se ha dado respuesta, lo cual impide la normal ejecución del contrato de obra.
*Se presentara esta lo antes posible ante la firma interventora para su estudio y fines pertinentes

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Entrega de informes mensuales No.3 de manera inmediata	Contratista
Planos de espacio publico Ajustados de manera inmediata	Contratista
Solicitud de suspensión al contrato de obra el 10 de noviembre del 2022	Contratista

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____ (DIA) _____ (MES) _____ (AÑO)

CITADOS: Personas que se citan a la próxima reunión para un tema especial o decisión particular.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Orden del Día, en Montería Córdoba, a los

NUEVE (09) (Día en letras) días del mes de NOVIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2.022 (Año de firma del acta)

ANEXO 05

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO

INFORME No.3	
PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO	
DESDE	HASTA
9-oct-22	8-nov-22
CONTRATO DE OBRA No. LP – SPM – 008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SPM-007-2022

No. ORDEN	FECHA	ESPECIFICACION									
		DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	EDAD (DIAS)	RANGO CUMPLIMIENTO	FRECUENCIA	RESISTENCIA OBTENIDA PSI	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACION /ACCIONES
			3000 PSI								
1		RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410				7 DIAS > 65% DE 210 KG/CM3 (3000 PSI)	POR JORNADA			
1	3/11/2022	PR0+700 - PR0+799, COSTADO DER				7			2421 PSI	81%	CUMPLE
						14			2789 PSI	93%	CUMPLE
						28			3967 PSI	132%	CUMPLE
2		PR0+650 - PR0+690, COSTADO IZQ				7			2561 PSI	85%	CUMPLE
						14			2856 PSI	95%	CUMPLE
3		PR0+650 - PR0+690, COSTADO DER				7			2444 PSI	81%	CUMPLE
						14			2783 PSI	93%	CUMPLE
4		PR0+700 - PR0+799, COSTADO IZQ				7			2567 PSI	86%	CUMPLE
						14			2901 PSI	97%	CUMPLE
5		PR0+600 - PR0+650, COSTADO IZQ				7			2412 PSI	80%	CUMPLE
						14			2777 PSI	93%	CUMPLE
6		PR0+600 - PR0+650, COSTADO DER				7			2592 PSI	86%	CUMPLE
7		PR0+044 - PR0+113, COSTADO IZQ				7			2378 PSI	79%	CUMPLE
8		PR0+044 - PR0+113, COSTADO IZQ				7			2543 PSI	85%	CUMPLE
2		NUCLEOS DE CONCRETO									
1	3/03/2023	ANDEN-PR0+780 CI							3008 PSI	100%	CUMPLE
2	3/03/2023	ANDEN PR0+ 755 CD							3013 PSI	100%	CUMPLE
3	3/03/2023	ANDEN PR0+667 CD							3024 PSI	101%	CUMPLE
4	3/03/2023	ANDEN PR0+575 CD							3052 PSI	102%	CUMPLE
5	3/03/2023	ANDEN PR0+541 CD							3063 PSI	102%	CUMPLE
6	3/03/2023	ANDEN PR0+475 CI							3016 PSI	101%	CUMPLE
7	3/03/2023	ANDEN PR0+113 CI							3023 PSI	101%	CUMPLE
8	3/03/2023	ANDEN PR0++080 CI							3012 PSI	100%	CUMPLE

Firma
Nombre: JORGE CARRASCAL PEREZ
Director de Obra

Firma
Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA
Residente de Interventoría



JORGE LUIS GALLEGO SILVA -
INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410


CALLE 3A #1C-20 NUEVO HORIZONTE
MONTERIA- CÓRDOBA

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ YLOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Localización: Monteria- Córdoba

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI				TIPO DE FALLA						Resistencia Obtenida		
						h1 (cm)	D (cm)	P(Kg)							PSI	DISEÑO	%
1	Andenes PR0+700 - PR0+799 DER	3/11/2022	10/11/2022	7	3000	30,1	15,2	11600,0	x						2421	63600	80,70%
2		3/11/2022	17/11/2022	14	3000	30,0	15,1	11962,0		x					2789	73267	92,97%
3		3/11/2022	1/12/2022	28	3000	30,2	15,2	11941,0				x			3067	80570	102,23%
1	Andenes PR0+690 - PR0+650 IZQ	7/11/2022	14/11/2022	7	3000	30,0	15,0	12133,0			x				2561	67277	85,37%
2		7/11/2022	21/11/2022	14	3000	30,0	15,2	12272,0		x					2856	75027	95,20%
3																	
1	Andenes PR0+690 - PR0+650 DER	9/11/2022	16/11/2022	7	3000	30,2	15,0	11766,0	x						2444	64204	81,47%
2		9/11/2022	23/11/2022	14	3000	30,1	15,1	11705,0					x		2783	73109	92,77%
3																	


 Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos

 Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

 Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

 Fractura en una de las esquinas

 las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZALEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA -
INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410


CALLE 3A #1C-20 NUEVO HORIZONTE
MONTERIA- CÓRDOBA

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ YLOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA


Localización: Monteria- Córdoba


NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Kg)	TIPO DE FALLA						Resistencia Obtenida		
															PSI	DISEÑO	%
1	Andenes PR0+700 - PR0+799 IZQ	17/11/2022	24/11/2022	7	3000	30,2	15,0	11936,0			x				2567	67435	85,57%
2		17/11/2022	1/12/2022	14	3000	30,0	15,1	11969,0	x						2901	76209	96,70%
3																	
1	Andenes PR0+600 - PR0+650 IZQ	18/11/2022	25/11/2022	7	3000	30,0	15,0	12262,0	x						2412	63363	80,40%
2		18/11/2022	2/12/2022	14	3000	30,1	15,2	12049,0				x			2777	72952	92,57%
3																	
1	Andenes PR0+600 - PR0+650 DER	21/11/2022	28/11/2022	7	3000	30,0	15,0	11639,0					x		2592	68092	86,40%
2																	
3																	



Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos


Conos razonablemente bien formados de ambos extremos


Cono bien formado en un extremo pero no en el otro


Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos


Fractura en una de las esquinas


las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZALEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA -
INGENIERO CIVIL
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. - 410


CALLE 3A #1C-20 NUEVO HORIZONTE
MONTERIA- CÓRDOBA

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ YLOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.


CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Localización: Monteria- Córdoba

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	FECHA ROTURA	DIAS	DISEÑO PSI	h1 (cm)	D (cm)	P(Kg)	TIPO DE FALLA						Resistencia Obtenida		
															PSI	DISEÑO	%
1	Andenes PR0+044 - PR0+113 IZQ	25/11/2022	2/12/2022	7	3000	30,0	15,0	11698,0		x					2378	62470	79,27%
2																	
3																	
1	Andenes PR0+000 - PR0+036 IZQ	26/11/2022	3/12/2022	7	3000	30,0	15,1	11789,0			x				2543	66805	84,77%
2																	
3																	
1																	
2																	
3																	


 Fractura diagonal sin rietas a través de los extremos

 Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

 Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

 Fractura en una de las esquinas

 las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZALEZ
LABORATORISTA



JORGE LUIS GALLEGO SILVA -
INGENIERO CIVIL MP.25202-40122CND
CONTROL DE ROTURA DE NÚCLEOS DE CONCRETO

CALLE 3A #1C-20 NUEVO HORIZONTE
MONTERIA- CÓRDOBA
CEL: 3106277098

PROYECTO : MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN LA CIUDAD DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

Localización: Monteria- Córdoba

NUMERO CILINDRO	ESTRUCTURA	FECHA TOMA	DISEÑO PSI				TIPO DE FALLA						Resistencia Obtenida		
				h1 (cm)	D (cm)	P(Kg)							PSI	DISEÑO	%
1	ANDEN- PR0+780 CL	3/03/2023	3000	8,0	5,0	47,2		X					3008	79020	100,27%
2	ANDEN-PR0+755CD	3/03/2023	3000	8,0	5,0	47,0		X					3013	79152	100,43%
3	ANDEN-PR0+667CD	3/03/2023	3000	8,0	5,0	46,1			X				3024	79440	100,80%
4	ANDEN-PR0+575CD	3/03/2023	3000	8,0	5,0	46,7					X		3052	80176	101,73%
5	ANDEN-PR0+541CD	3/03/2023	3000	8,0	5,0	45,0	X						3063	80465	102,10%
6	ANDEN-PR0+475CL	3/03/2023	3000	8,0	5,0	48,3		X					3016	79230	100,53%
7	ANDEN-PR0+113CI	3/03/2023	3000	8,0	5,0	46,8		X					3023	79414	100,77%
8	ANDEN-PR0+080CI	3/03/2023	3000	8,0	5,0	45,3				X			3012	79125	100,40%

Observaciones:

 Fractura diagonal sin grietas a través de los extremos

 Conos razonablemente bien formados de ambos extremos

 Cono bien formado en un extremo pero no en el otro

 Aquietamiento vertical columnar que abarca ambos extremos

 Fractura en una de las esquinas

 las grietas tienden a unirse en la superficie del cilindro

JORGE LUIS GALLEGO SILVA
INGENIERO CONTROL DE CALIDAD
M.P. 25202-40122 DE CND.

JORGE LUIS VANDA GONZALEZ
LABORATORISTA

ANEXO 06

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DEL CONTRATISTA DE OBRA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA	FECHA		
ALCALDÍA DE MONTERÍA	DD	MES	AÑO
CONTROL PARAFISCALES OBRA	28	FEB	2023

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA **PLANILLA No.:** 9448164986

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

MES O PERIODO: FEBRERO

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	J 16	V 17	S 18	D 19	L 20	M 21	MI 22	J 23	V 24	S 25	D 26	L 27	M 28	EPS	Pensiones	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
PERSONAL PROFESIONAL APROBADO																					
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA		13	1.069.468.639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
RODOLFO URRIAGA	ING RESIDENTE		13	6.889.639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS		13	11.000.193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO		13	78.747.853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	ING AMBIENTAL		13	25.775.982	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
NINI JHOANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL		13	49.606.740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA		13	1.064.985.371	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ROGER JOSE ATENCIA GARCIA	INSPECTOR		13	1.067.958.138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION	SURA	COMFACOR
MARIA CAMILA BALLESTERO CABALLERO	SECRETARIA		13	1.003.002.882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO		13	1.067.926.643	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
PERSONAL EN CAMPO																					
JAIVER ANDRES DIAZ SOTO	AUXILIAR SISO		13	1.066.186.999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
MERCADO HOYOS ANGELICA CECILIA	AUXILIAR RESIDENTE		13	30.578.821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
NANCY URANGO ORTEGA	BODEGUERA		13	1.067.932.580	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ALCIDES NAVARRO VELAZQUE	OFICIAL PAVIMENTO		13	1.073.825.317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	CADENERO		13	1.003.466.270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
DIEGO MONTES GONZALEZ	AYUDANTE		13	1.071.352.201	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CAJACOPI	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ERICK PLAZA ARDINES	AYUDANTE		13	1.067.926.278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
FREDY CERVANTES SULBARAN	AYUDANTE		13	10.999.854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA	FECHA		
ALCALDÍA DE MONTERÍA	DD	MES	AÑO
CONTROL PARAFISCALES OBRA	28	FEB	2023

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA **PLANILLA No.:** 9448164986

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

MES O PERIODO: FEBRERO

Nombre	Cargo	Período laborado	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M								EPS	Pensiones	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	AYUDANTE		13	10.767.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO	AYUDANTE		13	1.003.394.457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
MEDARDO ARCIA	CELADOR		13	10.785.279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								COOSALUD MOVILIDAD	PROTECCION	SURA	COMFACOR
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO		13	78.700.712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
WALTER PACHECO	AYUDANTE		13	1.065.663.737	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
OVER GASPAR BELTRÁN	AYUDANTE		13	1.063.165.642	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								COOSALUD	PORVENIR	SURA	COMFACOR
VIRGILIO FUENTES TORRE GLOSA	MAESTRO		13	6.893.241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MUTUAL SER	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
JULIO CONTRERAS	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA		13	1.073.820.884	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR		13	78.694.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
NEIDER PEREZ	AYUDANTE		13	1.005.662.678	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR

Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA
INTERVENTORÍA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	9448164986	9448164986	E	2023/03/09	2023/03/13	BANCO BOGOTA	4	$9,153,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTOS MONTERIA (29 Afiliados)					$29,787,335	$4,766,400			$29,497,335	$1,180,300			$29,787,335	$1,191,900			$30,657,335	$1,970,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON PAVIMENTOS MONTERIA (16 Afiliados)					$18,566,000	$2,970,600			$18,276,000	$731,100			$18,566,000	$742,700			$19,436,000	$1,353,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (16 Afiliados)					$18,566,000	$2,970,600			$18,276,000	$731,100			$18,566,000	$742,700			$19,436,000	$1,353,400		$0	$0
1	CC	1064985371	ALVAREZ LUIS	230201	15	$1,390,000	$222,400	EPS002	15	$1,390,000	$55,600	CCF16	15	$1,390,000	$55,600	14-11	15	$1,390,000	$96,800	15	$0	$0
2	CC	10785279	ARCIA MEDARDO	230201	5	$290,000	$46,400		0	$0	$0	CCF16	5	$290,000	$11,600	14-11	30	$1,160,000	$80,800	5	$0	$0
3	CC	1067958138	ATENCIA ROGER	230201	30	$1,810,000	$289,600	EPS037	30	$1,810,000	$72,400	CCF16	30	$1,810,000	$72,400	14-11	30	$1,810,000	$126,000	30	$0	$0
4	CC	1003466270	AYALA ALVARO	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
5	CC	11000193	BERROCAL ALEXANDER	230201	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
6	CC	1069468639	CARRASCAL JORGE	25-14	30	$3,336,000	$533,800	EPS002	30	$3,336,000	$133,500	CCF16	30	$3,336,000	$133,500	14-11	30	$3,336,000	$232,200	30	$0	$0
7	CC	1067931734	DAZA DURLEY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF16	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
8	CC	1066186999	DIAZ JAIVER	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
9	CC	30578821	MERCADO ANGELICA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS005	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
10	CC	78747853	PEÑA SIMON	231001	15	$580,000	$92,800	EPS048	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
11	CC	25775982	RAMIREZ MARIA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS002	15	$580,000	$23,200	CCF16	15	$580,000	$23,200	14-11	15	$580,000	$40,400	15	$0	$0
12	CC	49606740	ROPERO NINI	25-14	15	$1,390,000	$222,400	EPS037	15	$1,390,000	$55,600	CCF16	15	$1,390,000	$55,600	14-11	15	$1,390,000	$96,800	15	$0	$0
13	CC	78694807	SEJIN SERGIO	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
14	CC	10767500	URANGO GUSTAVO	231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
15	CC	1067932580	URANGO NANCY	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
16	CC	6889639	URRIAGA RODOLFO	230201	15	$1,390,000	$222,400	EPS048	15	$1,390,000	$55,600	CCF16	15	$1,390,000	$55,600	14-11	15	$1,390,000	$96,800	15	$0	$0
Centro de Trabajo: OBREROS PAVIMENTOSMONTERIA (11 Afiliados)					$8,661,335	$1,386,200			$8,661,335	$346,800			$8,661,335	$346,800			$8,661,335	$603,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (11 Afiliados)					$8,661,335	$1,386,200			$8,661,335	$346,800			$8,661,335	$346,800			$8,661,335	$603,500		$0	$0
17	CC	10999854	CERVANTES FREDY	230301	22	$850,667	$136,200	ESSC07	22	$850,667	$34,100	CCF16	22	$850,667	$34,100	14-11	22	$850,667	$59,300	22	$0	$0
18	CC	1073820884	CONTRERAS JULIO	230301	6	$232,000	$37,200	EPS041	6	$232,000	$9,300	CCF16	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$16,200	6	$0	$0
19	CC	6893241	FUENTES VIRGILIO	25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
20	CC	1063165642	GASPAR OVER	230301	14	$541,334	$86,700	ESSC24	14	$541,334	$21,700	CCF16	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
21	CC	1003394457	GOMEZ JEISON	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
22	CC	1071352201	MONTES DIEGO	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
23	CC	1073825317	NAVARRO ALCIDES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
24	CC	1065663737	PACHECO WALTER	230301	14	$541,334	$86,700	EPS041	14	$541,334	$21,700	CCF16	14	$541,334	$21,700	14-11	14	$541,334	$37,700	14	$0	$0
25	CC	1005662678	PEREZ NEIDER	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC07	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
26	CC	1067926278	PLAZA ERICK	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
27	CC	78700712	RAMOS MEDARDO	230201	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$14,000	CCF16	9	$348,000	$14,000	14-11	9	$348,000	$24,300	9	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)					$2,560,000	$409,600			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$13,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)					$2,560,000	$409,600			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$102,400			$2,560,000	$13,500		$0	$0
28	CC	1003002882	CABALLERO MARIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
29	CC	1067926643	LOPEZ JIMMY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF16	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(29)**				$29,787,335	$4,766,400			$29,497,335	$1,180,300			$29,787,335	$1,191,900			$30,657,335	$1,970,400		$0	$0

2023/03/15 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-03	9448164986	9448164986	E	2023/03/09	2023/03/13	BANCO BOGOTA	4	$9,153,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$4,766,400	$23,200	$0	$4,789,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$464,000	$2,300	$0	$466,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$941,800	$4,600	$0	$946,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,060,100	$10,000	$0	$2,070,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,300,500	$6,300	$0	$1,306,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,970,400	$9,600	$0	$1,980,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	$1,970,400	$9,600	$0	$1,980,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,191,900	$5,800	$0	$1,197,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	29	$1,191,900	$5,800	$0	$1,197,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				28	$1,180,300	$6,100	$0	$1,186,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,400	$300	$0	$46,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$21,700	$200	$0	$21,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$78,800	$400	$0	$79,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$326,500	$1,600	$0	$328,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$197,600	$1,000	$0	$198,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$31,000	$200	$0	$31,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$375,100	$1,900	$0	$377,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$103,200	$500	$0	$103,700
TOTAL				29	$9,109,000	$44,700	$0	$9,153,700

2023/03/15 11:55 AM

	REPÚBLICA DE COLOMBIA	FECHA	
	ALCALDÍA DE MONTERÍA	DD / MES / AÑO	23 / NOV / 2022
	CONTROL PARAFISCALES OBRA	PLANILLA No.: 9444089964	

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

MES O PERIODO: NOVIEMBRE

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	EPS	Pensiones	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
					M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M				
PERSONAL PROFESIONAL APROBADO																														
JORGE CARRASCAL PEREZ	DIRECTOR DE OBRA		22	1069468639	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
RODOLFO URRIAGA	ING. RESIDENTE DE OBRA		22	6.889.839	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ALEXANDER BERROCAL ARTEAGA	ING. ESPECIALISTA EN VIAS		22	11.000.193	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
DIANA PALACIO MOSQUERA	ING ESPECIALISTA AMBIENTAL		22	1.067.886.516	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
SIMON PEÑA MENDOZA	ING. ELECTRICO		22	78.747.853	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
LUIS GUILLERMO ALVAREZ	PROFESIONAL SISOMA		22	1.064.995.371	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
NINI JHOANA ROPERO DAZA	TRABAJADORA SOCIAL		22	49.606.740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
MARIA CAMILA CABALLERO	SECRETARIA		22	1.003.002.882	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JIMMY LOPEZ LARA	MENSAJERO		22	1.067.926.673	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ROGER JOSE ATENCIA GARCIA	INSPECTOR DE OBRA		22	1.067.958.138	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS S.A.	PROTECCION	SURA	COMFACOR
PERSONAL EN CAMPO																														
ANGELICA CECILIA MERCADO HOYOS	ING. AUXILIAR DE OBRA		22	30.578.821	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JAIVER ANDRES DIAZ SOTO	AUXILIAR SISO		22	1.066.186.999	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
MEDARDO FRANCISO RAMOS SAENZ	TOPOGRAFO		22	78.700.712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	COMFACOR
ALCIDES MANUEL NAVARRO VELAZQUEZ	OFI. PAVIMENTO		22	1.073.825.317	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ALVARO JAVIER AYALA GARCIA	CADENERO		22	1.003.466.270	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ANA MARIA TORRES MORALES	AYUDANTE		22	1.067.883.433	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
CAMILO ANDRES AYALA GARCIA	AYUDANTE		3	1.010.154.860	X	X	X																				NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	COMFACOR
CESAR DAVID MARTINEZ CAMAÑO	AYUDANTE		22	1.067.870.213	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
EDINSON MANUEL PATERNINA CABRERA	AYUDANTE		6	10.965.718																		X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
ERICK PLAZA ARDINES	AYUDANTE		22	1.067.926.278	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR
FULGENCIO ANTONIO ESPITIA PEREZ	AYUDANTE		18	78.689.774					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	COMFACOR
GEINER DAVID MESTRA MARTINEZ	OPERADOR MINICARGADOR		22	1.067.905.342	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
GUSTAVO URANGO GONZALEZ	OFICIO VARIOS		22	10.767.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JEISON MANUEL GOMEZ PEINADO	AYUDANTE		22	1.003.394.457	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JORGE ELIECER MONTES MONSALVO	AYUDANTE		6	4.978.981																		X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JOSE RAFAEL AVILEZ ALBARADO	AYUDANTE		18	1.067.860.476					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA	COMFACOR
JULIO ALBERTO CONTRERAS BURGOS	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA LLANTAS		22	1.073.820.884	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
KEVIN JAVIER GARCIA TORRES	AYUDANTE		18	1.068.421.965					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COOSALUD MOVILIDAD	PROTECCION	SURA	COMFACOR
MEDARDO ARCIA	CELADOR		22	10.785.279	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
MIGUEL ARMANDO MARTINEZ DIAZ	CADENERO		22	1.003.432.844	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PROTECCION	SURA	COMFACOR
NANCY URANGO ORTEGA	BODEGUERA		22	1.067.932.580	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA S.A.S NIT. 901.254.479-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ALCALDÍA DE MONTERÍA

CONTROL PARAFISCALES OBRA

FECHA		
DD	MES	AÑO
23	NOV	2022

CONTRATO DE OBRA No.: LP-SPM-008-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA **PLANILLA No.: 9444089964**

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

MES O PERIODO: NOVIEMBRE

Nombre	Cargo	Periodo laborado	No Días mes (Base Liquidación)	C.C.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	EPS	Pensiones	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN
					M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M				
OSWALDO ENRIQUE RAMOS VELASQUEZ	AYUDANTE		22	1.067.881.471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FOSYGA	PORVENIR	SURA	COMFACOR
OVER LUIS GASPAR BELTRAN	AYUDANTE		5	1.063.165.642	X	X	X	X	X																		COOSALUD	PORVENIR	SURA	COMFACOR
RAFAEL EDUARDO SOTO RAMOS	OPERADOR DE VIBRO-COMPACTADOR		22	7.382.146	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA	COMFACOR
SERGIO RAUL SEJIN MACEA	CELADOR		22	78.694.807	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA	COMFACOR
VIRGILIO FUENTES TORRE GLOSA	MAESTRO		22	6.893.241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MUTUAL SER	COLPENSIONES	SURA	COMFACOR

Firma

Nombre: ELKIN ROJAS ANAYA

INTERVENTORÍA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9444089964	9444089964	E	2022/12/12	2022/12/14	BANCO BOGOTA	2	$12,323,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PAVIMENTOS MONTERIA (49 Afiliados)						$42,476,025	$6,633,300			$41,976,025	$1,514,600			$42,476,025	$1,534,600			$43,976,025	$2,613,100		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMON PAVIMENTOS MONTERIA (18 Afiliados)						$23,442,671	$3,697,500			$22,942,671	$864,000			$23,442,671	$884,000			$24,942,671	$1,642,400		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (18 Afiliados)						$23,442,671	$3,697,500			$22,942,671	$864,000			$23,442,671	$884,000			$24,942,671	$1,642,400		$0	$0
1	CC	1064985371	ALVAREZ LUIS	230201	23	$2,131,334	$341,100	EPS002	23	$2,131,334	$85,300	CCF16	23	$2,131,334	$85,300	14-11	23	$2,131,334	$148,400	23	$0	$0
2	CC	1064985371	ALVAREZ LUIS	230201	7	$648,667	$77,900	EPS002	7	$648,667	$0	CCF16	7	$648,667	$0	14-11	7	$648,667	$0	7	$0	$0
3	CC	10785279	ARCIA MEDARDO	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC24	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
4	CC	1067958138	ATENCIA ROGER	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
5	CC	78696203	AYALA ABEL	230301	5	$250,000	$40,000		0	$0	$0	CCF16	5	$250,000	$10,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	5	$0	$0
6	CC	1003466270	AYALA ALVARO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	11000193	BERROCAL ALEXANDER	230201	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
8	CC	11000193	BERROCAL ALEXANDER	230201	7	$233,334	$28,100	EPS002	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
9	CC	1069468639	CARRASCAL JORGE	25-14	30	$3,336,000	$533,800	EPS002	30	$3,336,000	$133,500	CCF16	30	$3,336,000	$133,500	14-11	30	$3,336,000	$232,200	30	$0	$0
10	CC	1066186999	DIAZ JAIVER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
11	CC	1068822356	JULIO JULISSA	230301	8	$266,667	$42,700	EPS002	8	$266,667	$10,700	CCF16	8	$266,667	$10,700	14-11	8	$266,667	$18,600	8	$0	$0
12	CC	78692154	MARTINEZ WILLIAM	25-14	5	$250,000	$40,000		0	$0	$0	CCF16	5	$250,000	$10,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	5	$0	$0
13	CC	30578821	MERCADO ANGELICA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
14	CC	1067886516	PALACIOS DIANA	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
15	CC	1067886516	PALACIOS DIANA	230301	7	$233,334	$28,100	EPS002	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
16	CC	78747853	PEÑA SIMON	231001	23	$766,667	$122,700	EPS048	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
17	CC	78747853	PEÑA SIMON	231001	7	$233,334	$28,100	EPS048	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
18	CC	49606740	ROPERO NINI	25-14	30	$2,780,000	$444,800	EPS037	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-11	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
19	CC	78694807	SEJIN SERGIO	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
20	CC	10767500	URANGO GUSTAVO	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
21	CC	1067932580	URANGO NANCY	230201	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF16	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
22	CC	6889639	URRIAGA RODOLFO	230201	30	$2,780,000	$444,800	EPS048	30	$2,780,000	$111,200	CCF16	30	$2,780,000	$111,200	14-11	30	$2,780,000	$193,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBREROS PAVIMENTOSMONTERIA (29 Afiliados)						$16,533,354	$2,535,800			$16,533,354	$550,600			$16,533,354	$550,600			$16,533,354	$957,500		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (29 Afiliados)						$16,533,354	$2,535,800			$16,533,354	$550,600			$16,533,354	$550,600			$16,533,354	$957,500		$0	$0
23	CC	1003408017	ARRIETA OSCAR	230301	1	$33,334	$5,400	ESSC07	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
24	CC	15612829	ARRIETA OSCAR	230301	10	$333,334	$53,400	ESSC07	10	$333,334	$13,400	CCF16	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
25	CC	1067860476	AVILEZ JOSE	230301	10	$333,334	$53,400	ESSC07	10	$333,334	$13,400	CCF16	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
26	CC	1010154860	AYALA CAMILO	230301	1	$33,334	$5,400	EPS041	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
27	CC	1073820884	CONTRERAS JULIO	230301	23	$766,667	$122,700	EPS041	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
28	CC	1073820884	CONTRERAS JULIO	230301	7	$233,334	$28,100	EPS041	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
29	CC	1118817005	DIAZ DAVID	230301	1	$33,334	$5,400	EPSIC3	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
30	CC	78689774	ESPITIA FULGENCIO	25-14	10	$333,334	$53,400	ESSC07	10	$333,334	$13,400	CCF16	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
31	CC	6893241	FUENTES VIRGILIO	25-14	7	$233,334	$37,400	ESSC07	7	$233,334	$9,400	CCF16	7	$233,334	$9,400	14-11	7	$233,334	$16,300	7	$0	$0
32	CC	6880515	GALARAGA ALVARO	230301	23	$766,667	$122,700	EPS041	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
33	CC	6880515	GALARAGA ALVARO	230301	7	$233,334	$28,100	EPS041	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
34	CC	78711372	GARCIA PEDRO	231001	1	$33,334	$5,400	ESSC07	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0

2023/01/27 04:58 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
35	CC	1063165642	GASPAR OVER	230301	5	$166,667	$26,700	ESSC24	5	$166,667	$6,700	CCF16	5	$166,667	$6,700	14-11	5	$166,667	$11,700	5	$0	$0
36	CC	1003394457	GOMEZ JEISON	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
37	CC	1003394457	GOMEZ JEISON	230301	7	$233,334	$28,100	ESSC07	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
38	CC	11004525	GONZALEZ LUIS	230301	23	$766,667	$122,700	EPS037	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
39	CC	11004525	GONZALEZ LUIS	230301	7	$233,334	$28,100	EPS037	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
40	CC	1062428878	GUZMAN SANTIAGO	230301	3	$100,000	$16,000	ESSC07	3	$100,000	$4,000	CCF16	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
41	CC	1068421965	KEVIN GARCIA	230301	26	$866,667	$138,700	ESSC07	26	$866,667	$34,700	CCF16	26	$866,667	$34,700	14-11	26	$866,667	$60,400	26	$0	$0
42	CC	1003452457	LEON JHONATAN	230301	1	$33,334	$5,400	CCFC55	1	$33,334	$1,400	CCF16	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0
43	CC	1067870213	MARTINEZ CESAR	230201	23	$766,667	$122,700	EPS048	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
44	CC	1067870213	MARTINEZ CESAR	230201	7	$233,334	$28,100	EPS048	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
45	CC	1143337094	MARTINEZ JOSE	230301	10	$333,334	$53,400	ESSC07	10	$333,334	$13,400	CCF16	10	$333,334	$13,400	14-11	10	$333,334	$23,300	10	$0	$0
46	CC	10034328 44	MARTINEZ MIGUEL	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
47	CC	10034328 44	MARTINEZ MIGUEL	230301	7	$233,334	$28,100	ESSC07	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
48	CC	1067905342	MESTRA GEINER	230301	19	$633,334	$101,400	EPS002	19	$633,334	$25,400	CCF16	19	$633,334	$25,400	14-11	19	$633,334	$44,100	19	$0	$0
49	CC	4978981	MONTES JORGE	230301	14	$466,667	$74,700	ESSC07	14	$466,667	$18,700	CCF16	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
50	CC	1073825317	NAVARRO ALCIDES	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
51	CC	1073825317	NAVARRO ALCIDES	230301	7	$233,334	$28,100	ESSC07	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
52	CC	10965718	PATERNINA EDINSON	230301	14	$466,667	$74,700	ESSC07	14	$466,667	$18,700	CCF16	14	$466,667	$18,700	14-11	14	$466,667	$32,500	14	$0	$0
53	CC	1067926278	PLAZA ERICK	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
54	CC	1067926278	PLAZA ERICK	230301	7	$233,334	$28,100	ESSC07	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
55	CC	78700712	RAMOS MEDARDO	230201	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
56	CC	78700712	RAMOS MEDARDO	230201	7	$233,334	$28,100	EPS002	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
57	CC	1067881471	RAMOS OSWALDO	230301	23	$766,667	$122,700	MIN001	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
58	CC	1067881471	RAMOS OSWALDO	230301	7	$233,334	$28,100	MIN001	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
59	CC	1067892782	ROQUEME CARLOS	230301	3	$100,000	$16,000	ESSC24	3	$100,000	$4,000	CCF16	3	$100,000	$4,000	14-11	3	$100,000	$7,000	3	$0	$0
60	CC	7382146	SOTO RAFAEL	230301	23	$766,667	$122,700	EPS002	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
61	CC	7382146	SOTO RAFAEL	230301	7	$233,334	$28,100	EPS002	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
62	CC	1067883437	TORRES ANA	230301	23	$766,667	$122,700	ESSC07	23	$766,667	$30,700	CCF16	23	$766,667	$30,700	14-11	23	$766,667	$53,400	23	$0	$0
63	CC	1067883437	TORRES ANA	230301	7	$233,334	$28,100	ESSC07	7	$233,334	$0	CCF16	7	$233,334	$0	14-11	7	$233,334	$0	7	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,200		$0	$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (2 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$100,000			$2,500,000	$13,200		$0	$0
64	CC	1003002882	CABALLERO MARIA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS002	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$0	$0
65	CC	1067926643	LOPEZ JIMMY	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF16	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(49)**					$42,476,025	$6,633,300			$41,976,025	$1,514,600			$42,476,025	$1,534,600			$43,976,025	$2,613,100		$0	$0

2023/01/27 04:58 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901609836	4	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTOS MONTERIA	KRA 2 #31-48	MONTERIA-CORDOBA	7826058	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	9444089964	9444089964	E	2022/12/12	2022/12/14	BANCO BOGOTA	2	$12,323,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				49	$6,633,300	$14,500	$0	$6,647,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$476,200	$1,100	$0	$477,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,109,400	$2,400	$0	$1,111,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$3,251,500	$7,100	$0	$3,258,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,796,200	$3,900	$0	$1,800,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$2,613,100	$5,700	$0	$2,618,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	49	$2,613,100	$5,700	$0	$2,618,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				49	$1,534,600	$3,400	$0	$1,538,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	49	$1,534,600	$3,400	$0	$1,538,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				47	$1,514,600	$3,900	$0	$1,518,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$1,400	$100	$0	$1,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$1,400	$100	$0	$1,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$50,700	$200	$0	$50,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$172,600	$400	$0	$173,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$30,700	$100	$0	$30,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	18	$375,400	$900	$0	$376,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$265,900	$600	$0	$266,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$62,800	$200	$0	$63,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$513,700	$1,200	$0	$514,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$40,000	$100	$0	$40,100
TOTAL				49	$12,295,600	$27,500	$0	$12,323,100

2023/01/27 04:58 PM

ANEXO 07

REPROGRAMACIÓN DE OBRA

FLUJO DE CAJA SEMANAL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ACTIVIDADES	PROGRAMADO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27
		1/08/22 -14/08/22	15/08/22 -21/08/22	22/08/22 -28/08/22	29/08/22 -4/09/22	5/09/22 -11/09/22	12/09/22 -18/09/22	19/09/22 -25/09/22	26/09/22 -02/10/22	03/10/22 -09/10/22	10/10/22 -16/10/22	17/10/22 -23/10/22	24/10/22 -30/10/22	31/10/22 -06/11/22	7/11/22 -13/11/22	14/11/22 -20/11/22	21/11/22 -27/11/22 y 30/11/22 -4/12/22	28/11/2022 -4/12/2022	5/12/2022 -11/12/2022	12/12/2022 -18/12/2022	19/12/2022 -25/12/2022	26/12/22 -1/01/23	2/01/23 -8/01/23	9/01/23 -15/01/23	16/01/23 -22/01/23	23/01/23 -29/01/23	30/01/23 -5/02/23	6/02/23 -12/02/23
PRELIMINARES																												
LOCALIZACION Y REPLANTEO CON TOPOGRAFIA	$ 1.05	$ 0.47	$ 0.25																									
DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	$ 5.856.615,01			$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60	$ 313.384,60
CORTE DE PISO EN ESPALTA Y RANURA DE CONCRETO DE ALTO RESISTENCIA	$ 19.676.625,00			$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40	$ 765.065,40
DEMOLICION DE PISOS Y MUROS DE CONCRETO	$ 18.462.180,00			$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00	$ 417.864,00
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	$ 7.815.000,00				$ 4.260.822,55	$ 3.554.177,45																						
EXCAVACION MECANICA EN CUALQUIERA PARA FALLOS EN LOS RASANTE PROFUNDIDAD - H CUALQUIER TIPO	$ 14.720.467,00				$ 8.024.600,35	$ 6.695.866,77																						
EXCAVACION MANUAL CONFORMACION Y NIVELACION Y CANALES	$ 25.648.706,01			$ 1.497.950,66	$ 1.497.950,66	$ 1.497.950,66

FLUJO DE CAJA SEMANAL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ACTIVIDADES	PROGRAMADO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	SEMANA 17	SEMANA 18	SEMANA 19	SEMANA 20	SEMANA 21	SEMANA 22	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENDIDO DE RED PARA MT DE PARA AEREA EN CABLE ASILADO DE ALUMINIO ECOLOGICO - No. 1/0 AWG.	$ 55.591.000,00																					$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00	$ 9.265.175,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RED MEDIA MT EN POSTE DE 12m A POSTE DE 9 m	$ 5.592.420,00																					$ 934.771,33	$ 934.771,33	$ 934.771,33	$ 934.771,33	$ 934.771,33	$ 934.771,33	$ 934.771,33
INSTALACION INCLUYENTE DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA SECCIONADOR TRIFASICO 3 X 13.2 KV.	$ 2.053.785,00																					$ 342.297,00	$ 342.297,00	$ 342.297,00	$ 342.297,00	$ 342.297,00	$ 342.297,00	$ 342.297,00
RED DE BAJA TENSION (3X#1/0 + N																												
DOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES DE BAJA TENSION.	$ 1.266.455,00																					$ 211.075,83	$ 211.075,83	$ 211.075,83	$ 211.075,83	$ 211.075,83	$ 211.075,83	$ 211.075,83
SUMINISTRO, FOTACION E HINCADO DE POSTE EN CONCRETO DE 9 M – 510 KGF.	$ 35.072.730,00																					$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00	$ 5.845.455,00
SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CIMENTACION CICLOPEA CON CONCRETO DE 3000 PSI A POSTE EN CONCRETO DE 9 M – 510 KGF.	$ 6.302.640,00																					$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34	$ 1.050.440,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ARMADO EN SUSPENSION + ANCLAJE + FINAL DE CIRCUITO PARA RED 3X#1/0 AWG	$ 10.066.568,00																					$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34	$ 1.677.761,34
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA DE RED TRIFASICA	$ 1.544.954,00																					$ 256.912,67	$ 256.912,67	$ 256.912,67	$ 256.912,67	$ 256.912,67	$ 256.912,67	$ 256.912,67
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA RETENIDA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	$ 1.455.080,00																					$ 242.513,33	$ 242.513,33	$ 242.513,33	$ 242.513,33	$ 242.513,33	$ 242.513,33	$ 242.513,33
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA PUESTA A TIERRA EN POSTE DE 9 M.	$ 942.054,00																					$ 157.009,17	$ 157.009,17	$ 157.009,17	$ 157.009,17	$ 157.009,17	$ 157.009,17	$ 157.009,17
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA CAJA DE CONEXIONES (SELLADO) + RED TRIFASICA DE ACOMETIDA V.	$ 19.464.768,00																					$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00	$ 3.244.128,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ADECUACION DE SUBESTACION BIFASICA EN POSTE A (1.20X0.20) V. INCLUYE: INSTALACION PUNTOS DE SECCIONADOR, ESTRUCTURA DE PROTECCION, SECCIONADOR, DPS, HERRAJES Y MONTAJE EN LA SUBESTACION.	$ 8.072.466,00																					$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67	$ 1.345.407,67
ALUMBRADO PUBLICO, ALIMENTADORES Y REDES DE BAJA TENSION (3X#1/0																												
SUMINISTRO, RIEGO, ANCLAJE Y TENDIDO DE CABLE CONCENTRICO DE ALUMINIO - (2x6x + – 1x6x, 6 AWG).	$ 2.452.525,00																					$ 415.467,50	$ 415.467,50	$ 415.467,50	$ 415.467,50	$ 415.467,50	$ 415.467,50	$ 415.467,50
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA ENERGIZACION DE MEDIDOR (3X#2/0) T.	$ 2.701.200,00																					$ 458.301,00	$ 458.301,00	$ 458.301,00	$ 458.301,00	$ 458.301,00	$ 458.301,00	$ 458.301,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA REINSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 7.737.700,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67	$ 1.289.616,67
Subtotal general	$ 163.597.597,00																											
PROGRAMADO SEMANAL($)		$ 0,47	$ 0,53	$ 27.529.661	$ 47.266.463	$ 43.756.955	$ 34.237.634	$ 34.237.634	$ 80.113.058	$ 80.113.058	$ 80.113.038	$ 81.510.946	$ 82.059.900	$ 95.529.989	$ 109.874.700	$ 112.707.644	$ 112.399.336	$ 103.251.212	$ 103.251.212	$ 103.251.212	$ 103.251.212	$ 134.964.220	$ 134.964.220	$ 201.520.270	$ 201.520.270	$ 201.520.270	$ 201.520.270	$ 201.520.270
PROGRAMADO SEMANAL(%)		0,00%	0,00%	1,65%	1,81%	1,68%	1,31%	1,31%	3,06%	3,06%	3,06%	3,12%	3,14%	3,65%	4,20%	4,31%	4,30%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	5,16%	5,16%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%
PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL($)		$ 0,47	$ 1,00	$ 27.529.662	$ 74.796.125	$ 118.595.079	$ 152.832.713	$ 187.070.347	$ 267.183.385	$ 347.296.424	$ 427.409.463	$ 508.920.408	$ 591.130.309	$ 686.660.298	$ 796.534.998	$ 909.322.642	$ 1.021.721.978	$ 1.124.973.190	$ 1.228.224.402	$ 1.331.475.613	$ 1.434.726.825	$ 1.569.690.845	$ 1.704.655.065	$ 1.906.175.335	$ 2.107.695.605	$ 2.309.215.875	$ 2.510.736.145	$ 2.712.256.415
PROGRAMADO ACUMULADO SEMANAL(%)		0,00%	0,00%	1,65%	2,86%	4,54%	5,85%	7,16%	10,22%	13,28%	16,35%	19,47%	22,61%	26,27%	30,47%	34,79%	39,09%	43,04%	46,98%	50,94%	54,89%	59,04%	63,00%	69,16%	76,87%	84,58%	92,29%	100,00%

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
R.L. DURLEY DAZA MACEA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA SAS
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ

ANEXO 08

SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE OBRA

Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	Hoja 1 de 1	INFORME No.4
	FECHA PRESENTE ACTA	
	4 / DD	MARZO / MM	2023 / AA

ACTA DE DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO : $ 2.680.932.314,00

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

REPRESENTANTE LEGAL : DURLEY DAZA MACEA

POLIZA

Aseguradora : SEGURO MUNDIAL

Numero : C -100008907 RC-100002734

FECHA INICIO 09 DE AGOSTO DE 2022

TIEMPO 6 MESES

FECHA FINAL 05 DE MAYO DEL 2023

OBRA	X	INTERVENTORIA		PRESTACION DE SERVICIOS	
LEGALIZACION		ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO		ACTUALIZACION SEGÚN REINICIO	
ACTUALIZACION ADICIONAL Y/O MODIFICATORIO	X	RECIBO FINAL			

AMPARO		VIGENCIA DESDE DD	MM	AA	HASTA DD	MM	AA
1. Garantia Unica de Cumplimiento	X	22	FEB	2023	3	NOV	2023
2. Buen manejo y correcta inversion del anticipo y/o pago anticipado							
3. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	X	22	FEB	2023	3	MAYO	2026
4. Estabilidad de obra	X	3	MAYO	2023	4	MAYO	2028
5. Calidad de los estudios y diseños							
6. Responsabilidad Civil	X	7	JUL	2022	3	MAYO	2023
7. Calidad del servicio suministrado							

Contratos Adicionales:

Modificación No.	Póliza No.
1	C-100008907 Anexo 8, RC-100002734 Anexo 7

Firma

Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520233553 CND

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: hcXFoJv5Z2Re9n81S1C4NQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025328	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA N.1 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 22/02/2023	24:00 Horas Del 03/11/2023	268.093.231,40	79.326,22
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 22/02/2023	24:00 Horas Del 03/05/2026	536.186.462,80	158.652,43
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 03/05/2023	24:00 Horas Del 03/05/2028	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	237.978,65
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	237.978,65
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	45.215,94
TOTAL A PAGAR	$	283.194,59

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **09/03/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **09** días del mes **MARZO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: IXdlUPpBJ8J0QMVb2+FCfg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	350025326	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN PRORROGA N.1 AL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	131.506,85
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	131.506,85
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	131.506,85
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	24.986,30
TOTAL A PAGAR	$	156.493,15

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 09/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	350025326	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	09/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	03/05/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

	Hoja 1 de 1	INFORME No.4
	FECHA PRESENTE ACTA	
4	MARZO	2023
DD	MM	AA

ACTA DE DE SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO : $ 2.680.932.314,00

CONTRATISTA : CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA

REPRESENTANTE LEGAL : DURLEY DAZA MACEA

POLIZA

Aseguradora : SEGURO MUNDIAL

Numero : C -100008907 RC-100002734

FECHA INICIO 09 DE AGOSTO DE 2022

TIEMPO 4 MESES

FECHA FINAL 04 DE MARZO DEL 2023

OBRA	X	INTERVENTORIA		PRESTACION DE SERVICIOS	
LEGALIZACION		ACTUALIZACION SEGÚN ACTA DE INICIO		ACTUALIZACION SEGÚN REINICIO	X
ACTUALIZACION ADICIONAL Y/O MODIFICATORIO		RECIBO FINAL			

AMPARO		VIGENCIA DESDE DD	MM	AA	HASTA DD	MM	AA
1. Garantia Unica de Cumplimiento	X	15	FEB	2023	4	SEP	2023
2. Buen manejo y correcta inversion del anticipo y/o pago anticipado							
3. Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones	X	15	FEB	2023	4	MAR	2026
4. Estabilidad de obra	X	4	MAR	2023	4	MAR	2028
5. Calidad de los estudios y diseños							
6. Responsabilidad Civil	X	7	JUL	2022	4	MAR	2023
7. Calidad del servicio suministrado							

Contratos Adicionales:

Modificación No.	Póliza No.

Firma
Nombre: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
Director de Interventoria
Matricula No.: 2520233553 CND

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZQQJ/Ka0KZ3xv0xw6fv3gA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100008907	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	350024836	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	22/02/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	**TELÉFONO**	7826058
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CLL 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE REINICIO NO.1 DE FECHA DEL 15/02/2023 AL CONTRATO
LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 15/02/2023	24:00 Horas Del 04/09/2023	268.093.231,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 15/02/2023	24:00 Horas Del 04/03/2026	536.186.462,80	224.757,61
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 04/03/2023	24:00 Horas Del 04/03/2028	804.279.694,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.608.559.388,40	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	224.757,61
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	224.757,61
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	42.703,95
TOTAL A PAGAR	$	267.461,56

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/02/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CRC-100008907** y endoso, **6** cuyo afianzado es: **CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **22/02/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN REGION CARIBE a los **23** días del mes **FEBRERO** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: G2yQuCw9CJnGjBiDGwyufA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025279	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
ASEGURADO	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA	No. DOC. IDENTIDAD	901.609.836-4
DIRECCIÓN	CRA 2 NO. 31-48 PISO 2	TELÉFONO	7826058
BENEFICIARIO	TERCEROS, AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA SEGUN ACTA DE REINICIO N°1 DE FECHA 15/02/2023
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	0.00	400,000,000.00	400.000.000,00	186.301,37
GASTOS MEDICOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
PATRONAL	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
R.C. CRUZADA	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	0.00	20,000,000.00	20.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 400.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BIEN LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	186.301,37
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	186.301,37
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	35.397,26
TOTAL A PAGAR	$	221.698,63

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/03/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CRC-100002734	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	350025279	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/03/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN REGION CARIBE

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	07/07/2022	24:00 Horas Del	04/03/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.LP- SPM-008-2022, CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA ESTA CONFORMADO POR:
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA C.C.78.696.113 PART:90%
AMIRA CRISTINA PATRANA GONZALEZ C.C.50.911.572 PART:10%
CODIGO: 6708259

ASEGURADOS: MUNICIPIO DE MONTERIA, NIT 800096734-1 Y CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA NIT 901609836-4
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y MUNICIPIO DE MONTERIA NIT 800096734-1

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA NIT
901.609.836-4 , EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE MONTERIA NIT: 800.096.734-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

GASTOS MEDICOS AMPARA UNICAMENTE GASTOS MEDICOS INMEDIATOS Y DE EVENTOS MENORES.
LIMITE EVENTO/PERSONA Y LIMITE EVENTO/VIGENCIA .

R.C. CRUZADA OPERA ÚNICAMENTE ENTRE LOS ASEGURADOS DE LA PÓLIZA, CONSIDERANDOLOS TERCEROS ENTRE SI.

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
GASTOS MEDICOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
R.C. CRUZADA	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

ANEXO 09

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	4	**ENTRE**	9/11/2022 16/02/2023	**Y EL**	22/11/2022 04/03/2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR, ENTRE BARRIOS ALFONZO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	CMA-SPM-007-2022	**CONTRATO No.:**	LP-SPM-008-2022
CONTRATISTA:	ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04)MESES	**PLAZO INICIAL:**	CUATRO (04)MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE AGOSTO DEL 2022	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09 DE AGOSTO DEL 2022
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	23 DE NOVIEMBRE DEL 2023
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1:	22 DE DICIEMBRE DEL 2022		22 DE DICIEMBRE DEL 2022
AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1:	11 DE ENERO DEL 2023		11 DE ENERO DEL 2023
AMPLIACION No.3 A LA SUSPENSION No.1:	31 DE ENERO DEL 2023		31 DE ENERO DEL 2023
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	16 DE FEBRERO DEL 2023	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	16 DE FEBRERO DEL 2023
PRORROGA:	DOS MESES	**PRORROGA:**	DOS MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	03 DE MAYO DEL 2023	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	03 DE MAYO DEL 2023
PLAZO ACTUALIZADO:	SEIS (06)MESES	**PLAZO ACTUALIZADO:**	SEIS (06)MESES
VALOR INICIAL :	$215.493.346,00	**VALOR INICIAL :**	$2.680.932.314,00
VALOR ADICION(ES):	$0,00	**VALOR ADICION(ES):**	$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$215.493.346,00	**VALOR ACTUALIZADO:**	$2.680.932.314,00
VALOR EN TRAMITE A ACTA No.1:	$121.430.500,00	**VALOR EN TRAMITE A ACTA No.2:**	$1.510.335.191,00
VALOR POR PAGAR:	$94.062.846,00	**VALOR POR PAGAR:**	$1.170.597.123,00

2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	8/07/2022	8/05/2023	$21.549.334,60
CALIDAD DEL SERVICIO	7/11/2022	7/11/2027	$21.549.334,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	8/07/2022	7/11/2025	$21.549.334,60

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	22/02/2023	3/11/2023	$268.093.231,40
PRESTACIONES SOCIALES	22/02/2023	3/05/2026	$536.186.462,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	3/05/2023	3/05/2028	$804.279.694,20
RESPONSABILIDAD CIVIL	7/07/2022	3/05/2023	$400.000.000,00

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO


INFORME No.	4	ENTRE	9/11/2022 16/02/2023	Y EL	22/11/2022 04/03/2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR, ENTRE BARRIOS ALFONZO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS				

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1	PAGADO	$ 56.911.793,00	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	PAGADO	$ 708.149.164,00
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2	EN TRAMITE	$ 64.518.707,00	ACTA PARCIAL DE OBRA No.2	EN TRAMITE	$ 802.186.027,00

4. CURVA "S"

MES	SEMANA	EJECUTADO $	PROGRAMADO $
1	1	$ 0,00	$ 0,00
	2	$ 0,00	$ 0,00
	3	$ 4.446.668,80	$ 27.529.662,04
	4	$ 21.530.383,30	$ 74.796.124,63
2	5	$ 45.760.458,74	$ 118.595.079,45
	6	$ 81.686.610,72	$ 152.832.713,16
	7	$ 145.648.624,90	$ 187.070.346,86
	8	$ 187.173.170,28	$ 267.183.385,22
	9	$ 278.610.233,07	$ 347.296.423,57
3	10	$ 378.816.715,59	$ 427.409.461,93
	11	$ 456.979.725,60	$ 508.920.408,32
	12	$ 708.889.575,22	$ 591.130.308,74
	13	$ 718.294.098,14	$ 686.660.297,86
	14	$ 735.975.255,04	$ 796.534.997,91
4	15	$ 760.133.982,08	$ 909.322.642,07
	16	$ 1.021.036.436,05	$ 1.021.721.978,43
	17	$ 1.110.178.718,60	$ 1.124.973.190,12
	18	$ 1.225.008.204,51	$ 1.228.224.401,81
5	19		$ 1.331.475.613,49
	20		$ 1.434.726.825,18
	21		$ 1.537.978.036,86
	22		$ 1.672.942.257,24
6	23		$ 1.807.906.477,61
	24		$ 2.009.426.747,98
	25		$ 2.210.947.018,35
	26		$ 2.412.467.288,72
	27		$ 2.613.987.559,09

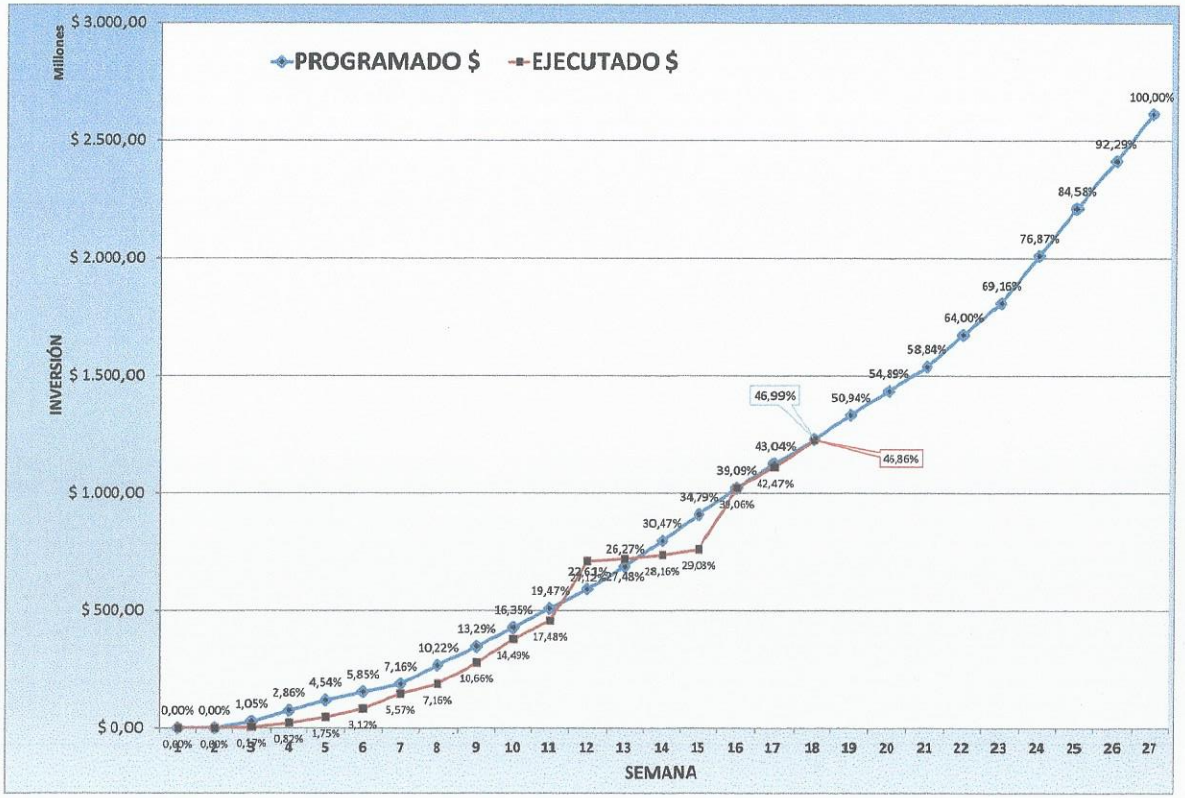

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
INFORME No.	4	**ENTRE**	9/11/2022 16/02/2023	**Y EL**	22/11/2022 04/03/2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR, ENTRE BARRIOS ALFONZO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS				

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A A LA FECHA

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL MES:
•Localización y Replanteo, 100% en todos los tramos
TRAMO 1. PR0+000 – PR0+043, Longitud de intervención proyectada: 43.00m
TRAMO 2. PR0+044 – PR0+433, Longitud de intervención proyectada: 389.00m
TRAMO 3. PR0+446 – PR0+645, Longitud de intervención proyectada: 199.00m
TRAMO 4. PR0+645 – PR0+689, Longitud de intervención proyectada: 44.00m
TRAMO 5. PR0+700 – PR0+799, Longitud de intervención proyectada: 99.00m
Para un total de 774 mts de longitud de vía a intervenir
•Excavaciones:
PR0+000 al PR0+043
PR0+044 al PR0+190
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799
•Instalación de geotextil:
PR0+000 al PR0+043
PR0+044 al PR0+190
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799
•Suministro e Instalación de Rajón:
PR0+000 al PR0+043
PR0+044 al PR0+190
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799
•Suministro e Instalación de Subbase granular:
PR0+000 al PR0+043
PR0+044 al PR0+190
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799

•Suministro e Instalación de concreto MR 32 kg/cm2
PR0+000 al PR0+043
PR0+044 al PR0+190
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799
•Instalación de espacio publico
PR0+000 al PR0+036
PR0+044 al PR0+113
PR0+132 al PR0+180
PR0+446 al PR0+690
PR0+700 al PR0+799
•Reparación de tuberías para suministro de agua y domiciliarias
•Reubicación de domiciliarias
•Reubicación de medidor de gas

INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO					
INFORME No.	4	ENTRE	9/11/2022 16/02/2023	Y EL	22/11/2022 04/03/2023
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA				
LOCALIZACIÓN	CARRERA 8E SUR, ENTRE BARRIOS ALFONZO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS				

Para este peoriodo correspondiente al MES 4, se obtiene una inversión del 46,86% ($1.225.008.205), inferior a la programada en -0,12% (-$ 3.216.197,00).

•Se realiza ajuste a los diseños en cuanto a la variación de los niveles de las intersecciones viales de la carrera 8e sur con las calles 3,4,5 y 6, estos ajustes fueron entregados por el Ingeniero Pablo Castilla Negrete mediante comunicado de fecha 13 de febrero del 2023

•Durante el proceso de construcción de estructura de la vía se observa en sectores excavados, presencia de agua de infiltración que procede de la zona alta de los taludes, los cuales llegan por gravedad a lo largo del sector a intervenir, se hace necesario el manejo de estas con el fin de garantizar la estabilidad de las obras a ser ejecutadas, por tal motivo mediante comité No.17 de fecha 14 de febrero del 2023, el Ing. Pablo Castilla Negrete, diseñador del proyecto recomendó que en aquellos sectores donde se evidencia la situación antes descrita, se debe incrementar el espesor del pedraplén de diseño de 30 cm a 50 cm, garantizándose con ello el manejo de las aguas que pudiesen infiltrarse en estos sectores.

•Se eliminaron las cunetas de las calles 3 sur PR0+120 Y PR0+128, calle 4 sur PR0+185 Y PR0+195, calle 8 sur PR0+643 Y PR0+650, según lo expuesto en comité No.17 de fecha 14 de febrero del 2023.

•Se realiza suspensión al contrato de obra mediante Acta de suspensión por un término de 30 días a partir del día 23 de noviembre del 2023.

•Se realiza ampliación No.1 a la suspensión del contrato de obra de fecha 22 de diciembre del 2022, por un término de 20 días calendario.

•Se realiza ampliación No.2 a la suspensión del contrato de obra de fecha 11 de enero del 2023, por un término de 20 días calendario.

•Se realiza ampliación No.3 a la suspensión del contrato de obra de fecha 31 de enero del 2023, por un término de 15 días calendario.

•Se reinicia el contrato de obra en fecha 16 de febrero del 2023, mediante acta de reinicio de fecha 15 de febrero del 2023, hasta el 4 de marzo del 2023.

•Se prorroga el contrato de obra e interventoría por un término de 60 días calendario, a partir del 5 de marzo del 2023, quedando como nueva fecha de finalización el día 03 de mayo del 2023

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ANEXO 10

REGISTRO FOTOGRAFICO

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

	CMA-SPM-007-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME 4


PERIODO: DEL 09 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y DEL 16 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023

DURANTE



DESCRIPCION: DEMOLICION PISO PR0+000 AL PR0+036

DURANTE

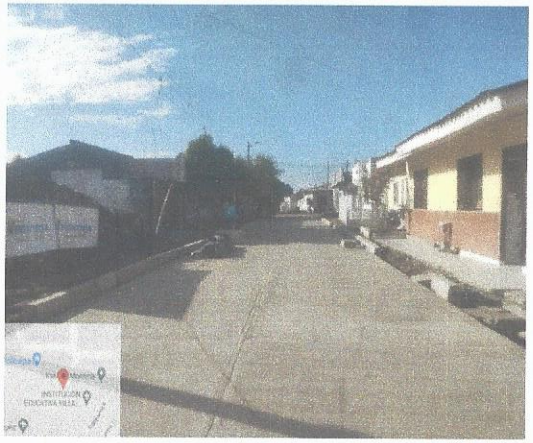

DESCRIPCION: SARDINELES PR0+130 AL PR0+170

FINAL




DESCRIPCION: SARDINELES Y ESPACIO PUBLICO PR0+700 AL PR0+799

DURANTE



DESCRIPCION: SARDINELES PR0+600 AL PR0+530

DURANTE

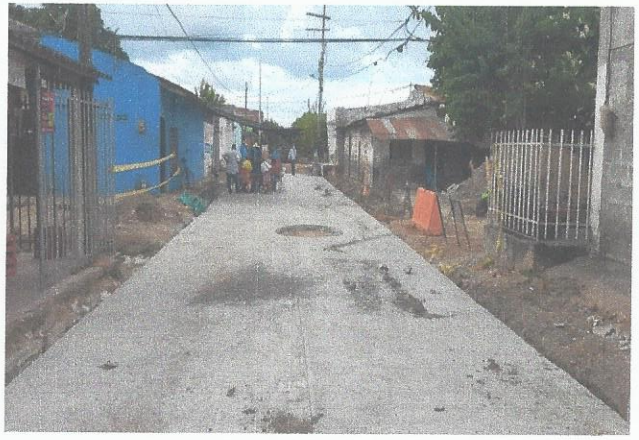

DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+690 A LA PR0+626

FINAL



DESCRIPCION: SUBBASE PR0+650 AL PR0+600

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

CMA-SPM-007-2022

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME 4


PERIODO: DEL 09 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y DEL 16 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023

DURANTE




DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+650 AL PR0+600

DURANTE

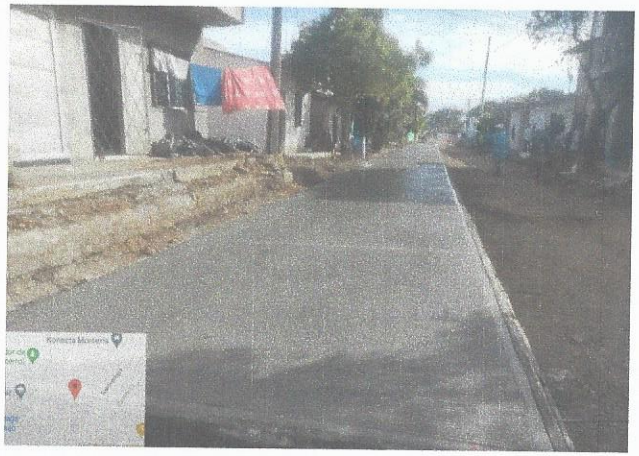

DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+600 A LA PR0+650

FINAL

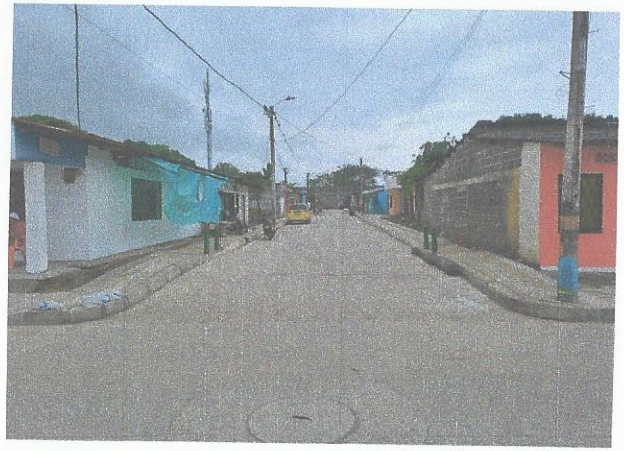

DESCRIPCION: SARDINELES PR0+700 AL PR0+799

DURANTE




DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+600, CALLE 7 SUR

DURANTE



DESCRIPCION: ESPACIO PUBLICO PR0+044 AL PR0+130

FINAL

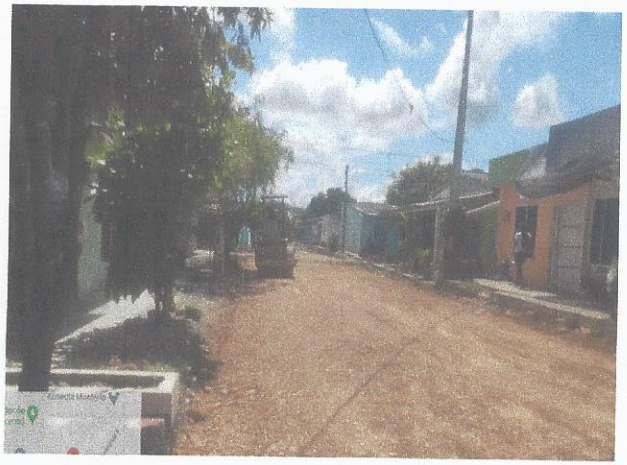

DESCRIPCION: SUBBASE PR0+500 AL PR0+600

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
INGENIERIA S.A.S
NIT. 901.254.479-2

	CMA-SPM-007-2022
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO - INFORME 4


PERIODO: DEL 09 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y DEL 16 DE FEBRERO DEL 2023 AL 04 DE MARZO DEL 2023

DURANTE




DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+540 AL PR0+600

DURANTE

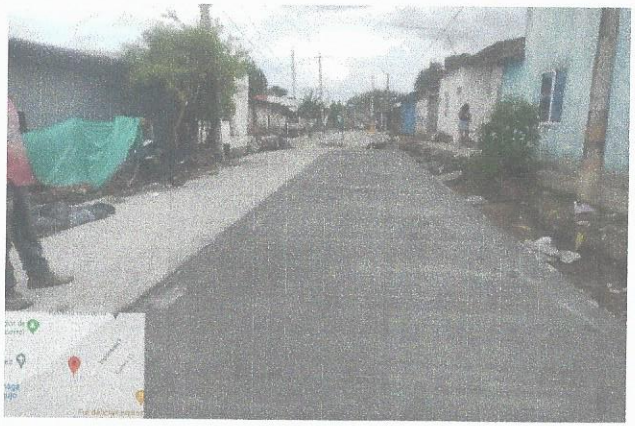

DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+600 A LA PR0+650

FINAL

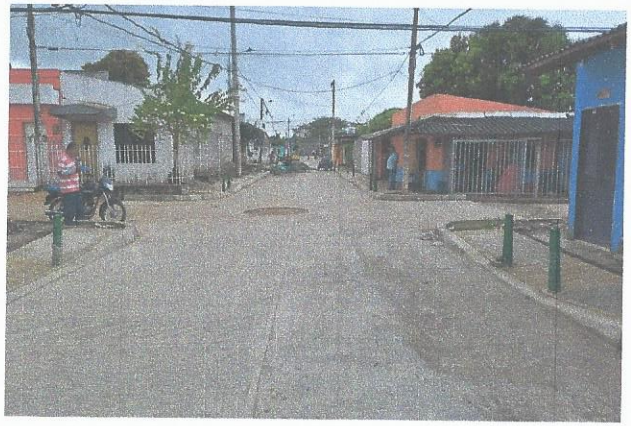

DESCRIPCION: ESPACIO PUBLICO PR0+620 AL PR0+690

DURANTE



DESCRIPCION: ESPACIO PUBLICO PR0+650 AL PR0+690

DURANTE



DESCRIPCION: PAVIMENTO PR0+540 AL PR0+600

FINAL



DESCRIPCION: ESPACIO PUBLICO PR0+540 AL PR0+600

ANEXO 11

CORRESPONDENCIA ENVIADA

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS		INFORME No	4
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO	
		jueves, 9 de noviembre de 2023	sábado, 4 de marzo de 2023
		DESDE	HASTA
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
11/11/2022	ESASIM-074-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ - Sercretario de Infraestructura	MONTERÍA	Solicitud de Suspensión contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022-067	VIA EMAIL
15/11/2022	ESASIM-075-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DOCUMENTALES	VIA EMAIL
15/11/2022	ESASIM-076-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ - Sercretario de Infraestructura	MONTERÍA	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No.13	VIA EMAIL
18/11/2022	ESASIM-077-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	VIA EMAIL
22/11/2022	ESASIM-078-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ - Sercretario de Infraestructura	MONTERÍA	SOLICITUD DE SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)	VIA EMAIL
23/11/2022	ESASIM-079-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTOS DE AFILIACIÓN AL PERSONAL EN OBRA	VIA EMAIL
23/11/2022	ESASIM-080-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ - Sercretario de Infraestructura	MONTERÍA	INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA No.14-15	VIA EMAIL
24/11/2022	ESASIM-081-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTOS AMBIENTALES	VIA EMAIL
24/11/2022	ESASIM-082-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	TRAMITES PARA DEFINICION DE SITIOS PARA COMPENSACION FORESTAL	VIA EMAIL
3/12/2022	ESASIM-083-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA - Alcalde de Montería €	MONTERÍA	Solicitud de Ampliación a la Suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022	VIA EMAIL
14/12/2022	ESASIM-084-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	ALCADÍA DE MONTERÍA	Calle 27 3-16 Piso 3 . Montería - Córdoba	MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ - Sercretario de Infraestructura	MONTERÍA	Solicitud de Ampliación a la Suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022	VIA EMAIL
22/01/2023	ESASIM-085-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL	VIA EMAIL
1/02/2023	ESASIM-087-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+700 AL PR0+799	VIA EMAIL
2/02/2023	ESASIM-088-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	PETICION DE PROPIETARIO DE VIVIENDA	VIA EMAIL

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE	INFORME No	4
		PERIODO DEL PRESENTE REGISTRO	
		jueves, 9 de noviembre de 2023	sábado, 4 de marzo de 2023
		DESDE	HASTA
		CONTRATO DE OBRA No.LP-SPM-008-2022	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.CMA-SPM-007-2022

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA D/M/A	CODIGO CONSEC.	REMITE	DESTINO					OBSERVAC.
		FUNCIONARIO / PROFESIONAL	EMPRESA	DIRECCION	FUNCIONARIO / PROFESIONAL	CIUDAD	ASUNTO	
3/02/2023	ESASIM-089-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+000 AL PR0+120	VIA EMAIL
7/02/2023	ESASIM-090-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	Respuesta a su comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha febrero 06 del 2023.	VIA EMAIL
7/02/2023	ESASIM-091-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	RESPUESTA COMUNICADO LP-SPM-008-2022- 092	VIA EMAIL
8/02/2023	ESASIM-092-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	Respuesta a Solicitud Ing. Mario Torres	VIA EMAIL
20/02/2023	ESASIM-093-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	CAMBIO DE INSPECTOR DE OBRA	VIA EMAIL
23/02/2023	ESASIM-094-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	REQUERIMIENTO TÉCNICOS	VIA EMAIL
2/01/2023	ESASIM-095-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3.	VIA EMAIL
1/01/2023	ESASIM-096-2022	ING. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ - INTERVENTORIA	CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA	Carrera 2 # 31-48 - E-mail: consorciopavimientosmonteria@gmail.com, Montería - Córdoba	DURLEY DAZA MACEA - Representante Legal	MONTERÍA	SOLICITUD DE PLAN DE INTERVENCIÓN	VIA EMAIL

VBO - Interventor

Contratista de Interventoria: ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS	Contratista de obra: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERÍA
Contrato No: CMA-SPM-007-2022	Contrato No. LP-SPM-008-2022
Objeto: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ Y LOS ARAUJOSEN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-096-2022 - SOLICITUD DE PLAN DE INTERVENCION

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 1 de marzo de 2023, 8:01
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE PLAN DE INTERVENCIÓN

ESASIM-096-2022 SOLICITUD DE PLAN DE INTERVENCION.pdf
85K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, Marzo 01 de 2022

COMUNICADO: ESASIM-096-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
JUAN IGNACIO PUPO GARCIA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: SOLICITUD DE PLAN DE INTERVENCION

Cordial saludo,

Por medio del presente escrito la firma interventora se permite informar lo siguiente:

1. Sitios intervenidos a la fecha:
   - Calle 2 Sur, A nivel de pavimento y espacio publico
   - Cra 8E Sur entre Calle 2 Sur y Calle 3 Sur, A nivel de pavimento, espacio público en construcción costado derecho (Casas invadiendo)
   - Cra 8E Sur entre Calle 3 Sur y Calle 4 Sur, A nivel de pavimento, espacio público en construcción
   - Cra 8E Sur entre Calle 6C Sur y Calle 6E Sur, A nivel de pavimento, espacio público en construcción
   - Cra 8E Sur entre Calle 6E Sur y Calle 7 Sur, A nivel de pavimento, espacio público en construcción
   - Cra 8E Sur entre Calle 7 Sur y Calle 8 Sur, A nivel de pavimento, espacio público con detalles
   - Cra 8E Sur entre Calle 8 Sur y Calle 9 Sur, A nivel de pavimento, espacio público con detalles
   - Cra 8E Sur entre Calle 9 Sur y Abscisa PR0+799, A nivel de pavimento, espacio público con detalles

2. Sitios por intervenir:
3. Cra 8E Sur entre Calle 4 Sur y Calle 5 Sur
4. Cra 8E Sur entre Calle 5 Sur y Calle 6 Sur
5. Cra 8E Sur entre Calle 6 Sur y Calle 6C Sur

Teniendo en cuenta la anterior información solicitamos a la firma contratista:

Presentar plan de intervención para las tres cuadras pendientes, donde se debe detallar recursos a ser utilizados (Equipos, personal) para cada uno de ellos, fechas de inicio y finalización de cada actividad a desarrollar, a fin de poder dar cumplimiento al programa de inversión dentro del plazo contractual.

Lo anteriormente requerido deberá ser presentado a más tardar en fecha 3 de marzo de 2023

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
DIRECTORA INTERVENTORIA
ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ARCHIVO
ANEXO: SIN ANEXOS
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

INFORME MENSUAL No.3

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de marzo de 2023, 18:08
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

INFORME MENSUAL No.3 INTERVENTORIA.pdf

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.3.

ESASIM-095-2022 INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.3.pdf
76K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Bucaramanga, Febrero 24 de 2023

COMUNICADO: ESASIM-095-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: DR. MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.3.

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente me permito remitir lo siguiente:

1. Informe Mensual No.3. Periodo 09 de octubre al 08 de noviembre de 2022

Lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-094-2022 - REQUERIMIENTO TÉCNICOS

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 23 de febrero de 2023, 8:41
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, jipupo@hotmail.com
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>, Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS

ESASIM-094-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
3789K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, Febrero 23 de 2023

COMUNICADO ESASIM-094-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS

En visita de obra realizada el día 21 de febrero de 2023, la firma interventora evidenció:


1. Se debe hacer retiro de material producto de demoliciones de andenes costado derecho entre el PR0+044 al PR0+130






TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776


2. Se debe hacer retiro de escombro entre PR0+130 AL PR0+180

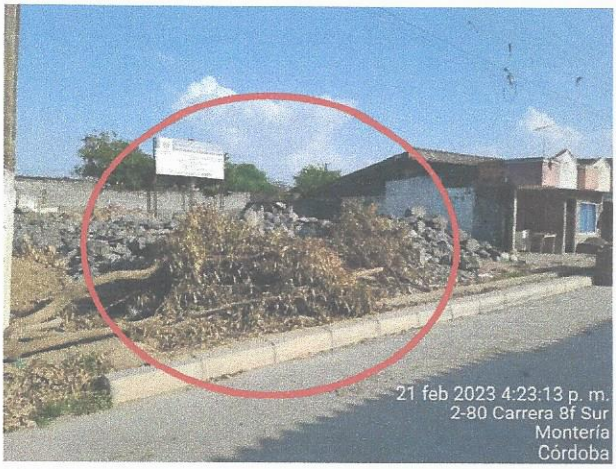



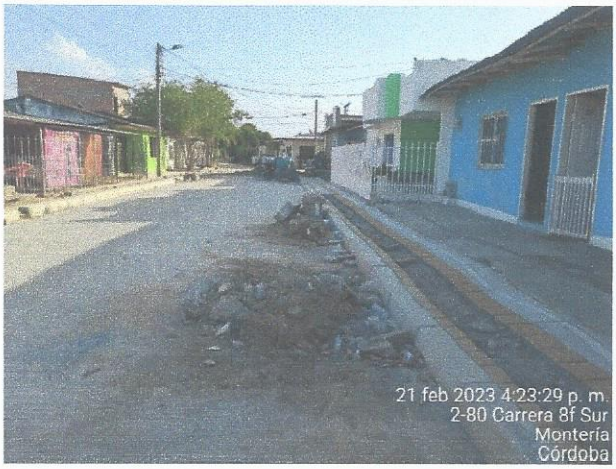

3. Se debe hacer retiro de escombros en:
   PR0+445 Derecho

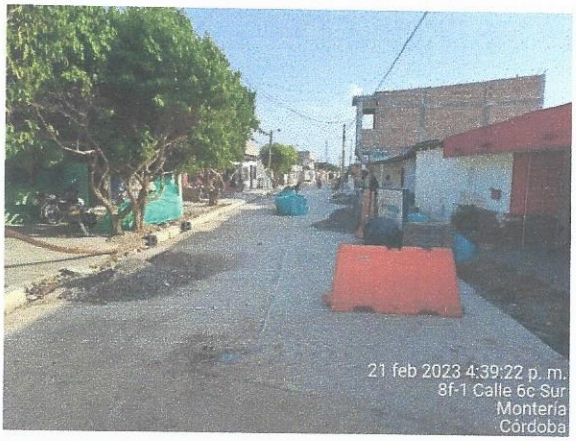




PR0+470 Izquierdo





4. Se debe subida de bordillos de 16 cm a 20 cm por encima de la rasante del pavimento costado izquierdo, casa Begambre

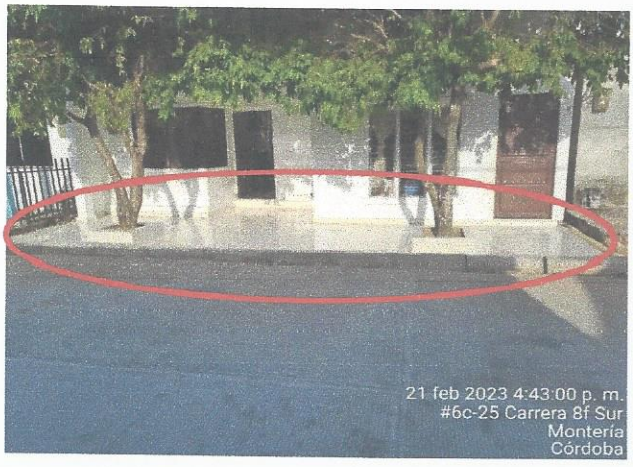

5. Sello entre sardineles PR0++520 derecho e izquierdo





6. Construcción tapa Manjol PR0+470



7. Pañete en esquina calle 7




8. Sello de losetas y resane de piso en concreto PR0+520 derecho



9. Arreglar acabo de placa de concreto por no protección en lluvia PR0+530 derecho



10. Arreglo concreto anden vivienda

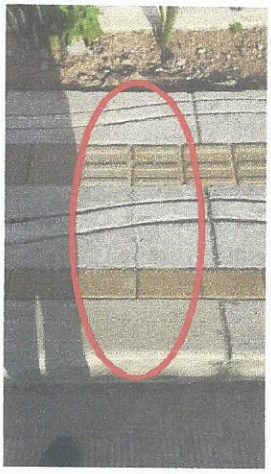



11. Arreglo concreto anden vivienda PR0+540 Izquierdo





12. Sello de losetas entre calles 7 y 8 Sur




13. Tubo de salida de aguas lluvias de la vivienda tapada, propietario de vivienda pide retiro de material PR0+550



14. Remoción de escombros PR0+550 derecho y sello de losetas




15. Arreglo concreto de anden

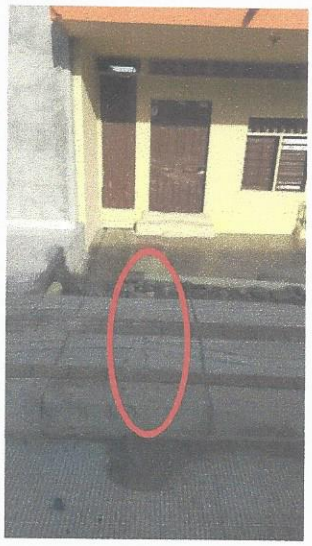



16. Demolición y construcción de bordillo fundido en sitio PR0+550



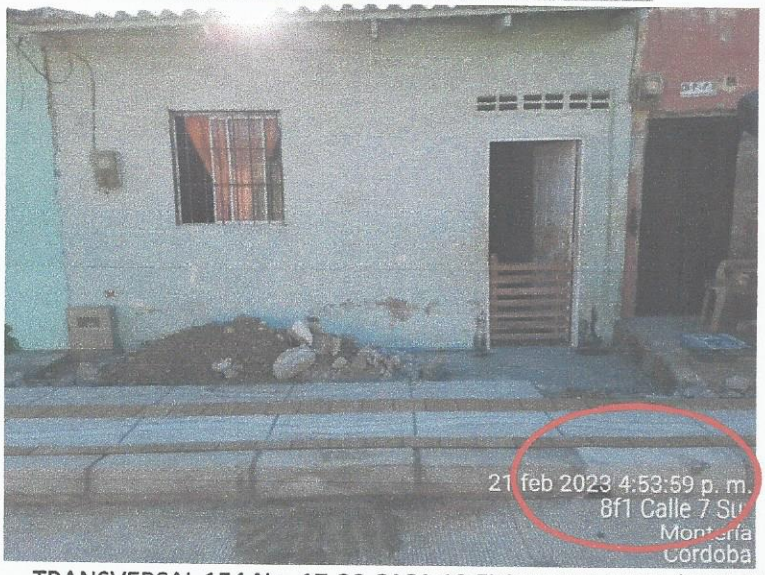

17. Sello entre pavimento y bordillo, arreglo de losetas y anden en concreto







18. Señalización de cunetas construidas y su finalización, construcción de tapa manjol y remoción de escombros






19. Limpieza de pavimento PR0+590



20. Cambio de bordillo PR0+609



21. Resane anden y sello de losas

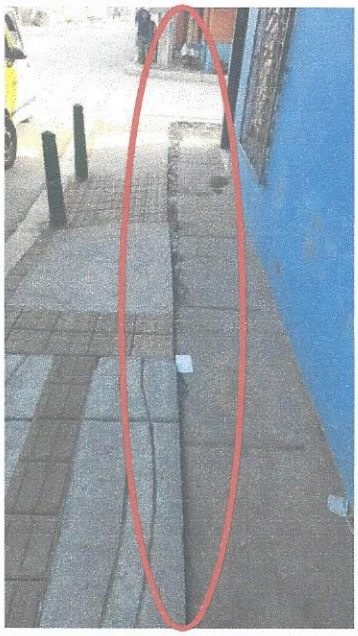

22. Demolición de bordillo fundido en sitio y construcción nuevamente PR0+615



23. Demolición, construcción de andenes y reubicación de medidor de gas esquina calle 8 Sur izquierda



24. Cambio de todas las losetas, decoloradas, mal acabado esquina calle 8 Sur derecha



25. Se debe dar acabado a todos los tubos de salidas de aguas lluvias de las viviendas



26. Arreglo de concreto para andenes calle 8 sur, PR0+650






27. Arreglo de acabado de concreto de las señales de tránsito, hacer en forma cuadrada el corte para la cimentación y darle el mismo acabado del concreto del anden como se indica en el manual de señalización 2015




Imagen 12. Cimentación de pedestal a terreno.

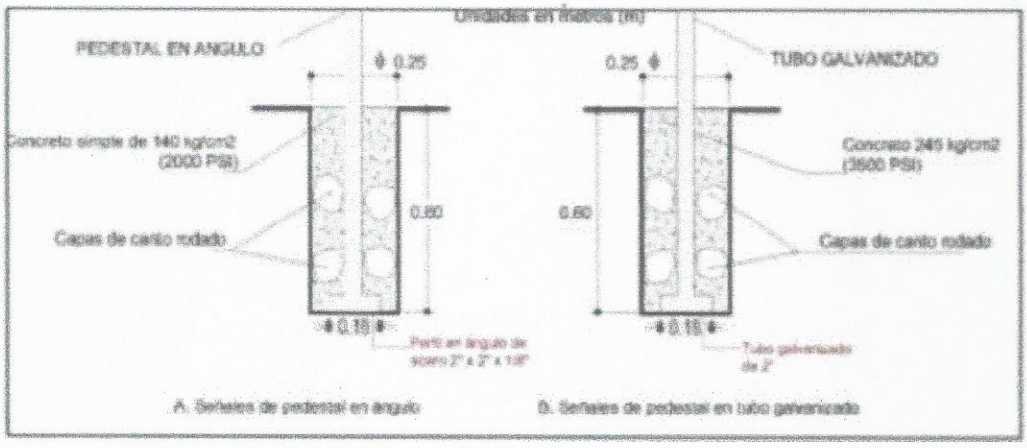

28. Arreglar acabado de rampa



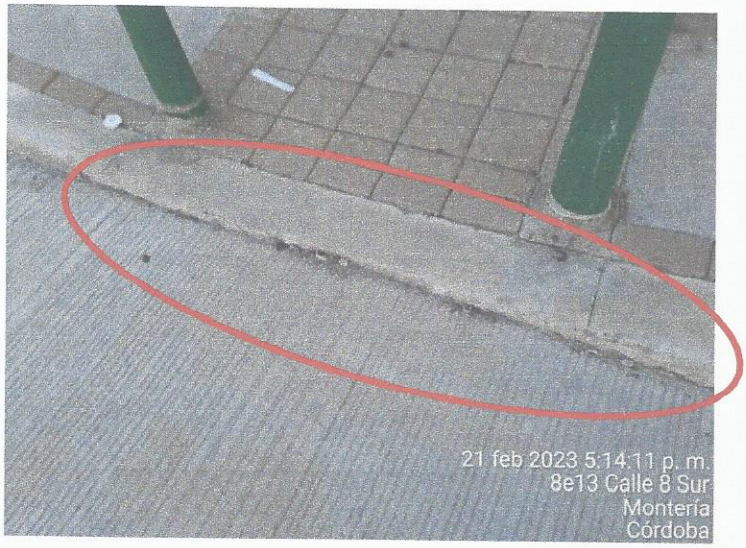

Por lo anteriormente mencionado, la firma interventora solicita de manera inmediata a la firma contratista, subsanar los pendientes solicitados para poder ser recibidos y hacer parte de pago del acta de obra.

Atentamente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO, ALCALDIA
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-093-2022 - CAMBIO DE INSPECTOR DE OBRA

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 20 de febrero de 2023, 9:02
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: CAMBIO DE INSPECTOR DE OBRA

2 adjuntos

ESASIM-093-2022 CAMBIO DE INSPECTOR DE OBRA.pdf
113K

12.Vida Roger Atencia Ing. Civi.pdf
4175K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, febrero 20 de 2022

COMUNICADO ESASIM-093-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: CAMBIO DE INSPECTOR DE OBRA

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remite hoja de vida de profesional ambiental por parte de la firma contratista para cambio de residente ambiental, anexo a la presente se describe la evaluación a esta por parte de la interventoría de acuerdo con el Anexo Técnico De Obra No.01

CARGO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO	CEDULA	% DEDICACIÓN
INSPECTOR DE OBRA	MATEO DE JESÚS SEBA FERNÁNDEZ	APROBADO INICIAL	1.067.947.461	100%
INSPECTOR DE OBRA	ROGER JOSE ATENCIA GARCIA	APROBADO CAMBIO	1.067.958.138	100%

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
4	Inspector de Obra ROGER JOSE ATENCIA GARCIA 100%	**SI**	**SI**	**SI**	N/A	**SI**	N/A	**SI**	**CUMPLE**

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-088-2022 - PETICION DE PROPIETARIO DE VIVIENDA

3 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 2 de febrero de 2023, 17:22
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: PETICIÓN DE PROPIETARIO DE VIVIENDA

3 adjuntos

- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 092. Peticion de Instalacion de reja metalica.pdf** 324K
- **202302010928.pdf** 597K
- **ESASIM-088-2022 PETICION DE PROPIETARIO DE VIVIENDA.pdf** 75K

Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co> 7 de febrero de 2023, 9:35
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Buenos dias Ing Elsa
En atención a la solicitud del peticionario, por favor verificarla, atenderla y tramitar una respuesta a la solicitud, de acuerdo con las condiciones contractuales del proyecto
Saludos
[El texto citado está oculto]

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 8 de febrero de 2023, 11:41
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Respuesta a Solicitud Ing. Mario Torres
[El texto citado está oculto]

- **ESASIM-092-2022 RESPUESTA PETICION MARIANO BEGAMBRE .pdf** 75K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, febrero 08 de 2023

COMUNICADO: ESASIM-092-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: ING. MARIO TORRES
Apoyo a la supervisión

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: Respuesta a Solicitud Ing. Mario Torres

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado enviado por la firma contratista, nos permitimos recomendar No acceder a la petición del señor MARIANO BEGAMBRE TORRES, toda vez que los recursos son del estado para inversión pública mas no en predios privados. Las rejas de la vivienda del señor, de acuerdo con el diseño del pavimento y espacio público, invaden el espacio público y no se cuentan con recursos para esta actividad, como lo es la instalación de rejas en las viviendas.

De igual manera solicitamos a la entidad contratante revise el tema en particular, toda vez que el propietario de vivienda presenta una condición de salud y nos conceptúe al respecto.

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-091-2022 - RESPUESTA COMUNICADO LP-SPM-008-2022- 092

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 7 de febrero de 2023, 18:24
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO LP-SPM-008-2022- 092

3 adjuntos

- **ESASIM-091-2022 RESPUESTA PETICION MARIANO BEGAMBRE .pdf** 74K
- **RADICADO LP-SPM-008-2022 - 092. Peticion de Instalacion de reja metalica (1).pdf** 324K
- **202302010928 (1).pdf** 597K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, febrero 07 de 2023

COMUNICADO: ESASIM-091-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: RESPUESTA COMUNICADO LP-SPM-008-2022- 092

Cordial Saludo;

Dando alcance al comunicado enviado por la firma contratista, nos permitimos informar que no se puede acceder a la petición realizada por el señor MARIANO BEGAMBRE TORRES, toda vez que no se cuenta con recursos para esa actividad, como lo es la instalación de rejas en las viviendas donde el diseño del pavimento indica que está invadiendo espacio público.

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-090-2022 - Respuesta a su comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha febrero 06 del 2023.

2 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 7 de febrero de 2023, 17:47
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
Asunto: Respuesta a su comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha febrero 06 del 2023.

ESASIM-090-2022 RESPUESTA COMUNICADO LP-SPM-008-2022.pdf
254K

CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com> 8 de febrero de 2023, 11:59
Para: ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Hola buenos dias. teniendo en cuenta lo comentado esta mañana acerca de la duda, si la resolución forestal al aprovechamiento a la tala de árboles está en firme; sin que aún esté cancelada ante la corporación cvs. gracias, quedo atento.
[El texto citado está oculto]

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, Febrero 07de 2023

COMUNICADO ESASIM-090-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Respuesta a su comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha febrero 06 del 2023.

Cordial saludo,

Damos alcance a su comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha del 06 de febrero de 2023. En el cual textualmente expresan lo siguiente *"El presente es para realizar la reiteración del RADICADO LP-SPM-008-2022 – 028 "numeral 9" del 1 de septiembre de 2022, RADICADO LP-SPM-008-2022 – 044 del 8 de octubre de 2022. Donde se solicita solución con respecto a la falta de la resolución forestal por parte la CVS, para el aprovechamiento en la tala de los árboles que están dentro del proyecto; Cabe resaltar que esta certificación debe ser diligenciada y pagada por el ente contratante "Alcaldía de montería".*

De igual manera a lo expresado en los comunicados relacionados a continuación:

LP-SPM-008-2022 – 028, con fecha del 01 de septiembre del 2022, en el cual textualmente expresan lo siguiente, "*Con respecto a los árboles que quedaron expuestos al borde de la excavación, cabe resaltar que no se logró hacer el aprovechamiento de la tala de estos mismos, por la falta de entrega de la certificación de la CVS que debe ser diligenciada por el ente contrate. Aun así, se está realizando la actividad de lleno con material para la estabilización de la subrasante y así evitar que los árboles queden expuestos y se pueda presentar un accidente*".

LP-SPM-008-2022 – 044, con fecha del 8 de octubre del 2022, en el cual textualmente expresan lo siguiente, "*Mediante el presente se reitera lo antes mencionado en el radicado: LP-SPM-008-2022 – 028 del 1 de septiembre de 2022, con respecto a la falta de la certificación por parte la CVS para el aprovechamiento en la tala de los árboles que están dentro del proyecto; Haciendo que se presente atrasos en algunas actividades. Cabe resaltar que esta certificación debe ser diligenciada por el ente contrate, Alcaldía de montería".*

Así las cosas, la Interventoría no comprende lo expresado en el comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha del 06 de febrero de 2023, en el cual, la firma contratista expresa la falta del permiso de aprovechamiento forestal para la tala de los árboles que hacen parte del corredor intervenido.

Se recuerda a la firma contratista que se cuenta con permiso de aprovechamiento forestal, otorgado por la Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del Sinú y Del San Jorge- CVS, mediante resolución 222 del 19 de octubre del 2022.

Ahora bien, si con el comunicado LP-SPM-008-2022- 095, con fecha del 06 de febrero de 2023, la firma contratista quiso referirse al tema relacionado con la compensación forestal estipulada en la resolución 222 del 19 de octubre del 2022. Se recuerda que mediante comunicado ESASIM-082-2022, con fecha del 24 de noviembre del 2022, la interventoría expresa lo siguiente, *" En desarrollo del contrato de la referencia, el proyecto cuenta con permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, otorgado por la Corporación Autónoma Regional De Los Valles Del*

Sinú y Del San Jorge – CVS, mediante Resolución 222 del 19 de octubre del 2022, permiso otorgado al municipio de Montería como entidad administradora del espacio público, resolución que dentro de sus requerimientos contempla las siguientes medidas".

MEDIDA COMPENSATORIA

Condicionar al municipio de Montería, como entidad administradora del espacio público, representado legalmente por el Doctor CARLOS ORDOSGOITIA SANÌN, que como compensación por la tala de cada árbol se debe establecer diez (10) árboles, por lo tanto, la compensación será de trescientos cincuenta (350) árboles.
El Autorizado en un término NO MAYOR A DOS (02) MESES a partir de la ejecutoria del acto administrativo por el cual se otorga el aprovechamiento forestal deberá enviar para su evaluación y aprobación el Plan de compensación; el cual debe contener como mínimo lo siguiente:
- Enumerar las especies a establecer, los criterios de selección de las mismas y las características de cada una de ellas.
- Plan de establecimiento, manejo de viveros, características de los individuos a establecer, labores pre y pos trasplanté, siembra, productos empleados, protección contra incendios forestales, aislamiento de la plantación etc.
- Plan de mantenimiento, el cual incluirá: visitas técnicas, limpieza, plateo, control de plagas y reposición, índices de mortalidad, protección contra incendios forestales y aislamiento de la plantación. Se deberá garantizar un porcentaje de supervivencia del 95% de la reforestación.
- Si el área a compensar se encontrase en predios que no sean de propiedad de la empresa autorizada se levantarán Actas de acuerdo y compromiso con los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca que las plantaciones deberán poseer un carácter protector.
- Planos a escala 1:5.000 o más detallada, según sea el caso, debidamente georeferenciados delimitando las zonas a reforestar.
- Cronograma de ejecución, donde se detalle las actividades de aislamiento, establecimiento y mantenimiento de la plantación.
- Costos estipulados para el desarrollo de cada una de las actividades a desarrollar durante la implementación del Programa de Compensación.

Nuevamente, se recuerda al contratista que es su responsabilidad en conjunto con la entidad contratante, identificar los sitios para realizar la compensación forestal e informar a la interventoría. Así las cosas, se solicita al contratista que de manera inmediata de inicio a las gestiones requeridas e informe los sitios que se tienen propuestos para realizar dicha compensación, lo anterior con la finalidad de realizar un acompañamiento asertivo por parte de la firma de interventoría.

Atentamente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO, ALCALDIA
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-089-2022 - REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+000 AL PR0+120

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 3 de febrero de 2023, 7:51
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+000 AL PR0+120

ESASIM-089-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
1723K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, Febrero 02 de 2023

COMUNICADO ESASIM-089-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+000 AL PR0+120

En visita de obra realizada el día 02 de febrero de 2023, la firma interventora evidenció:

1. Se debe hacer resane PR0+000 costado derecho y sello de losetas





TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776


2. Remoción de escombros PR0+015 costado derecho



3. Se reubico medidor de gas, pero no se realizó resane de piso



4. Cambio de tabletas toperoles por guías

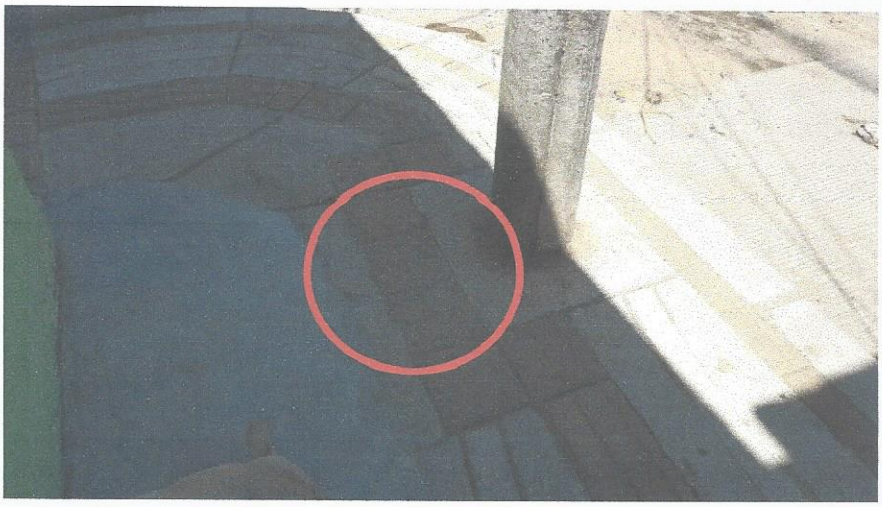

5. Arreglo de juntas entre visual y bordillo, se presenta hundimiento



6. Sello entre guías y visuales en el tramo PR0+000 AL PR0+036



7. Reparación de placa de anden y sello de juntas PR0+044, Limpieza de tabletas con concreto superficial costado izquierdo





8. Sello de juntas PR0+075, hundimiento de tableta visual






9. Fisura en concreto de anden PR0+075 costado izquierdo, se debe hacer reparación




10. Fisura en concreto de anden PR0+080 costado izquierdo, se debe hacer reparación



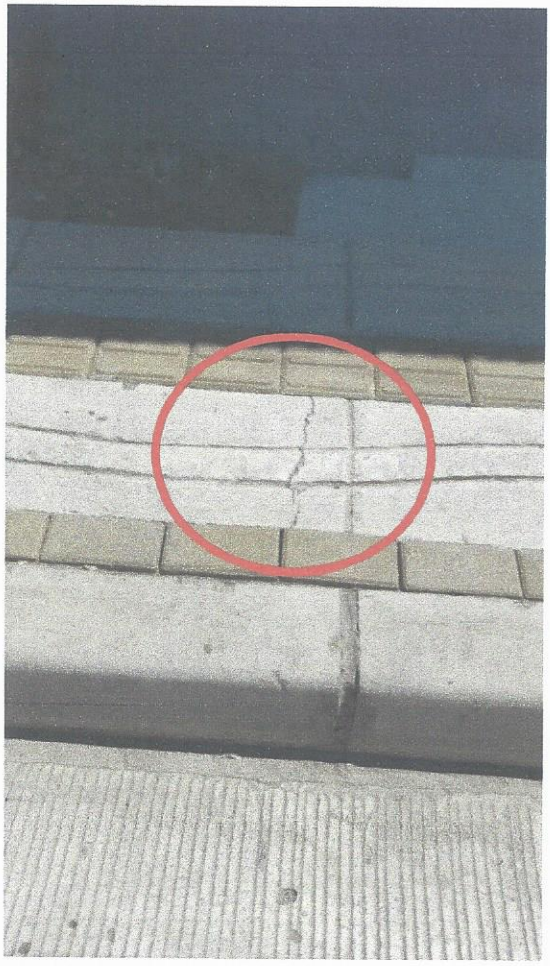

11. Se debe Mejorar acabado del concreto del PR0+075 AL PR0+110 costado izquierdo, se debe hacer con producto el cual se debe presentar ficha técnica indicar como van a realizar el procedimiento para aprobar antes de hacerlo y así mismo realizar remoción de escombros.

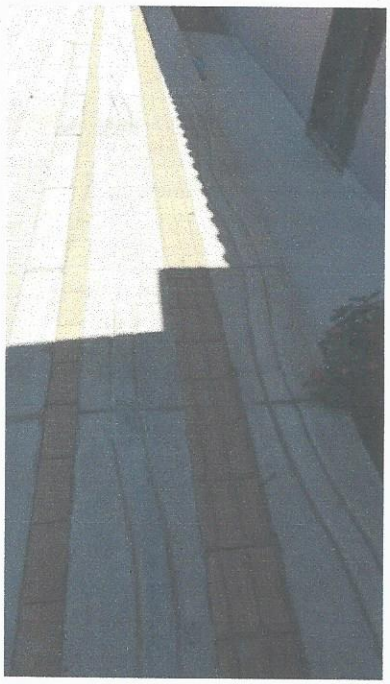
Por lo anteriormente mencionado, la firma interventora solicita de manera inmediata a la firma contratista, empezar a subsanar los pendientes solicitados.

Atentamente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO, ALCALDIA
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, febrero 02 de 2023

COMUNICADO: ESASIM-088-2022

Señores:
MUNICIPIO DE MONTERIA
Attn.: DR. MONICA MARIA SEVERICHE NUÑEZ
Secretario de Infraestructura

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: PETICION DE PROPIETARIO DE VIVIENDA

Cordial Saludo;

Adjunto a la presente me permito remitir RADICADO LP-SPM-008-2022 - 092. Petición de Instalación de reja metálica, de fecha 2 de febrero del 2023, en donde el señor Mario de Jesús Begambre Torres propietario de vivienda ubicado sobre la vía en construcción del contrato referenciado solicita retiro y colocación de rejas de su vivienda al momento de hacer la construcción del espacio publico debido a su condición expuesta en comunicado anexo.

Teniendo en cuenta que no contamos con ítem para esta actividad y no esta dentro de nuestro alcance contractual remitimos a ustedes dicha petición

Agradecemos su atención,

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-087-2022 - REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+700 AL PR0+799

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 1 de febrero de 2023, 19:38
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, Administracion JIPG <ADMINISTRACION@constructorajipg.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+700 AL PR0+799

ESASIM-087-2022 REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
2002K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, Febrero 01 de 2023

COMUNICADO ESASIM-087-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: REQUERIMIENTO TÉCNICOS - TRAMO PR0+700 AL PR0+799


En visita de obra realizada el día 01 de febrero de 2023, la firma interventora evidenció:

1. Material en sitio, se debe hacer retiro de este puesto que la vivienda donde se dono este material no ha hecho uso de este. Abscisa PR0+780 costado derecho




2. Las tapas de manjoles se encuentran fisuradas, no fueron curadas debidamente, se debe corregir.



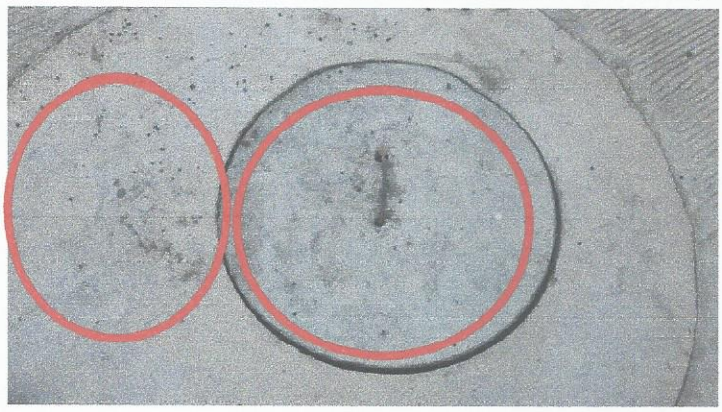

TRANSVERSAL 154 No. 17-20 CASA 10 FLORIDABLANCA (SANTANDER)
e-mail: interventoriamonteria007@gmail.com Cel. 3174359776

3. PR0+784 costado izquierdo se encuentra registro domiciliaria alta por encima de anden, se debe bajar a nivel del anden

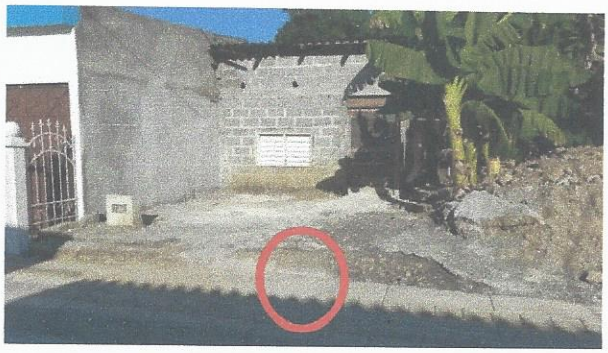


4. Falta medidor de agua PR0+771 derecha, se debe reponer tapa de medidor de agua





5. Arreglo de placas de pavimento con producto para reparación de pavimento

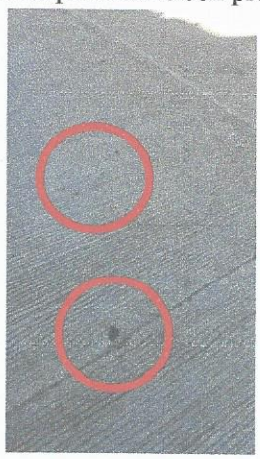

6. Se tiene concreto y dilataciones en domiciliaria con mal acabado, mejorar acabado.






7. En las dilataciones entre el pavimento nuevo y el viejo PR0+700, se tiene placas con mal acabado, dilataciones mal realizadas, se debe arreglar y decir el procedimiento a realizar y el producto a utilizar para esta reparación.





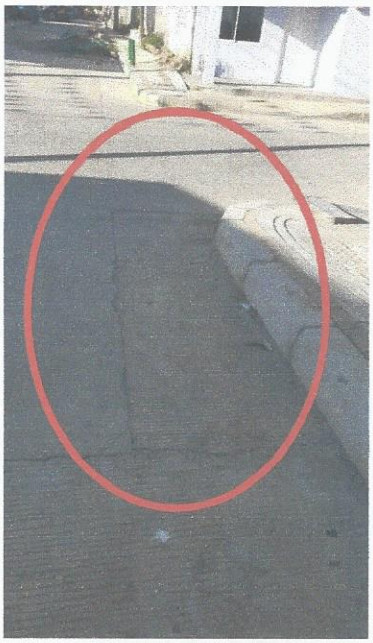

No se entiende por qué la firma contratista no realizó la demolición de esta placa y realizo una sola fundida



8. En el PR0+700 se debe realizar arreglo de anden costado derecho toda vez que se presenta hundimiento, se debe levantar y arreglar, así mismo se debe resanar el frente de la vivienda





9. Se debe Mejorar acabado del concreto del PR0+700 AL PR0+740 costado izquierdo, se debe hacer con producto el cual se debe presentar ficha técnica indicar como van a realizar el procedimiento para aprobar antes de hacerlo y así mismo realizar remoción de escombros.











10. Se debe Mejorar acabado del concreto del PR0+740 AL PR0+760 costado derecho, se debe hacer con producto el cual se debe presentar ficha técnica e indicar como van a realizar el procedimiento para aprobar antes de hacerlo.





ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

11. Se presenta cunetas construidas en concreto en la intersección de la carrera 8E Sur con la calle 7 Sur con malos acabados, torcidas, sin alineación, muros deformes, se deben demoler las cunetas y construirlas de nuevo.













Por lo anteriormente mencionado, la firma interventora solicita de manera inmediata a la firma contratista, empezar a subsanar los pendientes solicitados.

Atentamente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO, ALCALDIA
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

Gmail

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO ESASIM-085-2022 - CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL

1 mensaje

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 22 de enero de 2023, 8:59
Para: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>
Cc: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL

2 adjuntos

ESASIM-085-2022 CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL.pdf
115K

11.H V. Maria Ramirez - Ambiental Aprobada.pdf
5219K

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Montería, Enero 22 de 2022

COMUNICADO ESASIM-085-2022

Señores
CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA
DURLEY DAZA MACEA
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO CMA-SPM-007-2022 - INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

ASUNTO: CAMBIO DE PROFESIONAL AMBIENTAL

Cordial Saludo;

Mediante correo electrónico, se remite hoja de vida de profesional ambiental por parte de la firma contratista para cambio de residente ambiental, anexo a la presente se describe la evaluación a esta por parte de la interventoría de acuerdo con el Anexo Técnico De Obra No.01

CARGO	NOMBRE COMPLETO	ESTADO	CEDULA	% DEDICACIÓN
ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	DIANA PALACIO MOSQUERA	APROBADO INICIAL	1.067.886.516	30%
ING. CIVIL ESPECIALISTA AMBIENTAL	MARIA ESTHER RAMIREZ GUZMAN	APROBADO CAMBIO PROFESIONAL	25.775.982	30%

Cordialmente,

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ
R.L. ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS
C.C.: ARCHIVO
ANEXO: LO ENUNCIADO
ELABORO. E.R.A.

ELSA MARIA RUEDA LANDINEZ INGENIERIA SAS INTERVENTORIA

N	DESCRIPCIONES	CARTA DE COMPROMISO	COPNIA VIGENCIA	COPIA DIPLOMAS	EXPERIENCIA GENERAL		EXPERIENCIA ESPECIFICA		OBSERV
					REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	REQUISITOS	CUMPLE SI/NO	
4	Área Ambiental / Ingeniero ambiental o sanitario y ambiental o ingeniero civil con postgrado en área ambiental 30%	**SI**	**SI**	**SI**	Experiencia mínima de 5 años como profesional la cual se contabilizar a partir de la expedición de la expedición de la tarjeta profesional.	Ing. Civil: 25 Enero de 2007 **SI** Especialista: Ambiental 21 de Agosto de 2009 **SI**	Experiencia como profesional área ambiental de mínimo dos proyectos que tengan por objeto la construcción y/o mejoramiento y/o mantenimiento de pavimento	**SI**	**CUMPLE**

Gmail ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

COMUNICADO: ESASIM-084-2022 - Solicitud de Ampliación a la Suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022

2 mensajes

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 14 de diciembre de 2022, 12:31
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>
Cc: CONSORCIO PAVIMENTOS MONTERIA <consorciopavimentosmonteria@gmail.com>, jipupo@hotmail.com, ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com>

Referencia: CONTRATO LP- SPM-008-2022 - MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN LOS BARRIOS ALFONSO LÓPEZ Y LOS ARAUJOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Asunto: Solicitud de Ampliación a la Suspensión del Contrato de Obra No. LP- SPM-008-2022

2 adjuntos

ESASIM-084-2022 SOLICITUD DE AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1 DEL CONTRATO.pdf
234K

RADICADO LP-SPM-008-2022 - 084. Oficio ampliacion a la suspension.pdf
2152K

ELSA M RUEDA LANDINEZ <interventoriamonteria007@gmail.com> 19 de diciembre de 2022, 16:47
Para: Mario Alejandro Torres Perez <matorresp.infra@alcaldiamonteria.gov.co>, Secretaría De Infraestructura <s.infraestructura@monteria.gov.co>

Ing. Mario

Buenas Tardes

Envio para su revisión acta de ampliación a la suspensión del contrato de obra e interventoría para su revisión
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Ampliacion a la Suspension Obra N°1 LP-SPM-008-2022 - v2 Final.docx
135K

Ampliacion a la Suspension Interventoria N°1 CMA-SPM-007-2022.docx
132K
