
DocuSign Envelope ID: 5C2DEF9A-AB9A-4C49-864D-9CBD9DCB580F

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - LOTE 1.**	**365.78 días**	**lun 9/05/22**	**mar 9/05/23**
2	**DIAGNOSTICOS**	**365.78 días**	**lun 9/05/22**	**mar 9/05/23**
3	Diagnostico de Topografia, Diagnostico de Suelos, Ajuste a la Estructura de Pavimentos, Trazado y Diseño Geometrico, Señalización y Seguridad Vial y Plan de Manejo de Trafico, Diagnostico de Cantidaes de Obras, Analisis de Precios Unitarios y Presupuesto	30 días	lun 9/05/22	mié 8/06/22
4	FIN DE FASE	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22
5	**EJECUCION**	**335.78 días**	**mié 8/06/22**	**mar 9/05/23**
6	INCIO	0 días	mié 8/06/22	mié 8/06/22
7	**TRAMO 3 - CALLE 8 ENTRE AV 3 Y 5**	**175 días**	**mié 8/06/22**	**mié 30/11/22**
33	**TRAMO 4 CALLE 20 AV 1 Y 2**	**140.78 días**	**mié 16/11/22**	**mié 5/04/23**
61	**TRAMO 6 CALLE COMANDO Y COLEGIO SAN MATEO**	**165 días**	**lun 21/11/22**	**vie 5/05/23**
62	INICIO	0 días	sáb 26/11/22	sáb 26/11/22
63	Localizacion y replanteo	40 días	sáb 26/11/22	jue 5/01/23
64	Demolición de pavimento existente	30 días	sáb 26/11/22	lun 26/12/22
65	Corte de concreto	30 días	dom 27/11/22	mar 27/12/22
66	Demolición sardinel	30 días	dom 27/11/22	mar 27/12/22
67	Demolicion de concreto e=0.10 mts	30 días	dom 27/11/22	mar 27/12/22
68	Excavacion mecanica sin clasificar	30 días	jue 1/12/22	sáb 31/12/22
69	Excavacion manual	30 días	jue 1/12/22	sáb 31/12/22
70	Suministro e instalacion de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22
71	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22
72	Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22
73	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	0 días	jue 1/12/22	jue 1/12/22
74	Conformacion y Compactacion de subrasante	20 días	lun 21/11/22	dom 11/12/22
75	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	20 días	mar 22/11/22	lun 12/12/22
76	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	0 días	mar 22/11/22	mar 22/11/22
77	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	50 días	vie 25/11/22	sáb 14/01/23
78	Base estabilizada con cemento 6%	60 días	mié 4/01/23	dom 5/03/23
79	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	60 días	jue 23/02/23	lun 24/04/23
80	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	40 días	jue 23/02/23	mar 4/04/23
81	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores	41 días	sáb 25/03/23	vie 5/05/23
82	<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	60 días	jue 23/02/23	lun 24/04/23
83	Corte de Pavimento	50 días	vie 24/02/23	sáb 15/04/23
84	Sellado de Juntas	50 días	mar 28/02/23	mié 19/04/23
85	Retiro de Escombros	120 días	jue 5/01/23	vie 5/05/23
86	FIN	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23
87	**TRAMO 9 CALLE 0 AV 0**	**47 días**	**lun 20/03/23**	**vie 5/05/23**
88	INICIO	0 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23
89	Localizacion y replanteo	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
90	Demolición de pavimento existente	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
91	Corte de concreto	15 días	jue 23/03/23	jue 6/04/23
92	Demolición sardinel	15 días	jue 23/03/23	jue 6/04/23
93	Demolicion de concreto e=0.10 mts	15 días	jue 23/03/23	jue 6/04/23
94	Excavacion mecanica sin clasificar	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
95	Excavacion manual	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
96	Suministro e instalacion de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
97	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	0 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23
98	Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6	0 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23
99	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	0 días	mié 22/03/23	mié 22/03/23
100	Conformacion y Compactacion de subrasante	10 días	lun 20/03/23	mié 29/03/23
101	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	10 días	mar 21/03/23	jue 30/03/23
102	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	1 día	mar 21/03/23	mar 21/03/23
103	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	15 días	mar 21/03/23	mar 4/04/23
104	Base estabilizada con cemento 6%	15 días	mié 22/03/23	mié 5/04/23
105	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	30 días	mar 4/04/23	mié 3/05/23
106	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	30 días	mar 4/04/23	mié 3/05/23
107	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores	30 días	jue 6/04/23	vie 5/05/23
108	<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	30 días	mar 4/04/23	mié 3/05/23
109	Corte de Pavimento	31 días	mié 5/04/23	vie 5/05/23
110	Sellado de Juntas	31 días	mié 5/04/23	vie 5/05/23
111	Retiro de Escombros	45 días	mié 22/03/23	vie 5/05/23
112	FIN	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23
113	**TRAMO 10 CALLE KENNEDY**	**40 días**	**lun 27/03/23**	**vie 5/05/23**
114	INICIO	0 días	lun 27/03/23	lun 27/03/23
115	Localizacion y replanteo	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
116	Demolición de pavimento existente	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
117	Corte de concreto	10 días	mar 28/03/23	jue 6/04/23
118	Demolición sardinel	10 días	mar 28/03/23	jue 6/04/23
119	Demolicion de concreto e=0.10 mts	10 días	mar 28/03/23	jue 6/04/23
120	Excavacion mecanica sin clasificar	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
121	Excavacion manual	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
122	Suministro e instalacion de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
123	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
124	Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
125	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	10 días	lun 27/03/23	mié 5/04/23
126	Conformacion y Compactacion de subrasante	10 días	mar 4/04/23	jue 13/04/23
127	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	10 días	mié 5/04/23	vie 14/04/23
128	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	0 días	mié 5/04/23	mié 5/04/23
129	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	20 días	mié 5/04/23	lun 24/04/23
130	Base estabilizada con cemento 6%	20 días	jue 6/04/23	mar 25/04/23
131	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	10 días	lun 24/04/23	mié 3/05/23
132	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	10 días	sáb 22/04/23	lun 1/05/23
133	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores	11 días	mar 25/04/23	vie 5/05/23
134	<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	10 días	lun 24/04/23	mié 3/05/23
135	Corte de Pavimento	11 días	mar 25/04/23	vie 5/05/23
136	Sellado de Juntas	11 días	mar 25/04/23	vie 5/05/23
137	Retiro de Escombros	40 días	lun 27/03/23	vie 5/05/23
138	FIN	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23
139	**TRAMO 8 RESERVAS DE SAN LUIS**	**113 días**	**mar 17/01/23**	**mar 9/05/23**
140	INICIO	0 días	mar 17/01/23	mar 17/01/23
141	Localizacion y replanteo	40 días	mar 17/01/23	sáb 25/02/23
142	Demolición de pavimento existente	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
143	Corte de concreto	30 días	mié 18/01/23	jue 16/02/23
144	Demolición sardinel	30 días	mié 18/01/23	jue 16/02/23
145	Demolicion de concreto e=0.10 mts	30 días	mié 18/01/23	jue 16/02/23
146	Excavacion mecanica sin clasificar	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
147	Excavacion manual	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
148	Suministro e instalacion de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
149	Suministro e instalacion de accesorios de 1/2"	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
150	Suministro e instalación de tubería alcantarillado de 6	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
151	Suministro e instalación accesorios de alcantarillado de 6"	30 días	mar 17/01/23	mié 15/02/23
152	Conformacion y Compactacion de subrasante	20 días	mar 14/02/23	dom 5/03/23
153	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	20 días	mié 15/02/23	lun 6/03/23
154	Suministro e Instalacion de sub base granular e=20 cm	0 días	mié 15/02/23	mié 15/02/23
155	Suministro e Instalacion de recebo arenoso	35 días	mié 15/02/23	mar 21/03/23
156	Base estabilizada con cemento 6%	35 días	jue 16/02/23	mié 22/03/23
157	Instalacion de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	40 días	mar 21/03/23	sáb 29/04/23
158	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	0 días	dom 19/03/23	dom 19/03/23
159	Mano de Obra para Sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores	40 días	vie 31/03/23	mar 9/05/23
160	<Nivelacion de camara de inspeccion de alcantarillado (hmax=0.15)	40 días	mar 21/03/23	sáb 29/04/23
161	Corte de Pavimento	36 días	vie 31/03/23	vie 5/05/23
162	Sellado de Juntas	36 días	vie 31/03/23	vie 5/05/23
163	Retiro de Escombros	109 días	mar 17/01/23	vie 5/05/23
164	FIN	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23
165	**ANEXOS**	**331 días**	**mié 8/06/22**	**vie 5/05/23**
166	Componente Ambiental	331 días	mié 8/06/22	vie 5/05/23
167	Componente SST	331 días	mié 8/06/22	vie 5/05/23
168	Componente SIG	331 días	mié 8/06/22	vie 5/05/23
169	FIN DE FASE	0 días	vie 5/05/23	vie 5/05/23

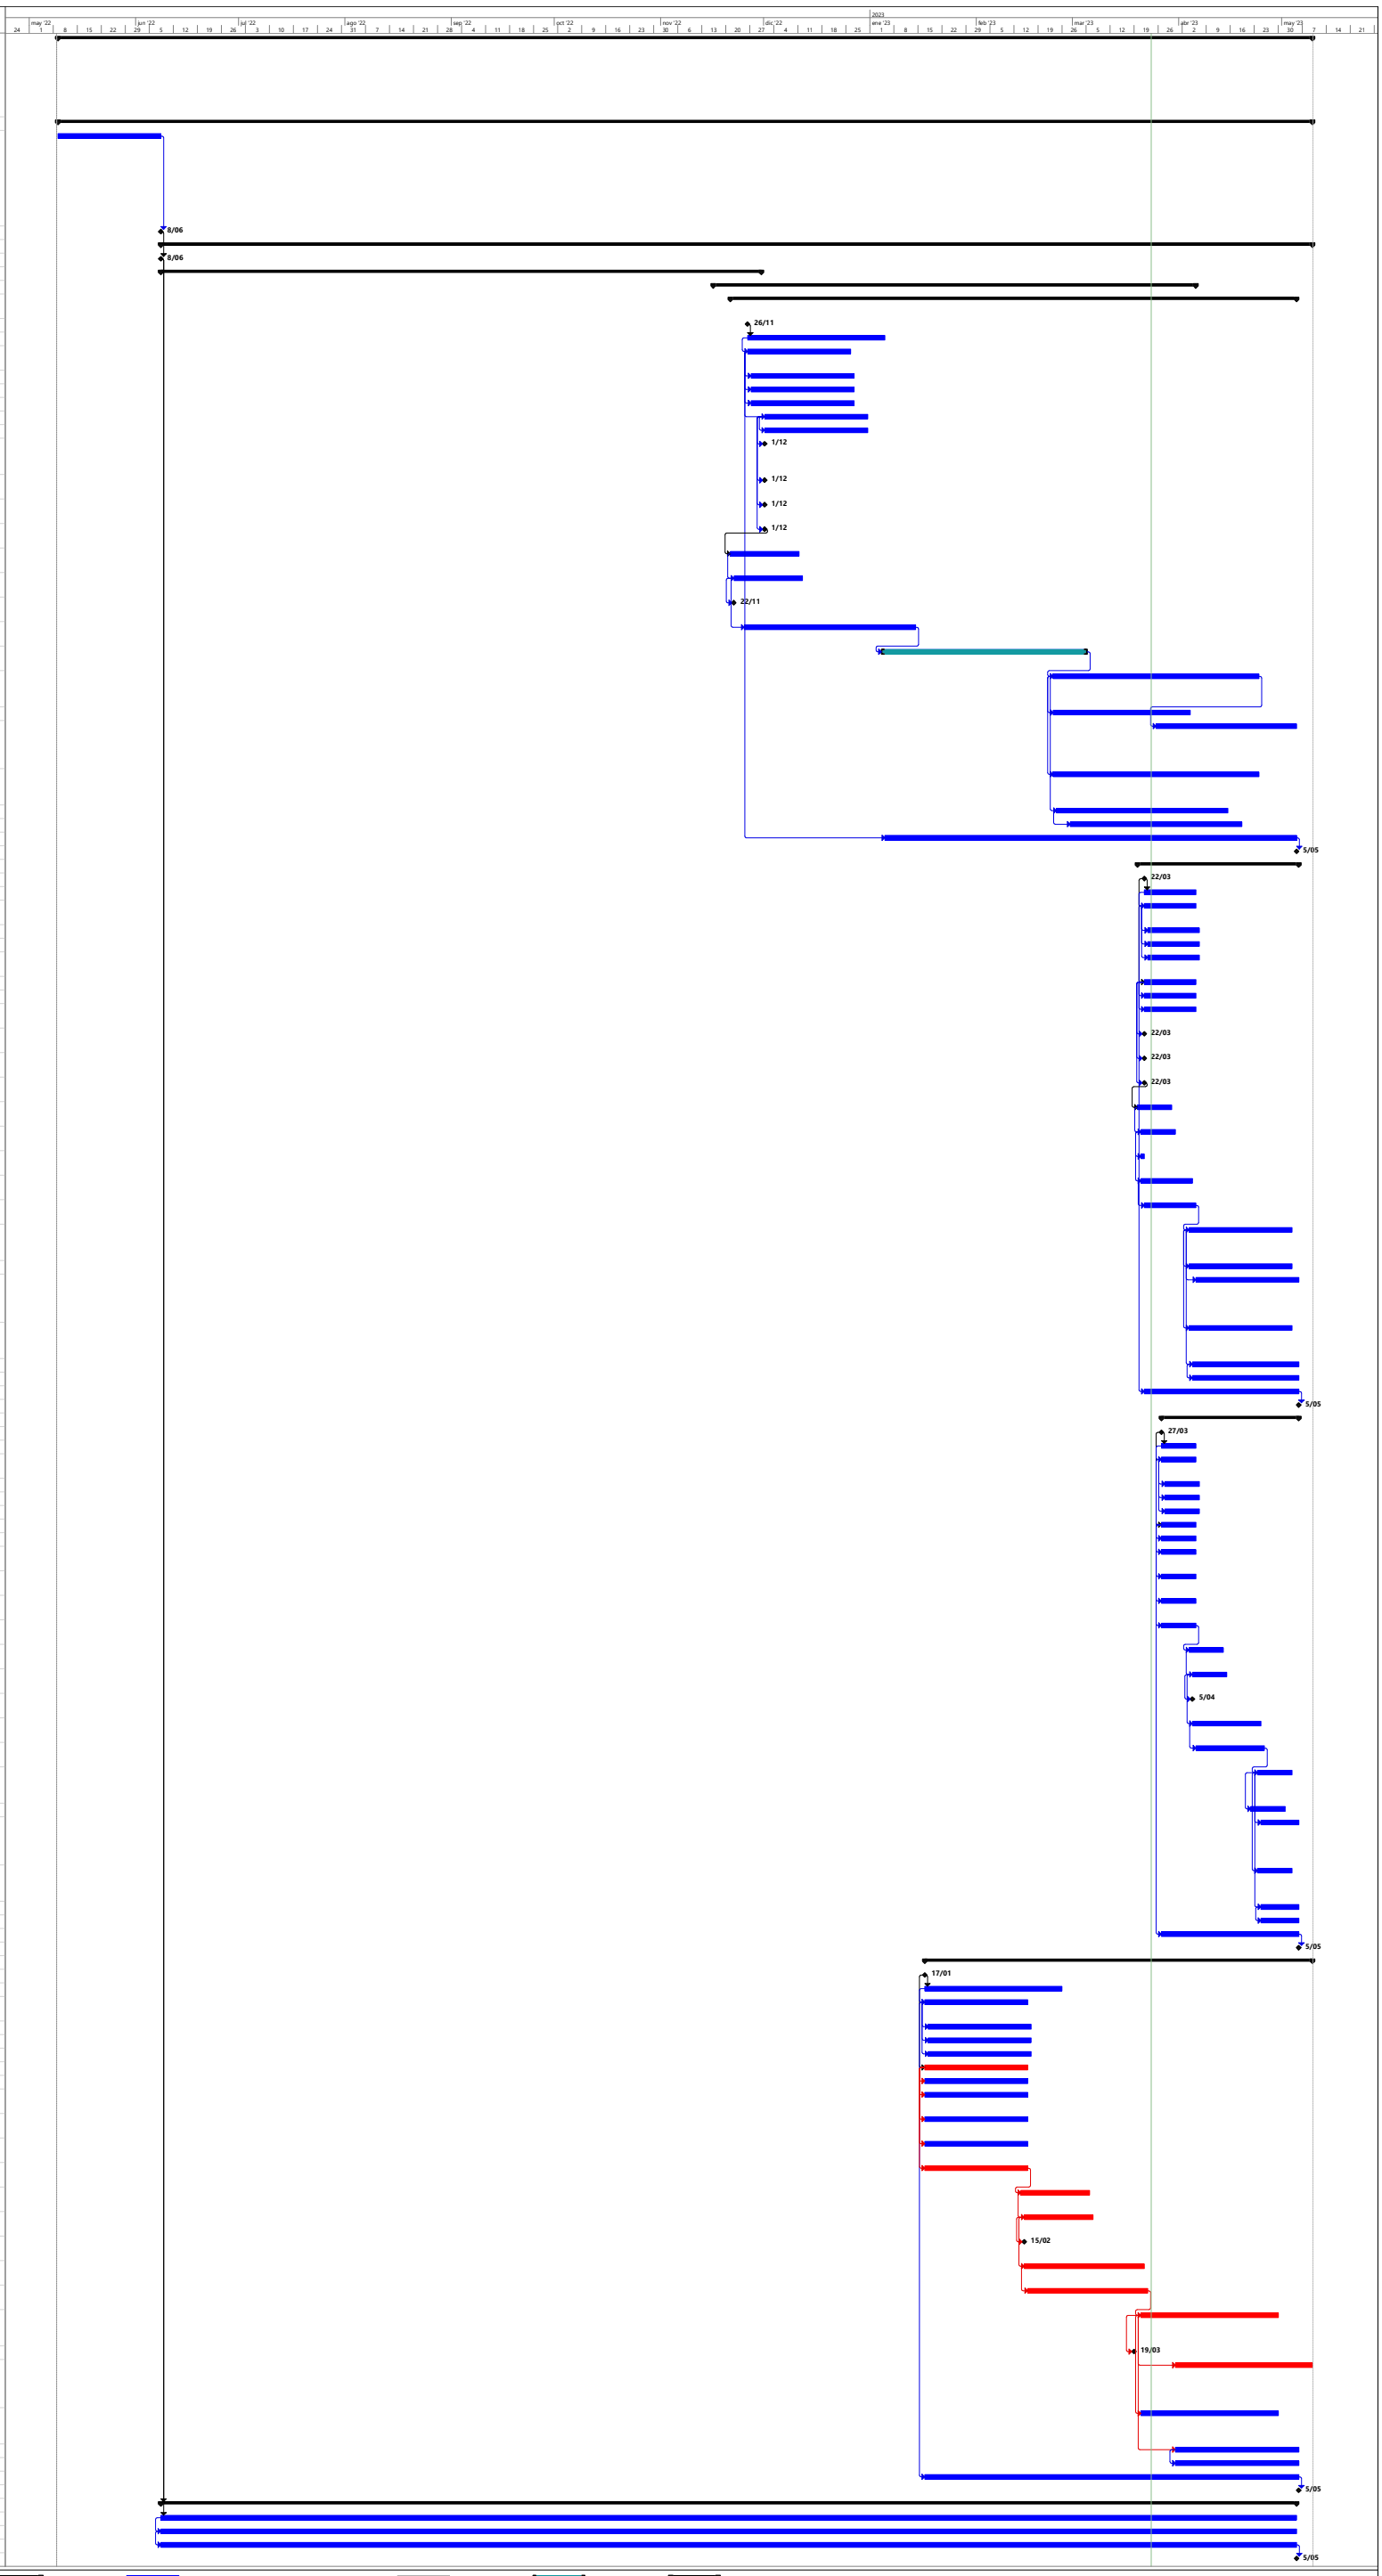

Proyecto: DIAGNOSTICO Y/O E
Fecha: vie 24/03/23

Tarea · Resumen · Tarea resumida · Progreso resumido · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Fecha límite
División · Resumen del proyecto · Tarea crítica resumida · Tareas externas · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Tarea crítica
Hito · Agrupar por síntesis · Hito resumido · Hito externo · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Progreso

DocuSigned by:
SOCING S.A.S.
NIT 900428091-3
