Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022		
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.		
Plazo de Ejecución (meses)	5							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6		
Periodo del Informe:	1	3	2023	al	28	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503		
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO		
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA		
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**			
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER											
Objeto Contractual:											
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.											

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 398,554,472	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 398,554,472	Número CDP	325 IDIGER	Fecha CDP	05 DE AGOSTO DEL 2022	Fuente de Recursos	FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
			Valor RP		Número RP	609 DEL 2022	Fecha RP	27/04/2022 - 27/04/2022		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP			
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4 MESES		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Valor Total	$ 398,554,472							
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**					
		Valor Total	$ 398,554,472							

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio	NA	**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
			Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		Fuente de Recursos	
Cantidad de meses de prórroga 1	1 MES		Valor RP		Número RP		Fecha RP			
		Subtotal	$ 0							
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 398,554,472							
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	5 MESES	**Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique**			**Descripción**					
		Valor Total	$ 398,554,472							

Si tiene mas de dos adiciones y prórrogas inserte las casillas necesarias

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	17 de marzo del 2022	**Valor disminución :**	7

Descripción del motivo de la disminución: *Redistribución de la oferta económica por tiempo de prórroga.*

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL : NA

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	$ 0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 398,554,472	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	5 MESES

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**	NA	**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**	NA	**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

No aplica contratación derivada por ser contrato de interventoría contratado directamente por el IDIGER

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
28 de diciembre del 2022 al 10 de enero del 2023	25 de Enero del 2023	$ 59,783,172	Corresponde al pago del Producto 1 -Recopilación, revisión y análisis de la información existente de cada nodo y cronograma detallado
del 11 de enero del 2023 al 31 de enero del 2023	16 de Febrero del 2023	$ 59,783,172	Corresponde al pago del producto 2 - Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del subsuelo
Del 01 de febrero al 28 de febrero del 2023	Dato pendiente en la carpeta contractual	$ 79,710,894	Correspondiente al pago del producto 3 - correspondiente a los insumos temáticos e implementación de la de exploración del subsuelopara tres nodos del proyecto

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	5							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	1	3	2023	al	28	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									
Objeto Contractual:									
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.									

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 59,783,172	OP: No. 3086 25/01/2023	NA
2	$ 59,783,172	OP: No. 3164 16/02/2023	NA
3	$ 79,710,894	INFORMACIÓN PENDIENTE EN EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	NA
TOTALES	$ 199,277,238		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
25/01/2023	$ 4,931,359	Retefuente Contrato de obra (2%), Reteiva (15%), Estampilla Universidad pedagógica (0.5%), Estampilla para el bienestar del adulto mayor (2%),Estampilla Universidad distrital (1.1%), Reteica 8.66xmil, Estampilla Pro Cultura (0.5)
16/02/2023	$ 9,452,776	Reteiva(15%), Rtefuente honorarios (11%), Estampilla Universidad Pedagógica (0.5%), Estampilla para el bienestar del adulto mayor(2%), Estampilla Universidad distrital (1.1%), Reteica (8.66xmil), Estampilla Pro Cultura (0.5%)
PENDIENTE POR REVISAR EN LA CARPETA CONTRACTUAL	PENDIENTE POR REVISAR EN LA CARPETA CONTRACTUAL	PENDIENTE POR REVISAR EN LA CARPETA CONTRACTUAL
TOTAL	$ 14,384,135	

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100232795** **RCE: NB-100054265**	**10/11/2022**	**10/03/2024**	**10/11/2022**	$ 79,710,895
Cumplimiento - Pago de salarios			**10/11/2022**	**10/03/2026**	**10/11/2022**	$ 39,855,448
Cumplimiento - Calidad del servicio			**10/11/2023**	**10/03/2025**	**10/11/2022**	$ 79,710,895
Responsabilidad civil extra contractual			**10/11/2022**	**10/11/2023**	**10/11/2022**	$ 200,000,000

ACTUALIZACIÓN SEGÚN INICIO DEL CONTRTAO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100232795** **RCE: NB-100054265**	**28/12/2022**	**27/04/2024**	**24/02/2023**	$ 79,710,895
Cumplimiento - Pago de salarios			**28/12/2022**	**27/04/2026**	**24/02/2023**	$ 39,855,448
Cumplimiento - Calidad del servicio			**27/04/2023**	**27/04/2025**	**24/02/2023**	$ 79,710,895
Responsabilidad civil extra contractual			**28/12/2022**	**27/04/2024**	**24/02/2023**	$ 200,000,000

ACTUALIZACIÓN SEGÚN INICIO DEL CONTRTAO

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	**SEGUROS MUNDIAL**	**NB-100232795** **RCE: NB-100054265**	**28/12/2022**	**27/05/2024**	**29/03/2023**	$ 79,710,895
Cumplimiento - Pago de salarios			**28/12/2022**	**27/05/2026**	**29/03/2023**	$ 39,855,448
Cumplimiento - Calidad del servicio			**27/04/2023**	**27/05/2025**	**29/03/2023**	$ 79,710,895
Responsabilidad civil extra contractual			**28/12/2022**	**27/05/2024**	**29/03/2023**	$ 200,000,000

pólizas actualizadas de acuerdo a modificación 1

9. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	x	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:

Riesgo 12 de la Matriz de identificación y distribución de los
riesgos: "Cuando en el sector objeto del estudio y/o diseño se presentan condiciones de seguridad que afectan el desarrollo de las actividades de campo fundamentales para el desarrollo del contrato"

Riesgo 18 de la Matriz de identificación y distribución de los
riesgos: "Retraso en el cumplimiento del cronograma de trabajo por causas externas asociadas a condiciones hidrometeorológicas, que no permitan la ejecución de la totalidad de la captura de información de campo"

Observaciones adicionales:

En consecuencia con la ocurrencia de los riesgos, el 17 de marzo se aprobó la prórroga por 30 días.

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

10 REFERENTE AL SEGUIMIENTO TÉCNICO: Información de seguimiento técnico del contrato, así como análisis respecto del cronograma o avance inicialmente pactado (evidencia de posibles retrasos, vicisitudes, dificultades), (estado % de terminados, en ejecución, pendientes por ejecutar, pagos pendientes y/o en curso etc.).

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME PERIÓDICO DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-65 **Versión: 3** **Página:** 1 de 1 **Vigente Desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	IDIGER 278-2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Tipo de contrato	CONSULTORÍA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	GEODINAMICA INGENIERIA S.A.
Plazo de Ejecución (meses)	5							**Número de Cédula o NIT:**	830.146.665-6
Periodo del Informe:	1	3	2023	al	28	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	MAURICIO HERNAN CAMARGO CHÁVEZ CC.79.334.503
Interventor (si Aplica)	TORRES ING SAS.							**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	NIT. 900.335.343-4 REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	ING. DIANA CAROLINA MORENO MORENO							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	NA
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER (según cláusula del supervisor del contrato/convenio) Si Aplica								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									
Objeto Contractual:									
Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.									

En el mes de febrero el consultor notificó sonbre retrasosn en la ejecución producto de las dificultades en los permisos sociales para la elaboración de la exploración geotécnica ,se genera aprobación de prórroga solicitada por el consultor el 09 de marzo del 2023,con esta prórroga se subsana el tiempo de retrasos identificado en el proyecto, a partír de la aprobación de la prórroga el consultor actualizo el cronograma de ejecucición, encontrandose actualmente al día con dicha proyección, también en la modificación contractual realizada a partír de la prórroga se genera la modificación asociada a la forma del pago del informe No. 3, en donde tambien se aprueba la aprobación parcial del informe 3 para tres nodos inicialmente.

El consultor presenta informe parcial No. 3 el 06/03/2023 el cual fue aprobado con salvedades el 21 /03/2023 y mediante el cual tambien se aprueba el acta de cobro correspondiente al 20% del valor del contrato.

A nivel porcentual, teniendo en cuenta la aprobación del informe No. 1 , informe No. 2 e informe parcial No.3, se cuenta con un avance técnico correspondiente al 47%

A nivel de facturación, se cuenta con un avance del 50% correspondiente al pago del Informe No. 1, informe No 2 e informe parcial 3 ($199.277.240).

A nivel de tiempo, se cuenta con un avance del 60% en tiempo correspondiente a los tres primeros meses del contrato.

11. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Se revisa el cumplimiento de la seguridad social de acuerdo a la certificación suministrada por el contratista para la gestion del pago No. 3

Fecha emisión de Informe	29	3	2023

Firma

ING. JOSE RUBEN TORRES CAMARGO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
R.L TORRES ING S.A.S

Cargo Supervisor

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado)) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.

IDIGER
Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático

SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

CONTRATO	278 DE 2022 - IDIGER
OBJETO	Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.
FECHA INICIO	28 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	5.0 MESES
INTERVENTOR	TORRES ING S.A.S

ELEMENTOS TÉCNICOS

No	ACTIVIDAD	Semana 1- 01 de Marzo al 04 de Marzo	Semana 2- 05 de Marzo al 11 de Marzo	Semana 3 - 12 de Marzo al 18 de Marzo	Semana 4 19 de Marzo al 25 de Marzo	Semana 5 26 de Marzo al 28 de Marzo
1	**ACTIVIDADES ESPECÍFICAS**					
0	Legalización contractual **(Finalizada en el periodo anterior)**					
1.1	Presentación de las hojas de vida del equipo consultor **(Finalizada en el periodo anterior)**					
2.1	Informe Parcial 1: Recopilación, revisión y análisis de la información existente de cada nodo y cronograma detallado **(Finalizada en el periodo anterior)**					
2.1.1	Presentación del cronograma para el desarrollo del proyecto		**8 de marzo del 2023**: El Consultor remite el cronograma actualizado incluyendo el mes solicitado para la prórroga. **09 de marzo del 2023**: La interventoría emite observaciones y recomendaciones en referencia al cronograma presentado por el consultor.	**15 de marzo del 2023:** El consultor remite respuesta a las observaciones presentadas por la interventoría indicando que se mantendrá el cronograma propuesto teniendo en cuenta los rendimientos identificados en el desarrollo de la exploración geotécnica		
2.2	Informe Parcial 2 Definición de las metodologías de zonificación, verificación del polígono de análisis, insumos temáticos preliminares y programa de exploración del subsuelo (**Aprobado en el periodo anterior- 15 de febrero mediante oficio OF014_TC_299_2022**)					
2.3	Informe Parcial 3: Insumos temáticos Completos e Investigación de campo completa		**06 de Marzo del 2023:** Se finaliza la exploración geotécnica en el nodo Auras. **07 de Marzo del 2023: (06-03-2023 5:15 pm)** El consultor realiza la entrega del informe No. 3 para los nodos Vegas, Concepción y Tunal Alto **09 de Marzo del 2023:** La interventoría genera la revisión y envio de observaciones al informe No. 3 para los nodos Concepción, Tunal Alto y Vegas **11 de Marzo del 2023:** Se genera socialización de las actividades a desarrollar en el nodo Santa Ana	**12 de Marzo del 2023:** Se finaliza la exploración geotécnica del nodo Sumapaz **14 de Marzo del 2023:** El consultor remite el informe 3 versión 1 del nodo Concepción con el fin de ser revisado y tomado como base para los siguientes nodos. **15 de Marzo del 2023:** Se genera reunión técnica de pares con el fin de puntualizar observaciones y llegar a los acuerdos que generarán la aprobación de los productos. **18 de Marzo del 2023:** El Consultor remite los informes de los nodos concepción Tunal alto y Vegas ajustados exceptuando las observaciones relacionadas con la geología, las cuales serán entregadas el martes 21 de marzo **18 de Marzo del 2023:** El consultor finaliza la exploración geotécnica del nodo Ánimas	**21 de Marzo del 2023:** El consultor presenta el informer No. 3 para el nodo Vegas, Tunal Alto y Concepción con la inclusión de los ajustes en geología. **21 de Marzo del 2023:** La interventoría genera aprobación del Informe No. 3 con salvedades de acuerdo al oficio OF OF24_TC_299_2022 y Radicado No.2023ER6477 **24 de Marzo del 2023:** Finaliza la exploración geotécnica en el nodo Raizal	**28 de Marzo del 2023:** Finaliza la exploración geotécnica en el nodo San Ana
2.4	Informe Parcial 4: Que contenga para cada nodo ensayos de laboratorio, Modelo geológico y Análisis de estabilidad				**22 de Marzo del 2023:** Se finalizan los ensayos de laboratorio para los nodos Concepción, Tunal Alto y Vegas	

PRODUCTOS

PRODUCTO	Semana 1- 01 de Marzo al 04 de Marzo	Semana 2- 05 de Marzo al 11 de Marzo	Semana 3 - 12 de Marzo al 18 de Marzo	Semana 4 19 de Marzo al 25 de Marzo	Semana 5 26 de Marzo al 28 de Marzo
Informe Parcial 3: Insumos temáticos Completos e Investigación de campo completa				21 de Marzo del 2023: La interventoría genera aprobación del Informe No. 3 con salvedades de acuerdo al oficio OF OF24_TC_299_2022 y Radicado No.2023ER6477	

ESTADO DE AVANCE, HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el mes de febrero el consultor notificó sonbre retrasos en la ejecución producto de las dificultades en los permisos sociales para la elaboración de la exploración geotécnica ,se genera aprobación de prórroga solicitada por el consultor el 09 de marzo del 2023,con esta prórroga se subsana el tiempo de retrasos identificado en el proyecto, a partír de la aprobación de la prórroga el consultor actualizo el cronograma de ejecucición, encontrandose actualmente al día con dicha proyección, también en la modificación contractual realizada a partír de la prórroga se genera la modificación asociada a la forma del pago del informe No. 3, en donde tambien se aprueba la aprobación parcial del informe 3 para tres nodos inicialmente.

El consultor presenta informe parcial No. 3 el 06/03/2023 el cual fue aprobado con salvedades el 21 /03/2023 y mediante el cual tambien se aprueba el acta de cobro correspondiente al 20% del valor del contrato.

A nivel porcentual, teniendo en cuenta la aprobación del informe No. 1 , informe No. 2 e informe parcial No.3, se cuenta con un avance técnico correspondiente al 47%

A nivel de facturación, se cuenta con un avance del 50% correspondiente al pago del Informe No. 1, informe No 2 e informe parcial 3 ($199.277.240).

A nivel de tiempo, se cuenta con un avance del 60% en tiempo correspondiente a los tres primeros meses del contrato.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Fecha	Asunto de solicitud	Soporte
1 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría la solicitud de prórroga para el contrato en referencia	Vía correo electrónico 34-23-GDING-PROY188
02 de marzo de 2023	La interventoría remite a la supervisión y al consultor concepto en referencia a la solicitud de modificación contractual presentada por el consultor	Vía correo electrónico OF018_TC_299_2022
3 de marzo de 2023	La interventoría remite a la supervisión oficio con la solicitud de prórroga para el contrato 299 basado en la prórroga planteada al contrato vigilado 278-2022	Vía correo electrónico OF_019_TC_299_2022 ANX Int
3 de marzo de 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión de la seguridad social presentada por el contratista para el mes de enero 2023	Vía correo electrónico - Anexo_Verificación_Seguridad_ Social

SEGUIMIENTO TÉCNICO SEMANAL A CONTRATOS

06 de marzo del 2023	La interventoría remite a la supervisión el informe mensual No 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2023	Vía correo electrónico OF020_TC_299_2022
06 de marzo del 2023	El consultor remite los documentos legales requeridos para el trámite de la prórroga	Vía correo electrónico DOC MODIFICACION CONTRACTUAL.rar
06 de marzo del 2023	La consultoría remite a la interventoría las subsanaciones a la seguridad social del mes de Diciembre y enero de la profesional SIG del contratista	Vía correo electrónico
06 de marzo del 2023	La consultoría remite el informe 3 con los nodos acordanos (Vegas, Concepción y Tunal Alto), hora de entrega 5:12 pm	Vía correo electrónico 38-23 -GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 3-1.
06 de marzo del 2023	La consultoría notifica a la interventoría y a la supervisión sobre el reporte de la perforación en la localidad Sumapaz "Nos permitimos informarles que el día de hoy se presentaron lluvias a lo largo del sector detrabajo de la localidad de Sumapaz en la jornada de la tarde retrasando las actividades enAuras".	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
06 de marzo del 2023	La consultoría a la interventoría remite los soportes de solicitud y respuesta para el desarrollo de la exploración geotécnica en el Nodo Raizal	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
07 de marzo del 2023	La consultoría remite a la intreventoría y a la supervisión el reporte de la perforación en el nodo Sumapaz "Nos permitimos informarles que el día de hoy solicitamos los permisos para realizar las perforaciones en los nodos de Sumapaz yAnimas, pero por el momento no se ha tenido autorización por parte de la comunidad para acceder a los predios, por lo cualsolicitamos apoyo para estos sitios".	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
08 de marzo de 2023	La consultoría remite a la interventoría el cronograma del proyecto actualizado y ajustado de acuerdo a la prorroga solicitada	Vía correo electrónico - Programacion Sumapaz prorroga
08 de marzo de 2023	El contratista remite a la interventoría y a la supervisión la presentación a realizar para la solicitud de los permisos en el nodo Santa Ana	Vía correo electrónico DIAPOSITIVA SANTA ANA.pptx
9 de marzo de 2023	La interventoría remite a la consultoría comentarios y observaciones en referencia al cronograma de actividades planteado por cel contratista	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
9 de marzo de 2023	La interventorpia remite a la consultoría el oficio con las observaciones realizadas al informe Parcial No 3	Vía correo electrónico OF21_TC_299_2022
13 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría y a la supervisión reporte de perforación en el nodo Animas " Nos permitimos informarles que tal como se pudo evidenciar este fin de semana, a lolargo de la localidad de Sumapaz se han presentado lluvias y niebla que no permite lavisibilidad del área de trabajo, factores han generado retrasos en los trabajos deexploración para el nodo de Animas."	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
14 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría el informe técnico de Concepción con los ajustes con el fin de ser revisado y evaluado en la reunión de pares	Vía correo electrónico - GEOLOGIA ENTREGADA.rar
15 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoria horario de disponibilidad del especialista en geología para generar la reunión de pares requerida para dar aprobación al volumen geológico junto con el link para descargar los documentos relacionados con la entrega de las EPP de los trabajadores de campo	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
15 de marzo de 2023	El consultor contesta a la interventoría ratificndo los tiempos presentados en el cronograma de actividades teniendo en cuenta los rendimientos en el desarrollo de la exploración geotécnica	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
15 de marzo de 2023	La interventorpia remite a la consultoría la lista de documentos administrativos faltantes correspondientes a los protocolos de bioseguridad ylas evidencias del cumplimiento de este	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
17 de marzo del 2023	La Supervisión remite el documento de la modificación contractual para la firma de la interventoría	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
17 de marzo del 2023	La interventoría la supervisión el documento de la modificación contractual (Prórroga) firmado	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
21 de marzo del 2023	La interventoría genera radicación del informe No 3 del consultor para los nodos Concepción, Tunal Alto y Vegas junto con el oficio de aprobación con salvedades bajo el número de radicado 2023E6446	Vía correo electrónico OF24_TC_299_2022
21 de marzo del 2023	La interventoría, presenta ante la supervisión la cuenta No 3 del consultor la cual radicada por la supervisora con el consecutivo No.2023ER6477	Vía correo electrónico OF25_TC_299_2022
21 de marzo del 2023	La consultoría repite documentos para la generación de la cuenta No 3 "ENTREGA DE FACTURA No 1231 Y SOPORTES".	Vía correo electrónico 45-23-GDING-PROY188

ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO

Fecha	Tema de la reunión o seguimiento	Soporte
14/03/2023	Reunión de seguimiento CTO 278 y CTO 299	Acta No 7
15/03/2023	Reunión de Pares para revisar informe No. 3 y evaluar las alternativas para generar la aprobación.	Acta No 8
28/03/2023	Reunión de seguimiento CTO 278 y CTO 299	Acta No 9

REGISTRO GRÁFICO Y FOTOGRÁFICO

VISITA DE CAMPO A LOS NODOS POR PARTE DEL EQUIPO CONSULTORÍA- INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO DESARROLLO DE LA EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA EJECUTADA











PORCENTAJE GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

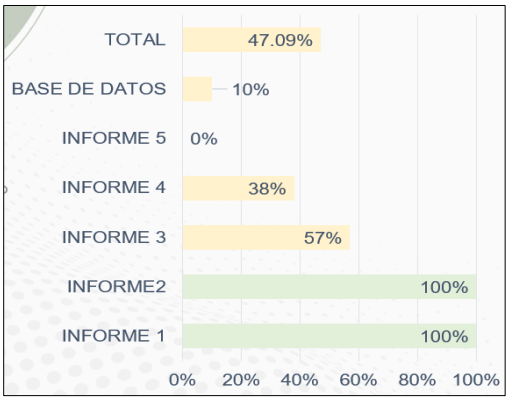


AVANCE EN EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA Y ENSAYOS DE LABORATORIO

Actividad Finalizada
Actividad En ejecución
Actividad no iniciada

Nodo	Exploración geotécnica		Laboratorios
	Permiso	Ejecución	
Vegas	16/02/2023	27/02/2023	20/03/2023
Tunal Alto	14/02/2023	24/02/2023	20/03/2023
Concepción	10/02/2023	20/02/2023	20/03/2023
Santa Ana	Reunion 11/03/2023	28/03/2023	
Auras	28/02/2023	6/03/2023	
Sum paz	8/03/2023	12/03/2023	
Ánimas	9/03/2023	18/03/2023	
Raizal	6/03/2023	24/03/2023	

RELACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE AVANCE

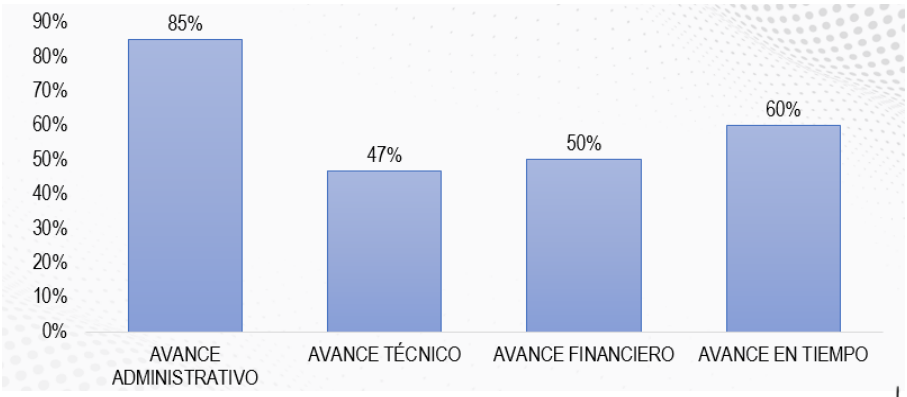

RESPONSABLES	**ELABORÓ**	ING. MARIA PAULA APARICIO GARZÓN
	REVISÓ	ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA)

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

Fecha de elaboración del informe	29 de Marzo del 2023
Periodo de seguimiento	01 de Marzo al 28 de Marzo del 2023
Fecha de inicio	28 de diciembre del 2022
Fecha de terminación	27 de Mayo del 2023
Valor del Contrato	TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($398.554.472.oo) incluido de IVA
Objeto	Elaboración de estudios básicos de zonificación de amenaza por movimientos en masa, a escala 1:5.000 acorde con los requisitos del decreto 1077 de 2015, para 8 nodos de equipamientos rurales de la localidad de Sumapaz.
Nombre de contratista	GEODINAMICA INGENIERIA S.A. NIT. 830.146.665-6
Nombre del interventor	TORRES ING SAS. NIT. 900.335.343-4
PLAZO DE EJECUCIÓN	5.0 Meses

Avance

Técnicos	47.00%
Financieros	50.00%
Recursos ejecutados	56.10%

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO:

Fecha	Asunto de solicitud	Soporte
1 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría la solicitud de prórroga para el contrato en referencia	Vía correo electrónico 34-23-GDING-PROY188
02 de marzo de 2023	La interventoría remite a la supervisión y al consultor concepto en referencia a la solicitud de modificación contractual presentada por el consultor	Vía correo electrónico OF018_TC_299_2022
3 de marzo de 2023	La interventoría remite a la supervisión oficio con la solicitud de prórroga para el contrato 299 basado en la prórroga planteada al contrato vigilado 278-2022	Vía correo electrónico OF_019_TC_299_2022 ANX Int
3 de marzo de 2023	La interventoría remite a la consultoría la revisión de la seguridad social presentada por el contratista para el mes de enero 2023	Vía correo electrónico - Anexo_Verificación_Seguridad_Social
06 de marzo del 2023	La interventoría remite a la supervisión el informe mensual No 2 correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de febrero al 28 de febrero del 2023	Vía correo electrónico OF020_TC_299_2022
06 de marzo del 2023	El consultor remite los documentos legales requeridos para el trámite de la prórroga	Vía correo electrónico DOC MODIFICACION CONTRACTUAL.rar
06 de marzo del 2023	La consultoría remite a la interventoría las subsanaciones a la seguridad social del mes de Diciembre y enero de la profesional SIG del contratista	Vía correo electrónico
06 de marzo del 2023	La consultoría remite el informe 3 con los nodos acordanos (Vegas, Concepción y Tunal Alto), hora de entrega 5:12 pm	Vía correo electrónico 38-23 - GDING-PROY188- ENTREGA INFORME 3-1.

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

06 de marzo del 2023	La consultoría notifica a la interventoría y a la supervisión sobre el reporte de la perforación en la localidad Sumapaz "Nos permitimos informarles que el día de hoy se presentaron lluvias a lo largo del sector detrabajo de la localidad de Sumapaz en la jornada de la tarde retrasando las actividades en Auras".	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
06 de marzo del 2023	La consultoría a la interventoría remite los soportes de solicitud y respuesta para el desarrollo de la exploración geotécnica en el Nodo Raizal	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
07 de marzo del 2023	La consultoría remite a la intreventoría y a la supervisión el reporte de la perforación en el nodo Sumapaz "Nos permitimos informarles que el día de hoy solicitamos los permisos para realizar las perforaciones en los nodos	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
08 de marzo de 2023	La consultoría remite a la interventoría el cronograma del proyecto actualizado y ajustado de acuerdo a la prorroga solicitada	Vía correo electrónico - Programacion Sumapaz prorroga
08 de marzo de 2023	El contratista remite a la interventoría y a la supervisión la presentación a realizar para la solicitud de los permisos en el nodo Santa Ana	Vía correo electrónico DIAPOSITIVA SANTA ANA.pptx
9 de marzo de 2023	La interventoría remite a la consultoría comentarios y observaciones en referencia al cronograma de actividades planteado por cel contratista	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
9 de marzo de 2023	La interventorpia remite a la consultoría el oficio con las observaciones realizadas al informe Parcial No 3	Vía correo electrónico OF21_TC_299_2022
13 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría y a la supervisión reporte de perforación en el nodo Animas " Nos permitimos informarles que tal como se pudo evidenciar este fin de semana, a lolargo de la localidad de Sumapaz se han presentado lluvias y niebla que no permite lavisibilidad del área de trabajo, factores han generado retrasos en los trabajos de exploración para el nodo de Animas."	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
14 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoría el informe técnico de Concepción con los ajustes con el fin de ser revisado y evaluado en la reunión de pares	Vía correo electrónico - GEOLOGIA ENTREGADA.rar
15 de marzo del 2023	El consultor remite a la interventoria horario de disponibilidad del especialista en geología para generar la reunión de pares requerida para dar aprobación al volumen geológico junto con el link para descargar los documentos relacionados con la entrega de las EPP de los trabajadores de campo	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
15 de marzo de 2023	El consultor contesta a la interventoría ratificndo los tiempos presentados en el cronograma de actividades teniendo en cuenta los rendimientos en el desarrollo de la exploración geotécnica	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
15 de marzo de 2023	La interventorpia remite a la consultoría la lista de documentos administrativos faltantes correspondientes a los protocolos de bioseguridad ylas evidencias del cumplimiento de este	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
17 de marzo del 2023	La Supervisión remite el documento de la modificación contractual para la firma de la interventoría	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
17 de marzo del 2023	La interventoría la supervisión el documento de la modificación contractual (Prórroga) firmado	Vía correo electrónico en el cuerpo del correo
21 de marzo del 2023	La interventoría genera radicación del informe No 3 del consultor para los nodos Concepción, Tunal Alto y Vegas junto con el oficio de aprobación con salvedades bajo el número de radicado 2023E6446	Vía correo electrónico OF24_TC_299_2022
21 de marzo del 2023	La interventoría, presenta ante la supervisión la cuenta No 3 del consultor la cual radicada por la supervisora con el consecutivo No.2023ER6477	Vía correo electrónico OF25_TC_299_2022
21 de marzo del 2023	La consultoría repite documentos para la generación de la cuenta No 3 "ENTREGA DE FACTURA No 1231 Y SOPORTES".	Vía correo electrónico 45-23-GDING-PROY188

CONTROL TÉCNICO

SEGUIMIENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS

Informe de Interventoría Contrato de consultoría IDIGER 278 de 2022- Informe de interventoría

Informe Parcial 3 Insumos temáticos Completos e Investigación de campo completa	21 de Marzo del 2023: La interventoría genera aprobación del Informe No. 3 con salvedades de acuerdo al oficio OF OF24_TC_299_2022 y Radicado No.2023ER6477

OTROS	No aplica
PROFESIONAL RESPONSABLE	ING. JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO (DIRECTOR DE CONSULTORÍA)
