CONTRATO 1110 DEL 2022

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.







INFORME MENSUAL No. 1

FEBRERO DEL 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____ **MES O PERIODO: _____**


No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1			
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1			
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1			
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 1
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	27/03/2023	Fabriany M. Ascanio Contreras	
Revisión	29/03/2023	Jesús Orlando Vivas Noguera	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Elías Jaimes Fernández	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1		
2		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
2.1 LOCALIZACION 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 9
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 11
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 11
3.1.1 Información contractual 11
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 13
3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS 13
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato 13
3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra. 14
3.4.3 Estado de pólizas 14
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 16
4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA 17
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 21
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 22
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 23
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 24
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 25
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 26
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 27
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 27
5.1.1 Aspectos legales del contrato 27
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 28
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 30
6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA 30

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 31

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA 31

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA 32

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 32

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo 32

8. ANEXOS 34

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 11
Tabla 3. Póliza de cumplimiento..... 14
Tabla 4. Póliza de responsabilidad civil extracontractual..... 15
Tabla 7. Aspectos legales del contrato de interventoría 27
Tabla 8. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría..... 28
Tabla 1. Personal Activo de la Interventoría. 31
Tabla 8. Relación de la correspondencia recibida 34
Tabla 10. Relación de la correspondencia enviada 38

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 34
Anexo 8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras..... 39

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 09 y 28 de Febrero de 2023, para el proyecto **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER."**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al contrato No. 01930 de 2019 en ejecución, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)"** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de recorridos conjuntos con funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander y especialistas, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e inspector de Obra e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 01930 de 2019 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial Ocaña, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 1110 de 2022, Ingeniero ELIAS JAIMES FERNANDEZ.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION



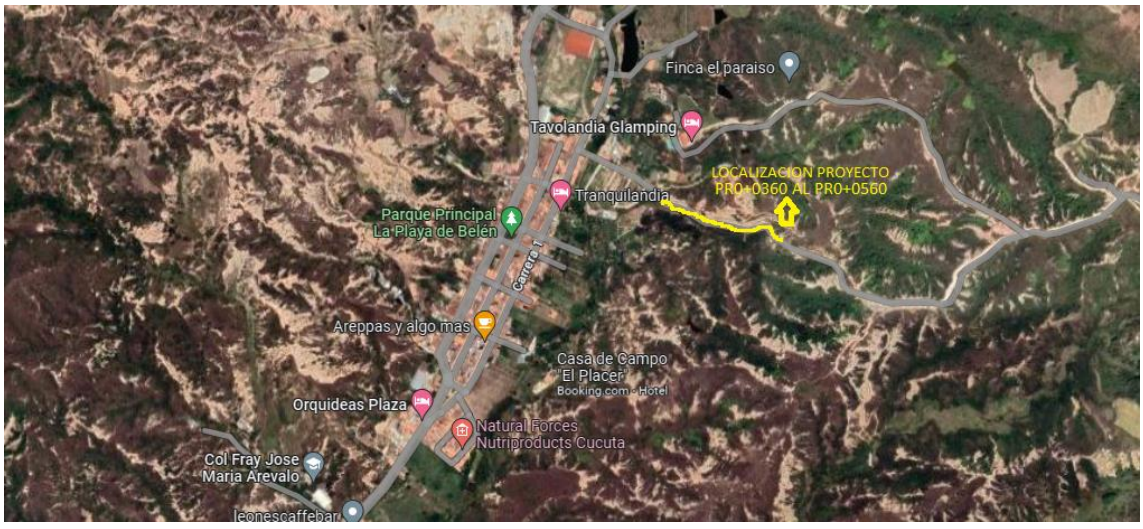


Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra localizado en el municipio de PLAYA, Norte de Santander, sobre la vía que comunica el municipio LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY. Específicamente la zona de intervención comprende el tramo vial que

inicia en la cabecera municipal en la terminación de la vía pavimentada (PR 0+0360) y continua su recorrido en sentido SW hasta el punto final (PR 0+0560).

El proyecto contempla la construcción de una placa huella. Se desarrolla en terreno considerado de pendiente media-alta; la vía se encuentra en mal estado, con ancho promedio de 5,2 metros, sin berma, y longitud del tramo a intervenir de 200 ml.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

La vía Playa – Curasica- Alto el Buey, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesado hacia los sectores de producción agrícola que se encuentran en la zona, además se presentan zonas de socavación, producto de aguas escorrentías, disminución o pérdida parcial de banca, falta de limpieza de alcantarillas y cunetas y falta de rocería, por tal motivo se requiere rehabilitación total del tramo en mención.

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de INVIAS (2013), las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto la construcción de una placa huella de 200 ml desde el pr 0+360 al pr 0+560. La vía Playa – Curasica- Alto el Buey que se encuentran en malas condiciones, en su gran mayoría por no contar con pavimento. Además de la inestabilidad de la calzada, lo cual se complica aún más, en los tiempos de lluvia. Esta situación genera altos costos de operación y aumento en los tiempos de recorrido.

El departamento norte de Santander realiza inversiones con periodicidad anual en mantenimiento, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía secundaria comprendida entre los municipios de convención y el tarra y las obras complementarias que

garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños entregados por la gobernación de norte de Santander.

Los estudios y diseños contienen capítulos estructurales, hidráulicos, geotécnicos, pavimentos, diseño geométrico, que determinan la ejecución de las obras contempladas en el alcance del proyecto.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 01946 de 2019.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONTRATO No. - FECHA	01930 del 28 de agosto de 2019
TIPO DE CONTRATO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Secretaría de Infraestructura
CONTRATISTA	CONSORCIO LA PLAYA 2019
C.C. o N.I.T.	901312586-1
REPRESENTANTE LEGAL	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO
C.C. o N.I.T	60.333.536 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)”
VALOR DEL CONTRATO	$938´826.313,00
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO	$187´141.848,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.125´968.161,00
PLAZO O DURACIÓN	Cinco (05) meses contados a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 1: “Modificar el plazo de ejecución hasta el 25 de octubre de 2021”.
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 2: Dos (02) meses más contados a partir del vencimiento del término inicialmente pactado.
LUGAR DE EJECUCIÓN	La Playa – Curasica- Alto El Buey, Municipio de La Playa, Departamento Norte de Santander
RUBRO	POSICION CATALOGO DE GASTOS 005-2402-0603-2018-130101-0058 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER.

SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	Gustavo Lamus Murillo, designado mediante memorando interno del 30 de agosto de 2019
INTERVENTOR (Externo)	Consorcio MSF 058, Interventor Externo del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 001901 de 2019
FECHA ACTA DE INICIO	Diciembre 02 de 2019
ACTAS PREVIAS SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN	**Suspensión 1:** febrero 7 de 2020 **Reinicio 1:** Febrero 27 de 2020 **Suspensión 2:** marzo 25 de 2020 **Reinicio 2:** julio 8 de 2020 **Suspensión 3:** Septiembre 1 de 2020 **Ampliación 1 Suspensión 3:** Septiembre 16 de 2020 **Reinicio 3:** octubre 12 de 2021 **Suspensión No. 4:** 22 de octubre de 2021. **Reinicio No. 5:** Diciembre 29 de 2022 **Acta de Ampliación suspensión No.** 5: 16 de enero 2023. **Acta de Ampliación No.2 suspensión No.** 5: 25 de enero 2023. **Reinicio 2:** Febrero 09 de 2023

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente al 09 al 28 de febrero 2023 de ejecución del contrato 01930 de 2019, luego de su reanudación N°2, el pasado 09 de febrero de 2023. El Contratista CONSORCIO LA PLAYA 2019,

realizó las siguientes actividades.

- Entrega de pólizas actualizadas con la fecha de reinicio N°2.
- Programación de obra actualizada con la fecha de reinicio.

Se adelantan las siguientes actividades técnicas:

- ✓ Se realizan recorridos periódicos por el corredor vial a intervenir y en ejecución y toma de registro fotográfico al inicio y durante la ejecución de los trabajos en el tramo.
- ✓ Durante este periodo se ejecutaron actividades como localización y replanteo, traslado de materiales, herramientas y equipos al sitio de obra.
- ✓ Se llevó a cabo excavación y conformación de la subrasante.
- ✓ Suministro e instalación de sub-base granular
- ✓ Construcción de placa huella

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

A la fecha no se presentan ítems no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.4.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se no han presentado modificaciones de cantidades.

3.4.2 Actas de recibo parcial de obra y recibo final de obra.

En el formato de Acta de recibo parcial y/o final de obra se relacionan los conceptos: información principal del contrato de obra, las condiciones originales, las condiciones actualizadas a traer de la última acta de modificación de cantidades de obra aprobada, la obra ejecutada en cada mes y el acumulado de ejecución de estos hasta el mes de la correspondiente acta.

A la fecha no se han presentado actas de recibo parcial.

3.4.3 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la actualización de la póliza de cumplimiento No 49-44-101019687, con respecto a la fecha de reinicio n°2, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación de norte de Santander. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 112.596.816,10	2	12	2019	10	8	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0%	$ -						
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15%	$ 168.895.224,15	2	12	2019	10	4	2026
Calidad de Estudios y Diseños	0%	$ -						
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 337.790.448,30	Cinco (05) años desde el acta de recibo final					

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la actualización de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.49-44-101009321, respecto a la fecha de reinicio N°2, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación de norte de Santander. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 200.000.000,00	26	12	2022	10	4	2023
Otros								

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 9 al 28 de febrero de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	28/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER **PERIODO MES:** FEBRERO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No.: 01930 DE 2019

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATISTA: CONSORCIO LA PLAYA 2019

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ELIAS JAIMES FERNANDEZ

PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	02 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN:	7 DE FEBRERO 2020
FECHA DE REANUDACIÓN:	09 DE FEBRERO 2023
FECHA DE VENCIMIENTO:	10 DE ABRIL 2023
PLAZO ACUMULADO:	SIETE (7) MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 938.826.313,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 187.141.848,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1.125.968.161,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Placa huella	Construcción	ML	200
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Muros de contencion		
	Alcantarillas		
	Pontones		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	Construcción	ML	40	40
	Mejoramiento			
	Rehabilitación			
Estructuras	Muros de contencion			
	Alcantarillas			
	Pontones			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1.125.968.161,00		1.125.968.161,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1.125.968.161,00		**1.125.968.161,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				878.216.513,00
AJUSTES				
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS				
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO				**878.216.513,00**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1.048.576.819,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 878.216.513,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	83,75%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8

REGISTRO FOTOGRÁFICO





SE FUNDIO PLACA HUELLA PR 0+0560 AL PR 0+0545





E FUNDIO PLACA HUELLA, PIEDRA PEGADA Y CUNETA PR 0+0560 AL PR 0+0545

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)


Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el Director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

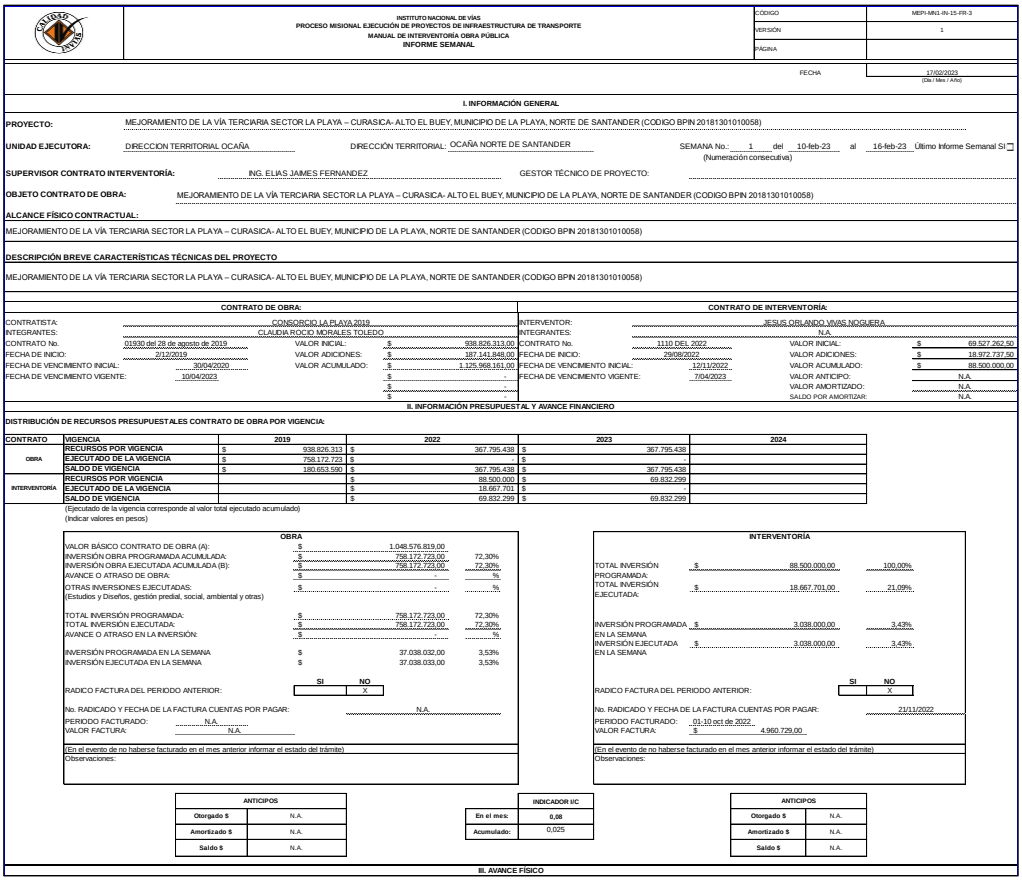

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 17/02/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 1 del 10-feb-23 al 16-feb-23 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2019		
INTEGRANTES:	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO		
CONTRATO No:	01930 del 28 de agosto de 2019	VALOR INICIAL:	$ 938.826.313,00
FECHA DE INICIO:	2/12/2019	VALOR ADICIONES:	$ 187.141.848,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2020	VALOR ACUMULADO:	$ 1.125.968.161,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10/04/2023		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA		
INTEGRANTES:	N.A.		
CONTRATO No.	1110 DEL 2022	VALOR INICIAL:	$ 69.527.262,50
FECHA DE INICIO:	29/08/2022	VALOR ADICIONES:	$ 18.972.737,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/11/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 88.500.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7/04/2023	VALOR ANTICIPO:	N.A.
		VALOR AMORTIZADO:	N.A.
		SALDO POR AMORTIZAR:	N.A.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 938.826.313	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 758.172.723	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.653.590	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 88.500.000	$ 69.832.299	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18.667.701	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 69.832.299	$ 69.832.299	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.048.576.819,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 758.172.723,00	72,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 37.038.032,00	3,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 37.038.033,00	3,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N.A.
PERIODO FACTURADO: N.A.
VALOR FACTURA: N.A.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 88.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.667.701,00	21,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.038.000,00	3,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.038.000,00	3,43%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/11/2022
PERIODO FACTURADO: 01-10 oct de 2022
VALOR FACTURA: $ 4.960.729,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,08
Acumulado:	0,025

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador 7 ton mínimo	1	1
Volquetas	2	2
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Obra Física y otros	Unidad	1	10/02/2022	16/02/2023	Prog	$ 37.038.032,00			$ 37.038.032,00	3,3%
					Ejec	$ 37.038.032,00			$ 37.038.032,00	3,3%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL PR 12+0500	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N.A.	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N.A.	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N.A.	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N.A.	
EMISIONES:	SI	NO	N.A.	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N.A.	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A.
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A.
AVALÚOS APROBADOS: N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SEIGUIENTES ACTIVIDADES COMO FUERON: RELLENO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION, CONFORMACIÓN DE LA SUB-RASANTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SIGUIENTE SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMO SON EXCAVACIONES Y FIGURADO DEL HIERRO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE DEL PR 0+360 AL PR 0+560



INSTALACIÓN DE SUB BASE DEL PR 0+360 AL PR 0+560



COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE DEL PR 0+360 AL PR 0+560

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 10 al 28 de febrero de 2023.**
	CONTRATO No. 1110 DEL 2022	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	17/02/2023 (DIA / MES / AÑO)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 2 del 17-feb-23 al 23-feb-23 (Numeración consecutiva) — Ultimo Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2019		INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	
INTEGRANTES:	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO		INTEGRANTES:	N.A.	
CONTRATO No.	01930 del 28 de agosto de 2019	VALOR INICIAL: $ 938.826.313,00	CONTRATO No.	1110 DEL 2022	VALOR INICIAL: $ 69.527.262,50
FECHA DE INICIO:	2/10/2019	VALOR ADICIONES: $ 187.141.846,00	FECHA DE INICIO:	28/08/2022	VALOR ADICIONES: $ 18.972.737,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2020	VALOR ACUMULADO: $ 1.125.968.161,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/11/2022	VALOR ACUMULADO: $ 88.500.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10/04/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7/04/2023	VALOR ANTICIPO: N.A.
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N.A.
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 938.826.313	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 758.172.723	$ -	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.653.590	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 69.500.000	$ 69.832.299	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18.667.701	$ -	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 69.832.299	$ 69.832.299	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1.048.576.819,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 758.172.723,00	72,30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 758.172.723,00	72,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 100.043.790,00	9,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.043.790,00	9,54%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N.A.
PERIODO FACTURADO: N.A.
VALOR FACTURA: N.A.

En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 88.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.667.701,00	21,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.076.000,00	6,87%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.076.000,00	6,87%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/12/2022
PERIODO FACTURADO: 01-10 oct de 2022
VALOR FACTURA: $ 4.960.729,00

En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,06
Acumulado:	0,025

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (a)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Obra Física y otros	Unidad	1	10/02/2022	16/02/2023	Prog.	$ 37.038.032,00			$ 37.038.032,00	3,3%
					Ejec	$ 37.038.032,00			$ 37.038.032,00	3,3%
					Prog.					
					Ejec					
					Prog.					
					Ejec					
					Prog.					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador 7 ton mínimo	1	1
Volquetas	2	2
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	TRITURADORA GUAYABAL PR 12+0500	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N.A.
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N.A.
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N.A.
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N.A.
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N.A.
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N.A.
EMISIONES:	SI	NO	N.A.
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N.A.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A.
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N.A.
AVALÚOS APROBADOS: N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS: N.A.

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SEIGUIENTES ACTIVIDADES COMO FUERON: RELLENO MECANICO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION , SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR Y FIGURADO DE HIERRO

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SIGUIENTE SEMANA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES COMO SON: EXCAVACIONES Y FIGURADO DEL HIERRO

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO


CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE DEL PR 0+360 AL PR 0+560


INSTALACIÓN DE SUB BASE DEL PR 0+360 AL PR 0+560


COMPACTACIÓN DE LA SUB BASE DEL PR 0+360 AL PR 0+560

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. se realiza informe semanal 02
2. solicitar documentos faltantes al contratista.
3. control de programacion para evitar atraso de obra.
4. control de material puesto en obra
5. revisar cumplimiento de protocolos de bioseguridad

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor + Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 10 al 28 de febrero de 2023.**
	CONTRATO No. 1110 DEL 2022	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MEPI-MINS-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	1/03/2023 (DD / MM / AAA)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER — SEMANA No.: 3 del 24/02/2023 al 2/03/2023 (Ultimo Informe Semanal SI) (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ELIAS JAIMES FERNANDEZ — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL:

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA PLAYA 2019		INTERVENTOR:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	
INTEGRANTES:	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO		INTEGRANTES:	N.A.	
CONTRATO No.	01930 del 28 de agosto de 2019	VALOR INICIAL: $ 938.826.313,00	CONTRATO No.	1110 DEL 2022	VALOR INICIAL: $ 69.527.262,50
FECHA DE INICIO:	2/12/2019	VALOR ADICIONES: $ 187.141.848,00	FECHA DE INICIO:	29/08/2022	VALOR ADICIONES: $ 18.972.737,50
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/04/2020	VALOR ACUMULADO: $ 1.125.968.161,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	12/11/2022	VALOR ACUMULADO: $ 88.500.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	10/04/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	7/04/2023	VALOR ANTICIPO: N.A.
		$ -			VALOR AMORTIZADO: N.A.
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: N.A.

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2019	2022	2023	2024
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 938.826.313	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 758.172.725	$	$	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 180.653.590	$ 367.795.438	$ 367.795.438	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 88.500.000	$ 69.832.299	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 18.667.701	$	
	SALDO DE VIGENCIA		$ 69.832.299	$ 69.832.299	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1.048.576.819,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	878.216.513,00	83,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	878.216.513,00	83,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	878.216.513,00	83,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	878.216.513,00	83,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	120.043.790,00	11,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	120.043.790,00	11,45%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: N.A.
PERIODO FACTURADO: N.A.
VALOR FACTURA: N.A.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite).
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	88.500.000,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	18.667.701,00	21,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	9.114.000,00	10,30%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	9.114.000,00	10,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 21/11/2022
PERIODO FACTURADO: 01-10 oct de 2022
VALOR FACTURA: $ 4.960.729,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,08
Acumulado:	0,021

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A.
Amortizado $	N.A.
Saldo $	N.A.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: _____ Avance o Atraso Físico %: _____
Meta Física Ejecutada %: _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Obra Física y otros	Unidad	1	24/02/2023	2/03/2023	Prog	$ 120.043.790,00			$ 120.043.790,00	11,4%
					Ejec	$ 120.043.790,00			$ 120.043.790,00	11,4%
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____
TRAMO Y/O SECTOR (n): _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador 7 ton mínimo	1	1
Volquetas	2	2
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: TRITURADORA GUAYABAL PR 12+0500	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N.A.	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N.A.	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N.A.	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N.A.	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N.A.	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N.A.	
EMISIONES:	SI	NO	N.A.	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N.A.	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: N/A

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 8

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: N.A.
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: N.A.
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N.A.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N.A.
AVALUOS APROBADOS:	N.A.
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N.A.

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N.A.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN ESTA SEMANA SE REALIZARON LAS SEIGUIENTES ACTIVIDADES COMO FUERON: ARMADO Y FIGURADO DE ACERO PARA LAS VIGA RIOSTRA Y DE LA PLACA HUELLA, Y ADEMAS SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE FUNDICION DE CUNETA, VIGA RIOSTRA, Y INSTALACION PIEDRA PEGADA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SIGUIENTE SEMANA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR CONTINUAR CON LA FUNDICION DE PLACA HUELLA, PIEDRA PEGADA Y CUNETA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MINS-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



SE FUNDIO PLACA HUELLA PR 0+0560 AL PR 0+0545



SE FUNDIO PLACA HUELLA Y PIEDRA PEGADA PR 0+0560 AL PR 0+0545



E FUNDIO PLACA HUELLA, PIEDRA PEGADA Y CUNETA PR 0+0560 AL PR 0+0545

NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. se realiza informe semanal 03
2. solicitar documentos faltantes al contratista.
3. control de programacion para evitar atraso de obra.
4. control de material puesto en obra
5. revisar cumplimiento de protocolos de bioseguridad

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: ING. JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del Interventor.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo en el periodo comprendido entre 09 al 28 febrero 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 denominado anexo “Maquinaria y Equipo Del Contratista”. En el presente informe no se reporta maquinaria y equipos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2023 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO No. 01930 DE 2019 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 — **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	MITSUBISHI MG300	1,2 M3	OBRA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 121D	8 TON	OBRA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
VOLQUETAS (3)	DODGE	7M3	OBRA													X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X							
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 54202-68941NTS

Firma
Nombre: **FABRIANY M. ASCANIO CONTRERAS**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188028NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra en el periodo comprendido entre 09 al 28 de febrero 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 denominado “Personal del contratista de obra”.

En el presente período se reporta solo el personal mínimo requerido.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	29/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 01930 DE 2019 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Mes de Febrero del 2023 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 2018130101058)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1110 DE 2022 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

NOMBRE ARL: POSITIVA — **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CLAUDIA ROCIO MORALES	60.333.536	REPRESENTANTE LEGAL	$ 2.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO LA PLAYA 2019	$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	COOSALUD	948639589	$ 92.800	COLPENSIONES	948639589	$ 371.200	$ 92.800	N/A	N/A	
2	CLAUDIA ROCIO MORALES	60.333.536	DIRECTOR DE OBRA	$ 2.320.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	COOSALUD	948639589	$ 92.800	COLPENSIONES	948639589	$ 371.200	$ 92.800	N/A	N/A	
3	BLADIMIR CARRASCAL RUEDA	1.090.413.969	RESIDENTE DE OBRA	$ 1.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.500.000,00	$ 104.400	V	NUEVA EPS	948639589	$ 60.000	COLPENSIONES	948639589	$ 240.000	$ 60.000	N/A	N/A	
4	NILSON OSWALDO SANGUINO	88.183.875	AYUDANTE DE OBRA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X		$ 580.000,00	$ 40.400	V	COOSALUD	948639589	$ 23.200	PROTECCION	948639589	$ 92.800	$ 23.200	N/A	N/A	
5	DAIRO RUEDAS QUINTERO	1.091.592.216	MAESTRO DE OBRA	$ 1.160.000,00	X X X X X X X X X X X X X X		$ 580.000,00	$ 40.400	V	COOSALUD	948639589	$ 23.200	COLFONDOS	948639589	$ 92.800	$ 23.200	N/A	N/A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
A fecha de hoy 04 de octubre de 2022, el contratista no ha hecho entrega de la planilla de pago de seguridad social para el personal de obra, correspondiente al mes de septiembre de 2022

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 54202-68941NTS

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se describe el estado actual financiero del contrato de obra en el periodo comprendido entre el 09 al 28 febrero 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8 denominado “Informe financiero y presupuestal del contrato de obra”. Adicionalmente se resalta que no se generaron actas parciales en el periodo.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 01930 DE 2019 — **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO 2023 — **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1110 DE 2022 — **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
				TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.125.968.161,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	parcial	sep-23	$ 386.561.687	$ -	$ 386.561.687	$ -	$ -	$ -			-$ 386.561.687				
2	parcial	dic-20	$ 275.526.004	$ -	$ 662.087.691	$ -	$ -	$ -			-$ 662.087.691				
					$ 662.087.691										
					$ 463.880.470										
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 1.125.968.161,00	$ -	**$ 1.125.968.161,00**
VALOR CARACTERIZACIÓN VIAL (Incluye IVA 19%)	$ 26.261.242,47	$ 6.160.044,53	**$ 32.421.287,00**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	**$ -**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 8.887.000,00	$ -	**$ -**
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	$ 8.660.000,00	$ -	**$ 8.887.000,00**
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 1.169.776.403,47**	**$ 6.160.044,53**	**$ 1.167.276.448,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:54202-68941NTS

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado general del tiempo en el periodo comprendido entre el el 09 al 28 de febrero 2023, la información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 denominado “Estado general del tiempo”

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 01930 DE 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco									21,5	22	24	24	21	24	24	21	24	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				466,5
Lluvias moderadas									2,5	2			3			3		3														13,5
Lluvias intensas																																0
Total horas										24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				456

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nomt **BLADIMIR CARRASCAL RUEDA**
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 152064-0620520STD

Firma
Nombre: **FABRIANY M. ASCANIO CONTRERAS**
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-188028NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo comprendido entre el 09 al 28 febrero 2023, se realizó la toma de muestras para ensayos de laboratorio, del material subbase y base granular, de acuerdo a las actividades a ejecutar, sin embargo, los resultados se reportaran en el próximo informe mensual. Esta información se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 denominado “Resumen ensayos laboratorio”, cuando aplique en la ejecución de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 29/03/2023 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 01930 DE 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO 2023 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1110 DE 2022 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	18-feb-23	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO DE ARENA	INV-E-161-2013		2	Gci(90)>=95%	96,28%	si	SUBBASE GRANULAR
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:
en este mes se realizaron los ensayos densidad para el mes marzo se presentaran los resultados de concreto

NOTAS:
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: **CLAUIDA ROCIO MORALES TOLEDO**
Director Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-68941NTS

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha se está revisando los documentos del plan de calidad presentado por el contratista de obra a la anterior interventoría.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

• Seguimiento a la inversión de anticipo N/A

N/A debido a que no se realiza anticipo.

Formatos MEPI-MN-IN-2-FR-1y MEPI-MN-IN-2-FR-2

• Seguimiento programa de obra

• Seguimiento programa de inversiones

En este periodo por ser tan corto no se realizaron comités de obra.

Durante el presente mes no se realizaron socializaciones con la comunidad

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	1110-2022
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIO:	29 DE AGOSTO 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	12 OCTUBRE 2022
FECHA REINICIO:	10 DE FEBRERO 2023
FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	7 DE ABRIL DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 65.987.262,50
ADICIONAL	$ 22.512.737,50
VALOR ACUMULADO	$ 88.500.000,00

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual. La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 9-44-10102851 de SEGUROS DEL ESTADO S.A. fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA						
			Desde				Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 6.598.726,25	25	7	2022		10	4	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 13.197.452,50	25	7	2022		10	10	2023
Calidad del servicio	30%	$ 19.796.178,75	10	10	2022		10	10	2027

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 10 al 28 de febrero de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de obra N° 01930 de 2019.

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Comités de seguimiento de la ejecución del contrato de obra.
- ✓ Revisión de las cantidades ejecutadas en obra, en base a los diseños y documentos técnicos.
- ✓ Realización y revisión de avance de acuerdo a la programación presentada y flujo de intraversiones.
- ✓ Control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizaron recorridos periódicos por el corredor vial intervenido y toma de registro fotográfico a los sitios del proyecto y de las actividades ejecutadas.

- ✓ Se hace control y trazabilidad del proyecto a través de la bitácora de obra.

- ✓ La interventoría llevó a cabo el seguimiento y control a la implementación del PMT.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA

En este período se realizaron actividades, que para su control demandan recursos o logística que afectan el rubro costos de alquiler de equipos; en el cuadro “Equipo de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-5, se indica el estado o nivel de uso de los equipos a nivel diario; en general en este cuadro podrá observarse que el estado para todos y cada uno de los equipos considerados contractualmente.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2022 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA- ALTO EL BUEY, MUNICIPIO DE LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER (CODIGO BPIN 20181301010058)

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1110 DE 2022 **INTERVENTORÍA:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

CONTRATO DE OBRA No. 01930 DE 2019 **CONTRATISTA:** CONSORCIO LA PLAYA 2019

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA. LINEA T115F1 PLACA HKG-09G. CILIDRAJE 115CC										A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS

Firma
Nombre: **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría.

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría	30%
Fabriany M. Ascanio Contreras	Residente de Interventoría	100%

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El Cuadro “Información financiera del contrato de interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se presentan los movimientos a nivel mensual de costos de la interventoría, del saldo de contrato y del saldo del registro presupuestal.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

6.6.1 Seguimiento a la inversión del anticipo

El contrato de interventoría No 1110-2022 no pactó anticipo.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de obra No 01930 de 2019, completa al finalizar este primer período luego del reinicio N°2, comprendido entre el 09 al 28 febrero del 2023, presenta una inversión del presente periodo se llega al 83,75 % de ejecución total.

El CONSORCIO LA PLAYA 2019, respecto de la programación mensual para el periodo 1 obtuvo el siguiente rendimiento en obra:

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		$ 878.216.513,00		83,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		$ 878.216.513,00		83,75%

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega de oportuna de la documentación solicitada, con el fin de evitar inconvenientes que desenfunden en multas y sanciones, de acuerdo a las cláusulas establecidas en el contrato de obra

Se recomienda al contratista continuar con la entrega de soportes de la afiliación del personal y toda la información relacionada con pagos de seguridad social.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DESDE El 10 al 28 FEBRERO 2023

FECHA	No OFICIO	REMITENTE	ENTIDAD	DESTINATARIO	ASUNTO
19 de enero de 2023	DT-OCA 2051	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	INVIAS. Territorial Ocaña	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Asunto: APROBACIÓN PROFESIONAL - INGENIERO RESIDENTE CTO INTERVENTORIA 1110 de 2022
22 de febrero de 2023	DT-OCA 9258	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	INVIAS. Territorial Ocaña	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	ACTIVACION INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARA FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE HACARI

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

DT-OCA 2051

Ocaña, 19 de enero de 2023

INGENIERO
JESUS ORLANDO VIVAS
Director Interventoría
CTO INTERVENTORIA NO. 1110 DE 2022
interventoria1110de2022@gmail.com
Cúcuta - Norte De Santander

Asunto: APROBACIÓN PROFESIONAL - INGENIERO RESIDENTE CTO INTERVENTORIA 1110 de 2022

Cordial saludo,

Por medio del presente se informa que, una vez revisada la hojas de vida del profesional entregado a la Entidad mediante el radicado No. 002-2023 del 18 de enero de 2023, esta cumple con los lineamientos de la invitación pública No. IP-DT-OCA-003-2022 y su anexo técnico y dada la revisión realizada el 19 de enero de 2023 en la base de datos de dedicaciones de los profesionales de las interventorías del INVÍAS, este cuenta con la disponibilidad de dedicación requerida para el proyecto, por lo cual, muy respetuosamente se informa lo siguiente:

. Ingeniero FABRIANY MAURICIO ASCANIO CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.653.811 cumple con los requisitos y es **admitido** para participar en el proyecto en el cargo de Ingeniero residente.

La anterior aprobación se lleva a cabo con base en que la profesional MARIA JOSE TARAZONA GELVEZ que ocupaba este cargo en el contrato de interventoría No. 1110 de 2022, aprobada mediante radicado No DT-OCA 50556 de fecha 26 de agoto de 2022, solicitó formalmente desvinculación del contrato mediante comunicación recibida el 19 de diciembre de 2022 para participar en otro proyecto.

Se recuerda que el personal de dedicación completa para la interventoría debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales, por otra parte, es de conocimiento que los profesionales aprobados para el contrato de interventoría No. 1110 de 2022, no podrán ser sustituidos o cambiados sin justa causa y previa aprobación y aceptación del Instituto.

Adicional a lo anterior, cabe resaltar que el presente comunicado tiene como finalidad la aprobación de personal, sin embargo, para la incorporación del personal a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación de cada uno de ellos se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa autorización del supervisor del contrato.

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

DT-OCA 2051

Atentamente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

Instituto Nacional de Vías
Calle 7 # 29 - 259 Av. Francisco Fernandez de Contreras
Ocaña - Norte de Santander - Tels: (057) 5611670 / 14
http://www.invias.gov.co

MINISTERIO DE TRANSPORTE INVIAS

DT-OCA 9258

Ocaña, 22 de febrero de 2023

INGENIERO
JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO 1110 DE 2022
interventoria1110de2022@gmail.com
Cúcuta - Norte De Santander

Asunto: Activacion Ingeniero Residente de interventoria para frente de obra municipio de Hacari

Respetado Ingeniero Vivas,

En atención a la solicitud presentada y dado que el contrato de obra No. 1932-2019 del municipio de Hacari ya cuenta con su reinicio, esta supervisión autoriza la activación del personal relacionado a continuación, para la ejecución del contrato de interventoría No. 1110 de 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.", a partir de la fecha.

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Maria José Tarazona Gelvez	60.293.349	Ingeniera Residente

Atentamente,

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña

Proyecto: BRAYAN CAMILO CRIADO

Instituto Nacional de Vías
Calle 7 # 29 - 259 Av. Francisco Fernandez de Contreras
Ocaña - Norte de Santander - Tels: (057) 5611670 / 14 1/1
http://www.invias.gov.co

Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.				
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL 29 DE AGOSTO DE 2022 AL 31 DE AGOSTO DE 2022				
FECHA	**No DE OFICIO**	**DESTINATARIO**	**ENTIDAD/EMPRESA**	**ASUNTO**
16 de enero de 2023	Oficio-001-2023	GUSTAVO LAMUS MURILLO	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	APROBACION A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 05, DEL CONTRATO No.01930 DE 2019.
18 de enero de 2023	Oficio-002-2023	ELIAS JAIMES FERNANDEZ Director Territorial Ocaña y Supervisor.	Director Territorial Ocaña y Supervisor	PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA
13 febrero de 2023	Oficio-003-2023	CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO	Consorcio La Playa 2019	SOLICUTD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA
21 febrero de 2023	Oficio-004-2023	ELIAS JAIMES FERNANDEZ Director Territorial Ocaña y Supervisor.	Director Territorial Ocaña y Supervisor	SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1110 de 2022 de INVÍAS

Oficio-001-2023

San José de Cúcuta, 16 de enero de 2023

Ingeniero
GUSTAVO LAMUS MURILLO
Supervisor Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Vías Contrato No. 01930 de 2019
Gobernación de Norte de Santander

REFERENCIA: SOLICITUD AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 05 CONTRATO DE OBRA No. 01930 DE 2019: "MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR LA PLAYA – CURASICA – ALTO EL BUEY, MUNICIPIO LA PLAYA, NORTE DE SANTANDER".

ASUNTO: APROBACION A LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 05, DEL CONTRATO No.01930 DE 2019.

Cordial Saludo,

De acuerdo con las actividades de seguimiento y control desarrolladas por esta interventoría al Contrato de la referencia; nos permitimos informar que, una vez analizada la solicitud de la ampliación de la Suspensión No. 05, realizado por la contratista a través de oficio, de fecha enero 13 de 2023, esta interventoría considera, que se han encontrado motivos suficientes para aprobar la ampliación a la suspensión No. 05 del Contrato de Obra No.01930 de 2019, ya que no ha sido posible que la Trituradora El Guayabal S.A.S tenga el material disponible de sub base granular y arena lavada y el triturado 3/4" para la fecha de reinicio que se había programado inicialmente.

Por esta razón, esta interventoría considera pertinente ampliar la suspensión No. 05 al Contrato de Obra No.01930 de 2019, hasta el día 25 de enero 2023.

APROBACIÓN A SOLICITUD DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN N°5.

Cualquier aclaración al respecto con gusto la atenderemos.

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1110 de 2022 de INVÍAS

Cordialmente,



JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64

Copias

a) ELIAS JAIMES FERNANDEZ, Director Territorial Ocaña y Supervisor de interventoría. Correo: ejaimes@invias.gov.co
b) EFRAIN ALEXANDER PACHECO ROJAS, secretario de vías Gobernación Norte de Santander. Correo: secvias@nortedesantander.gov.co
c) CLAUDIA ROCIO MORALESTOLEDO. R/L CONSORCIO LA PLAYA 2019 Correo: claurociomorales@hotmail.com

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1110 de 2022 de INVÍAS

Oficio-002-2023

San José de Cúcuta, 16 de enero de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
ejaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE HOJAS DE VIDA PERSONAL DE INTERVENTORIA

Cordial saludo,

Apreciado Ingeniero de acuerdo con las obligaciones contractuales de la interventoría, comedidamente remitimos para su respectiva revisión y si lo considera pertinente aprobación, las hojas de vida de los siguientes profesionales:

NOMBRE	CARGO
Jesús Orlando Vivas Noguera	Director de Interventoría
Fabriany M. Ascanio Contreras	Ingeniero residente de interventoría 3

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: Interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato 1110
de 2022 de INVÍAS

Oficio-003-2023

San José de Cúcuta, 13 febrero de 2023

INGENIERA
CLAUDIA ROCIO MORALES TOLEDO
R.L. CONSORCIO LA PLAYA 2019
Contratista.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

ASUNTO: SOLICUTD DE REPROGRAMACIÓN DE OBRA

Cordial saludo,

De acuerdo a nuestras obligaciones contractuales de seguimiento y control en la ejecución del proyecto derivado del contrato en referencia se solicita la reprogramación de obra de acuerdo reinicio de obra de fecha 9 de febrero del 2023.

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

JESÚS ORLANDO VIVAS
NOGUERA
Interventor contrato 1110
de 2022 de INVÍAS

Oficio-004-2023

San José de Cúcuta, 21 febrero de 2023

Ingeniero
ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña y Supervisor.
eljaimes@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, HACARI Y LA PLAYA DEL ACUERDO 11 DEL OCAD PAZ, LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE INGENIERA RESIDENTE DE INTERVENTORIA.

Cordial saludo,


Apreciado Ingeniero la presente es para solicitar la activación de la Ingeniería María José Tarazona Gelves identificada con cédula de ciudadanía No. 60.293.349, la cual cumple con los requisitos ingeniero residente de Interventoría con una participación del 100%.

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Ingeniero civil – Especialista en Estructuras
Director de Interventoría
Celular No. 302 372 25 64
Correo: interventoria1110de2022@gmail.com

Calle 2 Faroles N° 8 E 47 Barrio Quinta Oriental - Cúcuta

Anexo 8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

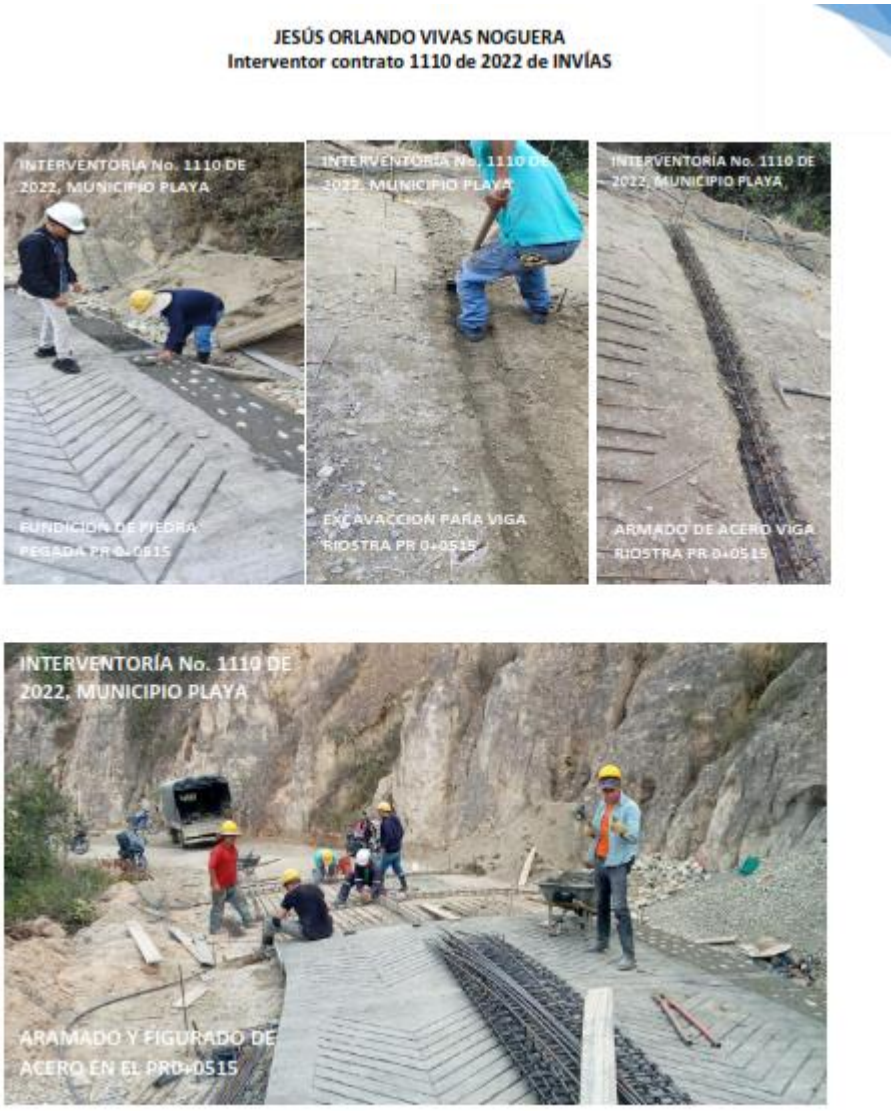

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Interventor contrato 1110 de 2022 de INVÍAS







Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
