Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - PORTADA	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.

CONTRATO No.: 1632-22

INFORME DE SUPERVISION No.: 7

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

San Juan de Pasto, marzo 2023

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESETACION:		CON CORTE :	28/02/2023

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	N/A		
CONVENIO MACRO No:	N/A		
CONTRATO No.:	GN1632 de 28 de enero de 2022		
CDP No.:	2022010144	FECHA:	17/01/2022
REGISTRO No:	2022011926	FECHA:	28/01/2022
OBJETO DEL CONTRATO:	OBJETO:CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN BANCA, en el DEL PUNTO CRÍTICO K2+000 GEORREFERENCIACIÓN 1° 28' 05.57" Norte 77° 05' 33.85" OESTE, CORRESPONDIENTE A LA VÍA DEPARTAMENTAL 25ANR01 DENOMINADA CRUCE TRAMO 2501A - SAN JOSÉ - SAN BERNARDO - LA CRUZ - SAN PABLO. LO ANTERIOR PARA ATENDER LA EMERGENCIA PRESENTADA COMO CONSECUENCIA DE LA II TEMPORADA DE LLUVIAS CON INCIDENCIA DEL FENÓMENO DE LA NIÑA.		
MODIFICACION No.:	01 del 28 de septeimbre de 2023	Prórroga de un mes	
MODIFICACION No.:	02 del 28 de diciembre 2023	Adición de recursos y prorroga hasta el 30 junio de 2023	
CONTRATISTA DE OBRA:	JAIRO GUILLERMO NARVAEZ BRAVO C.C. 98.384.058 de Pasto (N).		
CONTRATISTA INTERVENTORIA	JOSE LUIS NATES DULCECC 12.749.315		
SUPERVISOR .	ING SONIA ALEJANDRA VELASCO		
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	Ing. SONIA Y. LASSO MEDINA		
META FISICA	1 PUNTO CRITICO ATENDIDO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 1.564.849.791,00		
VALOR CONTRATO ADICIONAL1	$ 781.533.717,00		
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.346.383.508,00		
FECHA DE INICIACION:	31/01/2022		
PLAZO DEL CONTRATO:	4 MESES		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30/05/2022		
SUSPENSION	20/05/2022		
REINICIO	22/09/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 de octubre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	1 MES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	01 de noviembre de 2022		
SUSPENSION	28/10/2022		
REINICIO	27/12/2022		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de diciembre de 2022		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	6 MESES		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 de junio de 2023		
PORCENTEJE ANTICIPO	40%		

	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

TOTAL ANTICIPO	$ 625,939,916,40			
VALOR PAGADO ACTAS + ANTIC.	$ 625,939,916,40			
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO SA			
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901			
% AVANCE FISICO EN OBRA	% PROGRAMADO	42,16%	% EJECUTADO:	19,55% INFORME SEMANAL 31
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	42,16%	% EJECUTADO	40%

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - AVANCE DEL CONVENIO Y/O CONTRATO**	digo.: SIVEYC.F Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS : Con corte a 28 de febrero de 2023, el contrato se encuentra en ejecución , el contratista está realizando las obras de construcción del boxcoulverth, de lo cual presenta atraso.
La Interventoría contratada para el seguimiento y control mediante contrato GN1431-22, suscrito con el Ing. José Luis Nates, presentó el informe mensual No 6 correspondiente al mes de enero de 2023 en el que se detalla los temas técnicos del contrato hasta el 31 de enero de 2023, el informe No. 08 con corte a febrero de 2023 no ha sido presentado hasta la fecha del corte del presente informe.

Se ha requerido al contratista para que presente un plan de contingencia con el fin de que se se iguale en las obras programadas y que presente la información referente a la construcción de los anclajes, para lo cual sse le solicitó plan de trabajo, proceso constructivo y , proceso constructivo. Se realizó una visita el día 14 de febrero con los intervinientes del contrato , comunidad, alcaldía , interventoría, con el fin de verificar el avance de las obras y definir compromisos en el tema predial del talud superior, proceso que está en fase de terminación, el propietario afirma que no se opone a las obras, pero espera el pago del valor arrojado en el avaluo, en ese día se realizan compromisos por parte del Municipio.

ASPECTOS FINANCIEROS : A la fecha de corte del presente informe se ha entregado al contratista el pago del anticipo del 40 %, estipulado en el contrato. No se han presentado actas parciales a pesar de haber solicitado su presentación .

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS : Se firma acta de inicio el 31 de enero de 2022, en la actualidad esta en ejecución y su fecha de terminación es el 20 de junio de 2023

ASPECTOS LEGALES: Las pólizas se encuentran vigentes.

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se Solicitó a Interventoria verificar las condiciones para la posibilidad de adelantar un proceso de presunto incumplimiento

Proyecto: Ing. Sonia Y Lasso Medina
Profesional Universitario - SIMD
Apoyo a la Supervisión - Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. Sonia Alejandra Velasco Rodríguez
Secretaria de Infraestructura y Minas - SIMD
Departamento de Nariño

4. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto1: Sector talud superior señalizado , para cortes

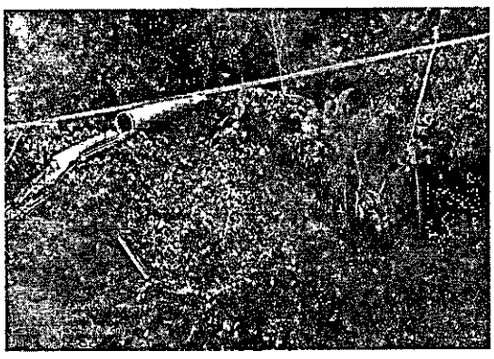


Foto 2: Sector de desviación de agua para construcción del box



Foto 3: Sector aledaño al Box, donde se necesita realizar la segunda fase determinada en el estudio complementario

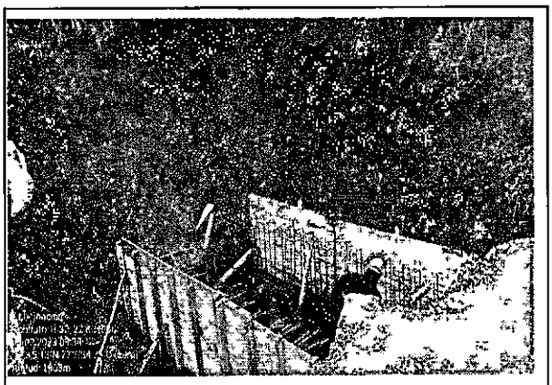


Foto 4: Trabajos de construcción de box coulverth

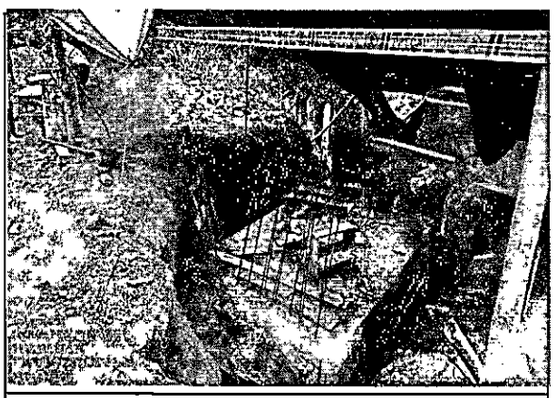


Foto 5: Sector del box coulverth construido



Foto 6: Vista general sitio de los trabajos

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No.:	GN1632-2022	$ 1.564.850.572,00

ACTAS	FECHA	VR. TOTAL	ACUMULADO	AMORT. ANTICIPO	VR. NETO	VR EGRESO	TOTAL DESC	ORDEN DE GIRO	FECHA PAGO
ANTICIPO	15/03/2022	$ 625.939.916,40	$ 625.939.916,40		$ 625.939.916,40		$ 625.939.916,40		
					$ 0,00		$ 0,00		
TOTAL		$ 625.939.916,40	$ 625.939.916,40	$ 0,00	$ 625.939.916,40	$ 0,00	$ 625.939.916,40		

AVANCE FISICO	19,55%
AVANCE FINANCIERO	40%

Nota : el valor adicional mediante modificatorio No. 02 es de $781,533,717

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

	$	1.564.850.572,00
CONTRATO No GN1632-22	$	781.533.717,00

GARANTIAS:	Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO.A.
Póliza No.:	41-44-101252829 Y 41-40-101043901

ANEXO 0			FECHA APROBACION	28/01/2022	FECHA EXPEDICION	28/01/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	13%	28-ene-22	28-nov-22	Condicioens originales	
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	28-may-22	28-may-27	Condicioens originales	
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	28-ene-22	28-may-25	Condicioens originales	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	2-may-19	2-nov-22	Condicioens originales	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	28-ene-22	28-may-22	Condicioens originales	

ANEXO 1			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	1/02/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	31-may-27	Condicioens originales	
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	31-ene-25	Condicioens originales	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-dic-22	Condicioens originales	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-may-22	Condicioens originales	

ANEXO 6			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	23/09/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-abr-23	Reinicio	
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-oct-27	Reinicio	
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	2-oct-25	Reinicio	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-dic-22	Reinicio	
ANEXO 4			FECHA APROBACION	23/09/2022	FECHA EXPEDICION	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	2-oct-22	Reinicio	

ANEXO 7			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	3/10/2022
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	2-nov-27	Modificación No. 02	
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	1-nov-23	Modificación No. 02	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	1-may-23	Modificación No. 02	
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	1-nov-22	Modificación No. 02	

ANEXO 9			FECHA APROBACION	28/12/2022	FECHA EXPEDICION	28/12/2022
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-jun-23	Reinclo 2	
Estabilidad de la obra	$ 469.454.937,30	30%	31-ene-22	30-dic-27	Reinclo 2	
Salarios y prestaciones	$ 312.969.958,20	20%	31-ene-22	30-dic-25	Reinclo 2	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Reinclo 2	
ANEXO 5			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 02	

ANEXO 11			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	2/01/2023
DETALLE	VALOR	%	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	ALERTA
Cumplimiento	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-23	Modificatorio 3	
Estabilidad de la obra	$ 703.915.052,40	30%	31-ene-22	30-dic-27	Modificatorio 3	
Salarios y prestaciones	$ 469.276.701,60	20%	31-ene-22	30-dic-25	Modificatorio 3	
Buen manejo de Anticipado	$ 625.939.916,40	40%	31-ene-22	30-jun-23	Modificatorio 3	
ANEXO 6			FECHA APROBACION		FECHA EXPEDICION	
Responsabilidad extracont	$ 300.000.000,00	19%	31-ene-22	31-dic-23	Modificación No. 03	
