1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: 001	Periodo comprendido desde el 15 Noviembre 2022 al 28 de Febrero 2023

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No 4133.010.26.1.1284-2022	
Nombre Completo del Contratista: CONSORCIO OBRAS VERDES 22	
Documento de identificación del contratista: 901634364-5	
Nombre (s) del Interventor es): JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS	
Organismo: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE - DAGMA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 93%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 93%
Objeto del contrato: REALIZAR LABORES DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJISTICA EN SEPARADORES DE LAS COMUNAS 5, 7, 8 y 13 DE SANTIAGO DE CALI".	

3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
02 DE NOVIEMBRE DE 2022	28 DE FEBRERO DE 2023

Modificación del contrato No 1: Se prorrogó el plazo de ejecución del contrato 4133.010.26.1.1284-2022 hasta el 28 de febrero de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

Acta de recibo final de obra: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato: Es hasta por la suma de: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($689.969.616).

Adición:

Prórroga:
PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato de obra No. 4133.010.26.1.1284-2022 hasta el 28 de febrero de 2023.

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 689.969.616	$ 647,554,703	$0	$ 42,414,913

PERSONA JURÍDICA:

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 13 de abril de 2023
La certificación esta expedida por el representante legal y contador del contrato

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA NATURAL

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No. Planilla: 9446702213
Operador: Aportes en línea
Fecha de Pago: 2023/03/09
Periodo de pago: febrero 2023

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TÉCNICO

Para las obras contempladas en el marco del desarrollo del contrato de obra No No. 4133.010.26.1.1284-2022 el contratista implementó diferentes frentes de trabajo en aras de lograr altos rendimientos de obra a continuación se describen de manera resumida las actividades ejecutadas:

A**CTIVIDADES ALAMEDA CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 1B2, UBICADO EN LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.**

Para el presente informe se tiene un avance físico de 100% se han adelantado obras encaminadas a realizar al cumplimiento del objeto contractual como las citadas a continuación:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Incluyen la instalación de campamentos, localización y materialización de las obras en terreno y las demoliciones de andenes y sardineles en concreto

OBRAS CIVILES

Durante la intervención del separador de la calle 52 entre carreras 1B y 1B2 se hizo la construcción de senderos peatonales y rampas peatonales que incluían un bordillo-sardinel rectangular de concreto 3000 psi, altura= 25cm, ancho= 15 cm en adoquín soportado en un lecho de arena de 10 cm de espesor y una capa de roca muerta de 25 cm de espesor compactada con saltarín o rana. Y cintas de confinamiento en concreto regularmente de 15 cm pero en curvas de ancho variable.
Para la verificación de la resistencia de los concreto se realiza la respectiva toma de muestra, de cilindro y se ensaya en laboratorio.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

LOCALIZACION Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El proyecto se encuentra localizado hacia la parte Nororiental del casco urbano de Santiago de Cali, comunas 5, 7, 8 y 13. En las 4 comunas se tuvo 5 frentes obra,

METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO

Con el propósito garantizar el seguimiento y control del desarrollo de las actividades del ejecutor, la interventoría cuenta con un Director con dedicación parcial, un Residente con dedicación completa entre obra y oficina y un inspector técnico con dedicación completa en obra y la disponibilidad de asesoría técnica necesaria.

A continuación se describen las principales actividades desarrolladas durante la ejecución de las obras para realizar el seguimiento y control por parte de la interventoría:

- ✓ Cumplimiento de la dedicación de los profesionales en obra.
- ✓ Comités de obra semanales.
- ✓ Seguimiento técnico a las actividades desarrolladas por el ejecutor.
- ✓ Verificación de ensayos de laboratorio a muestras de concreto.
- ✓ Elaboración y presentación de informes mensuales y los demás necesarios sobre el estado del proyecto y desarrollo de las actividades.
- ✓ Seguimiento y control del presupuesto de obra.
- ✓ Revisión de las afiliaciones de seguridad social del personal.
- ✓ Verificación de cumplimiento de seguridad industrial.
- ✓ Bitácora de obra.
- ✓ Archivo del Proyecto.
- ✓ Las establecidas en el contrato de interventoría

Para las obras contempladas en el marco del desarrollo del contrato de obra No No. 4133.010.26.1.1284-2022 el contratista implementó diferentes frentes de trabajo en aras de lograr altos rendimientos de obra a continuación se describen de manera resumida las actividades ejecutadas:

ACTIVIDADES ALAMEDA CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 1B2, UBICADO EN LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Para el presente informe se tiene un avance físico de 100% se han adelantado obras encaminadas a realizar al cumplimiento del objeto contractual como las citadas a continuación:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Incluyen la instalación de campamentos, localización y materialización de las obras en terreno y las demoliciones de andenes y sardineles en concreto

OBRAS CIVILES

Durante la intervención del separador de la calle 52 entre carreras 1B y 1B2 se hizo la construcción de senderos peatonales y rampas peatonales que incluían un bordillo-sardinel rectangular de concreto 3000 psi, altura= 25cm, ancho= 15 cm en adoquín soportado en un lecho de arena de 10 cm de espesor y una capa de roca muerta de 25 cm de espesor compactada con saltarín o rana. Y cintas de confinamiento en concreto regularmente de 15 cm pero en curvas de ancho variable.
Para la verificación de la resistencia de los concreto se realiza la respectiva toma de muestra, de cilindro y se ensaya en laboratorio.

MANEJO AMBIENTAL

En el componente de manejo ambiental se hizo el corte y retiro de raíz donde se realizó el corte al sistema radicular de los árboles donde se encontraron raíces al momento de realizar la actividad de excavación para la conformación de bordillos y pasos peatonales, se hizo aplicación de cicatrizante para evitar que la parte expuesta tenga las condiciones para la germinación de esporas de hongos y bacterias. se suministró tierra agrícola, Se sembró prado gateadora, Se sembraron plantas ornamentales pequeñas y medianas, se realizó poda y retiro de los sobrantes y malezas. Se sembraron 6 árboles de ´porte grande y se le hizo riego de agua hasta lograr que la planta o arbusto estuviera prendido.

AMOBLAMIENTO
Se instalaron 4 cestos para basura, se instalaron 6 bancas tipo cubo de 40x40x43. Se instalaron 8 Señaléticas, se instalaron 8 señaléticas de H 1.0 m vertical de 2 caras de altura 1 m ancho 40 cm incluye estructura de soporte y anclajes en concreto. Se instalaron 2 señaléticas tipo tótem triangular en concreto 3000 psi, H 2.90 m – 3.10 m, ancho de caras 30 cm esquinas biseladas, acabados en granito lavado gris y fichas en cerámica informativa incluye formaleta y acero de refuerzo. Se instalaron 7 bancas de concreto y metal l = 1.80 m color gris con espaldar debidamente instaladas.

COMPONENTE EDUCATIVO
se instalaron 4 señaléticas de H 0.57 m vertical de 1 cara de altura 0.57 m ancho 0.75 m incluye estructura de soporte y anclajes en concreto. Se realizo reunión informativa para empoderamiento de la comunidad. Incluye entrega de memoria descriptiva.

LIMPIEZA FINAL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se realiza retiro de sobrantes de la obra con acarreo hasta sitio de disposición autorizado, limpieza general de la zona de trabajo.

SEPARADOR COMUNA 7 ALFONSO LOPEZ ETAPA III Carrera 7 L BIS entre Calles 76 y 81

El proyecto de la comuna 7, Barrio Alfonso López etapa III, consistió en la construcción de dos pasos peatonales, en el separador de la Carrera 7L bis entre calles 76 y calle 81, como obra civil tiene la construcción de los sardineles que conforman los 2 pasos peatonales enchapados con piso tipo Deck, y 2 materas con tierra negra y plantas, realce parcial de sardinel existente y construcción de un tramo de sardinel, empradización parcial, componente ambiental, señalización y mobiliario.

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Incluyen la instalación de campamentos, localización y materialización de las obras en terreno y las demoliciones de andenes y sardineles en concreto

ORAS CIVILES
A la fecha el contratista a ejecutado el 100% de las actividades contempladas en el presupuesto entre las cuales se contemplan, excavaciones para alcanzar niveles finales de cimentación de bordillos entres otros, así como también la nivelación de la sub rasante con material de relleno, Las actividades terminadas contemplan la culminación de pasos peatonales con la construcción de un piso en deck concreto, color gris ocre y rojo dimensiones 50x14,5x6cms, instalado sobre una cama mortero de nivelación, de igual manera se instaló una loseta táctil/guía en concreto prefabricado color gris 20x20x6 cm. Todos los pasos peatonales están confinados con bordillo tipo sardinel de 45cm de alto por 20cm de ancho.

COMPONENTE AMBIENTAL
Respecto al componente ambiental se realizaron los corte y retiro de raíz que interfieren en el proceso constructivo los huecos que resultaron de la extracción de los tocones fueron rellenados, conformados y compactados hasta la superficie con el mismo nivel del terreno.
Se adelantó la remoción de las ramas muertas, enfermas o heridas, al igual que las que se tocaban entre sí. Se realizó la aplicación de abono y se hizo la cicatrización de los árboles a los que se les realizo poda aérea, la eliminación de la vegetación rastrera (hierba, maleza o residuos de sembradíos) existente en el terreno, teniendo en cuenta el nivel del terreno, el material sobrante fue dispuesto en un sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Se instaló tierra orgánica y prado gateadora, material terroso para rellenar el terreno hasta el nivel del bordillo
Para garantizar el óptimo desarrollo de del prado y las plantas ornamentales sobre el sitio a intervenir, se instaló tierra agrícola.
En el separador vial se realizó el suministro y siembra de las plantas ornamentales pequeñas medianas y grandes de las especies Isoras, camarones, lantanas, pluma de indio, crotos, carey batatilla, veraneras

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

enanas. El riego de prendimiento se realizó en la mañana en todas las zonas donde se hizo el establecimiento de prado y plantas ornamentales.

MOBILIARIO
Incluye la instalación de 3 cestos de basura y 8 bolardos metálicos M-63

SEÑALIZACION
. Se instalaron 2 señaléticas tipo tótem triangular en concreto 3000 psi, H 2.90 m – 3.10 m, ancho de caras 30 cm esquinas biseladas, acabados en granito lavado gris y fichas en cerámica informativa incluye formaleta y acero de refuerzo.
Señalización en lamina reflectiva 60x60,

COMUNA 8, BARRIO SANTAFE SEPARADOR CARRERA 18 ENTRE CALLES 33 F Y 34

En la comuna 8 se construyó un sendero peatonal, en el separador de la carrera 18 entre calles 33F y calle 34, la obra civil fue el sendero en concreto de 2.0 m de ancho, una plazoleta en concreto, además cuenta con empradización parcial, mobiliario, y señalización.

OBRA CIVIL
La obra civil se encuentra terminada, consistió en sendero en concreto de ancho 2.0 m y 10 cm de espesor, sobre una capa de roca muerta de 20 cm de espesor compactada a 95 PM, se tomaron ensayos de densidades y cilindros para ensayo a compresión y determinar la resistencia del concreto fabricado

COMPONENTE AMBIENTAL
Respecto al componente ambiental se realizaron los corte y retiro de raíz que interfieren en el proceso constructivo los huecos que resultaron de la extracción de los tocones fueron rellenados, conformados y compactados hasta la superficie con el mismo nivel del terreno.
Se adelantó la remoción de las ramas muertas, enfermas o heridas, al igual que las que se tocaban entre sí. Se realizó la aplicación de abono y se hizo la cicatrización de los árboles a los que se les realizo poda aérea, la eliminación de la vegetación rastrera (hierba, maleza o residuos de sembradíos) existente en el terreno, teniendo en cuenta el nivel del terreno, el material sobrante fue dispuesto en un sitio aprobado por la autoridad ambiental.
Se instaló tierra orgánica y prado gateadora, material terroso para rellenar el terreno hasta el nivel del bordillo
Para garantizar el óptimo desarrollo de del prado y las plantas ornamentales sobre el sitio a intervenir, se instaló tierra agrícola.
En el separador vial se realizó el suministro y siembra de las plantas ornamentales pequeñas de las especies Isoras, camarones, lantanas, pluma de indio, crotos, carey batatilla. El riego de prendimiento se realizó en la mañana en todas las zonas donde se hizo el establecimiento de prado y plantas ornamentales.

MOBILIARIO

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se instalaron 2 cestos de basura y 4 bancas prefabricadas en concreto debidamente instaladas

LIMPIEZA FINAL
Se realiza retiro de sobrantes de la obra con acarreo hasta sitio de disposición autorizado, limpieza general de la zona de trabajo.

COMUNA 13 BARRIO RICARDO BALCAZAR SEPARADOR VIAL calle 72 B y calle 72 C con la carrera 26 L hasta la carrera 26 M

la obra civil consistió en senderos y plazoletas en adoquín de concreto confinado, empradización, componente ambiental, Juegos infantiles, mobiliario y señalización.

Para el presente informe se tiene un avance físico de 100% se han adelantado obras encaminadas a realizar al cumplimiento del objeto contractual como las citadas a continuación:

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Incluyen la instalación de campamentos, localización y materialización de las obras en terreno y las demoliciones de andenes y sardineles en concreto

OBRAS CIVILES
Durante la intervención del separador se hizo la construcción de senderos peatonales y rampas peatonales que incluían un bordillo-sardinel rectangular de concreto 3000 psi, altura= 45cm, ancho= 15 cm en adoquín soportado en un lecho de arena de 10 cm de espesor y una capa de roca muerta de 30 cm de espesor compactada con saltarín o rana. Y cintas de confinamiento en concreto regularmente de 15 cm pero en curvas de ancho variable.
Para la verificación de la resistencia de los concreto se realiza la respectiva toma de muestra, de cilindro y se ensaya en laboratorio.

MANEJO AMBIENTAL
En el componente de manejo ambiental se hizo el corte y retiro de raíz donde se realizó el corte al sistema radicular de los árboles donde se encontraron raíces al momento de realizar la actividad de excavación para la conformación de bordillos y pasos peatonales, se hizo aplicación de cicatrizante para evitar que la parte expuesta tenga las condiciones para la germinación de esporas de hongos y bacterias. se suministró tierra agrícola, Se sembró prado gateadora, Se sembraron plantas ornamentales pequeñas y medianas, se realizó poda y retiro de los sobrantes y malezas. se le hizo riego de agua hasta lograr que la planta o arbusto estuviera prendido.

AMOBLAMIENTO
Se instalaron 6 cestos para basura, se instalaron 11 bancas tipo cubo de 40x40x43. Se instalaron 8 Señaléticas, se instalaron 3 señaléticas de H 1.0 m vertical de 2 caras de altura 1 m ancho 40 cm incluye

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

estructura de soporte y anclajes en concreto. Se instalaron 7 bancas de concreto y metal l = 1.80 m color gris con espaldar debidamente instaladas.

COMPONENTE EDUCATIVO
se instalaron 6 señaléticas de H 0.57 m vertical de 1 cara de altura 0.57 m ancho 0.75 m incluye estructura de soporte y anclajes en concreto. Se realizó reunión informativa para empoderamiento de la comunidad. Incluye entrega de memoria descriptiva.

JUEGOS INFANTILES
Está en proceso de inclusión como ítems no previsto 1 pasamanos, 1 columpios de 4 puestos,1 balancín de 6 puestos y 1 parque AE001

LIMPIEZA FINAL
Se realiza retiro de sobrantes de la obra con acarreo hasta sitio de disposición autorizado, limpieza general de la zona de trabajo.

OBSERVACIONES: Queda en curso de inclusión los ítems no previstos, aprobados por la interventoría, de acuerdo a la solicitud presentada por el contratista, quien recibió petición de la comunidad aledaña a la obra en representación de la junta de acción comunidad que solicito mejorar la capacidad de uso de población infantil y primera infancia.

COMUNA 13 BARRIO YIRA CASTRO COMUNEROS II SEPARADOR VIAL carrera 28D3 entre calles 70 y 72 i

la obra cuenta con empradización, componente ambiental, mobiliario, y señalización.

ACTIVIDADES PRELIMINARES
Incluyen la instalación de campamentos, localización y materialización de las obras en terreno y las demoliciones de andenes y sardineles en concreto

OBRAS CIVILES
la obra civil consistió en la recuperación del sardinel derecho y realce del mismo, construcción de 16 pasos peatonales, en piso tipo Deck, coincidiendo con las vías peatonales de la margen derecha de la carrera 28 D3,A la fecha el contratista a ejecutado el 100% de las actividades contempladas en el presupuesto entre las cuales se contemplan, excavaciones para alcanzar niveles finales de cimentación de bordillos entre otros, así como también la nivelación de la sub rasante con material de relleno, Las actividades terminadas contemplan la culminación de 16 pasos peatonales con la construcción de un piso en deck concreto, color gris ocre y rojo dimensiones 50x14,5x6cms, instalado sobre una capa mortero de nivelación, de igual manera se instaló una loseta táctil/guía en concreto prefabricado 20x20x6 cm. Todos los pasos peatonales están confinados con bordillo tipo sardinel de 45cm de alto por 20cm de ancho.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMPONENTE AMBIENTAL

Respecto al componente ambiental se realizaron los corte y retiro de raíz que interfieren en el proceso constructivo los huecos que resultaron de la extracción de los tocones fueron rellenados, conformados y compactados hasta la superficie con el mismo nivel del terreno.

Se adelantó la remoción de las ramas muertas, enfermas o heridas, al igual que las que se tocaban entre sí. Se realizó la aplicación de abono y se hizo la cicatrización de los árboles a los que se les realizo poda aérea, la eliminación de la vegetación rastrera (hierba, maleza o residuos de sembradíos) existente en el terreno, teniendo en cuenta el nivel del terreno, el material sobrante fue dispuesto en un sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Se instaló tierra orgánica y prado gateadora, material terroso para rellenar el terreno hasta el nivel del bordillo

Para garantizar el óptimo desarrollo de del prado y las plantas ornamentales sobre el sitio a intervenir, se instaló tierra agrícola.

En el separador vial se realizó el suministro y siembra de 4 plantas ornamentales por cada uno de los pasos peatonales, pequeñas medianas de las especies Isoras, camarones, lantanas, pluma de indio, crotos, carey batatilla. El riego de prendimiento se realizó en la mañana en todas las zonas donde se hizo el establecimiento de prado y plantas ornamentales.

MOBILIARIO

Incluye la instalación de 2 cestos de basura en toda la obra en la calle 70 y en la calle 72i

Por cada uno de los 16 pasos peatonales se instalaron 4 bolardos metálicos M-63

SEÑALIZACION

Se instalaron 16 señaléticas tipo tótem triangular en concreto 3000 psi, H 2.90 m – 3.10 m, ancho de caras 30 cm esquinas biseladas, acabados en granito lavado gris y fichas en cerámica informativa incluye formaleta y acero de refuerzo.

,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ACTIVIDADES ALAMEDA CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 1B2, UBICADO EN LA COMUNA 5 DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI..

	
Socializacion del proyecto	Socializacion del proyecto

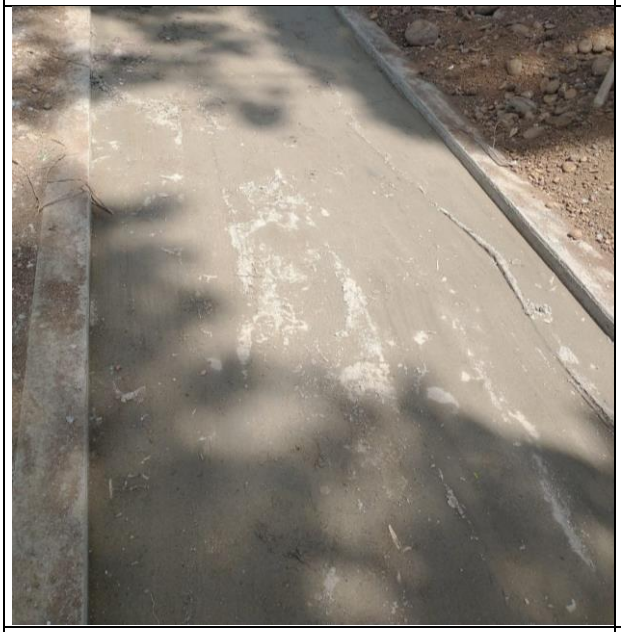
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Localizacion en campo del proyecto	Visita funcionarios del Dagma
	
Localizacion en campo de senderos	Excavacion para sardineles

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Excavacion para bordillos	Colocacion y compactacion de rocamuerta
}	
	
Sicatrizacion de raiz de arbol	Formaleteado para fundicion de sardinel

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Fundicion de Bordillos-Sardinel	Material para relleno lateral de sardineles
	
Capa de arena nivelada con rana	Inicio de instalacion de adoquin

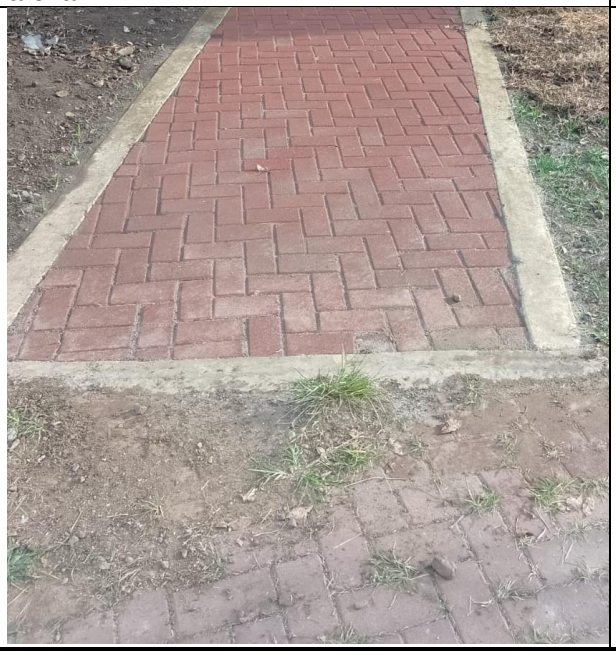
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Instalacion de adoquin sellado de juntas con arena



Sendero en adoquin con sus respectivas juntas de confinamiento.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Inicio de la obra es la continuacion del sendero



Retiro de material sobrante

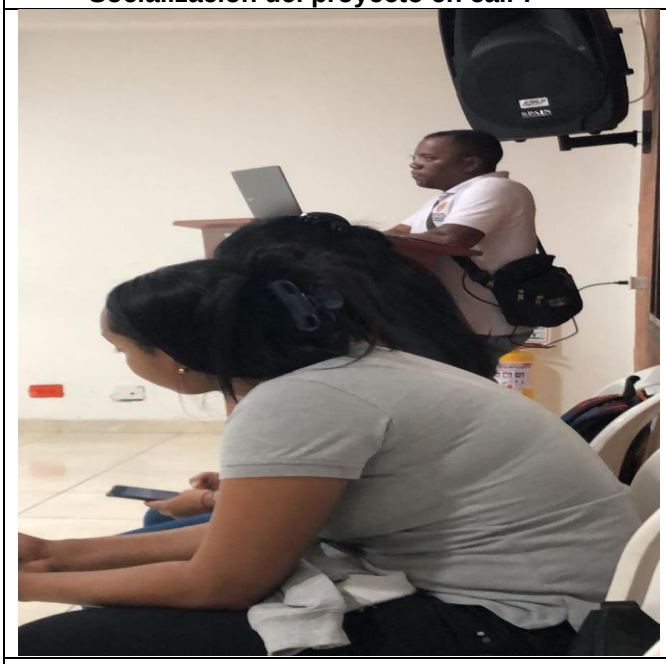


Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Plazoleta adoquinada	Construcción de rampas en adoquin
	
rampa en adoquin	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

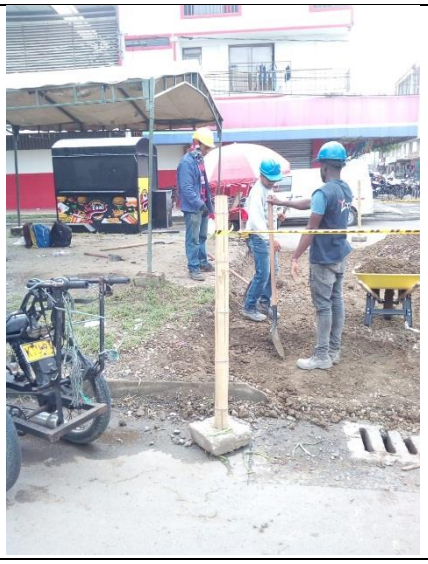
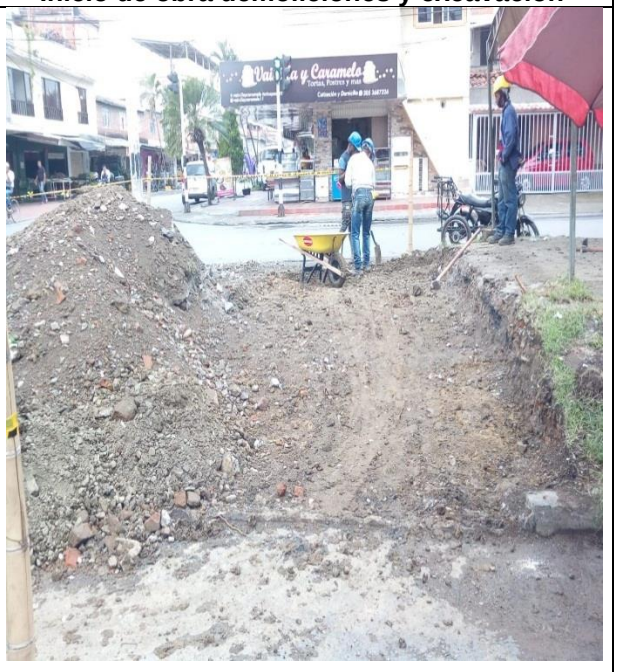
COMUNA 7, SEPARADOR VIAL CARRERA 7 L BIS ENTRE CALLES 76 Y 81 BARRIO ALFONSO LOPEZ ETAPA III

	
Socializacion del proyecto en cali 7	**Socializacion del proyecto en Cali 7**
	
Socializacion del proyecto en cali 7	**Socializacion del proyecto en Cali 7**

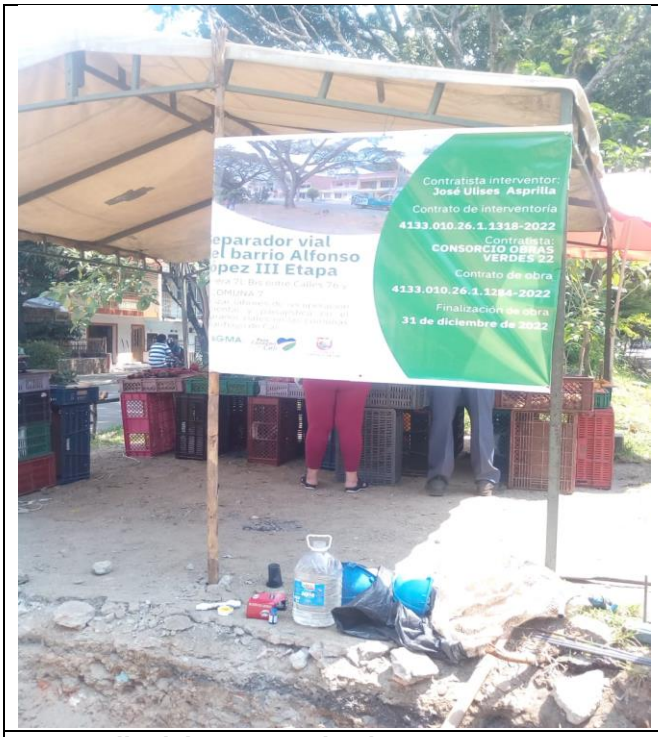
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Condiciones iniciales antes de la intervencion	**Condiciones iniciales antes de la intervencion**
	
Condiciones iniciales antes de la intervencion	**Condiciones iniciales antes de la intervencion**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Inicio de obra demoliciones y excavación	**Inicio de obra demoliciones y excavación**
	
Inicio de obra demoliciones y excavación	**Inicio de obra demoliciones y excavación**

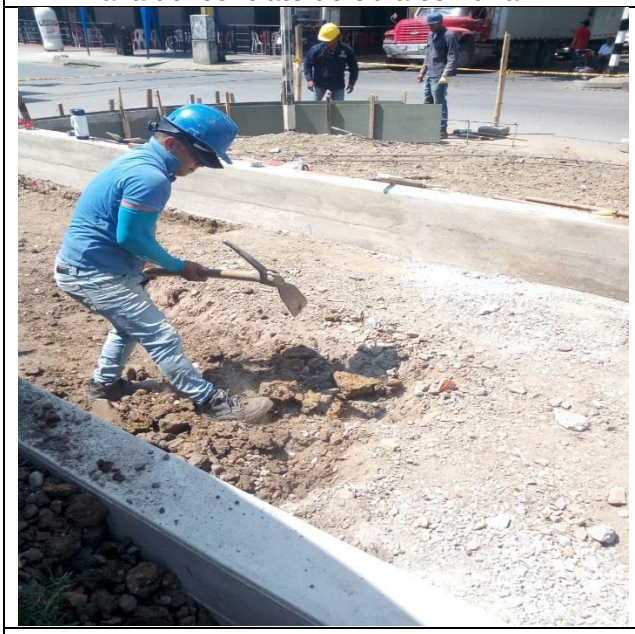
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Valla del contrato de obra comuna 7



Encofrado para función de sardinel Calle 76



Excavacion manual paso peatonal calle 76

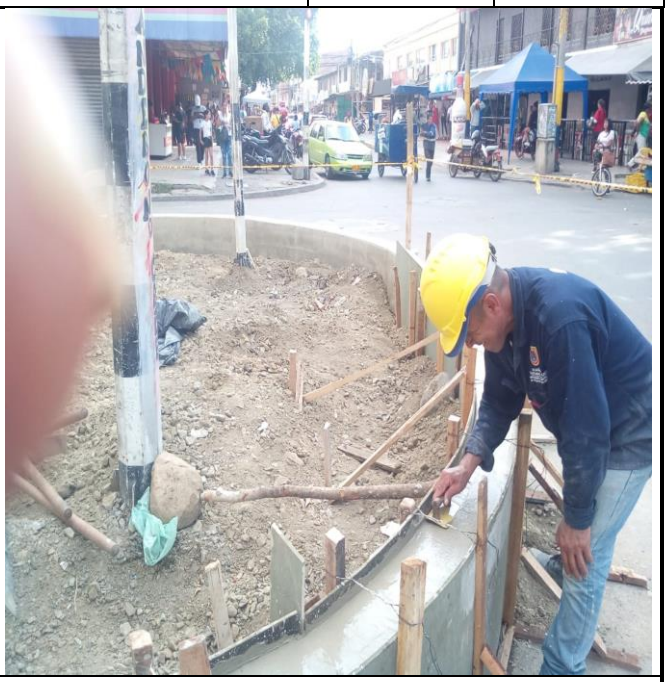


Fundición sardinel Cra 7Lbis con calle 76

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Fundicion sardinel Cra 7Lbis con Calle 76



Acolillado de sardinel



Excavacion para el paso peatonal



Detallado de sardinel en concreto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



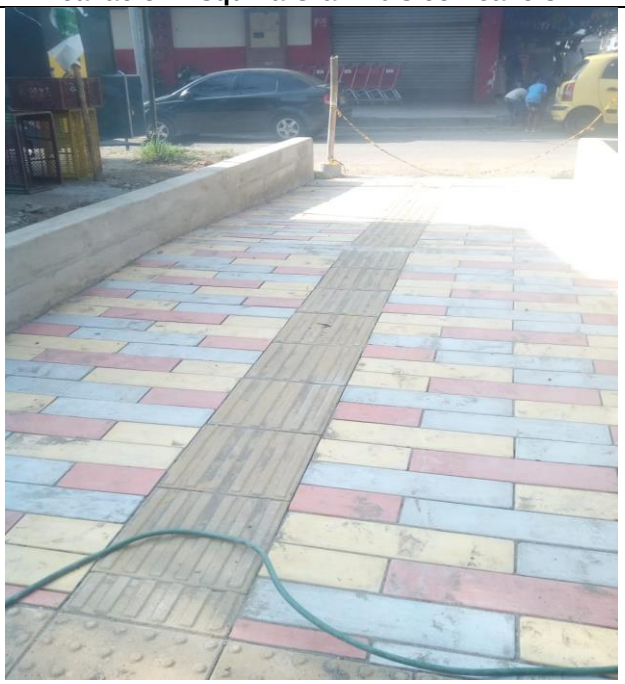
Colocación mortero de alistado de piso Deck



Excavacion Esquina Cra 7Lbis con calle 81

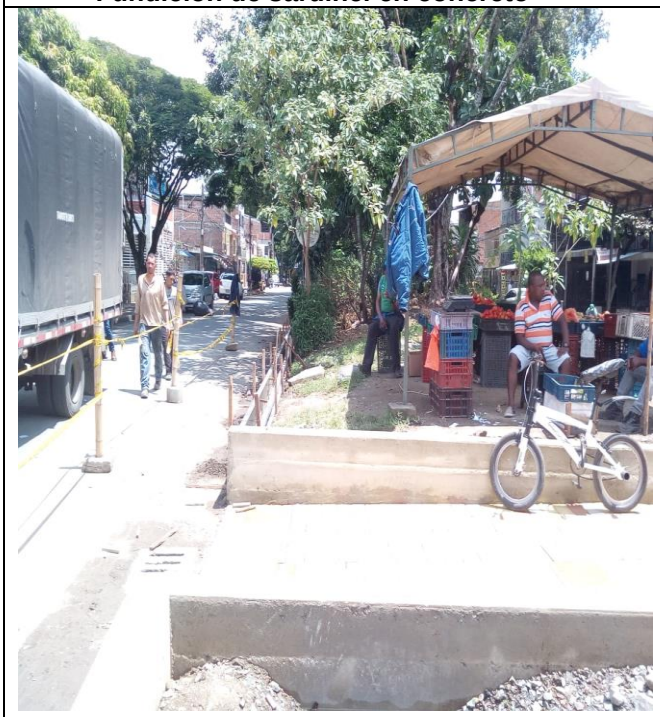


Excavacion Esquina Cra 7Lbis con calle 81



Instalacio de Piso tipo Deck con baldosa tactil

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Fundicion de sardinel en concreto	**Fundición sardinel paso de calle 81**
	
Realce de sardinel Cra 7Lbis	**Construcción y Realce de sardinel Cra 7Lbis**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Visita a la obra funcionarios del Dagma



Sellado de juntas en paso de calle 81



Instalacion de loseta táctil paso de Calle 81

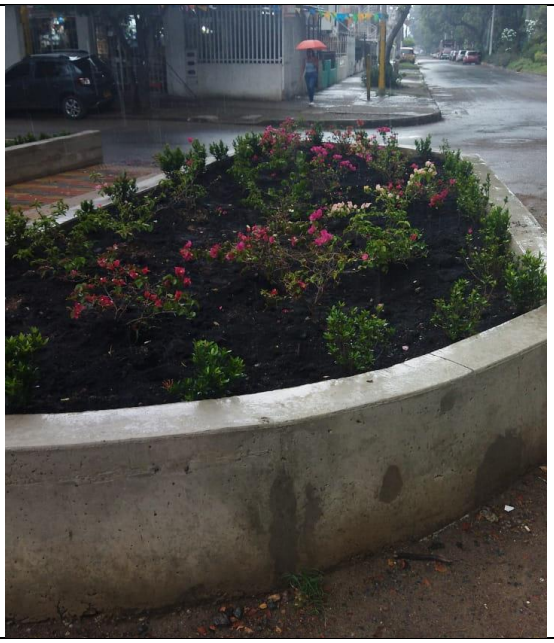
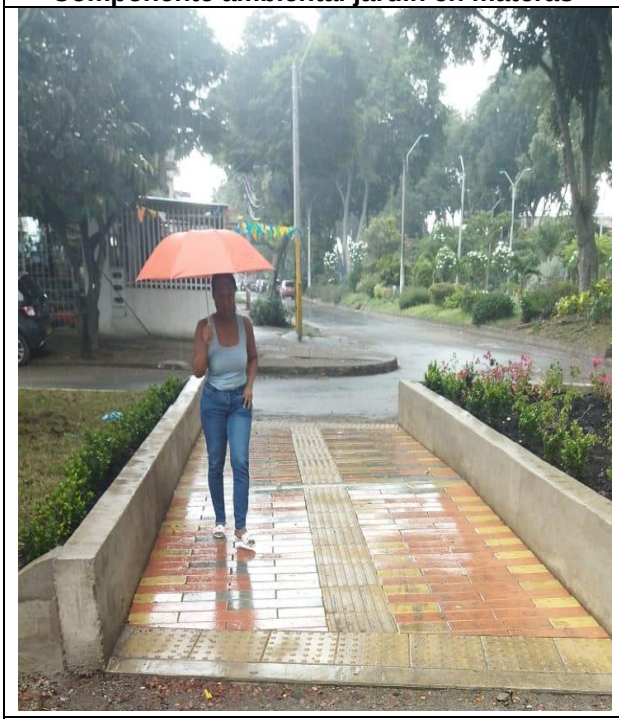


Realce de ardinel carera 7Lbis

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Realce de sardinel en concreto Cra 7Lbis	**Fundicion de sardinel que conforma matera**
	
Paso de Cra 7Lbis con calle 81 piso DEck y loseta tactil	**Paso de Cra 7Lbis con calle 81 piso Deck y loseta tactil**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Componente ambiental jardín en materas	**Componente ambiental jardín en materas**
	
Paso peatonal Cra 7Lbis calle 81 terminado	**Paso peatonal cra 7Lbis con calle 76**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 8, SEPARADOR VIAL BARRIO SANTAFE CARRERA 18 ENTRE CALLES 33F Y 34

	
Localizacion e inicio de xcavacion	**Excavaciones para senderos peatonales**
	
Colocacion de rocamuerta compactada	**Fundición de sendero peatonal en concreto**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Sendero peatonal losa ancho 2.0 m y E 10 cm y reforzado con malla electrosoldada de 4 mm	**Excavacion para plazoleta en concreto reforzad**
	
Proceso de excavación para plazoleta	**Plazoleta Fundida con malla electrosoldada**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Tramo formaleteado con malla electro soldada 4 mm	**Sendero fundido con acabado escobiado y acolillado ancho 2.0 m**
	
Instalacion de bancas tipo Mio en concreto en la plazoleta	**Plantas pequeñas y medianas sembradas con tierra organica**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Arboles tamaño grande para ser sembrados	**Señal ética instalada con base de concreto**
	
Limpieza general y retiro de maleza	**Retiro de sobrantes con cargue a mano**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 13, BARRIO RICARDO BALCAZAR, SEPARADOR VIAL CALLE 72 B Y CALLE 72 C CON LA CARRERA 26 L HASTA LA 26 M



Socializacion la comuna 13 con la comunidad



Presentacion del proyecto a la comunidad



Localizacion de senderos en campo

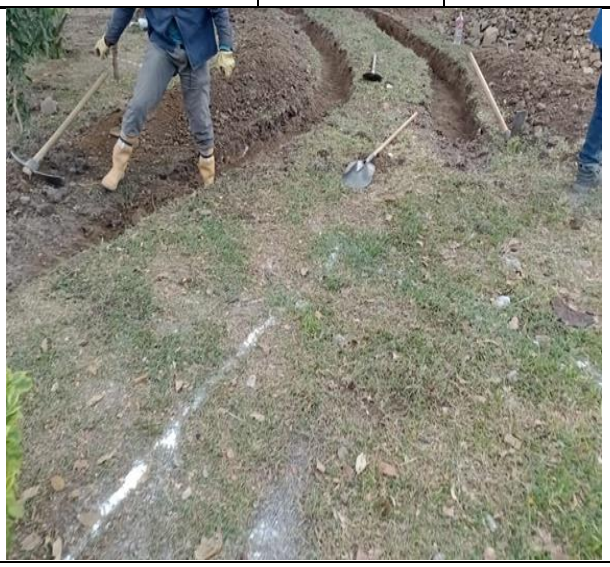


Localización de senderos en campo Ricardo B

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Demolicion de andenes en concreto existentes



Excavacion para sardinel de senderos



Excavaciones para senderos



Suministro de Rocamuerta para relleno

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Compactacion de rocamuerta al 95 PM	**Compactacion de rocamuerta al 95 PM**
	
Formaleteado y fundición de sardinel para conformar los senderos	**Relleno lateral de sardineles con material de rocamuerta**

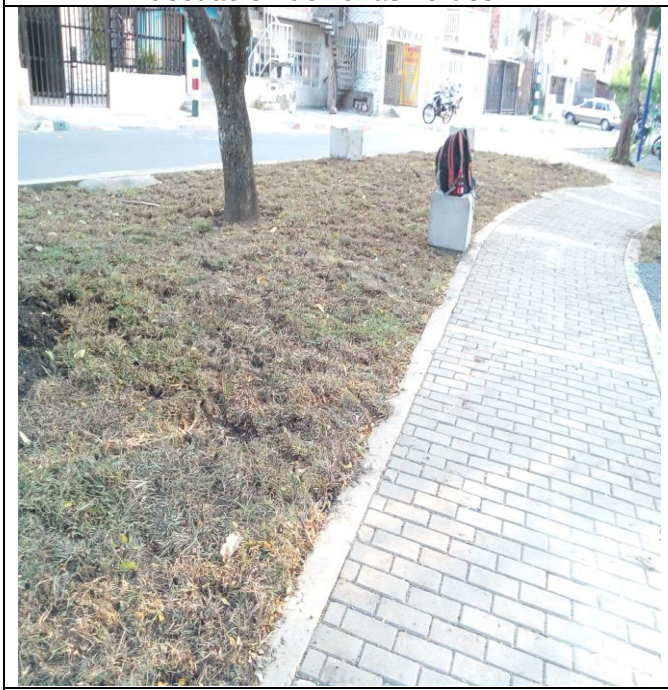
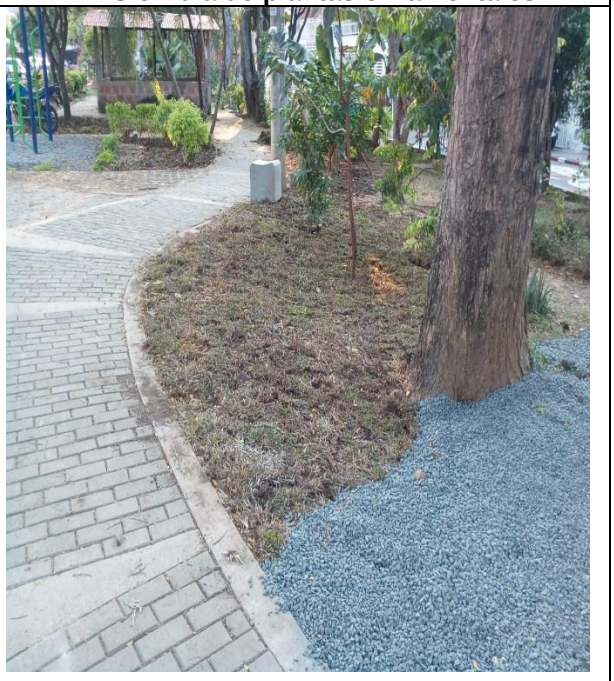
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Retiro de sobrantes cargue a mano en volqueta	**Colocacion de capa de arena y disposición de adoquines para su instalacion**
	
Colocacion de capa de arena	**Colocacion de adoquin en concreto color gris**

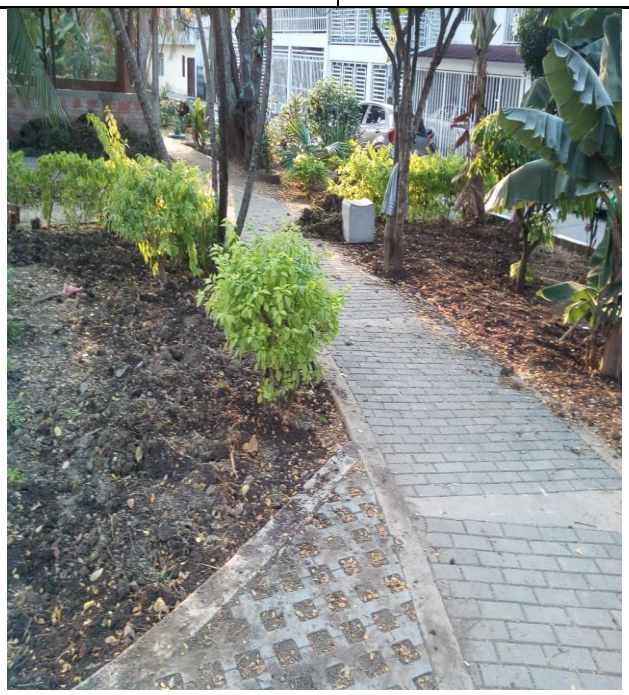
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Colocacion de cestos de para basura	**Suministro de bancas tipo cubo**
	
Bancas en concreto con espaldar	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Adecuacion de zonas verdes	**Siembra de plantas ornamentales**
	
Empradizado y bancas en concreto tipo cubo	**Emprdizado y bancas tipo cubo en concreto**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Plantas medianas sembradas gramoquin



Detalle instalación de gramoquin



Señal ética aluciva a mantener los espacios limpios y usar los cestos dispuestos para basura



Empradizacion y gravilla para zona de juegos infantiles

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

COMUNA 13, YIRA CASTRO, COMUNEROS II SEPARADOR VIAL DEL TRAMO CARRERA 28 D3 ENTRE CALLES 70 Y 72i

	
Socializacion del proyecto comuna 13	**Visita campo con la comunidad demolicion**
	
Demolición de sardinel existente,	**Demolicion sardinel y estruct en concreto**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Fundicion sardinel en concreto	**Colocacion de anclajes con varilla 3/8”**
	
Formaletas instaladas y fundicin de tramo de sardinel en concreto de 3000 psi	**Formaletas instaladas y fundicin de tramo de sardinel en concreto de 3000 psi**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Retiro de material sobrante cargue a mano y en volqueta	**Demolición de losas en concreto existentes en el separador**
	
Demolicion manual de losas en conceto existentes en el separador	**Sardineles para conformar los pasos peatonales fueron 16 pasos peatonales**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Colocacion de roca muerta para ser compactada



Colocacion de piso tipo Deck y loseta táctil en los extremos del paso peatonal



Colocacion de piso tipo deck base concreto son 16 pasos peatonales



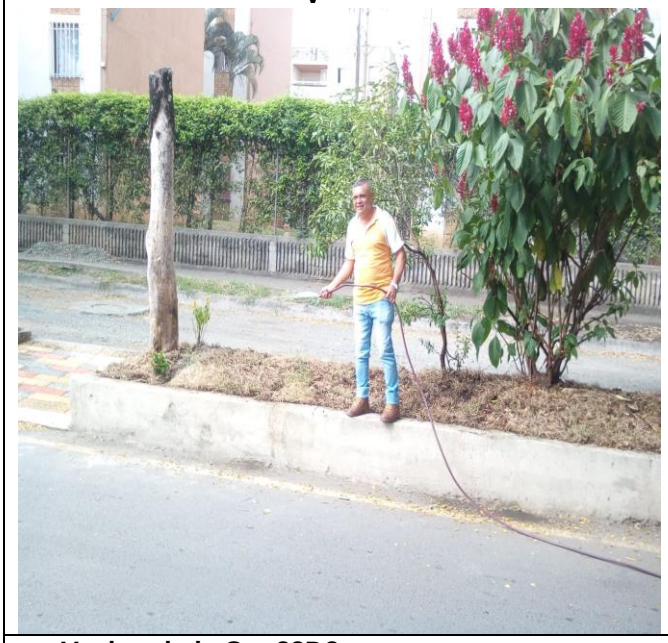
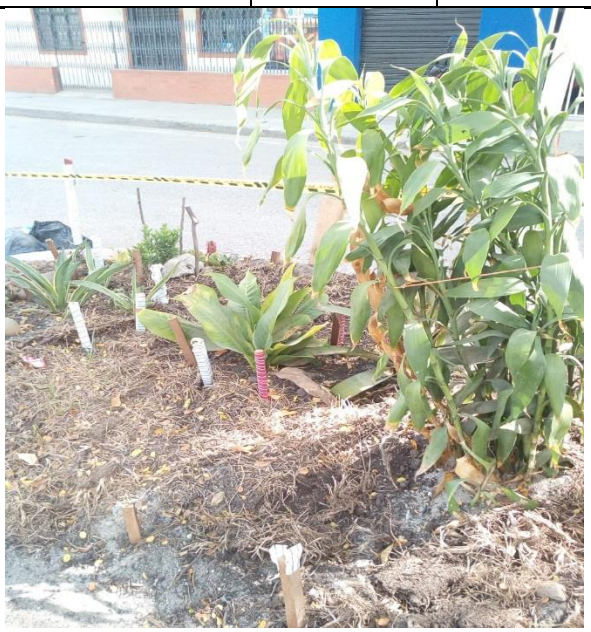
Colocacion de piso tipo deck base concreto son 16 pasos peatonales

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

	
Colocacion de la loseta táctil a los extremos de cada uno de los 16 pasos peatonales	**Colocacion de la loseta táctil a los extremos de cada uno de los 16 pasos peatonales**
	
Componente ambiental siembra de plantas medianas y pequeñas, con suministro de tierra orgánica isoras camarones,	**Componente ambiental simbra de prado gateadora con tierra organica y riego simbra de plantas medianas tipo isoras, camarones, lengua de suegra**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

V

	
Vecino de la Cra 23D3 saco manguera y colabora con el riego de las plantas y el prado instalado	**Adecucion y siembra de plantas en el separador Cra 28D3**
	
Siembra de Plantas pequeñas y medianas separador de cra 28D3	**Instalacion de señal ética con su respectiva cimentación en concreto**

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.


RECIBO A SATISFACCIÓN: N/A

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

N/A

7. FIRMAS RESPONSABLES



JOSE ULISES ASPRILLA CARDENAS
Interventor del contrato de Obra

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 13 de abril de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
