Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 8 AGO 22	DESDE	18-jul-22	HASTA	22-jul-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 1

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Tramite de soporte para giro de anticipo	21-jul-22		
2	Identificacion arboles a talar	22-jul-22		
3	NO SE PUEDE REALIZAR LABORES DE OBRA HASTA QUE EL LOTE NO ESTE EN CONDICIONES OPTIMAS, SIN ARBOLES Y RAICES			

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFOR

FECHA: 8 AGO 22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construc (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Con
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel P
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Ber
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdei
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz A
NIT	

SEMAN

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1	se amplia la vigencia de licencia de construccion con fec 2022
2	Permiso por parte de Corporinoquia para tala de 9 arbol
3	Esta pendiente de inicio de obra hasta aprobacion de otr dada por la entidad contratante y por interventoria en co

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitec **Representante leg** Firma y posfirma

RME SEMANAL DE OBRA

DESDE	25-jul-22	HASTA	29-jul-22

ción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño
sejo Superior de la Judicatura
iñeres
mudez
ic
Andrade

IA 2

	FECHA	UND	CANT
cha julio 15 de	25-jul-22		
es	29-jul-22		
ro si . Directriz mites previos	29-jul-22		
cto **al interventoría**	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 8 AGO 22	DESDE	01-ago-22	HASTA	06-ago-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 3

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Aprobacion de APUs para tala de arboles	01-ago-22		
2	Tala de 9 arboles autorizados	04-ago-22	UND	9,00
3	Entrega de infiormacion a interventoria y la entidad contratante para el tramite del patrimonio autonomo que manejara el anticipo	04-ago-22		
4	Estracción de raices de los arboles hay que tener en cuenta que el arbol No 10 la raiz plantada sobre el eje A , aun no se autoriza, motivo por el cual el lote aun no se encuentra en condiciones para inicio de obra	05-ago-22	UND	9,00
6	Se inicia levantamiento topografico perimetral para establecer mediciones, teniendo en cuenta que el lote aun no se encuentra en condiciones de inicio de obra, porque esta pendiente la aprovacion de tala de arbol A4	06-ago-22	M2	525,00

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA 4

FECHA: 15 AGO 22	DESDE	08-ago-22	HASTA	13-ago-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Aprobacion de apus y plan de inversion del anticipo por parte de la interver	08-ago-22		
2	Entrega de informacion del contratante No de cuenta bancaria patrimonio autonomo, Certificacion de cuenta Patrimonio Autonomo,Contrato anticipo Firmado y auenticado	09-ago-22		
3	Entrega de informacion del contratista acta de modificacion, esquema de localizacion de los arboles y APUS de cada arbol a talar	09-ago-22		
4	Entrega de informacion del contratista Contrato de fiducia para aprobacion por parte de la Interventoria	10-ago-22		
5	Entrega del Plano de Localizacion del arbol denominado A4	10-ago-22		
6	Entrega de informacion del contratista documentos para autorizacion tala de arbol A4	11-ago-22		
7	Entrega de informacion del contratista Observaciones corregidas al acta de modificacion 1	11-ago-22		
8	Entrega de informacion de Interventoria programacion ajustada 19 de julio de 2021	11-ago-22		
9	Aprobacion de Interventoria de la propuesta economica modificacion 1 apus y valor	12-ago-22		
10	Entrega de guias de la supervision al contratista para el tramite de tala de arboles. Hay que tener en cuenta que aun se sigue a la espera de tener el lote en las condiciones para inicio de obra, teniendo en cuenta que esta pendoiente el tramite y autorizocion por parte de corporinoquia y asi la interventoria y la entidad contratante emitan los documentos para que se proceda a su tak¿la y extraccion de raiz, y asi dar inicio a la obra	12-ago-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 22 AGO 22	DESDE	15-ago-22	HASTA	20-ago-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 5

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Informe de parte de la supervision sobre el registro de la cuenta bacaria en el sistema SIIF del contrato de obra 084 de 2022	16-ago-22		
2	Envio de documentos faltantes por parte de la supervision al contratista para presentar ante la entidad ambiental para autorizacion tala de arbo A4	17-ago-22		
3	Remision de docuementos por parte del contratista a la interventoria cuenta de cobro anticipo y certificacion cuenta patrimonio autonomo	18-ago-22		
4	Remision de documentos por parte del contratista a la interventoria PLAN DE GESTION AMBIENTAL y PLAN DE GESTION SST	18-ago-22		
5	Respuesta de Inteterventoria a contratista comunicado VER-60-2022	18-ago-22		
6	Remision por parte de interventoria a la supervision cuenta de cobro anticipo y certificacion patrimonio autonomo	18-ago-22		
7	Remision de documento a la interventoria PLAN DE GESTION DE CALIDAD	19-ago-22		
8	Envio de documentos por parte de la supervision a Interventoria y contratista para firma Acta de justificacion de modificacion y presupuesto y acta modificacion de cantidades	19-ago-22		
9	Remision a la interventoria del nuevo plan de inversion del anticipo	19-ago-22		
10	Envio de documentos a la interventoria firmado Acta de justificacion de modificacion y presupuesto y acta modificacion de cantidades	19-ago-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 29 AGO 22	DESDE	22-ago-22	HASTA	27-ago-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 6

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	El contratista mediante oficio Ber-71-22 Manifista los incovenientes que ha tenido para el inicio de las obras.	22-ago-22		
2	En oficio BER-72 - 22 SE manifiesta posibles acrividades no previstos a realizar en el proyecto	22-ago-22		
3	en oficio CSJ-CONT-PC-013-22 la interventoria da respuesta a oficio BER-71-22	22-ago-22		
4	Se realizo visita por parte del Director de Construccion del CSJ al sitio del proyecto, conjuntamente con Interventoria y contratista	25-ago-22		
5	En oficio CSJ-CONT-PC-015-22 La interventoria certifica el cumplimiento de documentos para el patrimonio autonomo del anticipo	25-ago-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 5 SEPT	DESDE	29-ago-22	HASTA	03-sep-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 7

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Me diante correo electronico el contratista envia la solicitud de desembolso No 1	29-ago-22		
2	Me diante oficio No VER-75-22 anexa plan de inversion por capitulo	29-ago-22		
3	Me diante oficio No BER -76-22 el contratista solicita informacion de los planos en digital	29-ago-22		
4	Me diante oficio No 77-22 el contratista solicita aprobacion de compra anexas	30-ago-22		
5	TALA DE ARBOL R1 - PERIMETRO 1,0 M; GUARATARO H=11 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
6	TALA DE ARBOL R2 - PERIMETRO 1,2 M; TAMARINDO H=14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
7	TALA DE ARBOL R3 - PERIMETRO 1,2 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
8	TALA DE ARBOL R4 - PERIMETRO 2,0 M; ALMENDRO H=15 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
9	TALA DE ARBOL R5 - PERIMETRO 1,90 M; HOBO H=18 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
10	TALA DE ARBOL R6 - PERIMETRO 1,70 M; MANGO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
11	TALA DE ARBOL A1 - PERIMETRO 1,3 M; MANGO H= 10 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
12	TALA DE ARBOL A2 - PERIMETRO 1,70 M; GUARATARO H=12 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
13	TALA DE ARBOL A3 - PERIMETRO 2,20 M; TAMARINDO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	30-ago-22	UND	**1,0**
14	Se autoriza de parte de CORPORINOQUIA mediante documento 600.5.1.22.037 la tala del arbo A-4 (mango)	30-ago-22		

15	Mediante oficio No 78-22 el contratista envia los diseños de conctreo y protor modificado para base granular	31-ago-22		
16	TALA DE ARBOL A4 - PERIMETRO 2,90 M; MANGO H= 14 MT INCLUYE PODA, DESRAMADO, APILADO TRASIEGO Y TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL. INCLUYE RETIRO DE TOCON DEL ARBOL HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD. NO INCLUYE RAICES	01-sep-22	UND	**1,0**
17	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN PROFUNDIDAD HASTA 1.5 M. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS. NO INCLUYE ENTIBADO O TABLESTACADO. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL. (EL CUAL SE COBRA POR APARTE, SI LO HUBIERE).	01-sep-22	M3	**123,23**
18	DESMONTE, DESCAPOTE, EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CMS DE SUELO INCLUYE CARGUE Y RETIRO HASTA SITIO AUTORIZADO. INCLUYE DESMONTE DE CUALQUIER ESPECIE VEGETATIVA (MALEZA) MENOR A 2 METROS Y RETIRO DE TOCONES. NO	01-sep-22	M2	**525,00**
19	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO (EJES, ABSCISADO Y DETALLES, COTAS). ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.	02-sep-22	M2	**525,00**

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO






REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 12 septp de 2022	DESDE	05-sep-22	HASTA	10-sep-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 8

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	Mediante oficio BER-82 -22 el contratisra envia aprobacion previa de compras con cargo al anticipo	05-sep-22		
2	Mediante oficio BER-84-22, el contratista envia cuentas por pagar con cargo anticipo	05-sep-22		
3	Mediante oficio BER-85-22, El contratosta envia la relacion de planos existentes en CAD	05-sep-22		
4	Mediante correo electronico el contratista envia soportes de los provedores	05-sep-22		
5	Mediante Oficion BER-87-22 Remite el informe No 2, anexando las planillas de seguridad	08-sep-22		
6	Mediante oficio BER-88-22 envia toma aerea DRON	08-sep-22		
7	Mediante oficio BER-80-22 remite nuevamente los APUS de los items, cerramiento, valla informativa y excavacion Manual.	08-sep-22		
8	Mediante oficio BER-87-22 el contratista envia especificaciones tencicas del cerramiento	09-sep-22		
9	Mediante oficio BER-88-22 , el contrastiasta envia en formato excel cuenta de rembolso y paga a provedores	10-sep-22		
10	RELLENO EN RECEBO CON LA ESPECIFICACIÓN B-200 INCLUYE EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO.	10-sep-22	m3	**165,0**

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 19 septp de 2022	DESDE	12-sep-22	HASTA	17-sep-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 9

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	EN OFICIO BER-92-22 EL CONTRATISTA ENVIA INFORMACION ADICIONAL DE LOS ITEM ADICIONALES	13-sep-22		
2	EN OFICIO BER- 96-22 EL CONTRATISTA ENVIA AVANCE DE OBRA RESPUESTA A OFICIO CSJ-CONT- PC-018- 2022	16-sep-22		
3	EN OFICIO CSJ-ENT-PC-08-2022 LA INTERVENTORIA ENVIA INFORME DE AVACE DE OBRA A LA SUPERVISION	12-sep-22		
4	EN OFICIO CSJ-ENT-PC-09-2022 LA INTERVENTORIA ENVIA A LA SUPERVSICION LO CORRESPONDIENTE A ITEM NO PREVISTOS	13-sep-22		
5	EN OFICIO CSJ-CONT- PC-018- 2022, LA INTERVENTORIA ENVIA INFORME DE AVANCE AL CONTRATISTA PARA SU CONOCIMIENTO	15-sep-22		
6	EN OFICIO CSJ-CONT-PC-019-2022 LA INTERVENTORIA ENVIA APROBACION DE ITEMS NO PREVISTOS, CERRAMIENTO, VALLA Y EXCAVACION MANUAL.	15-sep-22		
7	SE CONTINUA CON LA ACTIVIDAD DE MATERIAL DE RELLENO PARA EL SITIO DEL PROYECTO POR CUESTIONES DE LLUVIA LA ACTIVIDAD NO HA TENIDO EL RENDIMIENTO PARA SU CULMINACION.	17-sep-22		
8				
9				
10				

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 26 septp de 2022	DESDE	19-sep-22	HASTA	24-sep-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 10

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	EN OFICIO BER - 100 - 22 ENVIADO POR EL CONTRATISTA PRESENTA LA HOJA DE VIDA DEL NUEVO SISO	20-sep-22		
2	MEDIANTE CORREO ELECTROICO EL CONTRATISTA ENVIA LOS FORMATOS DESCRIBIENDO LOS REEMBOLSOS A REALIZAR	21-sep-22		
3	EN OFICIO BER - 102 - 22 ENVIADO POR EL CONTRATISTA SOLICITA AMPLIACION DE PLAZO	21-sep-22		
4	EN OFICIO BER - 103 - 22 ENVIADO POR EL CONTRATISTA DA RESPUESTA AL OFICIO DEAJUIFO22-620	22-sep-22		
5	SE REALIZA COMITÉ DE OBRA No 5 A LA 8 AM	23-sep-22		
6	EN CORREO ELECTRONICO LA INTERVENTORIA ENVIA SOPORTES AL SUPERVISOR DE LOS ITEMS ADICIONALES COMO EXCAVACION MANUAL, CERRAMIENTO, VALLA INFORMATIVA	20-sep-22		
7	VALLA PARA LICENCIA DE CONSTRUCCION. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE **ESTA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EJECUTADA EN UN 100%**	23-sep-22	UND	**1,0**
8	CERRAMIENTO PROVISIONAL : PARALES MADERA 5 CM X 10 CM, LAMINA EN TEJA METÁLICA GALVANIZADA, ESPESOR CALIBRE 26 A 30, PINTADA EN EL EXTERIOR CON PINTURA BLANCA, ALTURA 2.44 M. INCLUYE RETIRO Y	24-sep-22	M2	**231,8**
9	PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO GENERAL, 1 MAESTRO CONTRATISTA, 4 OBREROS,			
7	MATERIALES: 90 MADEROS 10X5, 95 TEJAS TIPO CANALETA GALVANIZADA			

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO







Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 3 OC 22	DESDE	26-sep-22	HASTA	01-oct-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 11

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	LIMPIEZA DEL AREA Y COLOCACION DE MATERIALES PETREOS	26-sep-22		
2	TRAZADO Y NIVELES EJES A-B- C- D- E-1-2-3-4-5-6	26-sep-22		
3	TODO EL PERSONAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AFILIACION Y EXAMENES MEDICOS	01-oct-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 9 OCT 22	DESDE	03-oct-22	HASTA	08-oct-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 12


ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	INGRESO DE MATERIALES A LA OBRA	03-oct-22		
2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	03-oct-22	KG	937,25
3	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PROFUNDIDAD HASTA 1.5 M. INCLUYE CARGUE, TRASIEGO, RETIRO DE MATERIAL Y ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO. NO INCLUYE MANEJO DE AGUAS. NO INCLUYE ENTIBADO O TABLESTACADO. NO INCLUYE EL COSTO QUE COBRA EL SITIO DE DISPOSICIÓN POR RECIBIR EL MATERIAL.	03-oct-22	M3	4,43
4	EXCAVACION MANUAL	03-oct-22	M3	29,25
5	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =2.000 PSI/13.79 MPA, PARA SOLADO, COMO SUPERFICIE PROTECTORA ENTRE EL SUELO Y LOS HIERROS DE LAS ESTRUCTURAS EN CONTACTO CON ÉL.	07-oct-22	M3	0,68
6	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	07-oct-22	M3	4,50


Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO






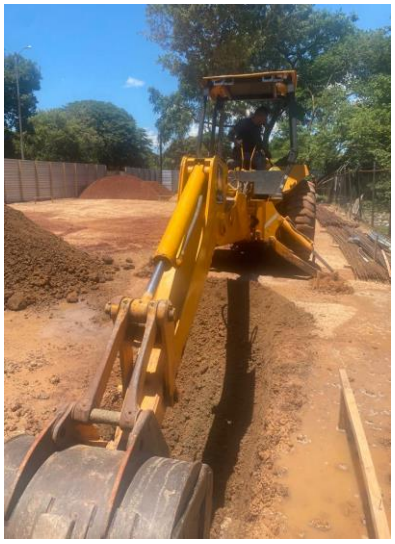

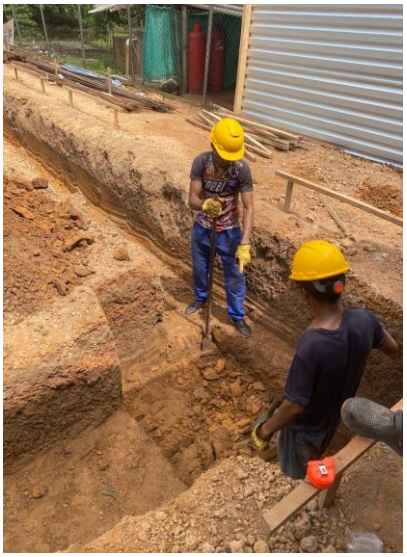



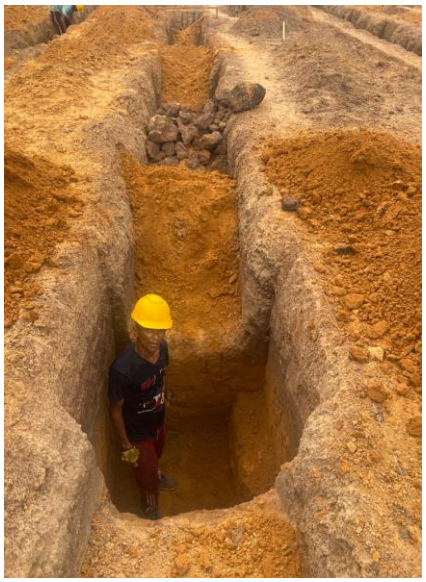

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 16 OCT 22	DESDE	10-oct-22	HASTA	15-oct-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 13

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	11-oct-22		
2	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =2.000 PSI/13.79 MPA, PARA SOLADO, COMO SUPERFICIE PROTECTORA ENTRE EL SUELO Y	11-oct-22	M3	0,60
3	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	12-oct-22	M3	3,60
4	TOMA MUESTRAS DE CILINDROS	12-oct-22		
5	EXCAVACION MANUAL VIGAS DE CIMENTACION	14-oct-22	M3	34,18

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 25 OC 22	DESDE	17-oct-22	HASTA	22-oct-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	


SEMANA 14

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	EXCAVACION MANUAL	17-oct-22	M3	0,24
2	SEÑALIZACION PERIMETRO DE LA OBRA	20-oct-22	UND	
3	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA, PARA ZAPATAS Y PEDESTALES DE CIMENTACIÓN. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA. NO INCLUYE REFUERZO.	21-oct-22	M3	20,03
4	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER	21-oct-22	KG	1141,37
5	TOMA DE MUESTRAS PARA CILINDROS 4000PSI VIGAS	21-oct-22		
6	UBICACIÓN PARA ACOPIO BOLSAS DE CEMENTO			

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO



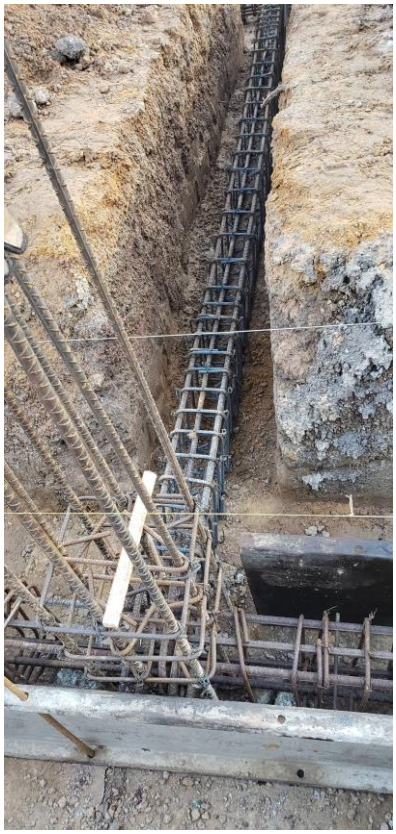



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 25 OC 22	DESDE	24-oct-22	HASTA	29-oct-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 15

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE	25-oct-22	M3	
2	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI/420 MPA PARA COLUMNAS, ZAPATAS, ZARPAS, VIGAS Y EN GENERAL PARA CUALQUIER ELEMENTO DE CONCRETO ESTRUCTURAL O NO ESTRUCTURAL. INCLUYE ALAMBRE, CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN.	25-oct-22	KG	1664,31
3	#¡REF!	28-oct-22	M3	4,11
4	RENOVACION DE DOTACION	26-oct-22		
5	SUMINISTRO DE 15 TONELADAS DE HIERRO	31-oct-22		
6	INSTALACION MEDIDOR ACUEDUCTO	29-oct-22		
7	TOMA DE MUESTRAS PARA CILINDROS 4000PSI COLUMNAS			
8	RADICADO RENOVACION DISPONIBILIDAD SERVICIO ENERGIA ELECTRICA No. 2022 50000 13682	22-oct-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 25 OC 22	DESDE	31-oct-22	HASTA	05-nov-22


N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 16

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	RELLENO CON MATERIAL SOBRANTE	02-nov-22	M3	
2	EXCAVACION MANUAL	02-nov-22	M3	11,71
3	CONCRETO DE 4.000 PSI/27.58 MPA PARA COLUMNAS. TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO 1/2". INCLUYE FORMALETA DE MADERA Y RETIRO DE ESTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO PERMITIDO. NO INCLUYE REFUERZO.	03-nov-22	M3	2,99
4	MAMPOSTERÍA EN BLOQUE DE ARCILLA NO. 5. INCLUYE MORTERO DE PEGA, REPLANTEO DE UBICACIÓN, CIMBRADO. EL VALOR INCLUYE LINEALES. EL ÁREA DE MEDIDA SERÁ EL ÁREA EFECTIVAMENTE CONSTRUIDA.	05-nov-22	M2	21,00
	RECEPCION DE PLANTA ELECTRICA, MATERIAL ELECTRICO, Y ACERO DE REFUERZO	3 - 5 NOV-22		
7	RADICADO A ELECTROVICHADA DE SERVICIO DE ENERGIA PROVISIONAL POR 9 MESES No. 2022 50000 14472	02-nov-22		

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO

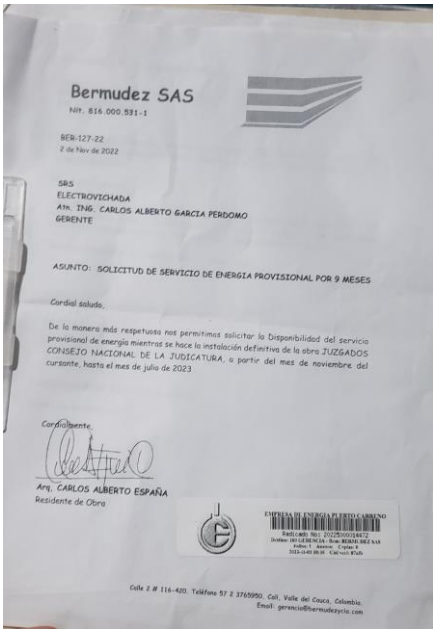

Bermudez SAS

NIT. 816.000.531-1

BER-127-22

2 de Nov de 2022

SRS
ELECTROVICHADA
Atn. ING. CARLOS ALBERTO GARCIA PERDOMO
GERENTE

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO DE ENERGIA PROVISIONAL POR 9 MESES

Cordial saludo,

De la manera más respetuosa nos permitimos solicitar la Disponibilidad del servicio provisional de energía mientras se hace la instalación definitiva de la obra JUZGADOS CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, a partir del mes de noviembre del cursante, hasta el mes de julio de 2023

Cordialmente,

Arq. CARLOS ALBERTO ESPAÑA
Residente de Obra

EMPRESA DE ENERGIA PUERTO CARREÑO


Calle 2 # 116-420. Teléfono 57 2 3765950. Cali, Valle del Cauca, Colombia.
Email: gerencia@bermudezycia.com









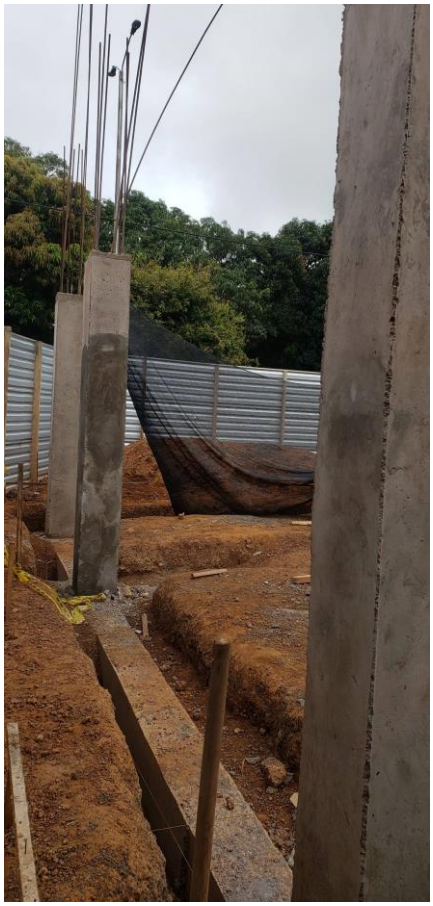



PLANTA ELECTRICA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 25 OC 22	DESDE	28-nov-22	HASTA	3-dic-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 20

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	PRUEBA RED CONTRA INCENDIOS	28-nov-22	UND	1
2	REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA EN CIMENTACIÓN, PANTALLAS, PLACA CONTRAPISO Y PLACA CUBIERTA. INCLUYE ALAMBRE, CORTE Y FIJACIÓN CON SEPARADORES Y CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL ADICIONAL DONDE SE REQUIERA.	29-nov-22	KG	408,00
3	CONCRETO DE RESISTENCIA F´C =4.000 PSI/27.58 MPA PARA CONTRAPISO. INCLUYE POLIETILENO CALIBRE NO. 4 NEGRO EN DOBLE CAPA EN TODA EL ÁREA, COMO AISLANTE E IMPERMEABILIZANTE. INCLUYE FORMALETA CUANDO SE REQUIERA Y RETIRO DE ESTA. NO INCLUYE REFUERZO. NO INCLUYE EXCAVACIÓN.	30-nov-22	M3	26,93
4	EXCAVACION MANUAL PARA POZO SEPTICO Y TUBERIA ELECTRICA PARA RED CONTRA INCENDIOS	30-nov-22	M3	30,88
6	REGISTRO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	1-dic-22	UND	3,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 9 DE 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ARENA, RELLENO COMPACTADO.	1-dic-22	ML	7,42
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 3/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	1-dic-22	ML	1,50
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/4". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	1-dic-22	ML	22,46
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 1 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	1-dic-22	ML	4,68
12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 21 DE 2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA.	1-dic-22	ML	26,28
14				

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO















Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 13 DIC 22	DESDE	5-dic-22	HASTA	11-dic-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 21

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	ENCOFRADO LOSA 2 PISO	5-dic-22	M2	320,00
2	EXCAVACION MANUAL PARA POZO SEPTICO Y TUBERIA ELECTRICA PARA RED CONTRA INCENDIOS	5-dic-22	M3	30,88
3	REGISTRO RED WHITE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	7-dic-22	UND	3,00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC-AGUA POTABLE RDE 9 DE 1/2". INCLUYE TODA LA TUBERÍA Y ACCESORIOS REQUERIDOS (CODOS, UNIONES, TEES, BUJES, ADAPTADORES, TAPONES) DESDE EL INICIO A LA TERMINACIÓN DE LA TUBERÍA. INCLUYE EXCAVACIÓN, ARENA, RELLENO COMPACTADO.	7-dic-22	ML	7,42

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO









Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 20 DIC 22	DESDE	12-dic-22	HASTA	18-dic-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 22

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	ENCOFRADO LOSA 2 PISO	12-dic-22	M2	320,00
2	ARMADO HIERRO LOSAS VIGAS Y LOSA 2 PISO	12-dic-22	KG	6.589,00

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO





INFORME SEMANAL DE OBRA

FECHA: 27 DIC 22	DESDE	19-dic-22	HASTA	26-dic-22

N° CONTRATO	084 DE 2022
OBJETO:	Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada)
CONTRATANTE	Rama Judicial. Consejo Superior de la Judicatura
SUPERVISOR	Arq. Juan Manuel Piñeres
CONTRATISTA	Bermudez SAS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Carlos Eduardo Bermudez
NIT	816.000.531-1
INTERVENTOR	Consorcio Ingealdeic
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	Juan Pablo Muñoz Andrade
NIT	

SEMANA 23

ITEM	ACTIVIDADES EJECUTADAS	FECHA	UND	CANT
1	ENCOFRADO LOSA 2 PISO	19-dic-22	M2	320,00
2	ARMADO HIERRO LOSAS VIGAS Y LOSA 2 PISO	19-dic-22	KG	6.589,00
3	FUNDICION LOSA	22-dic-22	M2	320,00

Ingeniero o Arquitecto **Representante legal contratista** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Representante legal interventoría** Firma y posfirma	Ingeniero o Arquitecto **Supervisor** Firma y posfirma

REGISTRO FOTOGRAFICO







