CLUB MILITAR	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Código: LA-M02-F51 Versión: 6 Fecha: 26/11/2018 Página 1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO 205-2022		FECHA:	22/10/20210

OBJETO CONTRACTUAL:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB

CONTRATISTA: **SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.**

NIT/CC/CE: 901.189.763-1

TRATA DE LA ENTREGA QUE HACE EL CONTRATISTA AL CLUB MILITAR

FECHA:	**21/10/2022**	HORA:		ENTREGA PARCIAL No.:	
				ENTREGA UNICA :	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	DIRECCION :		**Cra 50 No. 15-80**	

INTERVIENEN EN LA ENTREGA:

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE
CLUB MILITAR	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA	JEFE AREA MANTENIMIENTO CM	SUPERVISOR CONTRATO 205-2022
SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	MARIA DEL PILAR TAVERA GAITÁN	RESPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA

EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No.:	**CONTRATO 205-2022**
ENTIDAD CONTRATANTE/CLIENTE	**CLUB MILITAR**

DATOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ENTREGAR Y/O RECIBIR

SE HACE ENTREGA DE LOS SERVICIOS DISCRIMINADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO RECIBIDO	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
3371	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB			40,181,901.00
	Sede Principal	**VALOR SIN I.V.A**		**40,181,901.00**
		VALOR I.V.A		**7,634,561.00**
		VALOR TOTAL		**47,816,462.00**

CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN: *COLOCAR UNA **X** A LOS QUE APLIQUEN*

OBJETO DEL CONTRATO:		ANEXO DEL CONTRATO No._____:		FICHA TECNICA :			ESPECIFICACIONES TECNICAS:			
NORMA TECNICA:		**CUAL? :**								

EVIDENCIADO DE ACUERDO CON LA APLICACIÓN DE :*COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	OBSERVACIONES
INSPECCION VISUAL REALIZADA	X		
INFORMES DE LABORATORIO REALIZADOS		x	
CERTIFICACION EXPEDIDA		x	
MEDIO AUDIVISUAL		x	

DATOS DEL RECIBO

TRATA DEL RECIBO A SATISFACCION QUE HACE LA ENTIDAD CONTRATANTE /CLIENTE

UNA VEZ REVISADOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO, POR PARTE DE: *COLOCAR UNA X A LOS QUE APLIQUEN*

COMITÉ TECNICO :		SUPERVISOR :								

SE PUDO VERIFICAR QUE ESTOS CUMPLEN A ENTERA SATISFACCIÓN CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL CONTRATO.

OBSERVACIONES GENERALES :

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, INTERVIENEN :

ENTIDAD/EMPRESA	NOMBRE	CARGO	EN CALIDAD DE	FIRMA
SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.	MARIA DEL PILAR TAVERA GAITÁN	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	NOMBRE Y APELLIDOS
CLUB MILITAR	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA	JEFE AREA MANTENIMIENTO CM	SUPERVISOR CONTRATO 205-2022	NOMBRE Y APELLIDOS

(SI REQUIERE INSERTE MAS FILAS)

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001

Bogotá, D.C., 21 noviembre de 2022.

AL : Señor
Capitán de Navío (RA) **DAVID TADEO PIÑA SABAHG**
Coordinador de Gestión Grupo Administrativa
E. S. D.

Me permito enviar el Informe de Supervisión No. **001** del contrato No. 205-2022, correspondiente al período del mes de octubre – noviembre de 2022, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.	**CM-205-2022**
CDP No.	67722 de fecha 29 de julio 2022
CRP No.	99922 de fecha 29 de septiembre de 2022
OBJETO	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIA DEL PILAR TAVERA GAITÁN** **Representante Legal SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.** **N.I.T 901.189.763-1 Contratista**
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE OCTUBRE DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	Valor hasta de Ochenta millones de pesos ($80.000.000,00). Incluido IVA.
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES.
LUGAR DE ENTREGA	- CLUB MILITAR SEDE PRINCIPAL, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, Carrera 50 No. 15 – 80.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JT(RA) ROBINSON ORJUELA ZAPATA

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Verificado el contrato se efectúa el control al cumplimiento de las obligaciones, así:

Equipos reparados Sede Principal

FACTURAS	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Factura SRT Soluciones integrales No 33714							

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN PARA LA SEDE PRINCIPAL BOGOTA CLUB MILITAR					
ÍTEM	**NOMBRE DEL BIEN**	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANT**	**INCLUYA EL PRECIO COMO LO INDICA LA ENTIDAD ESTATAL**
1	Cuarto Frio No 1 Almacén AyB C1 17229	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	1,472,625.00
		Conexión de parametría	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Instalación Rubatex para los cuartos	und	1	
		Mantenimiento desagues	und	1	
		Cambio de resistencias	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación de Fugas	und	1	
		Carga de gasfiltro secador	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Soldaduras	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
2	Cuarto Frio No 2 Almacén AyB C2 17228	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	5,801,250.00
		BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		CAMBIO DE COMPRESOR	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	

		Cambio guarda motor	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Cambio Filtro secador	und	1	
		Carga gas refrigerante R507	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
3	Cuarto Frio No 3 Almacén AyB C3 17227	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	2,142,000.00
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1	
		Caja	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Filtro secador	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación de Fugas	und	1	
		Carga de gas R22	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
4	Cuarto Frio No 4 Almacén AyB C4 17226	CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE	und	1	1,588,650.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Instalación medias cañas	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio guarda motor	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Cambio Filtro secador	und	1	
		Carga gas refrigerante R507	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	

		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
5	Cuarto Frio No 5 Almacén AyB C5 17225	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	1,566,337.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Instalación medias cañas	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Carga gas refrigerante R507	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
6	Cuarto Frio No 6 Almacén AyB C6 17224	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	2,186,625.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		CAMBIO MOTOR VENTILADOR	und	1	
		REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES	und	1	
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio ruedas en teflon	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Cambio medias cañas	und	1	
		Carga gas refrigerante R22	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	

		Mantenimiento general	und	1	
7	Cuarto Frio Salon Colombia	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	1,785,000.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Instalación empaque sello magnético	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		Cambio motor ventilador manejadora	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Carga gas refrigerante (404 AJUSTE)	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
8	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	2,052,750.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Cambio Resistencias de descongelación	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE)	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
9	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	1,428,000.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio ruedas en teflón	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	

		Carga gas refrigerante (AJUSTE)	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
10	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	2,052,750.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Carga gas refrigerante R507 AJUSTE	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
11	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195	Cambio de circuito eléctrico Full gauge900	und	1	1,428,000.00
		Mantenimiento General partes Eléctricas	und	1	
		Conexión de parametría	und	1	
		Cambio 3 motores axiales de 14"	und	1	
		Aislamiento en Rubatex de tubería	und	1	
		mantenimiento y arreglo de drenajes	und	1	
		Caja	und	1	
		Cambio Lámpara de iluminación	und	1	
		Cambio Tubería mt	und	1	
		Cambio Aceite	und	1	
		Carga gas refrigerante AJUSTE	und	1	
		Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración	und	1	
		Rectificación plato de válvulas	und	1	
		Cambio tubería de cobre	und	1	
		Lavado y desengrase	und	1	
		Mantenimiento general	und	1	
12	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	1,204,875.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	

	/ gas R134A / Cocina Principal 1040	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
13	Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N4 1050	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	535,500.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
15	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	892,500.00
		CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
16	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	669,375.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	

		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
17	Nevecon una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE	Servicio	1	892,500.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
19	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	714,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
20	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	714,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
21	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	714,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	

		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
22	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	1,338,750.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
		Mantenimiento tarjeta electrónica	Servicio	1	
		Recarga de gas.	Servicio	1	
		Repontecializar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	Servicio	1	
23	Nevecon dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N3 5250	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	955,725.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
24	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1	722,925.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
25	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacén AyB 5251	REPARACION VISAGRA	Servicio	1	722,925.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
26	Nevecon dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacén AyB N9 5249	CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE	Servicio	1	892,500.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
27	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	624,750.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
28	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	624,750.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	

		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
33	Nevecon dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625	Suministro E Instalación De Unidad Compresora	Servicio	1	3,570,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	

34	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE.	Servicio	1	892,500.00
		AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
35	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CCAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	AJUSTE DE CARGA DE GAS	Servicio	1	714,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	

		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
36	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	REPARACION VISAGRAS	Servicio	1	722,925.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
40	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	740,800.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
41	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	1.REVISION SISTEMA ELECTRICA	Servicio	1	812,175.00
		2.AJUSTE CARGA DE GAS	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
42	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	714,000.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	

		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
43	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919	CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512	Servicio	1	758,625.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
45	Nevera horzintal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	669,375.00

	amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
50	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	REPROGRAMACION CONTROL	Servicio	1	624,750.00
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		CAMBIO CONTROL ANALOGICO	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	

		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
52	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	669,375.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
53	Nevera horzintal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	VERIFICACION MOTOR COMPRESOR	Servicio	1	535,500.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	

		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	
56	Nevera horzintal tipo EXCIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo	Servicio	1	669,375.00
		Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante	Servicio	1	
		Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería)	Servicio	1	
		Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo	Servicio	1	
		Realización De Vacío A Todo El Sistema (Con Bomba De Vacío)	Servicio	1	
		Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.	Servicio	1	
		Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora	Servicio	1	
		Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora	Servicio	1	
		Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas)	Servicio	1	
		Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo	Servicio	1	
		Lavado Y Desengrase General Del Equipo	Servicio	1	
		Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	Servicio	1	

47,816,462.00


Porcentaje cumplimiento Avance 59.77% Demora 10 %

Grafico del porcentaje de ejecución


VALOR	
Valor Contratado	80,000,000.00
Valor por Ejecutar	32,183,538.00
Valor Ejecutado	47,816,462.00
% Saldo por Ejecutar a 20 de diciembre de 2022	40.23%
% Saldo Ejecutado	59.77%



SALDO TOTAL	80,000,000
TOTAL FACTURADO	47,816,462.00
SALDO POR EJECUTAR	32,183,538.00

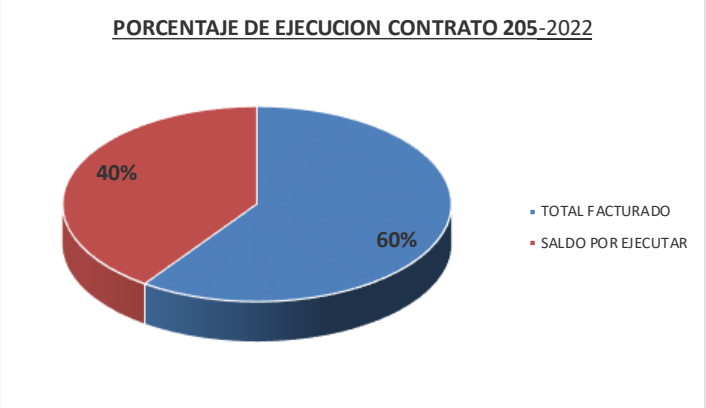

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS

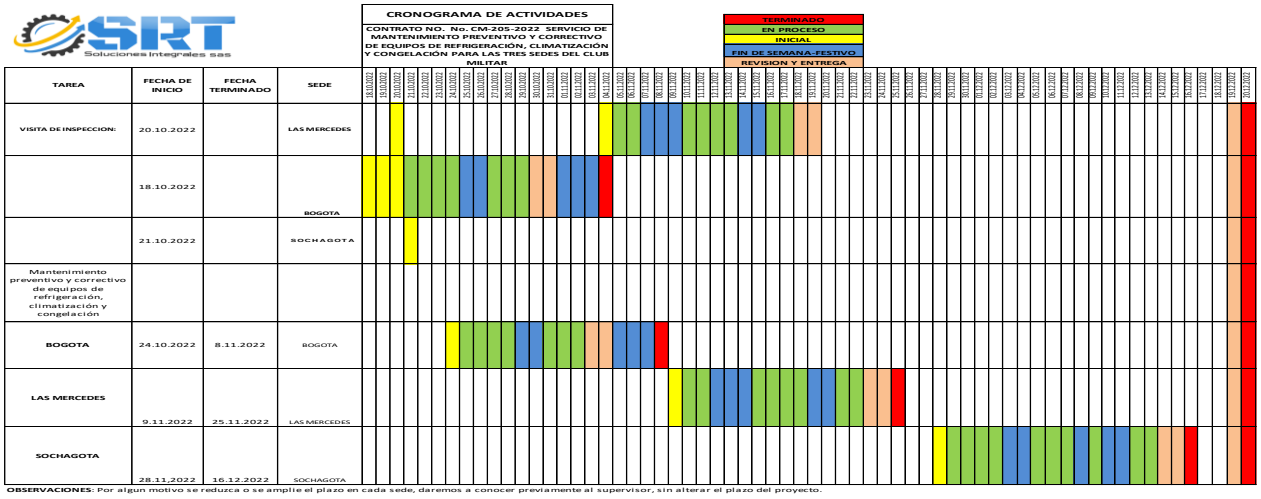

SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DEL MES NOVIEMBRE DE 2022:

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN

Dentro de la ejecución del proceso de mantenimiento se verifica que el total de los equipos del Club militar presentan un valor total de Ciento Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Treinta y Siete mil Ciento Doce pesos (**145.237.112,00);** el valor del **CDP No. 67722** es por valor de Ochenta Millones de Pesos **(80.000.000,00)**.

El contrato reza en la CLÁUSULA 2. OBJETO "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB" CLÁUSULA 3. PLAZO DEL CONTRATO El plazo de ejecución será a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y hasta el 20 de diciembre de 2022, o hasta agotar presupuesto.

Por tanto se ajusta la necesidad de mantenimiento de acuerdo a la capacidad de CDP dejando los equipos más urgentes para la operación convenidos con los responsables de mantenimiento de cada sede.

4. CONTROL DE PAGOS

Haciendo un seguimiento Contable, se diligencia el cuadro control de pagos y saldos del Contrato No. 205-2022 del cual soy supervisor

No.	CONTROL DE PAGOS			PAGO AL MES IVA INCLUIDO	SALDO 2022
	FECHA DOCUMANTO	FACTURA No.	OBSERVACIONES		80,000,000.00
CRP 99922	19/10/2022	Por un valor hasta de Ochenta millones de pesos ($80.000.000,00). INCLUIDO IVA			80,000,000.00
1	25/11/2021	FACTURA No. 3371	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB	47,816,462.00	32,183,538.00
SALDO					32,183,538.00

5. SEGUIMIENTO EFECTUADO A LOS PROCESOS EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022

Cumplimiento de obligaciones del contratista relacionadas con el pago de seguridad social integral y aportes parafiscales

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS.) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 03 de noviembre de 2022, suscrito por el representante legal de la empresa en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

6. OBSERVACIÓN

El supervisor del Contrato No. 205-2022, recomienda al ordenador del gasto realizar el pago de las cuentas de cobro y/o facturas No. 3371 por valor de **Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Diez y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y dos pesos ($47.816.462.00), equipos entregados y verificados en la** Sede Principal; anexando los documentos soportes para el correspondiente pago.

Cordialmente,

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor Contrato No. 205 -2022

CLUB MILITAR	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO	SRT Soluciones Integrales sas

Bogotá 08 de noviembre de 2022

INFORME TECNICO CONTRATO N° CM-205-2022UBICACIÓN: COCINA SOCIOS ÍTEM: 33 NEVECON DOS PUERTAS REFRITECNICA VOLT. 115 .127 FERQ 60 HZ/ 6.5AMP /GAS R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Suministro e instalación de unidad compresora de ½ HP /110V -R134A
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada:10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores evaporadores y condensador Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

TRABAJOS REALIZADOS (Extras)

Arreglo y correcta distribución del circuito eléctrico.
Cambio de filtro secador, soldable. Instalación de térmicos eléctricos.


REGISTRO FOTOGRAFICO









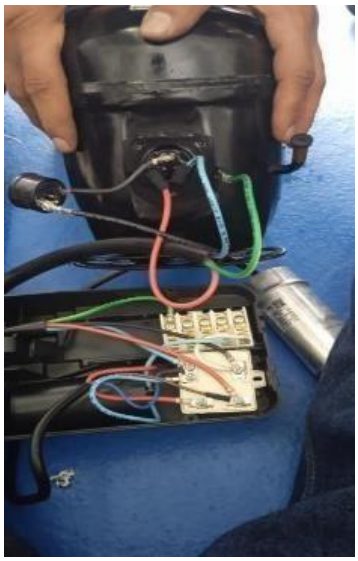





RESULTADOS OBTENIDOS:
Este equipo se encontró sin funcionamiento.
Con el trabajo realizado queda operando correctamente.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo cada dos meses, manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.
Los trabajos realizados (extras) se efectúan por efecto de calidad del presente contrato.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA SOCIOS
ITEM 34: NEVECON UNA PUERTA STARKOOC VOLT. 115 - 127/ FERQ 60 HZ / 6.5 AMP /GAS R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de control full gauge – con su respectiva parametria. Ajuste de carga de gas R134A
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando fugas eimpurezas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada. Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores del evaporador Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120 V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.






RESULTADOS OBTENIDOS:

Este equipo se encontró con variaciones en su temperatura. Luego de su intervenciónqueda en perfectas condiciones de funcionamiento.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo cada dos meses

Manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.

Prevenir el ingreso de agua en la parte superior donde se encuentran sus partes eléctricas.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA SOCIOS
ITEM: 35 NEVERA HORIZONTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 / FERQ60HZ
/ 5,6 AMP / GAS R134A / CAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Ajuste de carga de gas R134A
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo y con limpiador R141B.Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada. Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120 V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento del mismo.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo se encontró con fugas en el sistema por lo que no llegaba a la temperatura requerida, además con el trabajo extra realizado evitamos congelación del evaporador y prevenimos obstrucción del aire, evitando que el equipo llegue a temperaturas muy altas y afecte el producto. El equipo queda operando correctamente.

TRABAJOS REALIZADOS (Extras)
Suministro e instalación de termostato P1125.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo cada dos meses, manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.



Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022



ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT


UBICACIÓN: COCINA SOCIOS

ITEM 36 CONGELADOR CHALLEGER 120 FERQ 60 HZ / 10,5 AMP / GAS R134 / CAFETERIADESOCIOS BLANCO SIN PLACA

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Reparación bisagras
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno y con limpiador R141B a toda la tubería de baja y alta del equipo paradescartar fugas e impurezas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a las dos puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras.
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

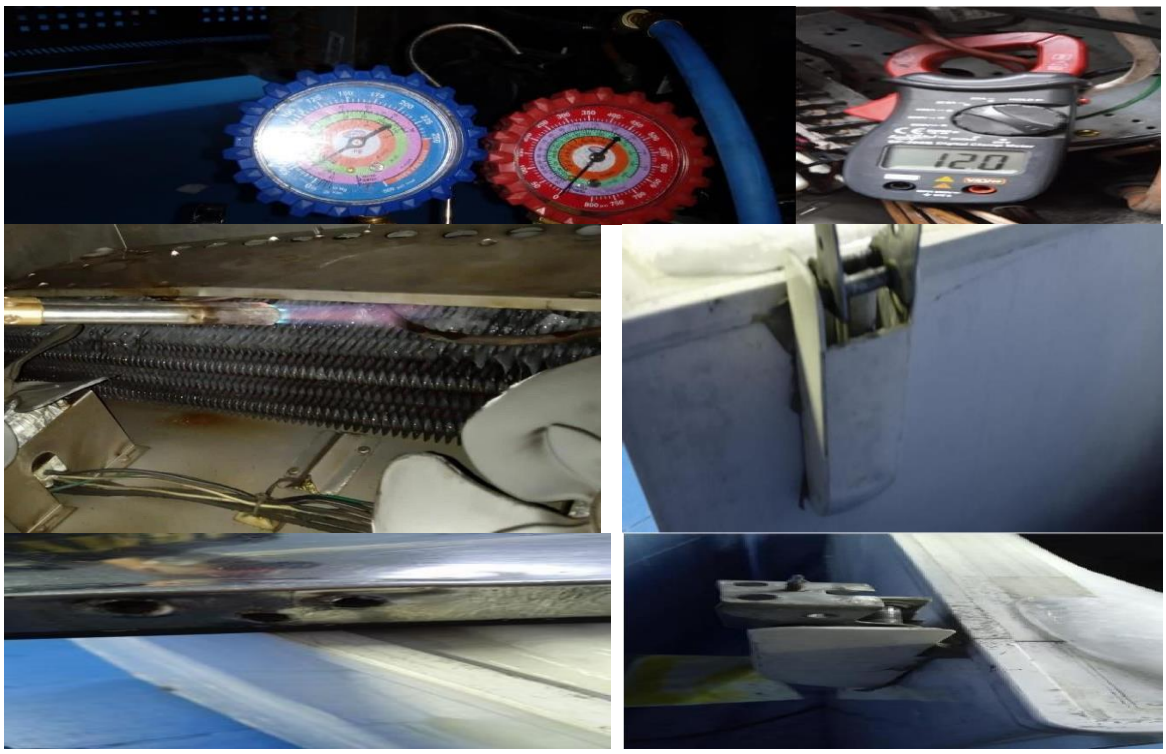


RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo se encontraba fuera de servicio. Luego de intervención quedo en estado operativo alcanzando la temperatura requerida.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo cada dos meses, manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.



Jefe Técnico (RA**) ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022



ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA SOCIOS
ITEM 40: NEVECON DOS PUERTAS FAGOR / VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ / 6,9 AMP / GASR134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para elequipo full gauge
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.:10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RESULTADOS OBTENIDOS:

El equipo se encontraba con variaciones de temperatura y congelación en la parte del evaporador. Luego de intervención quedo en estado operativo alcanzando la temperatura requerida.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo cada dos meses, manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.

Prevenir el ingreso de agua en el control de temperatura y partes eléctricas.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA SOCIOS
ITEM 41 NEVECON DOS PUERTAS FAGOR / VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ / 6,9 AMP / GASR134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036
UBICACIÓN: COCINA SOCIOS

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Revisión sistema eléctrico Ajuste carga de gas R134A
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo
Lavado y desengrase general del equipo destaponamiento de desagüe y puesta en servicioen óptimo estado de funcionamiento del mismo.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo se encontraba con variaciones de voltaje en sus partes eléctricas afectando así su correcto funcionamiento.
Realizado el trabajo descrito queda operando y alcanzando la temperatura requerida.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular.
Manipulación del equipo y sus partes eléctricas únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 1 CUARTO FRIO N°.1 C1 17229

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de circuito eléctrico y control Full gauge TC900
Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Mantenimiento y arreglo de drenajes, CajaCambio Tubería MT
Cambio Lámpara de iluminación
Instalación de Rubatex para aislamiento de tuberíaMantenimiento desagües
Cambio de resistencias a 220v
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación de Fugas con soldadura de plata
Carga de gas refrigerante 404ª 50PSI por baja, 180PSI por alta Cambio filtro secador soldable cuerpo grande
Cambio tubería de cobre 2mts.Soldaduras
Amperaje 14.0 -14.8 Lavado y desengrase Mantenimiento general.

REGISTRO FOTOGRAFICO










RESULTADOS OBTENIDOS:
El cuarto queda en correcto funcionamiento.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular, manipulación del equipo y sus partes eléctricas porparte de personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 2 CUARTO FRIO N°2 C217228

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de circuito electico y Full gauge TC900 Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Mantenimiento y arreglo de drenajes
Cambio de compresor trifásico semi hermético 2HP R-22Amperaje 10.9-11.5
Cambio de tubería mtCambio guarda motorCambio de aceite
Cambio filtro secador soldable cuerpo grande
Carga de gas refrigerante R507 50PSI por baja, 180PSI por alta Rectificación plato válvulas
Cambio de tubería de cobre 10mts
Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Este cuarto se encontraba fuera de servicio; el compresor y condensador se encontraban dañados. Se realiza los trabajos extras lo que permite que el equipo quede operando correctamente y con buen funcionamiento.

TRABAJOS REALIZADOS (EXTRAS)
Cambio de condensador Capacitores de arranque Válvula de expansión Danfoss

REGISTRO FOTOGRAFICO







RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular.

Manipulación del equipo, control digital y de temperatura y partes eléctricas únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 3 CUARTO FRIO N°3 C3 17227

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de circuito eléctrico y control Full gauge TC900 Cambio de motor ventilador 220V
Mantenimiento Caja
Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Cambio Tubería mt
Cambio Lámpara de iluminación
Cambio de filtro secador soldable cuerpo grande
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por altaRectificación de Fugas con soldadura de plata
Carga de gas refrigerante R404a 50PSI por baja, 180PSI por alta Cambio tubería de cobre 3mts.
Cambio de 3 motores axiales de 14”
Lavado y desengrase Mantenimiento general.

ESULTADOS OBTENIDOS:
El cuarto frio queda operando correctamente, con el trabajo realizado se evita recalentamiento y fugas de agua.

REGISTRO FOTOGRAFICO







RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado, así alargamos la vida útil del equipo.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB ITEM.4 CUARTO

FRIO N°4DESCRIPCION DEL SERVICIO:


Calibración de control full gauge TC512 Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Mantenimiento general partes eléctricasInstalación medias cañas
Aislamiento en rubatex de tubería para aislamiento Mantenimiento y arreglo de drenajes, caja
Cambio de lámpara de iluminaciónCambio de tubería mt
Cambio guarda motorCambio aceite Cambio filtro secador
Carga de gas refrigerante R507 - 45 de baja 220 de alta
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3 mts. Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El cuarto frio queda operando correctamente, se corrigió obstrucciones y condensación en la tubería.
Queda con buen funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



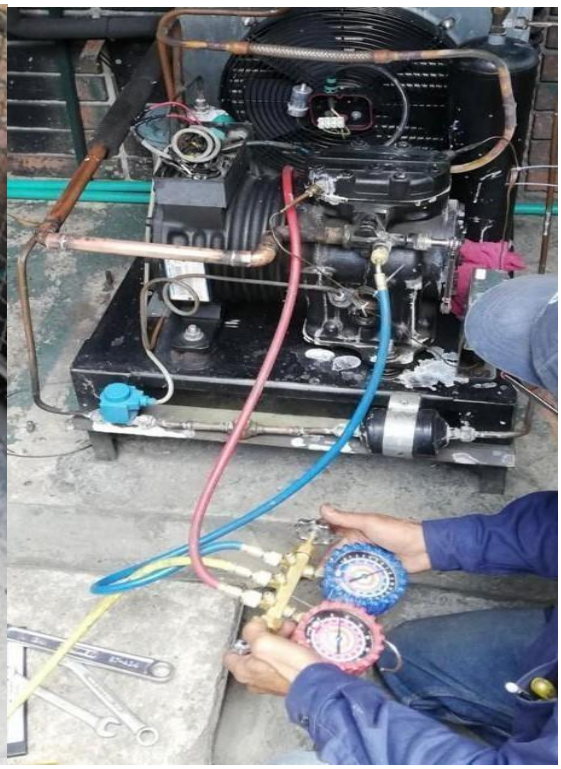



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Limpieza periódica
Mantenimiento preventivo regular, manipulación del equipo y sus partes eléctricas únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB ITEM.5 CUARTO FRIO N°5

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Cambio de circuito eléctrico y Full gauge TC512 Mantenimiento General partes Eléctricas
Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Instalación medias cañas
Mantenimiento y arreglo de drenajes, CajaCambio Lámpara de iluminación
Cambio Tubería mt
Cambio de aceite unidad compresora
Carga gas refrigerante R507 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts.
Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El cuarto frio quedo alcanzando la temperatura requerida evitando acumulación de hielo
El equipo queda operando de manera satisfactoria realizando los procesos de temperaturasgarantizando su función de almacenamiento de alimentos.

REGISTRO FOTOGRAFICO













RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Realizar limpieza periódica, evitando taponamientos por hielo. Mantenimiento preventivo regular por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN:
ALMACEN AYB ITEM.6 CUARTO FRIO N°6

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de circuito eléctrico y Full gauge TC900 Mantenimiento General partes Eléctricas Cambio de motor ventilador 220V.
Reparación de riel puerta y cambio de empaqueCambio 3 motores axiales de 14”
Aislamiento rubatex de tubería Mantenimiento y arreglo de drenajes, Caja Cambio Lámpara de iluminación
Cambio Tubería mt Cambio ruedas en teflón
Cambio de aceite a unidad compresoraCambio medias cañas
Carga gas refrigerante R22 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno al sistema de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts. Lavado y desengrase Mantenimiento general.


RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo queda operativo alcanzando la temperatura requerida y de manera uniforme.

REGISTRO FOTOGRAFICO







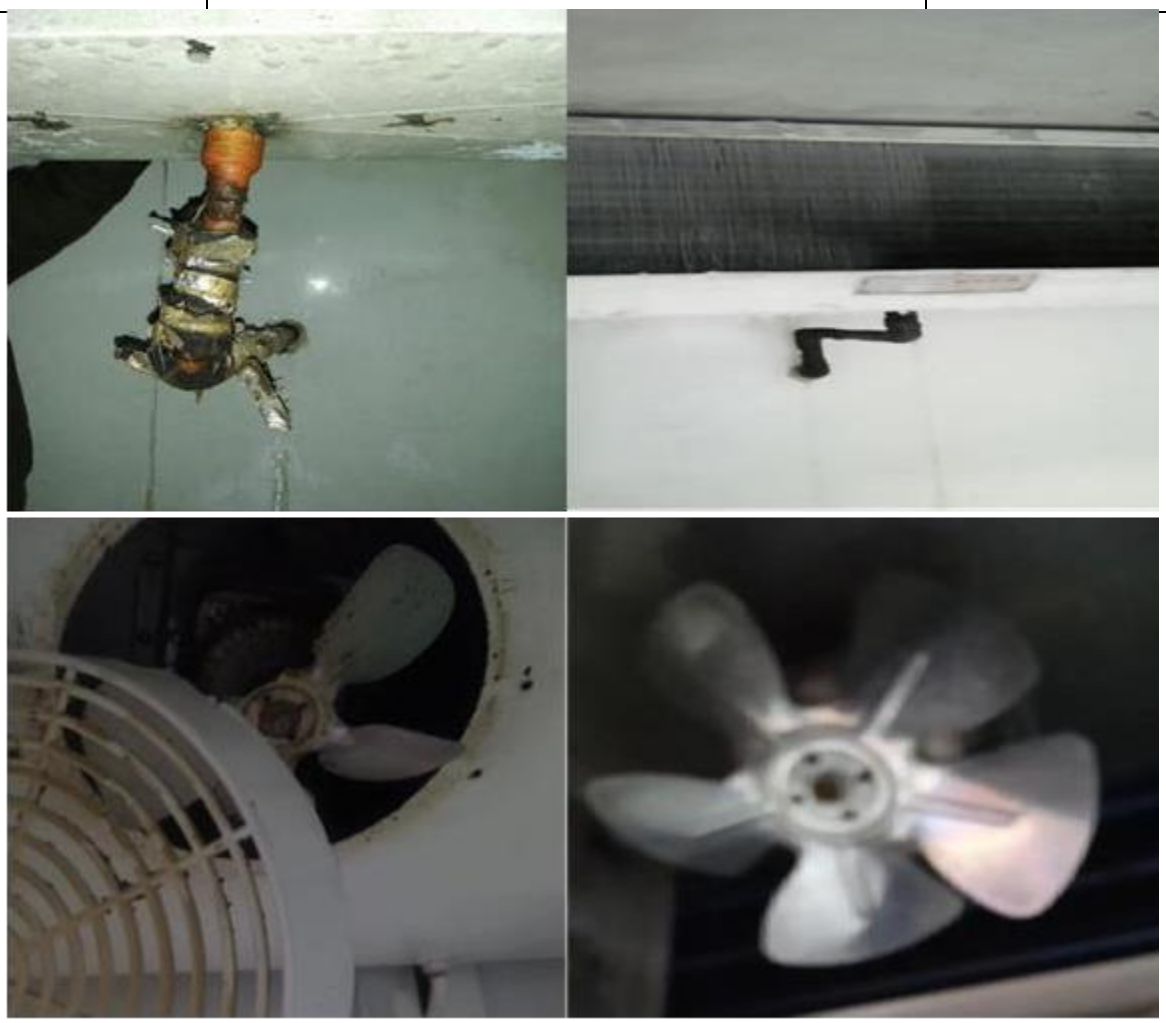

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular

Manipulación del equipo, controles digitales y de temperatura únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 13 NEVECON DOS PUERTAS TURBO AIR VOLT. 115 - 127 FERQ 60 HZ / 10,5 AMP /GAS R404A / N4 1050DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presiónde 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a las dos puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora.
Limpieza y engrase de motores ventiladores del evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo queda operando con buena capacidad.
El equipo presentaba problemas en los motores ventiladores, luego de intervención el equipoopera en su totalidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO











RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular
Manipulación del equipo únicamente por personal calificado.
Al realizar limpieza tener cuidado con el ingreso de agua en los equipos y sus partes eléctricas.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 23 NEVECON DOS PUERTAS ZINGAL VOLT. 110 - 120 FERQ 60 HZ / 10,5 AMP
/ GASR404A / N3 5250

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada. 10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a las dos puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

REGISTRO FOTOGRAFICO







RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo no tenía buena capacidad de enfriamiento. Queda operando correctamente.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Realizar mantenimiento preventivo regular, dando durabilidad y buen funcionamiento al equipo.


Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 24 CONGELADOR CHALLEGER 120 FERQ 60 HZ / 10,5 AMP / GAS R134 / 5251
ITEM. 25 CONGELADOR CHALLEGER 120 FERQ 60 HZ / 10,5 AMP / GAS R134 / 5251

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Reparación bisagras y tornillería en acero inoxidable
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a las dos puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras, limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidadcondensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo queda con buena capacidad de enfriamiento.

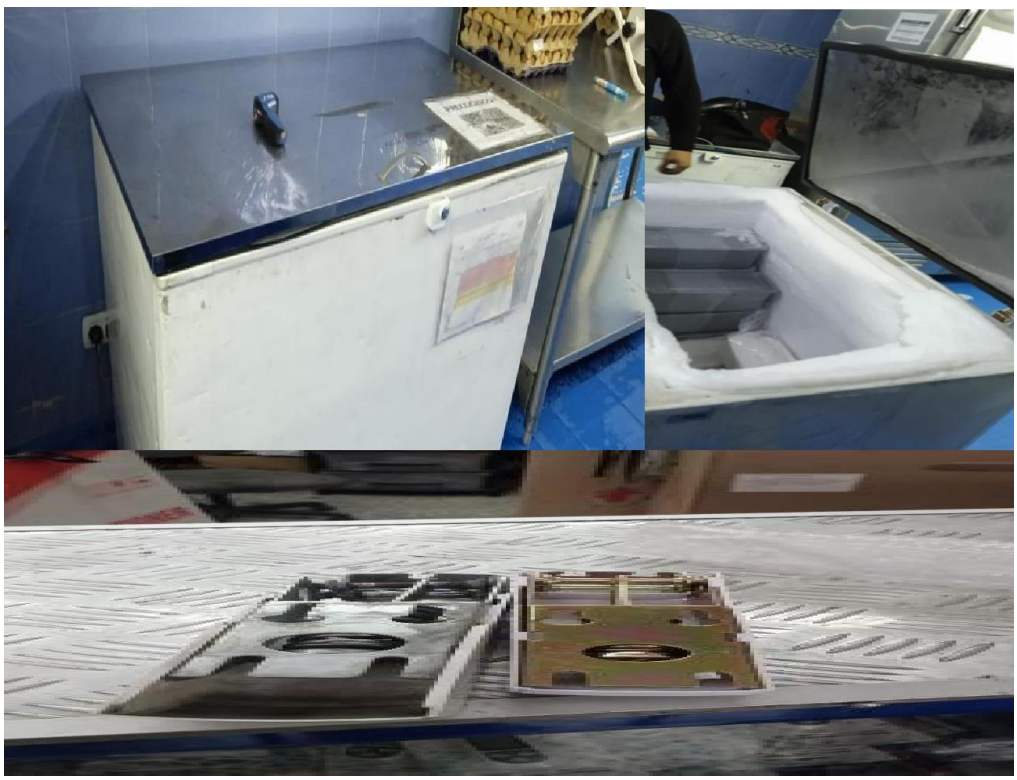



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Realizar mantenimiento preventivo regular, dando durabilidad y buen funcionamiento al equipo.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT


UBICACIÓN: ALMACEN AYB
ITEM. 26 NEVECON DOS PUERTAS SIN MARCA VOLT. 110 - 120 FERQ 60 HZ / 10,5AMP /GAS R404A / N9 5249

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de control full gauge- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Ajuste de carga de gas 134a
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada 10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a las dos puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador (cambiode aspas)
Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento del mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El equipo queda operando con buena capacidad de temperatura.

REGISTRO FOTOGRAFICO

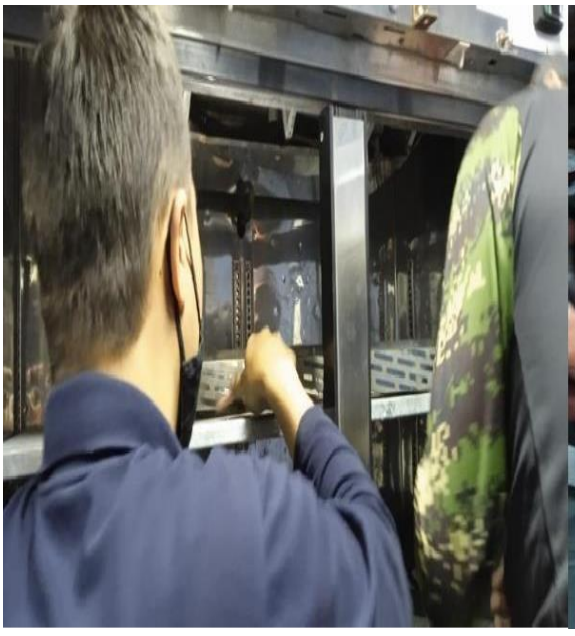







RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Limpieza periódica Mantenimiento preventivo regular
Manipulación del equipo y sus partes eléctricas únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

ITEM.50 NEVECON UNA PUERTA MARCA ASBER VOLT. 115 - 127/ FERQ 60 HZ / 6.5 AMP /GAS R404A / PORTOFINO 1039

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Reprogramación de control full gauge- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)

Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo con soldadura de plata Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo descartando impurezasy fugas.

Realización De Vacío A Todo El Sistema Con Bomba De Vacío

Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada 10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.

Cambio control analógico

Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora

Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8

Lavado y desengrase general del equipo

Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamientodel mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Luego de intervención queda operativo alcanzando la temperatura requerida.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular, manipulación del equipo y sus partes eléctricas por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

ITEM.52 NEVERA HORZINTAL TIPO MEZON / VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ / 5,6 AMP / GASR134A / PORTOFINO 1174

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura fullgaug e para el equipo Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)

Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante auna presión de 300 PSI

Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata

Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.

Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)

Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada. 10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.

Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo

Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora

Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora Limpieza y engrase de motores ventiladores del evaporadores y condensador


Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo

Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento del mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Queda operando con buena revolución el motor ventilador y sin ningún ruido, anteriormente presentaba ruido.

REGISTRO FOTOGRAFICO

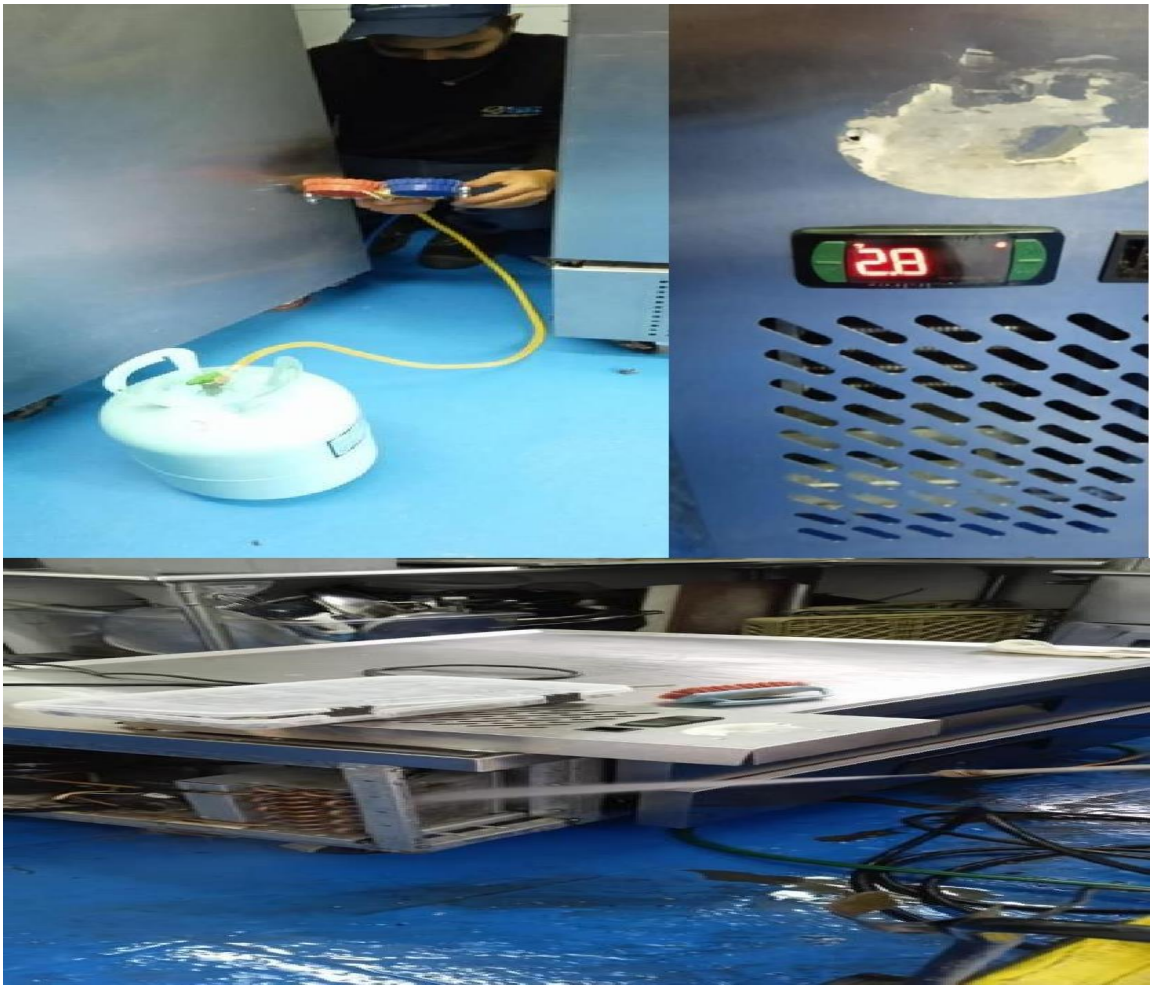

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular por personal calificado así alargamos la vida útil del equipo.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

ITEM.53 NEVERA HORZINTAL TIPO MEZON BANDEJAS / VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ /5,6 AMP / GAS R134A / PORTOFINO 1853


DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Verificación de motor compresor
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador (cambiode aspas)
Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamientodel mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El equipo queda operando con buena capacidad de temperatura.

REGISTRO FOTOGRAFICO

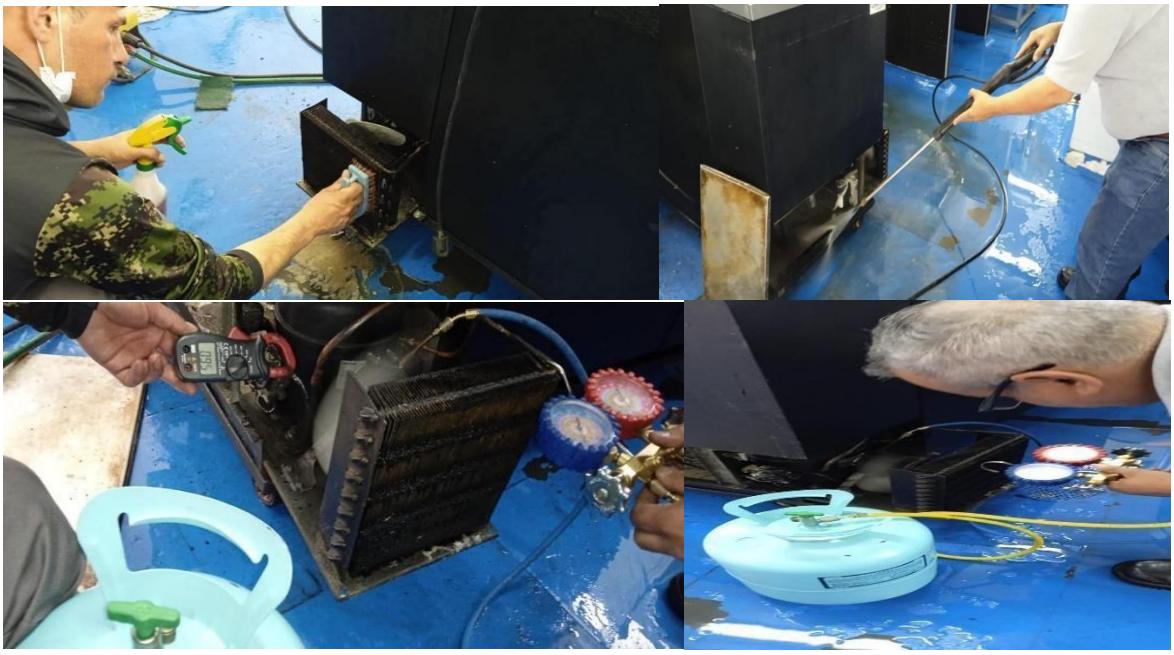

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Mantenimiento preventivo regular por personal calificado así alargamos la vida útil del equipo.

Manipulación del equipo y sus partes eléctricas por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

ITEM.56 NEVERA HORZINTAL TIPO EXHIBICION / VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ / 5,6AMP
/ GAS R134A / PORTOFINO 1815

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura full gauge para el equipo. Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas y limpieza con gas R141B.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada:10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120 V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

Trabajos realizados (extras)

Suministro e instalación de**:** compresor de i ½ hp 110v r134Filtro secador
Térmicos eléctricos.

REGISTRO FOTOGRAFICO





RESULTADOS OBTENIDOS:
Con el trabajo descrito y los extras, el equipo queda operando correctamente.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado así alargamos la vida útil del equipo.
Manipulación del equipo, control de temperatura y partes eléctricas únicamente por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN:
SALON COLOMBIA ITEM.7 CUARTO FRIO

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de circuito eléctrico Full gauge TC 900 - Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Mantenimiento general partes eléctricas: contactores, térmicos, breakermatic.
Instalación empaque sello magnético
Aislamiento en rubatex de tubería
Cambio motor ventilador manejadora, cajaCambio lámpara de iluminación
Cambio aceite
Carga de gas refrigerante R404A - 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Cambio tubería de cobre 3 mts.Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Con la intervención realizada evitamos recalentamiento a la unidad condensadora y elcorrecto funcionamiento del equipo.

REGISTRO FOTOGRAFICO







RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: SALON COLOMBIA
ITEM. 22 HIELERA ICE-O-MATIC VOLT. 220 / FERQ 60 HZ / GAS R404A / 4027

DESCRIPCION DEL SERVICIO:


Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura full gaugepara el equipo
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presiónde 300PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema (con bomba de vacío)
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada:50 por baja y 250 por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo 12amp-16amp.
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.
Mantenimiento tarjeta electrónica: condensadores, transistores, diodos, bobinas,interruptores, fusible.
Recarga de gas
Repotencialización motor 110.127 V clase B, 1/70 hp

RESULTADOS OBTENIDOS:

La máquina queda con buen funcionamiento y produciendo hielo según programación.

REGISTRO FOTOGRAFICO



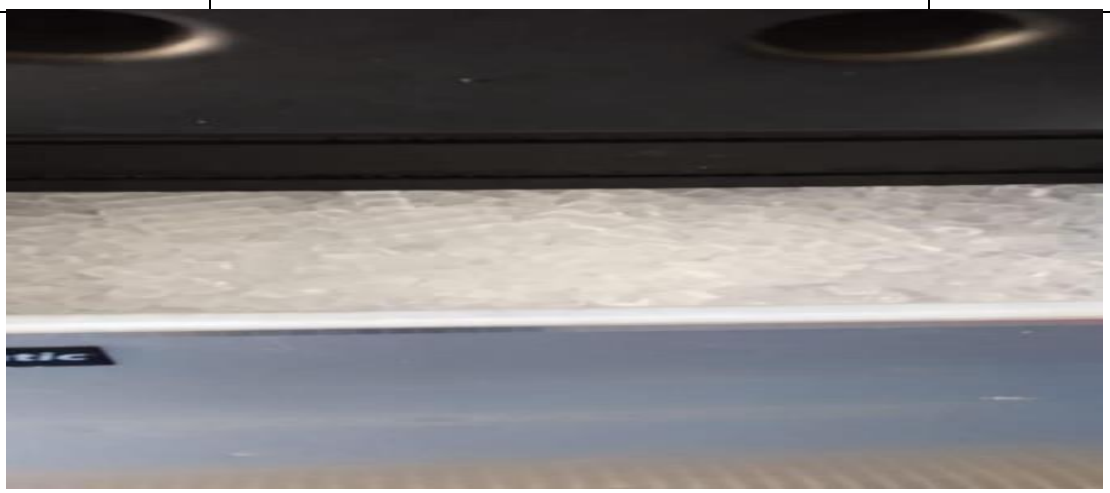

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Limpiar la maquina regularmente.

Asegurarse que siempre tengan alimentación de agua. No permitir que se desocupe en su totalidad.

Manipular únicamente por personal calificadoMantenimiento preventivo regular.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL ITEM. 8 CUARTO FRIO N°1 39098
DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Cambio de circuito eléctrico Full gauge TC 900-Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Mantenimiento general partes eléctricas: contactores, térmicos, breakermatic. Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Cambio de resistencias de descongelación220VAislamiento en rubatex de tubería
Caja
Cambio de tubería mtCambio aceite
Carga de gas refrigerante R507 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts. Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El cuarto frio queda operando correctamente evitando acumulación de hielo y obstrucciónpor baja temperatura.

REGISTRO FOTOGRAFICO





RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Limpieza regular para descongelación evitando aglomeración de hielo. Mantenimiento preventivo regular.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT


UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL ITEM. 9 CUARTO FRIO N°2 39091
DESCRIPCIONDEL SERVICIO:

Cambio de circuito eléctrico Full gauge TC900Mantenimiento general partes eléctricas
Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Cambio 3 motores axiales de 14”Aislamiento en rubatex de tuberíaCaja
Cambio de lámpara de iluminaciónCambio de tubería mt
Cambio de ruedas de teflónCambio aceite
Carga de gas refrigerante 404ª 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts. Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Con la intervención realizada el cuarto funciona de manera Correcta, realizando el ciclo defrio.

REGISTRO FOTOGRAFICO

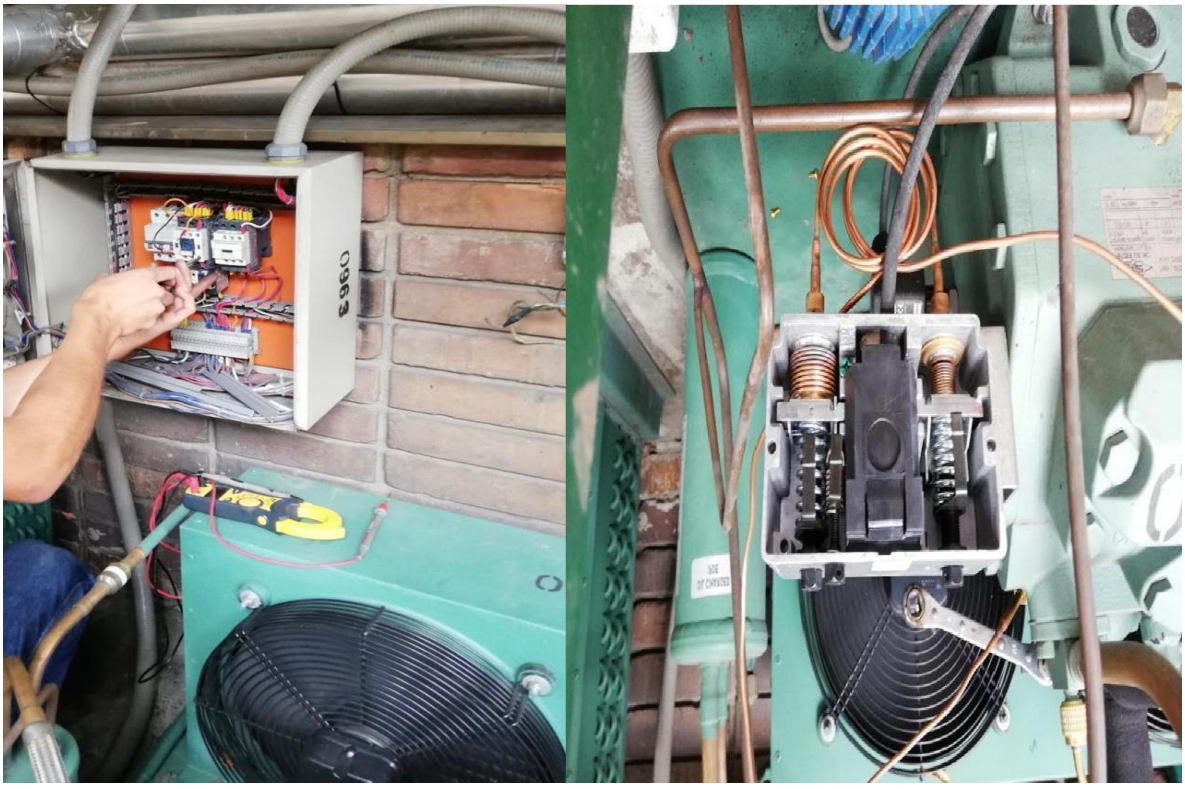





RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Realizar limpieza periódica.
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL ITEM. 10 CUARTO FRIO N°3 (5) 1194

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Cambio de circuito eléctrico Full gauge TC 900
Mantenimiento general partes eléctricas: contactores, térmicos, breakermatic.
Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Aislamiento en rubatex de tubería, cajaCambio de tubería mt
Cambio aceite para unidad compresora
Carga de gas refrigerante R507 - 50PSI por baja, 180PSI por alta
Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts. Lavado y desengrase
Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El cuarto queda trabajando a la temperatura requerida y el tiempo de trabajo deseado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Manipular únicamente personal calificado.

Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vida útil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL ITEM. 11 CUARTO FRIO N°4 (4) 1195 DESCRIPCIONDEL SERVICIO:

Cambio de circuito eléctrico Full gauge TC512
Mantenimiento general partes eléctricas: contactores, térmicos, breakermatic. Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en rubatex de tubería Mantenimiento y arreglo de drenajesCaja
Cambio de lámpara de iluminaciónCambio de tubería mt
Cambio aceite de unidad compresora
Carga de gas refrigerante 404ª 45PSI por baja, 220PSI por alta
Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Rectificación plato de válvulas Cambio tubería de cobre 3mts. Lavado y desengrase Mantenimiento general.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El equipo queda operando con buena capacidad y temperatura.

REGISTRO FOTOGRAFICO









RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado así alargamos la vida útil del equipo.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL
ITEM. 12 NEVECON DOS PUERTAS STARKOOC VOLT. 115 - 127 FERQ 60 HZ / 6.5 AMP / GASR134A / 1040

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Suministro e instalación de unidad compresora de ½ HP /110V -R134A
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presiónde 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques puertas del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras.
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe
Puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento del mismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Este equipo se encontraba sin funcionar. Al realizar estos trabajos queda operando correctamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Manipular únicamente personal calificado.
Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vida útil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL
ITEM. 15 NEVECON UNA PUERTA STARKOOC VOLT. 115 - 127/ FERQ 60 HZ / 6.5 AMP / GASR404A / (14) 974

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Ajuste de carga de gas R134A
Cambio de control full gauge- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo quedo operando con buena capacidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Manipulación del equipo, partes eléctricas y control de temperatura únicamente porpersonal calificado.
Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vidaútil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT


UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL
ITEM. 17 NEVECON UNA PUERTA ZINGAL /VOLT. 115 - 127/ FERQ 60 HZ / 8,5 AMP / GASR404A / (15) 1168

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de control full gauge TC900 - Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Ajuste de carga de gas R134A
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada. 10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo - voltaje 110-120V amperaje 4.8
Lavado y Desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo queda operando con buena capacidad de temperatura.

REGISTRO FOTOGRAFICO



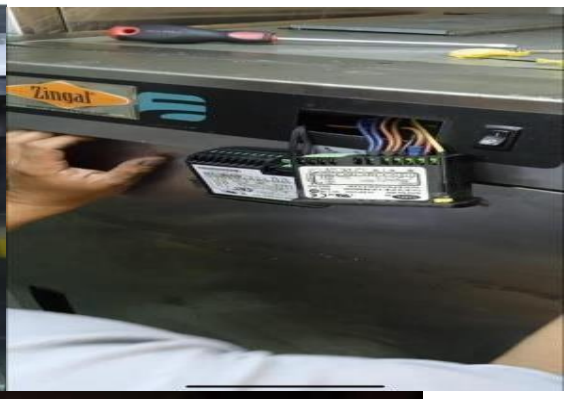



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Manipulación del equipo, partes eléctricas y control de temperatura únicamente por personal calificado.

Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vidaútil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA PRINCIPAL (PASTELERIA)
-ITEM. 19 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ
/ 6,5 AMP / GAS R134A / 1830
-ITEM. 20 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ
/ 6,5 AMP / GAS R134A / 1821
- ITEM. 21 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60HZ / 5,6 AMP / GAS R134A / (11) 1814

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Ajuste de carga de gas R134A
Prueba de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de la evaporadora
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo - voltaje 110-120V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Los equipos se encontraban con variaciones de voltaje en sus partes eléctricas afectando su correcto funcionamiento. Luego de los trabajos realizados quedan funcionando con la temperatura requerida y apropiada.

REGISTRO FOTOGRAFICO:









RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Limpieza periódica.
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado para alargar la vida útil de los equipos.

UBICACIÓN: COCINA DE EMPLEADOS
ITEM. 16 NEVECON UNA PUERTA ASBBER /VOLT. 115 - 127/ FERQ 60 HZ / 5,6 AMP / GASR134A / 1051 F/S

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura full gaugepara el equipo
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo
Barrido con nitrógeno a toda la tubería y limpieza con R141B. 300PSI por alta
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaques a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo voltaje 110-120V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

El equipo se encontraba con variaciones de temperatura. Con el trabajo realizado funcionacorrectamente y con estabilidad.







RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Manipulación del equipo, partes eléctricas y control de temperatura únicamente por personalcalificado.

Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vidaútil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: COCINA EMPLEADOS
-ITEM.27 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ
/ 5,6 AMP / GAS R134A / (31) 1924
-ITEM.28 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK/ VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ
/ 5,6 AMP / GAS R134A / COCINA EMPLEADOS (32) 1829

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para elequipo
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presiónde 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo y limpieza con R141B. 300PSI por alta
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora Limpieza y engrase de motores ventiladores del evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo- voltaje 110-120V amperaje 4.8 Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamientodelmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Las neveras quedan operando correctamente.

REGISTRO FOTOGRAFICO









RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo regular por personal calificado así alargamos la vida útil del equipo.


Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: BAR CAZADORES
ITEM.45 NEVERA HORIZONTAL VOLT. 115 - 127 / FERQ 60 HZ / 5,6 AMP / GAS R134A
/ 1138 DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura full gauge para el equipo- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo descartando impurezas yfugas.
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo: voltaje 110-120V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Este equipo se encontró con variaciones de temperatura. Con la intervención el equipo queda operando con buena capacidad de temperatura, buen balance y estabilidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO

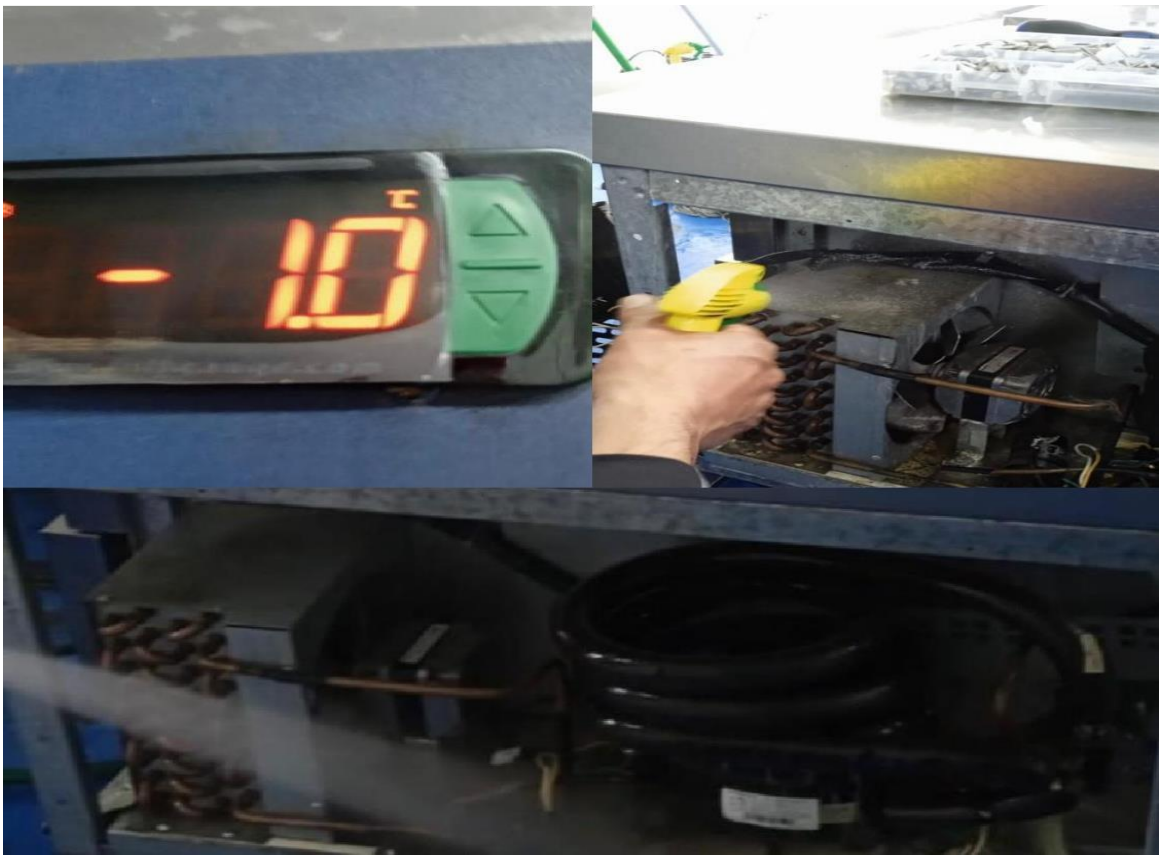

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Mantenimiento preventivo cada dos meses
Manipulación del equipo y sus partes eléctricas por parte de personal calificado.
Prevenir el ingreso de agua en la parte superior donde se encuentran sus partes eléctricas.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: PISCINA

ITEM.42 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ/ 5,6 AMP / GAS R134A / (28) 1916

DESCRIPCION DEL SERVICIO:

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)

Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante a una presión de 300 PSI

Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata

Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo y limpieza con R141B. 300PSI por alta

Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío

Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada.10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.

Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo

Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras

Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora

Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador

Verificación de voltaje y amperaje del equipo- voltaje 110-120V amperaje 4.8

Lavado y desengrase general del equipo

Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RESULTADOS OBTENIDOS

El equipo queda operando correctamente alcanzando la temperatura requerida El equipo queda operando bajo los ciclos de temperatura correctos programados, parimetria del control de temperatura,

REGISTRO FOTOGRAFICO



RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

Manipulación del equipo, partes eléctricas y control de temperatura únicamente por personal calificado.

Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vida útil.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

UBICACIÓN: PISCINA
ITEM. 43 NEVERA HORZINTAL TIPO BOTELLERO STARKOOK / VOLT. 115 - 127 /FERQ 60 HZ/ 5,6 AMP / GAS R134A / (26) 1919

DESCRIPCION DEL SERVICIO:
Cambio de control full gauge TC512- Conexión de parametría (Tiempo de defrost, parada de compresor, encendido de resistencias)
Pruebas de presurización con nitrógeno para detectar fugas de refrigerante- a una presiónde 300 PSI
Rectificación de fugas de refrigerante de todo el equipo con soldadura de plata
Barrido con nitrógeno a toda la tubería de baja y alta del equipo y limpieza con R141B. 450PSI por alta
Realización de vacío a todo el sistema con bomba de vacío
Cambio y suministro de refrigerante nuevo 134 a todo el sistema hasta la presión indicada-10Lb manométricas por baja 120Lb por alta.
Cambio suministro e instalación de empaque a la puerta de acceso del equipo
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines de las evaporadoras
Limpieza con químico desincrustante e hidrolavadora a serpentines a la unidad condensadora
Limpieza y engrase de motores ventiladores de los evaporadores y condensador
Verificación de voltaje y amperaje del equipo- voltaje 110-120V amperaje 4.8
Lavado y desengrase general del equipo
Destaponamiento de desagüe y puesta en servicio en óptimo estado de funcionamiento delmismo.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:
Limpieza periódica.
Manipulación del equipo, partes eléctricas y control de temperatura únicamente por personalcalificado.
Mantenimiento preventivo regular para prevenir fallas y optimizar su funcionamiento y vidaútil.

REGISTO FOTOGRAFICO



RESULTADOS OBTENIDOS:
El equipo funcionando correctamente.

OBSERVACIÓN:
Los trabajos extras se realizan por efectos de calidad del presente contrato y no se dará cubrimiento bajo las garantías del contrato.

Jefe Técnico (RA) **ROBINSON ORJUELA ZAPATA**
Supervisor del Contrato No. CM 205 DE 2022

ANGEL ENRIQUE RODRIGUEZ TAVERA
Técnico Soluciones Integrales SRT

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Nombre Comercial	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS
NIT	901189763
Obligación	IVA
Email	administrativo@srt-sas.com
Teléfono	3133399335
Dirección	CR 111 A 145 87 TO 8 AP 402
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CLUB MILITAR
Nombre Comercial	
NIT	860016951
Obligación	IVA
Email	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Teléfono	2611593
Dirección	AK 50 15-80
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	"Cuarto Frio No 1 Almacen AyB C1 17229"	ITEM 1.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Conexión de parametría mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Tubería mt Cambio Lámpara de iluminación Instalacion Rubatex para los cuartos Mantenimiento desagues Cambio de resistencias Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion de Fugas Carga de gasfiltro secador Cambio tuberia de cobre Soldaduras Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,237,500.00	IVA 19%	$1,237,500.00	$1,472,625.00
2	"Cuarto Frio No 2 Almacen AyB C2 17228 "	ITEM.2.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 BARRIDO DEL SISTEMA FILTRO SECADOR mantenimiento y arreglo de drenajes CAMBIO DE COMPRESOR Cambio Tubería mt Cambio guarda motor Cambio Aceite Cambio Filtro secador Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$4,875,000.00	IVA 19%	$4,875,000.00	$5,801,250.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

3	"Cuarto Frio No 3 Almacen AyB C3 17227 "	ITEM.3.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 CAMBIO MOTOR VENTILADOR Caja Conexión de parametría Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Cambio Tubería mt Cambio Lámpara de iluminación Cambio Filtro secador Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion de Fugas Carga de gas R22 Cambio tuberia de cobre Cambio 3 motores axiales de 14" Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,800,000.00	IVA 19%	$1,800,000.00	$2,142,000.00
4	"Cuarto Frio No 4 Almacen AyB C4 17226 "	ITEM.4.CALIBRACION CONTROL FULL GAUGE Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Instalacion medias cañas Aislamiento en Rubatex de tuberia mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio guarda motor Cambio Aceite Cambio Filtro secador Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,335,000.00	IVA 19%	$1,335,000.00	$1,588,650.00
5	"Cuarto Frio No 5 Almacen AyB C5 17225 "	ITEM 5.tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Instalacion medias cañas Aislamiento en Rubatex de tuberia mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,316,250.00	IVA 19%	$1,316,250.00	$1,566,338.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

6	"Cuarto Frio No 6 Almacen AyB C6 17224"	ITEM 6.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas CAMBIO MOTOR VENTILADOR REPARACION RIEL PUERTA Y EMPAQUES Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tuberia mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio ruedas en teflon Cambio Aceite Cambio medias cañas Carga gas refrigerante R22 Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,837,500.00	IVA 19%	$1,837,500.00	$2,186,625.00
7	"Cuarto Frio Salon Colombia "	ITEM 7.de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Instalacion empaque sello magnetico Aislamiento en Rubatex de tuberia Cambio motor ventilador manejadora Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Aceite Carga gas refrigerante (404 AJUSTE) Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,500,000.00	IVA 19%	$1,500,000.00	$1,785,000.00
8	"Cuarto Frio No 1 Cocina Principal 39098"	ITEM 8.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Cambio Resistencias de descongelacion Aislamiento en Rubatex de tuberia Caja Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 (AJUSTE) Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,725,000.00	IVA 19%	$1,725,000.00	$2,052,750.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

9	"Cuarto Frio No 2 Cocina Principal 39091"	ITEM 9.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tuberia Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio ruedas en teflon Cambio Aceite Carga gas refrigerante (AJUSTE) Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,200,000.00	IVA 19%	$1,200,000.00	$1,428,000.00
10	"Cuarto Frio No 3 Cocina Principal (5) 1194"	ITEM 10.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Aislamiento en Rubatex de tuberia Caja Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante R507 AJUSTE Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,725,000.00	IVA 19%	$1,725,000.00	$2,052,750.00
11	"Cuarto Frio No 4 Cocina Principal (4) 1195"	ITEM 11.Cambio de circuito eléctrico Full gauge900 Mantenimiento General partes Electricas Conexión de parametría Cambio 3 motores axiales de 14" Aislamiento en Rubatex de tuberia mantenimiento y arreglo de drenajes Caja Cambio Lámpara de iluminación Cambio Tubería mt Cambio Aceite Carga gas refrigerante AJUSTE Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion Rectificacion plato de valvulas Cambio tuberia de cobre Lavado y desengrase Mantenimiento general	1	94	$1,200,000.00	IVA 19%	$1,200,000.00	$1,428,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

12	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1040	ITEM 12.E Instalación De Unidad Compresora Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$1,012,500.00	IVA 19%	$1,012,500.00	$1,204,875.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

13	Nevecon dos puertas Turbo Air volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N4 1050	ITEM 13.Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$450,000.00	IVA 19%	$450,000.00	$535,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

14	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal (14) 974	ITEM 15. AJUSTE DE CARGA DE GAS CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$750,000.00	IVA 19%	$750,000.00	$892,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

15	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina de empleados 1051 F/S	ITEM 16. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$562,500.00	IVA 19%	$562,500.00	$669,375.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

16	Nevecon una puerta Zingal /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal (15) 1168	ITEM 17.CAMBIO DE CONTROL FULL GAGE AJUSTE DE CARGA DE GAS Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$750,000.00	IVA 19%	$750,000.00	$892,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

17	Nevera horizontal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal (PASTELERIA) 1830	ITEM 19. AJUSTE DE CARGA DE GAS Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$600,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

18	Nevera horzintal tipo botellero Starkook / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal 1821	ITEM 20.AJUSTE DE CARGA DE GAS Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$600,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

19	Nevera horzintal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal (11) 1814	ITEM 21. AJUSTE DE CARGA DE GAS Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$600,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

20	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia 4027	ITEM 22. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante+C27C279:C293 Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo. Mantenimiento tarjeta electronica Recarga de gas. Reponteciali zar motor (110-127 V clase B, 1/70 hp).	1	94	$1,125,000.00	IVA 19%	$1,125,000.00	$1,338,750.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

21	Nevecon dos puertas ZINGAL volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N3 5250	ITEM 23. Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$803,130.00	IVA 19%	$803,130.00	$955,725.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

22	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	ITEM 24. REPARACION VISAGRAS Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$607,500.00	IVA 19%	$607,500.00	$722,925.00
23	CONGELADOR CHALLEGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / Almacen AyB 5251	ITEM 25.REPARACION VISAGRA Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$607,500.00	IVA 19%	$607,500.00	$722,925.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

24	Nevecon dos puertas SIN MARCA volt. 110 - 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB N9 5249	ITEM 26.CAMBIO DE CONTROL AL FULL GAUGE AJUSTE DE CARGA DE GAS Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$750,000.00	IVA 19%	$750,000.00	$892,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

25	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (31) 1924	ITEM 27. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$525,000.00	IVA 19%	$525,000.00	$624,750.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

26	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK/ volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina EMPLEADOS (32) 1829	ITEM 28.Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$525,000.00	IVA 19%	$525,000.00	$624,750.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

27	Nevecon dos puertas REFRITECNICA volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS 156625	ITEM 33.Suministro E Instalac+C348:D372ión De Unidad Compresora Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$3,000,000.00	IVA 19%	$3,000,000.00	$3,570,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

28	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / CAFETERIA DE SOCIOS (37) 1044	ITEM 34.CAMBIO DE CONTROL FULL GAUGE. AJUSTE DE CARGA DE GAS Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$750,000.00	IVA 19%	$750,000.00	$892,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

29	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / CAFETERIA DE SOCIOS (38) 1824	ITEM 35.AJUSTE DE CARGA DE GAS Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$600,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

30	CONGELADOR CHALLENGER 120 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R134 / CAFETERIA DE SOCIOS BLANCO SIN PLACA	ITEM 36. REPARACION VISAGRAS Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Evaporadoras Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$607,500.00	IVA 19%	$607,500.00	$722,925.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

31	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (39) 1037	ITEM 40., instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$622,521.00	IVA 19%	$622,521.00	$740,800.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

32	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / COMEDOR DE SOCIOS (40) 1036	ITEM 41.REVISION SISTEMA ELECTRICA 2.AJUSTE CARGA DE GAS Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$682,500.00	IVA 19%	$682,500.00	$812,175.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

33	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (28) 1916	ITEM 42.Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$600,000.00	IVA 19%	$600,000.00	$714,000.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

34	Nevera horizontal tipo botellero STARKOOK / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PISCINA (26) 1919	ITEM 43.CAMBIO CONTROL FULL GAUGE 512 Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$637,500.00	IVA 19%	$637,500.00	$758,625.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

35	Nevera horizontal volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / BAR CAZADORES 1138	ITEM 45.Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$562,500.00	IVA 19%	$562,500.00	$669,375.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

36	Nevecon una puerta MARCA ASBER volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / PORTO FINO 1039	ITEM 50.REPROGRAMACION CONTROL Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. CAMBIO CONTROL ANALOGICO Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$525,000.00	IVA 19%	$525,000.00	$624,750.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

37	Nevera horzintal tipo MEZON / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1174	ITEM 52. Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$562,500.00	IVA 19%	$562,500.00	$669,375.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

38	Nevera horizontal tipo MEZON BANDEJAS / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1853	ITEM 53.VERIFICACION MOTOR COMPRESOR Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$450,000.00	IVA 19%	$450,000.00	$535,500.00

Factura Electrónica de Venta 3371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764021344240 de 17/11/2021 - 17/11/2022 autoriza -3201 a -3400

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	17/11/2022 15:01
Fecha de Vencimiento	30/11/2022 00:00
Fecha de Validación	17/11/2022 15:02
Forma de Pago	Crédito 13 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901189763
Actividad Económica Principal 3312
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

39	Nevera horizontal tipo EXHIBICION / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / PORTOFINO 1815	ITEM 56, instalación y puesta en funcionamiento de 01 control de temperatura para el equipo Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Cambio De Tubería Si Es Necesario) Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo Realización De Vacío A Todo El Sistema Sistema (Con Bomba De Vacío) Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada. Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La Puerta De acceso del Equipo Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de La Evaporadora Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Cambio De Aspas Si Es Necesario) Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo Lavado Y Desengrase General Del Equipo Destaponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.	1	94	$562,500.00	IVA 19%	$562,500.00	$669,375.00

39

Subtotal	$40,181,901.00
IVA 19%	$7,634,561.00
Total a Pagar	$47,816,462.00

#$15-10-00-000;contrato205-2022;recepcionfacturaelectronica@clubmilitar.gov.co#$

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3507180E07108E93

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JEISSON ALEXANDER CAMACHO RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1016019708 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 250160-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de agosto de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES


EL CONTADOR DE SRT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

CERTIFICA:

Que la Empresa SRT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S, con Nit: 901.189.763-1 durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2022. De conformidad con las normas vigentes ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones con el sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar. Lo anterior en observancia de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Así mismo, Acogiéndonos al Decreto 2201 del 2016 que reglamenta parcialmente la Ley 1819 de 2016, nuestra empresa se encuentra Exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por ser una persona jurídica, responsable de la auto retención del Impuesto sobre la Renta, según ley 1819.

Dada en Bogotá D.C., a los 3 días del mes de noviembre de 2022.



FIRMA:
JEISSON ALEXANDER CAMACHO
CC. No. 016.019.708 de Bogotá

T.P.250160-T CONTADOR PUBLICO

3014848
www.srt-sas.com
administrativo@srt-sas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.016.019.708

CAMACHO RINCON
APELLIDOS

JEISSON ALEXANDER
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-AGO-1989
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

13-AGO-2007 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500109-47163962-M-1016019708-20071014 00494 07287O 02 239004581

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250160-T



JEISSON ALEXANDER
CAMACHO RINCON
C.C. 1016019708
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258000 277218

Scanned by TapScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS Identificado con NI 9011897631

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina COLINA CAMPESTRE, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24086081117
Fecha de apertura:	6 de Julio de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0167 COLINA CAMPESTRE de la ciudad de BOGOTA, el día Viernes, 14 de Octubre de 2022.

Cordialmente,

Banco Caja Social
OF. COLINA CAMPESTRE
SG 31 14 OCT 2022 OF. 167
Vo.Bo.
TRAMITADO

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS	CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	3014848	administrativo@srt-sas.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	24/10/2022	62043632	$2.520.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	52.000	0		0		0	10	500	0	52.500	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	224.000	0		0		0	10	2.200	0	226.200	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	88.000	0		0		0	10	900	0	88.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	10	1.600	0	161.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	528.000	0	0	0	0	10	5.100	0	533.100	3
231001	Colfondos	800227940-6	352.000	0	0	0	0	10	3.400	0	355.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	10	4.000	0	420.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	312.000				312.000	10	3.000	315.000			3.120	315.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	364.000	10	3.500	367.500	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	364.000	367.600
Pensión	4	1.456.000	1.470.100
Riesgos Laborales	1	312.000	315.000
CCF	1	364.000	367.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.496.000	2.520.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901189763-1	SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS		CR 111A 145 87 TO 8 AP 402	3014848	administrativo@srt-sas.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	24/10/2022	62043632	$2.520.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018497386	RODRIGUEZ TAVERA ANGEL ENRIQUE	1	0			S																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019019342	RODRIGUEZ TAVERA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1019081761	RODRIGUEZ TAVERA EDGAR FELIPE	1	0			S																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	1031126892	SIABATO CASTRO BRYAN OSWALDO	1	0			S																	231001	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS008	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
5	CC	1126430998	LASCANO JAIMES ALEXANDER YOSUE	1	0			S																	25-14	1.600.000	256.000	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	64.000	14-11	1.600.000	5	111.400	CCF24	1.600.000	64.000	0	0	0	0	0
6	CC	52048488	TAVERA GAITAN MARIA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	79154203	RODRIGUEZ ALBA EDGAR ANGEL	1	0			S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
8	PT	856615	PIRELA ARTEAGA DEIVER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
