






INFORME FINAL


En Bucaramanga a los once (11) días del mes de marzo del año 2023, se reunieron los señores: (QUIENES RECIBEN), EDER ORLANDO GONZALEZ, en su calidad de SUPERVISOR del Contrato 393, y el señor GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA (QUIEN ENTREGA) Representante Legal de la empresa FRIOCLIMA DE ORIENTE S.A.S.,se reunieron con el fin de verificar la ENTREGA Y RECIBIDO de lo que se detalla a continuación y cuya instalación se llevó a cabo entre las fechas del seis (06) y once (11) de marzo del presente año:

Bucaramanga marzo 11 de 2023


Señores


ALCALDIA DE BUCARAMANGA0

No.	ÍTEM	CANTIDAD DE EQUIPOS	CARACTERISTICA	IMAGEN	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO EJECUTADO
1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	2	Descripción: Equipo de Aire acondicionado tipo fancoil de 40000 BTU/H, refrigerante R-410, con condensadora para la capacidad solicitada.		Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaró paso a paso las siguientes actividades: Instalacion de las unidades tipo fancoil dentro del salon de gobierno. Instalacion a la intemperie de las unidades condensadoras en piso de la terraza.
2	EQUIPO UNIDAD PURIFICADORA DE AIRE, VERTICAL FILTRO EPA	3	Descripción: Equipo purificador de aire .		Se realizaron las actividades de instalacion d elos equipos.
3	INSTALACIÓN DE LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN	2	Descripción: 1. tubería de cobre de 3/8" con rubatex cantidad: 60m 2. tubería de cobre de 5/8" con rubatex cantidad: 30m 3. tubería de cobre de 3/4" con rubatex cantidad: 36m 4.Accesorios (codos, uniones. soldadura, gas map) y 5.Puntos de anclaje (soportaría de tubería y/o abrazaderas según sea necesario) 6. Pruebas de fugas 7. instalacion de valvulas de paso 8. vacio 9. ajuste de carga de refrigerante	 	Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaró paso a paso las siguientes actividades: instalacion de sus tuberias de refrigeracion en cobre con diametros de 5/8 para tuberia de succion y 3/8 para tuberia de descarga, con su respectivo aislamiento rubatex, soporte y llegada con acoplimiento tuerca exagonal flare, barrido del sistema con nitrogeno, pruebas de hermeticidad, vacio y carga de refrigerante.
4	INSTALACIÓN LÍNEA ELÉCTRICA Y/O CONTROL	2	Descripción: Instalación de cable encauchetado 4x12 para señal, (de la condensadora a la evaporadora) Cantidad. 62 m		Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaró paso a paso las siguientes actividades. instalacion y conexion de cable encaucetado 4X12 de alimentacion electrica y señal, esta instalacion correcponde a los dos equipos (DOS FANCOIL DE 40000 BTU).
5	INSTALACIÓN DE TUBERÍA VALVULAS DE PASO	2	Descripción: accesorios valvulas de paso, cantidad: dos de 5/8 y dos de 3/8.		Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaró paso a paso las siguientes actividades: instalacion de valvulas de paso.
6	INSTALACIÓN DE DUCTERIA	2	Descripción: Ducteria en panel espuma rigida polisocianurato, 60m2		Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaró paso a paso de las siguientes activividades: instalacion de ducteria en panel espuma rigida polisocianurato.

7	INSTALACIÓN REJILLAS DE SUMINISTRO	2	Descripción: rejilla difusora de suministro, 6 rejillas		Finalizadas las actividades de instalación de los equipos se realizaron paso a paso de las siguientes actividades: instalación de rejillas de suministro.
8	INSTALACIÓN REJILLAS DE SUMINISTRO	2	Descripción: rejilla de retorno, 2 rejillas		Finalizadas las actividades de instalacion de los equipos se realizaron paso a paso de las siguientes activividades: instalación de rejillas de retorno.

REGISTRO FOTOGRAFICO

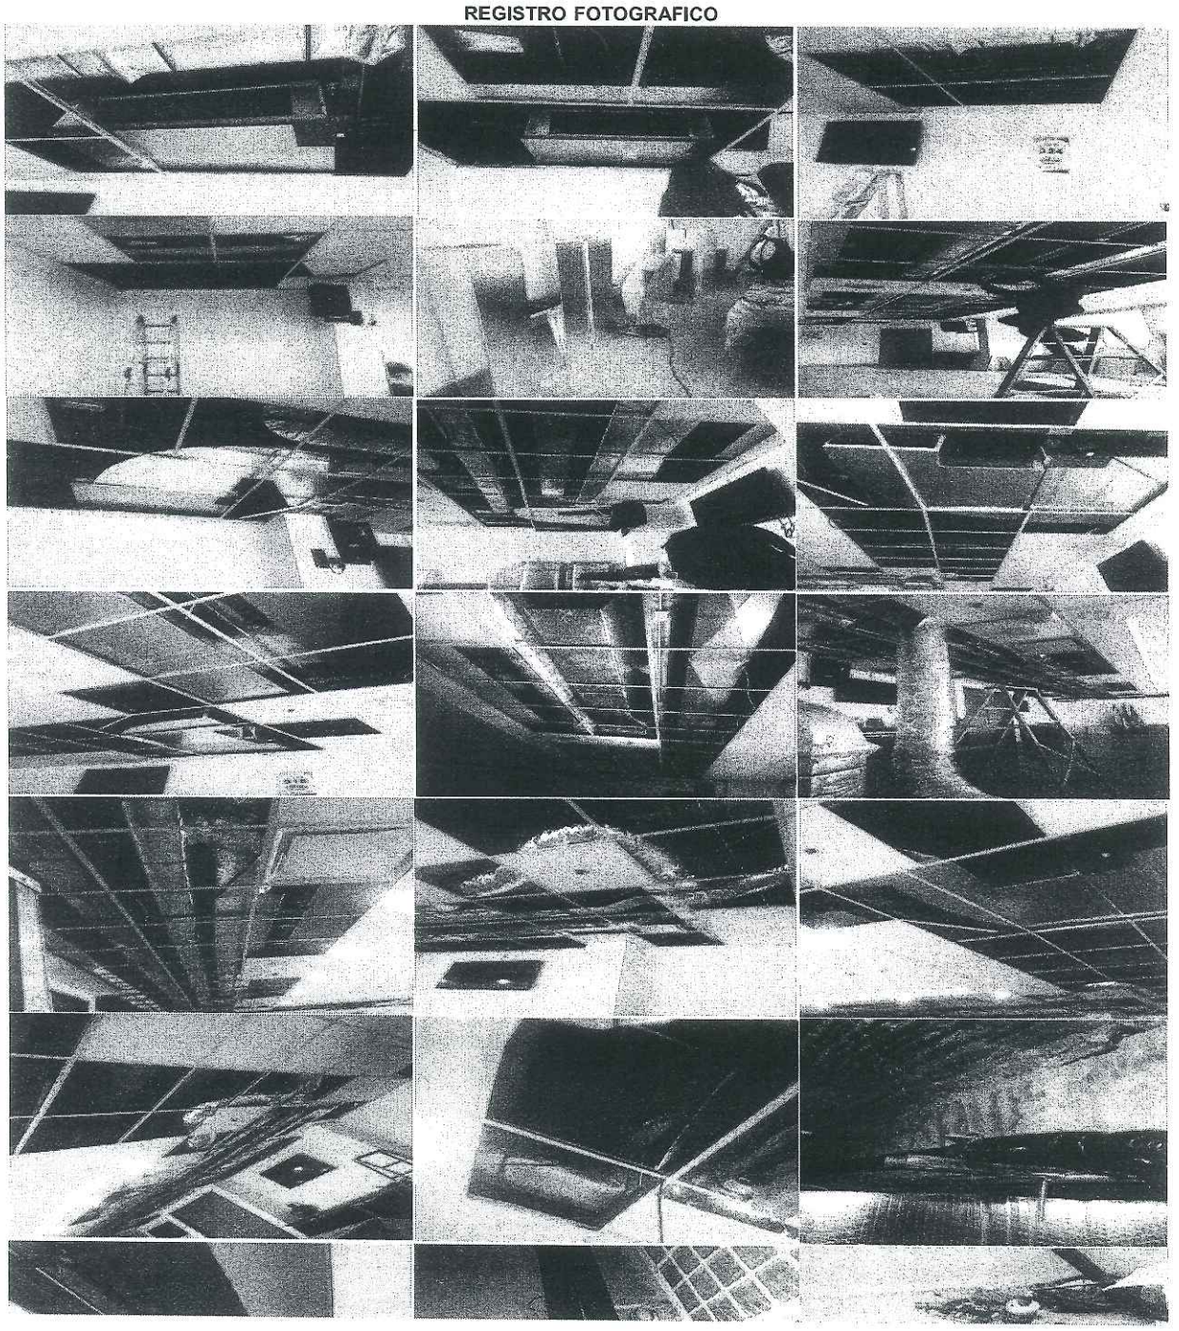

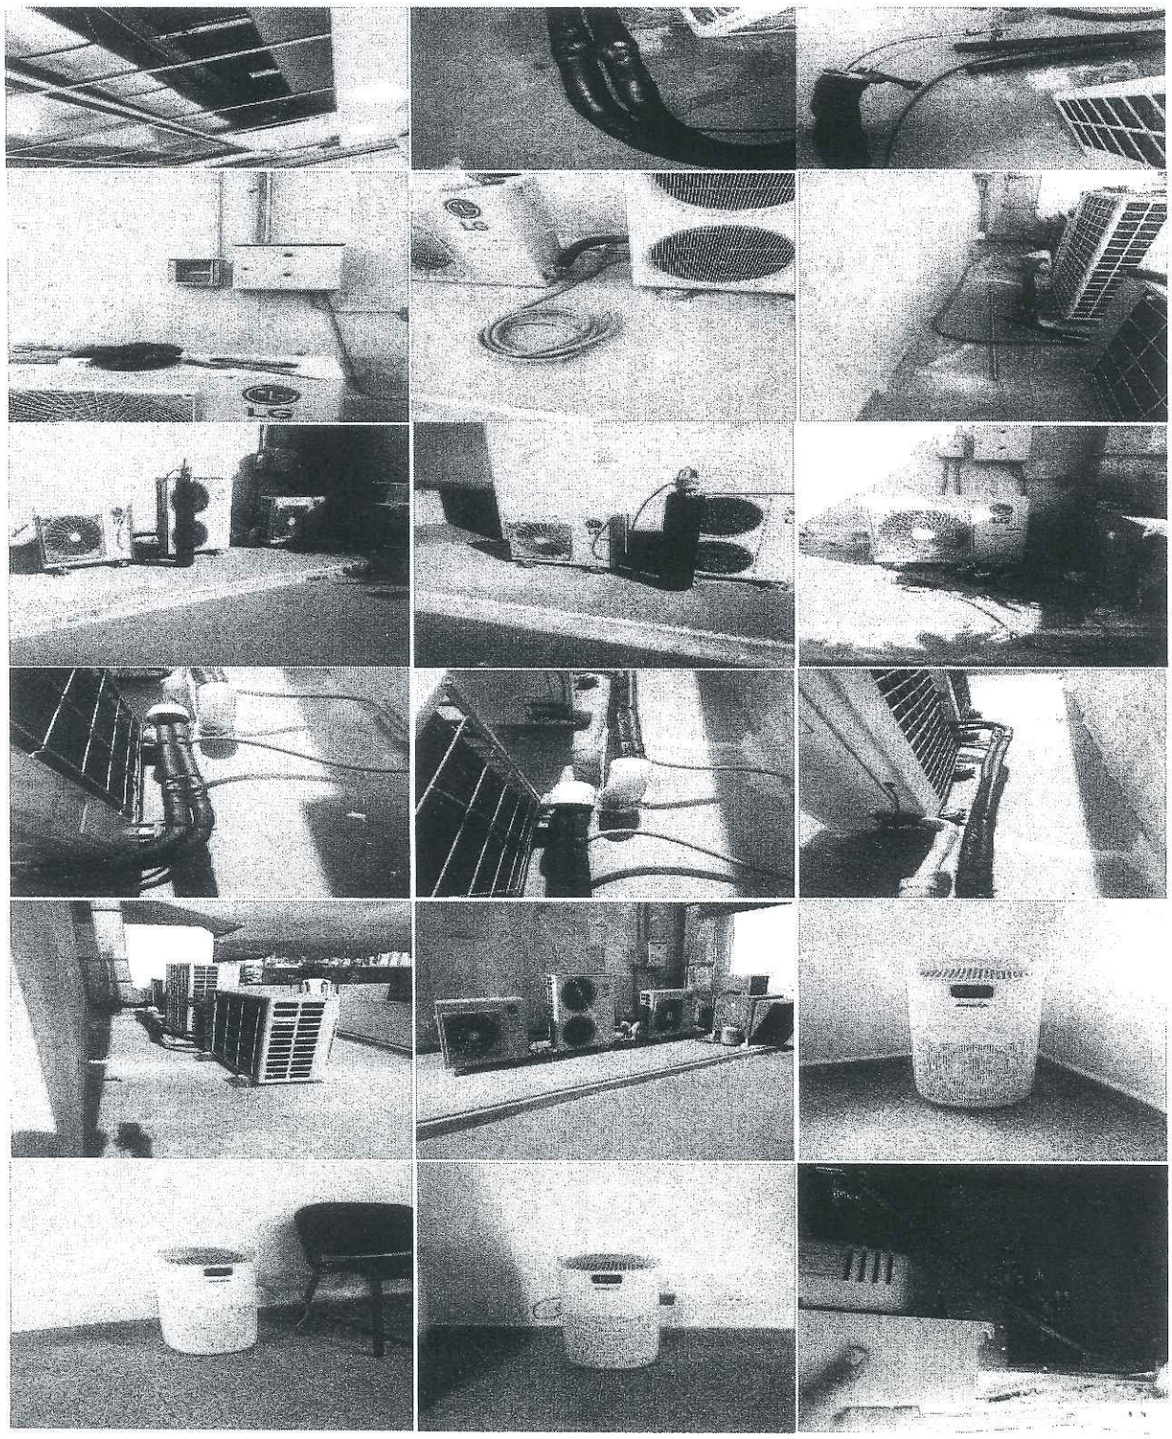

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI TORRES VESGA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 13721972
DIRECCION: CALLE 20 N0. 29-46 Bucaramanga
NUMERO DE CONTACTO CELULAR: 3008353845
CORREO ELECTRONICO: frioclimaofertas@gmail.com
NOMBRE DEL PROPONENTE: FRIOCLIMA DE ORIENTE
NIT: 900.816.491
