
Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**36%**			**"REPROGRAMACION PROYECTO - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL"**	**37 días?**	**lun 24/04/23**	**mar 30/05/23**
2		22%			Frente de obra 1 "HELIPUERTO"	7,5 días	mié 26/04/23	mié 3/05/23
3		**0%**			**1. PRELIMINARES**	**5 días**	**vie 28/04/23**	**mié 3/05/23**
4		0%			1,59 Desmonte de vidrio (crudo y/o templado) de cualquier espesor, incluye disposición final según recomendación de la Interventoria.	5 días	vie 28/04/23	mié 3/05/23
5		**0%**			**6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**1 día**	**mié 26/04/23**	**mié 26/04/23**
6		**0%**			**6,21 Suministro y colocación de tubería PVC para bajantes de aguas lluvias. Incluye accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpieza y preparación de la superficie con wash primer, pintura abase de aceite (de uso exterior) para**	**1 día**	**mié 26/04/23**	**mié 26/04/23**
7		0%			6,22,3 En 4", de L=1.50/2.00 m.	1 día	mié 26/04/23	mié 26/04/23
8		**88%**			**8. PISOS**	**2 días**	**vie 28/04/23**	**sáb 29/04/23**
9		88%			8,17 Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en baldosa monocolor de h= 0.10 m, incluye mortero 1:3 para pega, lechada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	2 días	vie 28/04/23	sáb 29/04/23
10		~~0%~~			~~Fecha de entrega frente de obra 1~~	~~1 día~~	~~mar 2/05/23~~	~~mar 2/05/23~~

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
11		48%			Frente de obra 15 "SÓTANO A"	34,25 días	lun 24/04/23	sáb 27/05/23
12		**21%**			**1. PRELIMINARES**	**4,75 días**	**mié 26/04/23**	**sáb 29/04/23**
13		26%			1.6 Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.50 m	1 día	sáb 29/04/23	sáb 29/04/23
14		18%			1.60 Desmonte y reinstalación de vidrio templado con accesorios en acero inoxidable, incluye todo lo necesario para realizar de manera decuada la actividad.	2 días	mié 26/04/23	jue 27/04/23
15		**74%**			**8. PISOS**	**29,33 días**	**lun 24/04/23**	**mar 23/05/23**
16		74%			8,17 Suministro, transporte e instalación de guardaescobas en baldosa monocolor de h= 0.10 m, incluye mortero 1:3 para pega, lechada y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad	3 días	lun 24/04/23	mar 23/05/23
17		**32%**			**9. REVOQUES ENCHAPES Y PINTURA**	**29,33 días**	**lun 24/04/23**	**mar 23/05/23**
18		32%			9.17 Suministro y aplicación de pintura a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada	2 días	lun 24/04/23	mar 23/05/23
19		**68%**			**11. CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**31,55 días**	**lun 24/04/23**	**jue 25/05/23**

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23



Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
20		100%			11.4 Suministro, transporte e instalación de cortina enrollable con fleje de 9cm, poleas, ejes, canales, bandera, resorte de 2", ángulo de 1" 1/2x1/8", pasadores en platina de 1"x1/4", acabado en anticorrosivo y pintura esmalte y todos los elementos neces	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23
21		26%			11,31 Suministro y instalacion de vidrio templado de 8 mm incoloro, incluye zocalo en aluminio inferior y superior y todos los demás elementos necesarios para su correcta fabricación e instalación.	3 días	jue 27/04/23	jue 25/05/23
22		**43%**			**NP**	**34,25 días**	**lun 24/04/23**	**sáb 27/05/23**
23		39%			NP-10 Puesta punto de cielos, con altura maxima 3.80m, incluye limpieza de cielo, retirada de soporterias de tuberias desinstaladas, elementos en cualquier material y decapado de pintura existente donde sea necesario. Se debe comtemplar Revestimiento de h	12 días	lun 24/04/23	vie 5/05/23
24		10%			NP-13 Suministro e instalacion de Dual Vox Ltg 03 paraTaquillas Ventanillas Duralumio	3 días	jue 25/05/23	sáb 27/05/23
25		89%			NP-14 Suministro e instalacion de acabado prefabricado concrestone C2 en acabado blanco en formato de 30x5cm, donde se requiera, incluye pegacor, todo lo necesario para su correcta instalacion	3 días	sáb 29/04/23	mié 3/05/23

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23




Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
26		0%			~~Fecha de entrega frente de obra 1~~	~~1 día~~	~~lun 29/05/23~~	~~lun 29/05/23~~
27		26%			Frente de obra 16 "SÓTANO B"	13 días?	lun 24/04/23	sáb 6/05/23
28		**0%**			**7. APARATOS SANITARIOS Y MUEBLES**	**4 días?**	**mié 26/04/23**	**sáb 29/04/23**
29		0%			7.10 Sumistr e instalación de lavaescob en acero inox. AISI 304 calibre18 de 60 x 0,40cm x 50cm de profundidad, incluye salpicadero de 15 cm en los puntos de contacto con la pared, sifón, canastilla, llave bocamanguera metálica tipo Polinco o equivalen	4 días	mié 26/04/23	sáb 29/04/23
30		0%			7.24 Suministro y colocación de llaves boca manguera tipo Polinco o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para la correcta instalación	1 día	jue 27/04/23	jue 27/04/23
31		0%			8.20 Suministro, transporte e instalación de cinta antideslizante bicolor de 4,80 cm.	1 día?	vie 28/04/23	vie 28/04/23
32		**38%**			**9. REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURAS**	**13 días**	**lun 24/04/23**	**sáb 6/05/23**
33		38%			9.17 Suminist. y aplica. de pint. a base de agua, vinilo tipo 1 de primera calidad sobre pintura existente o muro revocado y/o estucado, tres manos. Incluye resanes con estuco plástico, adecuación de la superficie a intervenir, rasquetiada o rutiada hast	13 días	lun 24/04/23	sáb 6/05/23
34		0%			~~Fecha de entrega frente de obra 16~~	~~1 día~~	~~mié 10/05/23~~	~~mié 10/05/23~~
35		0%			Frente de obra 20 "TUBOS ROJOS"	8,25 días?	lun 8/05/23	lun 15/05/23
36		**0%**			**1. PRELIMINARES**	**3,25 días?**	**lun 8/05/23**	**mié 10/05/23**
37		0%			1.6 Retiro de puerta de cualquier material y de dimensiones hasta 1.50 m x 2.50 m	1 día	lun 8/05/23	lun 8/05/23

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
38		0%			1.7 Retiro y reinstalación de puerta (1 y/o 2 alas) de dimensiones hasta 0.60 m x 2.00 m, material diferente a vidrio.	1 día?	mié 10/05/23	mié 10/05/23
39		**0%**			**11. CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA**	**7,25 días**	**mar 9/05/23**	**lun 15/05/23**
40		0%			11.26 Suministro e instalación de chapa de seguridad de primera calidad tipo Yale o similar para puertas existentes, con pistillo fijo, doble cilindro. Incluye jaladeras de aluminio y desmonte de la existente.	1 día	lun 15/05/23	lun 15/05/23
41		0%			11.13 Suministro, transporte y colocación de puertas madera marco en roble y ala en triplex. Incluye pintura a base de aceite y/o barniz, y todo lo necesario para su correcta colocación, De 0.60/1,2 m x 2.10 m. e= 10/15 cm	4 días	mar 9/05/23	vie 12/05/23
42		~~0%~~			~~Fecha de entrega frente de obra 20~~	~~1 día~~	~~lun 15/05/23~~	~~lun 15/05/23~~
43		39%			PLAZOLETA	37 días	lun 24/04/23	mar 30/05/23
44		**46%**			**4. CONCRETOS**	**18,25 días**	**mar 25/04/23**	**vie 12/05/23**
45		46%			4.6 Suministro, transporte y construción de mortero con dosificación 1:4, con espesor de 0,07 hasta 0,10 m, acabado rustico, incluye colocacion de Malla electrosoldada D-84 y todo lo necesario para su correcta instalación. La malla se pagara en su item co	12 días	dom 30/04/23	vie 12/05/23
46		**46%**			**3. ACEROS Y ESTRUCTURAS METALICAS**	**11,77 días**	**mar 25/04/23**	**sáb 6/05/23**
47		46%			3.4 Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada tipo D 84.	1 día	mar 25/04/23	sáb 6/05/23
48		**98%**			**6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**30,24 días**	**lun 24/04/23**	**mié 24/05/23**

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23



Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
49		98%			6,20 Mantenimiento desagüe lavamanos, orinal, rejilla de piso, pozuelo, poceta. Incluye cambio de rejilla, sifón y/o desobstrucción por medios manuales y/o mecánicos.	2 días	lun 24/04/23	mié 24/05/23
50		**4%**			**7. APARATOS SANITARIOS**	**6 días**	**mié 24/05/23**	**lun 29/05/23**
51		4%			7,23 Suministro e instalación de rejilla metálica cuadrada para piso, fundida, color bronce, espesor 3mm, tráfico pesado, para exteriores de 16.5cm x16.5cm.	6 días	mié 24/05/23	lun 29/05/23
52		**39%**			**9. REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA**	**37 días**	**lun 24/04/23**	**mar 30/05/23**
53		37%			9,15 Suministro e instalación de enchape para pisos exteriores tipo marmol royal veta 30 x 60 de espesor de 2 cm, junta perdida, debe ser similar al existente para alto tráfico peatonal,incluye pegante para exteriores lechada, junta de dilatacion cada 2.0	37 días	lun 24/04/23	mar 30/05/23
54		**92%**			**12. VARIOS**	**1 día**	**lun 24/04/23**	**lun 24/04/23**
55		92%			12.5 Sellado de juntas de dilatación con Sikaflex o equivalente.	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23
56		**46%**			**NP**	**2 días**	**jue 27/04/23**	**vie 28/04/23**
57		46%			NP-16 Suministro, transporte e instalación de aislante térmico en poliisocianurato (PIR) de 40kg/m3 de 20mm de espesor, incluyendo recubrimiento con Kraft/Kraft, para cumplir con un R de 5,163 (°F.FT2.hr/BTU) ", para instalación en losa superior de plazol	2 días	jue 27/04/23	vie 28/04/23

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Notas	% completado	Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
58		0%			Fecha de entrega frente de obra plazoleta	1 día?	mar 30/05/23	mar 30/05/23

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Costo	Sucesoras
$ 820.491.588	
$ 850.640	
$ 205.044	
$ 205.044	
$ 226.983	
$ 226.983	
$ 226.983	
$ 418.614	
$ 418.614	
~~$ 0~~	

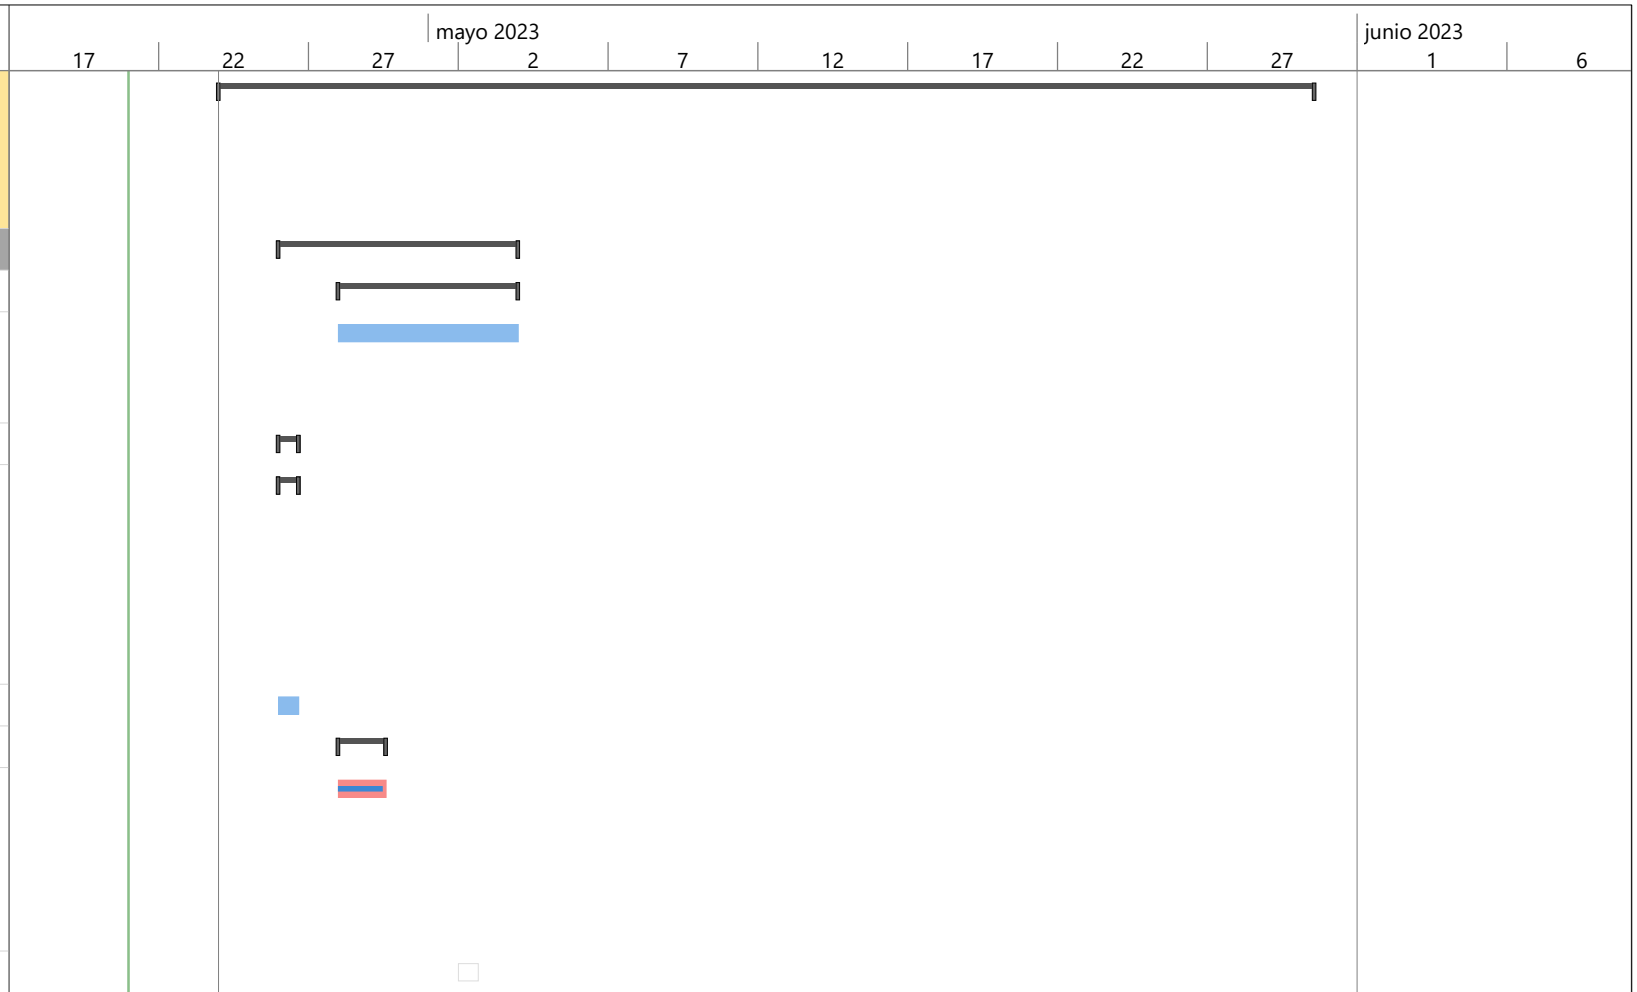

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Costo	Sucesoras
$ 161.693.890	
$ 987.681	
$ 170.751	
$ 816.929	
$ 838.346	
$ 838.346	21
$ 58.668.133	
$ 58.668.133	21
$ 25.096.239	

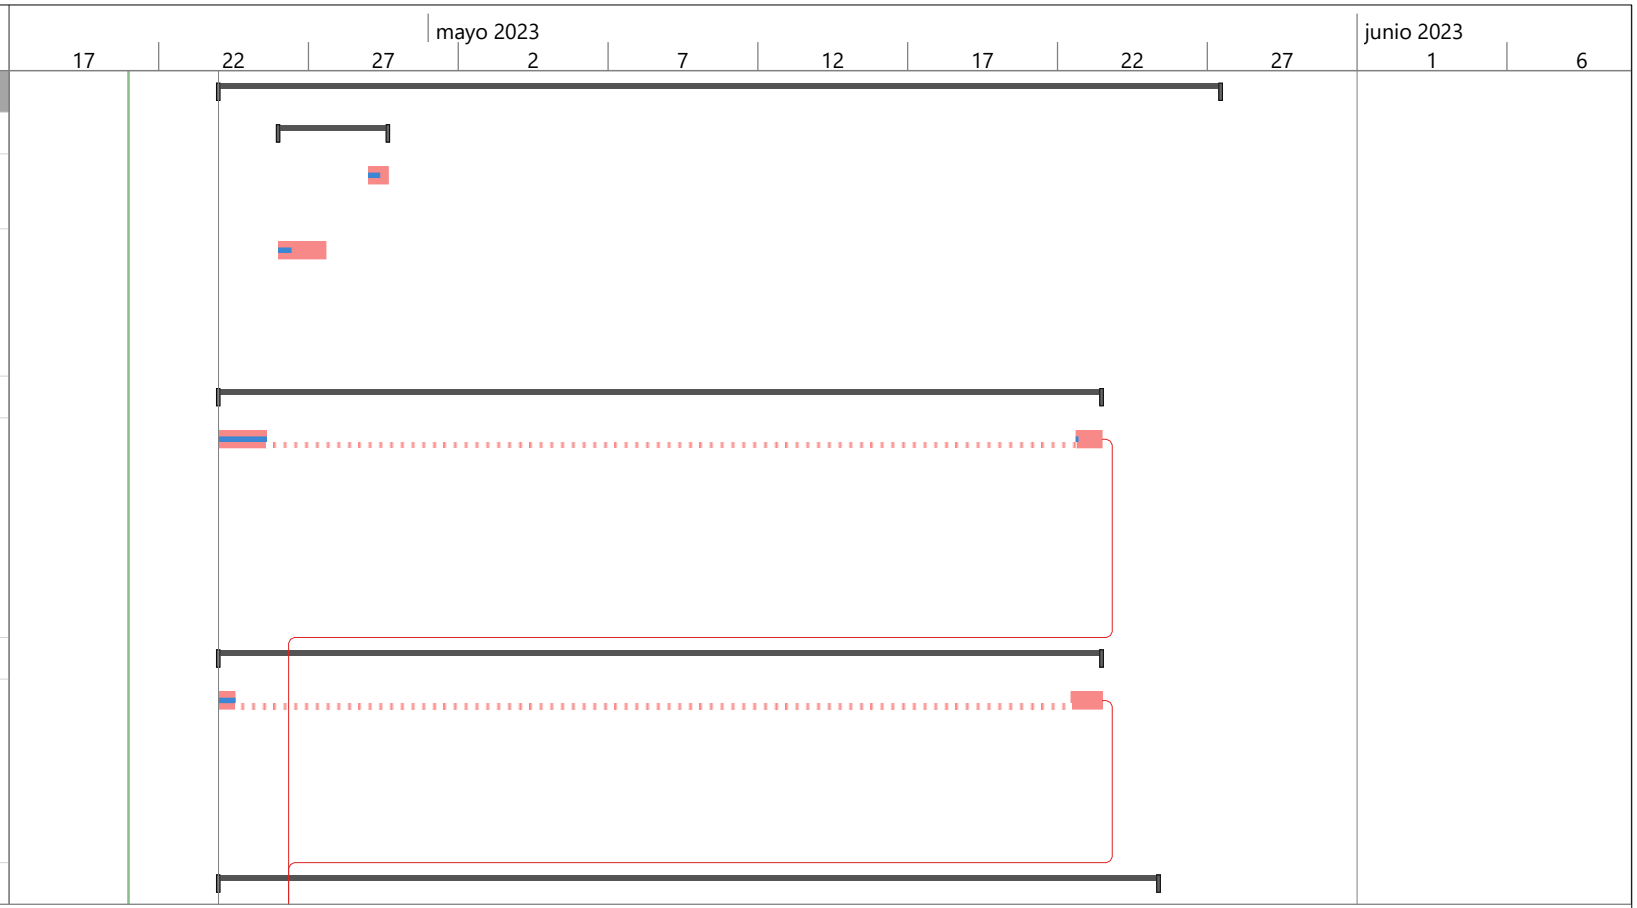

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Costo	Sucesoras
$ 1.856.025	
$ 23.240.214	24
$ 76.103.492	
$ 49.318.600	
$ 20.886.145	
$ 5.898.747	

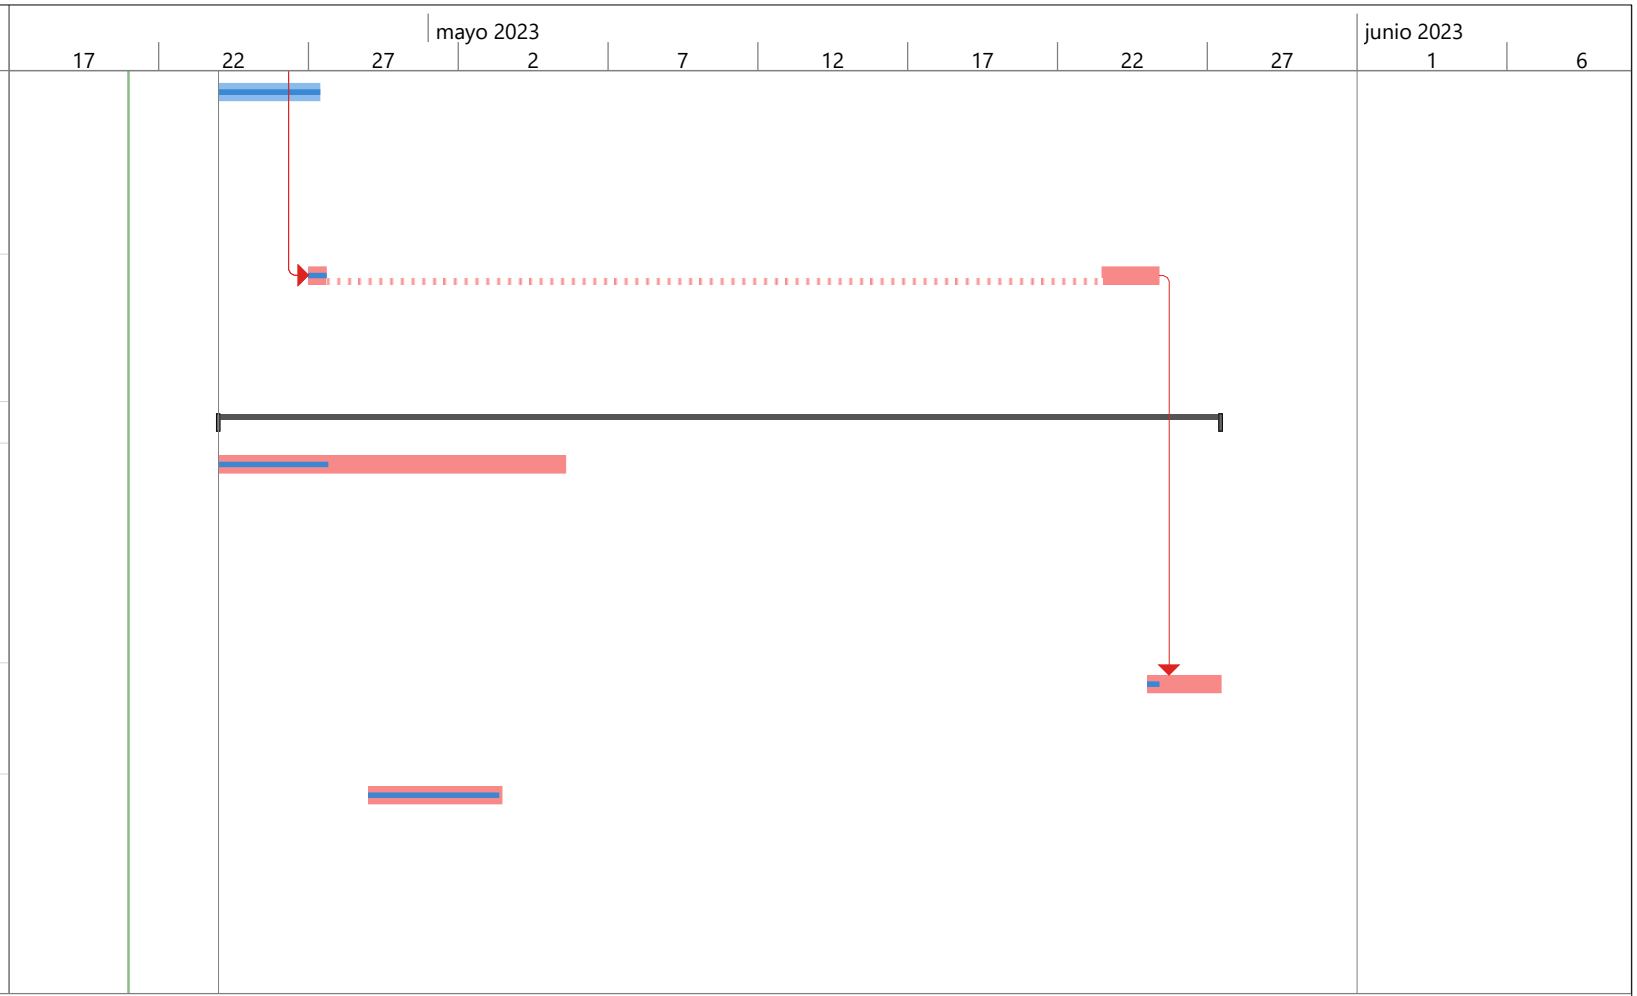

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Costo	Sucesoras
~~$ 0~~	
$ 3.261.723	
$ 2.277.560	
$ 736.173	
$ 62.705	
$ 1.478.682	
$ 984.163	
$ 984.163	
~~$ 0~~	
$ 830.398	
$ 215.276	
$ 97.572	41

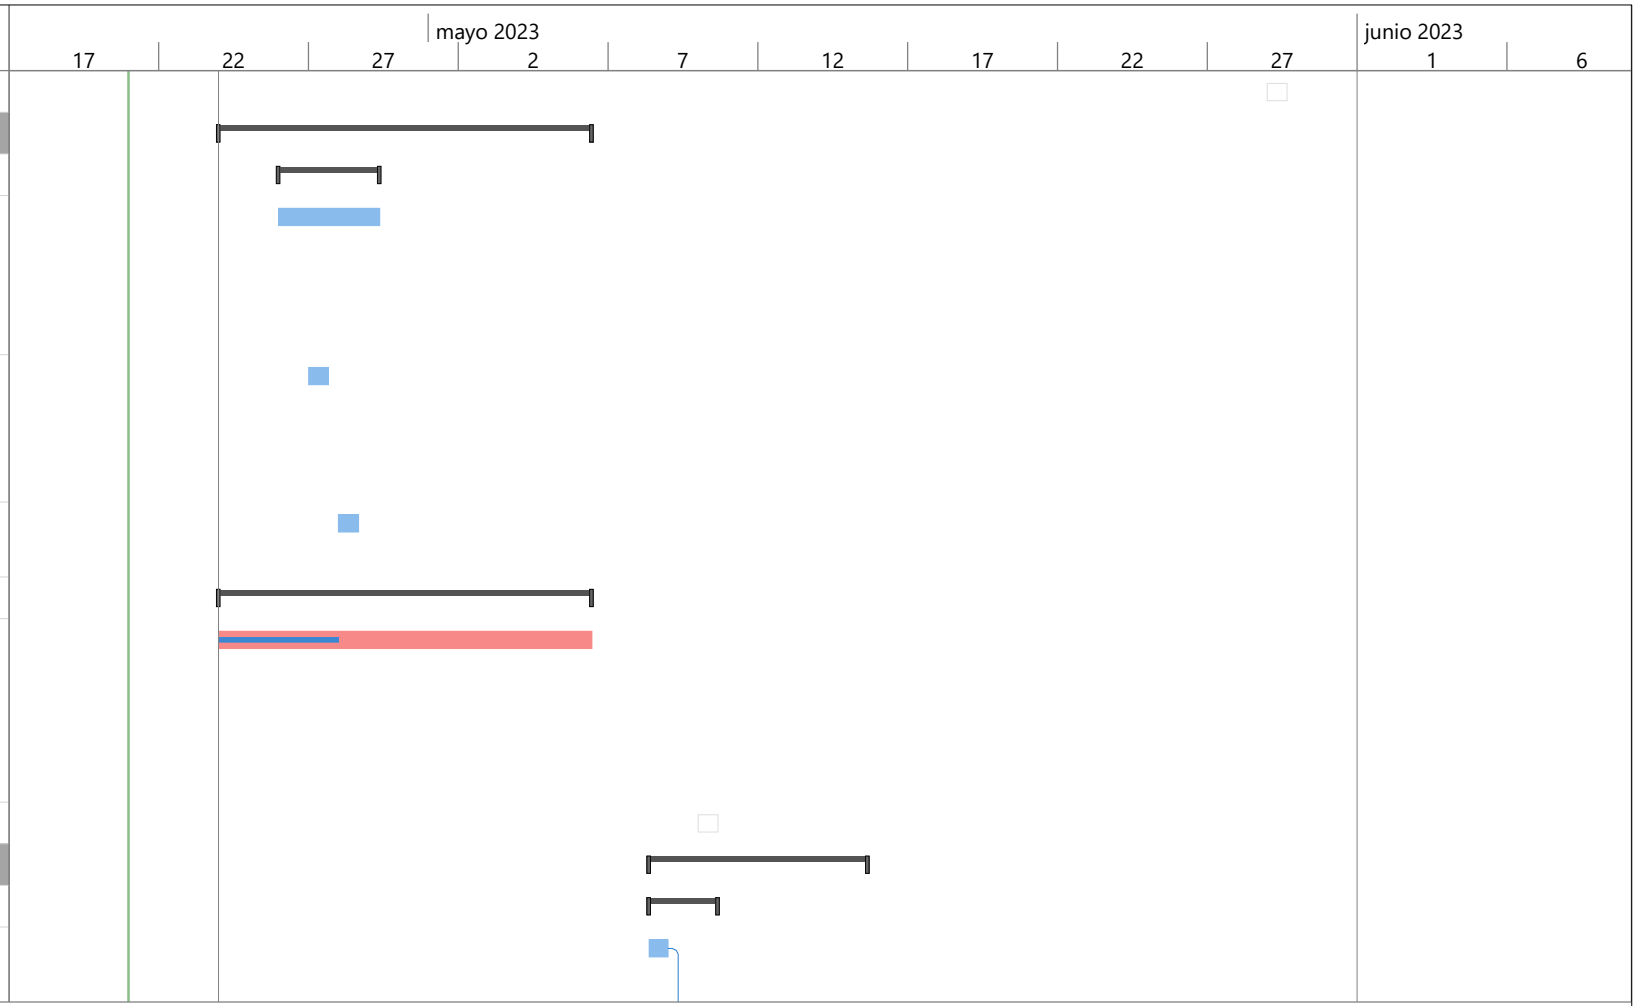

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Costo	Sucesoras
$ 117.704	
$ 615.122	
$ 145.905	
$ 469.217	40
~~$ 0~~	
$ 653.854.937	
$ 128.970.078	
$ 104.048.803	
$ 24.921.275	
$ 24.921.275	45
$ 769.050	

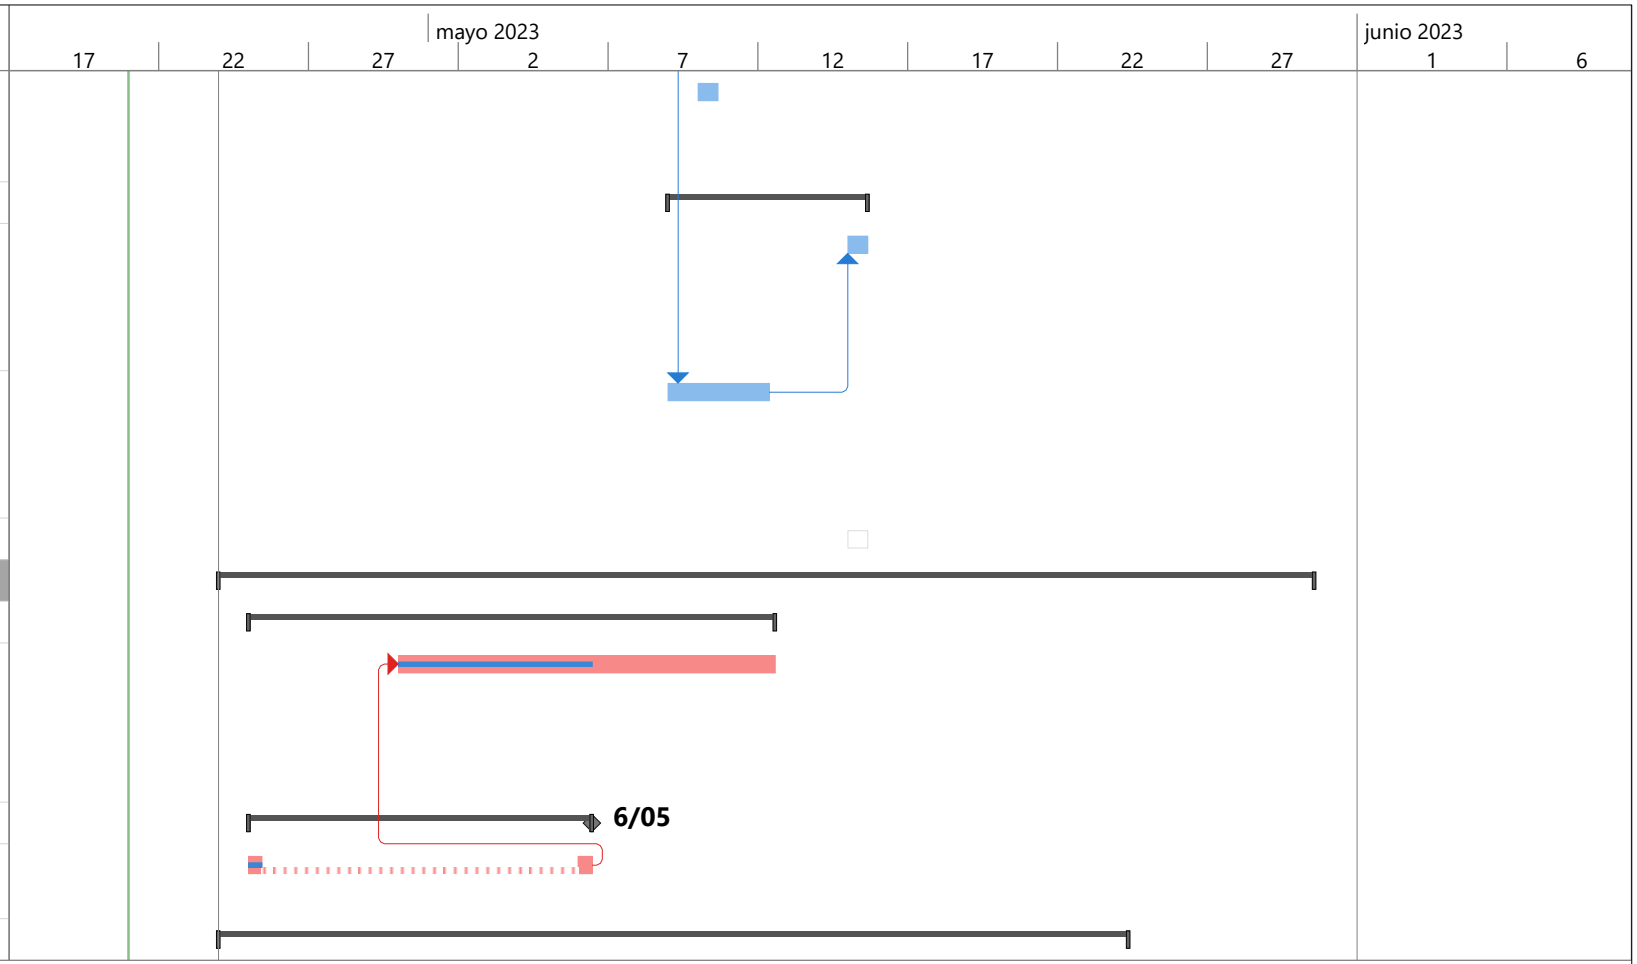

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Costo	Sucesoras
$ 769.050	51
$ 1.014.300	
$ 1.014.300	
$ 523.101.509	
$ 421.350.167	
$ 14.536.177	
$ 14.536.177	
$ 87.215.164	
$ 87.215.164	

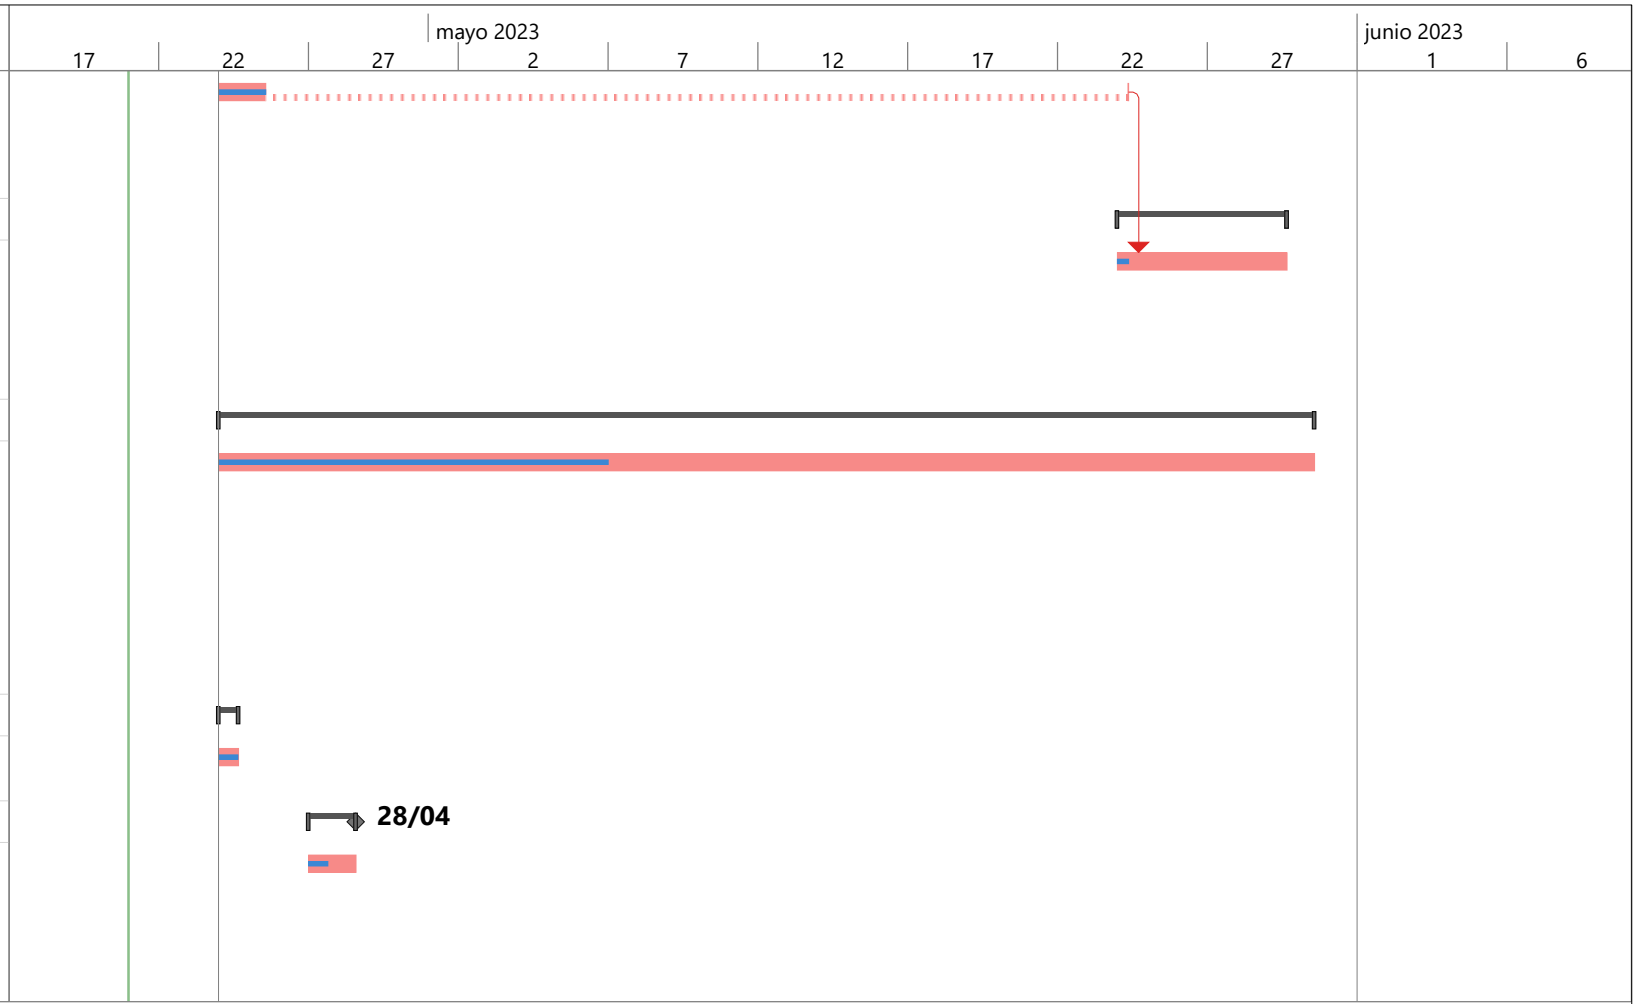


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Costo	Sucesoras	mayo 2023									junio 2023	
		17	22	27	2	7	12	17	22	27	1	6
$ 0												


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

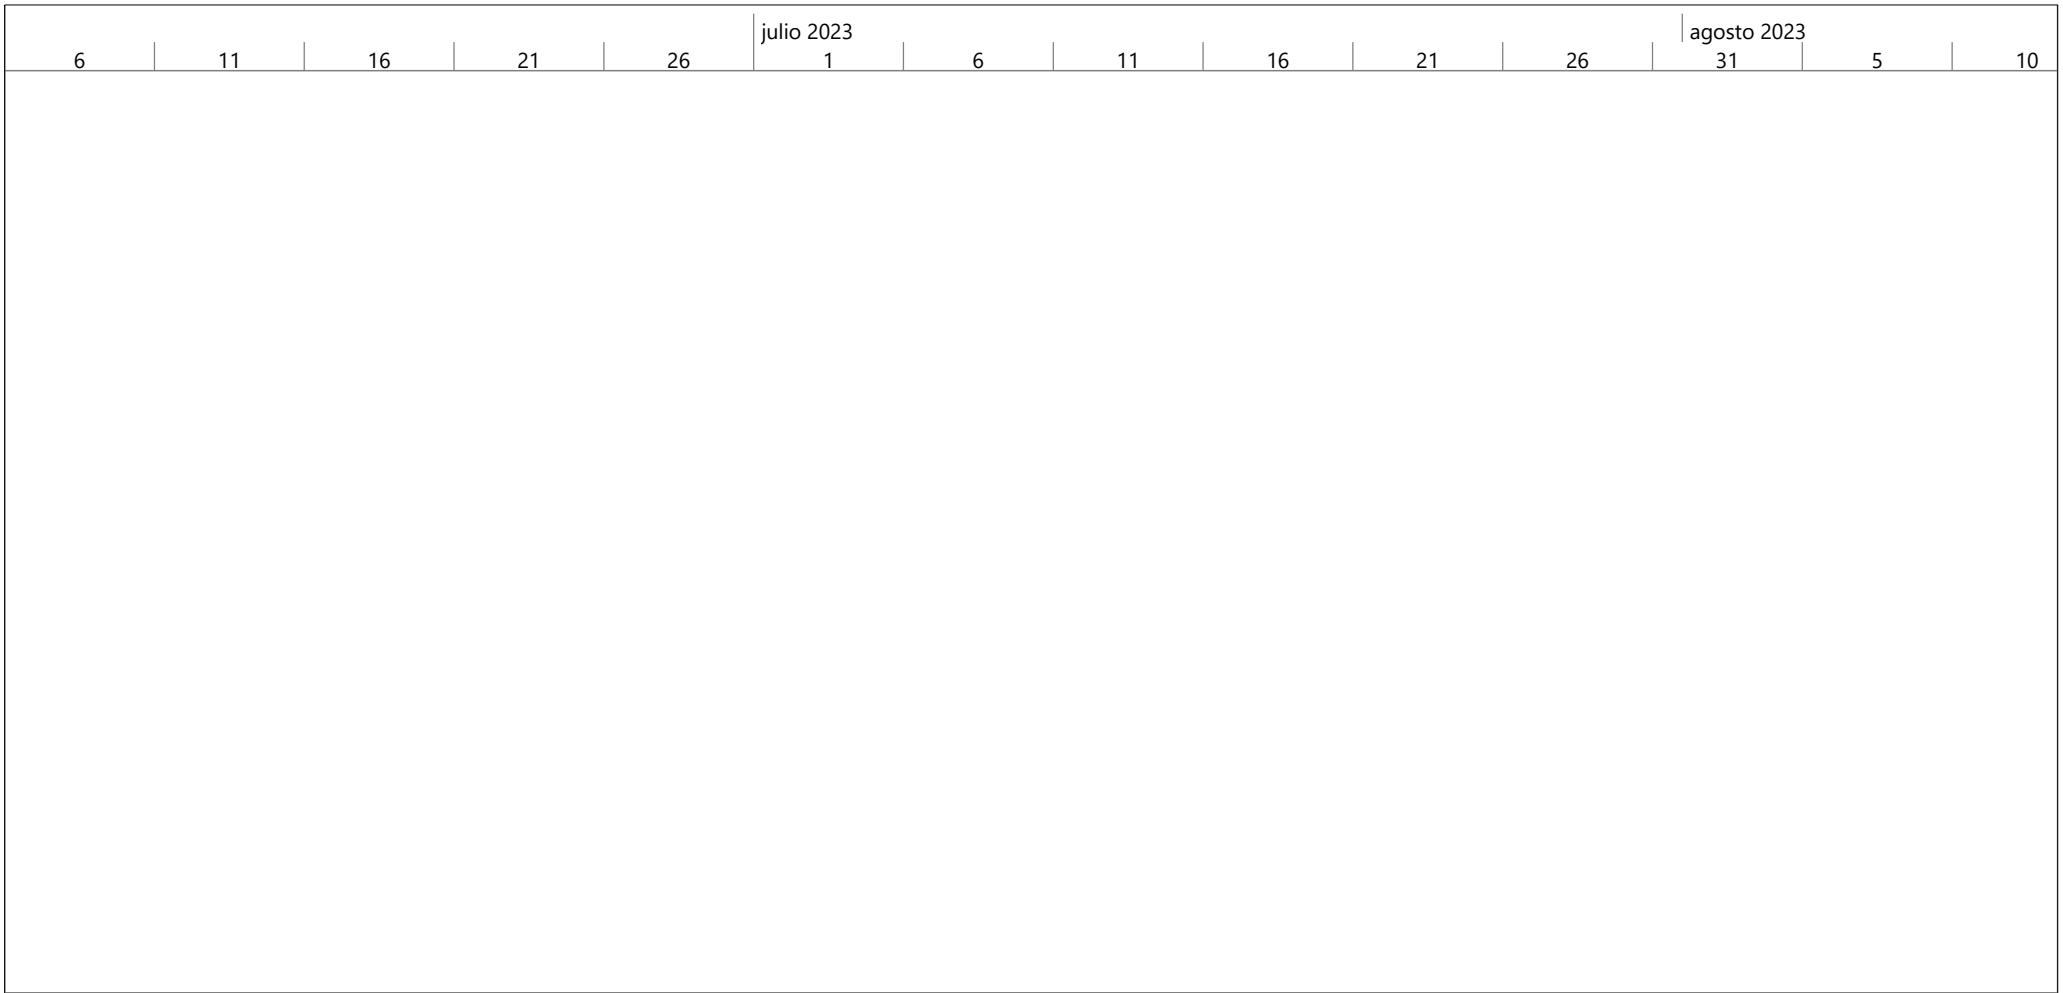


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

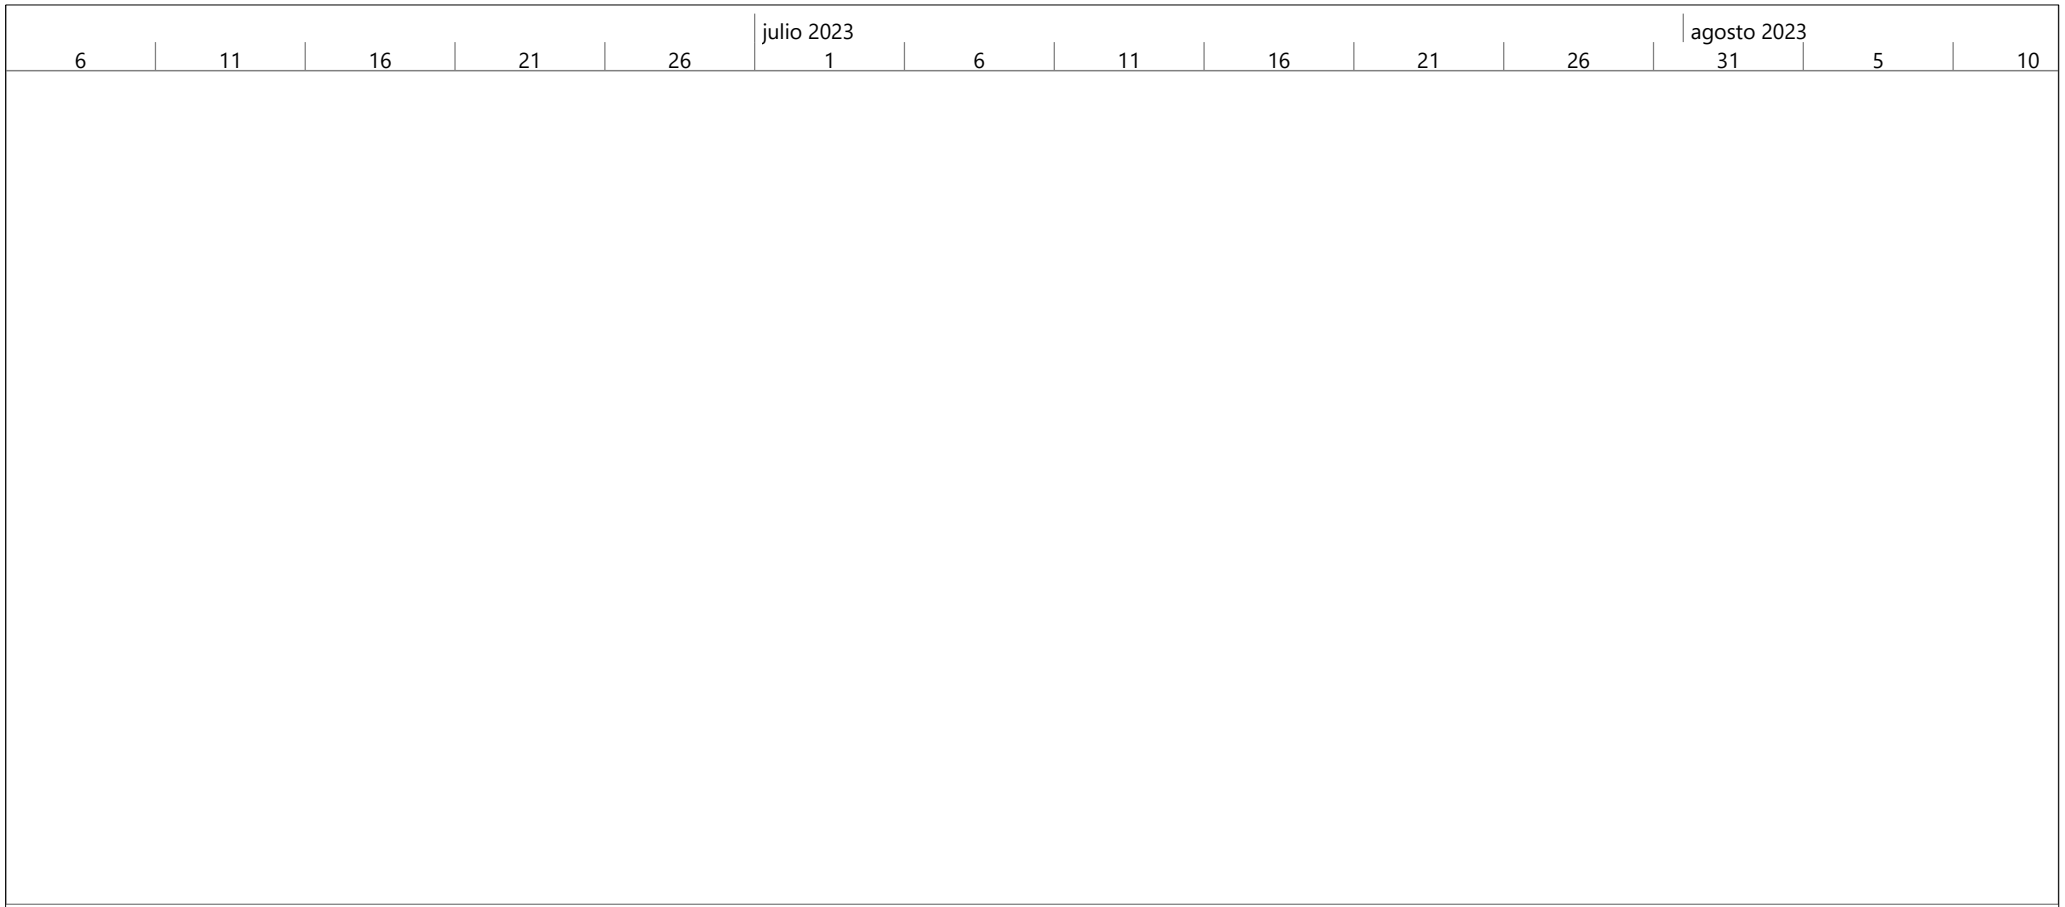

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

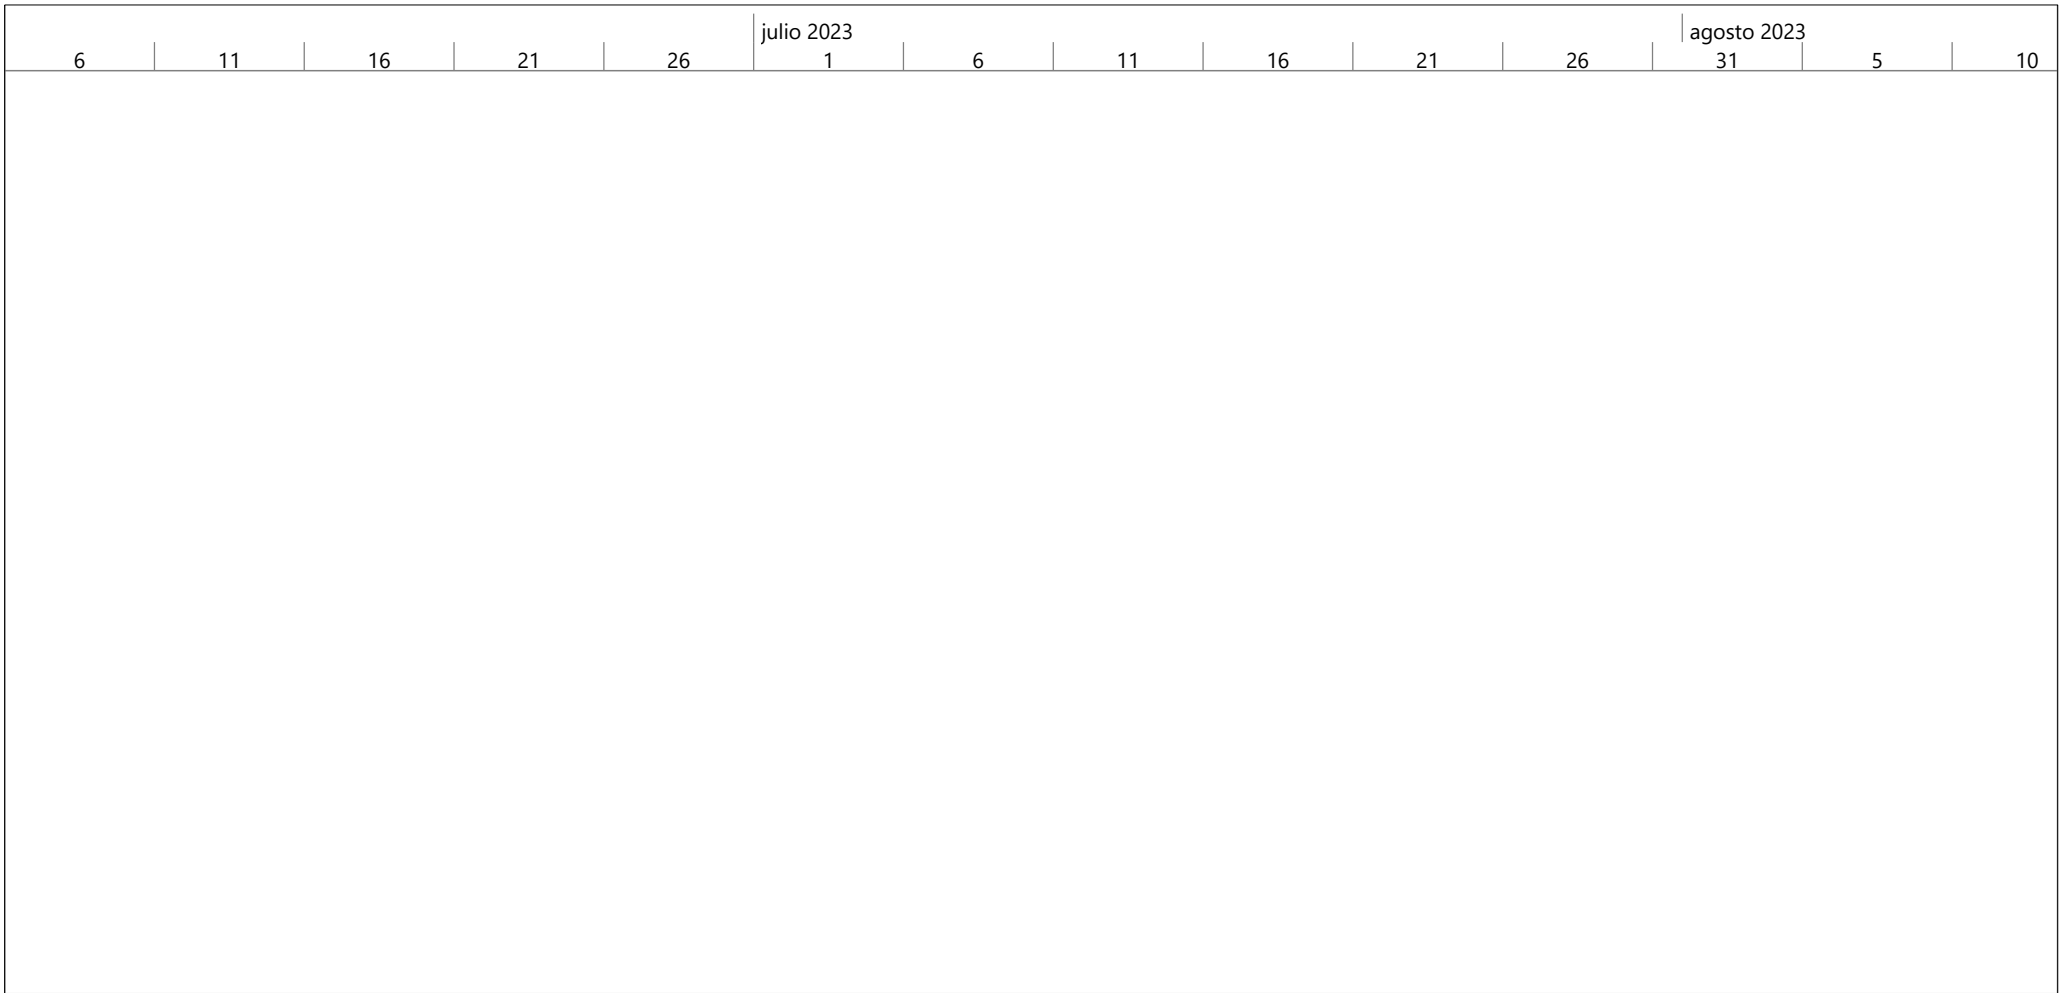


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

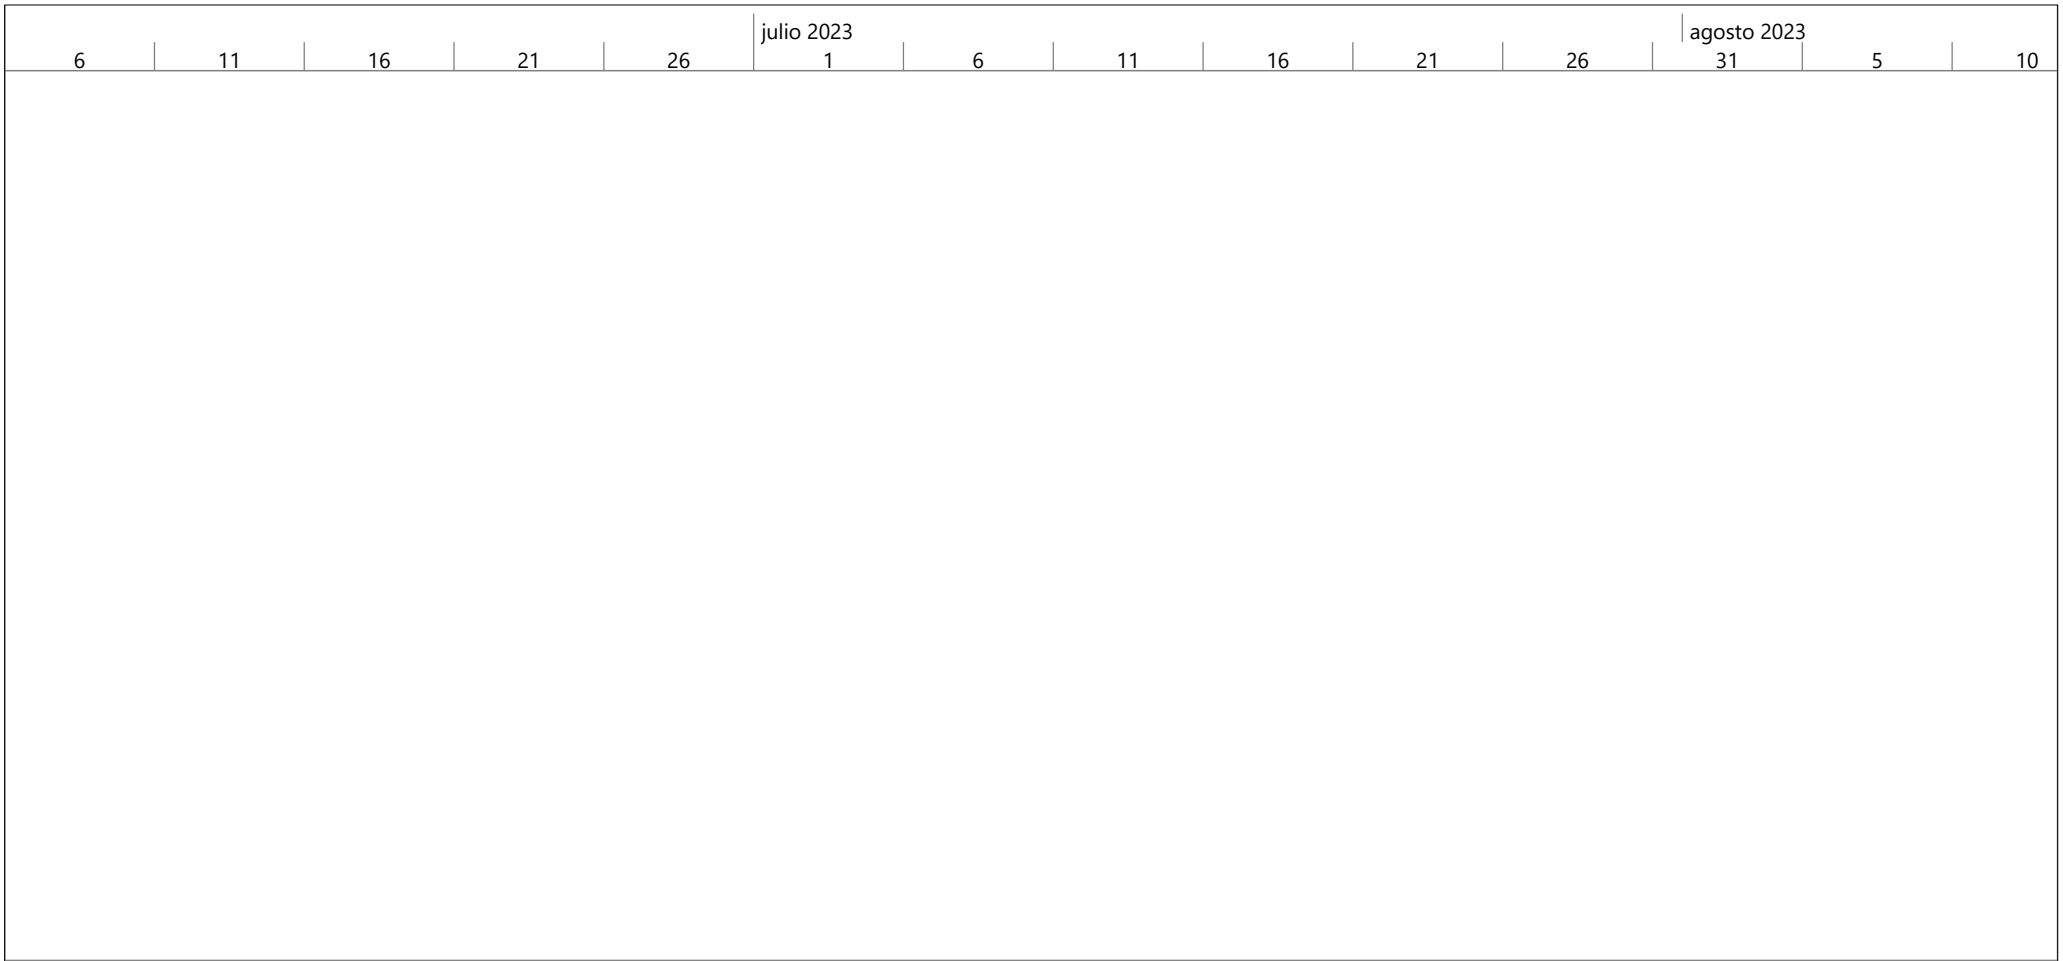


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
