

Id	Notas		Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1	78.5%		78.5%		"PROYECTO - MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO O EN LOS QUE LE CORRESPONDA HACERLO EN VIRTUD DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL"""	194,88 días	jue 14/07/22	mié 11/01/23	$ 1.290.510.328
2					Frente de obra 1 "HELIPUERTO"	33 días	mié 22/02/23	vie 24/03/23	$ 14.964.035
3					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	33 días	mié 22/02/23	vie 24/03/23	$ 14.964.035
4					Frente de obra 2 "CAM PISO 13"	74 días	jue 14/07/22	mié 21/09/22	$ 44.852.822
5					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	74 días	jue 14/07/22	mié 21/09/22	$ 44.852.822
6					Frente de obra 3 "CAM PISO 12"	113 días	jue 14/07/22	jue 27/10/22	$ 53.761.813
7					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	113 días	jue 14/07/22	jue 27/10/22	$ 53.761.813
8					Frente de obra 4 "CAM PISO 11"	67,38 días?	mar 13/09/22	lun 14/11/22	$ 24.235.068
9					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	67,38 días?	mar 13/09/22	lun 14/11/22	$ 24.235.068
10					Frente de obra 5 "CAM PISO 10"	48 días	jue 15/12/22	sáb 28/01/23	$ 38.098.978
11					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	48 días	jue 15/12/22	sáb 28/01/23	$ 38.098.978
12					Frente de obra 6 "CAM PISO 9"	67 días	mar 13/09/22	lun 14/11/22	$ 22.053.089
13					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	67 días	mar 13/09/22	lun 14/11/22	$ 22.053.089
14					Frente de obra 7 "CAM PISO 8"	79 días	mié 2/11/22	sáb 14/01/23	$ 29.380.716
15					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	79 días	mié 2/11/22	sáb 14/01/23	$ 29.380.716
16					Frente de obra 8 "CAM PISO 7"	115 días	mar 19/07/22	mié 2/11/22	$ 88.575.255
17					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	115 días	mar 19/07/22	mié 2/11/22	$ 88.575.255
18					Frente de obra 9 "CAM PISO 6"	96 días	jue 14/07/22	mar 11/10/22	$ 27.800.854
19					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	96 días	jue 14/07/22	mar 11/10/22	$ 27.800.854
20					Frente de obra 10 "CAM PISO 5"	218 días	jue 14/07/22	jue 2/02/23	$ 46.738.890



Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Notas		Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
21		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	218 días	jue 14/07/22	jue 2/02/23	$ 46.738.890
22		✓			**Frente de obra 11 "CAM PISO 4"**	**67 días**	**vie 22/07/22**	**jue 22/09/22**	**$ 20.997.649**
23		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	67 días	vie 22/07/22	jue 22/09/22	$ 20.997.649
24		✓			**Frente de obra 12 "CAM PISO 3"**	**87 días**	**dom 31/07/22**	**jue 20/10/22**	**$ 33.375.891**
25		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	87 días	dom 31/07/22	jue 20/10/22	$ 33.375.891
26		✓			**Frente de obra 13 "CAM PISO 2"**	**90 días**	**vie 15/07/22**	**jue 6/10/22**	**$ 20.867.125**
27		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	90 días	vie 15/07/22	jue 6/10/22	$ 20.867.125
28		✓			**Frente de obra 14 "CAM PISO 1"**	**104 días**	**lun 18/07/22**	**sáb 22/10/22**	**$ 30.503.470**
29		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	104 días	lun 18/07/22	sáb 22/10/22	$ 30.503.470
30					Frente de obra 15 "SÓTANO A"	223 días	mié 27/07/22	lun 20/02/23	$ 522.279.834
31					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	223 días	mié 27/07/22	lun 20/02/23	$ 522.279.834
32					Frente de obra 16 "SÓTANO B"	80 días	jue 14/07/22	lun 26/09/22	$ 55.926.621
33					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	80 días	jue 14/07/22	lun 26/09/22	$ 55.926.621
34		✓			**Frente de obra 17 "SÓTANO C"**	**70 días**	**jue 14/07/22**	**vie 16/09/22**	**$ 1.885.043**
35		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	70 días	jue 14/07/22	vie 16/09/22	$ 1.885.043
36		✓			**Frente de obra 18 "PLAZOLETA ALCANCE INICIAL"**	**55 días**	**jue 14/07/22**	**vie 2/09/22**	**$ 125.331.934**
37		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	55 días	jue 14/07/22	vie 2/09/22	$ 125.331.934
38		✓			**Frente de obra 19 "P. LIBERTAD"**	**64 días**	**vie 5/08/22**	**mar 4/10/22**	**$ 2.133.330**
39		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	64 días	vie 5/08/22	mar 4/10/22	$ 2.133.330
40					Frente de obra 20 "TUBOS ROJOS"	127 días	vie 22/07/22	jue 17/11/22	$ 33.705.889
41					Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	127 días	vie 22/07/22	jue 17/11/22	$ 33.705.889
42		✓			**Frente de obra 21 "C.C LIBRO"**	**198 días**	**jue 14/07/22**	**sáb 14/01/23**	**$ 33.153.671**




Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Notas		Notas	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	2022 6 11
43		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	198 días	jue 14/07/22	sáb 14/01/23	$ 33.153.671	
44		✓			**Frente de obra 22 "C.C JUANAMBU"**	**90 días**	**jue 28/07/22**	**mié 19/10/22**	**$ 3.702.551**	
45		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	90 días	jue 28/07/22	mié 19/10/22	$ 3.702.551	
46		✓			**Frente de obra 23 "C.C BOLIVAR PRADO"**	**167 días**	**lun 25/07/22**	**mar 27/12/22**	**$ 4.455.281**	
47		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	167 días	lun 25/07/22	mar 27/12/22	$ 4.455.281	
48		✓			**Frente de obra 24 "CONSEJO PISO 2"**	**118 días**	**jue 4/08/22**	**mar 22/11/22**	**$ 2.439.965**	
49		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	118 días	jue 4/08/22	mar 22/11/22	$ 2.439.965	
50		✓			**Frente de obra 25 PERSONERIA**	**101 días**	**dom 17/07/22**	**mié 19/10/22**	**$ 9.290.555**	
51		✓			Tareas ejecutadas al 11 de febrero de 2023	101 días	dom 17/07/22	mié 19/10/22	$ 9.290.555	


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

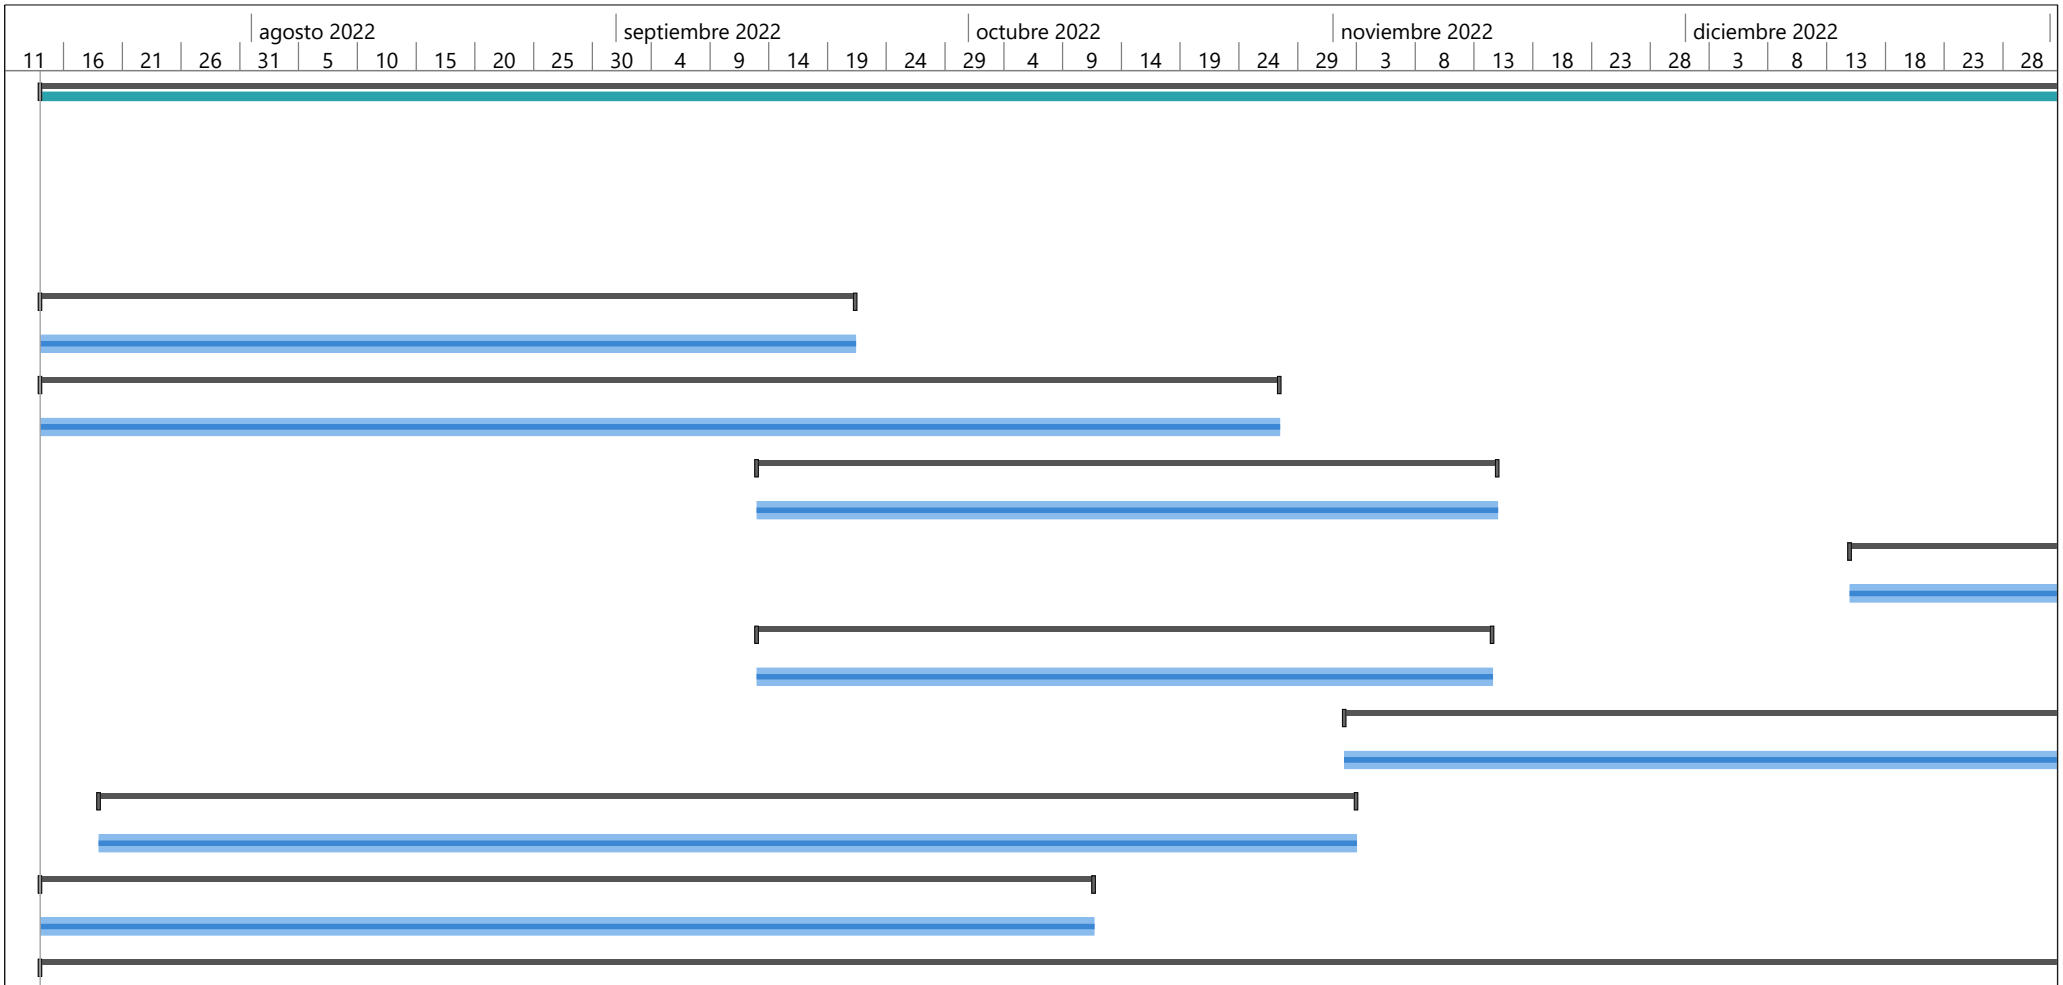


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

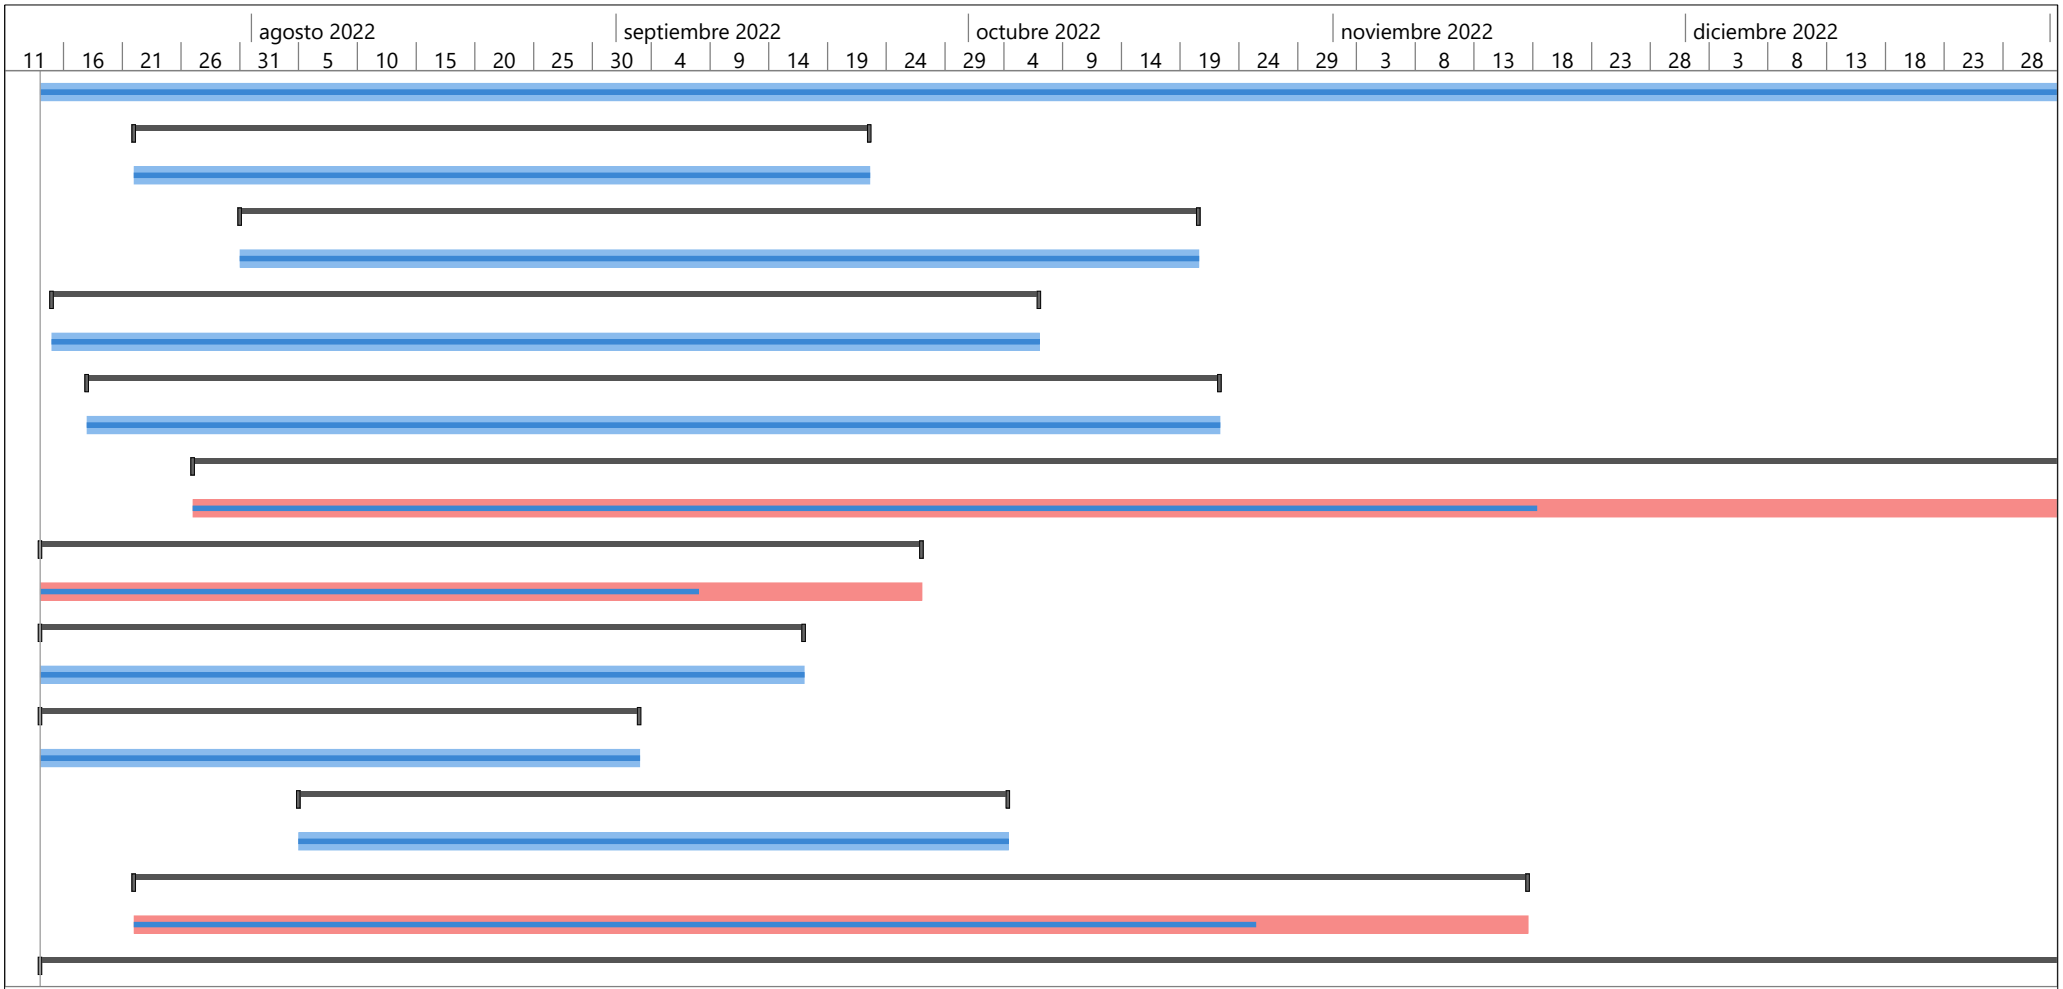


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

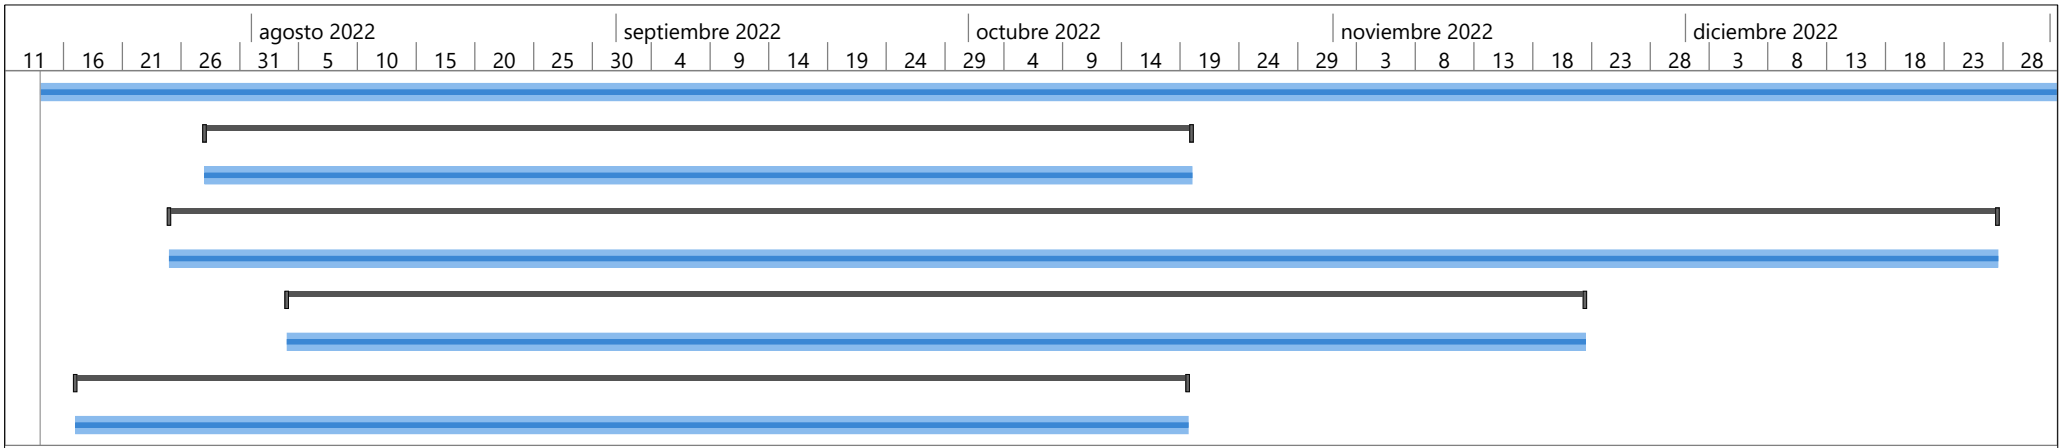

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

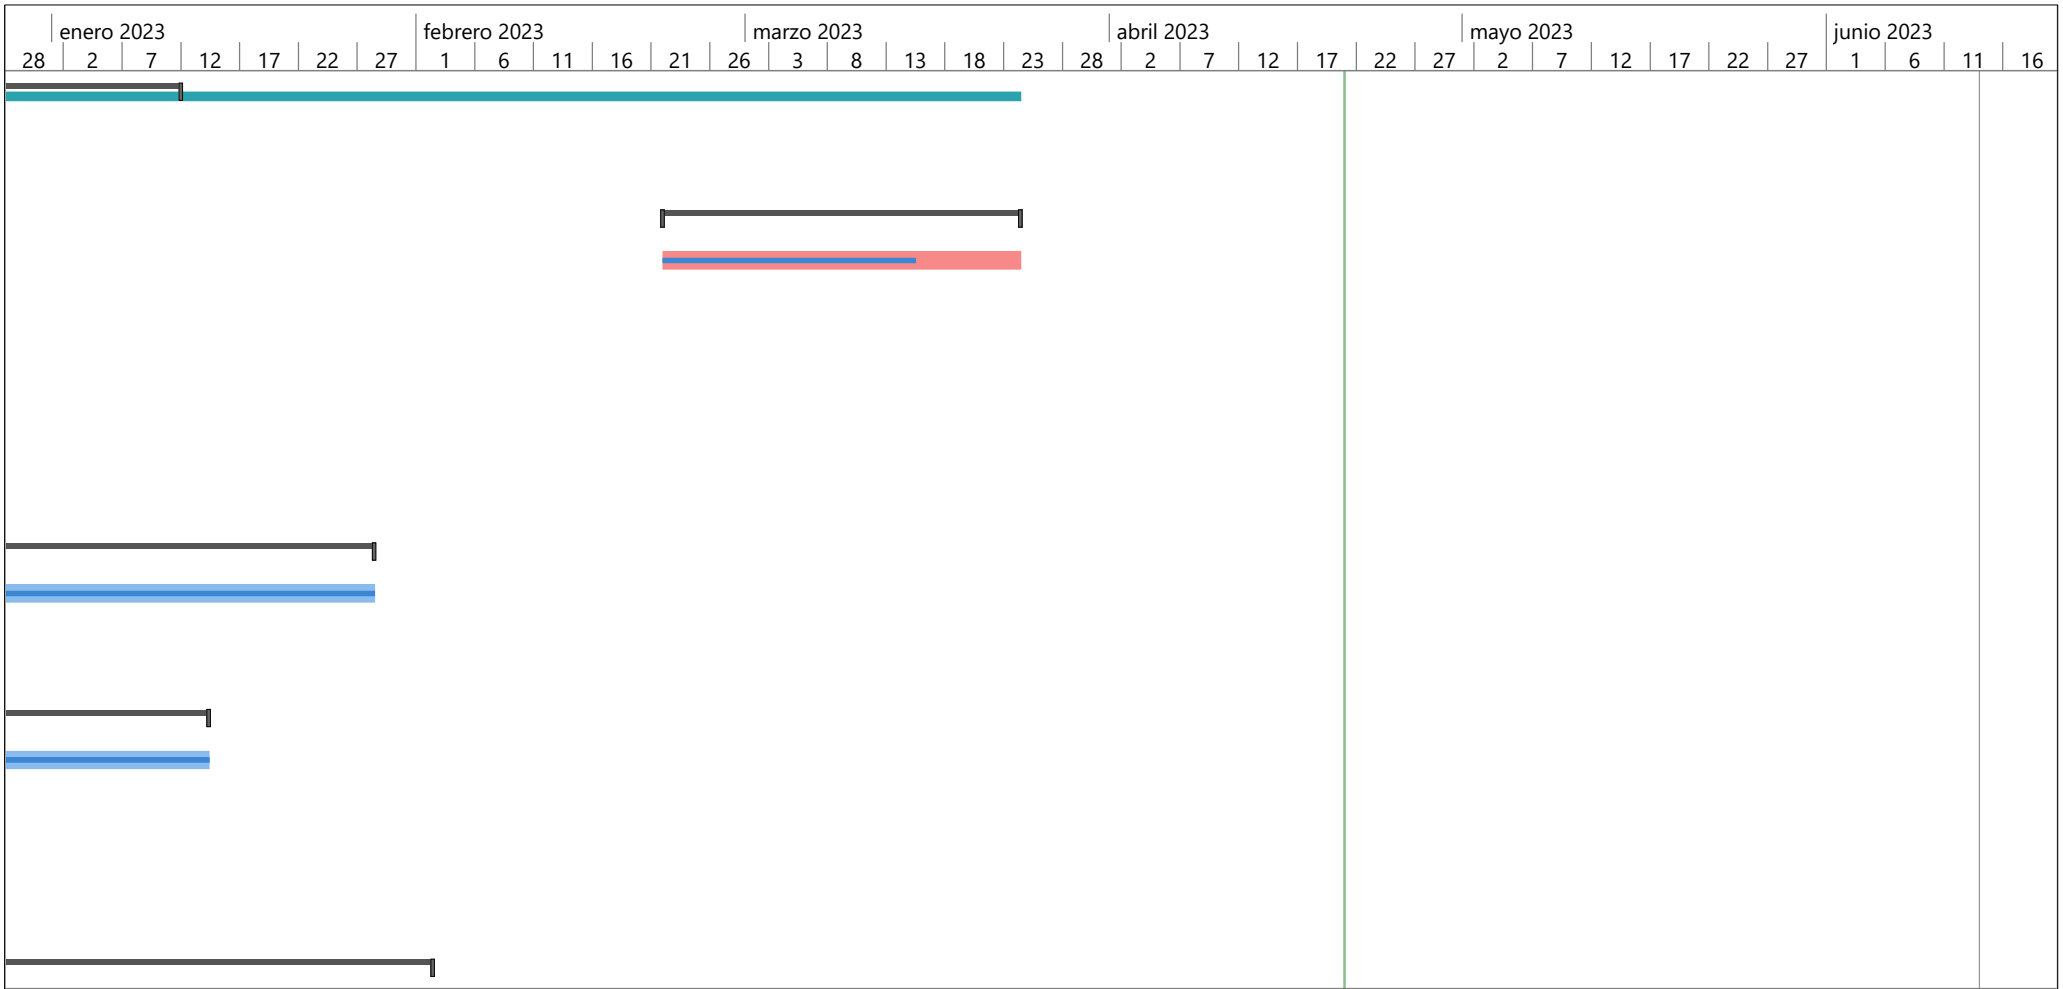


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual




Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

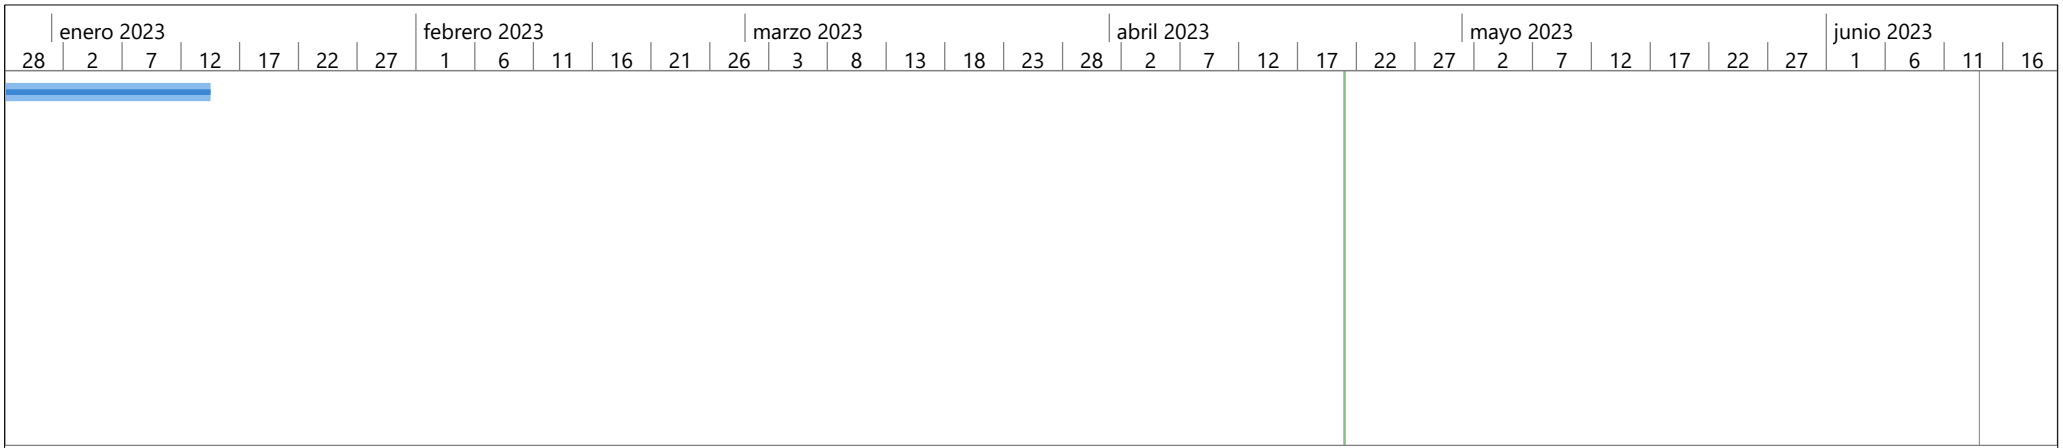


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

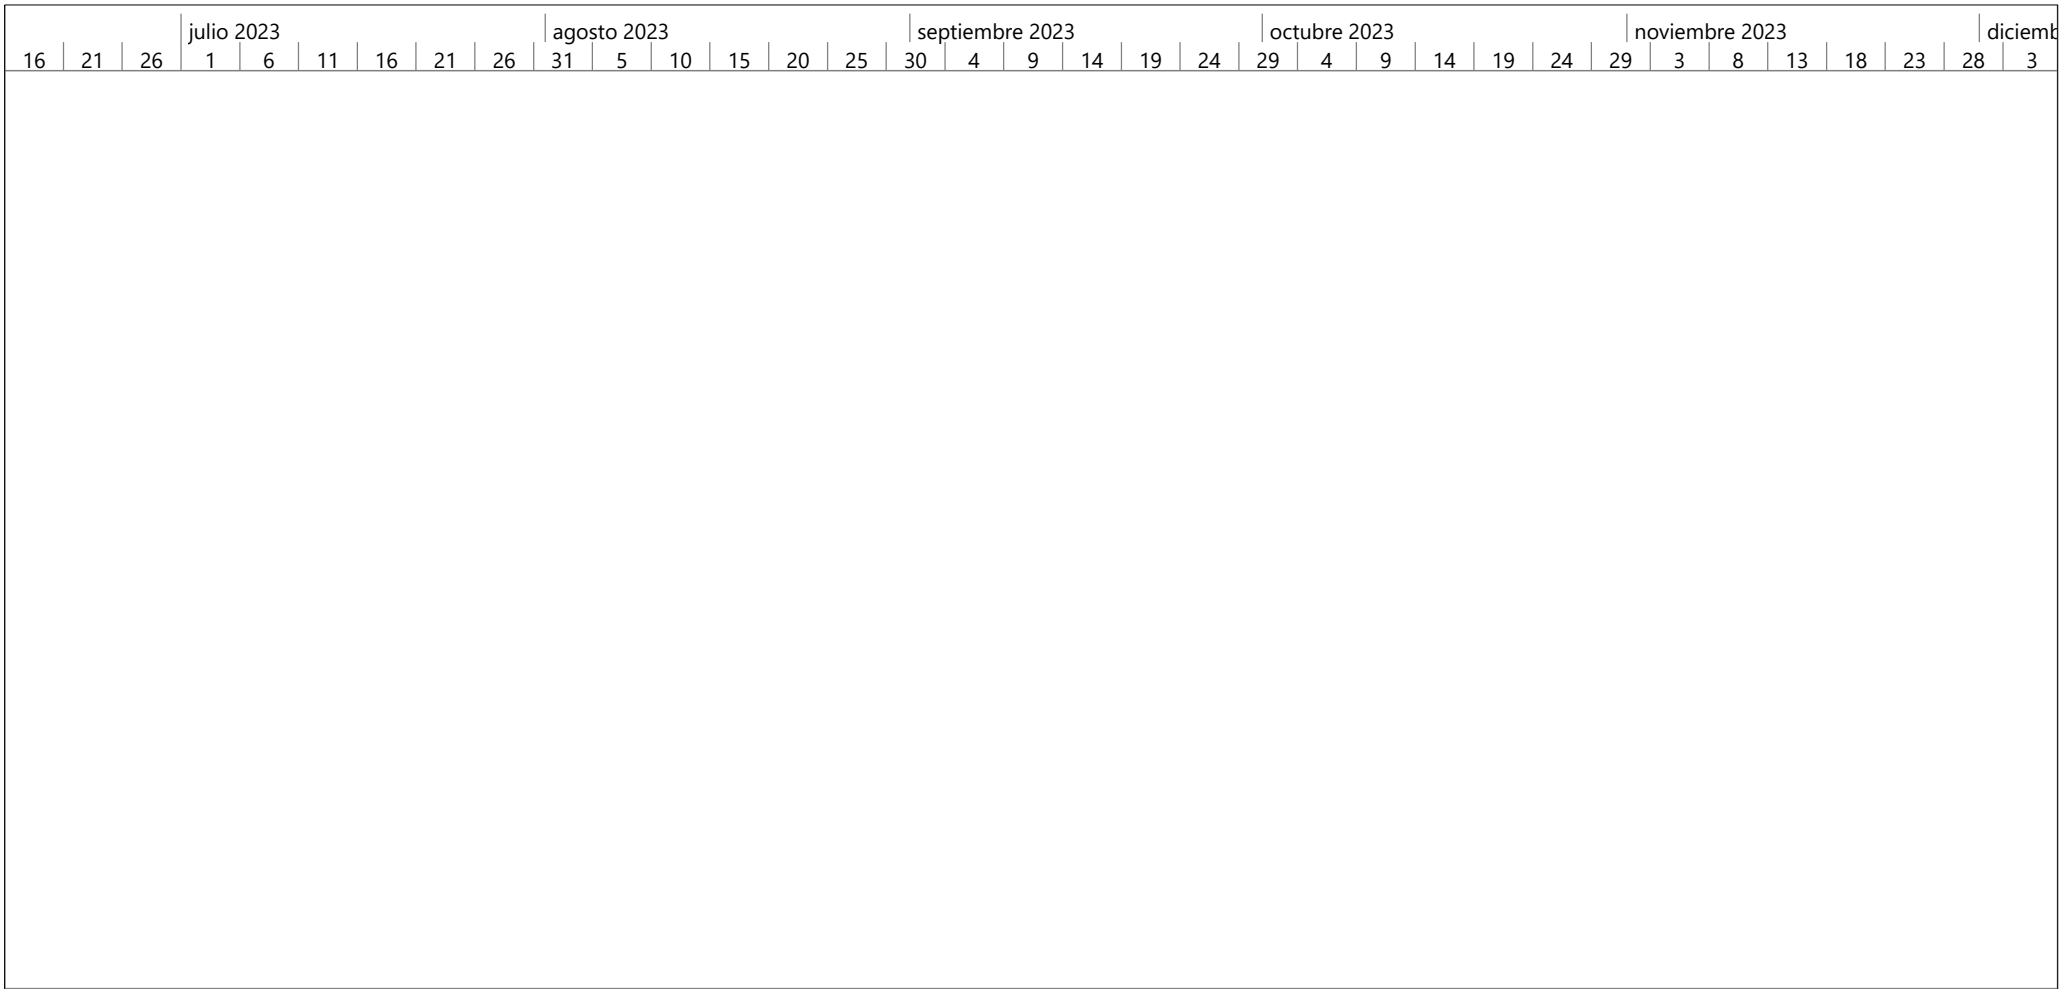


Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

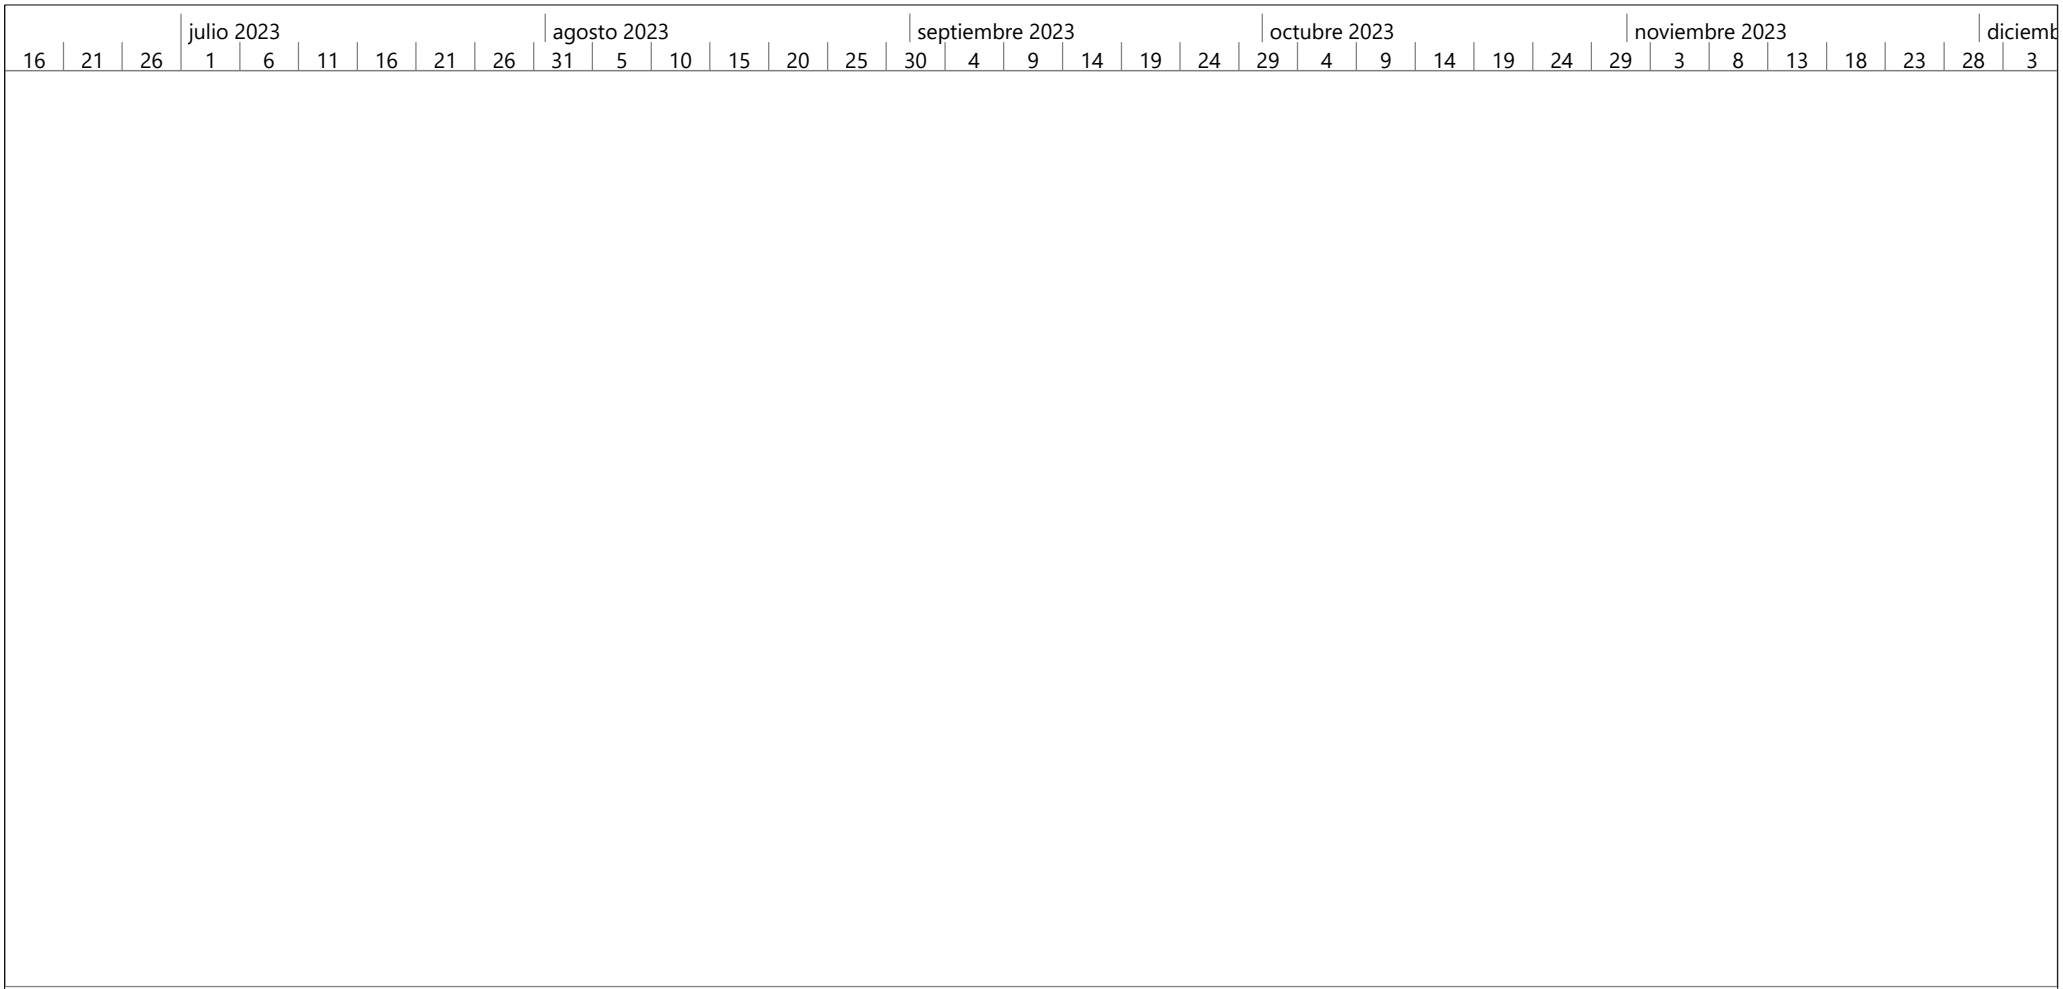

Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Proyecto: Programacion Alcadia
Fecha: vie 21/04/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	
