| | | |
|---|---|---|
| ALCALDIA MAYOR DE TUNJA | **ALCALDIA DE TUNJA** | **FECHA: 10/06/2022** |
| | **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** | **VERSION: 02** |
| | **PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA** | **CODIGO: GIN-F- 031** |
| | **FORMATO:INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN** | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME No. | 1 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL | 30 de noviembre del 2022 | Y EL | 18 de enero del 2023 |
| OBJETO | <Tal como aparece en el contrato> | | | | |
| LOCALIZACIÓN | <Indique el municipio, ciudad y barrio, según se requiera> | | | | |

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| | |
|---|---|
| CONTRATO No.: | 1475 DEL 2022 |
| CONTRATISTA: | TORRES ING S.A.S<br>NIT: 900335343-4<br>Representante legal: JOSE RUBÉN TORRES CAMARGO<br>C.C 91.492.804 |
| PLAZO INICIAL: | 1 MES CALENDARIO |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | 29 DE DICIEMBRE DEL 2022 |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | 17 DE ENERO DEL 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 18 DE ENERO DEL 2023 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 30 DÍAS CALENDARIO |
| VALOR INICIAL : | $25.632.000 |
| VALOR ADICION(ES): | NA |
| VALOR ACTUALIZADO: | NA |
| VALOR PAGADO: | 0 |
| VALOR POR PAGAR: | VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 25.632.000,00) |



* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

## 2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| CONCEPTO | VIGENCIAS | | VALOR | |
|---|---|---|---|---|
| | DESDE | HASTA | | |
| Cumplimiento del Contrato | 18/11/2022 | 24/08/2023 | $ | 5,126,400 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 18/11/2022 | 24/02/2026 | $ | 5,126,400 |
| Calidad del Servicio | 18/12/2022 | 24/02/2028 | $ | 5,126,400 |

## 3. INFORME DE ACTIVIDADES

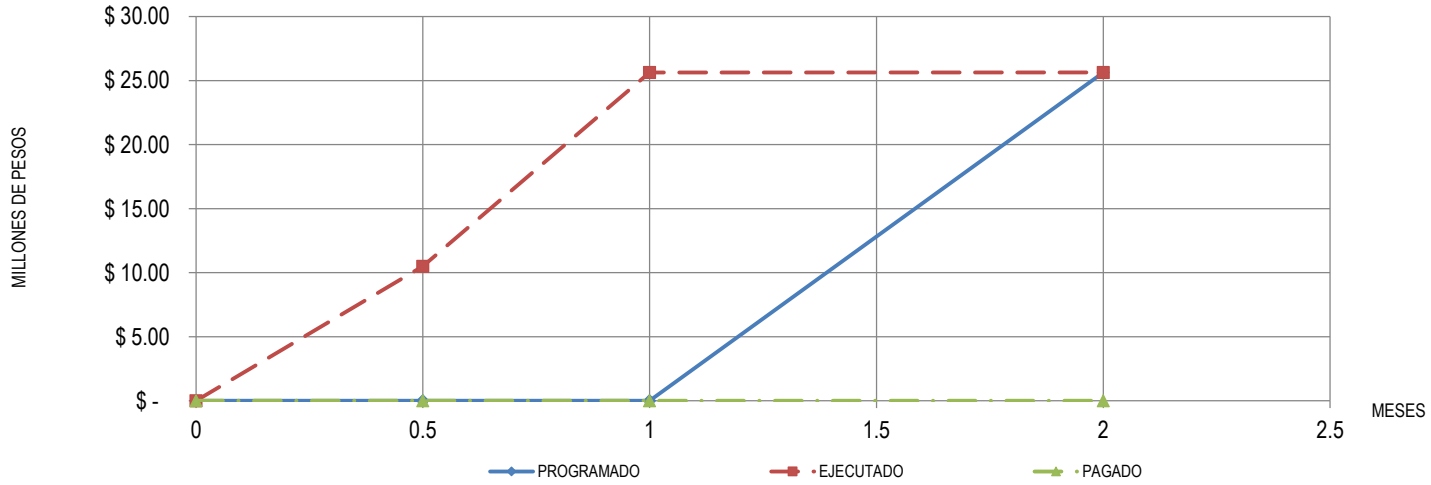
| No. | DIRECCION | | | | | ACTIVIDAD REALIZADA | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES | % AVANCE FISICO | SOPORTES / REGISTRO FOTOGRAFICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SECTOR | BARRIO | EJE VIAL | DESDE | HASTA | | | | ANTES | DESPUES |
| 1 | 5 | El Bosque | KRA 10 | CL 13A | CL15 | Desarrollo el contrato: Estudio geotécnico para el disgnóstico del muro ubicado en la carrera 10 entre calles 13 A 15 de conformidad a lo establecido en el fallo 150013333012 2018 0017100 contra el Municipio de Tunja | Levantamiento Topográfico.<br>Estudio de Suelos - Geotécnico.<br>Líneas de refracción sísmica.<br>Análisis de estabilidad.<br>Diseño.<br>Cantidades de obra, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto y cronograma. | 100% |  |  |

## 4. RESUMEN DE PAGOS

**CONTRATO DE CONSULTORÍA**

| CONCEPTO | VALOR | VALOR |
|---|---|---|
| NO S EHAN GENERADO PAGOS A LA FECHA PENDIENTE PAGO ÚNICO | | |

## 5. CURVA "S"




PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

## 6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

## 7. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Se ha dado cumplimiento a satisfacción de las actividades contratadas en el marco de la consultoría técnica, los productos de esta consultoría son entregados a la alcaldía bajo el radicado número ATU2023ER006047, dando aprobación a los pagos previstos, teneindo en cuenta la finalización de la ejecución física del contrato

**PEDRO ALEJANDO RODRIGUEZ**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**
