Id	Modo de tar	Nombre de tarea	Duración	Comienzo
1		**PRECONTRACTUALES**	**23 días**	**mié 1/03/23**
2		Plan de manejo de tránsito (PMT)	23 días	mié 1/03/23
3		Plan de manejo ambiental (PMA)	23 días	mié 1/03/23
4		**EJECUCIÓN FÍSICA**	**66 días**	**lun 3/04/23**
5		**PRELIMINARES**	**16 días**	**lun 3/04/23**
6		Desmonte y limpieza en zona boscosa	4 días	lun 3/04/23
7		Retiro manual de fachada colonial del muro existente	10 días	vie 7/04/23
8		Demolición de la estructura del muro existente	2 días	vie 21/04/23
9		**EXPLANACIONES Y ADECUACIONES**	**33 días**	**mar 25/04/23**
10		Excavaciónes varias de material común para la cimentación del muro	10 días	mar 25/04/23
11		Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte)	10 días	mar 25/04/23
12		Rellenos para estructuras con material seleccionado	5 días	vie 2/06/23
13		**ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS**	**3 días**	**vie 2/06/23**
14		Suministro e instalacion de Filtro frances incluye material granular filtrante y tubería ranurada	3 días	vie 2/06/23
15		Suministro e instalación de geotextil NT 2500 o similares	3 días	vie 2/06/23
16		**OBRAS DE CONTENCIÓN**	**32 días**	**mar 9/05/23**
17		Suministro e Instalación de concreto clase D para construcción de muro en concreto y aleta del muro	9 días	lun 22/05/23
18		Suministro e instalación de concreto clase E resistencia f'c= 17.5 MPa para limpieza (in situ)	3 días	mar 9/05/23
19		Acero de refuerzo para muro de contención fy 420mpa	6 días	vie 12/05/23
20		Acero de refuerzo para aleta del muro de contención fy 420mpa	6 días	vie 12/05/23
21		Junta de Dilatacion concreto	3 días	vie 2/06/23
22		Instalación de fachada colonial existente	11 días	mié 7/06/23
23		**REPOSICIÓN DE ANDENES**	**52 días**	**vie 21/04/23**
24		Retiro manual de andenes existentes tipo adoquines	5 días	vie 21/04/23
25		Instalación manual de andenes existentes tipo adoquines	8 días	jue 22/06/23
26		**TRANSPORTES**	**15 días**	**mar 9/05/23**
27		Transporte proveniente de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros	15 días	mar 9/05/23
28		LIQUIDACIÓN	20 días	mar 4/07/23

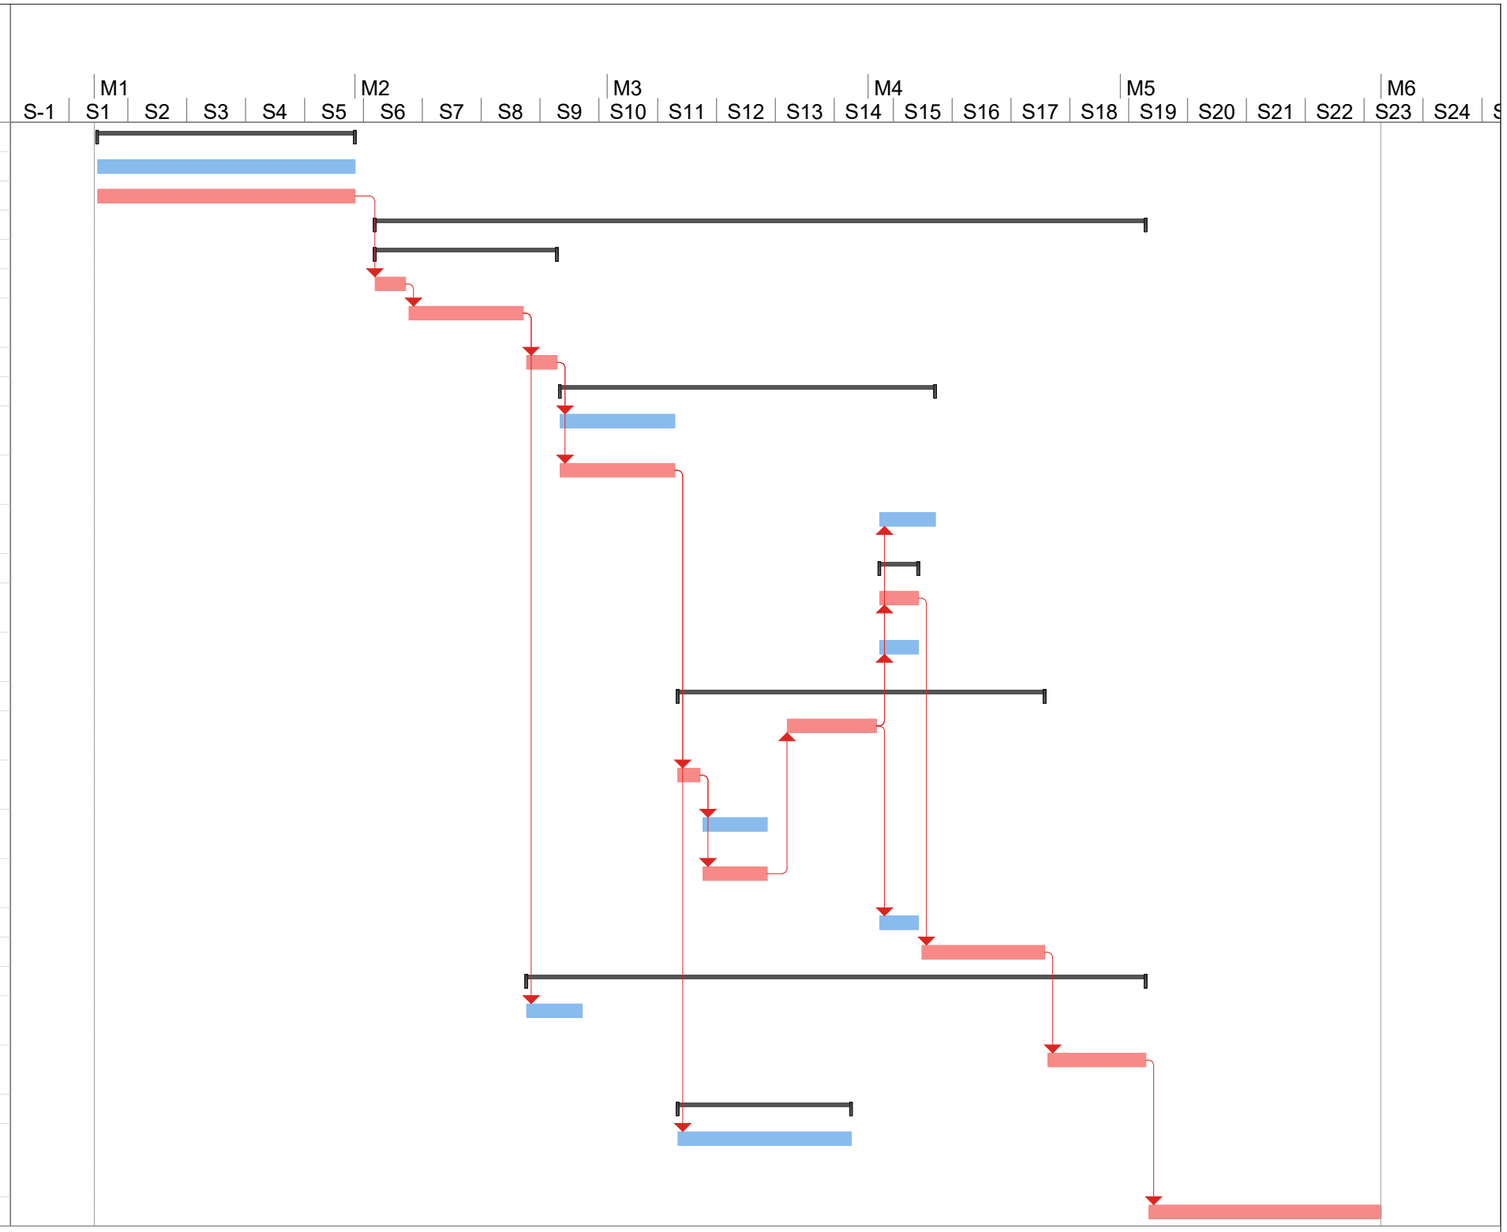

Proyecto: msproj11
Fecha: mar 17/01/23

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	
