“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de expansión y mantenimiento integral del Sistema de Semaforización de Bogotá D.C. y demás Contratos relacionados con la operación y el mantenimiento del Sistema Semafórico de Bogotá D.C.”

Contrato de Interventoría 2021-2454

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

GERENCIA EN VÍA
MOVILIDAD Y GESTIÓN

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

3.1 COMPROMISOS	3.2 RESPONSABLES	3.3 FECHAS	ESTADO
Entregar un informe que contenga la información de ejecución y el estado de avance de liquidación de los contratos que terminan en marzo de 2023. Este informe debe contener los aspectos de ejecución y presupuestal de los contratos que inician en marzo. Informe para ser entregado a la interventoría que recibe el primero de abril de 2023	INTERVENTORÍA Consorcio Semaforización ACO	25/03/2023	En ejecución por parte de la interventoria

Contrato 2021 – 2516
Lote 1 – Obras Civiles

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO			
Número de contrato	2021-2516		
Clase de contrato	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.*		
Contratista	CONSORCIO WILLIAMS-SKG		
Identificación	NIT. 901.543.585-5		
Interventor	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO		
Valor Inicial del contrato	CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA SIETE MIL OCHENTA PESOS ($5.301.947.080) M/CTE.		
Fecha de suscripción del contrato	30/11/2021		
Fecha de legalización	7/12/2021		
Fecha de inicio del contrato	16 de diciembre de 2021 (Acta de inicio)		
Plazo inicial de ejecución	Nueve (9) meses o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra		
Fecha de terminación inicial	15 de septiembre de 2022		
Valor adición No. 1	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.632.575.335) M/CTE.		
Valor contrato con adición No. 1	SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTI DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ($7.934.522.415) M/CTE.		
Fecha de suscripción adición No. 1	15/09/2021		
Plazo de ejecución con adición No. 1	Catorce (14) meses y quince (15) días o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra		
Tiempo adicionado	168 días		
Fecha de terminación adición No. 1	2/03/2022		
CDP 1 - Inicial	No. 2203	13/07/2021	VEINTI DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS VEINTI CINCO MIL OCHO CIENTOS VEINTI TRES PESOS ($22.179.825.823) M/CTE.

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO

CRP 1 - Inicial	No. 2500	6/12/2021	CINCO MIL TRESCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS ($5.301.947.080) M/CTE.
Rubro	133011604490000007578		
CDP 2 - Adición No. 1	No. 2308	5/08/2022	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.633.575.596) M/CTE.
CRP 2 - Adición No. 1	No. 2470	16/09/2022	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.632.575.335) M/CTE.
Rubro	O23011604490000007578		
CRP 1 + CRP 2	$ 7.934.522.415		
No. Pólizas	Cumplimiento No. 3015806 y Responsabilidad civil extracontractual No. 1028750		
Fechas de aprobación de pólizas	Suscripción del contrato	RCE	7/12/2021
		Cumplimiento	7/12/2021
	Actualización según acta de	RCE	20/01/2022
		Cumplimiento	17/03/2022
	Actualización según adición No. 1	RCE	29/09/2022
		Cumplimiento	26/10/2022
Compañía Aseguradora	LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. NIT. 860.002.400-2		
Proceso de selección N°	SDM-PSA-MC-115-2021		
Acta de adjudicación	Resolución No. 117926 del diecinueve (19) de noviembre de 2021		

AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS AL 30/03/2023 - CONTRATO INICIAL

	No.	ID	EXT	Intersección	Tipo	% Avanc	Estado
CONTRATO INICIAL	1	1745	3049	KR 78 K x CL 40 S	Nueva	100%	Terminada
	2	1691	1080	KR 74A x AC 72	Nueva	100%	Terminada
	3	1749	1183	KR 107 x DG 78 C	Nueva	100%	Terminada
	4	1748	1182	KR 70 x CL 103	Nueva	100%	Terminada
	5	1755	3002	AK 27 x CL 5	Nueva	100%	Terminada
	6	1756	3002	AK 27 x CL 5A	Nueva	100%	Terminada
	7	1759	2169	AK 50 x AC 63	Nueva	100%	Terminada
	8	1039	3044	KR 23C x CL 64 S	Nueva	100%	Terminada
	9	1433	3061	Alameda el Porvenir x CL 26 S	Nueva	100%	Terminada
	10	218	3011	TV 66A x CL 59C S (KR 67 x CL 66A S)	Nueva	100%	Terminada
	11	1765	2786	KR 100 X CL 19	Nueva	99%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	12	1409	3058	TV 78B x CL 36 S	Nueva	100%	Terminada
	13	1473	2087	KR 19A x CL 63A	Nueva	100%	Terminada
	14	1438	2073	KR 97 x CL 23F	Nueva	100%	Terminada
	1	724	1500	TV 94L x AC 80	Complement	100%	Terminada
	2	660	2866	KR 32 x Av. Los Comuneros (AC 6)	Complement	100%	Terminada
	3	2	1022	AK 7 x AC 170	Complement	100%	Terminada
	4	5	1012	AK 7 x CL 175	Complement	100%	Terminada
	1	15	1170	AK 9 X AC 147	Zona INES	100%	Terminada

AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS AL 30/03/2023 – ADICIÓN No. 1

	No.	ID	EXT	Intersección	Tipo	% Avance	Estado
Adición No. 1	1	692	3188	AK 30 X CL 1F	Zona INES	100%	Terminada
	2	631	1510	AK 86 X AC 90	Zona INES	100%	Terminada
	3	346	1493	AK 72 X AC 138	Zona INES	100%	Terminada
	1	1761	2155	TV 27 X CL 57	Nueva	99%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	2	1764	3080	KR 72 X CL 63A S	Nueva	98%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio y remates de obra
	3	1767	2347	KR 69D X AC 24	Nueva	100%	Terminada
	4	1768	3081	KR 3 X CL 30A S	Nueva	96%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio y remates de obra
	5	1769	3082	KR 12D X CL 28C S	Nueva	96%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio y remates de obra
	6	1770	2130	KR 69 X CL 68	Nueva	99%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	7	1771	1053	KR 95G X CL 86	Nueva	99%	Terminada el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	8	1763	2099	KR 60 X CL 4D	Nueva	99%	Terminada el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	9	1766	2783	KR 99 X CL 20	Nueva	99%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio
	10	1772	1054	KR 45A X CL 134D	Nueva	99%	Terminado el frente de obra. Pendiente algunos resultados de laboratorio

AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS PROYECTADOS AL 30/03/2023 DEL CONTRATO CON ADICIÓN No. 1: 99,46%

Pendientes para recibo a satisfacción:

1. Entrega del informe técnico y SSTMA del mes de marzo del 2023.

2. Entrega del informe final técnico y SSTMA del contrato.

3. Terminación de los pendientes de obra según actas de recorrido del 09/03/2023 y 13/03/2023, entregadas mediante oficio CSA-P1644-501 del 21/03/2023.

4. Entrega de la señalización retirada en los frentes de obra.

5. Entrega de los resultados de laboratorio y certificados de calidad pendientes los cuales fueron recordados al Contratista mediante oficio CSA-P1644-498 del 22/03/2022.

6. Entrega de cierre de incumplimientos a los PMT’s los cuales fueron recordados al Contratista mediante oficio CSA-P1644-498 del 22/03/2022.

7. Entrega de paz y salvos ante las empresas de servicios públicos del distrito, donde se relacione en cada una el listado de daños presentados durante el desarrollo del contrato.

Pendientes para recibo a satisfacción:

8. Paz y salvo emitido por la SDM, cuando por causas imputables al contratista, sus subcontratistas o sus dependientes, se causen daños a bienes o redes de su propiedad. Ver oficio CSA-P1644-221 con copia a SDM No. 20226120196032 2 referente al siniestro Ext. 3669 - KR 19 (Av. Boyacá) x CL 60 C sur del 19/07/2022.

9. Solicitud de cierre del PIN ambiental ante la Secretaría Distrital de Ambiente producto del plan de gestión de residuos de construcción y demolición y su informe final.


10. La entrega de las áreas de espacio público intervenidos a través de la licencia de excavación al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU.

11. Entrega de la información as-built (planos record) de las obras ejecutadas según oficio CSA-P1644-460 del 27/02/2023.

12. Entrega de 14 juegos de llaves de AUCE´s de la OT No. 18.

13. Suscripción del acta de terminación.

Entre otros.

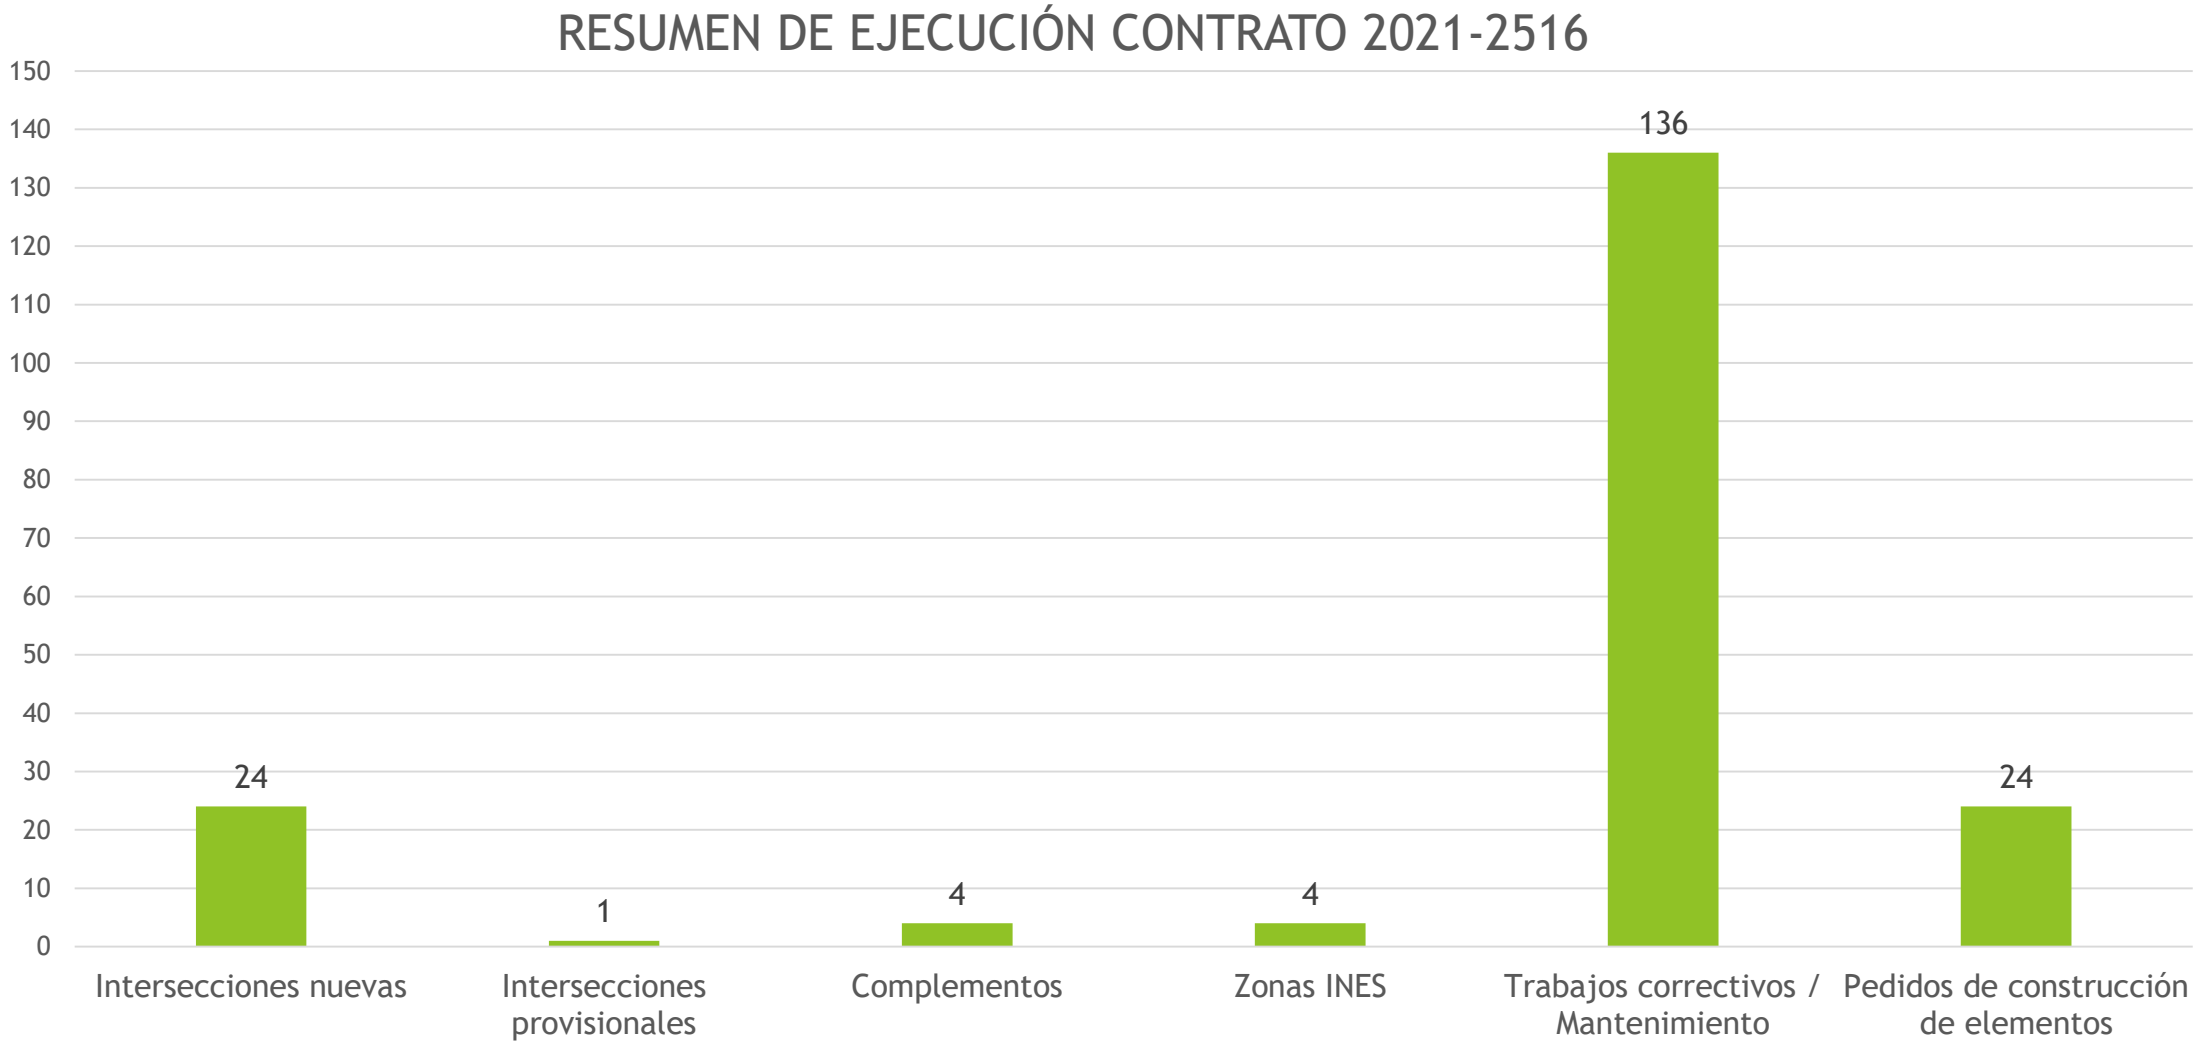

RESUMEN DE EJECUCIÓN CONTRATO 2021-2516
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
24
1
4
4
136
24
Intersecciones nuevas
Intersecciones provisionales
Complementos
Zonas INES
Trabajos correctivos / Mantenimiento
Pedidos de construcción de elementos

AVANCE PRESUPUESTAL VS AVANCE FÍSICO VS AVANCE PLAZO DE EJECUCIÓN

Avance del plazo de ejecución del contrato		**100,00%**
Avance físico de los trabajos proyectados		**99,46%**
Avance presupuestal (Facturado)		**93,65%**
Corte febrero 2022	$	178.009.720
Corte marzo 2022	$	230.964.735
Corte abril 2022	$	338.722.977
Corte mayo 2022	$	467.052.286
Corte junio 2022	$	482.643.408
Corte julio 2022	$	856.866.364
Corte agosto 2022	$	706.842.472
Corte septiembre 2022	$	473.830.862
Corte octubre 2022	$	383.574.642
Corte noviembre 2022	$	839.004.567
Corte diciembre 2022	$	892.983.744
Corte enero 2023	$	786.179.292
Corte febrero 2023	$	793.637.670
Corte pendiente marzo 2023 - Aprox.	$	406.674.126
Total facturado (no incluye corte marzo 2023)	**$**	**7.430.312.739**

Valor inicial del contrato	**$**	**5.301.947.080**
Valor adición No.1	**$**	**2.632.575.335**
Valor contrato + adición No.1	**$**	**7.934.522.415**

AVANCE PRESUPUESTAL VS AVANCE FÍSICO VS AVANCE PLAZO DE EJECUCIÓN

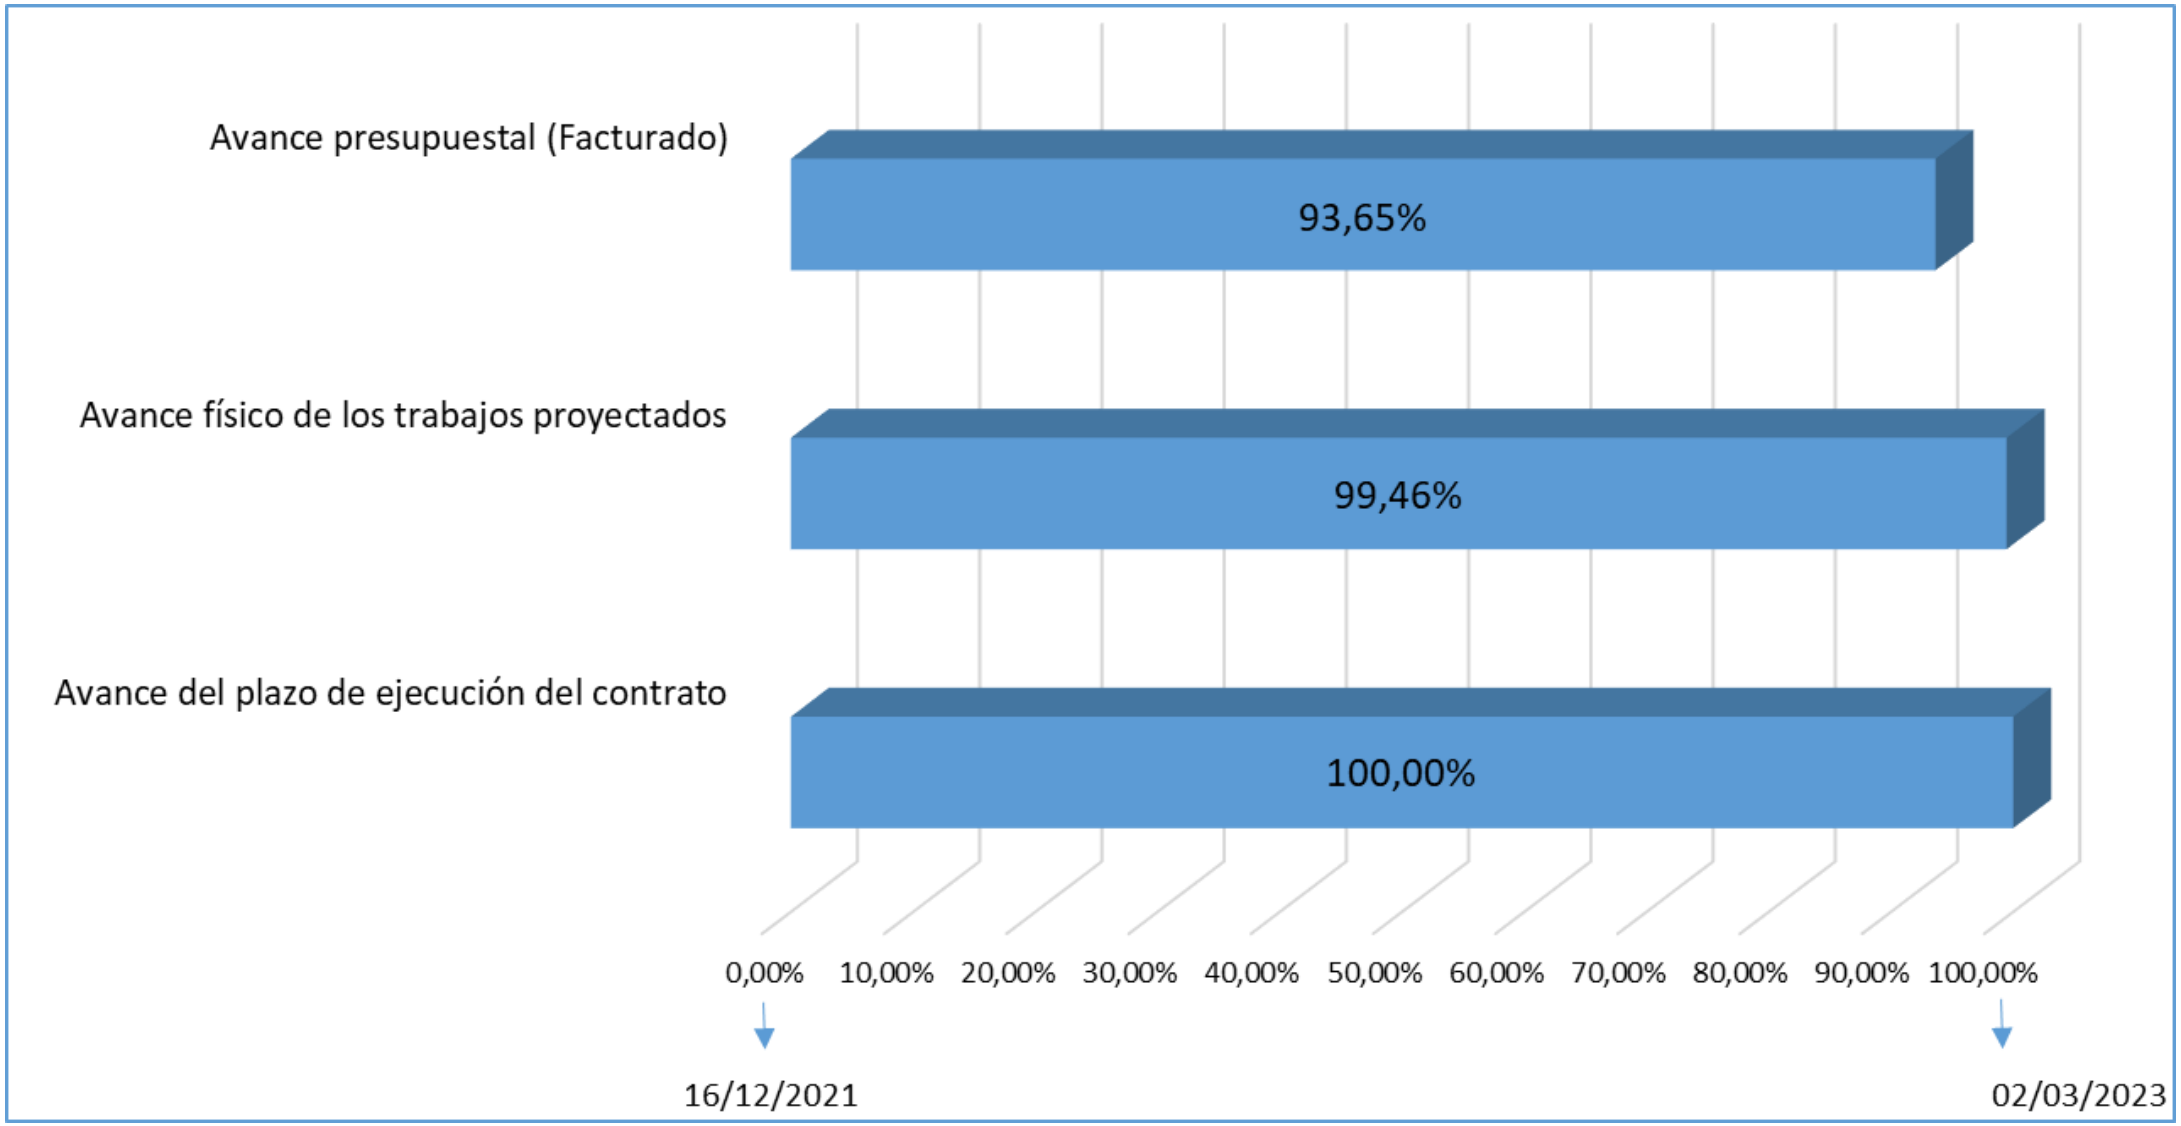

BALANCE FINANCIERO ESTIMADO PARA CIERRE DE CONTRATO

Acta No.	Periodo	Valor total corte	Retegarantía	Valor a pagar	Saldo del contrato	Fecha de radicación Contratista	Fecha de contabilización CXP	No. Documento Contable	CRP	Saldo CRP
					$ 7.934.522.415				2500	$ 5.301.947.080
1	feb-22	$ 178.009.720	$ 8.900.486	$ 169.109.234	$ 7.756.512.695	9/04/2022	22/04/2022	3000290523	2500	$ 5.132.837.846
2	mar-22	$ 230.964.735	$ 11.548.237	$ 219.416.498	$ 7.525.547.960	9/04/2022	22/04/2022	3000290524	2500	$ 4.913.421.348
3	abr-22	$ 338.722.977	$ 16.936.149	$ 321.786.828	$ 7.186.824.983	10/06/2022	16/06/2022	3000461260	2500	$ 4.591.634.520
4	may-22	$ 467.052.286	$ 23.352.614	$ 443.699.672	$ 6.719.772.697	10/06/2022	16/06/2022	3000461261	2500	$ 4.147.934.848
5	jun-22	$ 482.643.408	$ 24.132.170	$ 458.511.238	$ 6.237.129.289	11/07/2022	19/07/2022	3000547724	2500	$ 3.689.423.610
6	jul-22	$ 856.866.364	$ 42.843.318	$ 814.023.046	$ 5.380.262.925	10/08/2022	24/08/2022	3000673184	2500	$ 2.875.400.564
7	ago-22	$ 706.842.472	$ 35.342.124	$ 671.500.348	$ 4.673.420.453	8/09/2022	12/10/2022	3000828658	2500	$ 2.203.900.216
8	sep-22	$ 473.830.862	$ 23.691.543	$ 450.139.319	$ 4.199.589.591	10/10/2022	21/10/2022	3000856113	2500	$ 1.753.760.897
9	oct-22	$ 383.574.642	$ 19.178.732	$ 364.395.910	$ 3.816.014.949	11/11/2022	22/11/2022	3000950856	2500	$ 1.389.364.987
10	nov-22	$ 839.004.567	$ 41.950.228	$ 797.054.339	$ 2.977.010.382	15/12/2022	23/12/2022	3001070375	2500	$ 592.310.648
									2470	$ 2.632.575.335
11	dic-22	$ 892.983.744	$ 44.649.187	$ 848.334.557	$ 2.084.026.638	10/02/2023	20/02/2023	3000092928	2470	$ 1.784.240.778
12	ene-23	$ 786.179.292	$ 39.308.965	$ 746.870.327	$ 1.297.847.346	10/02/2023	1/03/2023	3000110833	2470	$ 1.037.370.451
13	feb-23	$ 793.637.670	$ 39.681.884	$ 753.955.786	$ 504.209.676	10/03/2023	16/03/2023	3000164582	2470	$ 283.414.665
Estimado	mar-23	$ 406.674.126	$ 20.333.706	$ 386.340.420	$ 97.535.550	Corte aprox. marzo 2023 para trámite ??? 2023			2470	$ -
									2500	$ 489.384.893
Totales		**$ 7.836.986.865**	**$ 391.849.343**	**$ 7.445.137.522**						

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.301.947.080
B	Total adiciones al contrato	$ 2.632.575.335
C	Valor total del contrato	$ 7.934.522.415
D	Valor pagado al contratista	$ 7.445.137.522
E	Retención en garantía acumulada	$ 391.849.343
F	Valor total ejecutado	$ 7.836.986.865
G	Saldo a favor de la Entidad	$ 97.535.550

Contrato 2023 – 1354
Lote 1 – Obras Civiles

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO			
Número de contrato	2023-1354		
Clase de contrato	SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.*		
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023		
Identificación	NIT. 901.686.586-6		
Interventor	CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO		
Valor Inicial del contrato	CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS ($4.605.914.516) M/CTE		
Fecha de inicio del contrato	Ocho (8) de marzo de 2023 (Acta de inicio)		
Plazo inicial de ejecución	Once (11) meses o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra		
Fecha de terminación inicial	Siete (7) de febrero de 2024		
Certificados de disponibilidad presupuestal	No. 193	6/01/2023	CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4.365.000.000)
	No. 194	6/01/2023	CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.074.000.000)
Certificados de registro presupuestal	No. 1376	2/03/2023	CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.365.000.000)
	No. 1377	2/03/2023	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE ($240.914.516)
Rubro	O23011604490000007578		
No. Pólizas	Cumplimiento No.21-44-101407370 y Responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101207009		
Fechas de aprobación de pólizas	Suscripción del contrato	RCE	7/03/2023
		Cumplimient	7/03/2023
	Actualización según acta de	RCE	Aprobada por Interventoría. Pendiente SDM
		Cumplimient	Aprobada por Interventoría. Pendiente SDM
Compañía Aseguradora	Seguros del Estado S.A.		
Proceso de selección N°	SDM-LP-170-2022		
Acta de adjudicación	Resolución No. 88260 de 22 de febrero de 2023		


DOCUMENTACIÓN DE INICIO CONTRATO		
REQUISITO		**ESTADO**
1	Acta de Inicio	Suscrita el 08/03/2023
2	Hojas de vida del personal profesional	Aprobadas
3	Relación del equipo mínimo obligatorio	Presentado por el Contratista y con observaciones
4	Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	Aprobados
5	Programa de obra	Presentado por el Contratista y con observaciones por parte de Interventoría
6	Plan de manejo de tránsito- PMT	En trámite
7	Licencia de excavación	En trámite
8	Plan de Calidad	En trámite dentro de cronograma. Se hace observaciones por parte de Interventoría
9	Actualización de pólizas según acta de inicio	Actualizadas y aprobadas por Interventoría. Pendiente aprobación SDM
10	Dotación y carnets	Muestras en proceso de aprobación
11	Vehículos	Aprobado vehículo de transporte de personal
		No aprobado camión transporte de materiales
		No aprobado grúa para izaje de AUCE´s y bases
12	Presentación de 2 bodegas	Aprobada bodega Carrera 123 No. 13 - 21 Int. C5
		Rechazada bodega Calle 38 Sur No. 68G - 37
		Rechazada bodega Calle 165 No. 56A - 45
13	Equipos de comunicación	Aprobados
14	Equipos de cómputo	El Contratista envía la relación de los equipos y está pendiente la presentación de licencias de software de sistema operativo, hoja de cálculo y procesador de texto para aprobación
15	Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV	No aplica para este contrato
16	Plan de manejo ambiental y pin ambiental	Presentado por el Contratista y con observaciones por parte de Interventoría
17	Plan anual de trabajo SST	Presentado por el Contratista y con observaciones por parte de Interventoría

Contrato 2021 – 2517

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Número de Contrato de Obra	2021-2517		
Objeto	EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
Contratista	CONSORCIO YUNEX TRAFFIC 2021		
Identificación	NIT: 901.543.742-5		
Valor Inicial del Contrato	DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($12.471.876.825)		
Valor del Contrato con adición	Adición No.1: $6.863.797.417 del 25/08/2022. Valor Total del Contrato: $ 19.335.674.242		
Fecha de inicio del contrato	04 de diciembre de 2021		
Plazo inicial de Ejecución	Nueve (9) meses o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra.		
Fecha de terminación inicial	03 de septiembre de 2022		
Plazo con adición y prórroga	Quince (15) meses o hasta agotar recursos, lo que primero ocurra.		
Fecha de terminación	03 de marzo de 2023. Modificatorio No. 2, primero (1) de febrero de 2023.		
CDP 1 - Inicial	CDP No. 1	2203 DEL 13/07/2021	$22.179.825.823 VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE
CRP	CRP No. 1	2479 DEL 01/12/2021	$12.471.876.825 DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE
CDP 2 - ADICIÓN Y PRORROGA No.1	CDP No. 2	2104 DEL 24/06/2022	$6.863.797.417 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
CRP 2 - ADICIÓN Y PRORROGA No.1	CRP No. 2	2089 DEL 26/08/2022	$6.863.797.417 SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE
No. Pólizas	Cumplimiento No.47379, RCE No.53014		


Contrato N° 2021-2517

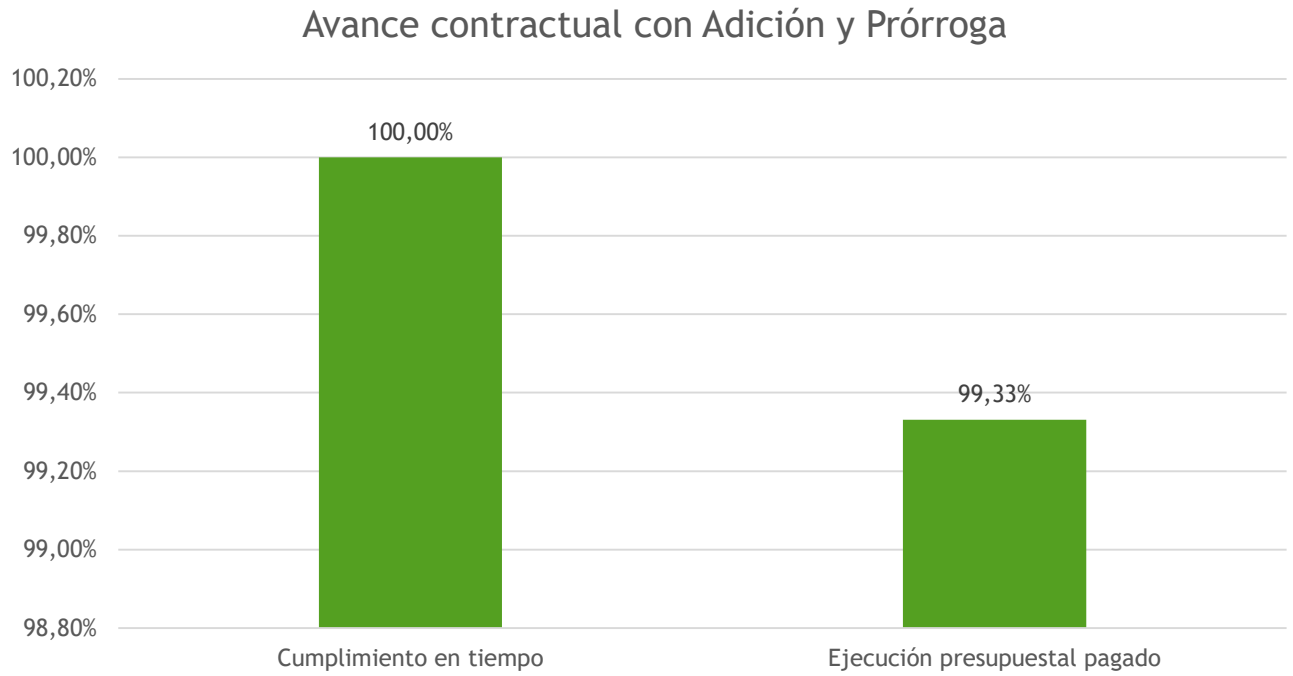


1. Se han atendido las solicitudes de servicios por parte de la SDM en su totalidad y la mayoría dentro de los tiempos estipulados para ello. Se han atendido las observaciones que ha realizado la interventoría.
2. El contratista presenta la programación de mantenimiento preventivos la cual es evaluada y aprobada por la interventoría finalizando el mes anterior.

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO


Actividades componente eléctrico mes de marzo

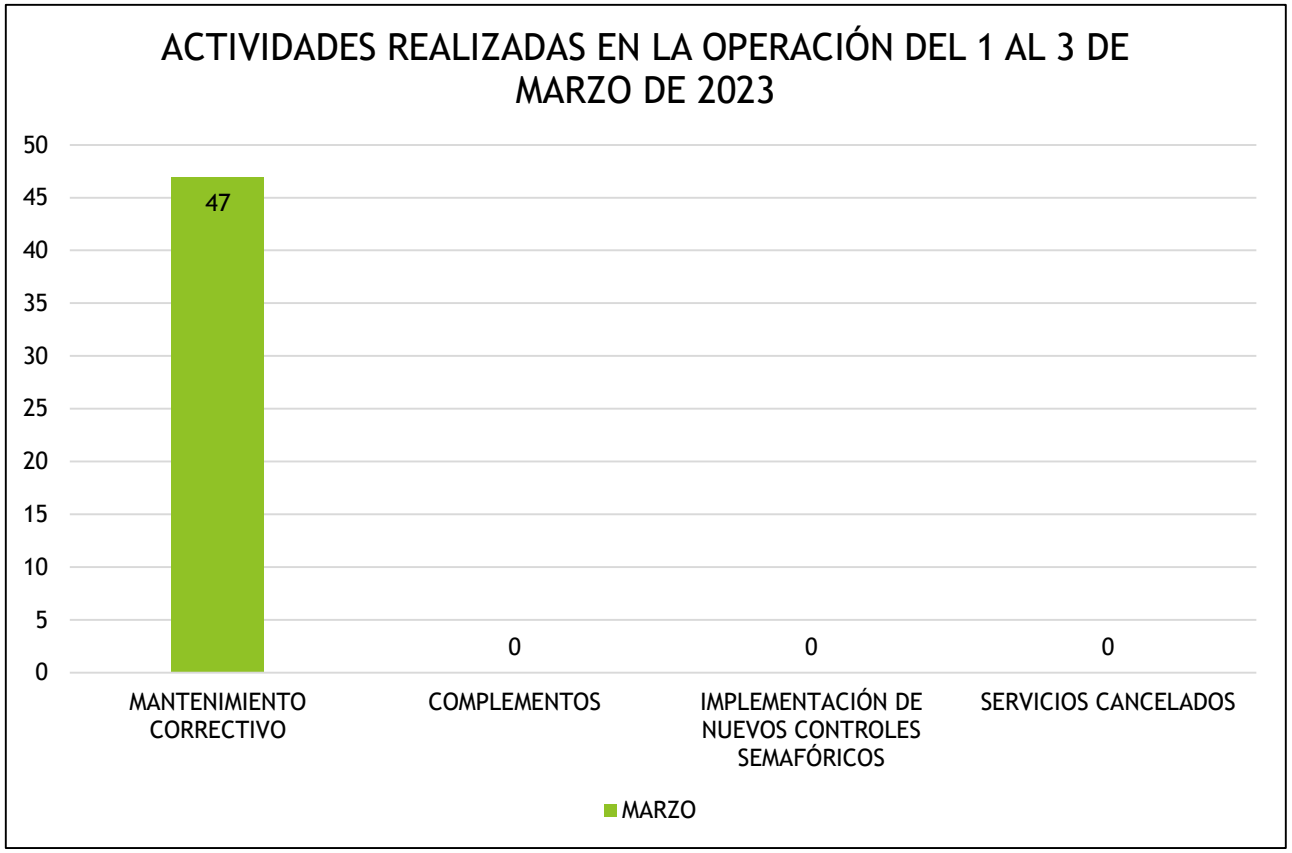


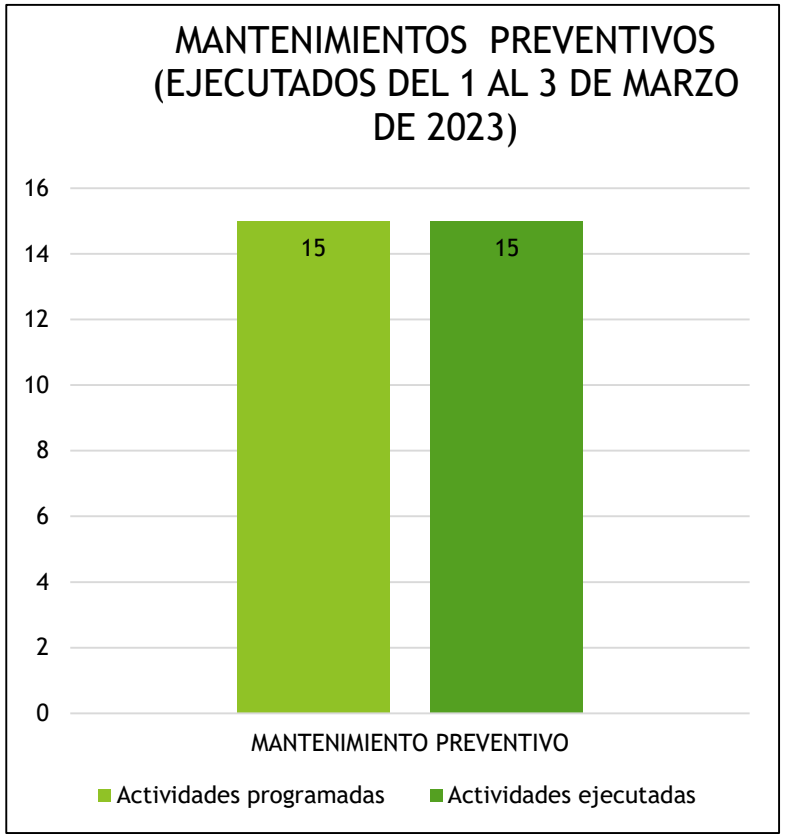

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Actividades componente equipos mes de marzo

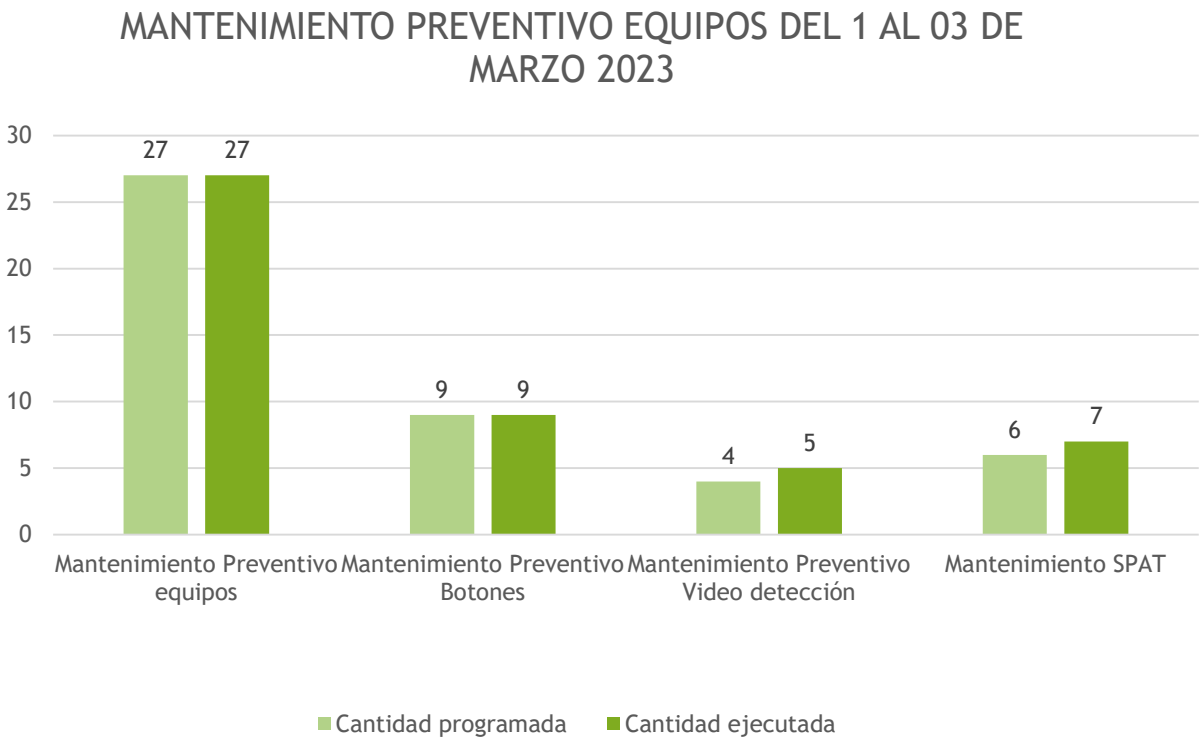

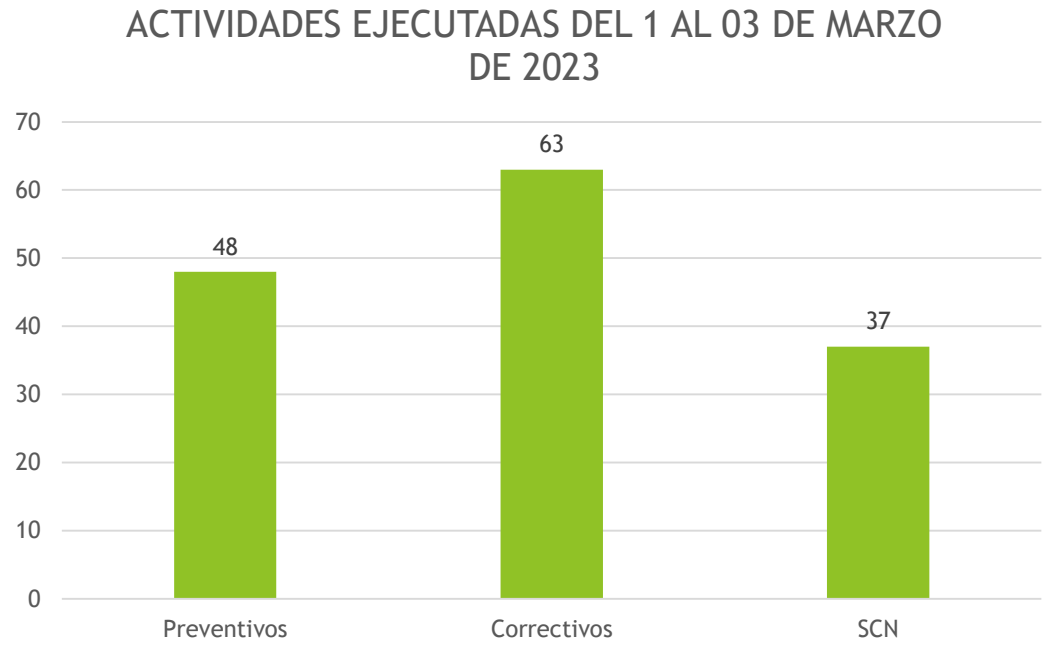


Ardanuy
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CAYCO S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Contrato 2023 – 1355

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Número de contrato	**2023-1355**
Clase de contrato	Contrato de Obra Pública
Objeto	*EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.*
Contratista	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023
Identificación	NIT: 901.686.106-4
Valor Inicial del Contrato	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 19.426.979.863).
Fecha de inicio del contrato	7 de marzo de 2023
Plazo inicial de ejecución	11 Meses y 15 días calendario o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato.
Fecha de terminación inicial	22 de febrero de 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 190 del 06-enero-2023 RUBRO O23011604490000007578 por valor de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL ($ 6.727.920.000) 191 06-enero-2023 RUBRO O23011604490000007578 por valor de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($ 12.697.165.000) 194 06-enero-2023 RUBRO O23011604490000007578 por un valor de CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES ($4.074.000.000)
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 1343 del 1 de marzo de 2023 RUBRO O23011604490000007578 por un valor de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL ($6.727.920.000) No. 1342 del 1 de marzo de 2023 RUBRO O23011604490000007578, por un valor de DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL ($12.697.165.000) No. 1344 RUBRO O23011604490000007578, por un valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES ($1.894.863)
No. Pólizas	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 2045219 Fecha de aprobación: 07/03/2023 POLIZA DE CUMPLIMIENTO 2045218 Fecha de aprobación: 07/03/2023
Fecha de aprobación de pólizas iniciales:	7 de marzo de 2023
Compañía Aseguradora	JMANUCELLI TRAVELERS S.A., Nit 900.488.151 - 3


Contrato N° 2021-1355

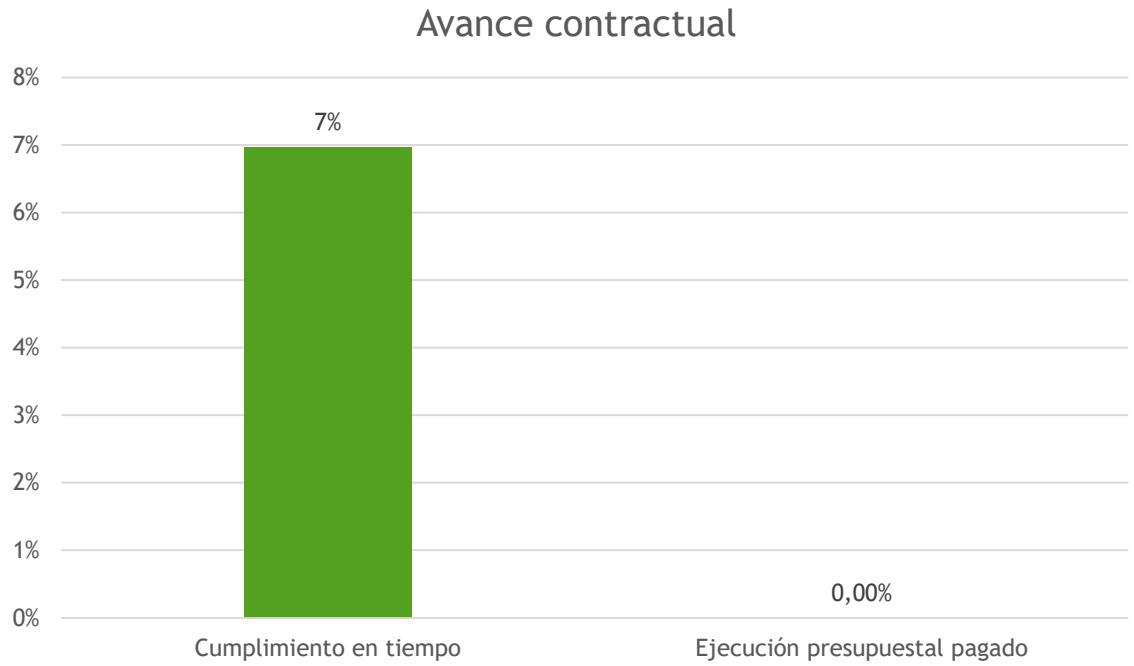


1. Se han atendido las solicitudes de servicios por parte de la SDM en su totalidad y la mayoría dentro de los tiempos estipulados para ello. Se han atendido las observaciones que ha realizado la interventoría.
2. El contratista presenta la programación de mantenimiento preventivos la cual es evaluada y aprobada por la interventoría finalizando el mes anterior.


Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO


Actividades componente eléctrico mes de marzo

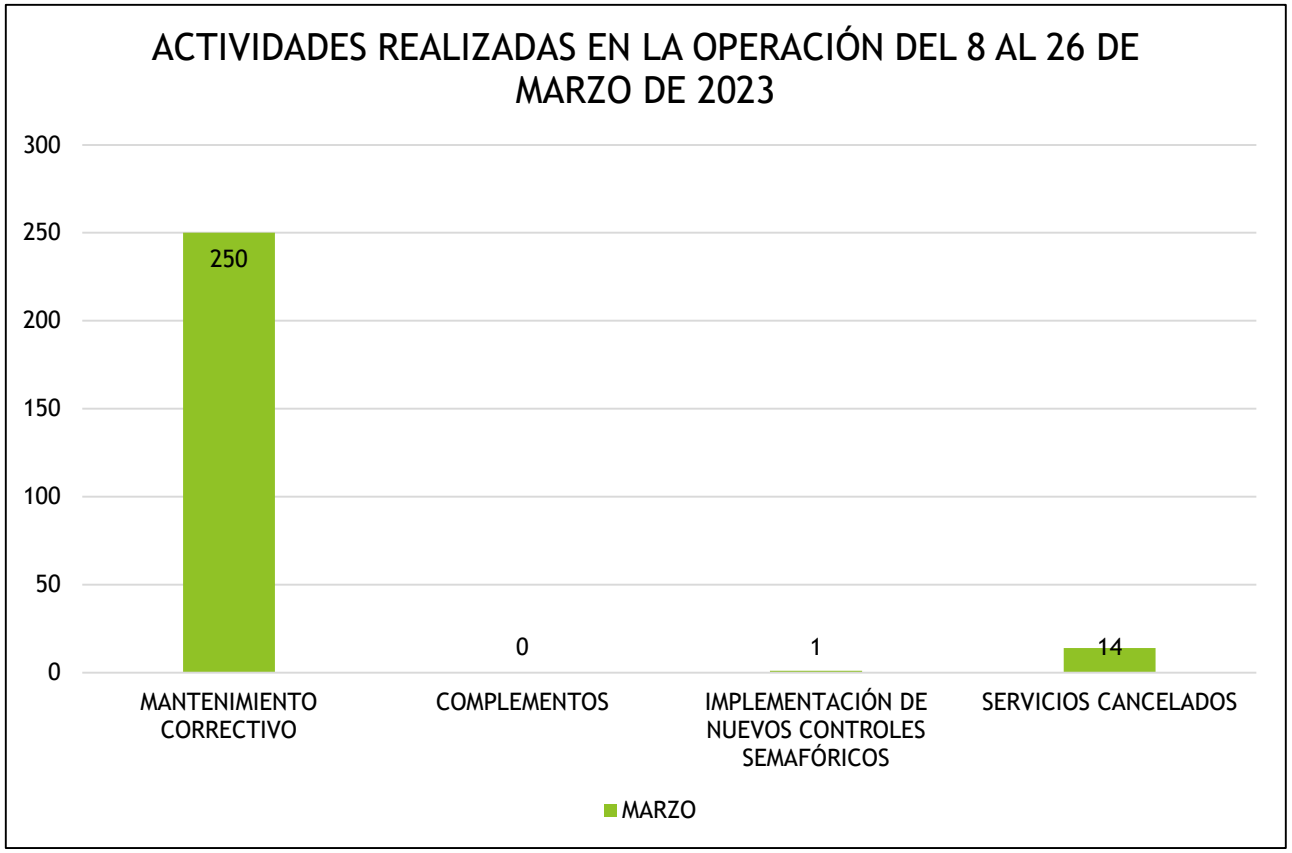

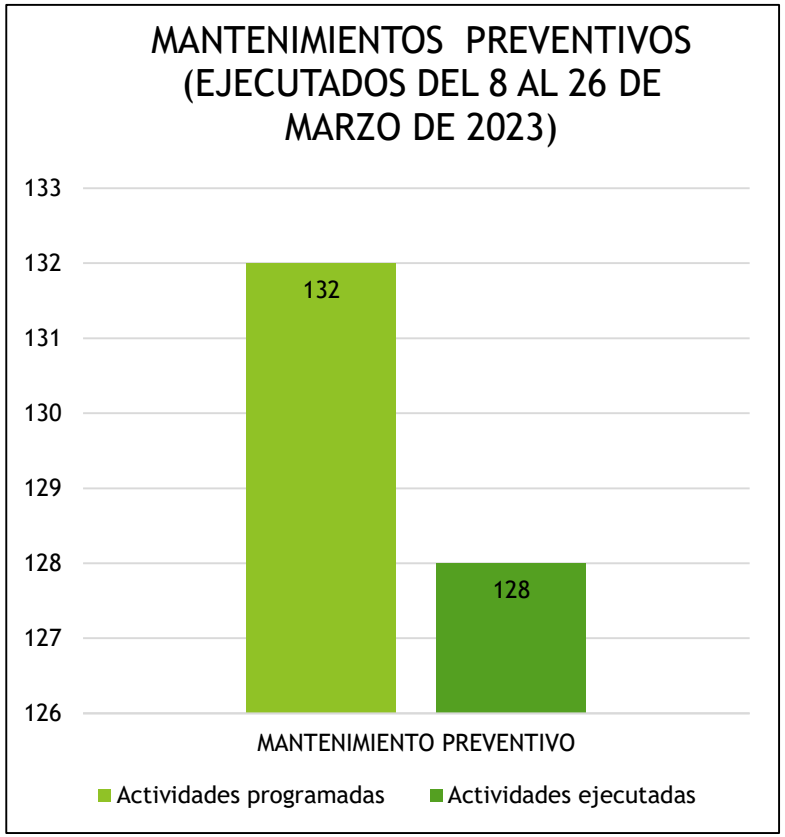

Actividades componente equipos mes de marzo

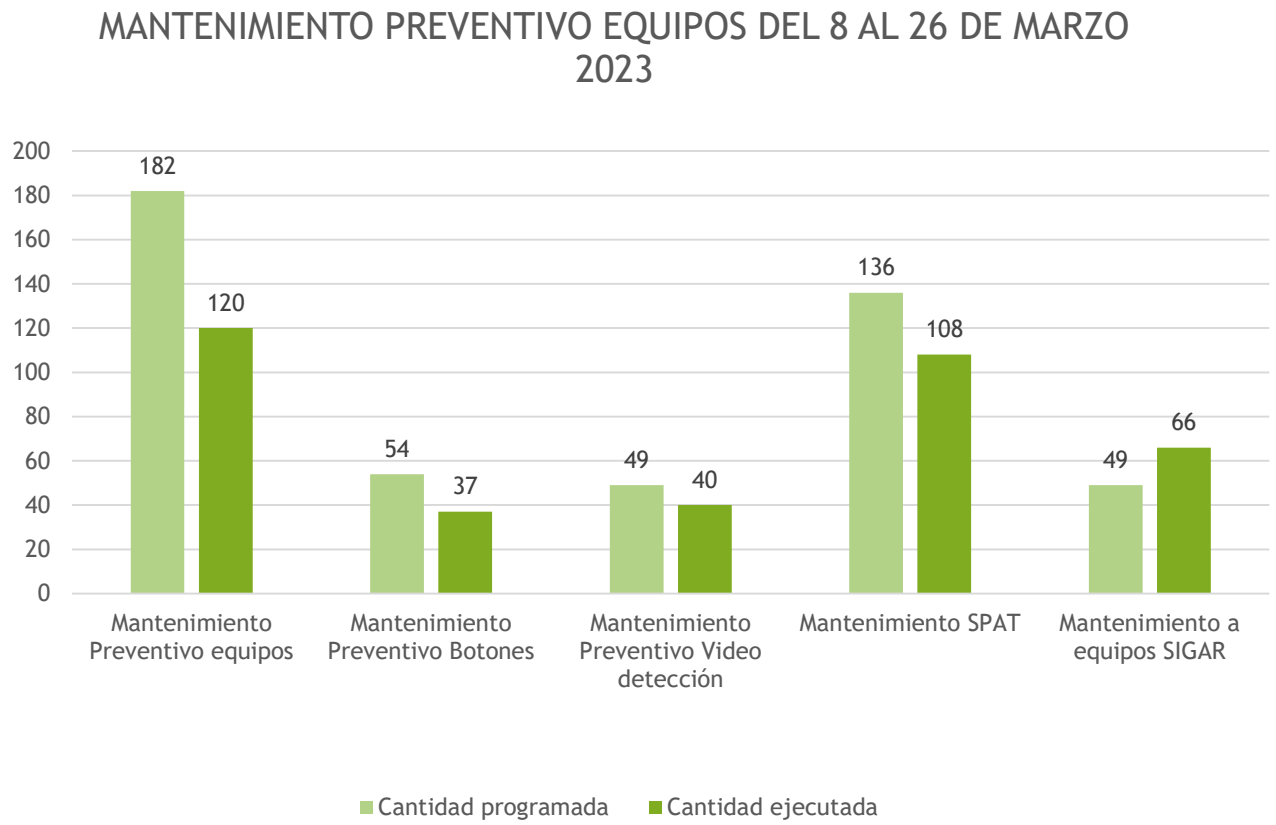

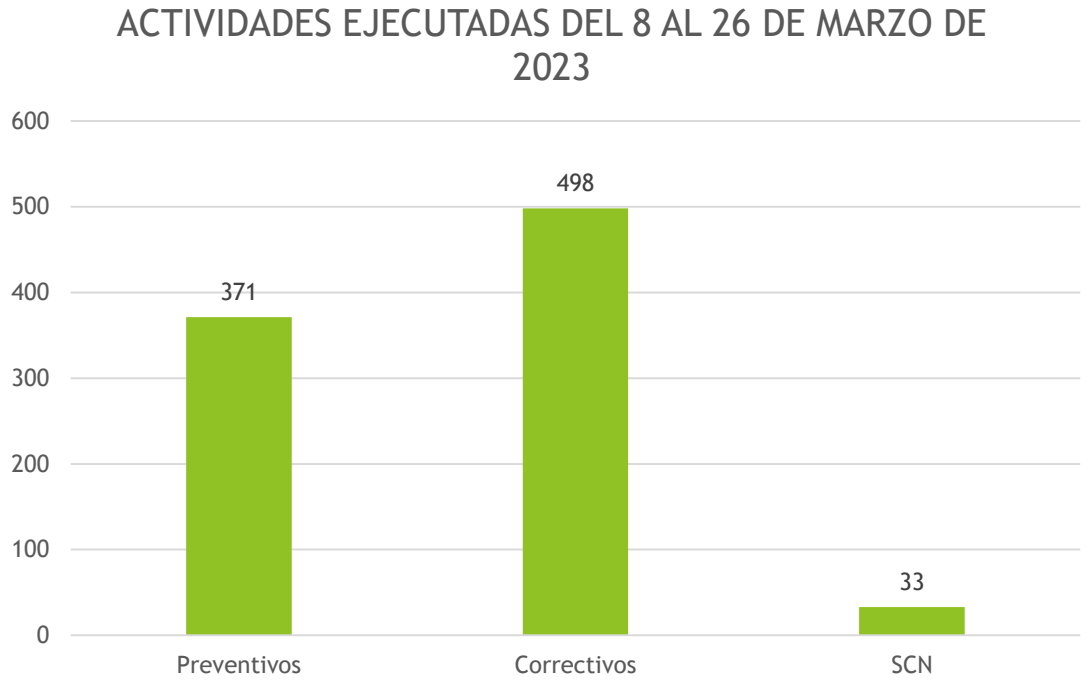

Ardanuy OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CAYCO S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Contrato 2021 – 2433

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Número de contrato	2021-2433		
Clase de contrato	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
Objeto	COMPONENTE DE POSTES METÁLICOS DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.		
Contratista	TRANSPORTE, PLANEACIÓN Y DISEÑO INGENIERÍA S.A. –TPD INGENIERÍA S.A.–		
Identificación	NIT: 830-034-108-3		
Interventor	CONSORCIO SEMAFORIZACIÒN ACO		
Valor inicial del contrato	TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.930.551.403)		
Valor adición No. 1	MIL MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.000.024.491)		
Valor total del contrato	CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.930.575.894,00)		
Fecha de suscripción del contrato	30 DE SEPTIEMBRE 2021		
Fecha de legalización	14 DE OCTUBRE DE 2021		
Fecha de inicio del contrato	09 DE DICIEMBRE DE 2021		
Plazo inicial de ejecución	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
Plazo de ejecución de prórroga	SEIS (6) MESES Y SIETE (7) DÍAS CALENDARIO		
Plazo final	CATORCE (14) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS		
Fecha de terminación inicial	23 DE AGOSTO DE 2022		
Fecha de terminación prórroga	02 DE MARZO DE 2023		
CDP No. 1 – Inicial	2203	13/07/2021	VEINTIDÓS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 22.179.825.823)
CDP No. 2 – Adición, prorroga y modificación No. 1	2311	5/08/2022	MIL MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.000.024.491)
CRP No. 1 – Inicial	2268	1/10/2021	TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.930.551.403)
CRP No. 2 – Adición, prorroga y modificación No. 1	2120	26/08/2022	MIL MILLONES VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 1.000.024.491)
Rubro inicial	3-3-01-16-04-490-000-007578		
Rubro Adición No. 1	C-2301-16-04-490-000-007578		
No. Pólizas	CUMPLIMIENTO NO. 3173551 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0790534-1		
Fecha de aprobación pólizas iniciales	14 DE COTUBBRE DE 2022		
Fecha de aprobación pólizas - Acta de inicio	04 DE FEBRERO DE 2022		
Fecha de aprobación pólizas – Adición, prorroga y modificación No. 1	07 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
Compañía Aseguradora	SEGUROS SURAMERICANA		
Proceso de licitación Nº	SDM-LP-072-2021		
Resolución de adjudicación	No. 87455 del 22 de septiembre de 2021		


Estado del proyecto

1. El contrato inició el 09 de diciembre de 2021, una vez el contratista cumplió la totalidad de requisitos legales y contractuales para este fin. El día 23 de agosto de 2022, se firmó la prórroga y adición para el contrato y finalizó el 02 de marzo de 2023.


2. A la fecha se han presentado 15 cuentas, correspondientes a los meses comprendidos entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, de acuerdo con las actividades desarrolladas durante este periodo. La cuenta No. 16 del mes de marzo de 2023 está pendiente por radicación

3. Avance del contrato:

- Ejecución presupuestal: 99,99 %
- Cumplimiento en tiempo: 100 %

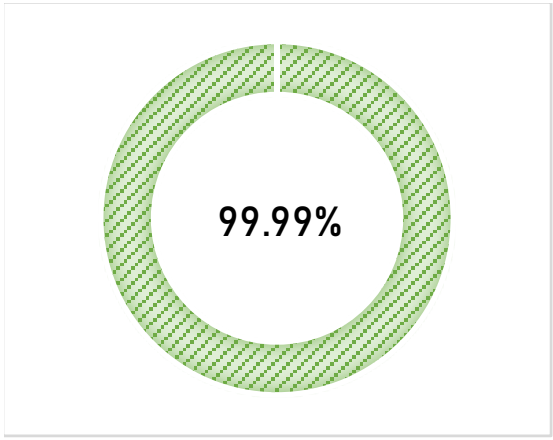

Cumplimiento presupuestal

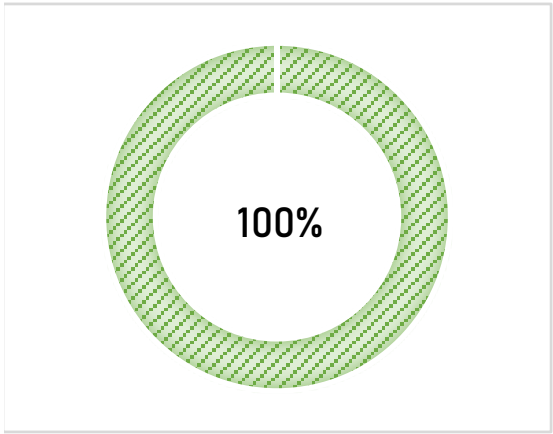

Cumplimiento en tiempo

Balance financiero


BALANCE FINANCIERO CONTRATO 2021-2433											
Acta No.	**Periodo**	**Valor total corte**	**Retegarantía**	**Valor pagado**	**Saldo por ejecutar**	**Fecha de radicación**	**Fecha de contabilización CXP entidad**	**No. Documento contable**	**CRP**	**Saldo CRP**	**Referencia**
1	09/12/2021 31/12/2021	$ 107.793.310	$ 5.389.665	$ 102.403.645	$ 3.822.758.093	10/02/2022	21/02/2022	3000109580	2268	$ 3.828.147.758	2676
2	01/01/2022 31/01/2022	$ 249.258.930	$ 12.462.947	$ 236.795.983	$ 3.573.499.163	10/02/2022	21/02/2022	3000109552	2268	$ 3.591.351.775	2675
3	01/02/2022 28/02/2022	$ 286.642.114	$ 14.332.106	$ 272.310.008	$ 3.286.857.049	10/03/2022	1/04/2022	3000224206	2268	$ 3.319.041.767	5396
4	01/03/2022 31/03/2022	$ 391.523.824	$ 19.576.191	$ 371.947.633	$ 2.895.333.225	8/04/2022	22/04/2022	3000290514	2268	$ 2.947.094.134	7798
5	01/04/2022 30/04/2022	$ 403.143.886	$ 20.157.194	$ 382.986.692	$ 2.492.189.339	10/05/2022	17/05/2022	3000359047	2268	$ 2.564.107.442	9976
6	01/05/2022 31/05/2022	$ 414.940.281	$ 20.747.014	$ 394.193.267	$ 2.077.249.058	10/06/2022	16/06/2007	3000461253	2268	$ 2.169.914.175	12113
7[1]	01/06/2022 30/06/2022	$ 415.148.026	$ 20.757.401	$ 394.390.625	$ 1.662.101.032	10/07/2022	26/07/2022	3000562464	2268	$ 1.775.523.550	14254
8	01/07/2022 31/07/2022	$ 415.148.026	$ 20.757.401	$ 394.390.625	$ 1.246.953.006	10/07/2022	25/07/2022	3000562665	2268	$ 1.381.132.925	14254
		$ 17.699.250	$ 884.963	$ 16.814.287	$ 1.229.253.756	10/08/2022	19/08/2022	3000662348	2268	$ 1.364.318.638	16646
9	01/08/2022 31/08/2023	$ 394.544.392	$ 19.727.220	$ 374.817.172	$ 1.834.733.855	8/09/2022	12/10/2022	3000828649	2268	$ 989.501.466	20399
10	01/09/2022 30/09/2022	$ 494.296.082	$ 24.714.804	$ 469.581.278	$ 1.340.437.773	10/10/2022	21/10/2022	3000852587	2268	$ 519.920.188	21491
11	01/10/2022 31/10/2022	$ 305.033.060	$ 15.251.653	$ 289.781.407	$ 1.035.404.713	11/11/2022	21/11/2022	3000939679	2268	$ 230.138.781	23956
12[2]	01/11/2022 30/11/2022	$ 321.200.517	$ 16.060.026	$ 304.242.110	$ 714.204.196	15/12/2022	23/12/2022	3001062095 3001069886	2268 2120	$0 $ 925.921.162	281131 28113
	VALOR A DESCONTAR EN NOVIEMBRE (ACTA 12) POR CONCEPTO DE BIOSEGURIDAD PAGADA EN LOS PERÍODOS DE JULIO A OCTUBRE 2022	$ 945.664	$ 47.283	$ 898.381	$ 715.102.577	15/12/2022	23/12/2022				
13[3]	01/12/2022 30/12/2022	$ 314.711.667	$ 15.735.583	$ 298.976.084	$ 400.390.910	11/11/2022	17/02/2023	3000083497	2120	$ 626.945.078	2103
14[3]	01/01/2023 30/01/2023	$ 224.732.785	$ 11.236.639	$ 213.496.146	$ 175.658.125	9/02/2023	20/02/2023	3000092911	2120	$ 413.448.932	2104
15	01/02/2023 30/02/2023	$ 163.235.016	$ 8.161.751	$ 155.073.265	$ 12.423.109	10/3/2023	23/3/2023	3000174685	2120	$ 258.375.667	4925
16	01/03/2023 02/03/2023	$ 12.421.239	$ 621.062	$ 11.800.177	$ 1.870	-	-	-	2120	$ 246.575.490	-
Total		**$ 4.930.574.024**	**$ 246.573.620**	**$ 4.684.000.404**							

Resumen financiero


Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 3.930.551.403
B	Valor adición No. 1 al contrato	$ 1.000.024.491
C	Valor total del contrato	$ 4.930.575.894
D	Valor pagado al contratista	$ 4.684.000.404
E	Retención en garantía acumulada de cuentas pagadas	$ 246.573.620
F	Valor total ejecutado	$ 4.930.574.024
G	Valor por ejecutar del contrato	$ 1.870

4. Se ejecutaron 23 órdenes de trabajo (09 fabricación y 14 mantenimiento), 1843 órdenes de servicio en Mántum
5. Se intervinieron 329 intersecciones en 6 localidades (San Cristóbal, Suba, Usme, La Candelaria, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño) y 3 corredores (AV Colón, AV Calle 80, AV Carrera 13)
6. Durante el desarrollo del contrato se ejecutaron las siguientes cantidades de las actividades de mantenimiento:
   - Instalación de postes: 1019
   - Pintura en vía: 821
   - Lavado en vía: 663
   - Soldaduras: 2828
7. Se fabricaron 1353 postes semafóricos y 12 postes de video detección.
8. Inventario final:.
   - 397 postes semafóricos.
   - 22 postes de video detección.
   - 81 tapas convencionales.
   - 17 tapas antivandálicas.

En la plataforma Mántum se realiza el cargue de las cantidades actualizadas de cada elemento a los almacenes correspondientes de la SDM

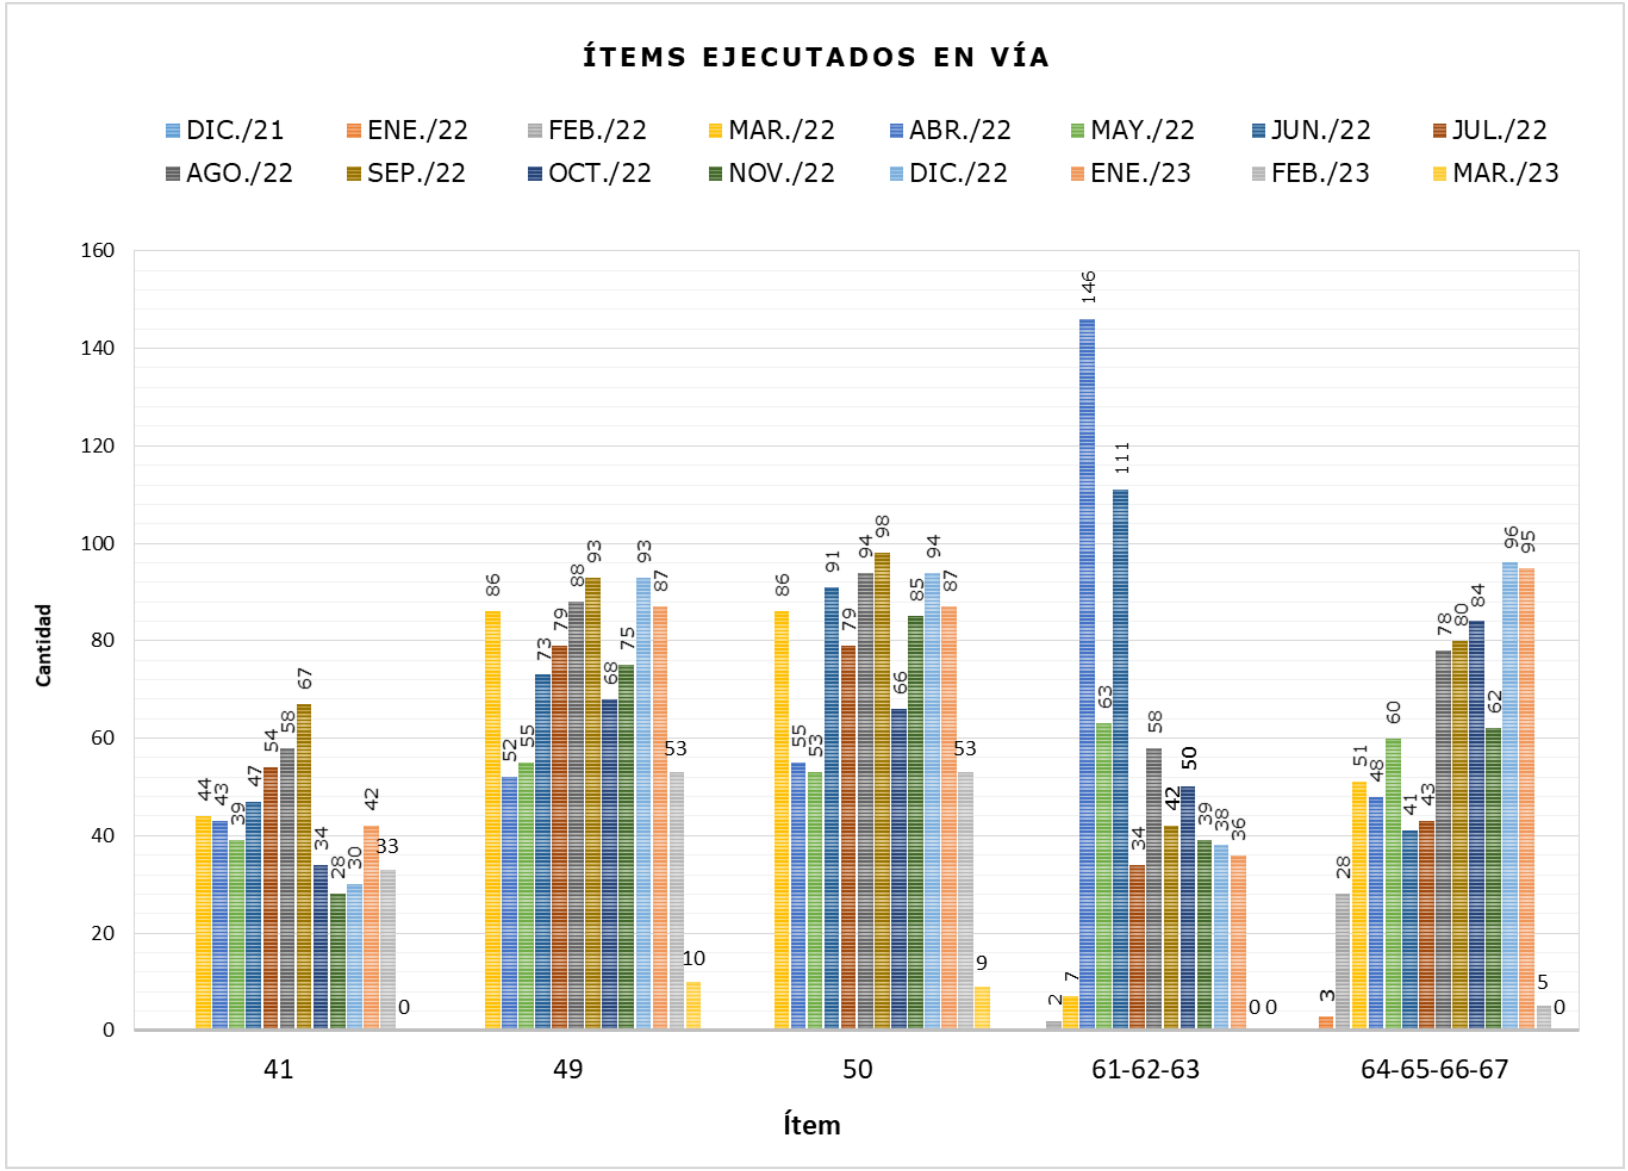

Ítem	Descripción	Und.
41	Retiro de soldadura para tapas de cajas de paso	UN
49	Retiro de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o para postes de video detección	UN
50	Reinstalación y/o reubicación de Postes de semaforización T1, T1X, T2 y/o para postes de video detección	UN
61	Lavado de postes semafóricos T1 o T1X	UN
62	Lavado de postes semafóricos T2 (L=2.5 a 6.5 Metros - Tubería de Diámetro 4")	UN
63	Lavado de postes semafóricos T2 (L=8.5 Metros - Tubería Diámetro 8")	UN
64	Pintura en vía de postes del tipo T1	JGO
65	Pintura en vía de postes del tipo T1X	JGO
66	Pintura en vía de postes del tipo T2 (L=2.5 a 6.5 Metros - Tubería de Diámetro 4")	UN

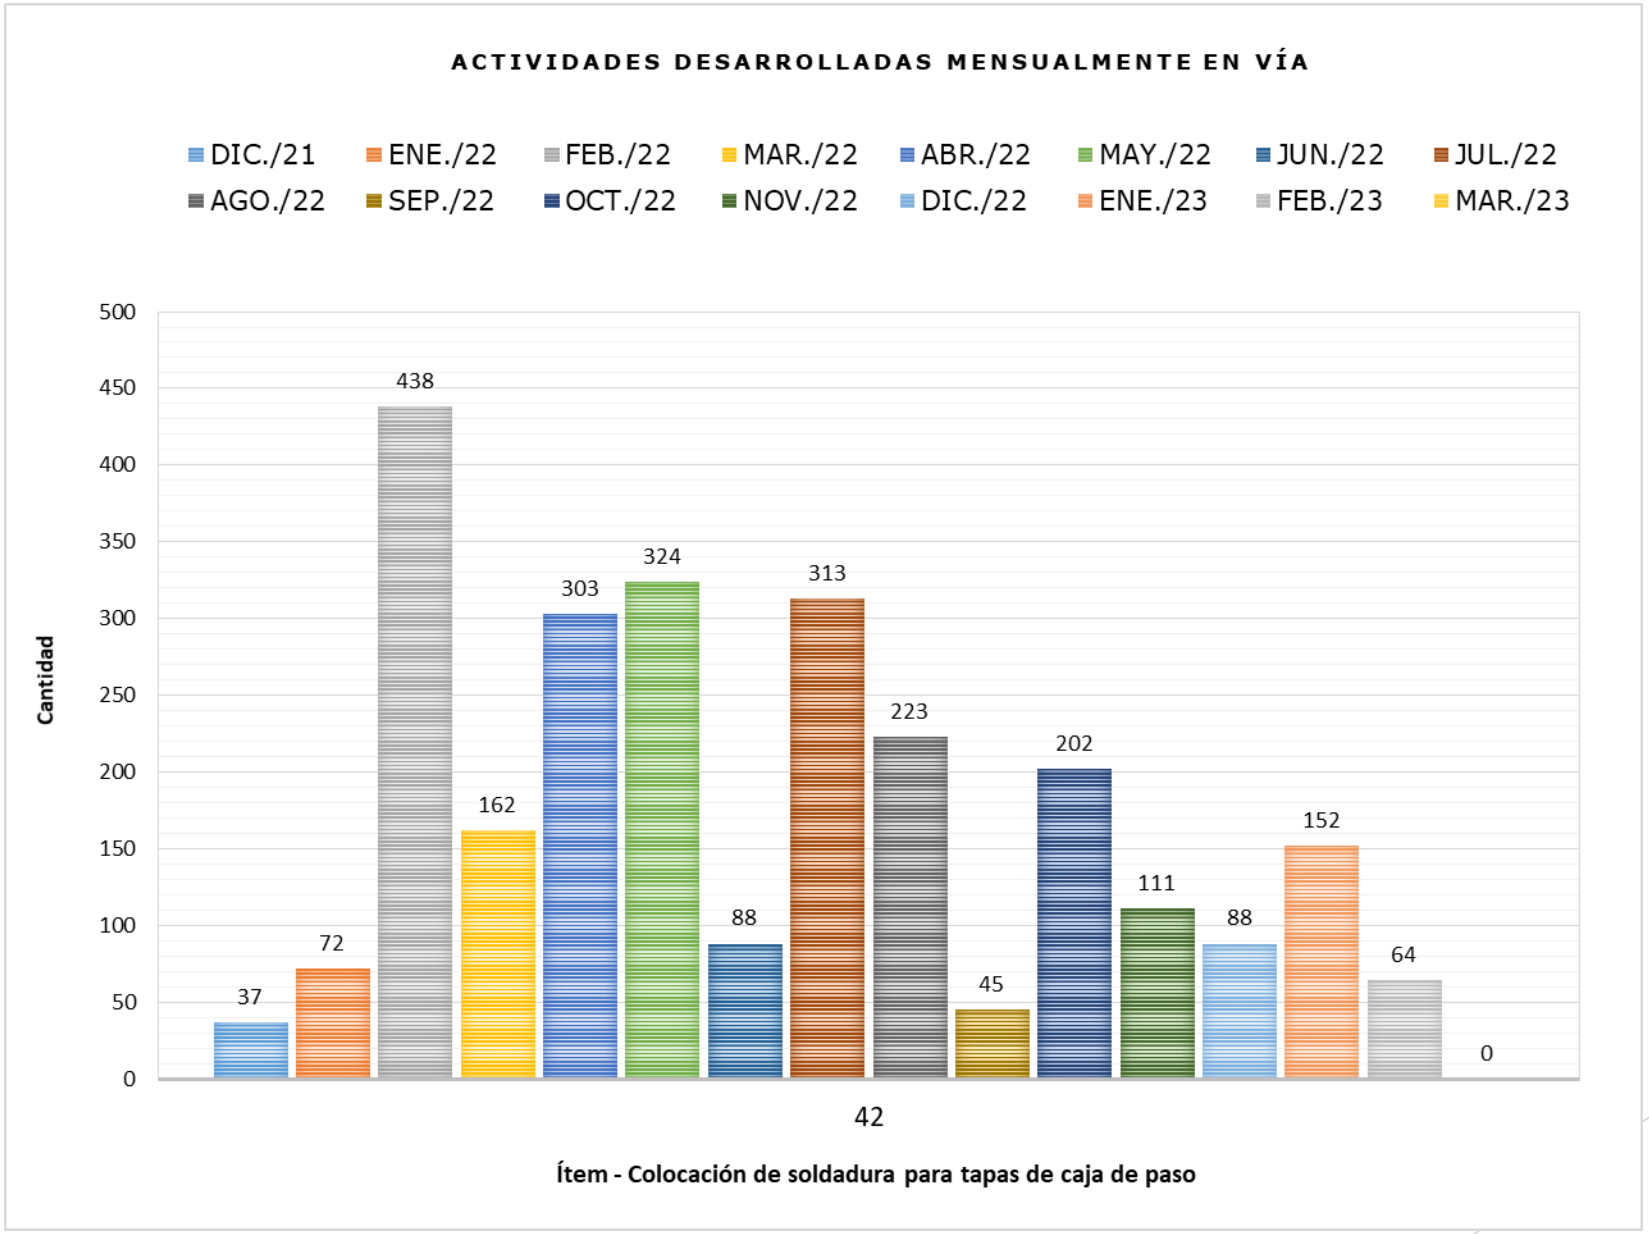
ACTIVIDADES DESARROLLADAS MENSUALMENTE EN VÍA
DIC./21
ENE./22
FEB./22
MAR./22
ABR./22
MAY./22
JUN./22
JUL./22
AGO./22
SEP./22
OCT./22
NOV./22
DIC./22
ENE./23
FEB./23
MAR./23
Cantidad
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
37
72
438
162
303
324
88
313
223
45
202
111
88
152
64
0
42
Ítem - Colocación de soldadura para tapas de caja de paso

Contrato 2023 – 1356

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Número de contrato	**2023-1356**
Clase de contrato	**Contrato de Obra Pública**
Objeto	**EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE BOGOTÁ D.C.**
Contratista	**TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERIA S.A.S**
Identificación	**NIT: 901.686.106-4**
Interventor	**CONSORCIO SEMAFORIZACIÒN ACO**
Valor Inicial del Contrato	**TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESO MONEDA CORRIENTE ($3.831.187.901)**
Fecha de suscripción del contrato	**27 de febrero de 2023**
Fecha de legalización	**3 de marzo de 2023**
Fecha de inicio del contrato	**9 de marzo de 2023**
Plazo inicial de ejecución	**11 Meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la SDM, la expedición del registro presupuestal y demás requisitos para la legalización del Contrato.**
Fecha de terminación inicial	**08 de febrero de 2024**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**194 06-enero-2023 RUBRO O23011604490000007578 por un valor de CUATRO MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.074.000.000)**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**No. 1309 del 28 de febrero de 2023 por un valor de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESO MONEDA CORRIENTE ($3.831.187.901)**
RUBRO:	**O23011604490000007578**
No. Pólizas	**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No. 21-40-10-1207010** **POLIZA DE CUMPLIMIENTO 21-44-101407367**
Fecha de aprobación de pólizas iniciales:	**3 de marzo de 2023**
Compañía Aseguradora	**SEGUROS DEL ESTADO S.A., Nit 860.009.578-6**
Proceso de selección Nº	**SDM-LP-170-2022**
Acta de adjudicación	**Resolución No. 88260 del 22 de febrero de 2023**

Estado del Contrato

1. El contrato inició el 09 de marzo de 2023, una vez el contratista cumplió la totalidad de requisitos legales y contractuales para este fin., firmado por once (11) meses. A la fecha no se han presentado cuentas de cobro.

2. Avance del contrato:

- Ejecución presupuestal: 0 %
- Cumplimiento en tiempo: 6,67 % con 22 días transcurridos, desde la firma del acta de inicio.

3. Con corte al día 25 de marzo de 2023, se han ejecutado las siguientes actividades:

- Instalación de postes: 17
- Instalación de tapas: 9
- Colocación de soldaduras: 20


Aprobaciones requerimientos iniciales

Tema	Oficio	Fecha de envío	Oficio de aprobación	Fecha de aprobación
Personal	TPD1356-003-23	10/03/2023	CSA-P1644-474	14/03/2023
Vehículos	TPD1356-004-23	10/03/2023	CSA-P1644-475	13/03/2023
Elementos de identificación	TPD1356-006-23	14/03/2023	En revisión interventoría	
Subsanación doc izaje grúa	TPD1356-008-23	14/03/2023	CSA-P1644-479	15/03/2023
Pólizas ajustadas acta de inicio	TPD1356-009-23	14/03/2023	CSA-P1644-499 observac.	23/03/2023
Respuesta solic ajuste de pólizas	TPD1356-027-23	23/03/2023	CSA-P1644-503	27/03/2023
PMT enviado a interventoría	Correo electrónico	14/03/2023	Correo electrónico, aprobación.	15/03/2023
PMT radicación SDM	TPD1356-011-23	16/03/2023	En revisión SDM	
Solicitud aval hojas de vida 2	TPD1356-013-23	21/03/2023	CSA-P1644-493	22/03/2023
Bodega	TPD1356-015-23	22/03/2023	CSA-P1644-487	22/03/2023
Plan de calidad	TPD1356-016-23	22/03/2023	Rta por correo elctrónico observac.	23/03/2023
Equipos y herramientas	TPD1356-017-23	22/03/2023	CSA-P1644-507	28/03/2023
Elementos de protección personal	TPD1356-018-23	22/03/2023	CSA-P1644-517	29/03/2023
Equipos de comunicación	TPD1356-019-23	22/03/2023	CSA-P1644-502	24/03/2023
Presentación APU y AIU	TPD1356-022-23	23/03/2023	-	-
Equipos de computo	TPD1356-023-23	23/03/2023	CSA-P1644-508	28/03/2023
Plan de calidad Versión 1	TPD1356-029-23	27/03/2023	CSA-P1644-518	29/03/2023

Área Tránsito

ESTADO PMTS GENERALES

PMTS GENERALES – MARZO 2023									
CONTRATISTA	CONTRATO	PMT GENERAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA	APROBACIÓN SDM	ESTADO	AVANCE PLAZO	RESTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
YUNEX TRAFFIC	2021-2517	PMT ELECTRICOS Y EQUIPOS	NA	NA	Terminado	100%	0%	21/09/2022	3/03/2023
TPD INGENIERIA	2021-2433	PMT POSTES	NA	NA	Terminado	100%	0%	2/09/2022	3/03/2023
CONSORCIO WILLIAMS	2021-2516	PMT OBRAS CIVILES	NA	NA	Terminado	100%	0%	6/10/2022	2/03/2023
UT MANTENIMIENTO INTEGRAL 2023	2023-1355	PMT ELECTRICOS Y EQUIPOS	Aprobado	Aprobado	En ejecución	5%	95%	13/03/2023	22/02/2024
TPD INGENIERIA	2023-1356	PMT POSTES	Aprobado	Radicado sin respuesta aún	En tramite	0%	100%	NA	NA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023	2023-1354	PMT OBRAS CIVILES	Devuelto con observaciones comunicado CSA-PI644-510	Sin radicar	Pendiente por probación de Interventoría para continuar gestión de radicación en SDM	0%	100%	NA	NA

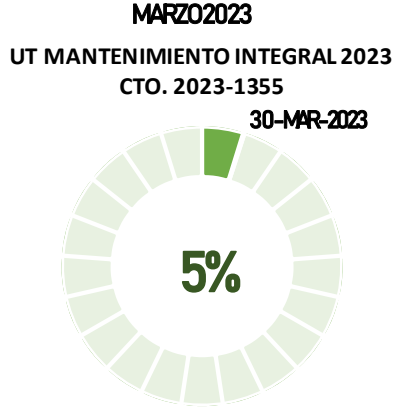

Reportados a la GUPT **589** Intersecciones semaforizadas con aplicación de PMT típicos por mantenimiento preventivo en marzo de 2023.

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Área SST

CONTRATO 2021-2516 CONSORCIO WILLIAMS SKG

- Consorcio Williams SKG no realiza entrega de informe de marzo de SSTMA.
- El día 02 de marzo se realizo visita a 3 frentes de trabajo evidenciando personal en terminación de actividades por el contratista.
- El día 07 de marzo se realizo reunión con la supervisión y con el contratista en la cual se llegaron acuerdos para la entrega de información de la parte ambiental del contrato e informe de cumplimiento de porcentaje de aprovechamiento, se radica en el transcurso del mes los soportes RCD de los meses de febrero y marzo.

CONTRATO 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN 2023

- El día 14 marzo según en mesa de trabajo con el contratista en uno de los compromisos se acordó realizar la entrega del plan de manejo ambiental y plan de trabajo anual SST, los cuales se radicaron a interventoría pero no fueron aprobados, puesto que no cumplían según los anexos técnicos se realizan oficios con las observaciones encontradas.

Área Ambiental

- CONSORCIO WILLIAMS SKG.
- Acumulado de aprovechamiento contrato 2021-2516.

CONSOLIDADO RCD - PIN 20942 CONTRATO 2021-2516 CONSORCIO WILLIAMS-SKG							
MES	**% APROV. EN EL MES**	**MATERIAL APROV.**	**MATERIAL USADO EN OBRA EN EL MES M3**	**GESTOR**	**RCD DISPUESTO (VALES DE DISPOSICIÓN) M3**	**RDC POR CERTIFICAR M3**	**RCD REAL CERTIFICADO M3**
ENERO	18%	73	402,5	CEMEX	98		98
				MAQ AMARILLAS	35		35
				TOTAL ENERO 23	133	0	133
FEBRERO	22%	125	572,9	CEMEX	224	0	224
				TOTAL FEBRERO	224	0	224
MARZO	0%	0	2,7	CEMEX	14		14
				TOTAL MARZO	14		14
ACUMULADO	18%	693,23	3804		2183	0	2172

Área SST Yunex Traffic 2021

- Durante las inspecciones de interventoría realizados al contratista Yunex Traffic 2021 durante este mes se evidenció que los trabajadores utilizan sus elementos de protección personal de forma adecuada y realizan el desarrollo de actividades de manera segura. Mantienen los elementos de bioseguridad como medida de prevención del COVID-19 así como su uso. (toallas, jabón, alcohol y gel antibacterial)
- Se verifican los elementos de atención de emergencias como extintor y botiquín, con fechas de recarga y vencimiento de insumos.
- Se verifica el cumplimiento de normas de seguridad como el diligenciamiento de charla pre operacional y diligenciamiento de ATS y permisos de trabajo, adicionalmente se verifican los documentos del vehículo.
- Se verifica el cumplimiento de afiliaciones o pagos de seguridad social, sus respectivos exámenes médicos ocupacionales e inducciones del personal nuevo de Yunex Traffic 2021. y toda la documentación que soporta el cumplimiento del plan de trabajo mensual en SST.
- A la fecha de corte del presente informe no se han presentado accidentes laborales del personal de Interventoría y Contratista.

Área SST - TPD

- Se verifica el cumplimiento de afiliaciones o pagos de seguridad social del personal ingresado en el mes, sin novedad, así como los respectivos exámenes médicos ocupacionales e inducciones del personal nuevo de TPD Ingeniería S.A.S

- Durante las inspecciones de interventoría realizados para los contratistas TPD Ingeniería S.A.S se observó que los trabajadores utilizan sus elementos de protección personal, realizan el desarrollo de actividades de manera segura, se encuentran en buen estado y vigentes los extintores, los botiquines se encuentran completos y elementos que lo componen se encuentran vigentes, de igual manera se llevan los registros pertinentes para el desarrollo de las actividades como son charlas, plan de izaje, ATS, permiso de trabajo en alturas.

- Se evidencia gestión de ejecución y cumplimiento, de actividades planificadas para el mes del presente informe del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de los contratistas TPD Ingeniería S.A.S., seguimiento y ejecución al plan de trabajo anual evidenciando realización de las diferentes actividades de capacitación, registros de inspección, registro de entrega de epp, COPASST, vehículos, certificados de alturas (cursos y elementos).

- No se reportan accidentes de trabajo

Área Calidad

- YUNEX TRAFFIC Cto 2021-2517
- TPD INGENIERIA Cto 2021-2433
- WILLIAMAS SKG Cto 2021-2516

GESTION DOCUMENTAL DE ENTREGA DE ARCHIVO

Martes 21/03/2023 – Reunión revisión y aceptación de forma de entrega información documentada **por parte de área de archivo de la SDM**

Lunes 27/03/2023 – Reunión revisión y aceptación de información documentada **por parte de la supervisión del contrato.**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE MOVILIDAD	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	RÓTULO DE CARPETA	
	PA01-PR05-MD01	Versión 1.0
FONDO	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	
	CÓDIGO	NOMBRE
SECCIÓN	500	SUBSECRETARIA DE GESTION JURIDICA
SUBSECCIÓN	530	DIRECCIÓN DE CONTRTACIÓN
SERIE		CONTRATOS



Área Calidad

- WILLIAMAS SKG Cto 2021-2516
- **Gestión de pendientes**

Se da alcance al acta de reunión No 14 del 23 de febrero de 2023 mediante oficio CSA-P1644-498 con radicado 2023612012472 72

- **Certificados de calidad**

Certificado de calidad actualizado de Transconcreto – **No entregado**

- **Bitácoras de obras**

Archivo de control y bitácoras de obra del contrato con compromiso de entrega el 13 de marzo. – **No entregado**

- **Cierre de incumplimientos PMT**

Quedan pendientes nueve (9) incumplimientos

No.	REGISTRO SDM	FECHA OFICIO	FRENTE DE OBRA CON INCUMPLIMIENTOS	FECHA INCUMPLIMIENTO	OFICIO CONTRATISTA	FECHA CAPACITACIÒN	FECHA CIERRE (Evidencia capacitación y acciones cierre no conformidad)	Radicado a SDM por parte del contratista
16	SPMT 2023312001525 71 Radicado SDQS-100712023	13/01/2023	Calle 68 Carrera 69 Localidad: Engativá Respuesta SDQS-100712023 en alcance al radicado SDM 20231850016472 Derecho petición Inet Leonor Cano P718 - KR 69 X CL 68	06/01/2023	CEXTCWS-238 09/02/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120053 7602 el 09/02/2023
17	SPMT 2023312001885 01	16/01/2023	Carrera 60 con Calle 4D Radicado SDM 202261203548762	11/01/2023	CEXTCWS-231 30/01/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120035 8782 el 30/01/2023
18	SPMT 2023312002318 81	18/01/2023	Carrera 45A con Calle 134D Localidad: Suba	12/01/2023	CEXTCWS-233	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120035 9382 el 30/01/2023
19	SPMT 2023312003995 41	25/01/2023	Carrera 12D con Calle 28C Sur Localidad: Rafael Uribe uribe	17/01/2022	CEXTCWS-255 02/03/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120094 6862 el 06/03/2023
20	SPMT 2023312004123 51	26/01/2023	Carrera 72 con Calle 63 A Sur Localidad: Ciudad Bolivar	23/01/2023	CEXTCWS-264 02/03/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120095 1502 el 06/03/2023
21	SPMT 2023312000039 93 Radicado SDQS No. 4565402022	10/01/2023	Calle 28C sur con Carrera 12D incumplimiento SPMT-202231210422181 "Barrio Gustavo Restrepo - semáforos zona Calle 28 sur, 28C sur Con 12 D, 12 K ROSA MARIA TALERO FRANCO"	15/12/2022	CEXTCWS-230 30/01/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120035 8682 el 30/01/2023
22	SPMT 2023312013821 81	13/02/2023	Carrera 12D CON Calle 28C Sur	03/02/2023	CEXTCWS-256 02/03/2023	En espera de Formato Lecciones aprendidas		20236120095 1222 el 06/03/2023
23	SPMT 2023312014311 91	16/02/2023	Calle 68 Carrera 69 Localidad: Engativá	10/02/2023	Falta emitir oficio	En espera de Formato Lecciones aprendidas		No hay radicado a la fecha
24	SPMT 2023312015572 31	21/02/2023	Carrera 3 Calle 30A Sur Localidad: San Cristóbal	15/02/2023	Falta emitir oficio	En espera de Formato Lecciones aprendidas		No hay radicado a la fecha

Área Calidad

- WILLIAMAS SKG Cto 2021-2516
- **Gestión de pendientes**

Se da alcance al acta de reunión No 14 del 23 de febrero de 2023 mediante oficio **CSA-P1644-498** con radicado 20236120124727 2

- **Resultados de ensayos de cilindros y densidades**

De 22 ensayos pendientes, se aceptan cinco (5), no entregados seis (6) y once (11) con faltantes.

Fechas de entrega de ensayos:

09/03/2023

No.	Ubicación	Ensayo	observaciones Acta No 14 del 23/02/2023	Resumen revisión 22/03/2023	Entrega
1	P183 KR 100 X CL 19	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Pendientes las 4 esquinas de la intersección	Falta resultados a 28 días de las 4 esquinas del 25 de febrero	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Pendientes las 4 esquinas de la intersección	Aceptado	09/03/2023
2	P1310 TV 27 X CL 57	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Falta ensayos NE, SE y SW Falta resultado a 14 y 28 días de la esquina NW	Falta ensayos NE, SE y SW Falta resultado a 14 y 28 días de la esquina NW	No entregado
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Falta NE y SW	Falta NE y SW	No entregado
3	P896 KR 72 X CL 63A SUR	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan ensayos de cilindros de toda la intersección	Aceptado	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Subsanado, entregado el 21 de febrero	Falta muestras de costado sur	No entregado
4	P1266 - KR 69D X AC 24	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	faltan corregir localización de andenes costado norte y separador central 3 primeras filas y las 3 segundas filas	Aceptado	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Subsanado, entregado el 21 de febrero. Completo	Aceptado	21/02/2023
5	P395 KR 3 X CL 30 A SUR	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan todos los ensayos	Revisar fecha de ensayos	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Faltan todos los ensayos	Nota: Ubicación errónea SW y NW de los ensayos del 25 de febrero y 1 de marzo	09/03/2023
6	P1226 kr 12D X CL 28 C SUR	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan todos los ensayos	Falta Esquina SW, SE y un separador	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Faltan los siguientes puntos Glorieta y separador KR 12D	Faltan los siguientes puntos Glorieta y separador KR 12D	No entregado
7	P718 KR 69 X CL 68	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan todos los ensayos	Pendiente resultado a 28 días de las tomas 11 y 17 de febrero y corregir SE a SW	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Subsanado, entregado el 21 de febrero. Pendiente corrección de la dirección del ensayo de 17 febrero de 2023	Aceptado	09/03/2023
8	P1262 KR 95G X CL 86	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Falta ensayos esquina NW y anden costado SUR. Pendiente corrección dirección ensayos de cilindros NE y resultados a 28 días esquina NE	Queda pendiente corrección dirección y ensayos NE a 28 días	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Subsanado, entregado el 21 de febrero	Aceptado	21/02/2023
9	P692 KR 60 x CL 4 D	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Falta ensayo de cilindros de esquina SE y SW. Pendiente resultados a 14 y 28 días de las esquinas NE y NW	Pendiente resultados a 14 y 28 días de las esquinas NE y NW	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Falta corrección de los puntos del ensayo del 20 enero de 2023 esquina NE, los cuales están en SW	Falta corrección de los puntos del ensayo del 20 enero de 2023 esquina NE, los cuales están en SW	No entregado
10	P207 KR 99 X CL 20	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan todos los ensayos	Falta ensayos a 28 días de las muestras del 11 y el 18	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Pendiente ensayos esquina SE y SW	Queda pendiente ensayos del 11 febrero corregir punto NW a SE	09/03/2023
11	P752 KR 45A X CL 134 D	Resistencia a la compresión de cilindros de concreto	Faltan todos los ensayos	Quedan pendiente 14 y 28 días todas las esquinas	09/03/2023
		Densidad y peso unitario del suelo en terreno	Faltan todos los ensayos	Faltan todos los ensayos	No entregado

Área Calidad

- Cto 2023-1355 UNION TEMPRAL MANTENIMIENTO INTEGRAL
- Cto 2023-1356 TPD INGENIERIA SAS
- Cto 2023-1354 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023

- **Jueves 16 de MARZO** se realiza reunión para establecer cronograma para la **ejecución del factor de calidad**

Contrato de obra	Contratista	Plan de calidad versión preliminar	observaciones	plan de calidad versión 1	aprobación Plan de calidad
2023-1354	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	24/03/2023	28/03/2023		
2023-1356	TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERA SAS	22/03/2023	23/023/2023	27/03/2023	29/03/2023 CSA-P1644-518
2023-1355	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL	23/03/2023	23/03/2023	23/03/2023	En revisión

- **Miércoles 15 de MARZO** se realiza confirmación de imagen institucional por parte de la SDM
- **Lunes 27 de MARZO** se realiza reunión para **revisión y aprobación** de dotación de contratistas

Contrato de obra	Contratista	Envió de artes propuesta contratista	Observaciones y aprobación artes	Envío de muestras físicas	Aprobación
2023-1354	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023	14/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
2023-1356	TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO INGENIERA SAS	14/03/2023	17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
2023-1355	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL	27/03/2023	27/03/2023	29/03/2023	

Área Calidad

Elemento	Observaciones Interventoría	Comentarios SDM	Aprobado / No Aprobado
CHAQUETA			
CHALECOS	1.		
























Interventoría financiera y contable

Informes Financieros Contrato 2021-2517 / Contratista CONSORCIO YUNEXTRAFFIC 2021

ACTA	PERÍODO	VALOR DEL CORTE	VALOR RETEGARANTÍA	VALOR A PAGAR	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR PAGADO ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR	ESTADO DE LA CUENTA	No. DE DOCUMEN.CONTABLE	FECHA DE CONTABILIZ. EN LA SDM
Acta No. 1- Diciembre 2021	04/12/2021 al 31/12/2021	$ 1.174.199.102	$58.709.955	$ 1.115.489.147	$ 1.174.199.102	$ 1.115.489.147	$ 11.297.677.723	Pagada al contratista	3000179113	14-Mar-22
Acta No. 2 - Enero 2022	01/01/2022 al 31/01/2022	$ 1.313.577.799	$65.678.890	$ 1.247.898.909	$ 2.487.776.901	$ 2.363.388.056	$ 9.984.099.924	Pagada al contratista	3000201872	23-Mar-22
Acta No. 3 - Febrero 2022	01/02/2022 al 28/02/2022	$ 1.318.582.177	$65.929.109	$ 1.252.653.068	$ 3.806.359.078	$ 3.616.041.124	$ 8.665.517.747	Pagada al contratista	3000303777	2-May-22
Acta No. 4 - Marzo 2022	01/03/2022 al 31/03/2022	$ 1.310.879.243	$65.543.962	$ 1.245.335.281	$ 5.117.238.321	$ 4.861.376.405	$ 7.354.638.504	Pagada al contratista	3000387858	24-May-22
Acta No. 5 - Abril 2022	01/04/2022 al 30/04/2022	$ 1.313.528.921	$65.676.446	$1.247.852.475	$ 6.430.767.242	$ 6.109.228.880	$ 6.041.109.583	Pagada al contratista	3000467748	21-Jun-22
Acta No. 6 - May 2022	01/05/2022 al 31/05/2022	$ 1.312.534.341	$65.626.717	$ 1.246.907.624	$ 7.743.301.583	$7.356.136.504	$ 4.728.575.242	Pagada al contratista	3000547719	19-Jul-22
Acta No. 7 - Jun 2022	01/06/2022 al 30/06/2022	$ 1.306.380.149	$65.319.007	$ 1.241.061.142	$ 9.049.681.732	$ 8.597.197.646	$3.422.195.093	Pagada al contratista	3000662352	19-Aug-22
Acta No. 8 - Jul 2022	01/07/2022 al 31/07/2022	$ 1.308.049.903	$65.402.495	$ 1.242.647.408	$ 10.357.731.635	$ 9.839.845.054	$ 2.114.145.190	Pagada al contratista	3000743712	14-Sep-22
Acta No. 9 - Ago 2022	01/08/2022 al 31/08/2022	$ 1.305.614.046	$65.280.702	$ 1.240.333.344	$ 11.663.345.681	$ 11.080.178.398	$ 7.672.328.561	Pagada al contratista	3000842376	19-Oct-22
Acta No. 10 - Sep 2022	01/09/2022 al 30/09/2022	$ 1.229.245.127	$61.462.256	$ 1.167.782.871	$12.892.590.808	$ 12.247.961.269	$ 6.443.083.434	Pagada al contratista	3000922684	11-Nov-22
Acta No. 11 - Oct 2022	01/10/2022 al 31/10/2022	$1.224.698.589	$ 61.234.929	$1.163.463.660	$ 14.117.289.397	$ 13.411.424.929	$ 5.218.384.845	Pagada al contratista	3001030177	15-Dic-22
	VALOR DESCONTADO EN OCTUBRE (ACTA 11) POR CONCEPTO DE BIOSEGURIDAD PAGADA EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022**	($3.178.159)	(158.908)	($3.019.251)	$ 14.114.111.238	$ 13.408.405.678	$5.221.563.004		3001026647	14-Dic-22
Acta No. 12 – Nov 2022	01/11/2022 al 30/11/2022	$1.222.505.762	$ 61.125.288	$1.161.380.474	$ 15.336.617.000	$ 14.569.786.152	$ 3.999.057.242	Pagada al contratista	3001053063	21-Dic-22
Acta No. 13 – Dic 2022	01/12/2022 al 31/12/2022	$1.217.003.843	$ 60.850.192	$1.156.153.651	$ 16.553.620.843	$ 15.725.939.803	$ 2.782.053.399	Pagada al contratista	3000054409	08-Feb-23
Acta No. 14 – Ene 2023	01/01/2023 al 31/01/2023	$1.374.815.991	$ 68.740.800	$1.306.075.191	$ 17.928.436.834	-	$ 1.407.237.408	Pago pendiente	-	-
Acta No. 15 - Feb 2023	01/02/2023 al 28/02/2023	$ 1.274.763.779	$ 63.738.189	$ 1.211.025.590	$ 19.203.200.613	-	$ 132.473.629	Pago pendiente	-	-
Acta No. 16 - Mar 2023	01/02/2023 al 03/03/2023	$126.255.915	$ 6.312.796	$119.943.119	$ 19.329.456.528	-	$6.217.714	Cuenta no radicada	-	-
TOTALES		$19.329.456.528	$966.472.825	$18.362.983.703						

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 12.471.876.825
B	Valor adición No. 1 al contrato	$ 6.863.797.417
C	Valor total del contrato	$ 19.335.674.242
D	Valor pagado al contratista	$ 15.725.939.803
E	Valor pendiente por pagar al contratista	$3.603.516.725
F	Retención final por garantía (5 % en corte mensual)	$966.472.825
G	Valor total ejecutado por el contratista (D + E + F)	$19.329.456.528
F	Saldo a favor de la entidad (C – G)	$6.217.714

Ardanuy OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S CAYCO S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Informes Financieros CONTRATO 2021-2433 / Contratista TPD INGENIERÍA

Acta	Periodo	Valor total corte	Valor retención garantías	Valor pagado	Valor pagado acumulado	Saldo por ejecutar	Estado de la cuenta	No. Referencia de pago	Fecha Cont.CxP en la Entidad
Acta No.1 Diciembre 2021	09/12/2021 31/12/2021	$ 107.793.310	$ 5.389.665	$ 102.403.645	$ 102.403.645	$ 3.822.758.093	Pagada al contratista	2676	21/02/2022
Acta No.2 Enero 2022	01/01/2022 31/01/2022	$ 249.258.930	$ 12.462.947	$ 236.795.983	$ 339.199.628	$ 3.573.499.163	Pagada al contratista	2675	21/02/2022
Acta No.3 Febrero 2022	01/02/2022 28/02/2022	$ 286.642.114	$ 14.332.106	$ 272.310.008	$ 611.509.636	$ 3.286.857.049	Pagada al contratista	5396	1/04/2022
Acta No.4 Marzo 2022	01/03/2022 31/03/2022	$ 391.523.824	$ 19.576.191	$ 371.947.633	$ 983.457.269	$ 2.895.333.225	Pagada al contratista	7798	22/04/2022
Acta No.5 Abril 2022	01/04/2022 30/04/2022	$ 403.143.886	$ 20.157.194	$ 382.986.692	$ 1.366.443.961	$ 2.492.189.339	Pagada al contratista	9976	17/05/2022
Acta No.6 Mayo 2022	01/05/2022 31/05/2022	$ 414.940.281	$ 20.747.014	$ 394.193.267	$ 1.760.637.228	$ 2.077.249.058	Pagada al contratista	12113	16/06/2007
Acta No.7 Junio 2022	01/06/2022 30/06/2022	$ 415.148.026	$ 20.757.401	$ 394.390.625	$ 2.155.027.853	$ 1.662.101.032	Pagada al contratista	14254	26/07/2022
Acta No.8 Julio 2022	01/07/2022 31/07/2022	$ 415.148.026	$ 20.757.401	$ 394.390.625	$ 2.549.418.478	$ 1.246.953.006	Pagada al contratista	14254	25/07/2022
Acta No.9 Agosto 2022	01/08/2022 31/08/2023	$ 394.544.392	$ 19.727.220	$ 374.817.172	$ 2.941.049.937	$ 1.834.733.855	Pagada al contratista	16646	19/08/2022
Acta No.10 Septiembre 2022	01/09/2022 30/09/2022	$ 494.296.082	$ 24.714.804	$ 469.581.278	$ 3.410.631.215	$ 1.340.437.773	Pagada al contratista	20399	12/10/2022
Acta No.11 Octubre 2022	01/10/2022 31/10/2022	$ 305.033.060	$ 15.251.653	$ 289.781.407	$ 3.700.412.622	$ 1.035.404.713	Pagada al contratista	21491	21/10/2022
Acta No.12 Noviembre 2022	01/11/2022 30/11/2022	$ 321.200.517	$ 16.060.026	$ 304.242.110	$ 4.004.654.732	$ 714.204.196	Pagada al contratista	281131 28113	23/12/2022
	VALOR A DESCONTAR EN NOVIEMBRE (ACTA 12) POR CONCEPTO DE BIOSEGURIDAD PAGADA EN LOS PERÍODOS DE JULIO A OCTUBRE 2022[1]	$ 945.664	$ 47.283	$ 898.381	-	$ 715.102.577			
Acta No.13 Diciembre 2022	01/12/2022 30/12/2022	$ 314.711.667	$ 15.735.583	$ 298.976.084	$ 4.303.630.816	$ 400.390.910	Pagada al contratista	2103	17/02/2023
Acta No.14 Enero 2023	01/01/2023 30/01/2023	$ 224.732.785	$ 11.236.639	$ 213.496.146	$ 4.517.126.962	$ 175.658.125	Pagada al contratista	2104	20/02/2023
Acta No.15 Febrero 2023	01/02/2023 30/02/2023	$ 163.235.016	$ 8.161.751	$ 155.073.265	$ 4.672.200.227	$ 12.423.109	Pago pendiente	-	-
Acta No.16 Marzo 2023	01/03/2023 30/03/2023	$ 12.421.239	$ 621.062	$ 11.800.177	$ 4.684.000.404	$ 1.870	Pago pendiente	-	-
Total	**Total**	**$ 4.930.574.024**	**$ 246.573.620**	**$ 4.684.000.404**	-				

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 3.930.551.403
B	Valor adición No. 1 al contrato	$ 1.000.024.491
C	Valor total del contrato	$ 4.930.575.894
D	Valor pagado al contratista	$ 4.517.126.962
E	Valor pendiente por pagar al contratista	$ 166.873.442
F	Retención final por garantía (5 % en corte mensual)	$ 246.573.620
G	Valor total ejecutado por el contratista (D + E + F)	$ 4.930.574.024
F	Saldo a favor de la entidad (C – G)	$ 1.870

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Informes Financieros CONTRATO 2021 – 2516 / Contratista CONSORCIO WILLIAMS-SKG

Acta No.	Periodo	Valor total corte	Valor retención en garantía (5%)	Valor a pagar	Saldo del contrato	Estado de la cuenta	Documento contable No.	Fecha Cont.CxP en la Entidad
1 Del 07/04/2022	01/02/2022 28/02/2022	$ 178.009.720	$ 8.900.486	$ 169.109.234	$ 7.756.512.695	Pagada al Contratista	3000290523	22/04/2022
2 Del 07/04/2022	01/03/2022 31/03/2022	$ 230.964.735	$ 11.548.237	$ 219.416.498	$ 7.525.547.960	Pagada al Contratista	3000290524	22/04/2022
3 Del 07/06/2022	01/04/2022 30/04/2022	$ 338.722.977	$ 16.936.149	$ 321.786.828	$ 7.186.824.983	Pagada al Contratista	3000461260	16/06/2022
4 Del 07/06/2022	01/05/2022 31/05/2022	$ 467.052.286	$ 23.352.614	$ 443.699.672	$ 6.719.772.697	Pagada al Contratista	3000461261	16/06/2022
5 Del 07/07/2022	01/06/2022 30/06/2022	$ 482.643.408	$ 24.132.170	$ 458.511.238	$ 6.237.129.289	Pagada al Contratista	3000547724	19/07/2022
6 Del 08/08/2022	01/07/2022 31/07/2022	$ 856.866.364	$ 42.843.318	$ 814.023.046	$ 5.380.262.925	Pagada al Contratista	3000673184	24/08/2022
7 Del 08/09/2022	01/08/2022 31/08/2022	$ 706.842.472	$ 35.342.124	$ 671.500.348	$ 4.673.420.453	Pagada al Contratista	3000828658	12/10/2022
8 Del 07/10/2022	01/09/2022 30/09/2022	$ 473.830.862	$ 23.691.543	$ 450.139.319	$ 4.199.589.591	Pagada al Contratista	3000856113	21/10/2022
9 Del 10/11/2022	01/10/2022 31/10/2023	$ 383.574.642	$ 19.178.732	$ 364.395.910	$ 3.816.014.949	Pagada al Contratista	3000950856	22/11/2022
10 Del 10/12/2022	01/11/2022 30/11/2022	$ 839.004.567	$ 41.950.228	$ 797.054.339	$ 2.977.010.382	Pagada al Contratista	3001070375	23/12/2022
11 Del 10/01/2023	01/12/2022 31/12/2022	$ 892.983.744	$ 44.649.187	$ 848.334.557	$ 2.084.026.638	Pagada al Contratista	3000092928	20/02/2023
12 Del 10/02/2023	01/01/2023 31/01/2023	$ 786.179.292	$ 39.308.965	$ 746.870.327	$ 1.297.847.346	Pagada al Contratista	3000110833	1/03/2023
13 Del 10/03/2023	01/02/2023 28/02/2023	$ 793.637.670	$ 39.681.884	$ 753.955.786	$ 504.209.676	Pagada al Contratista	3000164582	16/03/2023
Total	**Total**	**$ 7.430.312.739**	**$ 371.515.637**	**$ 7.058.797.102**				

*Nota: Este balance financiero se presenta con corte al 10 de marzo de 2023. Actualmente se está elaborando y cuantificando el corte de obra No. 14 correspondiente al mes de marzo de 2023, por lo cual los valores aquí señalados deberán ser actualizados posteriormente.

Ítem	Descripción	Valor
A	Valor inicial del contrato	$ 5.301.947.080
B	Total adiciones del contrato	$ 2.632.575.335
C	Valor total del contrato	$ 7.934.522.415
D	Valor pagado al Contratista	$ 7.058.797.102
E	Retención en garantía acumulada (5 % en corte mensual)	$ 371.515.637
G	Valor total ejecutado por el Contratista al 28 de febrero de 2023	$ 7.430.312.739
H	Valor aproximado corte No 14 regrantía incluida	$ 407.000.000
i	Saldo a favor de la entidad	$ 97.209.676

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Contrato Nº 2019-1874 / Liquidación

Clasificación de documento:	-
Descripción	ACTA DE LIQUIDACIÓN FECHADA Y FIRMADA.pdf
Nombre	ACTA DE LIQUIDACIÓN FECHADA Y FIRMADA.pdf
Tamaño	1866768
Estado	No encriptado
Creado por	MARIA FERNANDA BOTIA BOTIA
Fecha de creación	5 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 15:27:55(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Interventoría jurídica

Interventoría jurídica

Fecha	Enviado A	Numero de Oficio	CONT.	Asunto del Oficio	Radicado Movilidad
2023-03-06	**Secretaria Distrital de Movilidad** Atn. Yasmin Andrea Gomez Castro Directora de contratación	CSA-P1644-469	2019-1874	Remisión acta de liquidación del contrato de obra publica No. 2019-1874 AC2R	202361200976222
2023-03-09	**TPD INGENIERÍA** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-470	2023-1356	Entrega acta de inicio contrato 2021 - 1356 para firma del contratista.	202361201053152
2023-03-09	**TPD INGENIERÍA** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-471	2023-1356	Solicitud requerimientos contractuales.	202361201053152
2023-03-09	**Secretaria Distrital de Movilidad** Atn. Yasmin Andrea Gomez Castro Directora de contratación	CSA-P1644-472	2023-1355	Remisión acta de inicio contrato 2023-1355 del contratista UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO INTEGRAL	202361201073342
2023-03-10	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACION 2023. Atn. Ing. ALFREDO ARDILA ARIZA Representante Legale	CSA-P1644-473	2013-1354	Solicitud requerimientos contractuales	202361201134422
2023-03-14	**TPD INGENIERÍA** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-474	2023-1356	Respuesta comunicado TPD1356-003, envío hojas de vida equipo de trabajo.	202361201149152
2023-03-14	**Secretaria Distrital de Movilidad** Atn. Yasmin Andrea Gomez Castro Directora de contratación	CSA-P1644-476	2023-1354	Remisión acta de inicio contrato 2023-1354 del contratista CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN	202361201138752
2023-03-14	**Secretaria Distrital de Movilidad** Atn. Yasmin Andrea Gomez Castro Directora de contratación	CSA-P1644-477	2023-1356	Remisión acta de inicio contrato 2023-1356 del contratista TPD INGENIERÍA SAS	202361201138682
2023-03-15	**Yunex Traffic** Atn. Ing. WILLY GUNTHER HANISCH Ing. JUAN CAMILO BLANCO CRUZ Representantes Legales	CSA-P1644-483	2023-1355	ACTUALIZACIÓN POLIZAS CON FECHA DE ACTA DE INICIO	202361201176202
2023-03-15	Señores: Secretaria Distrital de Movilidad Subdirección de semaforización Atn. Nicolás Adolfo Correal Huertas Subsecretario ordenador de Gasto	CSA-P1644-484		Recomendación de cierre del trámite iniciado mediante Informe técnico de presunto incumplimiento del contrato 2021-2516 radicado mediante oficio CSA-P1644-445 del 09 de febrero de 2023	202361201152172
2023-03-23	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-499	2023-1354	Solicitud ajuste pólizas de seguro de cumplimiento No. 21-44-101407370. Contrato de obra No. 2023-1354	
2023-03-23	**TPD INGENIERÍA** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-500	2023-1356	Solicitud ajuste póliza de seguro de cumplimiento No. 21-44-101407367. Contrato de obra No. 2023-1356.	
2023-03-23	CONSORCIO WILLIAMS – SKG Atn. Ing. William Augusto Acosta López Representante Legal WILLIAMS-SKG	CSA-P1644-501	2021-2516	Solicitud atención pendientes Contrato 2021-2516	202361201247222
2023-03-27	**TPD INGENIERÍA** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-503		Aprobación pólizas de seguro de cumplimiento No. 21-44-101407367 y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101207010. Contrato de obra No. 2023-1356.	
2023-03-27	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SEMAFORIZACIÓN** Atn. Ing. Alfredo Ardila Ariza Representante legal	CSA-P1644-504	2023-1354	Aprobación pólizas de seguro de cumplimiento No. 21-44-101407370 y póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 21-40-101207009. Contrato de obra No. 2023-1354.	

Interventoría jurídica

- **Contrato 2023-1354**

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11386517	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.912.280.322,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	08/02/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.11238763	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.912.280.322,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	26/01/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Contrato 2023-1355

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11311919	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	971.348.994,00 COP	JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	22/02/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11312003	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	8.742.140.940,00 COP	JMANUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	22/02/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Contrato 2023-1355

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11386571	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.827.663.061,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	09/02/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.11217572	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	5.827.663.061,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	26/01/2029 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Ardanuy CAYCO S.A.S
OBRAS Y PROYECTOS RP S.A.S
CONSORCIO SEMAFORIZACIÓN ACO

Gracias.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

BOGOTÁ

GERENCIA EN VÍA
MOVILIDAD Y GESTIÓN
