UT ANDINO 066
NIT-901477981-6

UNION TEMPORAL ANDINO 066
NIT 901.477.981-6
CRA 15 90-64 OF 402

FACTURA PROFORMA

Señores: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT 800.215.807-2
Dirección: CLL 25G 73B-90
Teléfono: 377 0600
Ciudad: Bogotá
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Fecha factura proforma	Fecha de Vencimiento
14 - 03 - 2023	14 - 04 - 2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 19D CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CONTRATO 1009-2021	1	-$ 431.282
2	ADMINISTRACION 20%	1	-$ 86.256
3	IMPREVISTOS 5%	1	-$ 21.564
4	UTILIDAD 5%	1	-$ 21.564

Total Bruto	-$ 560.666
IVA 19%	-$ 4.097
Total a pagar	-$ 564.763

Valor en letras:

MENOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

Cindiciones de pago:

Pago a crédito - vence 14/04/2023

Observaciones:

Contrato 1009-2021:

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Conformación de la Unión Temporal:

CONYTRAC S.A. NIT 890.932.730-7: 24%

GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES SA EN REORGANIZACION NIT 860.034.551-3: 1%

CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS NIT 900.182.018-7: 24%

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS NIT 901.259.571-5: 1%

PROYECTOS Y VIAS SAS NIT 800.119.086-8: 25%

TECCIVIL SAS NIT 830.117.761-1: 1%

JMV INGENIEROS SAS NIT 800.095.951-9: 24%
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS # 263862344 BANCO DE OCCIDENTE A NOMBRE DE LA UNION TEMPORAL ANDINO 066

#$24-02-00;1009-2021;ieguis@invias.gov.co#$

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE CON (Ia)	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 14/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** **(P)** **ACTA FINAL:** **SI** X **NO**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 19 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** dic-22 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 19 **(D)**

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 1009 de 2021 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA- PUERTO BOLÍVAR-ESTRELLA-VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 1005 de 2021 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 275.853.856.477,00

PLAZO ACUMULADO: 110 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ 10.000.000.000,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 32.351.110.830

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 35.368.512.874

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8,000 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (FEB-2021)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado (DIC-2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (DIC-2022)	FACTOR DE AJUSTE	**FACTOR DE AJUSTE (*)**	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Preliminares y explanación	$0	$0,00	$0	101,141	103,211	108,894	1,02047	1,05440	$0	$0	$0	$0	$64.249.399
2 Afirmados, subbases y bases	$0	$0,00	$0	100,763	102,425	118,600	1,01650	1,15777	$0	$0	$0	$0	$672.134.264
3 Pavimentos asfálticos / concreto	$125.451.781	$10.036.143,00	$115.415.638	100,133	104,671	118,600	1,04532	1,13656	$131.137.256	$131.176.798	$146.898.416	$21.446.635	$1.837.623.378
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	$255.816.896	$20.465.352,00	$235.351.544	101,907	104,296	119,271	1,02344	1,08999	$261.813.244	$256.530.829	$282.992.529	$27.175.633	$386.868.728
5 Obras de urbanismo	$0	$0,00	$0	101,907	104,296	113,748	1,02344	1,07970	$0	$0	$0	$0	$0
6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$0	$0,00	$0	101,907	104,296	118,220	1,02344	1,08509	$0	$0	$0	$0	$0
7 Señalización y control de transito	$35.622.994	$2.849.840,00	$32.773.154	103,719	108,281	114,256	1,04399	1,11625	$37.190.050	$36.583.033	$40.999.929	$5.376.935	$27.539.071
8 Transporte y sobre acarreos	$0	$0,00	$0	100,393	100,890	105,743	1,00495	1,04810	$0	$0	$0	$0	$13.606.515
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	$13.582.041	$1.086.563,00	$12.495.478	101,650	105,203	134,480	1,03495	1,07632	$14.056.733	$13.449.133	$15.010.388	$1.428.347	$35.515.248
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	$541.415	$43.313,00	$498.102	101,650	105,203	119,271	1,03495	1,11686	$560.337	$556.310	$618.545	$77.130	$1.037.994
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	$233.368	$18.669,00	$214.699	100,900	102,261	106,298	1,01349	1,04829	$236.516	$225.067	$246.884	$13.516	$170.085
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	$2.377.246	$190.180,00	$2.187.066	101,590	102,556	107,840	1,00950	1,05399	$2.399.830	$2.305.146	$2.517.910	$140.664	$2.092.870
TOTALES	**$433.625.741**	**$34.690.060**	**$398.935.681**						**$ 447.393.966**	**$ 440.826.316**	**$ 489.284.601**	**$ 55.658.860**	**$ 3.040.837.552**

(*): Formula de correlación índices ICCP e ICOCIV

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales)

VALOR AJUSTE	$ 55.658.860	$ 3.040.837.552
VALOR IVA	$ 406.738	$ 22.221.505
VALOR TOTAL	$ 56.065.598	$ 3.063.059.057

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE ACTA 19P	$	56.219.526
VALOR IVA	$	410.835
*VALOR TOTAL AJUSTE ACTA 19P	$	56.630.361

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	-$	560.666
VALOR IVA	-$	4.097
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	-$	564.763

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: -$ 560.666

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: -$ 564.763 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: MENOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre: **ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL**
Representante Legal o Apoderado
Contratista: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191
Matrícula Profesional No.: 05202-00905 ANT

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

AJUSTES POR ICCP

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8,000 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (FEB-2021)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado (DIC-2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (DIC-2022)	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Preliminares y explanación	$0	$0,00	$0	101,141	103,211	103,211	1,02047	1,00000	$0	$0	$0	$0	
2 Afirmados, subbases y bases	$0	$0,00	$0	100,763	102,425	102,425	1,01650	1,00000	$0	$0	$0	$0	
3 Pavimentos asfálticos / concreto	$125.451.781	$10.036.142,00	$115.415.639	100,133	104,671	104,671	1,04532	1,00000	$131.137.256	$115.415.639	$131.137.256	$5.685.475	
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	$255.816.896	$20.465.352,00	$235.351.544	101,907	104,296	104,296	1,02344	1,00000	$261.813.244	$235.351.544	$261.813.244	$5.996.348	
5 Obras de urbanismo	$0	$0,00	$0	101,907	104,296	104,296	1,02344	1,00000	$0	$0	$0	$0	
6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$0	$0,00	$0	101,907	104,296	104,296	1,02344	1,00000	$0	$0	$0	$0	
7 Señalización y control de transito	$35.622.994	$2.849.840,00	$32.773.154	103,719	108,281	108,281	1,04399	1,00000	$37.190.050	$32.773.154	$37.190.050	$1.567.056	
8 Transporte y sobre acarreos	$0	$0,00	$0	100,393	100,890	100,890	1,00495	1,00000	$0	$0	$0	$0	
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	$13.582.041	$1.086.563,00	$12.495.478	101,650	105,203	105,203	1,03495	1,00000	$14.056.733	$12.495.478	$14.056.733	$474.692	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	$541.415	$43.313,00	$498.102	101,650	105,203	105,203	1,03495	1,00000	$560.337	$498.102	$560.337	$18.922	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	$233.368	$18.669,00	$214.699	100,900	102,261	102,261	1,01349	1,00000	$236.516	$214.699	$236.516	$3.148	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	$2.377.246	$190.180,00	$2.187.066	101,590	102,556	102,556	1,00950	1,00000	$2.399.830	$2.187.066	$2.399.830	$22.583	
TOTALES	**$433.625.741**	**$34.690.059**	**$398.935.682**						**$ 447.393.966**	**$ 398.935.682**	**$ 447.393.966**	**$ 13.768.225**	**$ -**

VALOR AJUSTE	$ 13.768.225	$ -
VALOR IVA	$ 100.614	$ -
VALOR TOTAL	$ 13.868.839	$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales)

AJUSTE POR ICCP	ACTA 19D	$ 13.768.225
AJUSTE POR ICOCIV	ACTA 19D	$ 41.890.635
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR		**$ 55.658.860**
VALOR IVA		$ 406.738
VALOR TOTAL		$ 56.065.598

AJUSTES POR ICOCIV

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (8,000 %)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (ICOCIV DIC-2021)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS Mes y Año utilizado (ICOCIV DIC-2021)	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV DIC-2022)	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	**B**	**C=A-B**	**Io**	**Ia**	**I**	**Ia / Io**	**I / Ia**	**D= A*(Ia / Io)**	**E= C*(I / Ia)**	**F =D+E-C**	**G= F-A**	
1 Preliminares y explanación	$0	$0,00	$0	103,276	103,276	108,894	1,00000	1,05440	$0	$0	$0	$0	
2 Afirmados, subbases y bases	$0	$0,00	$0	102,438	102,438	118,600	1,00000	1,15777	$0	$0	$0	$0	
3 Pavimentos asfálticos / concreto	$125.451.781	$10.036.142,00	$115.415.639	104,350	104,350	118,600	1,00000	1,13656	$125.451.781	$131.176.799	$141.212.941	$15.761.160	
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	$255.816.896	$20.465.352,00	$235.351.544	109,424	109,424	119,271	1,00000	1,08999	$255.816.896	$256.530.829	$276.996.181	$21.179.285	
5 Obras de urbanismo	$0	$0,00	$0	105,351	105,351	113,748	1,00000	1,07970	$0	$0	$0	$0	
6 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$0	$0,00	$0	108,949	108,949	118,220	1,00000	1,08509	$0	$0	$0	$0	
7 Señalización y control de transito	$35.622.994	$2.849.840,00	$32.773.154	102,357	102,357	114,256	1,00000	1,11625	$35.622.994	$36.583.033	$39.432.873	$3.809.879	
8 Transporte y sobre acarreos	$0	$0,00	$0	100,890	100,890	105,743	1,00000	1,04810	$0	$0	$0	$0	
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	$13.582.041	$1.086.563,00	$12.495.478	124,944	124,944	134,480	1,00000	1,07632	$13.582.041	$13.449.133	$14.535.696	$953.655	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	$541.415	$43.313,00	$498.102	106,792	106,792	119,271	1,00000	1,11686	$541.415	$556.310	$599.623	$58.208	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	$233.368	$18.669,00	$214.699	101,401	101,401	106,298	1,00000	1,04829	$233.368	$225.067	$243.736	$10.368	
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	$2.377.246	$190.180,00	$2.187.066	102,316	102,316	107,840	1,00000	1,05399	$2.377.246	$2.305.146	$2.495.326	$118.080	
TOTALES	**$433.625.741**	**$34.690.059**	**$398.935.682**						**$ 433.625.741**	**$ 440.826.317**	**$ 475.516.376**	**$ 41.890.635**	**$ -**

VALOR AJUSTE	$ 41.890.635	$ -
VALOR IVA	$ 306.124	$ -
VALOR TOTAL	$ 42.196.759	$ -

PORCENTAJE AMORTIZADO: 8,000% (%) (tres decimales)

EQUIVALENCIAS INDICES ICCP E ICOCIV (ANEXO 16.3)

ICCP	ICOCIV	
Grupo de obra	Tipología de obra	Capítulo constructivo
1 Obras de Explanación	Vías interurbanas	1 Preliminares y explanación
2 Sub-bases y bases	Vías interurbanas	2 Afirmados, subbases y bases
3 Transporte de materiales	Vías interurbanas	8 Transporte y sobre acarreos
4 Aceros y elementos metálicos	Vías interurbanas	7 Señalización y control de transito
5 Concretos, morteros y obras varias	Vías interurbanas	4 Estructuras hidráulicas y drenajes
6 Concreto para superestructuras	Puentes	4 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	Vías interurbanas	3 Pavimentos asfalticos / concreto
	Subclase	Grupo Descripción
4 Aceros y elementos metálicos	Carreteras (excepto carrete	Materiales 106 Acero corrugado

$$\frac{Pd}{Pi} + \frac{Vv}{Vd}$$

Índice de Costos de la Construcción Pesada - ICCP

A2. Variación y contribución anual y mensual según grupos de obra

Grupos de obra	Diciembre 2021
Obras de explanación	
Sub-bases y bases	
Transporte de Materiales	
Concretos, morteros y obras varias	
Concreto para estructura de puentes	
Pavimentación con asfalto, pinturas, geotextiles	
Aceros estructurales y cables de acero	
Aceros y elementos metálicos	

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Enero de 2022
53211_06	Vías interurbanas	01	Preliminares y explanación	
53211_06	Vías interurbanas	02	Afirmados, subbases y bases	
53211_06	Vías interurbanas	08	Transporte y sobre acarreos	
53211_06	Vías interurbanas	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	
53211_04	Vías interurbanas	04	Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	
53211_06	Vías interurbanas	03	Pavimentos asfalticos / concreto	
53262_42	Subestaciones eléctricas	06	Estructuras metálicas	

Grupo de obra	Código subclase CPC V 2.0 A.C.	Subclase CPC V 2.0 A.C.	Grupo de costo	Código de agrupación grupo de insumos	Descripción
Aceros y elementos metálicos	53211	Carreteras (excepto carreteras elevadas); calles	Materiales	106	Acero corrugado

GRUPO DE OBRA	ICCP Pi dic-21	ICCP Pd dic-21	ICOCIV Vd dic-21	ICOCIV Vv dic-22	I/Io ((Pd / Pi)+(Vv / Vd))-1
1 Preliminares y explanación	103,211	103,211	103,276	108,8940	1,05440
2 Afirmados, subbases y bases	102,425	102,425	102,438	118,6000	1,15777
3 Pavimentos asfálticos / concreto	104,671	104,671	104,350	118,6000	1,13656
4 Estructuras hidráulicas y drenajes	104,296	104,296	109,424	119,2710	1,08999
5 Obras de urbanismo	104,296	104,296	105,351	113,7480	1,07970
6 Obras geotécnicas y mitigaciónambiental	104,296	104,296	108,949	118,2200	1,08509
7 Señalización y control de transito	108,281	108,281	102,357	114,2560	1,11625
8 Transporte y sobre acarreos	100,890	100,890	100,890	105,7430	1,04810

Acero corrugado	Material	105,203	105,203	124,944	134,480	1,07632
Acero (Materiales)	Material	105,203	105,203	106,792	119,271	1,11686
Acero (Equipos)	Equipos	102,261	102,261	101,401	106,298	1,04829
Acero (M.O)	Mano de obra	102,556	102,556	102,316	107,840	1,05399

Pi corresponde al mes de desembolso del anticipo

CUANTIFICACION Y VALOR BASICO ACERO DE REFUERZO ACTA DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ACTA	VR. UNITARIO COSTO DIRECTO	VR. UNITARIO CON AIU	VR. BASICO TOTAL
27	*Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -* ***MATERIALES***	Kg	3111,578593	$ 134,00	$ 174,00	$ 541.415
27	*Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -* ***EQUIPOS***	Kg	3111,578593	$ 58,00	$ 75,00	$ 233.368
27	*Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) -* ***MANO DE OBRA***	Kg	3111,578593	$ 587,00	$ 764,00	$ 2.377.246
27	*Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa*	Kg	3111,578593	$ 3.358,00	$ 4.365,00	$ 13.582.041
			TOTALES	$ 4.137,00	$ 5.378,00	$ 16.734.070

FORMULA

$$\frac{I}{Io} = \left(\frac{Pd}{Pi} + \frac{Vv}{Vd} - 1\right)$$

I / Io, es RELACION I / Io PARA EL FORMULARIO MEPI-MN1-IN-5-FR-1
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Ajuste
Pd es el Indice ICCP del mes de DICIEMBRE 2021 del Grupo de Ajuste
Pi es el Indice ICCP del mes de cierre del proceso licitatorio del Grupo de Ajuste (FORMULARIO MEPI-MN1-IN-5-FR-1)
Vv es el Indice ICOCIV para el mes a aplicar el ajuste (correspondiente al grupo, tipología y capitulo seleccionado para el modo del proyecto)
Vd es el Indice ICOCIV para el mes de diciembre 2021 (correspondiente al grupo, tipología y capitulo seleccionado para el modo del proyecto) sin ajuste

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	30/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** LA GUAJIRA **ACTA Nº** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 433.625.741,00 **MES** dic-22

ACTA FINAL I

CONTRATO No.: **1009 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR : ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 2

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1005 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28-jun-21** (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31-ago-30** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 265.853.856.477** (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 10.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 275.853.856.477,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-08-2022		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR	UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	113,00	$	1.187.326,00	$ 134.167.838,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	1	201-13		Demolición de Estructuras	m3	6.300,00	$	113.989,00	$ 718.130.700,00	800,00	$ 91.191.200,00	-	$ -	258,24	$ 29.436.519,00
3	1	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	29.162,00	$	4.475,00	$ 130.499.950,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	1	210-13		Excavación sin clasificar e la explanación y canales	m3	336.858,00	$	10.642,00	$ 3.584.842.836,00	195.978,00	$ 2.085.597.876,00	-	$ -	62.133,75	$ 661.227.368,00
5	1	210-13		Excavación sin clasificar de préstamos	m3	35.000,00	$	12.579,00	$ 440.265.000,00	18.000,00	$ 226.422.000,00	-	$ -	-	$ -
6	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	430,00	$	62.892,00	$ 27.043.560,00	430,00	$ 27.043.560,00	-	$ -	-	$ -
7	1	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	36.564,00	$	10.642,00	$ 389.114.088,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
8	1	220.1		Terraplenes	m3	262.150,00	$	13.249,00	$ 3.473.225.350,00	197.523,20	$ 2.616.984.877,00	-	$ -	60.201,26	$ 797.606.495,00
Subtotal									$ 8.897.289.322,00		$ 5.047.239.513,00	-	$ -		$ 1.488.270.382,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
9	1	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	650.000,00	$	961,00	$ 624.650.000,00	650.000,00	$ 624.650.000,00	-	$ -	-	$ -
10	2		351.1P	Base Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	164.500,00	$	184.809,00	$ 30.401.080.500,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
11	2		351.2P	Subbase Estabilizada con cemento (incluye suministro de cemento)	m3	279.300,00	$	90.850,00	$ 25.374.405.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal									$ 56.400.135.500,00		$ 624.650.000,00	-	$ -		$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
12	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	782.271,00	$	2.926,00	$ 2.288.924.946,00	819.871,00	$ 2.398.942.546,00	-	$ -	135.596,00	$ 396.753.896,00
13	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	84.150,00	$	932.536,00	$ 78.472.904.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
Subtotal									$ 80.761.829.346,00		$ 2.398.942.546,00	-	$ -		$ 396.753.896,00
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
14	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	9.448,00	$	32.667,00	$ 308.637.816,00	11.223,25	$ 366.629.908,00	-	$ -	6.672,38	$ 217.966.638,00
15	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	439,00	$	81.882,00	$ 35.946.198,00	439,00	$ 35.946.198,00	-	$ -	-	$ -
16	5	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	11.955,00	$	25.958,00	$ 310.327.890,00	10.035,30	$ 260.496.317,00	-	$ -	-	$ -
17	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	6.326,00	$	109.936,00	$ 695.455.136,00	7.526,08	$ 827.387.131,00	-	$ -	2.945,09	$ 323.771.414,00
18	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2.440,00	$	2.100.926,00	$ 5.126.259.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.2 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	187,00	$	2.471.730,00	$ 462.213.510,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
20	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPA para para Viga de puentes	m3	2.337,00	$	1.433.984,00	$ 3.351.220.608,00	537,00	$ 770.049.408,00	-	$ -	-	$ -
21	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos , Aletas y placas	m3	5.817,00	$	1.165.384,00	$ 6.779.038.728,00	1.317,00	$ 1.534.810.728,00	-	$ -	-	$ -
22	6		630.3.4P	Concreto clase 28 MPA para tablero y anden	m3	362,00	$	1.255.761,00	$ 454.585.482,00	362,00	$ 454.585.482,00	-	$ -	-	$ -
23	5	630-13		Concreto 28 MPA	m3	10.350,00	$	956.449,00	$ 9.899.247.150,00	4.268,50	$ 4.082.602.557,00	-	$ -	464,60	$ 444.366.205,00
24	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	9.630,00	$	809.984,00	$ 7.800.145.920,00	9.630,00	$ 7.800.145.920,00	-	$ -	-	$ -
25	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	918,00	$	633.414,00	$ 581.474.052,00	936,95	$ 593.477.247,00	-	$ -	35,75	$ 22.644.551,00
26	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1.071,00	$	545.130,00	$ 583.834.230,00	471,00	$ 256.756.230,00	-	$ -	-	$ -
27	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	3.543.655,00	$	5.378,00	$ 19.057.776.590,00	538.921,30	$ 2.898.318.751,00	3.111,58	$ 16.734.070,00	49.827,45	$ 267.972.019,00
28	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	279.568,00	$	2.237,00	$ 625.393.616,00	279.568,00	$ 625.393.616,00	-	$ -	-	$ -
29	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	2.198,00	$	704.737,00	$ 1.549.011.926,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
30	5		671.1.1P	Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo (concreto f'c 21 mpa)	m3	2.905,00	$	847.572,00	$ 2.462.196.660,00	1.801,00	$ 1.526.477.172,00	-	$ -	-	$ -
31	7	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	86.945,00	$	7.720,00	$ 671.215.400,00	86.945,00	$ 671.215.400,00	-	$ -	-	$ -
32	5	673-13		Material granular drenante	m3	3.921,00	$	239.511,00	$ 939.122.631,00	3.921,00	$ 939.122.631,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal									$ 61.693.102.983,00		$ 23.643.414.696,00		$ 16.734.070,00		$ 1.276.720.827,00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	30/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** LA GUAJIRA **ACTA N°** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 433.625.741,00 **MES** dic-22

ACTA FINAL I

CONTRATO No : **1099 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1005 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28-jun-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31-ago-30** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 265.853.856.477** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 10.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 275.853.856.477,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-08-2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD														
33	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	253.599,00	$ 1.794,00	$ 454.956.606,00	244.899,53	$ 439.349.757,00	2.375,00	$ 4.260.750,00	34.291,25	$ 61.518.503,00
34	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	786,00	$ 22.076,00	$ 17.351.736,00	786,00	$ 17.351.736,00	-	$ -	30,40	$ 671.110,00
35	7	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	95.783,00	$ 8.346,00	$ 799.404.918,00	31.123,00	$ 259.752.558,00	2.313,00	$ 19.304.298,00	5.113,00	$ 42.673.098,00
36	4	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	1.960,00	$ 403.818,00	$ 791.483.280,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
37	4	730-13		Defensa metalica	m	1.100,00	$ 230.532,00	$ 253.585.200,00	100,00	$ 23.053.200,00	-	$ -	-	$ -
38	4	730-13		Sección final	u	280,00	$ 103.189,00	$ 28.892.920,00	280,00	$ 28.892.920,00	-	$ -	-	$ -
39	4	740-13		Captafaros	u	2.980,00	$ 22.031,00	$ 65.652.380,00	2.980,00	$ 65.652.380,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$ 2.411.327.040,00		$ 834.052.551,00		$ 23.565.048,00		$ 104.862.711,00
TRANSPORTES														
40	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	2.391.784,00	$ 1.057,00	$ 2.528.115.688,00	1.896.784,00	$ 2.004.900.688,00	-	$ -	18.277,52	$ 19.319.339,00
41	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	7.972.614,00	$ 1.175,00	$ 9.367.821.450,00	1.036.809,57	$ 1.218.251.245,00	-	$ -	585.195,48	$ 687.604.691,00
Subtotal								$ 11.895.937.138,00		$ 3.223.151.933,00		$ -		$ 706.924.030,00
ITEM NO PREVISTOS														
NP1	NP1	320.13		Subbase granular clase B (Especificación 320.13)	m3		$ 303.867,00	$ -	147.250,91	$ 44.744.691.054,00	-	$ -	25.345,83	$ 7.701.761.326,00
NP2	NP2	330.13		Base granular clase B (Especificación 330.13)	m3		$ 318.020,00	$ -	121.885,35	$ 38.761.979.007,00	-	$ -	20.647,20	$ 6.566.222.544,00
NP3	NP3	450-13		Mezcla semidensa en caliente Tipo MSC-19	m3		$ 1.002.812,00	$ -	77.512,95	$ 77.730.916.415,00	125,10	$ 125.451.781,00	12.731,27	$ 12.767.070.331,00
NP4	NP4	231-13		Geotextil BX 50 o similar	m2		$ 13.127,00	$ -	976.071,43	$ 12.812.889.662,00	-	$ -	156.040,00	$ 2.048.337.080,00
NP5	NP5	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 48" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		$ 1.682.190,00	$ -	2.373,00	$ 3.991.836.870,00	-	$ -	674,80	$ 1.135.141.812,00
NP6	NP6	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 96" diámetro interior (Especificación 662.13)	m		$ 3.770.044,00	$ -	1.674,00	$ 6.311.053.656,00	62,16	$ 234.345.935,00	193,28	$ 728.598.703,00
NP7	NP7	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 0.90 a 1.20 m	m		$ 77.932,00	$ -	1.111,98	$ 86.658.825,00	-	$ -	365,30	$ 28.468.560,00
NP8	NP8	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 1.90 a 2.70 m	m		$ 106.496,00	$ -	404,00	$ 43.024.384,00	-	$ -	98,00	$ 10.436.608,00
NP9	NP9	201,13		Remoción de alcantarillas metálicas diámetros 3.00 a 3.50 m	m		$ 159.744,00	$ -	308,00	$ 49.201.152,00	-	$ -	44,10	$ 7.044.710,00
NP10	NP10	662,13		Recubrimiento con base en resinas epóxicas Coaltar Epóxico o similar para protección de tuberías metálicas contra agentes altamente agresivos	m2		$ 38.846,00	$ -	22.263,70	$ 864.855.654,00	552,72	$ 21.470.961,00	5.754,41	$ 223.535.811,00
NP11	NP11	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 36" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 1.306.682,00		300,00	$ 392.004.600,00	-	$ -	-	$ -
NP12	NP12	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 60" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 2.357.951,00		850,00	$ 2.004.258.350,00	-	$ -	217,55	$ 512.972.240,00
NP13	NP13	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 72" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 2.766.862,00		210,00	$ 581.041.020,00	-	$ -	15,54	$ 42.997.035,00
NP14	NP14	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 84" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 3.312.344,00		650,00	$ 2.153.023.600,00	-	$ -	-	$ -
NP15	NP15	662,13		Tubería metálica corrugada galvanizada calibre 14 y 108" diámetro interior (Especificación 662.13)	m	-	$ 5.029.589,00		800,00	$ 4.023.671.200,00	-	$ -	-	$ -
NP16	NP16	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de transito tipo SR, SP y/o SI, con lámina retroreflectiva tipo IV (90x90 cm)	u	-	$ 711.620,00		1.226,00	$ 872.446.120,00	14,00	$ 9.962.680,00	64,00	$ 45.543.680,00
NP17	NP17	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de transito tipo SI-04 (postes de referencia) doble tablero, reflectivo tipo IV (1.00m x 0.45m)	u	-	$ 698.422,00		80,00	$ 55.873.760,00	3,00	$ 2.095.266,00	15,00	$ 10.476.330,00
NP18	NP18	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de transito tipo informativa (SI-05) con lámina retroreflectiva tipo IV	u	-	$ 711.002,00		60,00	$ 42.660.120,00	-	$ -	-	$ -
NP19	NP19	Manual de Señalización Vial 2015		Señal vertical de tránsito tipo preventiva delineador de curva horizontal SP-75. Reflectivo tipo IV (75x60cm)	u	-	$ 552.005,00		400,00	$ 220.802.000,00	-	$ -	-	$ -
Subtotal								$		$ 195.742.887.449,00		$ 393.326.623,00		$ 31.828.606.770,00
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				**$ 222.059.621.329,00**		**$ 231.514.338.687,00**		**$ 433.625.741,00**		**$ 35.802.138.615,00**
*				PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)				$ 24.652.634.122,00		$ 25.125.369.990,00		$ -		$ 2.921.913.238,00
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ 1.150.000.000,00		$ 1.150.000.000,00		$ -		$ -
*				VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 247.862.255.451,00		$ 257.789.708.677,00		$ 433.625.741,00		$ 38.724.051.853,00
*				VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 1.811.301.098,00		$ 1.883.847.871,00		$ 3.168.803,00		$ 282.983.456,00
*				VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D*+E)				**$ 249.673.556.549,00**		**$ 259.673.556.548,00**		**$ 436.794.544,00**		**$ 39.007.035.309,00**
*				REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ 1.500.000.000,00		$ 1.500.000.000,00		$ -		$ 300.000.000,00
*				IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ 285.000.000,00		$ 285.000.000,00		$ -		$ 57.000.000,00
*				TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				**$ 1.785.000.000,00**		**$ 1.785.000.000,00**		**$ -**		**$ 357.000.000,00**
*				**GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**				**$ 13.987.299.928,00**		**$ 13.987.299.928,00**		**$ -**		**$ 4.246.775,00**
*				**PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)**				**$ 408.000.000,00**		**$ 408.000.000,00**		**$ -**		**$ 5.002.158,00**
*				**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**				**$ 265.853.856.477,00**		**$ 275.853.856.477,00**		**$ 436.794.544,00**		**$ 39.373.284.242,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 3
FECHA	30/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL** LA GUAJIRA **ACTA Nº** 19 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 433.625.741,00 **MES** dic-22

ACTA FINAL I

CONTRATO No: **1009 DE 2021** (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA EQUIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1005 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**

PLAZO INICIAL: **110 MESES** (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: **110 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: **28-jun-21** (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: **31-ago-30** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 265.853.856.477** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ 10.000.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 275.853.856.477,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 5 de fecha 04-08-2022		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 6.500.000.000,00	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 34.690.059,00	8,00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 4.142.724.795,00	
Valor Saldo por Amortizar	$ 2.357.275.205,00	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 433.625.741,00	$ 3.168.803,00	$ 436.794.544,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 433.625.741,00	$ 3.168.803,00	$ 436.794.544,00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ -	$ 1.488.270,382
SB-GEO	$ -	$ 9.750.098.406,00
B	$ -	$ 6.566.222.543,00
P	$ 125.451.781,00	$ 13.163.824.227,00
OA	$ 272.550.966,00	$ 3.965.916.306,00
SCT	$ 35.622.994,00	$ 160.882.721,00
OV	$ -	$ -
T	$ -	$ 706.924.030,00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ -	$ 64.245.530,00
2 Sub-bases y bases	$ -	$ 671.632.614,00
3 Transporte de materiales	$ -	$ 13.606.515,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ 16.084.194,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ -	$ 331.178.352,00
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas,	$ -	$ 1.790.484.688,00
Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa	$ -	$ 31.855.407,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MATERIALES	$ -	$ 873.762,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - EQUIPOS	$ -	$ 142.195,00
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. (sin acero) - MANO DE OBRA	$ -	$ 1.809.981,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 433.625.741,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 398.935.682,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 402.104.485,00 **VALOR EN LETRAS:** **CUATROCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA - ANTICIPO, PARAGRAFO CUARTO - AMORTIZACION DEL CONTRATO 1009-21: EL ANTICIPO SERÁ AMORTIZADO MEDIANTE DEDUCCIONES DE LAS ACTAS MENSUALES DE OBRA, SITUACIÓN QUE DEBERÁ SER CONTROLADA POR LA INTERVENTORÍA. LA CUOTA DE AMORTIZACIÓN SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL VALOR DE LA RESPECTIVA ACTA POR LA RELACIÓN QUE EXISTA ENTRE EL SALDO DEL ANTICIPO Y EL SALDO DEL VALOR DE LAS VIGENCIAS DE LOS PRIMEROS CINCO (5) AÑOS.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma
Nombre : **ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: **UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066**
Matrícula No.:

Firma
Nombre: **CARLOS EDUARDO ARREDONDO ARANGO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor: **CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191**
Matrícula No.: 05202-00905 ANT

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1009 de 2021

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO	X	-0,00020%

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE	X	19D	dic-22
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO			
CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	215923	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402021-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	$ 0,00
No. COMPROMISO	215923	RUBRO No. C-2402-0600-13-0-2402006-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	-$564.763,00
				TOTAL ACTA	-$564.763,00

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ

Nombre: **DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ**
Matricula No. **08202-38090 ATL**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1009-2021 Contratista UNION TEMPORAL ANDINO 066

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

Acta N° **19D** Valor basico -$ 560.666 Período dic-22

Valor Incluido Iva $ -$ 564.763,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	N.A.	CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN		$ -	-$ 564.763,00	$ (564.763,00)
		TOTALES	**$**	$ -	$ (564.763,00)	**$ (564.763,00)**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	GUAJIRA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	URIBIA	$ (564.763,00)	-$ 560.666,00
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		-$ 564.763,00	-$ 560.666,00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			$ 0

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			$ 0

Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Director de Obra UNION TEMPORAL ANDINO 066
Matrícula No.: 19202-39965 CAU
CONTRATISTA

Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Director de Obra CONSORCIO GINPROVIAS VISION 2030 /191
Matrícula No.: 25202-03051 CND
INTERVENTORIA

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

PERSONAS JURÍDICAS

Yo, ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.876.040 de Bogotá, y JANETH LOZANO GARCIA, identificada con cédula de ciudadanía No. 28.057.912 de Carcasí Santander, en la condición de Representante legal principal y contadora respectivamente, de la UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066, identificada con Nit. 901.477.981-6, certificamos el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., el 21 de Febrero de 2023.

ANDRES ALBERTO ALVARADO ANGEL
Representante Legal

JANETH LOZANO GARCIA
Contadora

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

216883-T



JANETH
LOZANO GARCIA
C.C. 28057912

RESOLUCION INSCRIPCION 352 FECHA 07/06/2016

UNIVERSIDAD FUNS UNIV. PANAMERICANA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 231142

220071

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C6918553936E1AC90

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JANETH LOZANO GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28057912 de CARCASI (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 216883-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

78478-T

VICTOR MANUEL
DUEÑAS SANCHEZ
C.C. 79668279
RESOLUCION INSCRIPCION 64 FECHA 10/05/2001
UNIVERSIDAD F.U. AUTONOMA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

87596

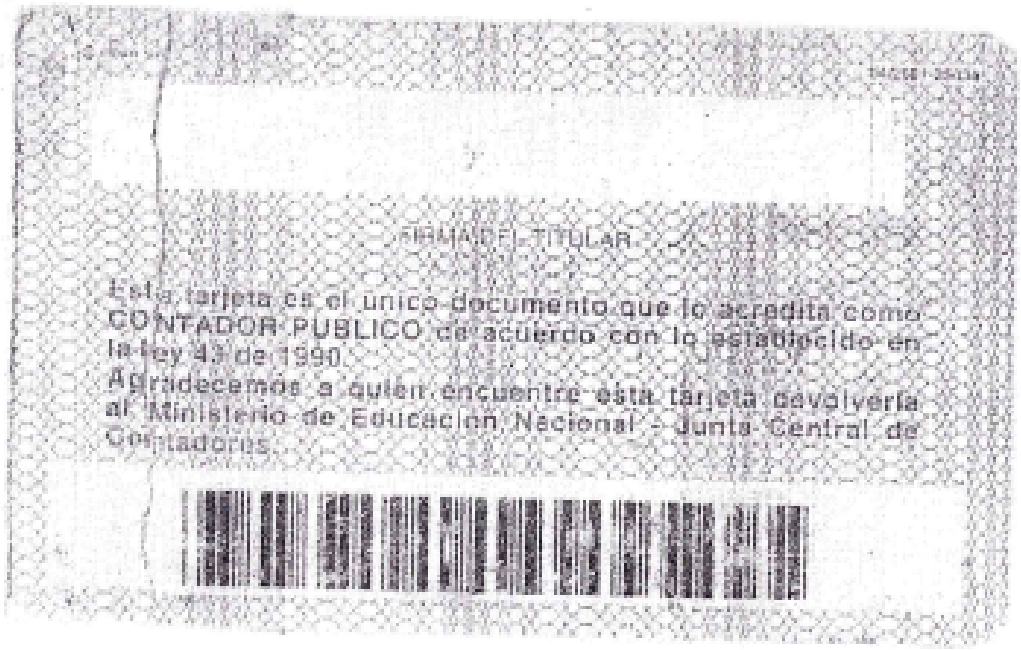

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.


GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA SAS






CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.



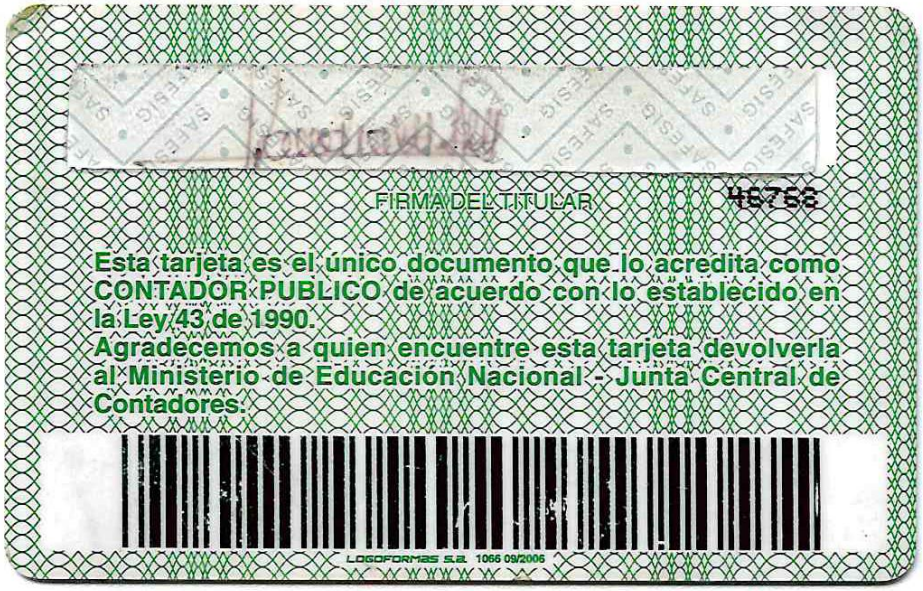

CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES SAS



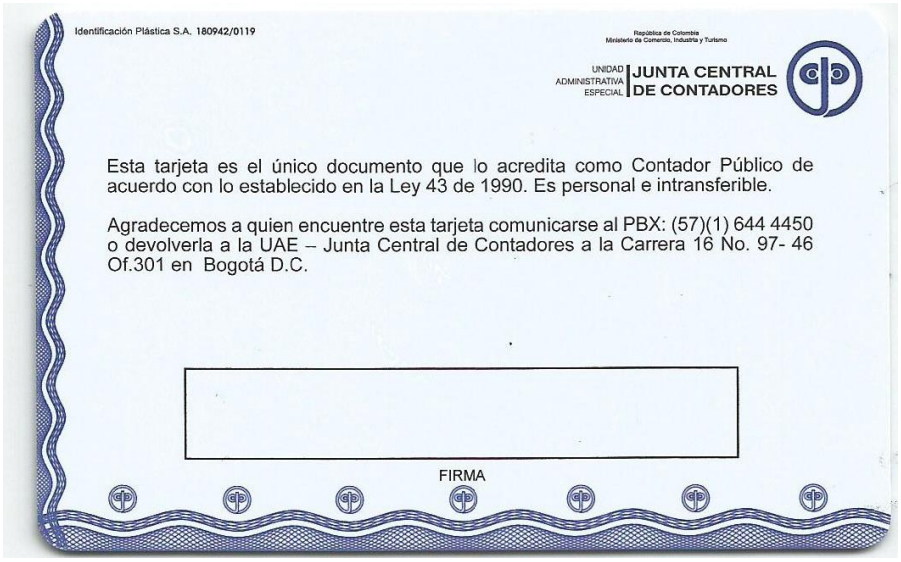

PROVIAS S.A.S.




República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

90929-T

JOSEFINA
LOPEZ GIRALDO
C.C. 21847823
RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

100300

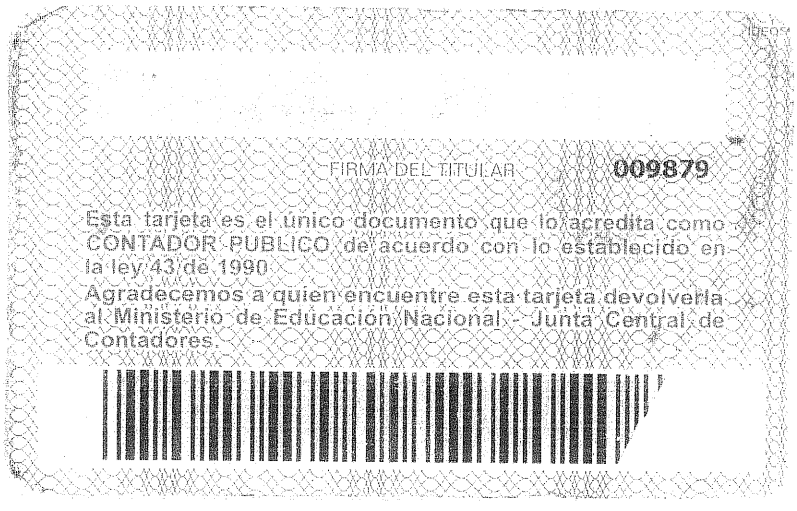

FIRMA DEL TITULAR

009879

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14897604901

(415)7707212489984(8020) 000001489760490 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL ANDINO 066

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CALLE 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico uniontemporalandino066@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 6 7 2 8 7 6	3 1 3 6 2 8 2 2 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 1 0 4 1 9	7 1 1 2	2 0 2 1 0 4 1 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2																		

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 21 / 10 : 40: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALVARADO ANGEL ANDRES ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897604901

(415)7707212489984(8020) **000001489760490 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 1 0 2 1 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 2 1 2	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 2 1 2	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897604901

(415)7707212489984(8020) **000001489760490 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 8 7 6 0 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVARADO	ANGEL	ANDRES	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 2 1 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 5 9 5 4 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ALVAREZ	MACIAS	LUIS	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897604901

(415)7707212489984(8020) **000001489760490 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	NIT 31	8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	COLOMBIA 169					CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.		24	2021 02 12	
2	NIT 31	8 6 0 0 3 4 5 5 1	3	COLOMBIA 169					GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACION		1	2021 02 12	
3	NIT 31	9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	COLOMBIA 169					CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S		24	2021 02 12	
4	NIT 31	9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	COLOMBIA 169					CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		1	2021 02 12	
5	NIT 31	8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	COLOMBIA 169					PROYECTOS Y VIAS S.A.S		25	2021 02 12	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14897604901

(415)7707212489984(8020) **000001489760490 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 4 7 7 9 8 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: TECCIVIL S A S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		1 2 0 2 1 0 2 1 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 0 9 5 9 5 1	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: JMV INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2 4	2 0 2 1 0 2 1 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CONYTRAC S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 48 78 C SUR 71

42. Correo electrónico contabilidad@conytrac.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 3 0 1 2 2 6 6	3 1 1 6 3 7 3 2 0 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 2 9 0	1 9 9 2 0 5 2 0	4 3 1 2	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 13 / 19 : 42: 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	8 9 2	4 7 9 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 5 2 3	2 0 1 9 1 1 1 4
74. Número de notaría	1	2 5
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 5 2 0	2 0 1 9 1 2 0 2
77. No. Matrícula mercantil	2 9 8 4	2 9 8 4
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 5 2 3	1 9 8 3 0 5 2 3
81. Hasta	2 2 1 9 1 1 1 3	2 2 1 9 1 1 1 3

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	1 9 9 9 1 2 2 7		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 2 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 9 1 2 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	3 3 0 5 7 3 3		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	POSADA	RODRIGO					1 9 9 9 1 2 2 7	2 0 1 8 0 3 2 8
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 0 5 5 6 4 9 8		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	CEBALLOS	JUAN	DIEGO				1 9 9 9 1 2 2 7	
3	Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 8 0 8 4 5		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	PEREZ	HILDA	LUCIA				1 9 9 9 1 2 2 7	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 3 1 7 6 1 1		COLOMBIA 1 6 9	PEREZ	DE HOYOS	LUCIA	NOEL				1 9 9 9 1 2 2 7	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	4 2 8 7 9 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	CEBALLOS	ANGELA	MARIA				2 0 1 8 0 3 2 8	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	4 2 8 9 0 0 7 1		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	PEREZ	ANA	CECILIA				2 0 1 8 0 3 2 8	
2	Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 8 2 0 7 6		COLOMBIA 1 6 9	HOYOS	PEREZ	ELENA	MARIA				2 0 1 8 0 3 2 8	
3	Cédula de Ciudada 1 3	4 3 5 6 5 1 5 2		COLOMBIA 1 6 9	RENDON	ORTIZ	ELIANA	MARIA				2 0 1 9 0 3 2 4	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 2 9 5 2 0 8		COLOMBIA 1 6 9	CEBALLOS	DE HOYOS	MARGARITA	ISABEL				2 0 1 9 0 3 2 4	
5													

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 1 6 3 1 1 2		1 2 4 2 1 7 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
ARANGO	MUNERA	SANDRA	MILENA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 5 2 4 4 2 8 7 5		2 3 3 5 1 7 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASTAÑO	ARENAS	ESTEFANIA	

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 0 1 5 8 2 1	8	CONTABLER S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 4 2 6 7 5 6		7 9 6 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MESA	SUAREZ	ADRIANA	LUCIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 1 0 6 1 4

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848693990

(415)7707212489984(8020) **000001484869399 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 7 3 0	7	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES Y TRACTORES CONYTRAC

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1	

165. Dirección: CR 48 78 C SUR 71

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 9 8 5	1 9 9 2 0 4 0 9	
168. Teléfono: 3 0 1 2 2 6 6	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14847664371

(415)7707212489984(8020) 000001484766437 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 3 4 5 5 1	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. - EN REORGANIZACIÓN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 75 A 66 46 OF 501

42. Correo electrónico aalvarado@gaico.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 2 1 1	5 8 0 7 0 3 0	3 1 3 4 0 6 9 6 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 7 2 1 0 3 1	7 1 1 2	1 9 7 2 1 0 3 1		4 2 1 0	4 3 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 11 / 22 : 48: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14851849383

(415)7707212489984(8020) 000001485184938 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 8 2 0 1 8	7	Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Caldas 1 7	La Dorada 3 8 0

41. Dirección principal
KM 3 VDA LA BOCANA CORR GUARINOCITO

42. Correo electrónico lgonzalez@gaico.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 8 0 7 0 3 0	3 1 3 3 9 3 7 3 5 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 0 7 1 0 1 3	4 2 1 0	2 0 0 7 1 0 1 3	4 6 9 0	7 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 20 / 06 : 30: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14897609737

(415)7707212489984(8020) 000001489760973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 5 9 5 7 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES, CIMENTACIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	C2SI S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 93 11 A 28 OF 601

42. Correo electrónico infoc2sisas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 2 2 1	6 0 1 7 4 2 0 1 6 8	3 1 8 8 9 7 9 8 4 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 9 0 2 2 6	4 3 3 0	2 0 1 9 0 2 2 6	4 2 1 0	7 1 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 21 / 08 : 54: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre VEJARANO SAMPER ALFONSO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14862056811

(415)7707212489984(8020) 000001486205681 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 1 9 0 8 6	8	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
PROYECTOS Y VIAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	PROVIAS S.A.S.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 30 A 81 37

42. Correo electrónico administracion@provias.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 4 4 8 1 7 2	3 1 1 3 9 0 2 3 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 / 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 9 1 0 1 2 6	4 2 9 0	1 9 9 1 1 0 2 6	4 1 1 2 / 4 9 2 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 09 / 10 : 25: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ MACIAS LUIS FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848704138

(415)7707212489984(8020) 000001484870413 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TECCIVIL S A S

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECCIVIL S A S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 90 64 OF 402

42. Correo electrónico teccivil@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 8 8 5 0	6 0 1 7 3 3 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 0 0 6 0 1	7 1 1 2	2 0 2 0 0 6 0 1	4 2 1 0	4 3 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 13 / 20 : 18: 06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 3 3 3	8
73. Fecha	2 0 0 3 0 2 1 4	2 0 0 9 0 8 2 8
74. Número de notaría	4 0	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 3 1 8	2 0 0 9 0 9 0 1
77. No. Matrícula mercantil	0 1 2 5 6 6 0 2	1 3 2 3 2 3 5
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 2 1 4	
81. Hasta	2 0 5 3 0 2 1 4	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 0 3 0 3 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 9 5 3 9 0 4 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MATIZ	BLANCA	SUSANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO					2 0 0 3 0 2 1 4	
2	Cédula de Ciudada 1 3	3 9 5 3 9 0 4 5		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	MATIZ	BLANCA	SUSANA				2 0 0 3 0 2 1 4	
3	Cédula de Ciudada 1 3	5 1 9 5 9 9 7 4		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	MATIZ	AZUCENA					2 0 0 3 0 2 1 4	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 1 8 9 9 6 5		COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	MATIZ	DIEGO	ALONSO				2 0 0 3 0 2 1 4	
5	NIT 3 1	8 0 8 5 1 5 4 3	1	COLOMBIA 1 6 9	MOSQUERA	MOSQUERA	JUAN	CAMILO				2 0 0 3 0 2 1 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 6 8 8 8 8 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GEIRINGER	ORTEGA	SAMUEL	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 3 0 2 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 6 8 2 7 9		7 9 4 7 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DUEÑAS	SANCHEZ	VICTOR	MANUEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 2 0 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 2 4 8 4 8		8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
AYALA	HURTADO	MARIA	ELVIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14848704138

(415)7707212489984(8020) **000001484870413 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 7 7 6 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: TECCIVIL S A

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 15 90 64 OF 402

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 2 5 6 7 8 5	2 0 0 3 0 3 1 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 3 3 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14843725131

(415)7707212489984(8020) 000001484372513 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JMV INGENIEROS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
JMV S.A.S	JMV S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 15 90 64 OF 402 BRR CHICO

42. Correo electrónico contabilidad@jmvingenieros.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 0 1 7 3 3 3	6 0 1 6 0 1 8 8 5 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 9 0 0 6 0 1	4 2 1 0	1 9 9 0 0 6 0 1	4 9 2 3	7 1 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 04 / 08 : 35: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843725131

(415)7707212489984(8020) **000001484372513 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	
72. Número	2 1	
73. Fecha	1 9 9 0 0 5 2 5	
74. Número de notaría	4 4	
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 0 0 5 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	4 1 0 7 7 5	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	

Vigencia

80. Desde	1 9 9 0 0 5 2 5
81. Hasta	2 0 1 0 0 5 2 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843725131

(415)7707212489984(8020) **000001484372513 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 9 8 9 1 3 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	MAURICIO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 1 6 7 5 8 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	DE MOSQUERA	MARIA	VICTORIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 0 2 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 8 5 1 5 4 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MOSQUERA	MOSQUERA	JUAN	CAMILO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843725131

(415)7707212489984(8020) **000001484372513 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 1 6 7 5 8 4 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	DE MOSQUERA	MARIA	VICTORIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
72,000,000	5 0	1 9 9 0 0 5 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 4 4 0 9 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MOSQUERA	TELLEZ	GUSTAVO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
72,000,000	5 0	1 9 9 0 0 5 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14843725131

(415)7707212489984(8020) **000001484372513 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 0 9 5 9 5 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 6 8 2 7 9		7 8 4 7 8 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DUEÑAS	SANCHEZ	VICTOR	MANUEL

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 7 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 2 3 9 1 7 8 5		2 1 8 8 7 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CLAVIJO	VALENCIA	JULIO	CESAR

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 0 7 2 8

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 1 2 4 8 4 8		8 8 9 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
AYALA	HURTADO	MARIA	ELVIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 0 9 2 0

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: feb-23 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	469121	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	54 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.363.070.830	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.641.385.647	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	$ 104.400.000	$ -
2021	469121		54 C-2402-0600-13-0-2402118-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.165.000.000	$ -
2022	268222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACION	1009 - 2021	$ 14.284.000.000	$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402015-02	NACION	1009 - 2021	$ 4.096.000.000	$ -
2022	268222		11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACION	1009 - 2021	$ 133.333.333	$ -
2022	760222	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	20 C-2402-0600-13-0-2402006-02	PROPIOS	1009 - 2021	$ 10.000.000.000	$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402021-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 93.192.823	$ -
2023	215923	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA	11 C-2402-0600-13-0-2402006-02	NACIÓN	1009- 2021	$ 10.878.807.177	$ 6.323.977.537
					TOTAL	$ 52.759.189.810	$ 6.323.977.537

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 275.853.856.477,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
ANTICIPO 1					$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2021-11-16	$ -	$ 265.853.856.477		X		
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
1	OBRA	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
1D	AJUSTES	jun-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2P	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
2D	AJUSTES	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3	OBRA	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3P	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
3D	AJUSTES	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4	OBRA	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4P	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				
4D	AJUSTES	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.504.456.477	$ 265.853.856.477				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066
MES INFORME MENSUAL: feb-23
PROYECTO: URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021
INTERVENTOR: CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

5	OBRA	oct-21	$ 60.185.430	$ 439.817	$ 60.625.247	$ -	$ 60.625.247	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.086.831.230	$ 265.793.231.230	120848 15-12-2021	X		
	E&D		$ 300.000.000	$ 57.000.000	$ 357.000.000	$ -	$ 357.000.000	$ 6.500.000.000			$ 265.436.231.230				
5P	AJUSTES	oct-21	$ 1.001.780	$ 7.321	$ 1.009.101	$ -	$ 1.009.101	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.085.822.129	$ 265.435.222.129	123736 20-12-2021	X		
5D	AJUSTES	oct-21	$ 86.279	$ 631	$ 86.910	$ -	$ 86.910	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 2.085.735.219	$ 265.435.135.219	123729 20-12-2021	X		
6	OBRA	nov-21	$ 305.151.023	$ 2.229.950	$ 307.380.973	$ -	$ 307.380.973	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 1.778.354.246	$ 265.127.754.246	119973 13-12-2021 124327 21-12-2021	X		
6P	AJUSTES	nov-21	$ 4.639.328	$ 33.903	$ 4.673.231	$ -	$ 4.673.231	$ 6.500.000.000	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ 1.773.681.015	$ 265.123.081.015	123741 20-12-2021	X		
7	OBRA	dic-21	$ 7.214.453.093	$ 52.721.003	$ 7.267.174.096	$ 1.360.216.747	$ 5.906.957.349	$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.855.906.919	124186 21-12-2021	X		
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.855.906.919				
									469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	$ 136.123.666	$ 257.855.906.919				
7P	AJUSTES	dic-21	$ 135.136.133	$ 987.533	$ 136.123.666	$ -	$ 136.123.666	$ 5.139.783.253	469121 (C-2402-0600-13-0-2402118-02) 2021-11-16	$ -	$ 257.719.783.253	123945 21-12-2021	X		
6D	AJUSTES	nov-21	$ 602.101	$ 4.400	$ 606.501	$ -	$ 606.501	$ 5.139.783.253	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 14.283.393.499	$ 257.719.176.752		X		
8	OBRA	ene-22	$ 384.632.498	$ 2.810.776	$ 387.443.274	$ 192.316.249	$ 195.127.025	$ 4.947.467.004	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 14.088.266.474	$ 257.331.733.478	35552 07-04-2022	X		
9	OBRA	feb-22	$ 910.877.671	$ 6.656.414	$ 917.534.085	$ 455.438.836	$ 462.095.248	$ 4.492.028.168	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 13.626.171.226	$ 256.414.199.393	35557 07-04-2022	X		
10	OBRA	mar-22	$ 1.939.415.022	$ 14.172.648	$ 1.953.587.670	$ 135.759.052	$ 1.817.828.618	$ 4.356.269.116	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 11.808.342.608	$ 254.460.611.723	44706 03-05-2022	X		
11	OBRA	abr-22	$ 5.183.649.828	$ 37.880.518	$ 5.221.530.346	$ 414.691.986	$ 4.806.838.360	$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 7.001.504.247	$ 249.239.081.377	57088 03-06-2022	X		
7D	AJUSTES	dic-21	$ 80.431.253	$ 587.767	$ 81.019.020	$ -	$ 81.019.020	$ 3.941.577.130	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 6.920.485.227	$ 249.158.062.357	95595 07-09-2022	X		
12	OBRA	may-22	$ 3.304.260.771	$ 24.146.521	$ 3.328.407.292	$ 264.340.862	$ 3.069.068.588	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.851.416.639	$ 245.829.655.065	65904 24-06-2022	X		
	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	may-22	$ 4.203.494	$ 798.664	$ 5.002.158	$ -					$ 245.824.652.907				
8D	AJUSTES	ene-22	$ 18.926.637	$ 138.310	$ 19.064.947	$ -	$ 19.064.947	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.832.351.692	$ 245.805.587.960	94336 02-09-2022	X		
9D	AJUSTES	feb-22	$ 26.496.596	$ 193.629	$ 26.690.225	$ -	$ 26.690.225	$ 3.677.236.268	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 3.805.661.467	$ 245.778.897.735	96931 09-09-2022	X		
13	OBRA	jun-22	$ 3.104.941.512	$ 22.689.957	$ 3.127.631.469	$ 248.395.321	$ 2.879.236.148	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 926.425.319	$ 242.651.266.266	83424 08-08-2022	X		
6D	AJUSTES	nov-21	-$ 602.101	-$ 4.400	-$ 606.501	$ -	-$ 606.501	$ 3.428.840.947		$ 927.031.820	$ 242.651.872.767				Desistimiento pago Acta 6D por Glosa 604, Memorando Invías SF-GCP 44314 del 13-06-22
10D	AJUSTES	mar-22	$ 122.315.344	$ 893.843	$ 123.209.187	$ -	$ 123.209.187	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 803.822.633	$ 242.528.663.580	96953 09-09-2022	X		
11D	AJUSTES	abr-22	$ 448.267.524	$ 3.275.801	$ 451.543.325	$ -	$ 451.543.325	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 352.279.308	$ 252.077.120.255	96172 12-09-2022	X		Saldo del contrato incluye valor de Adición No. 1 por $10MM
12D	AJUSTES	may-22	$ 290.046.283	$ 2.119.569	$ 292.165.852	$ -	$ 292.165.852	$ 3.428.840.947	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ 60.113.456	$ 251.784.954.403	102512 23-09-2022	X		
14	OBRA	jul-22	$ 3.623.646.251	$ 26.480.492	$ 3.650.126.743	$ 289.891.700	$ 3.360.235.043	$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-02-21	$ -	$ 248.134.827.660	96912 12-09-2022	X		
									268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	$ 795.878.413					
13D	AJUSTES	jun-22	$ 303.714.643	$ 2.219.453	$ 305.934.096	$ -	$ 305.934.096	$ 3.138.949.247	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	$ 489.944.317	$ 247.828.893.564	102508 23-09-2022	X		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 6/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA

CONTRATO DE OBRA No: 1009 DE 2021 **CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

MES INFORME MENSUAL: feb-23 **PROYECTO:** URIBIA - PUERTO BOLIVAR - CABO DE LA VELA -ESTRELLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

15	OBRA	ago-22	$ 2.610.147.019	$ 19.074.151	$ 2.629.221.170	$ 208.811.762	$ 2.420.409.408	$ 2.930.137.485	268222 (C-2402-0600-13-0-2402015-02) 2022-02-21	$ -	$ 245.195.425.619	109825 13-10-2022	X		
									268222 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2022-02-21	$ -					
	PAGA	ago-22	$ 4.159.949	$ 86.826	$ 4.246.775	$ -	$ 4.246.775	$ 2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 8.198.621.467					
14D	AJUSTES	jul-22	$ 411.388.771	$ 3.006.303	$ 414.395.074	$ -	$ 414.395.074	$ 2.930.137.485	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 7.784.226.393	$ 244.781.030.545	127738 25-11-22	X		
16	OBRA	sep-22	$ 2.331.780.845	$ 17.039.937	$ 2.348.820.782	$ 186.542.468	$ 2.162.278.314	$ 2.743.595.017	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 5.621.948.079	$ 242.432.209.763	127747 25-11-22	X		
15D	AJUSTES	ago-22	$ 308.364.033	$ 2.253.429	$ 310.617.462	$ -	$ 310.617.462	$ -	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 5.311.330.617	$ 244.470.413.083	126430 01-12-22	X		
17	OBRA	oct-22	$ 2.730.866.474	$ 19.956.332	$ 2.750.822.806	$ 218.469.318	$ 2.532.353.488	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.778.977.129	$ 241.719.590.277	136798 14-12-22	X		
16D	AJUSTES	sep-22	$ 242.147.686	$ 1.769.541	$ 243.917.227	$ -	$ 243.917.227	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.535.059.902	$ 241.475.673.050	137978 15-12-22	X		
17D	AJUSTES	oct-22	$ 301.476.049	$ 2.203.094	$ 303.679.143	$ -	$ 303.679.143	$ 2.525.125.699	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 2.231.380.759	$ 241.171.993.907	137982 15-12-22	X		
18	0BRA	nov-22	$ 1.664.505.438	$ 12.163.694	$ 1.676.669.132	$ 133.160.435	$ 1.543.508.697	$ 2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 687.872.062	$ 239.495.324.775	137973 22-12-22	X		
18P	AJUSTES	nov-22	$ 227.474.899	$ 1.662.317	$ 229.137.216	$ -	$ 229.137.216	$ 2.391.965.264	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 458.734.846	$ 239.266.187.559	140590 19-12-22	X		
19	0BRA	dic-22	$ 433.625.741	$ 3.168.803	$ 436.794.544	$ 34.690.059	$ 402.104.485	$ 2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ 56.630.361	$ 238.829.393.015	140565 19-12-22	X		
19P	AJUSTES	dic-22	$ 56.219.526	$ 410.835	$ 56.630.361	$ -	$ 56.630.361	$ 2.357.275.205	760222 (C-2402-0600-13-0-2402006-02) 2022-07-13	$ -	$ 238.772.762.654	140576 19-12-22	X		
20	0BRA	ene-23	$ 3.384.565.917	$ 24.733.366	$ 3.409.299.283	$ 270.765.273	$ 3.138.534.010	$ 2.086.509.932	215923 C-2402-0600-13-0-2402021-02 2023-03-01	$ -	$ 235.363.463.371			X	
									215923 C-2402-0600-13-0-2402006-02 2023-03-02	$ 7.833.465.990					
21	0BRA	feb-23	$ 1.620.164.535	$ 11.839.664	$ 1.632.004.199	$ 129.613.163	$ 1.502.391.036	$ 1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	$ 6.331.074.954	$ 233.731.459.172			X	
18D	AJUSTES	nov-22	$ 7.045.928	$ 51.489	$ 7.097.417	$ -	$ 7.097.417	$ 1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	$ 6.323.977.537	$ 233.724.361.755			X	
19D	AJUSTES	dic-22	-$ 560.666	-$ 4.097	-$ 564.763	$ -	-$ 564.763	$ 1.956.896.769	215923 (C-2402-0600-13-0-2402021-02) 2023-03-01	$ 6.324.542.300	$ 233.724.926.518			X	
TOTALES			**$ 44.099.850.536**	**$ 377.900.203**	**$ 44.477.750.739**	**$ 4.543.103.231**	**$ 39.934.647.509**	**$ 1.956.896.769**		**$ 6.324.542.300**	**$ 233.724.926.518**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 40.806.869.067	$ 298.204.043	**$ 41.105.073.110**
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 2.984.618.026	$ 21.810.670	**$ 3.006.428.696**
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -	**$ -**
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 300.000.000	$ 57.000.000	**$ 357.000.000**
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 4.159.949	$ 86.826	**$ 4.246.775**
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 4.203.494	$ 798.664	**$ 5.002.158**
VALOR TOTAL	**$ 44.099.850.536**	**$ 377.900.203**	**$ 44.477.750.739**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-59965 CAU

Firma
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 10
FECHA	31/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTÍN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N.A. (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado / % Ejecutado	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	noviembre 2021	diciembre 2021
GPP1 EXPLANACIONES (Items 1,2,3,4,5,6,7 y 8)	$5.047.240	2,18%	0,643%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,63%	1,41%	1,44%
				$ P	$0	$0	$0	$2.159	$56.115	$125.305	$117.582
			$1.488.270	$ E					$56.115	$250.903	$371.979
				% E					0,63%	2,82%	4,56%
GPP2 BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 9,10,11,NP1,NP2,NP4)	$96.944.210	41,87%	7,177%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,20%	6,40%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$1.240.142	$3.656.759
			$16.615.966	$ E							$3.288.651
				% E							5,76%
GPP3 PAVIMENTOS ASFALTICOS (Item 12, 13,NP3)	$80.129.859	34,61%	5,557%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	3,03%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$652.246	$2.443.970
			$12.864.179	$ E							$3.367.381
				% E						0,00%	4,17%
GPP4 ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Items14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,NP5,NP6,NP7,NP8,NP9,NP10,NP11,NP12,NP13,NP14,NP15)	$44.144.044	19,07%	1,713%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	1,32%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$272.137	$816.412
			$3.965.916	$ E							
				% E							
GPP5 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Items 33,34,35,36,37,38,39,NP16,NP17,NP18,NP19)	$2.025.835	0,88%	0,069%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,13%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.466
			$160.883	$ E							$4.038
				% E							0,17%
GPP6 TRANSPORTES (Items 40 y 41)	$3.223.152	1,39%	0,305%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	1,41%	2,93%
				$ P	$0	$0	$0	$0	$4.070	$167.536	$348.562
			$706.924	$ E					$4.070	$54.248	$182.404
				% E					0,03%	0,46%	1,53%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$222.059.621										
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 231.514.339	100%	$35.802.139								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,001%**	**0,03%**	**1,06%**	**3,22%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.159**	**$60.185**	**$2.457.367**	**$7.458.751**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,001%**	**0,03%**	**1,09%**	**4,31%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.159**	**$62.345**	**$2.519.712**	**$9.978.463**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,13%**	**3,12%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$60.185**	**$305.151**	**$7.214.453**
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,16%**	**3,27%**
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$60.185**	**$365.336**	**$7.579.790**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,022%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.247	0,03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 10

FECHA: 31/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021 .)

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2022	febrero 2022	marzo 2022	abril 2022	mayo 2022	junio 2022	julio 2022	agosto 2022	septiembre 2022	octubre 2022	noviembre 2022	diciembre 2022
0,27%	0,27%	0,27%	0,20%	0,01%	0,00%	1,03%	1,72%	1,32%	0,83%	1,43%	2,92%
$22.036	$22.036	$22.036	$13.471	$906	$0	$51.992	$86.807	$66.554	$42.108	$72.157	$147.144
	$113.439	$43.811	$49.470	$80.143	$161.275	$48.450	$8.930	$281.891	$20.728	$1.135	$0
	1,39%	0,54%	0,73%	1,18%	2,37%	0,69%	0,18%	5,59%	0,41%	0,02%	0,00%
0,62%	0,62%	0,62%	0,46%	0,25%	0,52%	1,52%	1,49%	1,42%	1,32%	1,46%	1,82%
$355.847	$355.847	$355.847	$422.365	$231.429	$482.983	$1.469.752	$1.442.563	$1.375.357	$1.278.741	$1.415.141	$1.763.379
$118.860	$447.549	$1.237.548	$2.222.375	$2.084.203	$1.177.373	$1.756.925	$869.299	$1.108.068	$1.206.838	$1.098.277	$0
0,21%	0,78%	2,17%	2,40%	2,25%	1,27%	1,81%	0,90%	1,14%	1,24%	1,13%	0,00%
0,65%	0,79%	0,79%	0,44%	0,56%	1,16%	1,57%	1,30%	1,40%	1,31%	1,45%	1,79%
$528.571	$634.285	$634.285	$338.253	$427.469	$892.109	$1.261.523	$1.040.787	$1.125.343	$1.046.290	$1.157.894	$1.432.331
$265.773	$0	$532.396	$1.607.038	$998.041	$1.470.101	$1.648.635	$1.215.004	$834.202	$740.188	$59.967	$125.452
0,33%		0,66%	2,10%	1,30%	1,92%	2,06%	1,52%	1,04%	0,92%	0,07%	0,16%
0,29%	0,35%		0,55%	1,35%	0,44%	0,38%	0,45%	0,43%	0,88%	1,90%	0,91%
$181.425	$217.710	$217.710	$228.614	$564.837	$184.928	$169.026	$197.129	$191.505	$388.842	$839.542	$401.542
	$142.302	$98.027	$1.269.848	$110.139	$246.160	$136.227	$516.914	$1.911	$705.393	$466.445	$272.551
	0,23%	0,16%	3,04%	0,26%	0,59%	0,32%	1,17%	0,00%	1,60%	1,06%	0,62%
0,42%	0,52%	0,52%	0,09%	3,08%	0,00%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	1,87%	0,03%
$10.062	$12.578	$12.578	$852	$30.653	$0	$28.547	$0	$0	$0	$37.977	$535
	$12.782					$24.446			$45.314	$38.680	$35.623
	0,53%		0,00%	0,00%		2,39%			2,24%	1,91%	1,76%
0,31%	0,31%	0,21%	0,17%	0,00%	0,00%	1,17%	0,85%	0,25%	0,32%	2,90%	2,81%
$37.230	$37.230	$24.820	$5.423	$0	$0	$37.230	$27.464	$8.009	$7.383	$0	$58.355
	$194.806	$27.592	$24.236	$31.755	$50.032	$8.963		$105.709	$12.407	$0	$0
	1,64%	0,23%	1,10%	1,00%	1,57%	0,28%		3,28%	0,38%	0,00%	0,00%
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2 3 4 5

0,49%	**0,55%**	**0,55%**	**0,44%**	**0,54%**	**0,67%**	**1,30%**	**1,21%**	**1,20%**	**1,19%**	**1,52%**	**1,64%**
$1.135.172	**$1.279.687**	**$1.267.277**	**$1.008.977**	**$1.255.294**	**$1.560.020**	**$3.018.628**	**$2.794.750**	**$2.766.768**	**$2.763.364**	**$3.522.711**	**$3.803.287**
4,80%	**5,35%**	**5,90%**	**6,34%**	**6,88%**	**7,55%**	**8,86%**	**10,06%**	**11,26%**	**12,45%**	**13,97%**	**15,62%**
$11.113.635	**$12.393.321**	**$13.660.598**	**$14.669.575**	**$15.924.869**	**$17.484.890**	**$20.503.518**	**$23.298.268**	**$26.065.036**	**$28.828.400**	**$32.351.111**	**$36.154.397**
0,17%	**0,39%**	**0,84%**	**2,24%**	**1,43%**	**1,34%**	**1,57%**	**1,13%**	**1,01%**	**1,18%**	**0,72%**	**0,19%**
$384.632	**$910.878**	**$1.939.415**	**$5.183.650**	**$3.304.261**	**$3.104.942**	**$3.623.646**	**$2.610.147**	**$2.331.781**	**$2.730.866**	**$1.664.505**	**$433.626**
3,44%	**3,83%**	**4,67%**	**6,91%**	**8,34%**	**9,68%**	**11,24%**	**12,37%**	**13,38%**	**14,56%**	**15,28%**	**15,46%**
$7.964.422	**$8.875.300**	**$10.814.715**	**$15.998.365**	**$19.302.625**	**$22.407.567**	**$26.031.213**	**$28.641.360**	**$30.973.141**	**$33.704.007**	**$35.368.513**	**$35.802.139**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	$ 39.373.284	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:

Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:

Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VIAS WAYU Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2023	febrero 2023	marzo 2023	abril 2023	mayo 2023	junio 2023	julio 2023	agosto 2023	septiembre 2023	octubre 2023	noviembre 2023	diciembre 2023
0,90%	0,90%	0,35%	0,47%	0,35%	0,48%	0,48%	0,23%	0,46%	0,23%	0,45%	0,70%
$45.388	$45.388	$17.760	$23.680	$17.760	$24.446	$24.446	$11.546	$23.092	$11.546	$22.780	$35.133
0,59%	0,59%	0,35%	0,47%	0,35%	0,59%	0,59%	0,29%	0,59%	0,29%	0,36%	0,57%
$570.299	$570.299	$342.179	$456.239	$342.179	$570.299	$570.299	$285.149	$570.299	$285.149	$353.585	$552.654
0,58%	0,58%	0,35%	0,46%	0,35%	0,58%	0,58%	0,29%	0,58%	0,29%	0,36%	0,60%
$465.018	$465.018	$279.011	$372.014	$279.011	$465.018	$465.018	$232.509	$465.018	$232.509	$288.311	$483.897
0,36%	0,36%	0,18%	0,24%	0,18%	0,96%	0,96%	0,02%	0,04%	0,02%	0,79%	1,32%
$157.883	$157.883	$78.764	$105.018	$78.764	$423.801	$423.801	$9.641	$19.282	$9.641	$347.222	$582.774
0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,67%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%	0,00%
$0	$13.620	$0	$0	$9.374	$0	$13.620	$0	$0	$9.374	$0	$0
0,41%	0,41%	0,12%	0,16%	0,12%	0,12%	0,12%	0,03%	0,06%	0,03%	0,00%	0,00%
$13.293	$13.293	$3.971	$5.295	$3.971	$3.934	$3.934	$988	$1.977	$988	$0	$0
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0,54%	**0,55%**	**0,31%**	**0,42%**	**0,32%**	**0,64%**	**0,65%**	**0,23%**	**0,47%**	**0,24%**	**0,44%**	**0,71%**
$1.251.881	**$1.265.501**	**$721.685**	**$962.246**	**$731.059**	**$1.487.497**	**$1.501.117**	**$539.834**	**$1.079.667**	**$549.208**	**$1.011.898**	**$1.654.458**
16,16%	**16,70%**	**17,02%**	**17,43%**	**17,75%**	**18,39%**	**19,04%**	**19,27%**	**19,74%**	**19,97%**	**20,41%**	**21,13%**
$37.406.278	**$38.671.779**	**$39.393.464**	**$40.355.710**	**$41.086.769**	**$42.574.266**	**$44.075.383**	**$44.615.217**	**$45.694.884**	**$46.244.092**	**$47.255.990**	**$48.910.448**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2024	febrero 2024	marzo 2024	abril 2024	mayo 2024	junio 2024	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024
0,31%	0,75%	0,75%	0,46%	0,92%	0,46%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,25%
$15.570	$38.001	$38.001	$23.097	$46.195	$23.097	$46.195	$46.195	$46.195	$46.195	$46.195	$12.777
0,24%	0,59%	0,59%	0,30%	0,60%	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,17%
$234.358	$570.299	$570.299	$293.033	$586.065	$293.033	$586.065	$586.065	$586.065	$586.065	$586.065	$160.890
0,24%	0,58%	0,58%	0,30%	0,59%	0,30%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,16%
$191.094	$465.018	$465.018	$238.218	$476.436	$238.218	$476.436	$476.436	$476.436	$476.436	$476.436	$130.793
0,52%	0,34%	0,34%	0,21%	0,43%	0,21%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,12%
$230.140	$148.325	$148.325	$94.521	$189.042	$94.521	$189.042	$189.042	$189.042	$189.042	$189.042	$51.897
0,71%	0,00%	0,66%	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,55%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%
$14.413	$0	$13.341	$0	$0	$11.180	$0	$11.180	$0	$11.180	$0	$0
0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,60%	0,30%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,16%
$0	$0	$0	$9.608	$19.216	$9.608	$19.216	$19.216	$19.216	$19.216	$19.216	$5.275
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
0,30%	**0,53%**	**0,53%**	**0,28%**	**0,57%**	**0,29%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,16%**
$685.575	**$1.221.642**	**$1.234.983**	**$658.477**	**$1.316.954**	**$669.657**	**$1.316.954**	**$1.328.134**	**$1.316.954**	**$1.328.134**	**$1.316.954**	**$361.632**
21,42%	**21,95%**	**22,48%**	**22,77%**	**23,34%**	**23,63%**	**24,19%**	**24,77%**	**25,34%**	**25,91%**	**26,48%**	**26,64%**
$49.596.024	**$50.817.666**	**$52.052.649**	**$52.711.126**	**$54.028.080**	**$54.697.737**	**$56.014.691**	**$57.342.825**	**$58.659.779**	**$59.987.913**	**$61.304.867**	**$61.666.499**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GESTIÓN PREDIAL SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 086

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo 2025	junio 2025	julio 2025	agosto 2025	septiembre 2025	octubre 2025	noviembre 2025	diciembre 2025
0,66%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	2,75%	1,83%	1,83%	1,83%	1,97%
$33.513	$46.195	$46.195	$46.195	$46.195	$46.195	$46.195	$138.584	$92.389	$92.389	$92.389	$99.546
0,44%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	1,81%	1,21%	1,21%	1,21%	1,30%
$425.176	$586.065	$586.065	$586.065	$586.065	$586.065	$586.065	$1.758.196	$1.172.131	$1.172.131	$1.172.131	$1.262.921
0,43%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	1,78%	1,19%	1,19%	1,19%	1,28%
$345.642	$476.436	$476.436	$476.436	$476.436	$476.436	$476.436	$1.429.307	$952.871	$952.871	$952.871	$1.026.678
0,31%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	1,28%	0,86%	0,86%	0,86%	0,92%
$137.146	$189.042	$189.042	$189.042	$189.042	$189.042	$189.042	$567.127	$378.085	$378.085	$378.085	$407.370
0,55%	0,00%	0,55%	0,00%	0,55%	0,00%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%
$244.190	$0	$11.180	$0	$11.180	$0	$11.180	$11.180	$11.180	$11.180	$11.180	$11.180
0,43%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%	1,79%	1,19%	1,19%	1,19%	1,28%
$13.941	$19.216	$19.216	$19.216	$19.216	$19.216	$19.216	$57.647	$38.432	$38.432	$38.432	$41.408
44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
0,42%	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**0,57%**	**1,71%**	**1,14%**	**1,14%**	**1,14%**	**1,23%**
$966.597	**$1.316.954**	**$1.328.134**	**$1.316.954**	**$1.328.134**	**$1.316.954**	**$1.328.134**	**$3.962.042**	**$2.645.088**	**$2.645.088**	**$2.645.088**	**$2.849.103**
27,05%	**27,62%**	**28,20%**	**28,77%**	**29,34%**	**29,91%**	**30,48%**	**32,19%**	**33,34%**	**34,48%**	**35,62%**	**36,85%**
$62.633.096	**$63.950.050**	**$65.278.184**	**$66.595.138**	**$67.923.272**	**$69.240.226**	**$70.568.361**	**$74.530.403**	**$77.175.491**	**$79.820.579**	**$82.465.667**	**$85.314.770**

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6 DE 10

FECHA: 31/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2026	febrero 2026	marzo 2026	abril 2026	mayo 2026	junio 2026	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	octubre 2026	noviembre 2026	diciembre 2026
1,69%	0,92%	0,92%	0,92%	-0,01%	-0,01%	0,90%	-0,01%	-0,01%	0,90%	-0,01%	-0,01%
$85.233	$46.195	$46.195	$46.195	-$663	-$663	$45.532	-$663	-$663	$45.532	-$663	-$663
1,12%	0,60%	0,60%	0,60%	0,58%	0,58%	1,19%	0,58%	0,58%	1,19%	0,58%	0,58%
$1.081.341	$586.065	$586.065	$586.065	$565.274	$565.274	$1.151.339	$565.274	$565.274	$1.151.339	$565.274	$565.274
1,10%	0,66%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	1,26%	0,59%	0,59%	1,19%	0,66%	0,66%
$879.064	$532.308	$533.987	$533.987	$535.667	$535.667	$1.012.103	$476.436	$476.436	$962.871	$532.308	$531.890
0,79%	1,19%	1,57%	1,57%	1,95%	1,95%	2,15%	0,43%	0,43%	0,86%	1,19%	1,09%
$348.800	$525.460	$692.658	$692.658	$859.856	$859.856	$948.495	$189.042	$189.042	$378.085	$525.460	$481.342
0,55%	0,55%	0,00%	0,55%	1,28%	1,83%	1,28%	1,28%	1,83%	1,83%	1,28%	1,83%
$11.180	$11.180	$0	$11.180	$25.923	$37.103	$25.923	$25.923	$37.103	$37.103	$25.923	$37.103
1,10%	0,60%	0,60%	0,60%	0,63%	0,63%	1,23%	0,63%	0,63%	1,23%	0,63%	0,63%
$35.455	$19.216	$19.216	$19.216	$20.357	$20.357	$39.573	$20.357	$20.357	$39.573	$20.357	$20.357
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
1,05%	**0,74%**	**0,81%**	**0,82%**	**0,87%**	**0,87%**	**1,39%**	**0,55%**	**0,56%**	**1,12%**	**0,72%**	**0,71%**
$2.441.073	**$1.720.423**	**$1.878.121**	**$1.889.301**	**$2.006.414**	**$2.017.594**	**$3.222.964**	**$1.276.369**	**$1.287.549**	**$2.604.503**	**$1.668.658**	**$1.635.303**
37,91%	**38,65%**	**39,46%**	**40,28%**	**41,14%**	**42,01%**	**43,41%**	**43,96%**	**44,51%**	**45,64%**	**46,36%**	**47,07%**
$87.755.843	**$89.476.266**	**$91.354.388**	**$93.243.689**	**$95.250.103**	**$97.267.697**	**$100.490.661**	**$101.767.029**	**$103.054.578**	**$105.659.081**	**$107.327.738**	**$108.963.041**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7 DE 10

FECHA: 31/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXION ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato orinicial)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2027	febrero 2027	marzo 2027	abril 2027	mayo 2027	junio 2027	julio 2027	agosto 2027	septiembre 2027	octubre 2027	noviembre 2027	diciembre 2027
0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	1,21%	0,30%	0,30%	1,21%	0,30%	0,30%	1,21%	0,34%
$14.956	$14.956	$14.956	$14.956	$61.151	$14.956	$14.956	$61.151	$14.956	$14.956	$61.151	$17.160
0,59%	0,59%	0,59%	0,59%	1,19%	0,59%	0,59%	1,19%	0,59%	0,59%	1,19%	0,62%
$572.204	$572.204	$572.204	$572.204	$1.158.269	$572.204	$572.204	$1.158.269	$572.204	$572.204	$1.158.269	$600.162
0,66%	0,66%	0,66%	0,66%	1,19%	0,59%	0,59%	1,19%	0,59%	0,65%	1,25%	0,68%
$528.609	$528.165	$528.165	$528.165	$952.871	$476.436	$476.436	$952.871	$476.436	$523.816	$1.000.251	$547.333
2,05%	1,95%	1,95%	1,95%	0,86%	0,43%	0,43%	0,86%	0,43%	1,11%	1,54%	1,36%
$903.325	$859.208	$859.208	$859.207	$378.085	$189.042	$189.042	$378.085	$189.042	$489.926	$678.969	$598.782
0,85%	1,40%	0,85%	1,40%	1,40%	0,85%	1,40%	1,40%	0,85%	1,40%	1,40%	0,85%
$17.282	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282	$28.462	$28.462	$17.282
0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	1,22%	0,62%	0,62%	1,22%	0,62%	0,62%	1,22%	0,65%
$19.977	$19.977	$19.977	$19.977	$39.192	$19.977	$19.977	$39.192	$19.977	$19.977	$39.192	$20.893
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
0,89%	**0,87%**	**0,87%**	**0,87%**	**1,13%**	**0,56%**	**0,56%**	**1,13%**	**0,56%**	**0,71%**	**1,28%**	**0,78%**
$2.056.353	**$2.022.972**	**$2.011.792**	**$2.022.972**	**$2.618.031**	**$1.289.897**	**$1.301.077**	**$2.618.031**	**$1.289.897**	**$1.649.341**	**$2.966.295**	**$1.801.612**
47,95%	**48,83%**	**49,70%**	**50,57%**	**51,70%**	**52,26%**	**52,82%**	**53,95%**	**54,51%**	**55,22%**	**56,50%**	**57,28%**
$111.019.394	**$113.042.366**	**$115.054.159**	**$117.077.130**	**$119.695.162**	**$120.985.059**	**$122.286.136**	**$124.904.167**	**$126.194.064**	**$127.843.405**	**$130.809.700**	**$132.611.312**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 DE 10
FECHA	31/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN" VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2028	febrero 2028	marzo 2028	abril 2028	mayo 2028	junio 2028	julio 2028	agosto 2028	septiembre 2028	octubre 2028	noviembre 2028	diciembre 2028
0,25%	0,30%	1,46%	1,46%	1,46%	1,10%	1,10%	1,28%	1,46%	1,46%	0,45%	1,04%
$12.780	$14.983	$73.928	$73.901	$73.901	$55.423	$55.423	$64.662	$73.901	$73.901	$22.606	$52.318
0,56%	0,59%	1,36%	1,48%	1,48%	1,19%	1,19%	1,34%	1,48%	1,48%	0,74%	1,17%
$544.246	$572.204	$1.320.024	$1.437.237	$1.437.237	$1.155.925	$1.155.925	$1.296.581	$1.437.237	$1.437.237	$716.142	$1.138.568
0,77%	0,80%	1,35%	1,35%	1,35%	1,12%	1,12%	1,25%	1,35%	1,35%	0,69%	1,08%
$615.194	$637.922	$1.084.367	$1.084.367	$1.084.367	$893.793	$893.793	$989.080	$1.084.367	$1.084.367	$555.333	$861.770
1,55%	1,52%	0,97%	1,10%	1,10%	0,88%	0,88%	0,99%	1,10%	1,10%	0,55%	0,88%
$684.014	$670.671	$430.261	$486.973	$486.973	$388.671	$388.671	$437.822	$486.973	$486.973	$243.033	$386.626
1,40%	1,40%	1,40%	1,56%	1,40%	2,11%	1,40%	2,11%	0,85%	2,11%	0,85%	0,85%
$28.462	$28.462	$28.462	$31.548	$28.462	$42.728	$28.462	$42.728	$17.282	$42.728	$17.282	$17.282
0,59%	0,62%	1,38%	1,38%	1,38%	1,14%	1,14%	1,26%	1,38%	1,38%	0,72%	1,10%
$19.060	$19.977	$44.496	$44.496	$44.496	$36.810	$36.810	$40.653	$44.496	$44.496	$23.159	$35.518
80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
0,82%	**0,84%**	**1,29%**	**1,36%**	**1,36%**	**1,11%**	**1,11%**	**1,24%**	**1,36%**	**1,37%**	**0,68%**	**1,08%**
$1.903.756	**$1.944.219**	**$2.981.538**	**$3.158.522**	**$3.155.436**	**$2.573.350**	**$2.559.084**	**$2.871.526**	**$3.144.256**	**$3.169.702**	**$1.577.555**	**$2.492.083**
58,10%	**58,94%**	**60,23%**	**61,59%**	**62,96%**	**64,07%**	**65,17%**	**66,41%**	**67,77%**	**69,14%**	**69,82%**	**70,90%**
$134.515.068	**$136.459.288**	**$139.440.825**	**$142.599.347**	**$145.754.783**	**$148.328.134**	**$150.887.218**	**$153.758.744**	**$156.903.000**	**$160.072.702**	**$161.650.257**	**$164.142.340**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Apruebe Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	9 DE 10
FECHA	31/12/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA - SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO_2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2029	febrero 2029	marzo 2029	abril 2029	mayo 2029	junio 2029	julio 2029	agosto 2029	septiembre 2029	octubre 2029	noviembre 2029	diciembre 2029
0,82%	1,10%	1,10%	1,28%	1,10%	1,10%	1,28%	1,46%	1,46%	0,92%	0,92%	0,90%
$41.639	$55.423	$55.423	$64.662	$55.423	$55.423	$64.662	$73.901	$73.901	$46.184	$46.184	$45.241
1,04%	1,19%	1,19%	1,34%	1,19%	1,19%	1,34%	1,48%	1,48%	1,05%	1,05%	1,01%
$1.005.902	$1.155.925	$1.155.925	$1.296.581	$1.155.925	$1.155.925	$1.296.581	$1.437.237	$1.437.237	$1.015.270	$1.015.270	$997.589
0,94%	1,16%	1,16%	1,28%	1,16%	1,16%	1,28%	1,40%	1,40%	1,00%	1,00%	0,98%
$751.631	$933.178	$933.178	$1.028.465	$933.178	$933.178	$1.028.465	$1.123.752	$1.123.752	$798.506	$798.506	$786.528
0,78%	0,88%	0,88%	0,99%	0,88%	0,88%	0,99%	1,11%	1,11%	0,77%	0,77%	0,76%
$344.287	$389.872	$389.872	$439.023	$389.872	$389.872	$439.023	$488.174	$488.174	$339.520	$339.520	$333.342
2,11%	0,85%	1,56%	1,40%	1,56%	0,85%	2,11%	0,85%	2,11%	0,85%	1,56%	0,85%
$42.728	$17.282	$31.548	$28.462	$31.548	$17.282	$42.728	$17.282	$42.728	$17.282	$31.548	$17.282
0,96%	1,14%	1,14%	1,26%	1,14%	1,14%	1,26%	1,38%	1,38%	1,02%	1,02%	1,01%
$31.076	$36.810	$36.810	$40.653	$36.810	$36.810	$40.653	$44.496	$44.496	$32.966	$32.966	$32.483
92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
0,96%	**1,12%**	**1,12%**	**1,25%**	**1,12%**	**1,12%**	**1,26%**	**1,38%**	**1,39%**	**0,97%**	**0,98%**	**0,96%**
$2.217.263	**$2.588.490**	**$2.602.756**	**$2.897.846**	**$2.602.756**	**$2.588.490**	**$2.912.112**	**$3.184.842**	**$3.210.287**	**$2.249.728**	**$2.263.994**	**$2.212.466**
71,86%	**72,98%**	**74,10%**	**75,35%**	**76,48%**	**77,59%**	**78,85%**	**80,23%**	**81,61%**	**82,59%**	**83,56%**	**84,52%**
$166.359.604	**$168.948.093**	**$171.550.849**	**$174.448.695**	**$177.051.450**	**$179.639.940**	**$182.552.051**	**$185.736.893**	**$188.947.180**	**$191.196.908**	**$193.460.902**	**$195.673.368**

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 / $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 / $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 / $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 / $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 / $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 / $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 / $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	10 DE 10

FECHA: 31/12/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA **ACTA DE RECIBIDO PARCIAL DE OBRA No.** 19 DE dic-22 **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 433.625.741,00

SEGUIMIENTO No. 19
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 1009-2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLIVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1005-2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO GINPROVIAS VISIÓN 2030/191

PLAZO INICIAL: 110 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 110 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28/06/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 265.853.856.477,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 10.000.000.000,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 275.853.856.477,00

enero 2030	febrero 2030	marzo 2030	abril 2030	mayo 2030	junio 2030	julio 2030	agosto 2030				
0,99%	1,39%	1,39%	1,15%	1,15%	2,07%	2,19%	3,24%				
$50.204	$70.070	$70.070	$58.281	$58.281	$104.476	$110.420	$163.421				
1,35%	1,63%	1,63%	1,48%	1,48%	2,20%	2,28%	2,97%				
$1.307.331	$1.579.870	$1.579.870	$1.430.306	$1.430.306	$2.133.584	$2.208.991	$2.881.404				
1,95%	1,50%	1,50%	1,44%	1,44%	2,03%	2,11%	2,78%				
$1.560.803	$1.205.954	$1.205.954	$1.150.463	$1.150.463	$1.627.925	$1.690.253	$2.231.201				
1,01%	1,21%	1,21%	2,13%	2,13%	3,03%	3,42%	3,95%				
$444.001	$535.217	$535.217	$939.885	$939.885	$1.335.970	$1.510.623	$1.744.381				
2,54%	2,54%	1,28%	2,54%	1,28%	2,54%	1,83%	2,54%				
$51.369	$51.369	$25.923	$51.369	$25.923	$51.369	$37.103	$51.369				
1,29%	1,54%	1,54%	1,39%	1,39%	1,99%	2,07%	2,75%				
$41.516	$49.780	$49.780	$44.876	$44.876	$64.092	$66.565	$88.611				
104	105	106	107	108	109	110	111				

100%
50%
0%

1,49%	**1,51%**	**1,50%**	**1,59%**	**1,58%**	**2,30%**	**2,43%**	**3,09%**				
$3.455.224	**$3.492.260**	**$3.466.814**	**$3.675.180**	**$3.649.734**	**$5.317.416**	**$5.623.955**	**$7.160.386**				
86,01%	**87,52%**	**89,02%**	**90,60%**	**92,18%**	**94,48%**	**96,91%**	**100,00%**				
$199.128.592	**$202.620.852**	**$206.087.667**	**$209.762.847**	**$213.412.581**	**$218.729.997**	**$224.353.952**	**$231.514.339**				

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$24.652.634 $25.125.370	$ 2.921.913	11,63%
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$1.150.000 $1.150.000	$ -	%
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$1.811.301 $1.883.848	$ 282.983	15,02%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.500.000 $1.500.000	$ 300.000	20,00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$285.000 $285.000	$ 57.000	20,00%
GESTION SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA19%)	$13.987.300 $13.987.300	$ 4.246,78	$ 0,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$408.000 $408.000	$ 5.002,16	%
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$43.794.235	$ 3.571.145	66,68%
VALOR TOTAL PROVISIONES ACTUALIZADAS (B')	$44.339.518		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 265.853.856**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$275.853.856**	**$ 39.373.284**	**14,27%**

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: Reprogramación No. 4 por inclusión de precios no previstos NP11 a NP19

Aprueba Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER GREGORY PRETELL**
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-33965 CAU

Revisó Firma:
Nombre: **NESTOR BELTRAN MORA**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-03051 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 10/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** LA GUAJIRA PERIODO MES: dic-22

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 19D (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: -$ 560.666

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10-abr-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NESTOR BELTRAN MORA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10-abr-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NESTOR BELTRAN MORA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	11-abr-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	DUBIN CAMARGO	Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	12-abr-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Guillermo Pinto S.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	27-abr-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Isolier Andrés Eguis Benitez	Firmado digitalmente por ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 1009 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA - PUERTO BOLÍVAR - ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066 **NIT.** 901.477.981-6

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, GERENTE DE GRANDES PROYECTOS REGIONALES 1 (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: UNIÓN TEMPORAL ANDINO 066

VALOR TOTAL A PAGAR: -$ 564.763 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: MENOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTE 19D (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** dic-23 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Matricula profesional No.: 08202-38090 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: LUIS GUILLERMO PINTO SOLER
Matrícula No. 15202-281003 BYC
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Firma
Nombre: ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ
Matrícula Profesional No.: 25202-96720 CND
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional

2000 - 2021

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	**100,93**	**101,34**	**101,94**	**101,93**	**102,39**	**102,80**	**103,50**	**103,62**	**103,44**	**103,30**	**103,42**	**103,78**
Canasta General												
Equipos	100,61	100,900	101,12	100,99	101,43	101,60	102,01	102,17	102,18	102,19	102,25	102,261
Materiales	101,12	101,650	102,62	102,61	103,23	103,81	104,84	104,98	104,64	104,36	104,57	105,203
Transporte	100,09	100,050	100,05	100,05	100,08	100,31	100,33	100,34	100,34	100,39	100,41	100,429
Mano de obra	101,25	101,590	101,76	101,93	102,03	102,26	102,51	102,56	102,57	102,58	102,56	102,556
Obras de explanación	100,73	101,141	101,40	101,48	101,83	102,06	102,65	102,85	102,91	103,07	103,15	103,211
Subbases y bases	100,71	100,763	101,46	101,61	101,59	101,95	102,22	102,16	102,23	102,20	102,40	102,425
Transporte de materiales	100,24	100,393	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,890
Aceros y elementos metálicos	101,59	103,719	104,69	106,46	107,81	108,09	109,17	109,82	109,10	108,16	108,06	108,281
Concretos, morteros y obras varias	101,32	101,907	102,07	102,31	102,62	102,96	103,91	104,07	103,96	103,79	103,90	104,296
Concreto para estructura de puentes	101,39	101,214	99,88	99,41	98,52	98,93	98,95	98,76	98,93	98,80	98,55	99,335
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,26	100,133	102,57	101,17	102,71	103,55	104,42	104,48	103,68	103,45	103,81	104,671

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

GOBIERNO DE COLOMBIA

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16. ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												2022											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.1 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C.

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase CPC	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Ponderación	2021												2022											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.2. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Ponderación	2021												2022											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra	2021												2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y c	22,06	100,23	101,15	101,42	101,50	101,86	102,09	102,72	102,82	102,86	103,14	103,21	103,28	104,36	105,59	106,33	107,22	108,07	108,34	109,12	105,17	109,49	110,04	110,42	110,31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subl	18,69	100,70	100,76	101,46	101,62	101,60	101,96	102,24	102,18	102,24	102,21	102,42	102,44	103,71	104,89	105,19	105,76	106,58	107,02	108,07	107,64	107,83	108,53	108,73	108,89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asf	38,51	100,90	101,20	102,53	102,02	102,91	103,25	104,31	104,29	103,81	103,50	103,66	104,35	106,80	109,36	110,34	113,44	114,11	113,62	116,71	116,86	116,76	118,63	119,18	118,60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidr	7,09	101,50	103,14	103,95	105,33	106,53	107,48	108,56	109,28	108,78	108,61	109,16	109,42	110,96	111,37	114,95	117,49	118,65	118,22	118,79	118,45	118,42	119,33	119,69	119,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbani	0,96	100,69	101,17	101,67	102,42	102,53	102,97	104,54	104,39	104,56	104,88	104,98	105,35	107,61	110,00	110,71	111,38	112,36	113,02	113,11	113,07	113,09	113,49	113,64	113,75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnic	4,07	101,36	101,84	102,86	104,40	105,05	105,45	107,62	107,99	108,14	108,36	108,49	108,95	111,12	112,85	113,76	114,86	115,31	115,13	116,29	116,39	116,82	118,44	118,64	118,22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y s	4,40	100,57	101,94	101,43	102,12	100,42	100,81	101,71	101,20	102,19	101,70	102,00	102,36	105,12	106,29	106,98	109,61	110,03	110,83	111,66	113,69	112,65	114,40	116,28	114,26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y so	4,22	100,24	100,39	100,42	100,45	100,42	100,77	100,81	100,82	100,84	100,89	100,89	100,89	101,56	101,84	102,77	103,21	104,21	104,62	105,41	105,48	105,50	105,53	105,53	105,74
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subs	15,73	101,10	101,28	101,15	100,84	101,07	101,66	102,16	102,31	102,10	101,90	101,84	102,58	105,35	107,06	108,69	110,41	111,48	111,70	113,46	113,98	114,03	115,39	115,54	115,29

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos

Grupos de costos	Ponderación	2021												2022											
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.5 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos y grupos de insumos

Grupos de costos	Código de agregación grupo	Grupos de insumos	Ponderación	2021												2022											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
				Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.6 ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos

Código grupos CPC V	Grupos CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación	Grupos de costos	Ponderación al grupo CPC V2	2021												2022											
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
					Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.7 ICOCIV - Serie histórica índice por agrupaciones de subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

Código grupos CPC V 2.0 A.C.	Grupos CPC V 2.0 A.C.	Grupos de costos	Código de agregación grupo de insumos	Grupos de insumos	Ponderación al grupo CPC V2 A.C.	2021												2022											
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
						Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.8 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de costos

Código grupos CPC V	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación	Grupos de costos	Ponderación a la subclase	2021												2022											
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
							Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	11	Carreteras (excepto	1	Materiales	54,83	100,99	101,42	102,43	102,93	103,46	104,13	105,73	105,87	105,81	105,82	106,19	106,79	108,99	110,92	111,95	114,10	114,52	114,79	116,92	116,76	116,97	119,13	119,68	119,27
530201	53211	11	Carreteras (excepto	2	Herramienta menor	1,58	100,85	101,50	102,12	102,76	102,32	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81
530201	53211	11	Carreteras (excepto	3	Maquinaria	12,84	100,58	100,89	101,08	100,87	101,50	101,58	102,10	102,30	102,29	102,22	102,35	102,32	103,47	104,54	104,85	105,47	106,46	106,88	107,79	107,95	108,44	108,91	108,88	108,71
530201	53211	11	Carreteras (excepto	4	Equipos	4,19	100,35	100,46	100,56	100,65	100,64	100,96	101,15	101,29	101,34	101,52	101,40	101,40	102,30	103,38	103,73	103,88	104,03	104,29	104,66	105,09	105,32	105,64	105,90	106,30
530201	53211	11	Carreteras (excepto	5	Mano de obra	14,15	101,09	101,35	101,45	101,67	101,72	101,98	102,20	102,29	102,29	102,31	102,32	102,52	104,66	106,66	106,99	106,73	106,95	107,44	107,65	107,67	107,68	107,71	107,76	107,84

A16.9 ICOCIV - Serie histórica índice por subclases CPC V 2.0 A.C. y grupos de insumos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de agregación subclase	Subclases CPC V 2.0 A.C.	Grupos de costos	Código de agregación grupo de insumos	Grupos de insumos	Ponderación a la subclase CPC V2.0 A.C.	2021												2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	101	Arena	0,33	100,82	101,02	102,13	102,55	104,86	104,30	104,48	105,23	105,15	105,20	105,34	105,40	106,16	107,04	108,67	109,46	110,18	110,92	112,02	112,52	113,03	113,23	113,75	114,27
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	102	Arborización	0,38	100,58	100,75	100,83	101,39	101,26	101,43	101,91	102,64	102,97	103,46	103,23	103,39	104,42	104,69	105,57	106,33	106,83	107,73	108,51	109,10	109,58	110,85	111,01	111,93
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	103	Consumibles	3,78	98,12	99,28	100,83	102,36	101,60	104,95	116,42	118,40	117,08	116,70	116,94	116,33	119,11	123,52	119,35	120,45	120,63	118,07	124,53	122,91	124,92	140,49	139,57	136,31
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	104	Malla	0,38	102,85	104,44	107,26	109,72	112,50	115,01	118,32	119,71	120,26	120,69	120,20	119,54	120,40	120,11	119,33	121,79	124,51	124,54	124,97	126,32	127,10	126,41	125,92	125,68
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	105	Alambre	0,11	101,87	104,33	108,27	111,73	114,67	118,97	122,31	124,60	127,20	129,22	130,26	130,55	131,49	132,19	133,37	135,89	137,32	138,06	138,49	138,82	138,97	138,95	139,01	139,31
530201	53211	11	Carreteras (excepto	Materiales	106	Acero corrugad	1,45	105,10	114,32	120,30	126,61	136,68	136,51	137,57	141,88	134,25	128,21	126,21	124,94	123,30	122,52	136,70	152,96	160,15	153,44	149,29	143,29	138,51	138,00	139,09	134,48

A16.10 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de costos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación grupo de costos	Grupos de costos	Ponderación a la tipología de obra	2021												2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.11. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y grupos de insumos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Código de agregación tipología de obra	Tipología de obra	Grupos de costos	Código de agregación grupo de insumos	Grupo de insumos	Ponderación a la tipología de obra	2021												2022											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.12. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos por costos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-	Tipología de obra - capítulo constructivo	Código de agregación grupo de	Grupos de costos	Ponderación a la obra y su capítulo	2021												2022											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

A16.13. ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra, capítulos constructivos y grupos de insumos

Código grupos CPC V 2.0 A.C	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-	Tipología de obra - capítulo constructivo	Grupos de costos	Código de agregación grupo de	Grupos de insumos	Ponderación a la obra y su capítulo	2021												2022											
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
										Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice

Fuente: DANE.

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C., en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de enero de 2023

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrariasc	RODRIGO ARIAS CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	1/03/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38323 de fecha 2023-03-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	215923	**Fecha Registro:**	2023-03-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.972.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.972.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	10.972.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901477981	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL ANDINO 066	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	263862344	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91108270	**Nombre:**	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	1009/2021	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-03-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402021-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF		93.192.823,00	0,00		
					Total:	93.192.823,00	0,00	93.192.823,00	93.192.823,00

13-21 SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES	C-2402-0600-13-0-2402006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA SECUNDARIA MEJORADA - CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTAR TERRITORIOS, GOBIERNOS Y POBLACIONES. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						10.878.807.177,00	0,00		
					Total:	10.878.807.177,00	0,00	10.878.807.177,00	10.878.807.177,00

Objeto:	VIGENCIA FUTURA SVR CON 1009/2021 C.E P 114 MESES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL AMBIENTAL CORREDOR CONEXIÓN ALTA GUAJIRA URIBIA PUERTO BOLÍVAR ESTRELLA - VÍAS WAYÚ Y CABO DE LA VELA – SAN MARTIN DEP GUAJIRA, EN MARCO REACTIV

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-04-28	10.972.000.000,00	10.972.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Firmado digitalmente por LEIDY MARIANA APONTE QUINCOS
