CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ACERO

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181718

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321488/310	PED22000023652206067	FIG COR NTC 2289 1"	0802012023	2.969

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	BTM12080	GR 60	0,27	1,09	0,008	0,018	0,21	0,06	0,03	0,02	0,01	0,001	0,001	0,46
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	BTM12222	GR 60	0,27	1,08	0,011	0,018	0,21	0,15	0,11	0,06	0,02	0,001	0,001	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	BTM12080	8	486	637	1,31	16,0	3,921	OK	17,20	2,11	5,70		
110000105	BAR COR NTC 2289 1" 12m REV	BTM12222	8	475	627	1,32	17,0	3,870	OK	17,20	1,82	5,50		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 3,735 kg/m		máx 17,60 mm	min 1,27 mm	máx 9,70 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181718

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321488/320	PED22000023652206067	FIG COR NTC 2289 1/2"	0402012023	383

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,16	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204417	GR 60	0,29	0,96	0,020	0,019	0,15	0,34	0,10	0,14	0,04	0,000	0,008	0,48
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204413	GR 60	0,28	0,98	0,014	0,018	0,13	0,36	0,11	0,10	0,03	0,000	0,005	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204417	4	464	616	1,33	16,0	0,945	OK	8,21	1,22	1,76		
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204413	4	477	617	1,29	15,0	0,939	OK	8,23	1,24	1,79		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181719

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321489/360	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 5/8"	0502012023	2.330

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	GR 60	0,27	1,04	0,017	0,021	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,003	0,45
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203087	GR 60	0,27	0,94	0,016	0,035	0,13	0,37	0,12	0,11	0,02	0,000	0,005	0,45
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203094	GR 60	0,29	0,99	0,018	0,030	0,16	0,37	0,12	0,06	0,02	0,000	0,005	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	5	495	637	1,29	19,0	1,556	OK	10,60	0,83	3,60		
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203087	5	460	595	1,29	16,0	1,465	OK	9,70	1,30	4,48		
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203094	5	477	619	1,30	17,0	1,465	OK	9,71	1,30	4,55		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181719

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321489/370	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 7/8"	0702012023	6.786

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	GR 60	0,29	1,11	0,012	0,041	0,19	0,36	0,09	0,10	0,01	0,000	0,027	0,50
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	GR 60	0,26	1,13	0,012	0,038	0,21	0,27	0,08	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	GR 60	0,28	1,18	0,016	0,032	0,15	0,32	0,10	0,15	0,03	0,003	0,027	0,50
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	GR 60	0,27	1,08	0,011	0,038	0,20	0,24	0,13	0,11	0,03	0,002	0,026	0,47
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	GR 60	0,28	1,11	0,015	0,042	0,17	0,27	0,12	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	GR 60	0,26	1,11	0,010	0,037	0,17	0,31	0,10	0,10	0,02	0,000	0,028	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	7	479	634	1,33	18,0	2,961	OK	15,06	1,44	4,28		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	7	459	623	1,36	18,2	2,918	OK	14,54	1,48	4,47		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	7	472	640	1,36	16,1	2,915	OK	14,53	1,43	4,40		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	7	447	605	1,35	19,4	2,964	OK	14,38	1,42	4,23		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	7	448	598	1,34	20,4	2,986	OK	14,42	1,55	4,35		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	7	458	610	1,33	19,3	2,955	OK	15,03	1,35	4,31		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181720

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321490/340	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 3/4"	0602012022	622

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019701	GR 60	0,29	1,13	0,009	0,026	0,19	0,23	0,11	0,13	0,02	0,003	0,028	0,50
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	GR 60	0,27	1,11	0,010	0,026	0,18	0,29	0,11	0,12	0,02	0,002	0,026	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,040	0,19	0,34	0,13	0,11	0,04	0,000	0,002	0,48
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	GR 60	0,25	0,99	0,019	0,023	0,18	0,28	0,16	0,35	0,05	0,002	0,003	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Sep		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019701	NA	478	627	1,31	18,0	2,172	OK	12,55	1,20	4,71		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	NA	464	613	1,32	19,5	2,195	OK	12,49	1,27	4,93		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	6	488	628	1,29	18,4	2,180	OK	12,50	1,29	4,80		
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	NA	474	621	1,31	15,6	2,186	OK	12,43	1,35	4,66		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,87 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181720

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321490/360	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 5/8"	0502012023	2.476

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27116	GR 60	0,27	1,04	0,017	0,021	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,003	0,45
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203087	GR 60	0,27	0,94	0,016	0,035	0,13	0,37	0,12	0,11	0,02	0,000	0,005	0,45
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203094	GR 60	0,29	0,99	0,018	0,030	0,16	0,37	0,12	0,06	0,02	0,000	0,005	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27116	5	495	637	1,29	19,0	1,556	OK	10,60	0,83	3,60		
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203087	5	460	595	1,29	16,0	1,485	OK	9,70	1,30	4,48		
110000505	BAR COR NTC 2289 5/8" 6M IMP	2203094	5	477	619	1,30	17,0	1,485	OK	9,71	1,30	4,55		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181720

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321490/360	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 5/8"	0527122022	1

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1725292401	GR 60	0,27	1,05	0,021	0,039	0,19	0,31	0,10	0,17	0,03	0,003	0,003	0,47
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725291301	GR 60	0,26	1,00	0,017	0,026	0,18	0,26	0,08	0,11	0,02	0,003	0,002	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
110000173	BAR COR NTC 2289 5/8" 14m	1725292401	5
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725291301	5
Rangos de referencia según norma			

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
485	627	1,29	16,6	1,534	OK
466	600	1,29	18,9	1,523	OK
420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Sep		
10,58	1,05	4,53		
10,60	1,02	4,53		
máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181720

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321490/370	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 7/8"	0702012023	6.198

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	GR 60	0,29	1,11	0,012	0,041	0,19	0,38	0,08	0,10	0,01	0,000	0,027	0,50
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	GR 60	0,28	1,13	0,012	0,038	0,21	0,27	0,08	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	GR 60	0,28	1,18	0,016	0,032	0,15	0,32	0,10	0,15	0,03	0,003	0,027	0,50
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	GR 60	0,27	1,08	0,011	0,038	0,20	0,24	0,13	0,11	0,03	0,002	0,026	0,47
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	GR 60	0,28	1,11	0,015	0,042	0,17	0,27	0,12	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	GR 60	0,28	1,11	0,010	0,037	0,17	0,31	0,10	0,10	0,02	0,000	0,028	0,48
	Rangos de referencia según norma			máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	7	479	634	1,33	18,0	2,961	OK	15,08	1,44	4,28		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	7	459	623	1,36	18,2	2,918	OK	14,54	1,48	4,47		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	7	472	640	1,36	16,1	2,915	OK	14,53	1,43	4,40		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	7	447	605	1,35	19,4	2,964	OK	14,38	1,42	4,23		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	7	448	598	1,34	20,4	2,986	OK	14,42	1,55	4,35		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	7	458	610	1,33	19,3	2,955	OK	15,03	1,35	4,31		
	Rangos de referencia según norma			420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181721

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321491/340	PED2200023652206073	FIG COR NTC 2289 3/4"	0602012022	3.634

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019701	GR 60	0,29	1,13	0,009	0,026	0,19	0,23	0,11	0,13	0,02	0,003	0,028	0,50
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	GR 60	0,27	1,11	0,010	0,026	0,18	0,29	0,11	0,12	0,02	0,002	0,026	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,040	0,19	0,34	0,13	0,11	0,04	0,000	0,002	0,48
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	GR 60	0,25	0,99	0,019	0,023	0,18	0,28	0,16	0,35	0,05	0,002	0,003	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019701	NA	478	627	1,31	18,0	2,172	OK	12,55	1,20	4,71		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	NA	464	613	1,32	19,5	2,195	OK	12,49	1,27	4,93		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	6	488	628	1,29	18,4	2,180	OK	12,50	1,29	4,80		
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	NA	474	621	1,31	15,6	2,166	OK	12,43	1,35	4,66		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181721

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321491/350	PED22000023652206073	FIG COR NTC 2289 3/8"	0302012022	1.045

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,040	0,17	0,33	0,16	0,15	0,04	0,003	0,037	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	3	469	700	1,49	15,0	0,550	OK	6,37	0,58	2,00		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181722

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321492/340	PED22000023652206084	FIG COR NTC 2289 3/4"	0602012022	1.795

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1725019701	GR 60	0,29	1,13	0,009	0,026	0,19	0,23	0,11	0,13	0,02	0,003	0,028	0,50
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1725019601	GR 60	0,27	1,11	0,010	0,026	0,18	0,29	0,11	0,12	0,02	0,002	0,026	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,040	0,19	0,34	0,13	0,11	0,04	0,000	0,002	0,48
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	GR 60	0,25	0,99	0,019	0,023	0,18	0,28	0,16	0,35	0,05	0,002	0,003	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1725019701	NA	476	627	1,31	18,0	2,172	OK	12,55	1,20	4,71		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 6m	1725019601	NA	464	613	1,32	19,5	2,195	OK	12,49	1,27	4,93		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	6	488	628	1,29	18,4	2,180	OK	12,50	1,29	4,80		
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	NA	474	621	1,31	15,6	2,166	OK	12,43	1,35	4,66		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 12,00%	min 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181722

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321492/350	PED22000023652206084	FIG COR NTC 2289 3/8"	0302012022	2.637

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,040	0,17	0,33	0,16	0,15	0,04	0,003	0,037	0,47
			Rangos de referencia según norma	máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	3	469	700	1,49	15,0	0,550	OK	6,37	0,58	2,00
			Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181722

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321492/370	PED22000023652206084	FIG COR NTC 2289 7/8"	0702012023	1.026

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	GR 60	0,29	1,11	0,012	0,041	0,19	0,38	0,08	0,10	0,01	0,000	0,027	0,50
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	GR 60	0,28	1,13	0,012	0,038	0,21	0,27	0,08	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	GR 60	0,28	1,18	0,016	0,032	0,15	0,32	0,10	0,15	0,03	0,003	0,027	0,50
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	GR 60	0,27	1,08	0,011	0,038	0,20	0,24	0,13	0,11	0,03	0,002	0,026	0,47
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	GR 60	0,28	1,11	0,015	0,042	0,17	0,27	0,12	0,12	0,03	0,003	0,028	0,49
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	GR 60	0,28	1,11	0,010	0,037	0,17	0,31	0,10	0,10	0,02	0,000	0,028	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725037201	7	479	634	1,33	18,0	2,961	OK	15,08	1,44	4,28		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280401	7	459	623	1,36	18,2	2,918	OK	14,54	1,48	4,47		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	7	472	640	1,36	18,1	2,915	OK	14,53	1,43	4,40		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906701	7	447	605	1,35	19,4	2,964	OK	14,38	1,42	4,23		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1724906601	7	448	598	1,34	20,4	2,986	OK	14,42	1,55	4,35		
110000149	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m	1725036801	7	458	610	1,33	19,3	2,955	OK	15,03	1,35	4,31		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2,659 kg/m		máx 15,50 mm	min 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radicactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181722

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321492/370	PED22000023652206084	FIG COR NTC 2289 7/8"	0729122022	1

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000222	BAR COR NTC 2289 7/8" 8m	1725036701	GR 60	0,27	1,14	0,014	0,033	0,19	0,30	0,08	0,08	0,01	0,000	0,027	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000222	BAR COR NTC 2289 7/8" 8m	1725036701	7	470	624	1,33	19,1	2,966	OK	15,04	1,40	4,38		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181723

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321493/350	PED22000023652206084	FIG COR NTC 2289 3/8"	0302012022	819

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,040	0,17	0,33	0,16	0,15	0,04	0,003	0,037	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	3	469	700	1,49	15,0	0,550	OK	6,37	0,58	2,00		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO
DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131181723

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321493/350	PED22000023652205084	FIG COR NTC 2289 3/8"	0302012023	657

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	GR 60	0,28	0,99	0,018	0,030	0,15	0,27	0,09	0,15	0,02	0,002	0,037	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	3	463	676	1,46	17,2	0,550	OK	6,37	0,57	2,06		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 02.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131181812

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321645/320	PED22000023652206080	FIG COR NTC 2289 1/2"	0403012023	3.949

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131181812

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321645/320	PED22000023652206080	FIG COR NTC 2289 1/2"	0402012023	1 .

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204417	GR 60	0,29	0,96	0,020	0,019	0,15	0,34	0,10	0,14	0,04	0,000	0,008	0,48
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204413	GR 60	0,28	0,98	0,014	0,018	0,13	0,36	0,11	0,10	0,03	0,000	0,005	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204417	4	464	616	1,33	16,0	0,945	OK	8,21	1,22	1,76		
110000507	BAR COR NTC 2289 1/2" 6M IMP	2204413	4	477	617	1,29	15,0	0,939	OK	8,23	1,24	1,79		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO
DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131181812

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321645/340	PED22000023652206080	FIG COR NTC 2289 3/4"	0603012023	226

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	GR 60	0,25	0,99	0,019	0,023	0,18	0,26	0,16	0,35	0,05	0,002	0,003	0,46
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	GR 60	0,27	1,11	0,010	0,026	0,18	0,29	0,11	0,12	0,02	0,002	0,026	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	NA	474	621	1,31	15,6	2,166	OK	12,43	1,35	4,66		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	NA	464	613	1,32	19,5	2,195	OK	12,49	1,27	4,93		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181813

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321646/340	PED22000023652206096	FIG COR NTC 2289 3/4"	0603012023	1.565

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	GR 60	0,25	0,99	0,019	0,023	0,18	0,28	0,16	0,35	0,05	0,002	0,003	0,46
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	GR 60	0,27	1,11	0,010	0,026	0,18	0,29	0,11	0,12	0,02	0,002	0,026	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000142	BAR COR NTC 2289 3/4" 9m	1725237901	NA	474	621	1,31	15,6	2,168	OK	12,43	1,35	4,66		
110000224	BAR COR NTC 2289 3/4" 8m	1725019601	NA	464	613	1,32	19,5	2,195	OK	12,49	1,27	4,93		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181813

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321646/340	PED22000023662206096	FIG COR NTC 2289 3/4"	0630122022	1

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725231901	GR 60	0,28	1,08	0,014	0,027	0,19	0,34	0,18	0,14	0,04	0,000	0,003	0,49
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0102217	GR 60	0,26	1,10	0,016	0,029	0,17	0,15	0,06	0,14	0,02	0,001	0,022	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725144801	GR 60	0,27	1,08	0,018	0,033	0,18	0,35	0,13	0,21	0,03	0,002	0,002	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	GR 60	0,28	1,05	0,012	0,040	0,19	0,34	0,13	0,11	0,04	0,000	0,002	0,48
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725231801	GR 60	0,25	1,05	0,013	0,032	0,17	0,35	0,15	0,15	0,04	0,000	0,002	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725231901	6	468	636	1,36	17,8	2,201	OK	12,44	1,36	4,87		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0102217	6	460	621	1,35	16,0	2,220	OK	13,10	1,52	5,20		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725144801	6	483	645	1,34	16,9	2,197	OK	12,52	1,21	4,90		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725067301	6	488	628	1,29	18,4	2,180	OK	12,50	1,29	4,80		
110000138	BAR COR NTC 2289 3/4" 14m	1725231801	6	471	619	1,31	20,0	2,192	OK	12,39	1,40	4,43		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131181813

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321646/350	PED22000023652206096	FIG COR NTC 2289 3/8"	0303012023	383

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	GR 60	0,26	0,99	0,018	0,030	0,15	0,27	0,09	0,15	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	GR 60	0,27	1,01	0,011	0,040	0,17	0,33	0,16	0,15	0,04	0,003	0,037	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3600%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	3	463	676	1,46	17,2	0,550	OK	6,37	0,57	2,08		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725182301	3	469	700	1,49	15,0	0,550	OK	6,37	0,58	2,00		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,528 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO
DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131181813

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007321646/370	PED22000023652206096	FIG COR NTC 2289 7/8"	0703012023	1.022

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	GR 60	0,28	1,18	0,016	0,032	0,15	0,32	0,10	0,15	0,03	0,003	0,027	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	7	472	640	1,36	16,1	2,915	OK	14,53	1,43	4,40		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 6,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 03.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

#56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190075

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329175/350	PED22000023652206123	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	187

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C E
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	GR 60	0,28	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,28	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R T/R F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	3	460	679	1,48	16,8	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	486	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,520 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190075

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329175/360	PED22000023652206123	FIG COR NTC 2289 5/8"	0523012023	275

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	GR 60	0,28	1,04	0,022	0,016	0,21	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,004	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	482	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	5	489	638	1,31	19,0	1,548	OK	10,60	0,80	3,70		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

DIACO

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR



...nal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190076

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329176/320	PED22000023652206123	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	230

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190076

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329176/350	PED22000023652206123	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	157

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	GR 60	0,28	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,26	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	3	460	679	1,48	16,8	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	466	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

...gonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190077

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329177/320	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	261

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO



...onal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia,
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190080

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329179/350	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	442

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	GR 60	0,28	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,28	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	3	460	679	1,48	16,8	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	486	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,528 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190080

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329179/360	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 5/8"	0523012023	612

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	GR 60	0,28	1,04	0,022	0,016	0,21	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,004	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	5	489	638	1,31	19,0	1,548	OK	10,80	0,80	3,70
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm


OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR





...nal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
...P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190080

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329179/370	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 7/8"	0723012023	115

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	GR 60	0,28	1,18	0,016	0,032	0,15	0,32	0,10	0,15	0,03	0,003	0,027	0,50
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	GR 60	0,26	1,12	0,012	0,037	0,21	0,18	0,06	0,15	0,02	0,002	0,024	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS / **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000458	BAR COR NTC 2289 7/8" 12m DIST	1725280501	7	472	640	1,36	16,1	2,915	OK	14,53	1,43	4,40		
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	5	444	599	1,35	17,0	2,962	OK	14,60	1,51	4,30		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	min 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO



REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190081

...onal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329180/320	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	336

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espacl	Altura	Sep
8,50	0,80	2,80
máx 8,90 mm	mín 0,51 mm	máx 4,90 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #55 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190081

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329180/350	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	313

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	GR 60	0,26	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,26	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	3	460	679	1,48	16,8	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	488	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR



S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190081

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329180/360	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 5/8"	0523012023	151

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,26	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	GR 60	0,28	1,04	0,022	0,016	0,21	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,004	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	5	489	638	1,31	18,0	1,548	OK	10,60	0,80	3,70		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190082

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329181/320	PED23000000692300011	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	2.075

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS — Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	6,50	0,80	2,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,934 kg/m		máx 8,80 mm	mín 0,51 mm	máx 4,80 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190082

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329181/350	PED23000000692300011	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	961

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	GR 60	0,28	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,28	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725168801	3	460	679	1,48	16,6	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	486	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,528 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190083

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329182/350	PED23000000692300012	FIG COR NTC 2289 3/8"	0323012023	717

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	GR 60	0,26	1,00	0,013	0,033	0,15	0,27	0,15	0,12	0,04	0,003	0,037	0,45
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725166801	GR 60	0,28	1,01	0,015	0,037	0,16	0,30	0,09	0,11	0,02	0,003	0,036	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	GR 60	0,28	1,02	0,009	0,032	0,20	0,28	0,11	0,10	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	GR 60	0,27	1,00	0,019	0,031	0,20	0,26	0,10	0,20	0,02	0,002	0,037	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725380201	3	461	627	1,36	15,1	0,547	OK	6,39	0,57	2,24		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725166801	3	460	679	1,48	16,8	0,552	OK	6,41	0,60	2,07		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724965301	3	486	703	1,45	15,8	0,555	OK	6,44	0,62	2,13		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1724971901	3	487	701	1,44	16,3	0,547	OK	6,42	0,58	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radiactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
CP - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131190083

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329182/350	PED23000000692300012	FIG COR NTC 2289 3/8"	0328122022	1

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725223601	GR 60

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
	0,28	1,02	0,021	0,037	0,15	0,34	0,17	0,13	0,04	0,003	0,037	0,48
Rangos de referencia según norma	máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725223601	3

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado
	499	678	1,36	15,4	0,544	OK
Rangos de referencia según norma	420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,526 kg/m	

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Espaci	Altura	Sep		
6,42	0,59	1,92		
máx 8,70 mm	min 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES


Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO



REPORTE DE ENSAYOS

...nal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190083

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329182/360	PED23000000692300012	FIG COR NTC 2289 5/8"	0523012023	1.335

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	GR 60	0,28	1,04	0,022	0,016	0,21	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,004	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27119	5	489	638	1,31	19,0	1,548	OK	10,60	0,80	3,70		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190078

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329178/320	PED22000023652206124	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	392

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,80 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

...nal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
...P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131190072

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007329174/320	PED22000023652206123	FIG COR NTC 2289 1/2"	0423012023	130

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,26	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Sep		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 23.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193458

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331838/370	PED23000000692300196	FIG COR NTC 2289 7/8"	0728012023	4.647

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000104	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m REV	A0103904	GR 60	0,28	1,24	0,017	0,026	0,20	0,20	0,08	0,19	0,02	0,002	0,024	0,52
110000103	BAR COR 7/8" NTC 2289 12m REV	A0103997	GR 60	0,28	1,09	0,010	0,033	0,16	0,16	0,06	0,15	0,02	0,002	0,024	0,49
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0101680	GR 60	0,29	1,20	0,013	0,027	0,21	0,17	0,07	0,12	0,02	0,002	0,023	0,51
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000104	BAR COR NTC 2289 7/8" 9m REV	A0103904	7	496	677	1,36	16,0	3,020	OK	14,70	1,55	5,80		
110000103	BAR COR 7/8" NTC 2289 12m REV	A0103997	7	488	627	1,34	15,0	2,970	OK	14,80	1,56	4,80		
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0101680	5	492	662	1,35	18,0	3,010	OK	14,80	1,52	5,00		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 12,00%	mín 2,859 kg/m		máx 16,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA, 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193457

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331837/350	PED23000000692300141	FIG COR NTC 2289 3/8"	0327012023	5.090

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	COMPOSICION QUIMICA (%) Ensayo según método ASTM E415											
				C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	GR 60	0,26	0,99	0,016	0,030	0,15	0,27	0,09	0,15	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	GR 60	0,26	1,03	0,025	0,037	0,19	0,46	0,09	0,23	0,03	0,004	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	GR 60	0,28	0,98	0,020	0,039	0,15	0,25	0,09	0,20	0,03	0,003	0,036	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS Ensayo según método NTC3353						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	3	463	676	1,46	17,2	0,550	OK	6,37	0,57	2,06		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725224701	3	498	667	1,34	15,6	0,548	OK	6,44	0,54	1,83		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	3	485	660	1,36	15,5	0,550	OK	6,46	0,48	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA, 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193457

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331837/360	PED23000000692300141	FIG COR NTC 2289 5/8"	0527012023	2.274

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Trección	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	mín 1,250	min 14,00%	min 1,458 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193457

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331837/370	PED23000000692300141	FIG COR NTC 2289 7/8"	0727012023	2.521

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000222	BAR COR NTC 2289 7/8" 6m	1725036701	GR 60	0,27	1,14	0,014	0,033	0,19	0,30	0,08	0,08	0,01	0,000	0,027	0,48
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	GR 60	0,26	1,12	0,012	0,037	0,21	0,18	0,06	0,15	0,02	0,002	0,024	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000222	BAR COR NTC 2289 7/8" 6m	1725036701	7	470	624	1,33	19,1	2,968	OK	15,04	1,40	4,38		
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	5	444	599	1,35	17,0	2,962	OK	14,80	1,51	4,30		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,859 kg/m		máx 15,50 mm	mín 1,12 mm	máx 8,50 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131192644

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331835/320	PED23000000692300033	FIG COR NTC 2289 1/2"	0426012023	2.747

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725180901	GR 60	0,26	1,01	0,021	0,035	0,15	0,29	0,12	0,15	0,03	0,003	0,037	0,45
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725182201	GR 60	0,27	0,99	0,010	0,037	0,16	0,29	0,11	0,10	0,03	0,002	0,037	0,45
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725180401	GR 60	0,28	0,98	0,013	0,027	0,16	0,27	0,21	0,14	0,05	0,002	0,036	0,47
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	GR 60	0,28	1,04	0,027	0,017	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,001	0,003	0,44
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BTY03659	GR 60	0,28	1,06	0,005	0,009	0,17	0,00	0,01	0,01	0,00	0,000	0,004	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725180901	4	464	630	1,36	16,3	0,953	OK	8,01	0,60	3,69		
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725182201	4	511	659	1,29	15,1	0,950	OK	8,08	0,76	3,94		
108000075	ALB COR NTC 2289 1/2"	1725180401	4	470	642	1,37	16,0	0,956	OK	8,10	0,72	3,94		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BBC27757	4	471	621	1,32	20,0	0,992	OK	8,50	0,80	2,80		
110000094	BAR COR NTC 2289 1/2" 12M REV	BTY03659	4	469	607	1,30	17,0	0,957	OK	8,50	0,66	2,20		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,934 kg/m		máx 8,90 mm	min 0,51 mm	máx 4,90 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131192644

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331835/340	PED23000000692300033	FIG COR NTC 2289 3/4"	0626012023	878

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	BTM11839	GR 60	0,28	1,08	0,006	0,020	0,19	0,07	0,03	0,02	0,01	0,000	0,000	0,46
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,026	0,19	0,16	0,07	0,11	0,03	0,001	0,023	0,47
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103185	GR 60	0,26	1,19	0,018	0,033	0,19	0,14	0,05	0,12	0,03	0,002	0,022	0,48
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103751	GR 60	0,27	1,17	0,012	0,037	0,18	0,20	0,08	0,22	0,02	0,002	0,023	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	BTM11839	6	477	628	1,32	20,0	2,258	OK	13,00	1,01	3,80		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	6	470	634	1,35	19,0	2,289	OK	12,70	1,57	5,40		
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103185	6	469	638	1,36	18,0	2,227	OK	12,70	1,71	5,30		
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103751	6	496	653	1,32	17,0	2,295	OK	12,70	1,69	5,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131192644

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331835/350	PED23000000692300033	FIG COR NTC 2289 3/8"	0326012023	705

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	GR 60	0,27	1,00	0,014	0,032	0,16	0,30	0,11	0,13	0,02	0,002	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	GR 60	0,28	0,99	0,018	0,030	0,15	0,27	0,09	0,15	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	GR 60	0,28	0,98	0,020	0,039	0,15	0,25	0,09	0,20	0,03	0,003	0,036	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	3	459	670	1,46	15,0	0,553	OK	6,42	0,56	2,08		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	3	463	676	1,46	17,2	0,550	OK	6,37	0,57	2,06		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	3	485	660	1,36	15,5	0,550	OK	6,46	0,48	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,36 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

DIACO

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131192644

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331835/360	PED2300000692300033	FIG COR NTC 2289 5/8"	0526012023	36

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,26	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	GR 60	0,27	1,04	0,017	0,021	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,003	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS · **CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS**
Ensayo según método NTC3353

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	5	495	637	1,29	19,0	1,556	OK	10,60	0,83	3,60		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193455

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331836/110	PED23000000692300178	BAR COR NTC 2289 3/4"	A0104099	322

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,026	0,19	0,18	0,07	0,11	0,03	0,001	0,023	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	6	470	634	1,35	19,0	2,269	OK	12,70	1,57	5,40		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2.101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131193455

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331836/330	PED23000000692300178	FIG COR NTC 2289 1/4"	0226012023	633

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1725399501	GR 60	0,28	0,89	0,017	0,039	0,16	0,30	0,10	0,15	0,02	0,002	0,026	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000077	ALB COR NTC 2289 1/4"	1725399501	2	455	668	1,47	16,3	0,257	OK	4,30	0,45	1,79		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 0,234 kg/m		máx 4,45 mm	min 0,25 mm	máx 2,49 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131193455

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331836/340	PED23000000692300178	FIG COR NTC 2289 3/4"	0626012023	1.070

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	BTM11839	GR 60	0,28	1,08	0,008	0,020	0,19	0,07	0,03	0,02	0,01	0,000	0,000	0,46
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,026	0,19	0,18	0,07	0,11	0,03	0,001	0,023	0,47
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103185	GR 60	0,26	1,19	0,018	0,033	0,19	0,14	0,05	0,12	0,03	0,002	0,022	0,48
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103751	GR 60	0,27	1,17	0,012	0,037	0,18	0,20	0,08	0,22	0,02	0,002	0,023	0,50
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Sep		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	BTM11839	6	477	628	1,32	20,0	2,258	OK	13,00	1,01	3,80		
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	6	470	634	1,35	19,0	2,269	OK	12,70	1,57	5,40		
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103185	6	468	638	1,36	18,0	2,227	OK	12,70	1,71	5,30		
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103751	6	496	653	1,32	17,0	2,295	OK	12,70	1,69	5,80		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	mín 0,97 mm	máx 7,30 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193455

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331836/360	PED23000000692300178	FIG COR NTC 2289 5/8"	0526012023	261

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	GR 60	0,27	1,04	0,017	0,021	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,003	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	5	495	637	1,29	19,0	1,556	OK	10,60	0,83	3,60		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 5,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131193455

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331836/370	PED23000000692300178	FIG COR NTC 2289 7/8"	0726012023	274

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	GR 60	0,28	1,12	0,012	0,037	0,21	0,18	0,06	0,15	0,02	0,002	0,024	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
110000165	BAR COR 7/8" NTC 2289 14m REV	A0104008	5	444	599	1,35	17,0	2,962	OK	14,80	1,51	4,30		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 1,458 kg/m		máx 11,10 mm	min 0,71 mm	máx 8,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193454

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331834/350	PED23000000692300012	FIG COR NTC 2289 3/8"	0326012023	662

COMPOSICION QUIMICA (%)

Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	GR 60	0,27	1,00	0,014	0,032	0,16	0,30	0,11	0,13	0,02	0,002	0,036	0,48
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	GR 60	0,28	0,99	0,018	0,030	0,15	0,27	0,09	0,15	0,02	0,002	0,037	0,47
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	GR 60	0,28	0,98	0,020	0,039	0,15	0,25	0,09	0,20	0,03	0,003	0,036	0,47
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS

Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	3	459	670	1,46	15,0	0,553	OK	6,42	0,56	2,06		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725353301	3	483	678	1,46	17,2	0,550	OK	6,37	0,57	2,06		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725219201	3	485	660	1,36	15,5	0,550	OK	6,46	0,48	1,95		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193454

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331834/360	PED23000000692300012	FIG COR NTC 2289 5/8"	0526012023	1.265

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	GR 60	0,28	1,05	0,013	0,030	0,19	0,30	0,10	0,14	0,03	0,003	0,003	0,48
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	GR 60	0,27	1,04	0,017	0,021	0,18	0,01	0,01	0,01	0,00	0,000	0,003	0,45
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espacl	Altura	Sep		
110000153	BAR COR NTC 2289 5/8" 9m	1725286401	5	462	625	1,35	18,0	1,520	OK	10,59	1,05	4,44		
110000097	BAR COR NTC 2289 5/8" 12M REV	BBC27118	5	495	637	1,29	19,0	1,556	OK	10,60	0,83	3,60		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 1,459 kg/m		máx 11,10 mm	mín 0,71 mm	máx 6,10 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

REPORTE DE ENSAYOS

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

Nº: 20018131193458

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331838/340	PED23000000692300196	FIG COR NTC 2289 3/4"	0628012023	814

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	GR 60	0,28	1,06	0,011	0,026	0,19	0,18	0,07	0,11	0,03	0,001	0,023	0,47
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103184	GR 60	0,28	1,17	0,015	0,027	0,20	0,16	0,06	0,10	0,02	0,002	0,022	0,49
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

PROPIEDADES MECÁNICAS
Ensayo según método NTC3353

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep
110000100	BAR COR NTC 2289 3/4" 12M REV	A0104099	6	470	634	1,35	19,0	2,269	OK	12,70	1,57	5,40
110000158	BAR COR NTC 2289 3/4" 14M REV	A0103184	6	482	655	1,36	17,0	2,237	OK	12,70	1,59	5,40
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	min 550,0 MPa	min 1,250	min 14,00%	min 2,101 kg/m		máx 13,30 mm	min 0,97 mm	máx 7,30 mm

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

GERDAU
DIACO

DIACO S/A
Diagonal 22 #56 294 El Bosque, Cartagena, Colombia.
C.P - 130001 Tel/Fax: 6685799

REPORTE DE ENSAYOS

Nº: 20018131193458

CLIENTE	FACTURA	Nº PEDIDO DEL CLIENTE	PRODUCTO	LOTE DE FIGURADO	PESO (Kg)
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIO	9007331838/350	PED23000000692300196	FIG COR NTC 2289 3/8"	0328012023	3.685

COMPOSICION QUIMICA (%)
Ensayo según método ASTM E415

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	GRADO	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Nb	V	C.E.
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	GR 60	0,27	1,00	0,014	0,032	0,16	0,30	0,11	0,13	0,02	0,002	0,036	0,46
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725428401	GR 60	0,28	1,01	0,010	0,031	0,14	0,23	0,09	0,10	0,02	0,002	0,037	0,46
Rangos de referencia según norma				máx 0,3000%	máx 1,5000%	máx 0,0350%	máx 0,0450%	máx 0,5000%							máx 0,550

MATERIAL	PRODUCTO	LOTE/COLADA	DESIG	PROPIEDADES MECÁNICAS (Ensayo según método NTC3353)						CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS				
				R. Fluencia	R. Tracción	R.T/R.F	Alargamiento	Masa Lineal	Doblado	Espaci	Altura	Sep		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725334701	3	459	670	1,46	15,0	0,553	OK	6,42	0,56	2,06		
108000076	ALB COR NTC 2289 3/8"	1725428401	3	473	676	1,43	15,1	0,555	OK	6,46	0,51	2,01		
Rangos de referencia según norma				420,0 - 540,0 MPa	mín 550,0 MPa	mín 1,250	mín 14,00%	mín 0,526 kg/m		máx 6,70 mm	mín 0,38 mm	máx 3,60 mm		

OBSERVACIONES

Se garantiza por mediciones que el producto está libre de radioactividad.

RESPONSABLE DE CALIDAD

CARTAGENA. 28.01.2023

LEIDY LORENA NIÑO ESCOBAR

INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

Calle 48b # 9a - 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

Semanales mes de: Septiembre

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 01 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINAS	2 1 de 2
		FECHA	13 de septiembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA SEMANA No.: 1 del 9/09/2022 al 10/09/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 48,329,916,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 48,329,916,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE:	PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

OBSERVACIÓN: TENIENDO EN CUENTA QUE EL ACTA DE INICIO SE FIRMÓ EL DÍA VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y LA PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA MEDIANTE EL SOFTWARE PROJECT MOSTRÓ CORTES LOS DÍAS SÁBADOS, SE ESTABLECE QUE LOS CORTES DE LA SEMANA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEAN LOS SÁBADOS Y DE ESA MANERA NO AFECTAR EL FLUJO FINANCIERO ARROJADO POR EL SOFTWARE.
POR CONSIGUIENTE EL PRIMER INFORME DE LA SEMANA QUEDÓ DE DOS DIAS (VIERNES 09 Y SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022).

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: EN LA PROGRAMACION INICIAL DEL PRIMER MES NO SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES TRANSPORTADOS Y/O DE CANTERA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A			
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A			
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		X	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X	
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A			

OBSERVACIONES: LA ALCALDÍA SUMINISTRÓ EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 059 DEL 07 DE ABRIL DE 2022 EXPEDIDA POR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, DE IGUAL FORMA EL MUNICIPIO SUMINISTRÓ EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	71	28
PERSONAL PROFESIONAL:	19	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #1B-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**
SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO A LA ENTIDAD
RECOPILACIÓN Y RELACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
SOLICITUD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO A LA ENTIDAD
SOLICITUD DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
SOLICITUD DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
SOLICITUD DE PROGRAMACIÓN DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO



X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

NO HAY ACCIONES A SEGUIR

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	2

FECHA	20 de septiembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA SEMANA No.: 2 del 11/09/2022 al 17/09/2022 Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
	RECURSOS POR VIGENCIA			CDP (22000908 Y 22001534)	
				$ 3,022,628,594.00	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA			CDP (22002127 Y 22002130)	
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%

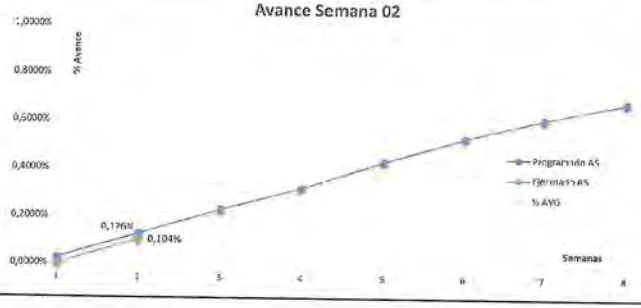



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 02 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: EN LA PROGRAMACION INICIAL DEL PRIMER MES NO SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES TRANSPORTADOS Y/O DE CANTERA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ EL PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 059 DEL 07 DE ABRIL DE 2022 EXPEDIDA POR CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, DE IGUAL FORMA EL MUNICIPIO SUMINISTRÓ EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	71	28
PERSONAL PROFESIONAL:	18	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #1B-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
ITEM 1,29 DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO
ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
REVISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA ECONÓMICA
COMITÉ DE OBRA No. 1

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO
- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO






X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

NO HAY ACCIONES A SEGUIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-VN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3
		FECHA	27 de septiembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA SEMANA No.: 3 del 18/09/2022 al 24/09/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%

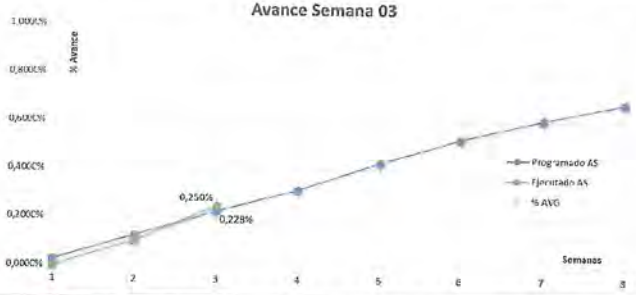



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: EN LA PROGRAMACIÓN INICIAL DEL PRIMER MES NO SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES TRANSPORTADOS Y/O DE CANTERA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO:	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A X
EMISIONES:	SI		NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: [illegible] DEL PROYECTO MEDIANTE LA [illegible] CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, DE IGUAL FORMA EL MUNICIPIO SUMINISTRO EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	71	28
PERSONAL PROFESIONAL:	10	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
ITEM 1,29 DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO
ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
ENTREGA DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
REVISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA ECONÓMICA
COMITÉ DE OBRA No. 2
REVISIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES, INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 03 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN I-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
NO HAY ACCIONES A SEGUIR	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINAS	3
		FECHA	04 de octubre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible] ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA [illegible] DE SEGURIDAD (CIE) "VIGILA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA SEMANA No: 4 del 25/09/2022 al 30/09/2022 Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible] DE SEGURIDAD (CIE) "VIGILA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 45,279,916,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 45,279,916,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,699.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%

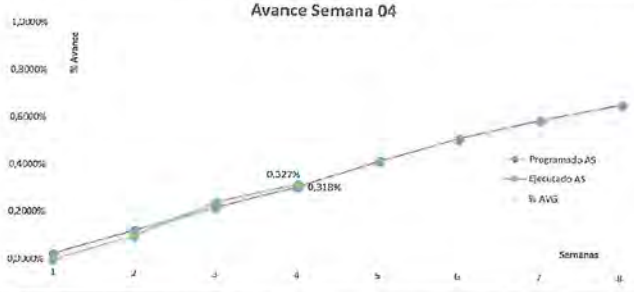



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: [illegible] CON AUTORIDAD REGIONAL DE LOS VALLES DEL [illegible] DE BOSQUE CONSTRUCCIONES Y CONCRETOS ADMINISTRO EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	71	28
PERSONAL PROFESIONAL:	6	19
PERSONAL TÉCNICO	12	9
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO CALLE 6 #1B-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
- ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- ITEM 1,02 DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- ITEMS (1,03) (1,09) (1,20) (1,21) DE MEDICIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 10-15M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
- REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- REVISIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTES A LA PROPUESTA ECONÓMICA
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA,
- COMITÉ DE OBRA No. 3

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES, INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- PODA DE RAÍZ INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 04 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MIN 1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
NO HAY ACCIONES A SEGUIR	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista y Empleo ejecutora

Semanales mes de: Octubre

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CODIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINAS	3

FECHA: 11 de octubre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA — SEMANA No.: 5 del 1/10/2022 al 8/10/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 46,529,913,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 46,529,913,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (822 Y 722)	$ 9,503,523,675.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%

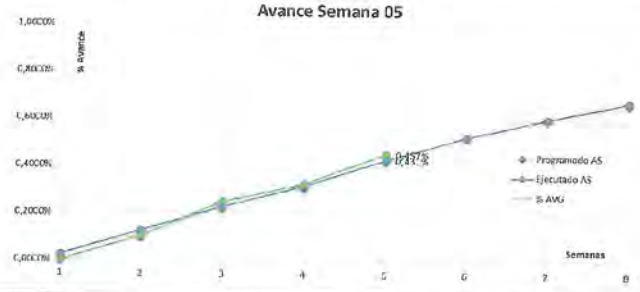



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPHMNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE
UBICACIÓN:	
ETEMA	NO
[illegible]	NO
UBICACIÓN:	
PERMISO MINERO	SI NO
LICENCIA AMBIENTAL	SI NO

OBSERVACIONES: [illegible] EL PROPIETARIO DE LA FUENTE DE MATERIALES

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI		NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A
EMISIONES	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: [illegible] EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA [illegible] CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL [illegible] EMITIDO EL MUNICIPIO OBTUVO EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	77	22
PERSONAL PROFESIONAL	15	19
PERSONAL TÉCNICO	7	3
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #1B-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

- ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- ITEM 1,02 DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,10 DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,14 RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- ITEM (1,18), (1,19), (1,20), (1,21) REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
- ITEM 1,27 PODA DE RAÍZ ALTURA H=15,1M O IGUAL A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- ITEM 1,28 CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 4
- REALIZACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.1 (MES SEPTIEMBRE DE 2022)

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DESCAPOTE EN MÁQUINA
- DEMOLICIÓN DEANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES, INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- PODA DE RAÍZ INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 05 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO











X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
NO HAY ACCIONES A SEGUIR	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista y Entidades locales

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	7
		PÁGINAS	3
		FECHA	18 de octubre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: [illegible] ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA [illegible] DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: S.I.C. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL [illegible] CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERIA SEMANA No.: 6 DEL 9/10/2022 AL 16/10/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible] DE CENTROS DE CUIDADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 08	VALOR INICIAL:	$ [illegible]	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR ADICIONES:	$ -	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE INICIO:	9/09/2022			FECHA DE INICIO:	9/09/2022		
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022			MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/1[illegible]	VALOR ACUMULADO:	$ [illegible]	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (622 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%

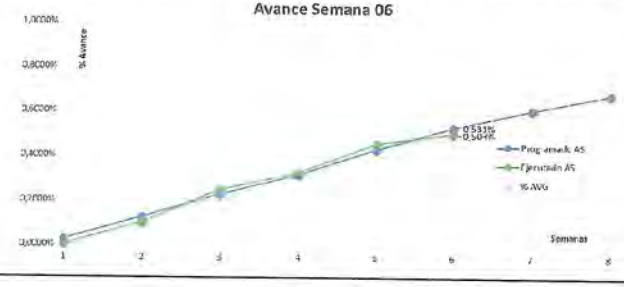



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 06 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-010-2022 CONSORCIO KALAR MONTERIA 010	CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	2

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONE	
UBICACIÓN:	PERMISO VIGENTE	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO VIGENTE	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES: [illegible] TRANSPORTADORAS DE BALDOSA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A	X
EMISIONES	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: [illegible] DEL PROYECTO MEDIANTE LA [illegible] DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	71	28
PERSONAL PROFESIONAL	19	18
PERSONAL TÉCNICO	17	10
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN PUESTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO: CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: [illegible] LA ADQUISICIÓN PREDIAL POSTERIOR DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**

- ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA
- ITEM 1,02 DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,10 DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ITEM 1,14 RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- ITEM 1,15 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO
- ITEM 1,17 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- ITEM (1,18), (1,19), (1,20), (1,21) REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
- ITEM (1,25), (1,26), (1,27) PODA DE RAÍZ ALTURA H=5,1M O IGUAL A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- ITEM 1,28 CARGUE Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**

- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 5

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DESCAPOTE EN MÁQUINA
- DEMOLICIÓN DEANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO
- PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR INCLUYENDO TRANSPORTE
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES, INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- PODA DE RAÍZ INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO











X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

NO HAY ACCIONES A SEGUIR

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora.

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 07 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

FECHA: 25 de octubre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: ...ASESORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA ...CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA — SEMANA No.: 7 del 17/10/2022 al 24/10/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: GERMÁN QUINTERO MENDOZA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: ...CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No:	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 46,309,918,941.00	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022			MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 46,309,918,941.00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023			FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (822 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.95	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.542%	-0.067%

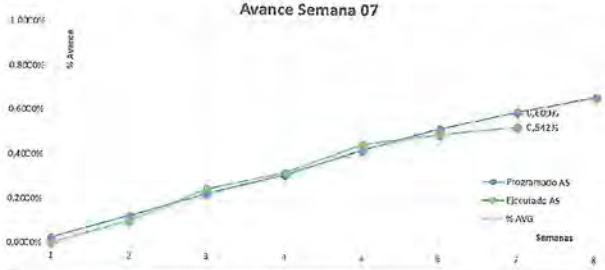



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 07 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE
UBICACIÓN	
	SI NO
UBICACIÓN	
PERMISO MINERO	SI NO
LICENCIA AMBIENTAL	SI NO

OBSERVACIONES: [illegible] TRANSPORTADOS Y/O DE CANTERA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: LA ALCALDÍA SUMINISTRÓ EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA [illegible] NACIONAL DE LICENCIAS (ESTE SINULY [illegible] DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	64	35
PERSONAL PROFESIONAL:	19	10
PERSONAL TÉCNICO:	4	4
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**

- ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- **ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA**
- ITEM (1,16), (1,19) A (1,20), (1,21) REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE 15 5M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
- ITEM (1,22), (1,23), (1,24) PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H>5,1 A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- ITEM 1,25 PODA DE RAÍZ ALTURA H>5,1M O IGUAL A 10M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**

- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 6

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DESCAPOTE EN MÁQUINA
- DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO
- PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR INCLUYENDO TRANSPORTE
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES, INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- PODA DE RAÍZ INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 07 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CODIGO	MEPM-M11-M-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista y Entidad estatal.

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 08 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPEMN1-IN-16-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3
		FECHA	01 de noviembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible] DE MONTERÍA

DEPENDENCIA: [illegible]

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: HERMAN QUINTERO MENDOZA

SEMANA No. 8 del 25/10/2022 al 31/10/2022 Último Informe Semanal SI

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible]

CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA:	CONSORCIO CID 08
CONTRATO No:	LP-SPM-017-2022
FECHA DE INICIO:	9/09/2022
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	[illegible]
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 40,329,918,941.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	[illegible]
VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022
FECHA DE INICIO:	9/09/2022
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023
VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000969)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.95	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.542%	-0.067%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.070%	$ 117,016,517.23	0.242%	$ 328,102,459.33	0.679%	$ 378,936,710.09	0.784%	0.105%

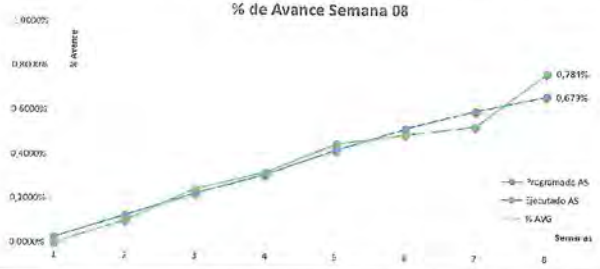

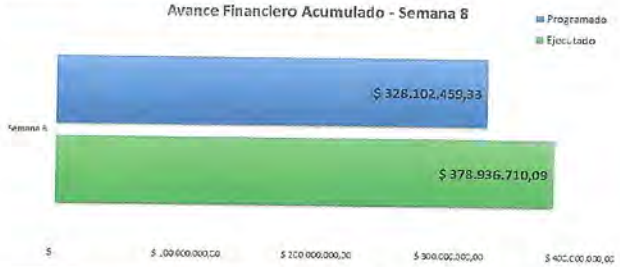

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

	DISPONIBLE
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

UBICACIÓN

PERMISO VIGENTE	SI	NO
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES: [illegible]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A	X
EMISIONES	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: [illegible]

DE AGOSTO DE 2022

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS	71	28
PERSONAL PROFESIONAL	19	18
PERSONAL TÉCNICO	17	4
MANO DE OBRA NO CUALIFICADA	35	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 99

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
UBICACIÓN DE BUZÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: [illegible]

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**

ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA
- ITEM 1,10 DEMOLICIÓN DE MUROS E= 0[illegible]MTS/20MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ITEM 1,15 DE MOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO
- ITEM 1,17 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS
- ITEM (1,19), (1,20), REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
- ITEM (1,22), (1,23), (1,24) PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5,1 A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- ITEM 1,25 PODA DE RAÍZ ALTURA H=5,1M O IGUAL A 10M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 7

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DESCAPOTE EN MÁQUINA
- DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYENDO RETIRO
- PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES, TALA DE ÁRBOLES. INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- PODA DE RAÍZ INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYENDO RETIRO
- DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 08 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPM/INT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO







X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

Semanales mes de: Noviembre

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 09 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPLMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

FECHA: 08 de noviembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORIA: [illegible] TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA [illegible] DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: [illegible] MUNICIPIO DE MONTERÍA. SEMANA No. 9 del 1/11/2022 al 5/11/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible] (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 58		
CONTRATO No:	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ [illegible]
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/[illegible]	VALOR ACUMULADO:	$ [illegible]
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/[illegible]	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,603,623,675.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000609)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CRP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 29% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.95	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.542%	-0.067%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.070%	$ 117,016,517.23	0.242%	$ 328,102,459.33	0.679%	$ 378,936,710.09	0.784%	0.105%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.136%	$ 111,136,719.05	0.230%	$ 393,917,854.31	0.815%	$ 490,073,429.14	1.014%	0.199%

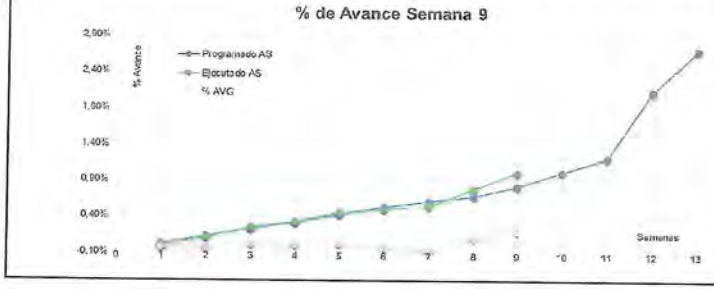

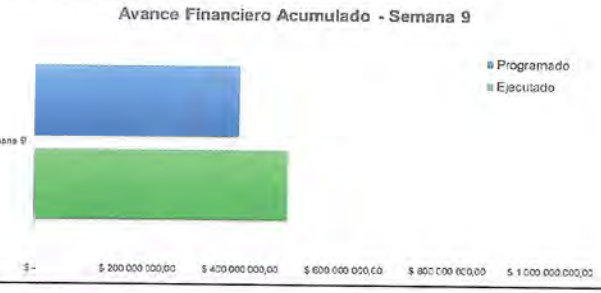

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: HASTA LA FECHA EN LA PROGRAMACIÓN INICIAL NO SE CONTEMPLA EL USO DE MATERIALES TRANSPORTADOS Y/O DE CANTERA.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	.....	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	N/A	X
EMISIONES	SI	.....	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	N/A	

OBSERVACIONES: LA ALCALDÍA SUMINISTRÓ EL PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DEL PROYECTO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN Nº 059 DEL 07 DE ABRIL DE 2022 EXPEDIDA POR CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE - CVS, DE IGUAL FORMA EL MUNICIPIO SUMINISTRÓ EL CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2022.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	70	28
PERSONAL PROFESIONAL:	19	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	34	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO 98

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ..... CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES: EL DIA 3 DE NOVIEMBRE SE HIZO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL ACTA DE VIAS DE LA RUTA QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA SOLETANCHE BACHY COLOMBIA PARA LOS PILOTES.

EL 4 DE NOVIEMBRE SE REALIZO VISITA DE VERIFICACIÓN DE QUEJA DE UNA TUBERÍA DE SUMINISTRO DE AGUA.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: ..... N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: ..... N/A
AVALÚOS APROBADOS: ..... N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: ..... N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**

- ACTIVIDADES DE AHUYENTAMIENTO CONTEMPLADAS EN LA LICENCIA No. 059 DEL ABRIL DE 2022
- ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA
- ITEM 1.10 DEMOLICIÓN DE MUROS E= 015MTS/020MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1.11 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE INCLUYE MALLA ESLABONADA, COLUMNETAS Y VIGUETAS
- ITEM 1.12 DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=010CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,13 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
- ITEM 1,14 RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO
- ITEM 1,15 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO
- ITEM 1,17 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS
- ITEM (1,18), (1,19); (1,20); (1,21); REMOCIÓN DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 5M A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS Y EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
- ITEM (1,22); (1,23); (1,24),(1,25) (1,26), (1,27) PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=5,1 A 20M INCLUYENDO TRANSPORTE DE RESIDUOS
- ITEM 1,29 DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**

- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 8
- REVISIÓN DE INFORMES DE OBRA DEL MES DE OCTUBRE 2022
- REVISIÓN DE ORDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- AHUYENTAMIENTO DE ESPECIES ANIMALES
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DESCAPOTE EN MAQUINA
- DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EN BLOQUE

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 09 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MSPM-M1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 10 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	DEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

FECHA: 14 de noviembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible] ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA [illegible] DE SERVICIO (CS) AHORA LA CENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

DEPENDENCIA: [illegible] MUNICIPIO DE MONTERÍA — SEMANA No: 10 DE 6/11/2022 AL 12/11/2022 Último Informe Semanal Sí: El

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible] DE SERVICIOS (CS) AHORA LA CENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO [illegible]	VALOR INICIAL:	$ 40,320,018,941.00
CONTRATO No:	LP-SPM-017-2022	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE INICIO:	9/09/2022		
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022	VALOR ACUMULADO:	$ 40,320,018,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	[illegible]		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023	VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,626,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,626,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,639,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (822 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,639,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA %EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,632,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.95	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.542%	-0.067%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.070%	$ 117,016,517.23	0.242%	$ 328,102,459.33	0.679%	$ 378,936,710.09	0.784%	0.105%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.136%	$ 111,136,719.05	0.230%	$ 393,917,854.31	0.815%	$ 490,073,429.14	1.014%	0.199%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.201%	$ 52,972,579.65	0.110%	$ 491,175,529.85	1.016%	$ 543,046,008.79	1.124%	0.107%

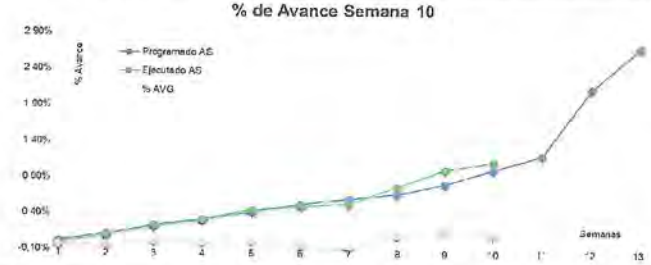

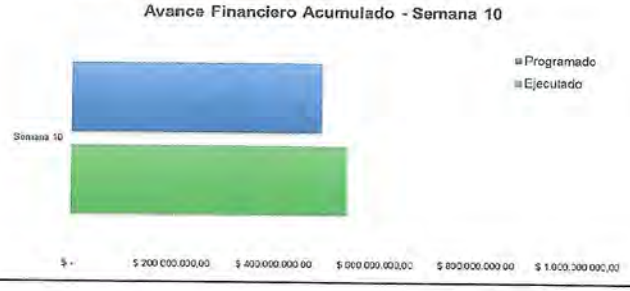

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 16 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	1IEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINAS	3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: SE ACOPIO EL MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO
SE TIENE LOS PERMISOS AMBIENTALES DE LAS CANTERAS, LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA
LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL, SE PRESENTARA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL MATERIAL
CUANDO EL MATERIAL SEA REQUERIDO EN OBRA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	X	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS	SI		NO	N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES	SI		NO	N/A X
VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A X
EMISIONES	SI		NO	N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES: SE TIENE LA CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE AGUAS DE LA DONACIÓN DEL MATERIAL
SE TIENE EL PERMISO DE EXCAVACIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	28	28
PERSONAL PROFESIONAL:	19	19
PERSONAL TECNICO	1	1
SUBCONTRATISTAS	32	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 96

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CALLE 6 #18-102

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO TIENE NINGUNA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**
- ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA
- ITEM 1,10 DEMOLICIÓN DE MUROS E= 015MTS/020MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,11 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE INCLUYE MALLA ESLABONADA, COLUMNETAS Y VIGUETAS
- ITEM 1,12 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=010CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,14 RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO
- ITEM 1,15 DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO
- ACOPIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 8
- INSPECCIÓN No. 1 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- DESCAPOTE EN MÁQUINA
- DEMOLICIÓN DE MUROS E=0,15/0,20M INCLUYENDO RETIRO DE MATERIAL
- DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EN BLOQUE
- CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 10 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CODIGO	MEPEMEN-Fr-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE. ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista y Entidad contratante

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3
		FECHA	21 de noviembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: [illegible] TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA [illegible] DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: [illegible] MUNICIPIO DE MONTERÍA — SEMANA No. 11 del 13/11/2022 al 19/11/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: [illegible] DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No:	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ [illegible] 529,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO	$ [illegible] 529,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (122 Y 722)	$ 9,503,523,675.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000809)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 29% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL PROGRAMADO	SEMANAL % PR	SEMANAL EJECUTADO	SEMANAL % EJ	SEMANA ACUMULADA PROGRAMADO ACUM	SEMANA ACUMULADA % PR ACUM	SEMANA ACUMULADA EJECUTADO ACUM	SEMANA ACUMULADA % EJE ACUM	% AV o RET
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		$ 11,839,911.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 50,154,384.17	0.104%	$ 61,009,284.36	0.126%	$ 50,154,384.17	0.104%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.102%	$ 70,469,712.25	0.146%	$ 110,178,656.78	0.228%	$ 120,624,096.43	0.250%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.090%	$ 37,532,899.41	0.078%	$ 153,520,099.59	0.318%	$ 158,256,995.84	0.327%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,918.79	0.457%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,818.92	0.503%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.95	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.542%	-0.067%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.070%	$ 117,016,517.23	0.242%	$ 328,102,459.33	0.679%	$ 378,936,710.09	0.784%	0.105%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.136%	$ 111,136,719.05	0.230%	$ 393,917,854.31	0.815%	$ 490,073,429.14	1.014%	0.199%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.201%	$ 52,972,579.65	0.110%	$ 491,175,529.85	1.016%	$ 543,046,008.79	1.124%	0.107%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.201%	$ 100,986,216.08	0.209%	$ 588,433,205.40	1.218%	$ 644,032,224.87	1.333%	0.115%

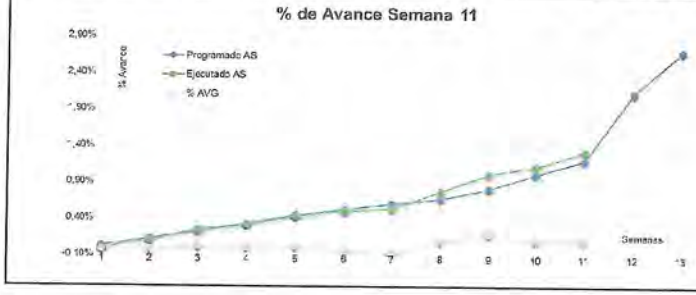



MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPLMN1-N-154FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
[illegible] CANTERA [illegible]	PERMISO MINERO SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO
UBICACIÓN	PERMISO MINERO SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL SI	NO

OBSERVACIONES: [illegible] DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO. [illegible] POR PARTE DEL CONTRATISTA. [illegible] CERTIFICADOS DE CALIDAD DE [illegible] (CONTRATISTA DE OBRA)

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI	NO	N/A	X
EMISIONES	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: [illegible] A LA COMPAÑÍA DEL DIANA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LA DONACIÓN DEL MATERIAL [illegible] EXCAVACIÓN

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	79	24
PERSONAL PROFESIONAL	19	19
PERSONAL TÉCNICO	1	0
SUBCONTRATISTAS	39	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 103

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL REGISTRO SE ENCUENTRA ADJUNTO A LAS ACTAS DE VECINDAD DE LA [illegible] LOS CON LA MAQUINARIA DE LOS PILOTES

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO SE HA GENERADO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA**
- ITEM 1,01 DESCAPOTE MÁQUINA
- ITEM 1,10 DE MOLICIÓN DE MUROS EN 015MTS/020MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
- ITEM 1,11 DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE INCLUYE MALLA ESLABONADA, COLUMNETAS Y VIGUETAS
- ITEM 1,20 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE CON ACARREO LIBRE
- ACOPIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 9
- INSPECCIÓN No. 2 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- ACOPIO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN DEL TERRENO
- ADECUACIÓN DE TERRENO PARA LAS ACTIVIDADES DE PILOTAJE (RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTACIÓN)
- ITEM 3,01,04 PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCIÓN 0.4X0.4M.

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO







MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 11 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPSMN1-Pr-16-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	3

IX. REGISTRO FOTOGRAFICO







NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 12 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA: 28 de noviembre de 2022 (Día/Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA — SEMANA No.: 12 del 20/11/2022 al 26/11/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 12 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,811.93	0.024%	$		$ 11,839,811.93	0.024%	$ -		-0.024%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,160,372.43	0.100%	$ 59,154,394.17	0.119%	$ 61,000,284.36	0.12%	$ 59,154,394.17	0.10%	-0.022%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,160,372.43	0.100%	$ 73,469,712.26	0.146%	$ 110,176,656.79	0.22%	$ 120,624,026.43	0.25%	0.022%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.088%	$ 37,632,899.41	0.075%	$ 153,518,099.59	0.31%	$ 158,256,535.84	0.33%	0.010%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.114%	$ 62,736,922.95	0.130%	$ 208,517,401.64	0.431%	$ 220,993,818.79	0.46%	0.026%
	Semana 6	9/10/2022	15/10/2022	$ 48,023,054.14	0.099%	$ 22,137,900.13	0.046%	$ 256,540,456.77	0.531%	$ 243,131,618.92	0.50%	-0.028%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.078%	$ 18,788,373.55	0.039%	$ 294,437,911.91	0.609%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.067%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.070%	$ 117,016,517.23	0.242%	$ 328,102,459.33	0.679%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.105%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.136%	$ 111,136,719.05	0.230%	$ 393,917,854.31	0.815%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.199%
	Semana 10	8/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.201%	$ 52,972,579.65	0.110%	$ 491,175,529.85	1.016%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.107%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.201%	$ 100,986,216.08	0.209%	$ 588,433,205.40	1.218%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.115%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.922%	$ 646,251,568.06	1.337%	$ 1,034,122,145.88	2.140%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.530%

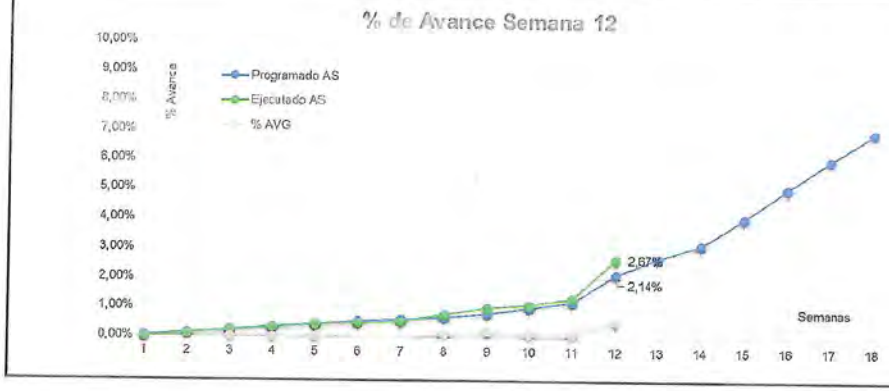



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ABASTECIMIENTO DE CANTERA PARA LA NIVELACIÓN DEL TERRENO. SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONOCER LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL Y DE IGUAL FORMA LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL LABORATORIO CORRESPONDIENTE.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS	SI		NO	N/A	X
FUNDONES	SI		NO	N/A	X
OTROS (cuales?)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ VISITA A CIERRA CERCA DE LA PARA LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS DE LA DONACIÓN DEL MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	85	28
PERSONAL PROFESIONAL	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	43	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 113

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN FÍSICA SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTAS DE VECINDAD DE LA PLETA QUE TRANSITARÁ DE VEHÍCULOS CON LA MAQUINARIA DE LOS PILOTES.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

* ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No. 10
- INSPECCIÓN No. 3 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No. 1 POR VALOR DE $76.528.459 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No. 2 POR VALOR DE $120.693.489 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No. 3 POR VALOR DE $5.761.564 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No. 4 POR VALOR DE $500.000.099 PESOS MCTE
- REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA Y EL PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA SOLETANCHE BACHY PARA LAS ACTIVIDADES DE PILOTAJE

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
1.10	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 015MTS/020MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 KM
1.11	DEMOLICION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE INCLUYE MALLA ESLABONADA,COLUMNETAS Y VIGUETAS
1.12	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=010CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 KM
1.15	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO NO MAYOR A 10 KM
1.16	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETOINCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 5 KM
1.22	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=51 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.23	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR H= 101 M O IGUAL 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.24	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR H= 151 M O IGUAL 20 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.25	PODA DE RAIZ ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=51 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.26	PODA DE RAÍZ ALTURA H= 101 M O IGUAL 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.27	PODA DE RAÍZ ALTURA H= 151 M O IGUAL 20 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.14.03	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 13 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

	FECHA	01 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA SEMANA No.: 13 del 27/11/2022 al 30/11/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	VALOR INICIAL:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 46,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	VALOR INICIAL:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	VALOR ADICIONES:	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (622 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 69,169,372.43	0.10%	$ 58,154,384.17	0.10%	$ 81,009,284.30	0.12%	$ 58,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.43	0.12%	$ 130,178,656.73	0.22%	$ 128,624,096.60	0.22%	0.00%
	Semana 4	25/09/2022	01/10/2022	$ 41,941,462.36	0.08%	$ 67,842,360.41	0.12%	$ 172,120,119.09	0.29%	$ 196,466,457.01	0.34%	0.05%
2	Semana 5	2/10/2022	8/10/2022	$ 94,997,360.65	0.17%	$ 92,730,822.95	0.16%	$ 267,117,479.74	0.46%	$ 289,197,279.96	0.50%	0.04%
	Semana 6	9/10/2022	15/10/2022	$ 40,023,085.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.04%	$ 307,140,564.88	0.56%	$ 311,335,180.09	0.54%	-0.02%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,456.14	0.06%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 345,038,021.02	0.62%	$ 330,123,554.04	0.57%	-0.05%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 378,702,568.45	0.69%	$ 447,140,071.27	0.77%	0.08%
	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 66,815,396.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 445,517,965.42	0.83%	$ 558,276,790.32	0.96%	0.13%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,936,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,687,949.48	0.92%	$ 646,251,585.06	1.34%	$ 1,034,122,149.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,654.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%

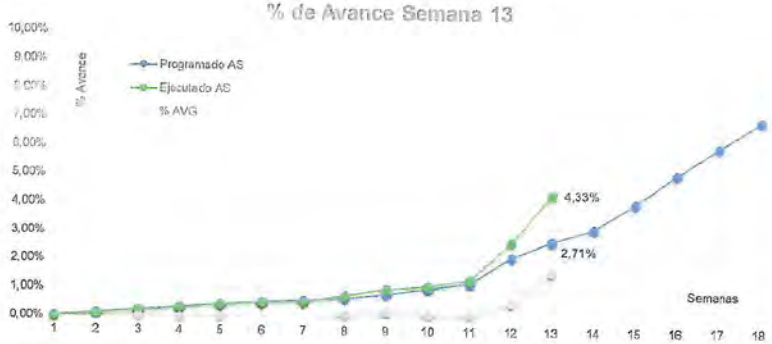

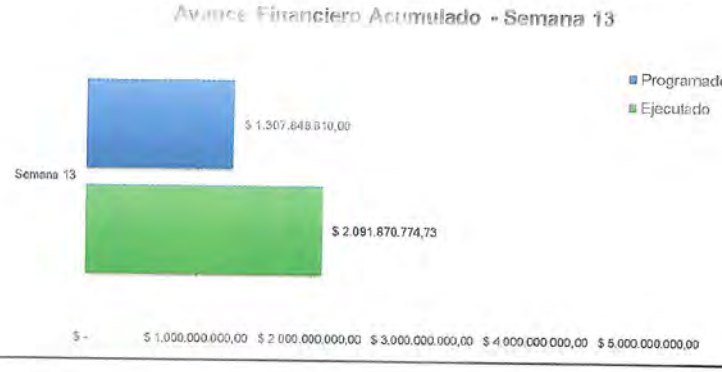

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES: SE CONTINUA REALIZANDO LABORES DE ADECUACIÓN AMBIENTAL DE LA OBRA Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL Y LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL LABORATORIO.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Cuales?)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	64	26
PERSONAL PROFESIONAL:	26	14
PERSONAL TÉCNICO	17	12
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

NO. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
NO. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
NO. DE PUNTOS DE ATENCIÓN AL USUARIO EN EL CAMPAMENTO DE OBRA:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS **POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 4 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.5 POR VALOR DE $934.400.625 PESOS MCTE
- REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA MAQUINARIA Y EL PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA SOLETANCHE BACHY PARA LAS ACTIVIDADES DE PILOTAJE

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
1.03	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA, INCLUYE RETIRO
1.04	DESMONTE DE PROTECTOR DE VENTANAS
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO
1.07	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO
1.08	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
1.09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.16.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 13 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CODIGO	MEPI-MIN*-IN-*5-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CASARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

Semanales mes de: Diciembre

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPHAINT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

	FECHA	08 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — **CONTRATANTE** MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 14 del 1/12/2022 al 3/12/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,626,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,626,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJ ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.61	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%

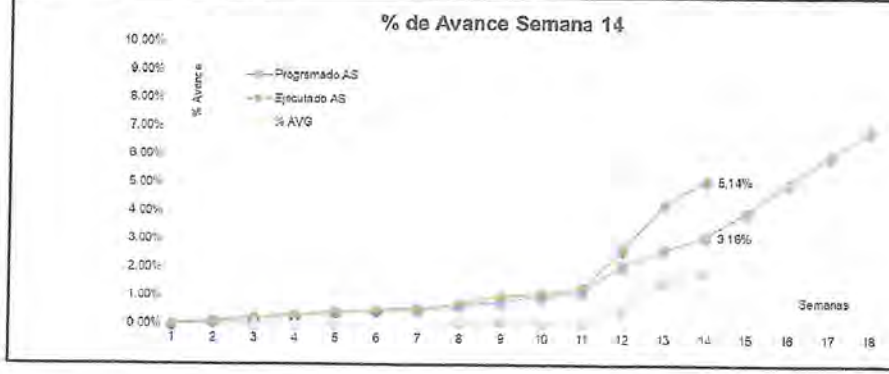



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR GRIS.

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA REVISIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MAT. SELECCIONADO COLOR MARRÓN CLARO, PIEDRA RAJON, DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE 2200 PSI, 3000PSI Y 4000PSI Y ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO DE LOS PILOTES, LOS CUALES NO HAN SIDO ENVIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
1.03	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA, INCLUYE RETIRO
1.04	DESMONTE DE PROTECTOR DE VENTANAS
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO
1.06	DESMONTE DE PUERTA PORTON DOBLE DE ACCESO INCLUYE MARCO CONCRETO
1.07	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO
1.08	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
1.09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
1.18	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.19	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 51M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
1.20	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 101M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 16 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-ATN°-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA: 19 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 16 del 11/12/2022 al 17/12/2022 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,626.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJ ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%



MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 16** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA** FIRMA NOMBRE: **ALFREDO CABARCAS BUELVAS**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 17** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPMNT-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	4
		PÁGINAS	4

FECHA 27 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 17 del 18/12/2022 al 24/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 015		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	**VIGENCIA**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CDP (422 Y 722)	$ 9,503,523,875.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	$ 10,713,075,250.12 CDP (22001084 Y 22000909)	$ 6,961,720,544.00 Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41 CRP (822 Y 722)		$ 10,713,075,249 CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,926,826.59 CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00 CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	6/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%

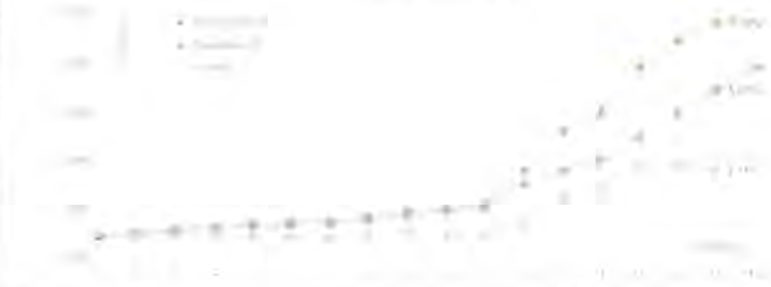



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR AMARILLO Y LA PIEDRA RAJON

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	93	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	51	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 121

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 7 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.10 POR VALOR DE $660.344.663 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.11 POR VALOR DE $186.880.124 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.12 POR VALOR DE $3.614.436,66 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.13 POR VALOR DE $19.870.320 PESOS MCTE
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ENVIADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL ACERO DE REFUERZO
- COMITÉ DE OBRA No. 14

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL
	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 15** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN°-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 13 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 15 del 4/12/2022 al 10/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,626,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJ ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%

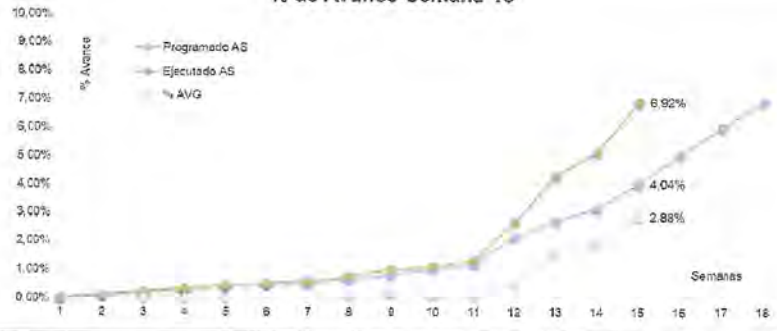



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACION DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 5 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ENVIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE 2200 PSI, 3000PSI Y 4000PSI
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL DE CANTERA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 15** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO













X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: **ALFREDO CABARCAS BUELVAS**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 18** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 03 de enero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 18 del 25/12/2022 al 31/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	**VIGENCIA**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826,59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,828,594,00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJ ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,09[illegible],870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%

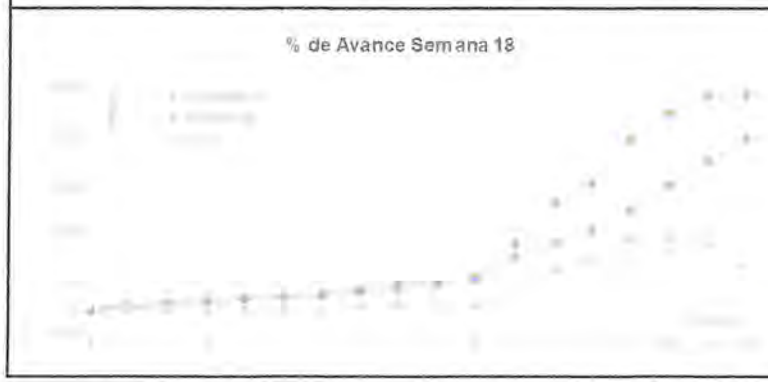



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO X

OBSERVACIONES: POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, LAS CANTERAS PRESTARON SUS SERVICIOS HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y RETOMARÁN LABORES A MEDIADOS DE ENERO 2023.
SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	63	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 133

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 8 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ENVIADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA CARACTERIZACION DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR HABANO CLARO, PIEDRA RAJÓN Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA) SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.14.03	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ALFREDO CABARCAS BUELVAS**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y entidad ejecutora

Semanales mes de:
Enero – 2023

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 19** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPHMN1-N-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 10 de enero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 19 del 1/01/2023 al 7/01/2023 — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			**INTERVENTOR:**	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00	**CONTRATO No.**	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -	**FECHA DE INICIO:**	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022			**MODIFICATORIO No.1**	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00	**FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:**	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -	**FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:**	29/12/2023		
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	**VIGENCIA**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**			$ 3,022,626,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	% PR ACUM	EJECUTADO ACUM	% EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,898.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%
5	Semana 19	1/01/2023	7/01/2023	$ 543,067,781.11	1.12%	$ 211,389,625.74	0.44%	$ 3,898,907,561.59	8.07%	$ 4,446,712,876.11	9.20%	1.13%

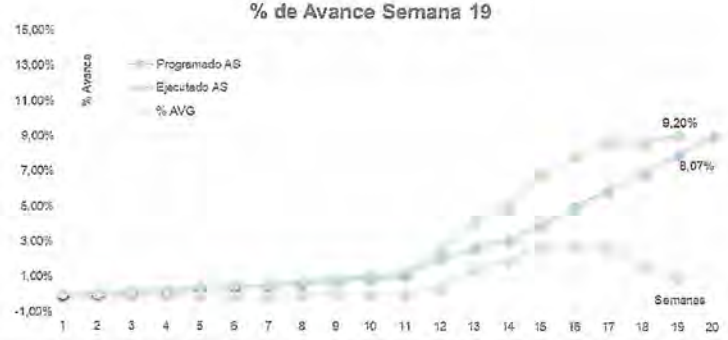



IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ____	
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO X	

OBSERVACIONES: SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TECNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	63	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 133

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**

- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 9 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO ENVIADOS POR EL CONTRATISTA
- REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No.15
- ORDEN DE DESEMBOLSO No. 14 POR UN VALOR DE $970.241.348,00

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.14.03	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.18.01	EXCAVACION MANUAL
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.01	EXCAVACION MANUAL

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
3.18.01	EXCAVACION MANUAL
3.18.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.20.01	EXCAVACION MANUAL
3.20.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original. Informe mensual de interventoría.
Copias. Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 20** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPMMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 17 de enero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 20 del 8/01/2023 al 14/01/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	**VIGENCIA**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.85	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.98%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%
5	Semana 19	1/01/2023	7/01/2023	$ 543,067,781.11	1.12%	$ 211,389,625.74	0.44%	$ 3,898,907,561.59	8.07%	$ 4,446,712,876.11	9.20%	1.13%
	Semana 20	8/01/2023	14/01/2023	$ 516,589,547.98	1.07%	$ 176,062,452.13	0.36%	$ 4,415,497,109.57	9.14%	$ 4,622,775,328.24	9.57%	0.43%





	INFORME SEMANAL No. 20 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO ___	
UBICACIÓN: CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO: SI ___ NO ___	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO X	

OBSERVACIONES: SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.
SE CONTINÚA EL ACOPIO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ADECUACIÓN DEL TERRENO EN ZONA DE CANCHAS Y PARQUEADEROS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI X	NO ___	N/A ___		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___	N/A ___	X	
APROVECHAMIENTO FORESTAL	SI X	NO ___	N/A ___		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ___	NO ___	N/A ___	X	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ___	NO ___	N/A ___	X	
VERTIMIENTOS	SI ___	NO ___	N/A ___	X	
EMISIONES:	SI ___	NO ___	N/A ___	X	
OTROS (Especificar cual)	SI ___	NO ___	N/A ___		

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TECNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	63	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 133

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ___
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: ___
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 10 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS INFORMES MENSUALES DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No.16

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN
3.18.01	EXCAVACION MANUAL
3.18.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.20.01	EXCAVACION MANUAL
3.20.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN
3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 21** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPM-M1-N-15-FR-3
		VERSION	1
		PÁGINAS	4

FECHA 24 de enero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 21 del 15/01/2023 al 21/01/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


		SGR		MUNICIPIO	
CONTRATO	**VIGENCIA**	**2022**	**2023**	**2022**	**2023**
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,626,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%
5	Semana 19	1/01/2023	7/01/2023	$ 543,067,781.11	1.12%	$ 211,389,625.74	0.44%	$ 3,898,907,561.59	8.07%	$ 4,446,712,876.11	9.20%	1.13%
	Semana 20	8/01/2023	14/01/2023	$ 516,589,547.98	1.07%	$ 176,062,452.13	0.36%	$ 4,415,497,109.57	9.14%	$ 4,622,775,328.24	9.57%	0.43%
	Semana 21	15/01/2023	21/01/2023	$ 611,680,193.59	1.27%	$ 563,133,884.35	1.17%	$ 5,027,177,303.17	10.40%	$ 5,185,909,212.58	10.73%	0.33%

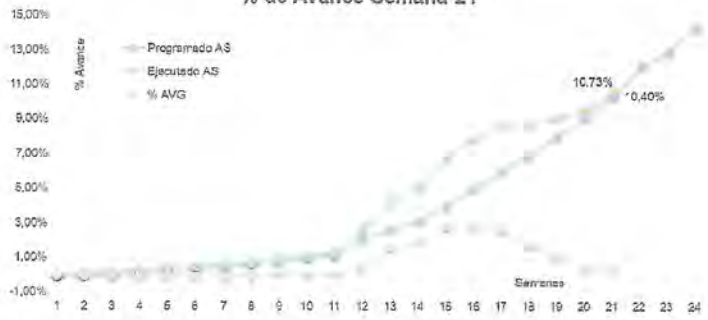



MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 21** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	X

OBSERVACIONES: SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.
SE CONTINÚA EL ACOPIO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA ADECUACIÓN DEL TERRENO EN ZONA DE CANCHAS Y PARQUEADEROS.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL.	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS:	63	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 133

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 11 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No.17

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 21** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO













XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 22** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 01 de febrero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 22 del 22/01/2023 al 31/01/2023 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:


CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,768,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,900,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.98%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%
5	Semana 19	1/01/2023	7/01/2023	$ 543,067,781.11	1.12%	$ 211,389,625.74	0.44%	$ 3,898,907,561.59	8.07%	$ 4,446,712,876.11	9.20%	1.13%
	Semana 20	8/01/2023	14/01/2023	$ 516,589,547.98	1.07%	$ 176,062,452.13	0.36%	$ 4,415,497,109.57	9.14%	$ 4,622,775,328.24	9.57%	0.43%
	Semana 21	15/01/2023	21/01/2023	$ 611,680,193.59	1.27%	$ 563,133,884.35	1.17%	$ 5,027,177,303.17	10.40%	$ 5,185,909,212.59	10.73%	0.33%
	Semana 22	22/01/2023	31/01/2023	$ 839,310,027.65	1.74%	$ 945,394,840.61	1.96%	$ 5,866,487,330.82	12.14%	$ 6,131,304,053.20	12.69%	0.55%

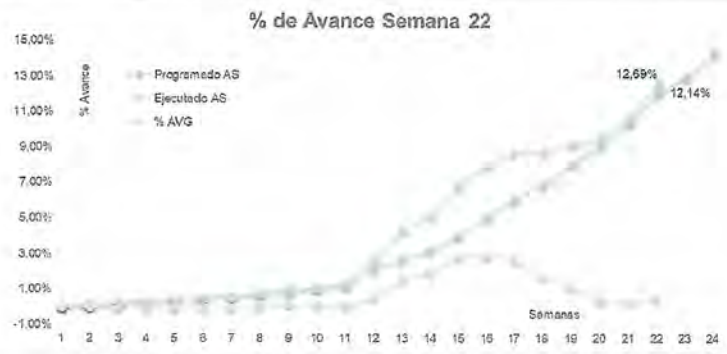

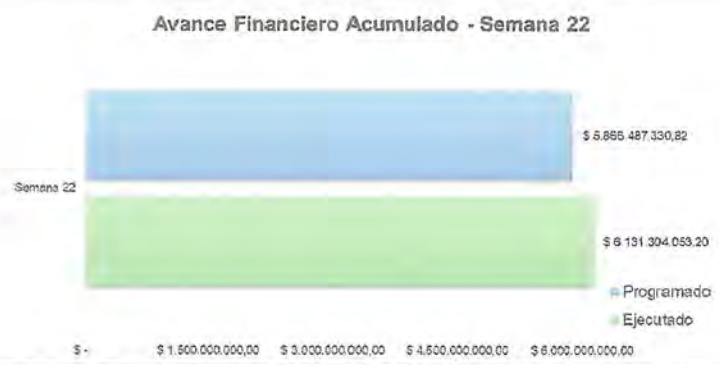

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO X	

OBSERVACIONES: SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	117	28
PERSONAL PROFESIONAL	25	19
PERSONAL TECNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	75	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 145

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 12 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE RELACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE RELACIÓN DE MAQUINARIA DEL CONTRATISTA DE OBRA
- COMITÉ DE OBRA No.17

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL
	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
	CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS INCLUYE FORMALETA
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 045X100M
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL
	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS.
	CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS INCLUYE FORMALETA
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN
	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 045X100M
	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO















XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

BITÁCORA DEL PERIODO A COBRAR

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

OBJETO

"Construcción del centro integrado de servicio (CIS) "Ahora la GENTE" en el municipio de Montería"

- Contrato No: LP-SPM-017-2022

- Contratista: CONSORCIO CIS 56

- Valor Obra: 48 329,92 SMLMV

- Interventoría: CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

- Valor Interventoría: 3.022,63 SMLMV

- Plazo: Quince (15) meses y veinte (20) días

- Fuente de Financiación: Sistema General de Regalías, asignaciones directas y asignación para la inversión local, según NBI, Recursos propios municipio de Montería.

9 de Septiembre 2022 - Viernes

-Estado del Tiempo: Nublado.

-Personal contratista: Director de Obra, residente de Obra Ingeniero ambiental, trabajadora social, profesional SST

-Personal Interventoría: Residente de obra, Ingeniero ambiental profesional SST, trabajadora Social

-Actividades Realizadas:
Se realiza un recorrido para el reconocimiento del lote donde se evidencia la presencia de dos habitantes de la calle y dos perros así como también estructuras existentes, andenes, sardineros, placas de concreto y muro de cerramiento en gran parte del lote.

No se realizan actividades por parte del contratista hasta no realizar socialización de inicio de Obra.

Residente Contratista

Residente Interventoría

Sabado - 10 de septiembre 2022

-Estado del tiempo: Nublado.

Personal Contratista: Director de Obra, Residente, ingeniero ambiental Ingeniero forestal, trabajadora social, profesional SST.

Personal Interventoría: Director de Obra, Residente de Obra, Ingeniero ambiental, trabajadora Social, profesional SST.

Actividades Realizadas:
- Se realiza inspección y reconocimiento de las especies del flora y fauna en el lote

No se realizan actividades por parte del contratista hasta no realizar Socialización de Inicio de obra.
- Se evidencian en el lote unas pilas de RCD bastante considerables, se le hará levantamiento topografico.

Residente Contratista

Residente Interventoria

Lunes, 12 de Septiembre 2022

Estado del Tiempo: Soleado.

-Personal Contratista: Director de Obra, Residente, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, Trabajadora social, profesional SST

-Personal Interventoría: Residente de Obra, profesional SST ingeniero ambiental, trabajadora Social.

Actividades Realizadas:
Se realiza inspección para la planeación del inicio de las actividades de dismonte de maleza y arbustos y tala de arboles.

No se realizan actividades por parte del contratista hasta no realizar Socialización de inicio de Obra.

Residente Contratista

Residente Interventoría

Martes 13 de Septiembre 2022

-Estado del Tiempo: Soleado

-Personal contratista: Director de Obra, Residente, trabajadora Social profesional SST.

-Personal Interventoría: Residente de Obra, profesional SST, trabajadora Social

-Actividades Realizadas:
Se plantean posibles puntos para entrada, y salida de vehículos
Se adelantan tramites para acometidas de aqueducto y alcantarillado

No se realizan actividades por parte del contratista hasta realizar Socialización de inicio de obra.

Residente Contratista

Residente Interventoría

Miercoles 14 de Septiembre 2022

Estado del Tiempo: Soleado

-Personal Contratista: Director de Obra, Residente, trabajadora Social profesional SST.

-Personal Interventoría: Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST

-Actividades Realizadas: Se tiene programado para el día de mañana la Socalización de Inicio de Obra

Residente Contratista

Residente Interventoría

Jueves 15 de Septiembre 2022

Estado del Tiempo: Soleado

-Personal Contratista: Director de Obra, Residente de Obra, profesional SST, trabajadora Social,

-Personal Interventoría: Director de Obra, Residente de Obra, profesional SST, trabajadora Social.

-Actividades Realizadas

Se asiste a la socialización de inicio de obra realizada en el colegio Antonia Santos en el barrio La Granja

Se programa el inicio de actividades en campo, para el día de mañana

Héctor S.
Residente Contratista

Stella Ser. C
Residente Interventoría

Viernes 16 de Septiembre 2022

Estado del Tiempo: Nublado.

-Personal Contratista: Director de Obra, residente, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora social

-Personal Interventoría: Residente de Obra, profesional SST trabajadora Social ingeniero ambiental

Actividades Realizadas:

Se inicia con el desmonte de arbustos y maleza en el lote con herramientas manuales.

- Se inicia el ahuyentamiento de las especies encontradas principalmente iguanas y se reubican en parques cercanos

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 17 de Septiembre 2022

-Estado del tiempo:

-Personal Contratista: Director de Obra, residente, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, trabajadora Social.

-Personal Interventoria: Director de Obra, residente, profesional SST, trabajadora Social, profesional ambiental.

-Actividades Realizadas:

- Continuación del desmonte y corte de arbustos del terreno con herramientas manuales.
- Continuación de reubicación de las especies encontradas en el lote (iguanas) a parques cercanos al sector.

Residente Contratista

Residente Interventoria

Lunes 19- Septiembre 2022

Estado del tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, trabajadora Social; cuadrilla de tala, cuadrilla de desmonte de arbustos

- Personal Interventoria : Residente, profesional SST, ingeniero ambiental, trabajadora Social

Actividades Realizadas:

- Inicia la actividad de tala de arboles autorizados por la CVS con motosierras
- Inicial el cargue y retiro de las ramas de los arboles talados
- Continua el desmonte de arbustos del lote
- Continua el ahuyentamiento de las especies encontradas en el lote y reubicadas en los parques cercanos al Sector

Hector
Residente Contratista

Lyz Sedra Sanc
Residente interventoria

Martes 20 de septiembre 2022

- Estado del tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, residente, ingeniero forest ingeniero ambiental, profesional SST, trabajadora Social cuadrilla de tala, cuadrilla de desmonte de arbustos.
- Personal Interventoria : Residente de Obra, profesional ambiental profesional SST trabajadora Social

- Actividades Realizadas
- Continua Pa tala de arboles autorizados por la CVS. con motosierras, entre las especies encontradas, Guayabo, Higo almendro, campano.
- Continua el cargue y retiro de residuos
- Continua el desmonte de arbustos y maleza del lote
- Continua Pa reubicación de las especies encontradas en el lote pincipalmente iguanas, ardillas y zarigüeya

Firmas
Presidente Contratista
Presidente Interventoria

Miercoles 21-Septiembre 2022

Estado del tiempo:

- Personal Contratista: Director de Obra, Residente, profesional SST, trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, cuadrilla tala de arboles, cuadrilla desmonte de maleza
- Personal Interventoria: Director de Obra, Residente, profesional SST, profesional ambiental, trabajadora social

Actividades Realizadas:

- Continua Pa remoción de especies vegetales con motosierras, entre Pas especies encontradas Almendro, Mango, Higo, campano.
- Continua retiro de residuos de Pa tala de arboles
- Continua el desmonte y corte de arbustos y maleza del lote
- Continua el ahuyamiento de Pa fauna encontradas en el lote así como Pa reubicación de las mismas.

Firmas
Presidente Contratista
Presidente Interventoria

Jueves - 22 de septiembre 2022.

Estado del Tiempo:

Personal Contratista: Director de obra, residente, profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora social, cuadrilla tala de arboles, cuadrilla desmonte de arbustos

- Personal Interventoría: Residente de obra, profesional SST profesional ambiental, trabajadora social

- Actividades Realizadas.
- Continua la remoción de especies vegetales
- Continua el cargue y retiro de residuos de la tala de arboles.
- Continua el desmonte de arbustos y maleza del lote
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote (iguanas, ardillas y zarigüeyas).

Residente Contratista

Residente Interventoría

23 de septiembre - Viernes

- Estado del tiempo: Lluvias de 1:45 pm a 4:00 pm.

- Personal Contratista: Director de obra, residente, trabajadora social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, cuadrilla tala de arboles, cuadrilla desmonte

- Personal Interventoría: Residente de obra, trabajadora Social profesional ambiental profesional SST

- Actividades Realizadas
- Continua la remoción de especies vegetales con motosierras, entre las especies encontradas, Espino, coco guacimo, camajón
- Continua, cargue y retiro de material sobrante de la tala de los arboles.
- Continua el desmonte de arbustos y maleza del lote
- Continua la reubicación de las especies animales encontradas en el lote (iguanas, ardillas y zarigüeyas).
- En horas de la tarde se suspenden actividades por lluvias.

Residente Contratista — Residente interventoría

24 - Septiembre 2022 - Sábado

- Estado del Tiempo:
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora social, profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal cuadrilla tala de arboles, cuadrilla desmonte de arbustos
- Personal Interventoría: Director de Obra, residente, profesional SST, trabajadora Social, profesional ambiental.

- Equipos: Motosierras, herramientas menores.

- Actividades Realizadas:
- Continuación de desmonte de arbustos y malezas del lote
- Continuación de remoción de especies vegetales aprobadas por la CVS para su tala
- Cargue y retiro de material de residuos de vegetación
- Continuación de reubicación de las especies animales encontradas y llevadas a parques cercanos al lote

Residente Contratista — Residente Interventoría

Lunes - 26 - Septiembre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias desde 5:00pm a 5:35 pm.
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, cuadrilla desmonte de arbustos, cuadrilla remoción de especies
- Personal Interventoría: Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST profesional ambiental.
- Equipos: Motosierras. Herramientas menores.

- Actividades Realizadas:
- Continuación de desmonte de arbustos y maleza del lote
- Remoción de especies vegetales encontradas como Higo, Espino coco, Mango, Camajón Guayabo etc.
- Cargue y retiro de material sobrante de la tala de arboles.
- Continua la reubicación de animales encontrados en el lote tales como iguanas, ardillas, zarigüeyas..
- Hoy se realizó procedimiento de abejas africanas por parte del cuerpo de bomberos
- Al finalizar la jornada se presentan lluvias

Residente Contratista — Residente Interventoria

Martes 27 de Septiembre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias 9am a 11:30am
- Personal Contratista: Director de Obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal cuadrilla desmonte de arbustos, cuadrilla remoción de especies

- Personal interventoria: Residente de Obra, profesional SST, trabajadora Social profesional ambiental
- Equipos: Motosierras Herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Se termina la actividad de desmonte de arbustos y maleza del lote
- Continua la remoción de especies vegetales del lote
- Continua cargue y retiro de material sobrante de vegetación
- Continua el ahuyentamiento de la especies encontradas en el lote y reubicadas en parques cercanos al lote.
- Durante la mañana no se realizan actividades por lluvias.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 28 de Septiembre 2022

- Estado del tiempo:
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental, ingeniero forestal cuadrilla tala y poda de arboles.
- Personal Interventoria: Residente de obra, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental
- Equipos: Motosierras, Herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua actividad de cargue y repique de material residual de tala y poda.
- Continua la remoción de especies vegetales del lote
- Continua reubicación de animales encontrados en el lote hacia

Horas

Residente Contratista

Residente Interventoría

29 de Septiembre 2022 - Jueves.

- Estado del tiempo : Lluvias desde 12:00pm a 2:30pm y 6:00pm a 6:45p.
- Personal Contratista : Director de Obra, residente, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora social cuadrilla cargue y retiro de tala
- Personal Interventoría : Director de obra, residente de obra, profesional SST, profesional ambiental, trabajadora social
- Equipos : Motosierras, Herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Continuación de cargue y retiro de material Sobrante de vegetación
- Remoción y repique de especies vegetales encontradas en el lote
- Reubicación de especies encontradas en el lote tales como, iguanas ardillas, buhos y zarigüeyas.

Se suspenden actividades por lluvias durante la tarde

Horas

Residente Contratista

Residente Interventoría

30 de septiembre 2022 - Viernes

- Estado del Tiempo :
- Personal Contratista : Director de obra, residente, trabajadora social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST cuadrilla cargue y retiro de tala.

- Personal Interventoría: Residente de Obra, profesional SST profesional ambiental, trabajadora social

- Equipos: Motosierras Herramientas menores.

- Actividades Realizadas

Continuación de remoción, tala y poda de especies vegetales encontradas en el lote

- Continuación de reubicación de especies animales encontradas en el lote como, iguanas ardillas, buhos y zarigüeyas

HAIDER S
Residente, Contratista

Ing Estella Sarpe C
Residente Interventoría

Sabado-1 de octubre 2022

- Estado del tiempo:

- Personal contratista: Director de Obra, residente, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora social comisión topográfica, cuadrilla cargue y retiro de tala.

- Personal Interventoría: Director de Obra, residente, profesional SST profesional ambiental, trabajadora social.

- Equipos: Equipo topografico, Motosierras Herramientas menores.

- Actividades realizadas.
- Levantamiento topográfico de las estructuras existentes en el lote (Andenes bordillos, cerramiento, placas en concreto, muros, edificaciones)
- Continuan con cargue y retiro de material sobrante de la tala y poda
- Continuan con la remoción de especies vegetales
- Continuan con ahuyentamiento de las especies animales encontradas en el lote para su reubicación en parques cercanos.

Residente de Interventoria

Residente contratista

Jueves - 3 de octubre 2022

- Estado del tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, residente, Trabajadora Soc ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, comisión topografica, cuadrilla cargue y retiro de tala, operador retro excavad

- Personal Interventoria : Residente, de Obra, trabajadora social, profesi SST, profesional ambiental

- Equipos y maquinaria : Retro excavadora, equipo topografico, motosi herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continuan el levantamiento topografico de las estructuras existente en el lote
- Comienza la demolición de estructuras existentes en el lote (Muros, placas de concreto, edificaciones etc) con la retro
- Continuan con el cargue y retiro de material sobrante de vegeta
- Continuan con la reubicación de especies animales encontradas en el lote
- Continuan con la remoción de los arboles autorizados por la cvs para talar

Residente contratista

Residente Interventoria

Martes – 4 de octubre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado.
- Personal Contratista : Director de Obra, residente, trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST comisión topográfica, operador retro, cuadrilla cargue y retiro tala.
- Personal Interventoría : Residente de obra, trabajadora social, profesional SST, profesional ambiental
- Maquinas y equipos: Retroexcavadora, motosierras, equipo topografico Herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Continuación de demolición de estructuras existentes en el lote
- Extracción de raices de los arboles talados con la retroexcavadora.
- Relleno con material seleccionado en areas de raices extraidas
- Continuación de cargue y retiro de material sobrante de tala de arboles.
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote y llevadas a parques cercanos al lote
- Continuación de tala de arboles autorizados por la CVS.

Firma S — Firma S
Residente Contratista — Residente Interventoría

Miercoles – 5 de octubre 2022

- Estado del Tiempo : Lluvias desde 10:20 am a 11:30 am.
- Personal contratista : Director de Obra, residente, trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, comisión topográfica, operador retroexcavadora, operador Bulldozer, cuadrilla retiro y tala de arboles.

- Personal Interventoría: Director de Obra, residente, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental.

- Equipos: Motosierras, Equipo topográfico, retroexcavadora, Bulldozer Herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continuación de tala, retiro y cargue de arboles autorizados por la CVS
- Continuación de extracción de raices.
- Continuación de relleno con material seleccionado de raices extraidas
- Continua el levantamiento topografico de las estructuras existentes
- Paralelamente se continua con la demolición de las estructuras existentes
- Continuación de rebbicacion de especies animales encontrados en el lote
- Comienza el descapote en las áreas más despejadas del lote con el bulldozer
- Las actividades realizadas se ven afectadas por lluvias durante la mañana así como también el rendimiento de la jornada

Horas

Residente Contratista

Residente Interventoría

Jueves 6 de octubre 2022.

- Estado del Tiempo: Soleado.

- Personal Contratista: Director de obra, residente, trabajadora Social ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST comisión topografico, operador retroexcavadora, operador bulldozer cuadrilla tala y retiro

- Personal Interventoría: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental

- Equipos: Motosierras, retroexcavadora, bulldozer, Equipo topográfico Herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Inicio de cerramiento en laminas de zinc alambre de puas y concertina
- Continua Pa tala, repique de ramas, corgue y retiro de arboles.
- Continua el descapote con maquina en las areas despejadas del lote
- Continua Pa demolicion de estructuras existentes (andenes edificios muros, bordillos etc)
- Continuacion de ahuyentamiento de especies encontradas en el lote y reubicados en parques cercanos al lote.
- Continua Pa extraccion de raices y su posterior relleno con material seleccionado.

Hector S
Residente Contratista

Liz Stella Sar. C.
Residente interventoria

Viernes - 7 de octubre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias de 2:30pm a 3:30pm.

- Personal Contratista: Director de obra, residente, trabajadora social ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, comision topografica, operador retroexcavadora, operador bulldozer, almacenista auxiliar almacen, cuadrilla tala y retiro, cuadrilla cerramiento

- Personal Interventoria: Residente de obra, trabajadora social, profesional SST, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: Motosierra, retroexcavadora, bulldozer, equipo topografico, herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continuacion de descapote
- Continuacion de demoliciones en edificaciones existentes
- Continuacion de reubicacion de animales encontrados en el lote.
- Continuacion de cerramiento en laminas de zinc.

- Continua la tala, repique de raices, cargue y retiro de las mismas.
- Las actividades se ven afectadas por lluvias en horas de la tarde

Residente Contralista | Residente Interventoría

Sabado - 8 de octubre 2022.

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contralista: Director de Obra, Residente, trabajadora social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, comisión topografica, operadores maquinas, cuadrilla cerramiento, cuadrilla tala y retiro, almacenista, auxiliar almacen auxiliares de tropico

- Personal Interventoria: Residente de obra, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: Motosierra, retroexcavadora, bulldozer equipo topografico, Herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua la tala, repique, cargue y retiro de raices y arboles autorizados por la CVS.
- Continua del cerramiento en lamina de zinc.
- Continuan la reubicación de las especies animales encontradas en el lote
- Continua el desespote y acopio del material Sobrante para su posterior retiro
-

Residente contralista | Residente interventoría

Jueves - 10 de octubre 2022

- Estado del clima: Soleado
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora Social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, almacenista auxiliar almacen, auxiliares de tropico, operadores de maquinaria cuadrilla tala y retiro, cuadrilla cerramiento
- Personal Interventoria: Director de Obra, residente, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental
- Maquinas y equipos: Motosierra, retroexcavadora, Bulldozer, equipo topografico, Herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuación del cerramiento en laminas de zinc
- Continuan descapote del lote
- Continuan Pa reubicación de las especies animalis encontradas en el lote y llevados a parques cercanos.
- Continua Pa demolición de estructuras encontradas en el lote
- Continua Pa tala, repique, cargue y retiro de las raices de los arboles autorizados por la CVS.

Heiner S — Le Bella S.A.S.C

Residente Contratista — Residente Interventoria

Martes 11 de octubre 2022:

Estado del Tiempo: Lluvias - 8:40 am a 9:30 am

- Personal contratista: Director de Obra, residente, profesional SST trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de tropico, comisión topografico, operadores de maquina, cuadrilla tala y retiro

- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental.

- Maquina y Equipos: Motosierras, Retroexcavadora, Bulldozer, equipo topográfico Herramientas menores.

Actividades realizadas.
- Continua Instalación de cerramiento perimetral en zin
- Continua descapote del lote
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote (iguanas, ardillas y 3 armadillos) hacia parques cercanos.
- Continua la tala, repique, cargue y retiro de arboles.
- Continua la extracción de raices de los arboles talados
- Continua la demolición de estructuras existentes
- La jornada laboral comienza luego de lluvias presentadas en horas de la mañana

Horas — Yo Erick Sanz C
Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles - 12 de Octubre 2022

- Estado del tiempo: Lluvias desde 4:30am a 7:30am

- Personal Contratista: Director de Obra, residente, ingeniero ambiental ingeniera forestal, trabajadora Social, profesional SST, comisión topografica, operadores maquina, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de tráfico, cuadrilla cerramiento, cuadrilla tala y retiro

- Personal Interventoria: Residente de Obra, profesional SST profesional ambiental, trabajadora Social

- Maquinas y equipos: Motosierras, retroexcavadora, Bulldozer, equipo topografico, Herramientas manores

- Actividades Realizadas.
Hoy el terreno amanece saturado por lluvias durante la madrugada
- Continua instalación de cerramiento en laminas de zinc.
- Continuan las actividades de tala, repique, cargue y retiro de los arboles autorizados para su tala por la CVS.
- Continua el desarrote del lote con el bulldozer
- Continua la extracción de raices con la retro.
- Continua el ahuyentamiento de especies animales encontradas en el lote.

Heazer S — Ing Stella Sep C
Residente de Contratista — Residente Interventoria

Jueves 13- octubre 2022.

- Estado del tiempo: Lluvias desde 3:40 pm a 4:07 pm
- Personal Contratista: Director de Obra, residentes, profesional SST trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora Social, comisión topografica, operadores maquinaria, almacenista auxilios de almacen, auxiliares de trapico, cuadrilla de cerramiento cuadrilla de tala y retiro.
- Personal Interventoria: Director de obra, residente, profesional SST trabajadora Social, profesional ambiental
- Maquinas y Equipos: Retroexcavadora, Bulldozer, Motosierras equipo topográpico Herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Continua la instalación del cerramiento en lamina de zinc
- Continua la tala, repique, cargue y retiro de arbdes
- Continua la reubicación de especies animales encontrada en el lote
- Demolición de pavimentos rigidos

- Continua descapote del lote
- Se suspenden actividades en horas de la tarde por lluvias

HEIDAN S
Residente Contratista

Steel Sas C
Residente Interventoria

Viernes 14 octubre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias desde 3:00pm a 3:30pm.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora Social almacenista, auxiliar de almacen, auxiliares de transito, operadores de maquinas, comisión topografica, cuadrilla de cerramiento, cuadrilla de tala y retiro
- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora social, profesional SST, profesional ambiental.
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo Topográfico, Motosierras, herramientas menores.

Actividades Realizadas
- Continuación de cerramiento en lamina de zinc.
- Continuación de tala, repique, cargue y retiro de arboles autorizados
- Continua la reubicación de las especies animales encontrados en el lote y llevadas a parques cercanos.
- Continua el descapote y el acopio del material para su posterior retiro
- Se suspenden actividades en horas de la tarde por presencia de lluvias

HEIDAN S
Residente Contratista

Steel Sas C
Residente Interventoria

Sabado - 15 octubre 2022

- Estado del tiempo : lluvias desde 2:30pm a 3:30pm.
- Personal Contratista : Director de Obra, residentes, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora social, almacenista, auxilios almacen, auxiliares de transito, operadores de maquina, comisión topografica, cuadrilla de cerramiento, cuadrilla de tala y retiro.
- Personal Interventoria : Director de Obra, residente, trabajadora social profesional SST, profesional ambiental.
- Maquinas y Equipos: Bulldozer, retroexcavadora, motosierras, equipo topografico, herramientas menores.
- Actividades realizadas
- Continua instalación de cerramiento en lamina de zinc.
- Instalación de señales de transito de acuerdo al PMT
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lde y llevadas a parques cercanos.
- Continua el cargue y retiro de las ramas de los arboles talados
- las actividades se suspenden por lluvias durante la tarde

Residente Contratista

Residente Interventoria

Lunes - 17 - octubre 2022

- Estado del tiempo : Soleado
- Personal Contratista : Director de Obra, residentes, trabajadora social ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, almacenista auxilios almacen, auxiliares de transito, operadores maquinas comisión topografica, cuadrilla tala y retiro, cuadrilla cerramiento

- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST, profesional ambiental.

- Maquinas y equipos: Motosierras, bulldozer, retroexcavadora, equipos topograficos herramientas menores.

Actividades Realizadas

- Continua instalación de cerramiento en laminas de zinc.
- Continua el descapote y acopio del material para su posterior retiro
- Continua la tala, repique, cargue y retiro de arboles autorizados por la CVS.
- Continua el ahuyentamiento de especies animales encontradas en el lote y su reubicación a parques cercanos.

Horas)

Residente Contratista

Residente Interventoria

Montes 18 de octubre 2022

- Estado del clima: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, residentes, trabajadora Social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, almacenista auxiliar almacen, auxiliares de trapico, comisión topográfico, operadores maquinas, cuadrilla tala y retiro, cuadrilla cerramiento

- Personal Interventoria: Residente de obra, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topográfico herramientas menores.

- Actividades Realizadas
- Se adelantan trabajos para adecuación de baños y oficinas provisionales
- Se termina de acopiar el material de retiro y se comienza con el retiro del mismo
- En obra se encuentra gran cantidad de material de desecho acumulado (basura) este tambien se retira
- Continua la reubicación de animales encontrados en el lote hacia parques cercanos.
- Se termina la instalación de cerramiento en lamina de zinc y se comienza la instalación de concertina
- Continua el descapote y acopio del material para su posterior retiro

Hasson) Ing Stefhe Sepc

Residente Contratista Residente Interventoria

Miercoles 19- octubre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora Social personal SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, almacenista auxilios almacen, auxiliares de tropico, comisión topografica, operadores maquinas, cuadrilla cargue y retiro
- Personal Interventoria: Director de Obra, residente, profesional SST profesional ambiental, trabajadora Social
- Equipos y Maquinas: Bulldozer, Retroexcavadora, motosierras, equipo topografico, herramientas menores
- Actividades Realizadas
- Continuan trabajos para la adecuación de Baños y oficinas provisionales
- Continua el retiro de residuos encontrados en el lote (basura)
- Continua el cargue y retiro de ramas y sobrantes vegetales de la tala

- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote y Tierra acumulada en el lote
- Continua el ahuyentamiento de las especies animales encontradas en el lote.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Jueves-20 de octubre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado
- Personal Contratista : Directa de Obra, residente, Trabajadora Social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de tráfico, operadores maquina, comisión topográfica, cuadrilla tala y retiro.
- Personal Interventoria : Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, motosierra, equipos topográficos
- Actividades Realizadas
- Continua la reubicación de las especies animales encontradas en el lote
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote y tierra acumulada en el lote
- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua retiro de material vegetal sobrante
- Demolición de estructuras en concreto

Residente Contratista — Residente Interventoria

Viernes - 21 de octubre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias 3:30 pm a 4:00pm
- Personal Contratista: Director de Obra, residentes, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora Social almacenista, auxiliar de almacen, auxiliares de tropico, operadores maquina, comisión topografica, cuadrilla tala y retiro
- Personal Interventoria: Residente de obra, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental.
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, motosierras equipo topografico, Herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua retiro de material sobrante de descapote y tierra acumulada encontrada en el lote.
- Continua Pa reubicación de especies animales encontradas en el lote
- Continua retiro de material vegetal sobrante de tala
- Continua retiro de material residual (basura) encontrada en el lote.
- Adelantan actividades de adecuación de Baños y oficinas provisionales
- Se Suspenden actividades en horas de la tarde por lluvias.

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 22 octubre 2022

- Estado del tiempo: Soleado
- Personal Contratista: Director de obra, residentes, trabajadora Social, profesional SST, ingenian ambiental, ingeniero forestal, almacenista, auxilior de almacen, auxiliares de tropico.

operadores maquina, comisión topográpica, cuadrilla tala y retiro

- Personal Interventoría: Directo de obra, residente, profesional SST profesional ambiental, trabajadora Social.

- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografico Herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua el cargue y retiro de material Sobrante (tierra)
- Continuas cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua cargue y retiro de material residual vegetal

Residente Contratista — Residente Interventoría

Jueves-24 octubre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de obra, residentes, profesional SST ingeniero forestal, ingeniero ambiental, trabajadora Social, almacenista, auxiliar almacen, operadores maquina, auxiliares de trafico, cuadrilla de retiro.

- Personal Interventoría: Residente de obra, Trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental

- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, Herramientas menores, equipo topográfico.

Actividades Realizadas.

- Continua cargue y retiro de material Sobrante de deseapote
- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua cargue y retiro de material sobrante vegetal.

Heroes
Residente Contratista

Fs Stella Sep C
Residente Interventoria

Martes 25 octubre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado.
- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora Social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, almacen, auxiliar de almacen, auxiliares de tráfico, comisión topografica, cuadrilla de retiro, operadores maquinas.
- Personal Interventoria: Director de Obra, residente, profesional SST profesional ambiental, trabajadora Social
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografica, Herramientas menores.
- Actividades Realizadas
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de deseapote
- Continua el cargue y retiro de material vegetal
- Continua el cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)

Heroes
Residente Contratista

Fs Stella Sep C
Residente Interventoria

Miercoles 26- octubre 2022

- Estado del Tiempo : Nublado - Llovisnas durante la mañana
- Personal Contratista : Director de Obra, residentes, trabajadora social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, operadores maquina, auxiliares trafico,
- Personal Interventoria : Residente de Obra, trabajadora social profesional SST, profesional ambiental
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Hoy amanece el terreno bastante saturado por lluvias durante la madrugada
- las actividades no se pueden iniciar por condiciones climática
- Se presentan lluvias durante la mañana
- Durante la tarde no se pueden iniciar actividades porque el terreno permanece Saturado.
- Demolición de muros del cerramiento existente

Hernan S
Residente Contratista

Leo Stella Sep. C
Residente Interventoria

Jueves 27 de octubre 2022

- Estado del Tiempo : Lluvias desde 7:35 am a 8:15 am
- Personal Contratista : Director de Obra, residentes, profesional SST profesional ambiental, trabajadora social, ingeniero forestal, almacenista, auxiliar almacenista, operadores maquina,
- auxiliares tráfico

- Personal Interventoria: Residente de Obra, profesional SST profesional ambiental, trabajadora social

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topográfico herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Hoy el terreno amanece saturado por lluvias y se dificulta la entrada y salida de volquetas al lote
- Continua el retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote y llevadas a parques cercanos.
- Continua el retiro de material sobrante de descapote
- Continua la demolición de andenes y bordillos existentes.

Firmas

Residente contratista

Ing Stella Sepúlveda
Residente Interventoria

Viernes - 28 octubre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Ingeniero ambiental trabajador social, ingeniero forestal, profesional SST, almacenista auxilios almacen, auxiliares de tráfico, operadores maquinaria

- Personal Interventoria: Residente de O, trabajadora Social profesional S.ST, profesional ambiental.

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas-

- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua cargue y retiro de material Sobrante de descapote
- Continua cargue y retiro de material vegetal Sobrante

Hernan S
Residente Contratista

Yo Stella Sepúlveda C
Residente Interventoría

Sabado 29- octubre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: Director de obra, Residentes, profesional SST, Ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora Social almacenista, auxiliar almacen, operadores maquina, comision topografica
- Personal Interventoria: Director de Obra, residente, profesional SST, profesional ambiental, trabajadora Social
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topográfi
- Actividades Realizadas.
- Continua el cargue y retiro de material Sobrante de descapote
- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua cargue y retiro de material vegetal Sobrante

Hernan S
Residente Contratista

Yo Stella Sepúlveda C
Residente Interventoría

Jueves 31 de octubre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado
- Personal Contratista : Director de obra, Residentes, profesional SST ingeniero ambiental, ingeniero forestal, trabajadora Social almacenista, auxiliar almacen, operadores maquinas, auxiliares de trapico:
- Personal Interventoría : Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental:
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores

Actividades Realizadas.

- Continuación de cargue y retiro de material Sobrante de
- Continuación cargue y retiro de material residual, entrapasto en el lote (basura)
- Continuación cargue y retiro de material Sobrante vegetal
- Continua la reubicación de especies arbóreas encontradas en el lote y llevadas a parques cercanos.

Residente Contratista

Residente Interventoría

Martes 01 noviembre 2022

Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, profesional SST trabajadora Social, ingeniero ambiental, ingeniero forestal almacenista, auxiliar almacen, operadores maquinas, auxiliares

Personal Interventoria: Director de obra, Residente, trabajador social profesional SST, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, herramientas menores equipo topografico.

Actividades realizadas.

- Continua el cargue y retiro de material sobrante de vegetación
- Continua cargue y retiro de material sobrante de deseopote
- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el Lote
- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote
- Continua la demolición de estructuras existentes y cerramiento

Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 02 noviembre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST, Ingeniero ambiental, Ingeniero forestal almacenista, auxiliar almacen, topografos, operadores maquina auxiliares de trafico.

- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: Bulldozer, retroexcavadora, herramientas menore equipo topografico

Actividades Realizadas

- Continua la reubicación de especies animales encontradas en el lote y llevados a parques cercanos.
- Continua cargue y retiro de material sobrante de desespote
- Continua cargue y retiro de material sobrante de vegetación
- Continua cargue y retiro de material residual
- Continua la demolición de estructuras y cerramiento existente

HEIDAS
Residente Contratista

Ing Stella Sara C
Residente Interventoría

Jueves - 03 noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, residente, trabajadora Social profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal, topografos. almacenista, auxiliar almacen, operadores maquinas, auxiliares de tráfico.

- Personal Interventoria : Director de Obra, residente, profesional SST, profesional ambiental, trabajadora Social

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topográfico herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de desespote
- Continua cargue y retiro de material residual encontrado en el lote (basura)
- Continua cargue y retiro de material vegetal
- Finaliza el ahuyentamiento de las especies animales encontradas e el lote

HEIDAS
Residente Contratista

Ing Stella Sara C
Residente Interventoria

Viernes 04 noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado
- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, Trabajadora Social, profesional SST, ingeniero ambiental, ingeniero forestal topografos, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de trapico operadores maquinas.
- Personal Interventoria : Residente de obra, trabajadora social profesional SST, profesional ambiental.
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, herramientas menores, equipo topográfico.

Actividades Realizadas.

- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote
- Continua el cargue y retiro de material residual (basura) encontrado en el lote
- Continua la condición de estructuras y cerramiento existente

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 05 noviembre. 2022

Estado del Tiempo : Soleado.

Personal Contratista : Director de Obra, Residentes de O. trabajadora Social, profesional SST, ingeniero ambiental, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de trapico operadores maquinas. topografos

- Personal Interventoria: Director de obra, trabajadora Social Residente, profesional SST, profesional ambiental
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas:

- Levantamiento topografico del lote despues del retiro del material acumulado.
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote
- Continua demolicion de estructuras y cerramiento existente.

Hagan) Ing Stella Serpa C.
Residente Contratista Residente Interventoria

Lunes 07 noviembre 2022.

- Dia festivo, no se realizan actividades por parte del contratista.

Hagan) Ing Stella Serpa C.
Residente Contratista Residente Interventoria

Martes 08 noviembre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias 2:30pm a 3:30pm
- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, profesional SST trabajadora social, almacenista, auxiliar almacen, topografos auxiliares de trafico, operadores maquinas.

2. Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social profesional SST.

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topográfico, herramientas menores.

Actividades Realizadas

- Continuo el retiro de material sobrante de descapote
- Llega el vibro compactador a obra, pero no puede comenzar por lluvias durante la tarde
- Se suspenden las actividades por lluvias.

Hanos
Residente Contratista

Ing Stella Sep C
Residente Interventoria

- Miercoles 09 noviembre 2022

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, trabajadora social, profesional SST, ingeniero ambiental, almacenista auxiliar almacen, topografo, auxiliares de tráfico, operadores maquina
- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST
- Estado del Tiempo: Lluvias en la madrugada.
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Hoy el terreno amanece saturado por lluvias presentadas en la noche de ayer y en la madrugada.
- Las actividades de vibrado del terreno no se pueden comenzar

Hanos
Residente Contratista

Ing Stella Sep C
Residente Interventoria

Jueves 10 noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Nublado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, trabajadora Social profesional SST, almacen, auxiliar almacen, operadores maquina, auxiliares de trafico

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residente, profesional SST trabajadora Social.

- Maquinarias y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibro compactador equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Se comienza la actividad de vibrado del terreno pero el suelo aun permanece saturado y se dificulta por ello se suspende la actividad

Residente Contratista

Residente Interventoria

Viernes 11 noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado en horas de la mañana
Lluvias a partir de las 3:00pm.

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, trabajadora Social profesional SST, almacen, auxiliar almacen, ingeniero ambiental operadores maquina, auxiliares trafico.

- Personal Interventoria : Residente de Obra, profesional SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua el vibrado del terreno presentandose fallas, los cuales se subsanan con estabilizado del terreno con piedra rajón y luego relleno con material Seleccionado
- Llegan material de relleno a Obra para extenderlo en las zonas ya compactadas
- Se suspenden actividades en horas de la tarde por Lluvias

Hasta

Ing Stella Sapc
Residente Contratista — Residente Interventoría

Sabado 12 noviembre 2022

- Estado del Tiempo: Lluvias desde 5am hasta 5:40 am

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, trabajadora Social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de trafico, operadores maquinas, topografo

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST,

- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores.

- Actividades Realizadas
- La obra amanece muy saturada por las lluvias presentadas durante la madrugada.
- No se pueden comenzar actividades

Hasta

Ing Stella Sapc
Residente Contratista

Jueves 14 de noviembre 2022

- Estado del tiempo: Lluvias a partir de las 11:20 am
- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, trabajadora Social profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de Trapico operadores de maquina, topografo. ingeniero ambiental,
- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores.
- Actividades Realizadas.
- Se continua vibrando el terreno parcialmente porque el terreno permanece saturado, se encuentran fallos y se estabilizan con piedra rajon y material sde relleno.
- Se suspenden las actividades por lluvias al medio día
En horas de la tarde no se labora.

Residente Contratista

Residente Interventoria

Martes 15 de noviembre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado
- Personal Contratista: Director de Obra, residentes, trabajadora Social, profesional SST, ingeniero ambiental, almacenista auxiliar almacen, auxiliares de trapico, operadores maquinas topografos.

- Personal Interventoria : Director de Obra, residente, profesional SST trabajadora Social.
- Maquinaria y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores, motobomba 3"
- Actividades Realizadas.
- Continua el acopio de material de relleno
- Continua el vibrado del terreno en las zonas más altas
- Se bombea el agua acumulada en las zonas más bajas del lote
- Se extiende el material de relleno en las zonas ya vibradas.

Hernan S — Fg Stella Sep. C

Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 16 de noviembre

Estado del Tiempo : Nublado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, profesional SST, trabajadora social, topografo, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares de trafico, operadores maquinas, ingeniero ambiental
- Personal Interventoria : Residente de obra, trabajadora social profesional SST
- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topografico, herramientas menores, motobomba 3"

Actividades Realizadas

- Continua el acopio de material de relleno
- Se extiende el material en las zonas donde permite el terreno
- Se continua evacuando el agua acumulada con motobomba
- Continua la compactación del material de relleno

Residente Contratista

Residente Interventoria

Jueves 17 noviembre 2022

Estado del Tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, residente, profesional SST trabajadora Social, topograpo, almacenista, auxiliar almacen auxiliares de tropico, operadores maquinas
- Personal Interventoria : Director de Obra, residente, profesional SST trabajadora Social.
- Maquinaria y equipos: Retroexcavadora vibrocompactador, Bulldozer equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua el acopio de material de relleno
- Se continua la extendida del material para realizar la plataforma para la maquina pilotecadora

Residente Contratista

Residente Interventoria

Viernes 18 noviembre 2022

Estado del Tiempo : Nublado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST, almacen, auxiliar de almacen, topografos, auxiliares viales, operadores de maquinas, Ingeniero ambiental

- Personal Interventoria : Residente de Obra, trabajadora social profesional SST,

- Equipos y maquinas: Bulldozer, Retroexcavadora, rodillo compactador equipo topográfico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua llegando material de relleno para su acopio
- Continua nivelación y compactación del terreno
- Se extiende material de relleno

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 19 de noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, profesional SST, trabajadora social, inspectores de obra, almacenista auxiliar almacen, topografos, auxiliares de topico operadores maquina

- Personal Interventoria : Residente de Obra, profesional SST trabajadora Social

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador equipo topográpico, herramientas menores.

Actividades realizadas.
- Continua el acopio de material de relleno
- Continua nivelacion y compactación del terreno.
- Continua relleno con material seleccionado

Residente Contratista — Ing Stella Serpa C Residente Interventoria

21 de noviembre - Lunes.

Estado del Tiempo: Soleado
- Continua el acopio de material de relleno.
- Continua la nivelación y compactación del terreno
- Hoy llega las partes de la maquina piloteadora a obra

-
- Personal Contratista: Director de obra, residentes, inspectores de O. Trabajadora Social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, topógrafos, auxiliares viales, operadores maquina. Ingeniero ambiental
- Personal Interventoria: Director de obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retro excavadora vibrocompactador, equipo topografico, herramientas menores.

Residente Contratista — Ing Stella Serpa C Residente Interventoria

22 de noviembre 2022 - Martes

- Estado del Tiempo : Soleado.

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspector de Obra, trabajadora social, profesional SST, topografos almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, vigilancia privada.

- Personal Interventoria : Director de obra, Residente, trabajadora social, profesional SST.

- Maquinas y equipos: Bulldozer, vibrocompactador equipo topográfico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua el acopio de material de relleno.
- Continua extendida nivelación y compactación del terreno

Horas

Residente Contratista

Ls Stella Sap. C

Residente Interventoria

Miercoles 23 de noviembre 2022

- Estado del Tiempo : Soleado.

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspector de Obra, trabajadora Social, profesional SST, almacenista auxiliar almacen, topografos, auxiliares viales, operadores maquinas, vigilancia privada, ingeniero ambiental

- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora Social, profesional SST

- Maquinas y equipos: Bulldozer, vibro compactador, Motoniveladora, grua, equipo topográfico, herramientas menores

Actividades Realizadas.

- Hoy llega a Obra la piloteadora y una grúa para Instalación de pilotes prefabricados.
- Continua el acopio de material de relleno
- Continua la extendida, nivelación y vibrado del terreno

Hans — Lz. Stella Sepúlveda

Residente Contratista — Residente Interventoria

Jueves - 24 de noviembre 2022

Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores de Obra, trabajadora Social, profesional SST, almacenista auxiliar almacen, topografos auxiliares viales, operadores maquinas

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residente trabajadora Social, profesional SST

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, vibrocompactador, piloteadora, grua, equipo topográfico herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua la llegada de material de relleno y se acopia
- Continua la nivelación y compactación del terreno
- Paralelamente se trabaja en el armado de la pilotedora para su optimo funcionamiento

Residente Contratista — Residente Interventoria

Viernes 25 de noviembre 2022

Estado del Tiempo : Soleado

Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora Social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, topografos ing ambiental, profesionales pilotaje. vigilancia privada

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residente trabajadora Social, profesional SST

- Maquinas y equipos: Bulldozer, vibrocompactador, equipo topografico, piloteadora, grua, herramientas menores.

Actividades realizadas.
- Se verifican la localización de los pilotes según coordenadas topográficas.
- Se verifican cotas y niveles de desplante de cada pilote de acuerdo a la profundidad de cada dado
- Llegan los primero pilotes a obra
- Continua el acopio de material de relleno
- Continua la compactación del terreno

Jueves - 29 noviembre 2022

- Estado del tiempo : fuertes lluvias desde 3:15 pm
- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora social, profesional SST, ingeniero ambiental, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, topografos, profesionales pilotaje, vigilancia priva
- Personal Interventoria : Director de obra, Residente, profesional SST, trabajadora social
- Maquinas y equipos : Vibrocompactadora, grúa, piloteadora equipo topográfico, herramientas menores, motobomba
- Actividades Realizadas:
- Hoy amanece el terreno muy saturado por fuertes lluvias en la tarde de ayer domingo.
- Se suspende la entrada de material de relleno por dificultad en el terreno
- No se puede vibar, ni nivelar el terreno por Terreno inestable
- Llegan viajes de pilotes pero no se pueden hincar por fuertes lluvias durante la tarde.

Residente Contratista

Residente Interventoría

Martes 29 noviembre 2022

- Estado del Tiempo: Nublado en la mañana, Soleado en la tarde
- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspector de Obra, trabajadora Social, profesional SST, almacenista auxiliar de almacen, operadores maquinas, auxiliares viales equipo pilotaje, vigilancia privada.
- Personal Interventoria: Residente de Obra, Trabajadora Social Profesional SST
- Maquinas y equipos: Piloteadora, Retro excavadora, grúa Bulldozer, equipo topografico, herramientas menores, motobomba

Actividades Realizadas.

- Hoy el Terreno amanece bastante Saturado por Lluvias el día anterior
- Se hace necesario bombear el agua con motobomba
- Se detiene el acopio de material de relleno porque se dificulta la entrada de volquetas.
- Llegan 2 vigas más de pilotes
- Se hincan 15 pilotes del ge 1 bloque 1a
- Llega piedra rajón para fallos.
- Se retoma el retiro de material de desecho acumulado

Residente Contratista

Residente Interventoria

Miercoles - 30 de noviembre 2022

- Estado de Tiempo: Soleado.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacenista, auxiliares viales, operadores maquinas, topografos, equipo pilotaje, ingeniera ambiental.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residente, trabajadora social, profesional SST

- Maquinarias y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, motoniveladora vibrocompactadora, equipo topografico, herramientas menores, piloteadora, grua

- Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes, hoy se instalaron 24 pilotes
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote
- Continua la extendida y nivelación del terreno
- Continua la compactación del terreno con el vibrocompactador

Hasar
Residente Contratista

Estelle Sas C
Residente Interventoria

- Jueves - 01 - diciembre 2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, inspectores trabajadora social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen auxiliares viales, topografos, operadores maquinas, equipo pilotaje

CONTINUACIÓN DE BITACORA

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

- Personal Interventoria: Residente de Obra, trabajadora social profesional SST

- Maquinas y equipos: Bulldozer, Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, equipo topografico, Herramientas menores, piloteadora, grúa
- Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes, hoy se instalaron 20
- Continua el cargue y retiro de material sobrante de descapote
- Continua el acopio de material de relleno
- Continua la extendida y compactación del relleno

Residente Contratista — Residente Interventoria

Viernes - 02 - Diciembre 2022

- Estado del tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, residentes, inspectores trabajadora social, ingeniera ambiental, profesional SST almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, equipo pilotaje, topografos

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residente, trabajadora Social, profesional SST

- Maquinaria y equipos: Equipo topografico, bulldozer, retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactadora, Herramientas menores

Actividades realizadas.
- Continuar el hincado de pilotes
- Continuar el cargue y retiro de material sobrante de desapote
- Continuar relleno con material seleccionado
- Continuar la compactación del relleno.

Hernan) Fs Stella Sap-C
Residente Contratista Residente Interventoría

Sabado 03-Dic-2022

Estado del tiempo: Soleado

Personal contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora Social, profesional SST, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, topografos equipo pilotaje, ing ambiental

Personal Interventoria: Director de Obra, Residente, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos, Inspectores de obra

Maquinaria y equipos: Equipo (topografico), bulldozer, retroexcavadora, motoniveladora, piloteadora, grua PH, herramientas menores, vibro compactador

Actividades realizadas
- Continuar hincado de pilotes en edificio
- Continuar relleno con material seleccionado
- Continuar compactación del terreno con (mal) vibrocompactador

Hernan Fs Stella Sap-C
Residente Contratista Residente Interventoria

05 - DIC - 2022 - Lunes

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores de obra trabajadora Social, ingeniero ambiental, profesional SST, almacenista auxiliar almacen, operadores maquinas, topografos, equipo pilotaje

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra profesional SST, trabajadora social, topografia.

- Maquinaria y equipos: Equipo topografico, grua PH, piloteadora bulldozer, motoniveladora, retroexcavadora, herramientas menores vibrocompactador

Actividades Realizadas.

- Continuación de hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continua relleno con material seleccionado
- Continua la compactación del relleno
- Continua la adecuación de fallos con piedra rajón y material seleccionado
- Continuación cargue y retiro de material sobrante

Residente Contratista

Residente Interventoria

Martes 06-DIC-2022

Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspector de obra trabajador Social, profesional SST, ingeniero ambiental almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, topografias, equipo pilotaje

- Personal Interventoria: Director de obra, Residentes, Inspector de obra, trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, topografia

Maquinaria y equipo: plotedora, bulldozer, PH grua, motoniveladora, retroexcavadora, equipo topografico, herramientas menores, vibrocompactador

Actividades Realizadas.

- Continua hincado de pilotes de edificio y puente de conexión
- Continua relleno con material seleccionado
- Continua compactación del relleno
- Se realiza riego del terreno para garantizar compactación adecuada.

Heiron S — Residente Contratista

Lz Stella Sep. E — Residente Interventoria

Miercoles 07-DIC-2022

Estado del Tiempo:

Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora social, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, topografos, profesional SST operadores maquinas, equipo pilotaje, ingeniera ambiental

Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes Inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

Maquinaria y equipos: Equipo pilotaje, equipo topografico grúa PH, bulldozer, motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuación de hincado de pilotes
- Continuación relleno con material seleccionado
- Continuación de vibrado para compactación del relleno
- Se continua el riego con carro bomba para compactar el

- Se adelantan excavaciones para mejoramiento de la subrasante con material seleccionado y piedra bajón.
- Continua cargue y retiro de material sobrante.

Residente Contratista ... Residente Interventoría

Jueves 08-DC-2022
Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora Social, profesional SST, ingeniera ambiental, almacenista, auxiliar almacen, topografos, auxiliares viales operadores maquinarias, personal vipers (seguridad privada) equipo pilotaje

- Personal Interventoria : Director de obra, Residentes de obra, Inspector de obras, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grua PH, bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador, Retroexcavadora, herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Se avanza en la hinca de pilotes de edificios y puente de conexión
- Continua la adquisición del Terreno
- Relleno con material seleccionado compactado
- Continuación de excavaciones para mejoramiento de la subrasante con piedra bajón (fallos)
- Continua cargue y retiro de material sobrante

Residente Contratista ... Residente Interventoría

Viernes 09-DIC-2022.
Estado de tiempo: Soleado

Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, inspectores Trabajadora Social, almacenista, auxiliar almacen, topografos auxiliares viales, profesional SST, operadores maquina personal, pilotaje, vigilantes upvs (seguridad privada)

Personal Interventoria: Director de Obra, residentes inspectores de obra, trabajadora Social, profesional SST inspector SST.

Maquinaria y equipo: Piloteadora, Pluma grua, equipo topografico, bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Continuación de hincado de pilotes en edificio y puente de conexión
- Continuación de relleno con material seleccionado
- Compactación del relleno
- Excavaciones para mejoramiento de la subrasante con piedra rajón (Gallos).

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 10-DIC-2022.
Estado de tiempo: Soleado

Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectora de obra, profesional SST, trabajadora Social, almacenista auxiliar almacen, auxiliares viales, topografos operadores maquinas, personal pilotaje

- Personal Interventoría: Director de obra, Residentes, inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, topografía.

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grúa PH, bulldozer motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, equipo topográfico herramientas menores.

- Actividades Realizadas:
- Avance en hincado de pilotes
- Avance en Relleno del lote con material seleccionado
- Continuación de vibrado para compactación del terreno
- Se riega el terreno con carrobomba para garantizar compactado
- Se excava para mejoramiento de la Subrasante con piedra Rajón
- Continúa el cargue y retiro de material sobrante

Residente Contratista

Residente Interventoría

12-12-2023 → Jueves.
- Estado del tiempo: Soleado.

Personal contratista: Director de Obra, Residentes, inspectores de obra, profesional SST, trabajadora social, ingeniera ambiental almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, topografos. operadores maquinas, personal pilotaje.

Personal Interventoría: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, topografía

- Maquinaria y equipos: pilotedora, grúa PH, retroexcavadora bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador, equipo topográfico herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Hincado de pilotes en edificio y puente de conexión
- Continuación de relleno con material seleccionado
- Continuación de compactación del terreno
- Excavación para adecuación de la subrasante con piedra Rajón
- Cargue y retiro de material Sobrante.

Residente Contratista — Residente Interventoría

13-12-2022- Martes
- Estado del Tiempo: Soleado.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspector de obra, profesional SST, almacenista, auxiliar almacenista auxiliares viales, topografos, trabajadora Social, operadores maquina, personal pilotaje; seguridad privada.

- Personal Interventoría: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, profesional SST, trabajadora Social almno

- Maquinaria y equipos: Piloteadora, grúa PH, bulldozer, motoniveladora, vibrocompactadora, retroexcavadora, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Continua el relleno con material seleccionado
- Continua compactación del terreno
- Continua excavación para mejoramiento de Subrasante con piedra Rajón.
- Continua hincado de pilotes en edificio y puente de conexión

Residente Contratista — Residente Interventoría

Miercoles 14-12-2023.
Estado del tiempo: Soleado.

-Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, trabajadora Social, ingeniera ambiental topografos, almacenista, aux almacenista, auxiliares viales operadores maquina, personal pilotaje, Seguridad privada.

-Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST, Ingeniero ambiental

-Maquinaria y equipo: Piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador, equipo topografico herramientas menores.

-Actividades Realizados.
- Continua relleno con material Seleccionado
- Continuas la compactación del terreno
- Continuas el cargue y retiro de material Sobrante
- Se realizan excavaciones para mejoramiento de la subrasante con piedra Rajón
- Avanza el hincado de pilotes en edificio y puente de conexión

Residente Contratista

Residente Interventoria

Jueves 15-12-2023
Estado del Tiempo: Soleado.

-Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, personal SST, trabajadora social, ingeniero ambiental, topografos, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, personal pilotaje, Seguridad privada.

- Personal Interventoría: Director de obra, Residentes, inspectores de obra, profesional SST, trabajadora social, almacenista auxiliar almacen, auxiliares viales, topografos, personal pilotaje operadores maquinas, Seguridad privada.

- Maquinaria y equipo: piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora bulldozer, motoniveladora, vibrocompactador, equipo topográfico herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua hincado de pilotes en edificios y puente de conexión
- Continua relleno con material seleccionado
- Continua compactado del terreno.
- Continua excavaciones para mejoramientos de la subrasante con piedra rajón
- Continua cargue y retiro de material sobrante

Residente Contratista

Residente Interventoría

Viernes 16-Dic-2022
Estado del tiempo: Soleado.

Personal Contratista: Director de Obra, Residentes de Obra, Inspectores profesional SISO, Inspector SISO, trabajadora Social, topografos almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, personal pilotaje, Seguridad privada.

Personal Interventoría: Director de Obra, Residentes, Inspectores. profesional SST, Inspector SST, topografos.

Maquinaria y equipos: Piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora bulldozer, motoniveladora, vibrocompactadora, equipo topografico, Herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes
- Continua el relleno con material Seleccionado
- Continua la compactación del terreno
- Continua el cargue y retiro del material Sobrante
- Continua las excavaciones para mejoramiento de la sub rasante con piedra rajón

Residente Contratista — Residente Interventoría

Sabado 17-Dic 2022
- Estado del Tiempo: Soleado.

- Personal contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, topografia profesional SST, Inspector SST, trabajadora social, almacenista, aux almacen, auxiliares viales, personal pilotaje, operadores maquinas. Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST, topografos, ingeniero ambiental

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grúa HH, equipo topográfico Retroexcavadora, motoniveladora, vibrocompactador, bulldozer herramientas menores.

- Actividades realizadas.
- Continua el hincado de pilotes en edificio y puente de conexión
- Continua el relleno con material Seleccionado
- Continua la excavación para mejoramiento de la subrasante con piedra Rajón

Residente Contratista — Residente Interventoría

Jueves 14-DIC-2022
- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST, topografia, trabajadora Social, profesional ambiental, almacenista, auxiliar almacen auxiliares viales, operadores maquinas, personal pilotaje, cuadrilla mano de obra excavaciones, seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST, topografos.

Maquinas y equipos: piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora motoniveladora, vibrocompactador, bulldozer, equipo topográfico Herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Comienza la excavación manual de los dados de cimentación en bloque 1B
- Continua el hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Si termina Relleno con material seleccionado en area de canchas y parqueaderos.

Residentes Contratista

Residente Interventoría

Martes 20-DIC-2022
Estado del Tiempo: Soleado

Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, topografos, profesional SST, Inspector SST trabajadora Social, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, personal pilotaje, cuadrilla mano de obra excavaciones Seguridad privada.

- Personal Interventoría: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST, topografos

- Maquinas y equipos: Piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora vibrocompactador, equipo topográfico, herramientos menores

- Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continua excavaciones de dados de cimentación en bloque 1B.
- Se termina compactación del terreno en zonas de canchas y parqueaderos.

Heinos
Residente Contratista

Ls Stella Sep-C
Residente Interventoría

Miercoles 21-DIC-2022
- Estado del tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, topografia, trabajadora Social, profesional SST, Inspector SST profesional ambiental, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, operadores maquinas, personal pilotaje, cuadrilla mano de Obra excavaciones, Seguridad privada

- Personal Interventoría: Director de O, Residentes, Inspectores de Obra, profesional SST, Inspector SST, topografia, trabajadora Social, profesional ambiental

- Maquinaria y equipos: Piloteadora, Retroexcavadora, grúa PH equipo topografico, Herramientas menores.

- Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continua excavaciones de dados de cimentación en bloque 1B

- Comienzan Solado en dados de cimentación bloque 1B.
- Se realiza cimentación para montaje de torre grua.

Residente Contratista — Residente Interventoría

Jueves 22-Dic-2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales, personal pilotaje, cuadrilla mano de obra, Seguridad privada.

- Personal Interventoría: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografia.

- Maquinas y equipos: Piloteadora, grúa, equipo topográfico, Retroexcavadora, herramientas menores.

- Actividades Realizados:
- Hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continua excavación de dados cimentación de edificio
- continua Solado en edificio

Residente Contratista — Residente Interventoría

Viernes 23-12-2022

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, trabajadora social topografia, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales ingenieros ambiental, operadores maquinas, personal pilotaje, cuadrilla excavaciones, Seguridad privada.

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes, Inspector de obra, topografia, profesional SST, Inspector SST

- Maquinas y equipos: Piloteadora, grúa PH, equipo topográfico, Retroexcavadora, Herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua excavaciones para cimentación en edificio
- Continua Solado en dados de edificio

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 24-12-2022

Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes Inspectores de Obra, profesional SST, inspector SST topografia, almacenista, aux almacen, auxiliares viales cuadrilla excavaciones, operador Retroexcavadora Seguridad privada

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes Inspectores de obra, profesional SST, Inspector SST topografia, trabajador Social

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, equipo topográfico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua excavaciones de dados de cimentación
- Continua Solado en dados de cimentación

Heiron
Contratista

Interventoría

Jueves 26-012-2022

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, topografía, trabajadora Social, profesional SST, inspecto SST, almacenista, auxiliar almacen, cuadrilla excavaciones operador Retroexcavadora, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, topografos, trabajadora Social, profesional SST, Inspector SST..

- Maquinas y equipos: Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua excavaciones de dados de cimentación en edificio
- Continua Solado en dados de cimentación en edificio

Heiron S
Residente Contratista

Residente Interventoria

Martes 27-12-2022

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, almacenista aux almacen, auxiliares viales, Seguridad privada, cuadrilla excavaciones

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social

- Maquinas y equipos: Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuación excavación de dados de cimentación en edificio
- continuación de solado en dados de cimentación de edificio

Residente Contratista

Residente Interventoria

Miercoles 28-12-2022

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspector de obra, profesional SST, Inspector de Obra, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, almacenista, aux almacen, auxiliares viales, Seguridad privada cuadrilla excavación.

- Personal Interventoria : Director de Obra, residentes, inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Continuan excavación de dados en edificio
Continuan Solado de dados en edificio.

Hernan S — Lz Stella Sepulveda C.
Residente Contratista — Residente Interventoria

Jueves 29-12-2022
- Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, inspectora trabajadora Social, profesional SST, inspector SST ingeniera ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales cuadrilla excavaciones

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST trabajadora Social,

- Maquinaria y equipo: Retroexcavadora, equipo topografico herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Continuan excavaciones en dados de cimentación de edificio
- Continuan Solado en dados de cimentación de edificio

Hernan S — Lz Stella Sepulveda C.
Residente Contratista — Residente Interventoria

Viernes 30-12-2022
- Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, inspectora trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, almacenista, aux almacenista, aux viales, cuadrilla excavacion

- Personal Interventoria: Director de obra, Residentes inspector, propesional SST, inspector SST, trabajadora Social

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, herramientas menores, equipo topográfico

Actividades Realizadas:
- Continuan excavación de dados de cimentación en edificio
- Continuan Solado en dados de cimentación en edificio

Residente Contratista — Residente Interventoria

Martes 02-01-2023.
- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores propesional SST, inspector SST, trabajadora social, almacenista aux almacen, aux viales, cuadrilla excavaciones, personal pilotaje, seguridad privada, topografia

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, inspectores propesional SST, inspector SST topografia

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grúa PH, Retroexcavadora, equipo topográfico, herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Hoy se continua con el hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continuan la excavación de dados de cimentación de edificio y escaleras auxiliares
- Continuan el Solado en los dados de cimentación de edificio y escaleras.

Miercoles 04-01-2023
- Estado del tiempo: Soleado

- Personal, Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional, SST, inspector SST, trabajadora social, almacenista aux almacen, aux viales, equipo pilotaje, cuadrilla excavaciones topografia, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes inspectores, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social topografia.

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grua PH, equipo topografia Retroexcavadora, herramientas menores

Actividades Realizadas.
- Continua el hincado de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continuan Solado en dados de cimentación en edificio y escalera
- Continuan excavación de dados de cimentación

Residente Contratista

Residente Interventoria

Jueves 05-01-2023
- Estado del tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, inspectores trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, topografos almacenista, aux almacen, equipo pilotaje, cuadrilla excavaciones, Seguridad privada, operadores maquinaria

Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, inspectores trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, topografos

- Maquinaria y equipos: piloteadora, grúa PH, compresor neumatico con martillo, minicargador con martillo, equipo topográfico, herramientas menores, Retroexcavadora.

Actividades Realizadas

- Hoy finaliza el hincado de pilotes tanto de edificios, puente y escaleras auxiliares
- Continua Solado en edificio
- Hoy se comienza con el descabece de pilotes en edificio
- Continua la excavación de dados de cimentación en escaleras y puentes.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Viernes 06-01-2023
Estado del Tiempo:

Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores de obra, trabajadora social, profesional SST, inspector SST topografos, almacenista, aux almacen, auxiliares viales operadores maquinarias, cuadrilla de excavaciones, ingeniero ambiental, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, topografia

Actividades Realizadas.

- Continua descabece de pilotes en edificio y escaleras auxiliares
- Continua excavaciones de dados de cimentación de edificio
- Continua Solado en edificio, puente y escaleras auxiliares
- Continua la adecuación de terreno con material Seleccionado
- excavacion de la subrasante para su mejoramiento con piedra Rajón
- Comienza excavación de vigas de cimentacion 45X100

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, equipo topografico compresor neumatico con martillo, minicargador con martillo, herramientas menores.

Residente Contratista

Ing Stella Sep-C
Residente Interventoria

Sabado 07-01-2023.

- Estado del Tiempo :
- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos almacenista, aux almacen, aux viales, operadores maquina contratistas mano de obra, Seguridad privada.
- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes, inspector profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos
- Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, minicargador con martillo demoledor, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua el descabece de pilotes en edificio, escaleras auxiliares y puente de conexión
- Excavación de dados de cimentación de edificio escaleras auxiliares y puente de conexión
- Continua Solado en dados de cimentación de puente de conexión
- Continua excavación de viga de cimentación 45x100

Residente Contratista

Ing Stella Sep-C
Residente Interventoria

Jueves 09-01-2023.
- Estado del tiempo: Soleado.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos. almacenista, aux almacen, aux viales, operadores maquinas. contratistas mano de obra, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: Retroexcavadora, minicargador con martillo demoledor, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Continua descabece de pilotes en puente de conexión y escaleras auxiliares
- Continua excavaciones de dados de cimentación de edificio puente y escaleras auxiliares
- Continua excavación viga de cimentación 45 X 100
- Comienza armado de acero figurado en dados de cimentación de edificio y escaleras auxiliares

Residente Contratista

Residente Interventoria

Martes 10-01-2023.
- Estado del Tiempo: Soleado.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, ingeniera ambiental, topografos, almacenista, aux almacen, aux viales, operadores maquinas, Seguridad privada.

Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes Inspectores. trabajadora Social, topografos. profesional SST inspector SST.

Maquinaria y equipos: minicargador con martillo demoledor equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Continua el descabece de pilotes en edificio, puente de conexión y escaleras auxiliares.
- Continua excavación de dados de cimentación y vigas de cimentación 45x100. en edificio, puente y escaleras auxiliares
- Avanza armado de acero en dados y vigas de cimentación
- Continua Solado en escaleras auxiliares
- Se entiba los dados de escaleras auxiliares.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 11-01-2023.
- Estado del Tiempo: Lluvias a partir 4:30pm.

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social ingeniero ambiental, topografos, almacenista, auxi almacen aux viales, operadores maquinas, cuadrillas mano de Obra, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos

- Maquinaria y equipos: minicargador con martillo, equipo topografico, herramientas menores,

Actividades Realizadas-
- Continua descabece de pilotes en edificio, puente y escaleras auxiliares
- Continua armado de acero de dados y vigas de cimentación en edificio, y escaleras.
- Continua excavación de dados de cimentación de puente y escalera.
- Excavación de vigas de cimentación en puente y escaleras.
- Continua Solado en puente de conexión.
- Se retira material Sobrante de las excavaciones

Residente Contratista ... Residente Interventoria

Jueves 12-01-2023
- Estado del tiempo:

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores de Obra. Profesional SST, Inspector SST, topografia, trabajadora social, almacenista, aux almacen, auxiliares viales, operadores maquinaria, cuadrillas mano de obra, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, Inspectores de obra, profesional SST, inspector SST, topografia, profesional ambiental.

- Maquinaria y equipos: minicargador con martillo, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas:
- Continua descabece de pilotes en edificio, puente y escalera
- Continua armado de acero de dados y vigas de cimentación en edificio
- Cargue y retiro de material Sobrante de la excavación
- Continua excavación de dados y vigas de cimentación

Residente Contratista — Residente Interventoría

Viernes 13-01-2023
- Estado del Tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, Residente, inspectores de Obra, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos, almacenista, aux almacen, cuadrillas mano de obra, operadores maquinaria, Seguridad privada.

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes, inspectores, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos

- Actividades Realizadas.
- Continua descabece de pilotes en edificio, puente de conexión y escaleras auxiliares
- Avanza armado de acero de dados y vigas de cimentación en (dados) edificio.
- Continua cargue y retiro de material Sobrante de excavación
- Continua excavación de dados y vigas de cimentación de puente y escaleras auxiliares

Residente Contratista — Residente Interventoría

Sabado 14-01-2023
- Estado del Tiempo : Lluvisnas.

- Personal Contratista : Directos de Obra, Residentes, Inspectores de Obra, topografos, trabajadora Social, profesional SST inspector SST, almacenista, aux almacen, contratista mano de obra, operador minicargador, Seguridad privada

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, inspectores, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos.

- Maquinaria y equipos: minicargador con martillo, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Continua el descabece de pilotes con minicargador con martillo en edificio, puente y escaleras auxiliares
- Continua excavación de cimentación de edificio, puente de conexión y escaleras auxiliares
- Avanza armado de acero en dados y vigas de cimentación de edificio
- Se retira material sobrante de excavaciones.

Heras — Leg Estella Sas-C
Residente Contratista — Residente Interventoria

Junes 16-01-2023.
- Estado del tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes Inspector de Obra, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos, almacenista, aux almacen, aux viales cuadrilla mismo de obra, operador minicargador, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de Obra, Residentes, inspectores profesional SST, inspector SST, trabajadora Social, topografos

- Maquinaria y equipos: minicargador con martillo demoledor, equipo topografo, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuan la excavación de dados y vigas de cimentación en edificio
- Se entiba las excavaciones con laminas metalicas para contener el terreno
- Se continua fundiendo Solado en los dados y vigas de cimentación de edificio
- Continua el armado de acero en dados y vigas de cimentación

Paralelo Se arman los columnas del bloque 1B

- En escaleras auxiliares se termina excavación y Solado de cimentación
- En puente de conexión se termina excavacion y Solado de cimentación.
- Se continua con el descabece de pilotes en edificio bloque 1A
- Se acopia y retira el material Sobrante de las excavaciones

Residente Contratista

Residente Interventoria

Martes 17-01-2023

- Estado del Tiempo :

- Personal Contratista : Director de Obra, Residentes, Inspectores, trabajadora Social, profesional SST, Inspector SST topografos, profesional ambiental, almacenista aux almacen, aux viales, operador minicargador, Contratistas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria : Director de Obra, Residentes Inspectores de Obra, topografos, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: Minicargador con martillo demoledor equipo topográfico, herramientas menores

Actividades Realizadas.

- Avanzan las excavaciones de dados y vigas de cimentación en edificio
- Continua el antibado en dados con laminas metalicas
- Continua el solado en dados y vigas de cimentación del edificio
- Continua el armado de acero en dados y vigas de cimentación
- Avanza en armado del acero de columnas para edificio
- Continua el descabece de pilotes en edificio bloque 1A
- Se acopia y retira el material sobrante de excavación.

Ing. Stella Sanz C.
Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 18-01-2023

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos almacenista, aux almacen, aux viales, operador minicargador, cuadrillas mano de obra, cuadilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director de obra, Residentes, Inspectores profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografo.

- Maquinaria y equipos: Minicargador con martillo demoledor equipo topografico, mezcladora de concreto, herramientas menores

Actividades Realizadas.

- Continuación de descabece de pilotes
- Cargue y retiro de material sobrante de excavacion

- Continuación de excavación de dados y vigas de cimentación
- La cuadrilla de acero avanza en armado de parrillas para dados y canastas para vigas de cimentación
- Armado de acero de columnas para edificios

Heizen C
Residente Contratista

Ing Stella Sep-C
Residente Interventoría

- Jueves 19-01-2023
- Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspectores, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos, Ingeniero ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales, Herreros cuadrillas mano de obra, operador minicargador, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director, Residentes, inspectoras, topografia, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social.

- Maquinaria y equipo: Minicargador con martillo demoledor mezcladora de concreto, equipo topografico, herramientas menores

Actividades Realizadas.
- Continuan descabece de pilotes con minicargador con martillo demoledor
- Continuan excavación de dados y vigas de cimentación
- La cuadrilla de acero avanza en armado de parrillas para dados de cimentación
- Continuan armado de vigas de cimentación
- Paralelamente, continuan armado de acero de columnas
- Continuan acopio y retiro de material sobrante de excavación
- Comienzan formaletas en dados y vigas

Heizen C
Residente Contratista

Ing Stella Sep-C
Residente Interventoria

Viernes 20-01-2023

- Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspectores, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, profesional ambiental, topografos, almacenista, auxiliar almacen, auxiliares viales operador minicargador, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, topografos.

- Maquinaria y equipos: Mezcladora de concreto, minicargador con martillo demoledor, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continua descabece de pilotes
- Excavación de dados y vigas de 45x100 en edificio y puente de conexión
- Continuan formaletas en dados y vigas de cimentación en edificio bloque 1B.
- Continua el armado de acero en dados, vigas y columnas en edificio y puente de conexión
- Continua acopio y retiro de material Sobrante de excavación
- Llega material Seleccionado para su acopio

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 21-01-2023

- Estado del Tiempo:

- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspectores, profesional SST, Inspector SST, topografos, trabajadora Social, almacenista aux almacen, auxiliares viales, profesional ambiental, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director, Residentes, inspectores trabajadora Social, profesional SST, Inspector SST, topografos, profesional ambiental.

- Maquinas y equipos: Mezcladora de concreto, minicargador con martillo demoledor, equipo topografico, herramientas menores

Actividades Realizadas.

- Descabece de pilotes en escaleras auxiliares
- Continuan guardeando dados y vigas de cimentacion en edificio
- Avanzan en armado de acero en dados, vigas y columnas.
- Continua ingreso de material seleccionado para su acopio

Residente Contratista — Residente Interventoria

Jueves 23-01-2023

- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de obra, Residentes, Inspectores trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, profesional ambiental, topografia, almacenista, aux almacen, aux viales cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, operador mini cargador seguridad privada.

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores, topografos trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, profesional ambiental

- Maquinaria y equipos minicargador con martillo demoledor mezcladora de concreto, equipo topografico, herramientas menores

Actividades Realizadas
- Continuan formaleteando dados y vigas de cimentación en edificio 1B
- Continuan armando acero de dados, vigas de cimentación y columnas de edificio 1A y 1B.
- Continuan excavación de dados y vigas 45x100 en edificio
- Continua el acopio y retiro de material Sobrante de excavación

Residente Contratista — Residente Interventoría

Martes 24-01-2023
- Estado del Tiempo: Soleado

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores topografia, trabajadora Social, profesional SST; inspector SST profesional ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales operador minicargador, cuadrillas de mano de Obra, cuadrilla herreros seguridad privada

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores, profesional SST, Inspector SST, trabajadora Social, profesional ambiental

- Maquinas y equipos: minicargador con martillo demoledor, equipo topografico, mezcladora, herramientas menores.

Actividades Realizadas.
- Avanzan formaleteado de dados y vigas de cimentación para fundición el dia 23-01-2023.
- Continuan armado de acero en dados, vigas y columnas de edificio 1A - 1B.
- Se termina el descabece de pilotes
- Se terminan las excavaciones de cimentación
- Continua el retiro del material Sobrante de excavación

Miercoles 25-01-2023
- Estado del Tiempo : Solado

- Personal Contratista : Director, Residentes, Inspectores, topografos profesional SST, inspectores SST, profesional ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales, cuadrillas mano de obra cuadrilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria : Director, Residentes, Inspectores profesion SST, Inspector SST, profesional ambiental, topografos.

- Maquinas y equipos: Mezcladora de concreto, equipo topografico herramientas menores, autobomba de concreto

Actividades Realizadas
- Hoy se funde el primer tramo de dados y vigas de 45x100 en edificio bloque 1B eje J
- Se toman muestras de concreto premezclado para fallar a 7 y 28 dias.
- Continua el armado de acero en dados, vigas y columnas
- Continuan formaleteando dados, vigas en edificio bloque 1A y 1B.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Jueves 26-01-2023
Estado del Tiempo: Solado

- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspectores, trabajadora social, profesional SST, inspector SST, profesional ambiental. almacenista, aux almacen, aux viales, contratistas mano de obra cuadrilla herreros, Seguridad privadas


- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspector, topografos trabajadora Social

Maquinaria y equipos: Mezcladora, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuan el encofrado de dados y vigas de cimentacion en edificio bloques 1A - 1B.
- Continua el armado del acero en dados, vigas y columnas
-

Se evidencia en el plano estructural de cimentacion un sobre ancho en las vigas de 45X100 de 28cm sobre los ejes 4 entre G y J ejes 1 entre G y J - eje 3 entre H-I - eje 2 entre H-J Bloque 1B y ejes 4 entre A-F y eje 1 Entre A-F del bloque 1A por lo que se hace la consulta al ingeniero estructural y este aclara que este sobre ancho responde a la ubicacion de los muros perimetrales del edificio quedando así: 0,45 — 0,28



Residente Contratista

Residente Interventoria

Viernes 27-01-2023

- Estado del Tiempo: Soleado


- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspectores, topografos profesional SST, inspector SST, trabajadora social, almacenista aux almacen, aux viales, profesional ambiental, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herrero, Seguridad privada

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores topografos, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

- Maquinaria y equipos: Mezcladora de concreto, Equipos topograficos, herramientas menores

- Actividades Realizadas
- Continuan encofrando dados y vigas de cimentacion en edificio bloque 1B y 1A
- Continuan el armado de acero de dados, vigas cimentacion y columnas en edificio bloque 1B y 1A

- Por metodo constructivo Se le consulta al diseñador estructural Si es posible anclar el acero de las vigas de muros (VMU) a las vigas principales luego de ser fundido a lo que autoriza el anclaje con Sikanchorfix-4 con profundidad de 15cm.

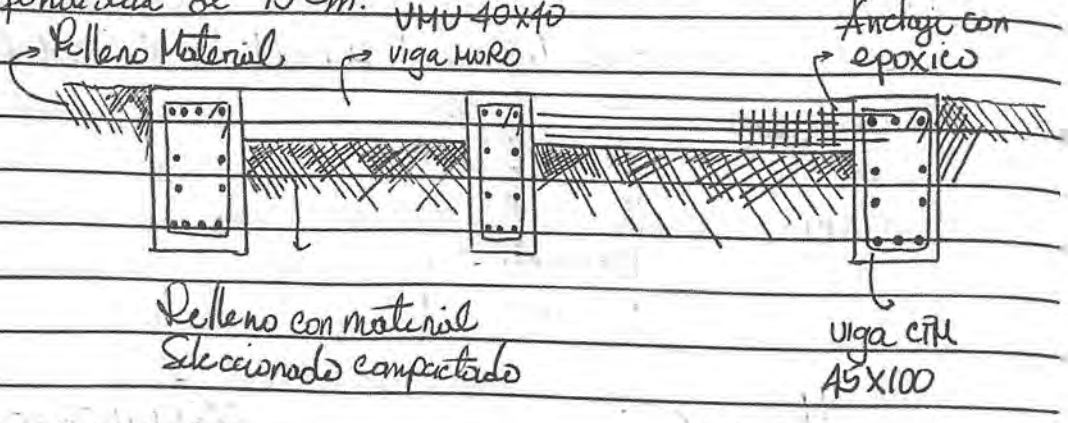

-DETALLE ANCLAJES-

Residente Contratista

Residente Interventoria

Sabado 28-01-2023

- Estado del tiempo:

- Personal Contratista: Director, Residentes, Inspector, topografos trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, almacenista aux almacen, aux viales, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada

- Personal Interventoria: Director, Residentes, inspectores trabajadora social, profesional SST, inspector SST, topografos

- Maquinas y equipos: Mezcladora, equipo topografico, herramientas menores.

Actividades Realizadas.

- Continuan formaleteando dados y vigas de cimentación en edificio bloque 1A-1B
- Avanza armado de acero en dados y vigas de cimentación
- Se arman acero de columnas y se hincan con las torre grua

Residente Contratista

Liz Stella Sepa C.
Residente Interventoria

Lunes 30-01-2023

- Estado del Tiempo

- Personal Contratista: Director de Obra, Residentes, Inspectores trabajadora social, profesional SST, inspector SST, profesional ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores, trabajadora social, profesional SST, inspector SST, profesional ambiental, topografos

- Maquinas y equipos: Mezcladora, equipo topografico, herramientas menores

Actividades Realizadas

- Continua formaleteando dados y vigas en dados y vigas de cimentación en edificio bloque 1A - 1B
- Continua armado de acero en dados, vigas de cimentación y columnas

Liz Stella Sepa C

Martes 31-01-2023

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal contratista : Director, Residentes, Inspectores topografos, trabajadora Social, profesional SST, Inspector SST profesional ambiental, almacenista, aux almacen, aux viales cuadrillas mano de Obra, cuadrillas herreros, Seguridad privada

- Personal Interventoria: Director, Residentes, Inspectores trabajadora Social, profesional SST, inspector SST, topografos

- Maquinaria y equipos: Mezcladora, equipo topografico herramientas menores

Actividades Realizadas:

- Se avanza en encofrado de los dados y vigas de cimentación
- Continuan armado de acero en dados y vigas de cimentación
- hincado de columnas con la torre grua en bloque 1A - 1B.

Residente Contratista — Residente Interventoria

Miercoles 01-02-2023

- Estado del Tiempo : Soleado

- Personal Contratista : Director, Residentes, Inspectores topografos, trabajadora Social, profesional SST, inspector SST almacenista, aux almacen, aux viales, cuadrillas mano de obra, cuadrilla herreros, Seguridad privada.

- Personal Interventoria : Director, Residentes, Inspectores topografos, profesional SST, inspector SST, trabajadora Social

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO
Montería - Córdoba

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
FECHA:	30/03/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PERIODO A COBRAR-PERIODO: 09/09/2022-31/01/2023

1.PRELIMINARES



















CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO
Montería - Córdoba

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
FECHA:	30/03/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PERIODO A COBRAR-PERIODO: 09/09/2022-31/01/2023

1.PRELIMINARES










2. ADECUACION DE TERRENO





CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO
Montería - Córdoba

REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
FECHA:	30/03/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PERIODO A COBRARPERIODO: 09/09/2022-31/01/2023

3.EDIFICACION (BLOQUE 1)











CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO
Montería - Córdoba


REGISTRO FOTOGRAFICO

PROYECTO:	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO CIS "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
FECHA:	30/03/2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN PERIODO A COBRARPERIODO: 09/09/2022-31/01/2023

3.EDIFICACION (BLOQUE 1)



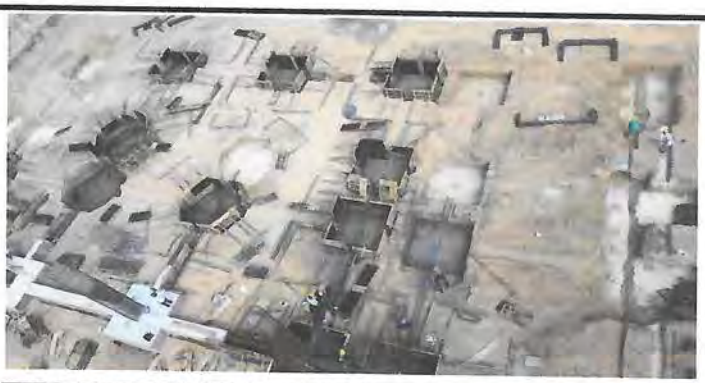








CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Calle 48b # 9a - 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. FASE 1.	**392,5 días**	**vie 9/09/22 8:00 a. m.**	**vie 29/12/23 9:00 a. m.**	**$ 48.329.918.941,00**
	Inicio de obras	0 días	vie 9/09/22 8:00 a. m.	vie 9/09/22 8:00 a. m.	$ 0,00
	PAPSO	392 días	vie 9/09/22 8:00 a. m.	jue 28/12/23 3:00 p. m.	$ 118.151.730,00
	PGIO	392 días	vie 9/09/22 8:00 a. m.	jue 28/12/23 3:00 p. m.	$ 140.036.652,00
	TRAMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES	**30 días**	**vie 9/09/22 8:00 a. m.**	**jue 13/10/22 12:00 p. m.**	**$ 75.942.000,00**
	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA	**60 días**	**jue 21/09/23 7:00 a. m.**	**vie 1/12/23 4:00 p. m.**	**$ 18.480.000,00**
	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA 1	3 mss	jue 21/09/23 7:00 a. m.	vie 1/12/23 4:00 p. m.	$ 0,00
	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA 2	3 mss	jue 21/09/23 7:00 a. m.	vie 1/12/23 4:00 p. m.	$ 0,00
	TRAMITES DE LEGALIZACIÓN ANTE OPERADOR DE RED ELÉCTRICA 3	3 mss	jue 21/09/23 7:00 a. m.	vie 1/12/23 4:00 p. m.	$ 0,00
	CERTIFICACIÓN Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL COCINA EDIFICIO 1	**40 días**	**lun 2/10/23 10:00 a. m.**	**lun 20/11/23 3:00 p. m.**	**$ 2.617.954,00**
	CERTIFICACIÓN Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL COCINA EDIFICIO 1 (1)	2 mss	lun 2/10/23 10:00 a. m.	lun 20/11/23 3:00 p. m.	$ 0,00
	CERTIFICACIÓN Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL COCINA EDIFICIO 1 (2)	2 mss	lun 2/10/23 10:00 a. m.	lun 20/11/23 3:00 p. m.	$ 0,00
	TRAMITES DE REVISIÓN DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**40 días**	**vie 3/11/23 9:48 a. m.**	**vie 22/12/23 2:48 p. m.**	**$ 500.000,00**
	TRAMITES DE REVISIÓN DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (1)	2 mss	vie 3/11/23 9:48 a. m.	vie 22/12/23 2:48 p. m.	$ 0,00
	TRAMITES DE REVISIÓN DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (2)	2 mss	vie 3/11/23 9:48 a. m.	vie 22/12/23 2:48 p. m.	$ 0,00
	PRELIMINAR	144 diast	vie 9/09/22 8:00 a. m.	mar 31/01/23 8:00 a. m.	$ 609.538.710,00
	ADECUACIÓN DE TERRENO	180 diast	mar 1/11/22 12:00 p. m.	dom 30/04/23 12:00 p. m.	$ 1.654.305.491,00
	EDIFICACION (BLOQUE 1)	322,13 días	lun 21/11/22 1:00 p. m.	vie 15/12/23 4:00 p. m.	$ 26.063.980.992,00
	EXCAVACIONES Y CIMIENTOS	75 días	lun 21/11/22 1:00 p. m.	jue 16/02/23 4:00 p. m.	$ 4.231.605.712,00
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	190 días	mié 4/01/23 9:00 a. m.	jue 24/08/23 4:00 p. m.	$ 5.214.543.349,00
	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO	202 días	lun 6/03/23 7:00 a. m.	mié 8/11/23 11:00 a. m.	$ 1.147.886.406,00
	REVESTIMIENTO DE MUROS Y FACHADA	50 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	vie 15/12/23 4:00 p. m.	$ 3.933.563.980,00
	PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS	170 diast	vie 28/04/23 4:00 p. m.	dom 15/10/23 4:00 p. m.	$ 2.739.324.880,00
	CARPINTERIA METALICA	120 diast	mié 5/04/23 10:00 a. m.	jue 3/08/23 10:00 a. m.	$ 2.650.772.999,00
	CUBIERTA	52 días	lun 31/07/23 11:00 a. m.	sáb 30/09/23 9:00 a. m.	$ 302.093.413,00
	IMPERMEABILIZACION DE PLACAS Y VIGAS CANAL	25 días	sáb 30/09/23 9:00 a. m.	mar 31/10/23 8:00 a. m.	$ 140.359.667,00
	CHUTE DE BASURAS	4 días	mié 8/11/23 11:00 a. m.	mar 14/11/23 12:00 p. m.	$ 9.559.534,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS	180 diast	mié 5/04/23 10:00 a. m.	lun 2/10/23 10:00 a. m.	$ 83.198.174,00
	INSTALACIONES SANITARIAS	180 diast	vie 3/02/23 12:00 p. m.	mié 2/08/23 12:00 p. m.	$ 94.442.740,00
	INSTALACIONES SANITARIAS - VENTILACION SANITARIA	180 días	vie 3/02/23 1:00 p. m.	mar 12/09/23 3:00 p. m.	$ 19.932.020,00
	ELEMENTOS HIDROSANITARIOS	25 días	lun 2/10/23 10:00 a. m.	mar 31/10/23 3:00 p. m.	$ 157.940.758,00
	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	30 diast	lun 21/11/22 1:00 p. m.	mié 21/12/22 1:00 p. m.	$ 205.406.318,00
	REDES DE GAS	180 diast	mié 5/04/23 10:00 a. m.	lun 2/10/23 10:00 a. m.	$ 7.268.813,00
	ASCENSORES	10 días	lun 11/09/23 4:00 p. m.	vie 22/09/23 10:00 a. m.	$ 681.359.221,00
	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS	180 diast	mié 17/05/23 4:00 p. m.	lun 13/11/23 4:00 p. m.	$ 1.787.873.323,00
	ESCALERAS AUXILIARES 1	175 diast	vie 3/02/23 12:00 p. m.	vie 28/07/23 12:00 p. m.	$ 753.799.309,00

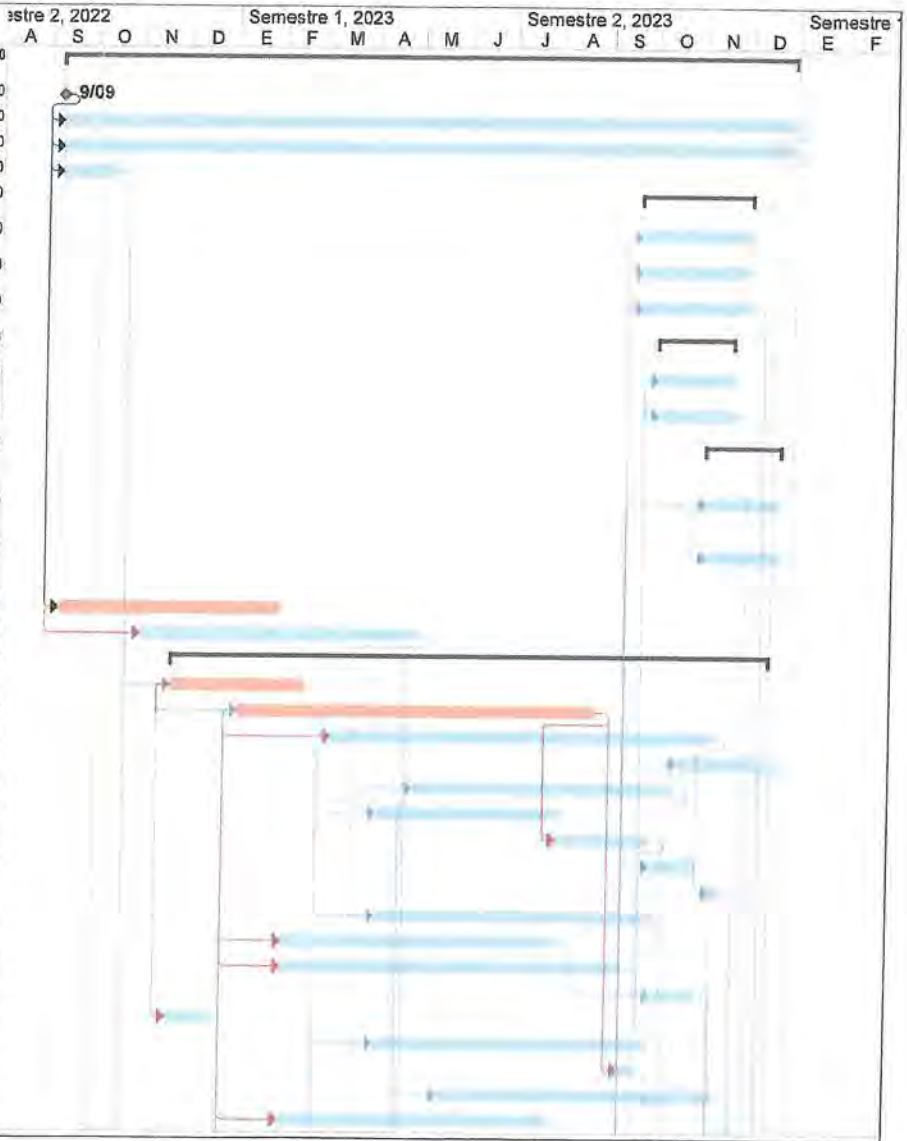

: CIS
24/09/2022

Elaboró: LISETH PETRO


Liseth Paola Petro Diaz
Directora de obra
CONSORCIO CIS 56

Visto bueno:

Alfredo Cabarcas
Director de interventoría
CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

Tarea	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
División	Hito inactivo	Sólo fin	
Hito	Resumen inactivo	Fecha límite	
Resumen	Tarea manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Sólo duración	División crítica	
Tareas externas	Informe de resumen manual	Progreso	
Hito externo	Resumen manual	Progreso manual	

Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	JARDINES INTERNOS	52 días	mié 17/05/23 4:00 p. m.	lun 24/07/23 8:00 a. m.	$ 33.715.185,00
	PUENTE DE CONEXIÓN	120 días	vie 3/02/23 1:00 p. m.	jue 29/06/23 4:00 p. m.	$ 1.869.335.191,00
	Fin de edificio (bloque 1)	0 días	vie 15/12/23 4:00 p. m.	vie 15/12/23 4:00 p. m.	$ 0,00
	SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV	**30 días**	**mar 17/10/23 7:00 a. m.**	**mié 22/11/23 11:00 a. m.**	**$ 1.827.002.185,00**
	BLOQUE N°1	30 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 1.536.566.986,00
	BLOQUE N°1 ZONA CAM	30 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 290.435.199,00
	Fin sistemas voz y datos y CCTV	0 días	mié 22/11/23 11:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 0,00
	AUDIO Y TECNOLOGIAS	**30 días**	**mar 17/10/23 7:00 a. m.**	**mié 22/11/23 11:00 a. m.**	**$ 542.677.896,00**
	SALONES	30 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 489.590.328,00
	SALAS DE JUNTAS	30 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 53.087.568,00
	Fin audio y tecnologias	0 días	mié 22/11/23 11:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 0,00
	CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD HUMANA	**30 días**	**mar 17/10/23 7:00 a. m.**	**mié 22/11/23 11:00 a. m.**	**$ 236.902.565,00**
	CONTROL DE ACCESO	30 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	mié 22/11/23 11:00 a. m.	$ 230.921.521,00
	SEGURIDAD HUMANA	22 días	mar 17/10/23 7:00 a. m.	sáb 11/11/23 10:00 a. m.	$ 5.981.044,00
	Fin control de acceso y seguridad humana	0 días	sáb 11/11/23 10:00 a. m.	sáb 11/11/23 10:00 a. m.	$ 0,00
	SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO	**75 días**	**mié 20/09/23 1:48 p. m.**	**mié 20/12/23 11:48 a. m.**	**$ 1.305.673.354,00**
	SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO	75 días	mié 20/09/23 1:48 p. m.	mié 20/12/23 11:48 a. m.	$ 337.145.470,00
	SISTEMA EXTINCION CONTRAINCENDIO	75 días	mié 20/09/23 1:48 p. m.	mié 20/12/23 11:48 a. m.	$ 968.527.884,00
	Fin sistema de deteccion y red contraincendio	0 días	mié 20/12/23 11:48 a. m.	mié 20/12/23 11:48 a. m.	$ 0,00
	CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA	**71,6 días**	**mié 29/03/23 8:00 a. m.**	**lun 26/06/23 4:48 p. m.**	**$ 706.744.830,00**
	ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION	24 días	mié 29/03/23 8:00 a. m.	jue 27/04/23 2:00 p. m.	$ 153.998.778,00
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	15 días	jue 27/04/23 2:00 p. m.	mar 16/05/23 2:00 p. m.	$ 109.509.373,00
	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO	9 días	mar 16/05/23 2:00 p. m.	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	$ 64.287.228,00
	PISOS ENCHAPES Y ACABADOS	5 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	vie 2/06/23 9:00 a. m.	$ 22.122.220,00
	CARPINTERIA METALICA	6 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	sáb 3/06/23 9:00 a. m.	$ 27.062.376,00
	REVESTIMIENTO DE FACHADA Y SISTEMAS DE PERGOLAS	8 días	mié 31/05/23 4:48 p. m.	vie 9/06/23 1:48 p. m.	$ 254.953.966,00
	CUBIERTA	7 días	vie 9/06/23 1:48 p. m.	mar 20/06/23 4:48 p. m.	$ 46.138.080,00
	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL	5 días	mar 20/06/23 4:48 p. m.	lun 26/06/23 4:48 p. m.	$ 3.256.759,00
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5 días	jue 27/04/23 2:00 p. m.	jue 4/05/23 2:00 p. m.	$ 2.783.147,00
	APARATOS SANITARIOS	12 días	jue 4/05/23 2:00 p. m.	jue 18/05/23 11:00 a. m.	$ 12.428.129,00
	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS	14 días	jue 27/04/23 2:00 p. m.	lun 15/05/23 3:00 p. m.	$ 10.204.774,00
	Fin cuartos tecnicos y cafeteria	0 días	lun 26/06/23 4:48 p. m.	lun 26/06/23 4:48 p. m.	$ 0,00
	CANCHAS POLIDEPORTIVAS	**72 días**	**jue 4/05/23 1:00 p. m.**	**mié 2/08/23 9:00 a. m.**	**$ 989.723.800,00**
	ESCENARIO DEPORTIVO	60 días	jue 4/05/23 1:00 p. m.	mar 18/07/23 11:00 a. m.	$ 450.806.219,00
	CERRAMIENTO PERIMETRAL	25 días	vie 30/06/23 3:00 p. m.	mié 2/08/23 9:00 a. m.	$ 538.917.581,00
	Fin canchas polideportivas	0 días	mié 2/08/23 9:00 a. m.	mié 2/08/23 9:00 a. m.	$ 0,00
	CANCHA DE TENIS	**70 días**	**jue 1/06/23 2:00 p. m.**	**mar 29/08/23 12:00 p. m.**	**$ 828.059.073,00**
	ESCENARIO DEPORTIVO	50 días	jue 1/06/23 2:00 p. m.	jue 3/08/23 12:00 p. m.	$ 352.982.672,00
	CERRAMIENTO PERIMETRAL	20 días	jue 3/08/23 1:00 p. m.	mar 29/08/23 12:00 p. m.	$ 475.076.401,00
	Fin cancha de tenis	0 días	mar 29/08/23 12:00 p. m.	mar 29/08/23 12:00 p. m.	$ 0,00
	ANDENES Y PLAZOLETAS	**75 días**	**mié 2/08/23 9:00 a. m.**	**mar 31/10/23 8:00 a. m.**	**$ 1.564.175.728,00**
	EXCAVACIONES Y RELLENOS	30 días	mié 2/08/23 9:00 a. m.	jue 7/09/23 2:00 p. m.	$ 3.563.238,00

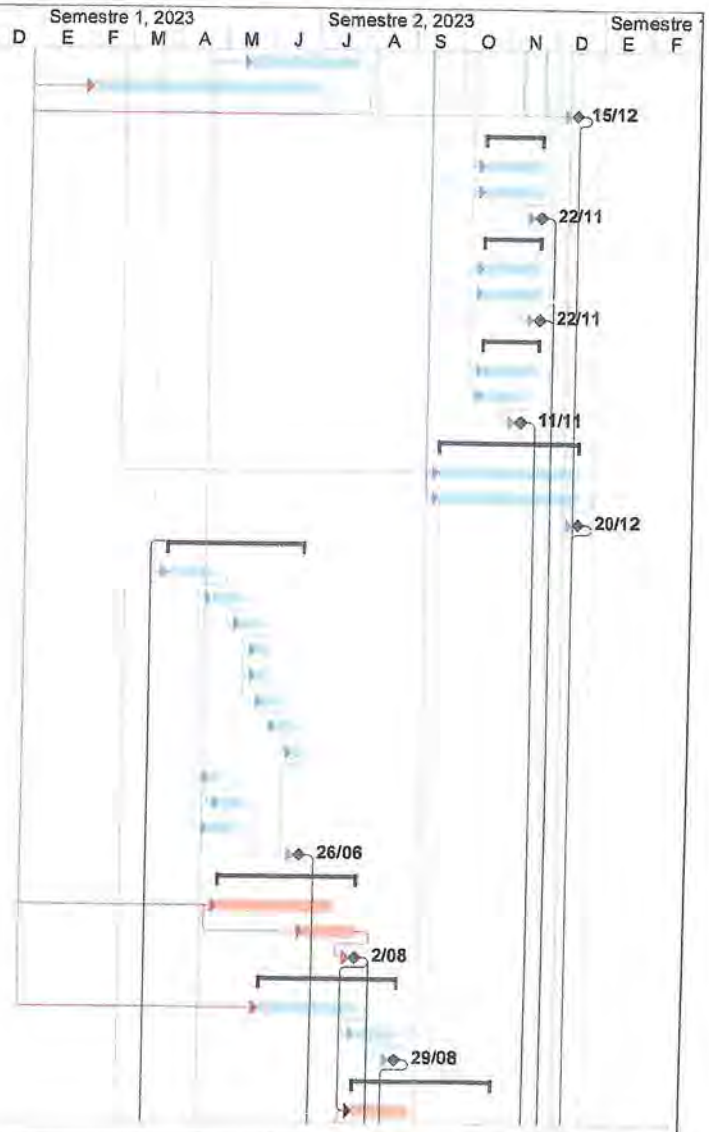


: CIS
24/09/2022

Elaboró: LISETH PETRO
Liseth Paola Petro Diaz
Directora de obra
CONSORCIO CIS 56

Visto bueno:
Alfredo Cabarcas
Director de interventoría
CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

Tarea	Tarea inactiva	Sólo el comienzo	
División	Hito inactivo	Sólo fin	
Hito	Resumen inactivo	Fecha límite	
Resumen	Tarea manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Sólo duración	División crítica	
Tareas externas	Informe de resumen manual	Progreso	
Hito externo	Resumen manual	Progreso manual	

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	ACABADOS	60 días	mar 22/08/23 9:00 a. m.	mar 31/10/23 8:00 a. m.	$ 1.560.612.490,00
	Fin andenes y plazoletas	0 días	mar 31/10/23 8:00 a. m.	mar 31/10/23 8:00 a. m.	$ 0,00
	PAISAJISMO	**43 días**	**mar 7/11/23 8:00 a. m.**	**vie 29/12/23 9:00 a. m.**	**$ 386.192.342,00**
	Fin mobiliario urbano	0 días	vie 29/12/23 9:00 a. m.	vie 29/12/23 9:00 a. m.	$ 0,00
	MOBILIARIO URBANO	**43 días**	**mar 7/11/23 8:00 a. m.**	**vie 29/12/23 9:00 a. m.**	**$ 501.228.754,00**
	Fin mobiliario urbano	0 días	vie 29/12/23 9:00 a. m.	vie 29/12/23 9:00 a. m.	$ 0,00
	BAHIAS Y PARQUEADEROS	**60 días**	**mié 29/03/23 8:00 a. m.**	**vie 9/06/23 5:00 p. m.**	**$ 1.289.116.808,00**
	EXCAVACIONES	14 días	mié 29/03/23 8:00 a. m.	lun 17/04/23 9:00 a. m.	$ 46.171.967,00
	ADECUACION DEL TERRENO	10 días	lun 17/04/23 9:00 a. m.	jue 27/04/23 2:00 p. m.	$ 247.570.949,00
	CONCRETOS	24 días	jue 27/04/23 2:00 p. m.	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	$ 941.405.896,00
	SEÑALIZACION	12 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	vie 9/06/23 5:00 p. m.	$ 53.967.996,00
	Fin bahias y parqueaderos	0 días	vie 9/06/23 5:00 p. m.	vie 9/06/23 5:00 p. m.	$ 0,00
	PARADERO DE BUSES	**76 días**	**mié 29/03/23 8:00 a. m.**	**vie 30/06/23 4:00 p. m.**	**$ 172.420.119,00**
	ADECUACION DEL TERRENO Y CIMENTACION	21 días	mié 29/03/23 8:00 a. m.	lun 24/04/23 5:00 p. m.	$ 34.669.117,00
	ELEMENTOS ESTRUCTURALES	20 días	mar 25/04/23 7:00 a. m.	jue 18/05/23 11:00 a. m.	$ 28.641.007,00
	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO	7 días	jue 18/05/23 11:00 a. m.	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	$ 7.220.770,00
	PISOS ENCHAPES Y ACABADOS	14 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	mié 14/06/23 10:00 a. m.	$ 14.240.047,00
	CARPINTERIA METALICA	6 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	sáb 3/06/23 9:00 a. m.	$ 5.366.237,00
	REVESTIMIENTO DE FACHADA	14 días	sáb 27/05/23 10:00 a. m.	mié 14/06/23 10:00 a. m.	$ 57.022.110,00
	CUBIERTA	5 días	mié 14/06/23 10:00 a. m.	mié 21/06/23 10:00 a. m.	$ 5.056.704,00
	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL	9 días	mié 21/06/23 10:00 a. m.	vie 30/06/23 4:00 p. m.	$ 3.650.059,00
	INSTALACIONES HIDRAULICAS	18 días	mar 25/04/23 7:00 a. m.	mar 16/05/23 2:00 p. m.	$ 3.250.651,00
	INSTALACIONES SANITARIAS	15 días	mar 25/04/23 7:00 a. m.	vie 12/05/23 11:00 a. m.	$ 8.969.339,00
	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS	8 días	mar 25/04/23 7:00 a. m.	jue 4/05/23 2:00 p. m.	$ 4.334.078,00
	Fin paradero de buses	0 días	vie 30/06/23 4:00 p. m.	vie 30/06/23 4:00 p. m.	$ 0,00
	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES	**40 días**	**vie 14/07/23 9:00 a. m.**	**vie 1/09/23 2:00 p. m.**	**$ 248.361.333,00**
	Fin estructuras hidraulicas y drenajes superficiales	0 días	vie 1/09/23 2:00 p. m.	vie 1/09/23 2:00 p. m.	$ 0,00
	JUEGOS INFANTILES	**50 días**	**mar 22/08/23 9:00 a. m.**	**jue 19/10/23 8:00 a. m.**	**$ 1.159.216.968,00**
	Fin juegos infantiles	0 días	jue 19/10/23 8:00 a. m.	jue 19/10/23 8:00 a. m.	$ 0,00
	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	**27 días**	**mar 22/08/23 9:00 a. m.**	**jue 21/09/23 11:00 a. m.**	**$ 273.608.537,00**
	Gimnasio al aire libre	0 días	jue 21/09/23 11:00 a. m.	jue 21/09/23 11:00 a. m.	$ 0,00
	SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES	**190,88 días**	**vie 10/03/23 8:00 a. m.**	**mar 31/10/23 8:00 a. m.**	**$ 847.957.748,00**
	SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS	16 días	sáb 30/09/23 9:00 a. m.	jue 19/10/23 5:00 p. m.	$ 116.189.633,00
	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS Y CÁRCAMOS	60 días	vie 10/03/23 8:00 a. m.	mié 24/05/23 12:00 p. m.	$ 253.165.014,00
	SISTEMA DE BOMBEO	20 días	vie 10/03/23 8:00 a. m.	mar 4/04/23 8:00 a. m.	$ 95.650.641,00
	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO	60 días	mar 22/08/23 9:00 a. m.	mar 31/10/23 8:00 a. m.	$ 382.952.460,00
	Fin sistema de aprovechamiento de aguas lluvias	0 días	mar 31/10/23 8:00 a. m.	mar 31/10/23 8:00 a. m.	$ 0,00
	DISEÑO ELECTRICO	**116,38 días**	**mar 2/05/23 7:00 a. m.**	**mié 20/09/23 5:00 p. m.**	**$ 6.694.069.772,00**
	SUBESTACION ELECTRICA	40 días	mar 2/05/23 7:00 a. m.	mar 20/06/23 11:00 a. m.	$ 1.808.658.459,00
	SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS	60 días	mar 20/06/23 11:00 a. m.	vie 1/09/23 3:00 p. m.	$ 4.673.530.415,00
	ILUMINACION EXTERIOR CANCHAS	20 días	mar 29/08/23 1:00 p. m.	mié 20/09/23 5:00 p. m.	$ 211.880.898,00

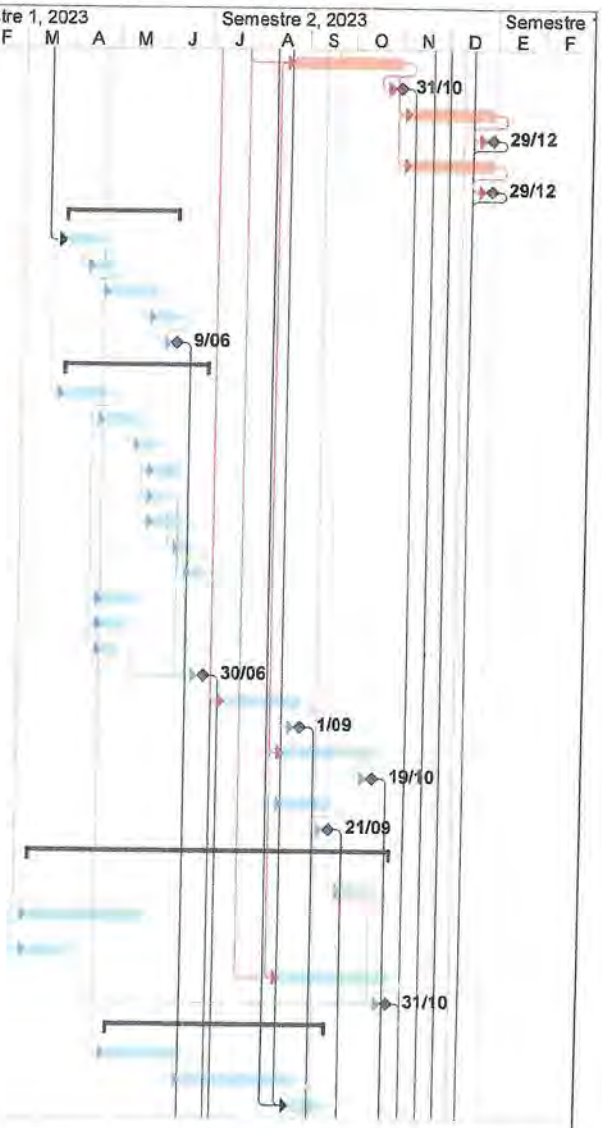

): CIS
4/09/2022

Elaboró: LISETH PETRO


Liseth Paola Petro Diaz
Directora de obra
CONSORCIO CIS 56

Visto bueno:

Alfredo Cabarcas
Director de interventoría
CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
	Fin Diseño eléctrico	0 días	mié 20/09/23 5:00 p. m.	mié 20/09/23 5:00 p. m.	$ 0,00
	CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL	90 días	mié 20/09/23 5:00 p. m.	mar 19/12/23 5:00 p. m.	$ 37.884.000,00
	CERTIFICACIÓN RETILAP	90 días	mié 20/09/23 5:00 p. m.	mar 19/12/23 5:00 p. m.	$ 35.349.600,00
	FIN	0 días	vie 29/12/23 9:00 a. m.	vie 29/12/23 9:00 a. m.	$ 0,00




: CIS
24/09/2022

Elaboró: LISETH PETRO
Liseth Paola Petro Diaz
Directora de obra
CONSORCIO CIS 56

Visto bueno:
Alfredo Cabarcas
Director de interventoría
CONSORCIO KAVAR MONTERIA 016

Tarea		Tarea inactiva		Sólo el comienzo	
División		Hito inactivo		Sólo fin	
Hito		Resumen inactivo		Fecha límite	
Resumen		Tarea manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Sólo duración		División crítica	
Tareas externas		Informe de resumen manual		Progreso	
Hito externo		Resumen manual		Progreso manual	

AVANCE MENSUAL - CIS								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					$ 48,329,918,941.00			
Mes	Semana	D	PERIODO		Programado	% Pr.S	Programado AS	% Pr.AS
1	1 a 4	22	vie 9-sep-2022	vie 30-sep-2022	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 153,520,099.59	0.32%
2	5 a 8	31	sáb 1-oct-2022	lun 31-oct-2022	$ 174,582,359.75	0.36%	$ 328,102,459.33	0.68%
3	9 a 13	30	mar 1-nov-2022	mié 30-nov-2022	$ 979,746,350.66	2.03%	$ 1,307,848,810.00	2.71%
4	14 a 18	31	jue 1-dic-2022	sáb 31-dic-2022	$ 2,047,990,970.49	4.24%	$ 3,355,839,780.48	6.94%
5	19 a 22	31	dom 1-ene-2023	mar 31-ene-2023	$ 2,510,647,550.34	5.19%	$ 5,866,487,330.82	12.14%
6	23 a 26	28	mié 1-feb-2023	mar 28-feb-2023	$ 2,219,415,693.42	4.59%	$ 8,085,903,024.24	16.73%
7	27 a 30	31	mié 1-mar-2023	vie 31-mar-2023	$ 1,937,356,227.18	4.01%	$ 10,023,259,251.42	20.74%
8	31 a 34	30	sáb 1-abr-2023	dom 30-abr-2023	$ 2,816,441,184.23	5.83%	$ 12,839,700,435.65	26.57%
9	35 a 38	31	lun 1-may-2023	mié 31-may-2023	$ 5,331,738,277.47	11.03%	$ 18,171,438,713.13	37.60%
10	39 a 42	30	jue 1-jun-2023	vie 30-jun-2023	$ 5,030,101,728.66	10.41%	$ 23,201,540,441.79	48.01%
11	43 a 46	31	sáb 1-jul-2023	lun 31-jul-2023	$ 5,119,057,617.80	10.59%	$ 28,320,598,059.59	58.60%
12	47 a 51	31	mar 1-ago-2023	jue 31-ago-2023	$ 5,043,077,985.47	10.43%	$ 33,363,676,045.06	69.03%
13	52 a 55	30	vie 1-sep-2023	sáb 30-sep-2023	$ 3,859,636,479.57	7.99%	$ 37,223,312,524.64	77.02%
14	56 a 59	31	dom 1-oct-2023	mar 31-oct-2023	$ 4,950,030,343.84	10.24%	$ 42,173,342,868.47	87.26%
15	60 a 63	30	mié 1-nov-2023	jue 30-nov-2023	$ 4,436,510,991.99	9.18%	$ 46,609,853,860.46	96.44%
16	64 a 67	29	vie 1-dic-2023	vie 29-dic-2023	$ 1,720,065,080.54	3.56%	$ 48,329,918,941.00	100.00%
	Tiempo	477	100.00%		$ 48,329,918,941.00	100.00%		

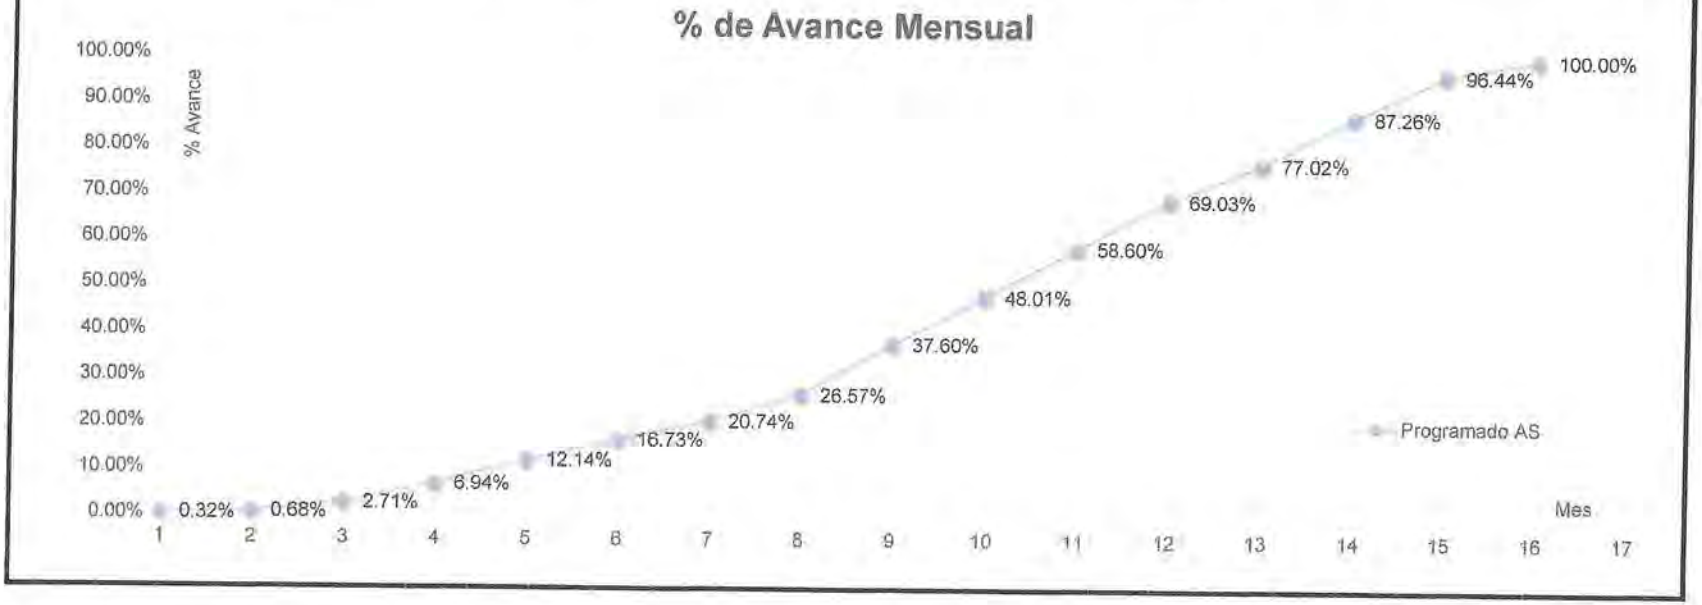

ACTA PARCIAL LITERAL

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO No.:	LP – SPM – 017 -2022
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56 Rep. Legal. Carlos Augusto Martínez Noriega
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR:	$48.329.918.941,00
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DIECISÉIS (16) MESES
MODIFICATORIO EN PLAZO # 1:	QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DÍAS
FECHA DE INICIO:	09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA FINAL:	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN:	09 DE SEPTIEMBRE 2022 A 31 DE ENERO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE ABRIL DE 2023

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2023, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: La Secretaria de Infraestructura Municipal **MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016** representado por **ORLANDO RIVERA MORA** y el Contratista **CONSORCIO CIS 56** Representado por **CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ NORIEGA** con el propósito de suscribir la presente Acta Parcial No. 1 del contrato de obra LP-SPM-017-2022. Tal como se presenta a continuación:

1. El avance de obra se encuentra en un 12,69%.
2. Dentro de las obras ejecutadas en el período se enuncian a continuación las más relevantes.

- **Preliminares**: correspondió al desmonte y corte de arbustos, remoción y poda de árboles para limpieza general y por tema de diseños.
  Demoliciones de estructuras y muros existentes, desmonte de cielos rasos, cubierta, aparatos sanitarios, ventanas, puerta y marcos de la vivienda localizada en el predio, así mismo se realizó el descapote y el retiro de este material.
- **Adecuación del terreno**: Comprende actividades de excavaciones mecánicas con el fin de retirar el material orgánico y el suelo reblandecido por la acumulación de agua, se

encontró acopio de material de otras obras en las abscisas K0+168.68 a K0+224.71, de igual forma, se realizó la actividad de relleno con material seleccionado compactado por tratarse de la zona donde se construirá la edificación y se realiza el cargue y retiro de material sobrante, con acarreo libre producto de la excavación. Se aclara que durante la ejecución se presentaron fallos en el terreno, esta actividad no hace parte de las actividades de la presente acta, ya que fueron ejecutas en una abscisa diferente a las actividades del presente cobro.

➢ **EDIFICACIÓN (BLOQUE 1)**

✓ **EXCAVACIONES Y CIMIENTOS:**

- EXCAVACIÓN MANUAL: excavaciones de zapatas y vigas de cimentación de los bloques 1a y 1b
- S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METÁLICA): utilizado para estabilidad de las paredes de la excavaciones de las zapatas de los bloques 1a y 1b .
- SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI): colocación en las zapatas y vigas e cimentación de los bloques 1a y 1b
- PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: se hincas todos los pilotes de los bloques 1a y 1b.
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS: comprende el acero utilizado en los dados de los bloques 1a y 1b.
- CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS INCLUYE FORMALETA: concreto utilizado en zapatas de los bloques 1a y 1b.
- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN: acero instalado en las vigas en los bloques 1a y 1b
- CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÒN SECCION 045X100M: vigas cimentación en el bloque 1b

✓ **ELEMENTOS ESTRUCTURALES**

- ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS: Acero utilizado en las columnas de los bloques 1a y 1b

✓ **ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**

- PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: pilote instalados en los tanques 1 y 2.

✓ **ESCALERAS AUXILIARES 1**

- EXCAVACION MANUAL: Excavaciones de zapatas y vigas de cimentación de escaleras.
- S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA): utilizado para estabilizar las paredes de las zapatas de escaleras auxiliar.
- SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI): concreto de limpieza utilizado en las zapatas y vigas de las escaleras auxiliares.

- PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: pilotes ubicados debajo de las zapatas de las escaleras

✓ **PUENTE DE CONEXIÓN**

- EXCAVACION MANUAL: Excavaciones de zapatas y vigas de cimentación del puente de conexión.
- S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA): utilizado para estabilizar las paredes de las zapatas del puente de conexión.
- SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI): concreto de limpieza utilizado en las zapatas y vigas del puente de conexion.
- PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN: pilotes ubicados debajo de las zapatas del puente de conexión

3. El anticipo del presente Contrato de Obra fue de $ 9.665.983.788,00 correspondiente al 20% del valor del contrato.

   El valor de la presente acta parcial No.1 sin amortizar es de $ 6.131.304.033,00 se amortiza el 20% por valor de $ 1.226.260.807,00, de esta forma el valor neto a pagar después de la amortización del anticipo es de $ 4.905.043.226,00.

4. Los pagos parciales relacionados son los suiguientes:

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRACTUAL	PAGOS/ TRAMITES
Valor contrato LP – SPM – 017 -2022	$48.329.918.941,00	
Pago anticipo del 20%		$ 9.665.983.788,00
Valor Acta N° 1 amortizada		**$4.905.043.226,00**
Saldo del contrato		$33.758.891.927,00
TOTAL	$48.329.918.941,00	$48.329.918.941,00

***VER ACTA PARCIAL NUMÉRICA**

5. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

6. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Parcial son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

7. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA

campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.

8. El recibo parcial por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 26 días del mes de abril de 2023.

CONSORCIO CIS 56
Rep. Legal Carlos A Martínez Noriega
Contratista

MÓNICA MARÍA SEVERICHE NÚÑEZ
Secretaria de infraestructura

CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016
Rep. Legal Orlando Rivera Mora
Interventor

Revisaron: Margarita Sabino – Contratista SIM
Efraín Morales – Contratista SIM
Revisaron Técnicamente: Edwin Paternina – Asesor SIM
Khalil Petro – Asesor SIM

ACTA PARCIAL NUMÉRICA

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

	CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-017-2022		FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINAR												
1.01	DESCAPOTE MAQUINA	M2	15,929.57	$ 1,001.00	$ 15,945,500.00	15,929.57	$ 15,945,500.00		$ -	15,787.48	$ 15,803,267.00	15,787.48	$ 15,803,267.00
1.02	DESMONTE CUBIERTA TIPO VARIAS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	M2	522.63	$ 27,587.00	$ 14,417,794.00	522.63	$ 14,417,794.00		$ -	492.00	$ 13,572,804.00	492.00	$ 13,572,804.00
1.03	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA, INCLUYE RETIRO	M2	27.77	$ 26,317.00	$ 730,823.00	27.77	$ 730,823.00		$ -	27.77	$ 730,823.00	27.77	$ 730,823.00
1.04	DESMONTE DE PROTECTOR DE VENTANAS	M2	24.89	$ 26,305.00	$ 654,731.00	24.89	$ 654,731.00		$ -	24.89	$ 654,731.00	24.89	$ 654,731.00
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO	UND	18.00	$ 67,645.00	$ 1,217,610.00	18.00	$ 1,217,610.00		$ -	18.00	$ 1,217,610.00	18.00	$ 1,217,610.00
1.06	DESMONTE DE PUERTA PORTON DOBLE DE ACCESO INCLUYE MARCO CONCRETO	UND	1.00	$ 217,630.00	$ 217,630.00	1.00	$ 217,630.00		$ -	1.00	$ 217,630.00	1.00	$ 217,630.00
1.07	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO	M2	277.80	$ 15,908.00	$ 4,419,242.00	277.80	$ 4,419,242.00		$ -	277.80	$ 4,419,242.00	277.80	$ 4,419,242.00
1.08	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	68.63	$ 13,040.00	$ 894,935.00	68.63	$ 894,935.00		$ -	68.63	$ 894,935.00	68.63	$ 894,935.00
1.09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UND	9.00	$ 22,903.00	$ 206,127.00	9.00	$ 206,127.00		$ -	9.00	$ 206,127.00	9.00	$ 206,127.00
1.10	DEMOLICIÓN DE MUROS E= 015MTS/020MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 KM	M2	2,370.28	$ 34,628.00	$ 82,078,056.00	2,370.28	$ 82,078,056.00		$ -	2,370.28	$ 82,078,056.00	2,370.28	$ 82,078,056.00
1.11	DEMOLICION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN BLOQUE INCLUYE MALLA ESLABONADA,COLUMNETAS Y VIGUETAS	M	216.16	$ 51,915.00	$ 11,221,946.00	216.16	$ 11,221,946.00		$ -	216.16	$ 11,221,946.00	216.16	$ 11,221,946.00
1.12	DEMOLICION DE CERRAMIENTO EN BLOQUE E=010CM, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 10 KM	M2	558.25	$ 20,147.00	$ 11,247,063.00	558.25	$ 11,247,063.00		$ -	558.25	$ 11,247,063.00	558.25	$ 11,247,063.00
1.13	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	88.00	$ 166,088.00	$ 14,615,744.00	88.00	$ 14,615,744.00		$ -	88.00	$ 14,615,744.00	88.00	$ 14,615,744.00
1.14	RETIRO DE BANCAS EN MAL ESTADO INCLUYE RETIRO	UND	6.00	$ 129,039.00	$ 774,234.00	6.00	$ 774,234.00		$ -	6.00	$ 774,234.00	6.00	$ 774,234.00
1.15	DEMOLICIÓN DE ANDENES Y PLACAS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO NO MAYOR A 10 KM	M2	4,313.03	$ 19,546.00	$ 84,302,484.00	4,313.03	$ 84,302,484.00		$ -	4,313.03	$ 84,302,484.00	4,313.03	$ 84,302,484.00
1.16	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL NO MAYOR A 5 KM	M	338.37	$ 11,532.00	$ 3,902,083.00	338.37	$ 3,902,083.00		$ -	338.37	$ 3,902,083.00	338.37	$ 3,902,083.00
1.17	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M2	274.36	$ 42,336.00	$ 11,615,305.00	274.36	$ 11,615,305.00		$ -	274.36	$ 11,615,305.00	274.36	$ 11,615,305.00
1.18	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	10.00	$ 330,634.00	$ 3,306,340.00	10.00	$ 3,306,340.00		$ -	10.00	$ 3,306,340.00	10.00	$ 3,306,340.00
1.19	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 51M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	91.00	$ 446,999.00	$ 40,676,909.00	91.00	$ 40,676,909.00		$ -	91.00	$ 40,676,909.00	91.00	$ 40,676,909.00
1.20	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 101M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	47.00	$ 753,750.00	$ 35,426,250.00	47.00	$ 35,426,250.00		$ -	47.00	$ 35,426,250.00	47.00	$ 35,426,250.00
1.21	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 151M A 20M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)	UND	17.00	$ 1,370,277.00	$ 23,294,709.00	17.00	$ 23,294,709.00		$ -	17.00	$ 23,294,709.00	17.00	$ 23,294,709.00
1.22	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=51 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	21.00	$ 313,472.00	$ 6,582,912.00	21.00	$ 6,582,912.00		$ -	21.00	$ 6,582,912.00	21.00	$ 6,582,912.00
1.23	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR H= 101 M O IGUAL 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	6.00	$ 382,275.00	$ 2,293,650.00	6.00	$ 2,293,650.00		$ -	6.00	$ 2,293,650.00	6.00	$ 2,293,650.00
1.24	PODA DE FORMACIÓN ÁRBOLES MAYOR H= 151 M O IGUAL 20 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	6.00	$ 522,530.00	$ 3,135,180.00	6.00	$ 3,135,180.00		$ -	6.00	$ 3,135,180.00	6.00	$ 3,135,180.00
1.25	PODA DE RAIZ ÁRBOLES ALTURA MAYOR H=51 O IGUAL 10 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	7.00	$ 319,145.00	$ 2,234,015.00	7.00	$ 2,234,015.00		$ -	7.00	$ 2,234,015.00	7.00	$ 2,234,015.00
1.26	PODA DE RAÍZ ALTURA H= 101 M O IGUAL 15 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	5.00	$ 375,630.00	$ 1,878,150.00	5.00	$ 1,878,150.00		$ -	5.00	$ 1,878,150.00	5.00	$ 1,878,150.00
1.27	PODA DE RAÍZ ALTURA H= 151 M O IGUAL 20 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)	UND	5.00	$ 430,201.00	$ 2,151,005.00	5.00	$ 2,151,005.00		$ -	5.00	$ 2,151,005.00	5.00	$ 2,151,005.00
1.28	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	3,362.95	$ 22,969.00	$ 77,243,599.00	3,362.95	$ 77,243,599.00		$ -	3,266.66	$ 75,031,914.00	3,266.66	$ 75,031,914.00
1.29	DESMONTE Y CORTE DE ARBUSTOS DEL TERRENO	M2	15,929.00	$ 9,596.00	$ 152,854,684.00	15,929.00	$ 152,854,684.00		$ -	15,721.65	$ 150,864,953.00	15,721.65	$ 150,864,953.00
2	ADECUACIÓN DE TERRENO												
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR	M3	3,781.72	$ 11,166.00	$ 42,302,320.00	13,693.84	$ 153,179,294.00		$ -	13,560.01	$ 151,682,272.00	13,560.01	$ 151,682,272.00
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	16,912.79	$ 88,636.00	$ 1,499,082,054.00	24,663.99	$ 2,186,117,418.00		$ -	8,592.85	$ 761,635,853.00	8,592.85	$ 761,635,853.00
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	4,916.24	$ 22,969.00	$ 112,921,117.00	17,801.99	$ 408,893,908.00		$ -	17,628.01	$ 404,897,762.00	17,628.01	$ 404,897,762.00
3	EDIFICACION (BLOQUE 1)												
3.01	EXCAVACIONES Y CIMIENTOS												
3.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	591.74	$ 34,411.00	$ 20,362,365.00	1,054.34	$ 36,280,894.00		$ -	1,054.34	$ 36,280,894.00	1,054.34	$ 36,280,894.00
3.01.02	S/A DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	955.39	$ 81,203.00	$ 78,382,564.00	1,497.88	$ 121,632,350.00		$ -	1,017.12	$ 82,593,195.00	1,017.12	$ 82,593,195.00
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	13.59	$ 534,844.00	$ 7,268,530.00	38.78	$ 20,741,250.00		$ -	30.90	$ 16,526,680.00	30.90	$ 16,526,680.00

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	3,099.00	$ 572,639.00	$ 1,774,608,261.00		3,306.00	$ 1,893,144,534.00		$ -	3,306.00	$ 1,893,144,534.00	3,306.00	$ 1,893,144,534.00
3.01.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS	KG	71,092.40	$ 10,232.00	$ 727,417,437.00		51,120.11	$ 523,060,966.00		$ -	45,461.99	$ 465,167,082.00	45,461.99	$ 465,167,082.00
3.01.06	CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS INCLUYE FORMALETA	M3	427.42	$ 909,646.00	$ 388,800,893.00		856.17	$ 778,811,616.00		$ -	286.25	$ 260,386,168.00	286.25	$ 260,386,168.00
3.01.07	ACERO DE REFUERZO Fy= 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	KG	41,698.50	$ 10,232.00	$ 426,659,052.00		48,698.92	$ 498,287,349.00		$ -	39,334.50	$ 402,470,604.00	39,334.50	$ 402,470,604.00
3.01.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 045X100M	M	325.02	$ 453,527.00	$ 147,405,346.00		276.13	$ 125,232,411.00		$ -	41.22	$ 18,694,383.00	41.22	$ 18,694,383.00
3.01.09	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 040X100M	M	33.80	$ 430,754.00	$ 14,559,485.00		35.82	$ 15,429,608.00		$ -		$ -	-	$ -
3.01.10	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 040X040M	M	123.71	$ 149,836.00	$ 18,536,212.00		151.67	$ 22,725,626.00		$ -		$ -	-	$ -
3.01.11	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4,303.83	$ 88,636.00	$ 381,474,276.00		994.84	$ 88,178,638.00		$ -		$ -	-	$ -
3.01.12	Llosa de contrapiso en concreto 21 Mpa (3000 PSI), E= 010MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	1,558.43	$ 157,929.00	$ 246,121,291.00		1,559.49	$ 246,288,696.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02	**ELEMENTOS ESTRUCTURALES**													
3.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	70,450.50	$ 10,232.00	$ 720,849,516.00		73,779.30	$ 754,909,798.00		$ -	37,172.90	$ 380,353,113.00	37,172.90	$ 380,353,113.00
3.02.02	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)	M3	63.52	$ 1,252,571.00	$ 79,563,310.00		60.95	$ 76,344,202.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS ENTREPISO NIVEL 2 INCLUYES VIGAS	KG	28,139.00	$ 10,232.00	$ 287,918,248.00		56,390.46	$ 576,987,187.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.04	LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION 0205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 030m3/m2	M2	1,522.10	$ 669,620.00	$ 1,019,533,022.00		1,525.35	$ 1,021,709,937.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.05	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL	M3	63.52	$ 1,289,914.00	$ 81,935,337.00		60.95	$ 78,620,258.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS NIVEL TRES INCLUYES VIGAS	KG	27,974.00	$ 10,232.00	$ 286,229,968.00		56,227.33	$ 575,318,041.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.07	LOSA DE ENTREPISO TERCER NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION 0205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 030m3/m2	M2	1,510.50	$ 678,728.00	$ 1,025,218,644.00		1,514.02	$ 1,027,607,767.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.08	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) TERCER NIVEL	M3	63.52	$ 1,329,211.00	$ 84,431,483.00		63.52	$ 84,431,483.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.09	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS N+/- 1227m	KG	17,649.00	$ 10,232.00	$ 180,584,568.00		17,604.57	$ 180,129,960.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.10	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA SUPERIOR DE SECCION 045*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	121.26	$ 521,238.00	$ 63,205,320.00		121.26	$ 63,205,320.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.11	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 040*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	117.95	$ 503,260.00	$ 59,359,517.00		117.95	$ 59,359,517.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.12	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 030*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	293.59	$ 467,303.00	$ 137,190,815.00		293.59	$ 137,190,815.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.13	CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 035M ESPESOR DE PLACA H=020M INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO	M	49.20	$ 271,435.00	$ 13,354,602.00		49.20	$ 13,354,602.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.14	CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 060M ESPESOR DE PLACA H=020M INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO	M	16.55	$ 344,749.00	$ 5,705,596.00		16.55	$ 5,705,596.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.15	CONCRETO 3500PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 075M ESPESOR DE PLACA H=020M INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO	M	19.40	$ 381,403.00	$ 7,399,218.00		19.40	$ 7,399,218.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.16	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS NIVEL CUATRO	KG	10,589.68	$ 10,232.00	$ 108,355,652.00		3,920.01	$ 40,109,542.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.17	LOSA DE ENTREPISO 4TO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0,60 M RELACION 0205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 030m3/m2	M2	230.50	$ 693,653.00	$ 159,889,322.00		218.35	$ 151,461,316.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.18	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) CUARTO NIVEL	M3	16.32	$ 1,367,452.00	$ 22,316,817.00		16.32	$ 22,316,817.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.19	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS MACIZA DE CUBIERTA	KG	9,519.00	$ 10,232.00	$ 97,396,408.00		11,727.60	$ 119,996,803.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
		PLAZO INICIAL	16 MESES		
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00	
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE	9/09/2022
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA	31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR: CONSORCIO KALAR MONTERIA 016				
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante: ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023	

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.02.20	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA ESP= 0.20 M VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. RELACION CONCRETO 028m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION 032m3/m2	M2	314.10	$ 738,868.00	$ 232,078,439.00	355.14	$ 262,401,582.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.21	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSAS DE CUBIERTA 2 INCLUYE VIGAS	KG	6,288.00	$ 10,232.00	$ 64,338,816.00	15,802.24	$ 161,688,520.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.22	LOSA DE CUBIERTA 2 BLOQUE 1B, EN CONCRETO DE 3500 PSI IMPERMEABILIZADO ESPESOR DE LOSA = 0,20 M RELACION CONCRETO 0285m3/m2. INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS. FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION 0315m3/m2	M2	297.30	$ 803,742.00	$ 238,952,497.00	298.35	$ 239,796,426.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.23	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERAS	KG	7,449.00	$ 10,232.00	$ 76,207,936.00	6,643.09	$ 67,972,097.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.24	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 1 Y 2(TRAMO DE 1ER A 2DO PISO)	M3	14.33	$ 1,996,664.00	$ 28,612,195.00	16.00	$ 31,946,624.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.25	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 1 Y 2 (TRAMO DE 2DO A 3ER PISO)	M3	14.33	$ 2,124,105.00	$ 30,436,425.00	15.97	$ 33,921,957.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.26	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ESCALERA TIPO 3 BIBLIOTECA	KG	3,784.70	$ 10,232.00	$ 38,725,050.00	1,343.29	$ 13,744,543.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.27	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS TIPO 3 BIBLIOTECA	M3	3.68	$ 1,875,428.00	$ 6,901,575.00	5.63	$ 10,558,660.00		$ -		$ -	-	$ -
3.02.28	CONCRETO 3000 PSI (21 Mpa), PARA PLACA DE BANCAS EMBEBIDA A MURO SEGÚN DISEÑO E= 015MINCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REVESTIMIENTO PARA SENTADERA EN MADERA	M	92.25	$ 627,090.00	$ 57,849,053.00	92.25	$ 57,849,053.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO												
3.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M2	1,391.54	$ 188,057.00	$ 261,688,838.00	1,391.54	$ 261,688,838.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_SEGUNDO NIVEL	M2	1,486.53	$ 212,334.00	$ 315,640,861.00	1,486.53	$ 315,640,861.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.03	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_TERCER NIVEL	M2	1,290.08	$ 214,071.00	$ 276,168,716.00	1,290.08	$ 276,168,716.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.04	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_CUARTO NIVEL	M2	122.93	$ 225,567.00	$ 27,728,951.00	122.93	$ 27,728,951.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.05	VIGA DINTEL DE 015m x 020m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @015m_PRIMER NIVEL	M	482.02	$ 103,570.00	$ 49,922,811.00	482.02	$ 49,922,811.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.06	VIGA DINTEL DE 015m x 020m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @015m_SEGUNDO NIVEL	M	585.17	$ 108,287.00	$ 63,366,304.00	585.17	$ 63,366,304.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.07	VIGA DINTEL DE 015m x 020m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @015m_TERCER NIVEL	M	470.59	$ 113,954.00	$ 53,625,613.00	470.59	$ 53,625,613.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.08	VIGA DINTEL DE 015m x 020m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @015m_CUARTO NIVEL	M	64.80	$ 117,032.00	$ 7,583,674.00	64.80	$ 7,583,674.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.09	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO , COLOR GRIS, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO 1 4	M2	55.39	$ 165,615.00	$ 9,173,415.00	55.39	$ 9,173,415.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.10	COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 015MTS X 020MTS EN CONCRETO DE 21 MPACON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @015m	M	273.90	$ 94,826.00	$ 25,972,841.00	273.90	$ 25,972,841.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.11	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1 4 ALTURA MENOR O IGUAL A 300M (H< =300M)	M2	65.53	$ 33,652.00	$ 2,205,216.00	65.53	$ 2,205,216.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.12	PAÑETE LINEAL ALLANADO EN MORTERO1 4 ALTURA MENOR E IGUAL A 300M (H< =300M)	M	94.18	$ 16,825.00	$ 1,584,579.00	94.18	$ 1,584,579.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.13	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1 3	M2	252.09	$ 46,902.00	$ 11,823,525.00	252.09	$ 11,823,525.00		$ -		$ -	-	$ -
3.03.14	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1 3	M	210.82	$ 23,573.00	$ 4,969,660.00	210.82	$ 4,969,660.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACIÓN:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.03.15	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M COLOR BLANCO PARA BUITRONES INCLUYE PEGA CON MORTERO EN COLOR, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON CONTRETO DE 3000PSI Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO	M2	189.51	$ 192,240.00	$ 36,431,402.00	189.51	$ 36,431,402.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04	PISOS, ENCHAPES Y PINTURAS												
3.04.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=004 MTS	M2	2,452.05	$ 61,236.00	$ 150,153,734.00	2,452.05	$ 150,153,734.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.02	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS	M2	216.05	$ 75,034.00	$ 16,211,096.00	216.05	$ 16,211,096.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.03	PLANTILLA EN MORTERO 1:3, ESPESOR MAXIMO 005MT, ACABADO ALLANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISO, CORTES Y JUNTAS DE DILATACION SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	2,052.52	$ 164,817.00	$ 338,290,189.00	2,052.52	$ 338,290,189.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.04	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 030X030 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	90.00	$ 158,591.00	$ 14,273,190.00	90.00	$ 14,273,190.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.05	GUARDAESCOBA EN GRANITO	M	73.03	$ 30,279.00	$ 2,211,275.00	73.03	$ 2,211,275.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.06	PISO CERÁMICA ANTIDESLIZANTE INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION EN MORTERO 1:4	M2	216.05	$ 126,366.00	$ 27,301,374.00	216.05	$ 27,301,374.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.07	S/I DE PISO EN MARMOL SINÚ VETA DORADO DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE e=1CMSELLADO CON HIDROFUGO, (COLOR Y TEXTURA SEGÚN DISEÑO) INCLUYE APOMASADO ANTICADO Y SELLADO DE JUNTAS	M2	2,452.05	$ 377,577.95	$ 925,840,007.00	2,452.05	$ 925,840,007.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.08	S/I DE GUARDESCOBA EN MARMOL SINÚ VETA DORADO DISEÑO EN FORMATO JUNTA PERDIDA O LARGO LIBRE e=1CMSELLADO CON HIDROFUGO, (COLOR Y TEXTURA SEGÚN DISEÑO)INCLUYE APOMASADO, ANTICADO Y SELLADO DE JUNTAS	M	707.35	$ 104,770.00	$ 74,109,060.00	707.35	$ 74,109,060.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.09	PISO EN MARMOL SINÚ VETA PARA ESCALERA TIPO1: 23UND HUELLAS (030*180M cAu) Y CONTRAHUELLAS (018*180M cAu)FORMATO JUNTA PERDIDA EN AREA DE DESCANSO SELLADO CON HIDROFUGO, INCLUYE PLANTILLA E=+/-5CM MORTERO 1:4 , APOMASADO, ANTICADO SELLADO DE JUNTAS SEGUN DISEÑO	UND	4.00	$ 32,852,749.00	$ 131,410,996.00	4.00	$ 131,410,996.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.10	PISO EN MARMOL SINÚ VETA PARA ESCALERA TIPO2: 20UND DE HUELLAS (030*152M cAu) Y CONTRAHUELLAS (018*152M cAu)FORMATO JUNTA PERDIDA EN AREA DE DESCANSO Y 3 ESCALONES EN FORMA IRREGULAR SELLADO CON HIDROFUGO, INCLUYE PLANTILLA E=+/-5CM MORTERO 1:4 , APOMASADO, ANTICADO SELLADO DE JUNTAS SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 20,789,992.00	$ 20,789,992.00	1.00	$ 20,789,992.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.11	S/I GUARDAESCOBA EN MADERA MOLDURA MATE 7CM COLOR BLANCO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	526.50	$ 37,842.00	$ 19,923,813.00	526.50	$ 19,923,813.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.12	ENCHAPE PARED BLANCA DE 045m x 030m PARA PRIMER PISO	M2	169.56	$ 119,741.00	$ 20,303,284.00	169.56	$ 20,303,284.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.13	ENCHAPE PARED BLANCA DE 045m x 030m PARA SEGUNDO Y TERCER PISO	M2	405.16	$ 121,977.00	$ 49,420,201.00	405.16	$ 49,420,201.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.14	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL A 300M (H<=300M)	M2	332.06	$ 22,393.00	$ 7,435,820.00	332.06	$ 7,435,820.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.15	ESTUCO ACRILICO LINEAL PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR O IGUAL A 300M (H<=300M)	M	292.40	$ 11,198.00	$ 3,274,295.00	292.40	$ 3,274,295.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.16	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	332.06	$ 17,406.00	$ 5,779,836.00	332.06	$ 5,779,836.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.17	PINTURA LINEAL EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M	292.40	$ 8,694.00	$ 2,542,126.00	292.40	$ 2,542,126.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.18	PINTURA ANTIBACTERIAL PARA MUROS (A 2 MANOS)	M2	68.16	$ 15,227.00	$ 1,037,872.00	68.16	$ 1,037,872.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.19	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	172.22	$ 112,559.00	$ 19,384,911.00	172.22	$ 19,384,911.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.20	S/I DE CIELO RASO EN SISTEMA SUSPENDIDO FORMADO POR PANELES LINEALES LISOS DE ALUZINC (180MM) INCLUYE PORTAPANEL, ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACIÓN, AISLANTE TERMICO ACUSTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	4,153.88	$ 460,988.00	$ 1,914,888,833.00	4,153.88	$ 1,914,888,833.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.21	S/I CIELO RASO EN ALUZINC 04MM, ACABADO LISO CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA POR UNA CARA INCLUYE PORTA PANELES	M2	101.84	$ 587,228.00	$ 59,803,300.00	101.84	$ 59,803,300.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACIÓN:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.04.22	S/I DE SISTEMA DE ILUMINACION NATURAL (TRAGA LUZ) COMPUESTO POR UNA CUPULA QUE ABSORBE, TUBO QUE CONDUCE Y DIFUSOR QUE REFLEJA LA LUZ SOLAR EN EL ESPACIO INTERIOR INCLUYE DOMO , BASE, TUBULAR DIM 040M DX060M.CINTA IMPERMEABLE, BANDEJA BRILLANTE, TORNILLOS DE FIJACION A BANDEJA Y TUBO ,CINTA DE ALUMINIO, TOPE PLASTICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	8.00	$ 2,938,009.00	$ 23,504,072.00	8.00	$ 23,504,072.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.23	S/I CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 060M e=007M PARA MESON LAVAMANOS CON ACABADO EN MARMOL INCLUYE: FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 20CM, PERFORACION PARA POCETAS, MUROS DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION	M	22.76	$ 1,912,793.00	$ 43,535,169.00	22.76	$ 43,535,169.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.24	S/I MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA APOYA BRAZOS EN MUROS DE RECEPCIÓN Y CAFETERIA ANCHO 050MINCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE METALICOS PARA FIJACION A MURO, FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACION	M	7.96	$ 1,283,837.00	$ 10,219,343.00	7.96	$ 10,219,343.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.25	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=010 MTS,ANCHO: 060M INCLUYE: REFUERZO ACERO3/8" @ 015 MTS Y ACABADO EN GRANITO	M	8.14	$ 287,431.00	$ 2,339,658.00	8.14	$ 2,339,658.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.26	S/I DE MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA LAVAMANOS DIMENSIONES 07X06M ANCLADO A MURO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE METALICOS, FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACIÓN	UND	5.00	$ 1,363,788.00	$ 6,818,940.00	5.00	$ 6,818,940.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.27	S/I DE MESON EN PLACA DE MARMOL e=2CM PARA LAVAMANOS DIMENSIONES 130X05M, ANCLADO A MURO INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE METALICOS, FALDON PERIMETRAL, SALPICADERO DE 10CM Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 2,030,811.00	$ 4,061,622.00	2.00	$ 4,061,622.00		$ -		$ -	-	$ -
3.04.28	PINTURA PARA EXTERIOR	M2	1,255.88	$ 30,615.00	$ 38,699,942.00	1,255.88	$ 38,699,942.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05	CARPINTERIA METALICA												
3.05.01	S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-01) DIMENSIONES DE VANO 200 M ANCHO X 294 M ALTO CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES HOJA 100M ANCHO X 240M ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180°, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL, CUERPO FIJO SUPERIOR DE DIMENSIONES 200 M ANCHO X050M ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 5,466,000.00	$ 16,398,000.00	3.00	$ 16,398,000.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.02	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 100M ANCHO X 210 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	14.00	$ 1,338,352.00	$ 18,736,928.00	14.00	$ 18,736,928.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.03	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-03) DIMENSIONES DE VANO 100M ANCHO X 294 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (100M ANCHO X 210 ALTO) ACABADO LISO SEGUN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION (100M ANCHO X 084M ALTO) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 1,972,560.00	$ 1,972,560.00	1.00	$ 1,972,560.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
			PLAZO INICIAL	16 MESES
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
DE 9/09/2022
HASTA 31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA
26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.04	S/I PUERTA AUTOMÁTICA, TIPO P-04, DIMENSIONES 200M ANCHO X 240 M DE ALTO DOS HOJAS CORREDIZAS ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y CUERPO FIJO SUPERIOR CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TRANSPARENTE e=10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN APERTURA CORREDIZA DE USO CONTINUO, SENSORES, CERRADURA DE CIERRE MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 19,861,496.00	$ 39,722,992.00	2.00	$ 39,722,992.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.05	S/I DE PUERTA TIPO (P-05) DIMENSIONES 100M ANCHO X 210 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDIRO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE MARCO EN ALUMINIO NATURAL, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO POMO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	33.00	$ 2,037,154.00	$ 67,226,082.00	33.00	$ 67,226,082.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.06	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-06) DIMENSIONES DE VANO 140 M ANCHO X 210 M ALTO PUERTA DE DOS HOJAS, UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL20 (096M ANCHO X 210 ALTO) ACABADO LISO EN AMBAS CARAS SEGÚN DISEÑO, UN CUERPO FIJO CON MARCO METALICO Y VISOR EN VIDRIO 5MM TRANSPARENTE (043M ANCHO X 210M ALTO) INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA ANTIPANICO, BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	15.00	$ 2,119,336.00	$ 31,790,040.00	15.00	$ 31,790,040.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.07	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-07) DIMENSIONES 090M ANCHO X 210 M DE ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGÚN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO EN LAMINA CAL18 , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	9.00	$ 1,303,888.00	$ 11,734,992.00	9.00	$ 11,734,992.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.08	S/I DE PUERTA TIPO (P-08) DIMENSIONES 080 M ANCHO X 210 M DE ALTO UNA HOJA BATIENTE CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y PERSIANAS EN ALUMINIO COLOR NATURAL SEGUN DISEÑO INCLUYE MARCO EN ALUMINIO NATURAL , BISAGRAS, CERRADURA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	5.00	$ 2,171,321.00	$ 10,856,605.00	5.00	$ 10,856,605.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.09	S/I DE PUERTA, TIPO (P-09) EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL DIMENSIONES 166M DE ANCHO X 210 M DE ALTO HOJA TIPO PERSIANA, PLEGABLES DE TRES CUERPOS DE 038M X 205M SEGUN DISEÑO INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 5,169,372.00	$ 5,169,372.00	1.00	$ 5,169,372.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.10	S/I DE PUERTA TIPO (P-10) DIMENSIONES DE VANO 150M ANCHO X 210 M ALTO DOS HOJAS BATIENTE CON APERTURA A 180°, MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10MM TRANSPARENTE SEGÚN DISEÑO INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	1.00	$ 4,831,209.00	$ 4,831,209.00	1.00	$ 4,831,209.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.11	S/I PUERTA AUTOMÁTICA, TIPO P-11, DIMENSIONES 150M ANCHO X 210 M ALTO DOS HOJAS CORREDIZAS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y CUERPO FIJO SUPERIOR CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO TRANSPARENTE e=10MM SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN APERTURA, SENSORES, CERRADURA DE CIERRE MANUAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 19,184,138.00	$ 38,368,276.00	2.00	$ 38,368,276.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.12	S/I DE PUERTA CORREDIZA TIPO (P-12) DIMENSIONES 100M ANCHO X 210 M ALTO UNA HOJA CORREDIZA, EN PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUIDO DE 3" X 1-1/2 CON ADAPTADOR VIDRIO TRANSPARENTE E=4MM PISA VIDRIOS DE 4MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE RIEL, CERRADURA DE SEGURIDAD , Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION	UND	2.00	$ 2,082,028.00	$ 4,164,056.00	2.00	$ 4,164,056.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.13	S/I DE PUERTA CORTAFUEGO RF 90M, TIPO (P-14) DIMENSIONES DE VANO 120M ANCHO X 210M ALTO FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 16 SEGÚN DISEÑO INCLUYE AISLANTE TERMICO DE ALTA DENSIDAD, BISAGRAS CAPSULADA, CERRADURA ANTIPANICO SIMPLE, CIERRA PUERTA DE SOBRE PONER CON BRAZO ARTICULADO, SELLO PERIMETRAL PARA JUNTAS DE FUEGO/HUMO ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	9.00	$ 4,572,437.00	$ 41,151,933.00	9.00	$ 41,151,933.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.14	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-15) DIMENSIONES 120M ANCHO X 210 M ALTO DOS HOJAS BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO LISO, CON REVESTIMIENTO EN PVC TIPO CORTASOL EN UNA SOLA CARA SEGÚN DISEÑO , INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD , BASE ANTICORROSIVO COLOR GRIS Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	2.00	$ 3,580,750.00	$ 7,161,500.00	2.00	$ 7,161,500.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.15	S/I DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO TIPO (P-16) DIMENSIONES DE VANO 200 M ANCHO X 284 M ALTO CONFORMADA POR DOS HOJAS BATIENTES EN VIDRIO TEMPLADO DIMENSIONES HOJA: 100M ANCHO X 240M ALTO, SEGÚN DISEÑO CON APERTURA 180º, INCLUYE BISAGRA DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE, MARCO EN ALUMINIO NATURAL CUERPO FIJO SUPERIOR DE DIMENSIONES 200 M ANCHO X050M ALTO CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO Ttemplado INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 5,466,000.00	$ 16,398,000.00	3.00	$ 16,398,000.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.16	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-19) DIMENSIONES DE VANO 100M ANCHO X 284 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 (100M ANCHO X 210 ALTO) ACABADO LISO SEGÚN DISEÑO EN CARA EXTERIOR, CUERPO FIJO SUPERIOR CON PERSIANAS DE VENTILACION (100M ANCHO X 084M ALTO) INCLUYE MARCO METÁLICO , BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACION	UND	3.00	$ 1,972,560.00	$ 5,917,680.00	3.00	$ 5,917,680.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.17	S/I DIVISIÓN MODULAR PARA OFICINAS EN PANELEARIA CON PERFILES EN ALUMINIO EXTRUIDO DE 5CMS ACODADOS MIXTO EN FORMICA Y VIDRIO CLARO 5MM ALTURA 205M ZÓCALOS TROQUELADOS Y LISOS PARA MANEJO DE CABLEADOINCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	532.51	$ 2,280,587.00	$ 1,214,435,383.00	532.51	$ 1,214,435,383.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.18	S/I DE VENTANA PIVOTANTE DE EJE VERTICAL, TIPO V-01. DIMENSIONES 050M ANCHO X 260M DE ALTO. MARCO EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL CUERPO EN VIDRIO TEMPLADO DE 5MMINCLUYE CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	70.00	$ 1,169,346.00	$ 81,854,220.00	70.00	$ 81,854,220.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.19	S/I DE CUERPO FIJO, TIPO V-01', DIMENSIONES 050M ANCHO X 260M DE ALTO. MARCO EN PERFILERÍA EN ALUMINIO COLOR NATURAL PERSIANAS DE VENTILACION SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 1,169,346.00	$ 2,338,692.00	2.00	$ 2,338,692.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022			FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
				PLAZO INICIAL	16 MESES
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
				FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
				% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.20	S/I DE VENTANA PROYECTANTE TIPO V-02 DIMENSIONES 230M ANCHO X 260M DE ALTO MARCO EN PERFILERIA ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO 10MM DIVIDIDA EN TRES CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES: DOS LATERALES FIJOS Y UN CUERPO CENTRAL CON DOS HOJAS PROYECTANTES SEGUN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION	UND	2.00	$ 3,713,529.00	$ 7,427,058.00	2.00	$ 7,427,058.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.21	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-03, DIMENSIONES DE VANO 950M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 CUARTO HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	7.00	$ 21,667,139.00	$ 151,669,973.00	7.00	$ 151,669,973.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.22	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-03', DIMENSIONES DE VANO 940M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 CUARTO HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	6.00	$ 21,667,139.00	$ 130,002,834.00	6.00	$ 130,002,834.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.23	S/I VENTANA TIPO V-04, DIMENSIONES DE VANO 748M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS CORREDIZAS) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 3,688,862.00	$ 7,377,724.00	2.00	$ 7,377,724.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.24	S/I VENTANA CORREDIZA TIPO V-05 DIMENSIONES DE VANO 495M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 4 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 3,371,594.00	$ 3,371,594.00	1.00	$ 3,371,594.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.25	S/I VENTANA CORREDIZA TIPO V-06, DIMENSIONES 060M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 196,182.00	$ 588,546.00	3.00	$ 588,546.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.26	S/I VENTANA CORREDIZA TIPO V-09, DIMENSIONES 100M ANCHO X 100M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 939,687.00	$ 939,687.00	1.00	$ 939,687.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.27	S/I VENTANA TIPO V-10, DIMENSIONES DE VANO 950M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	6.00	$ 6,519,957.00	$ 39,119,742.00	6.00	$ 39,119,742.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.28	S/I VENTANA TIPO V-10', DIMENSIONES DE VANO 940M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	6.00	$ 6,519,957.00	$ 39,119,742.00	6.00	$ 39,119,742.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.29	S/I VENTANA FIJA TIPO V-18, DIMENSIONES DE VANO 788M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS FIJOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM, 8 CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 14,530,189.00	$ 29,060,378.00	2.00	$ 29,060,378.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.30	S/I VENTANA CORREDIZA TIPO V-19, DIMENSIONES 100M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	9.00	$ 492,623.00	$ 4,433,607.00	9.00	$ 4,433,607.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.31	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-22, DIMENSIONES DE VANO 657M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 6 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (3 CUERPOS FIJOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS) Y CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURAS, TIRADERAS,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 16,887,277.00	$ 33,774,554.00	2.00	$ 33,774,554.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.32	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-23, DIMENSIONES DE VANO 237M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 CUERPOS CORREDIZOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM Y 2 CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGUN DISEÑO INCLUYE CERRADURAS, TIRADERAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 6,033,813.00	$ 12,067,626.00	2.00	$ 12,067,626.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.33	S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-24, DIMENSIONES: 272M ANCHO X 050M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 812,438.00	$ 2,437,314.00	3.00	$ 2,437,314.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.34	S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-25, DIMENSIONES: 274M ANCHO X 050M ALTO, DOS HOJA FIJA Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	5.00	$ 894,165.00	$ 4,470,825.00	5.00	$ 4,470,825.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.35	S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-26, DIMENSIONES: 303M ANCHO X 050M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 912,794.00	$ 912,794.00	1.00	$ 912,794.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.36	S/I VENTANA CORREDIZA TIPO V-27, DIMENSIONES 123M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 2 HOJAS CORREDIZAS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA TIPO MEDIALUNA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 631,356.00	$ 1,262,712.00	2.00	$ 1,262,712.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.37	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-37, DIMENSIONES DE VANO 835M ANCHO X 260M DE ALTO, COMPUESTA POR 7 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 3 HOJAS CORREDIZAS) CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIOS TEMPLADO DE 10MM SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURAS, TIRADERAS, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 18,998,130.00	$ 56,994,390.00	3.00	$ 56,994,390.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.38	S/I VENTANA SISTEMA PROYECTANTE TIPO V-42, DIMENSIONES DE VANO 100M ANCHO X 055M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGUN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	14.00	$ 541,012.00	$ 7,574,168.00	14.00	$ 7,574,168.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.39	S/I VENTANA SISTEMA PROYECTANTE TIPO V-43, DIMENSIONES DE VANO 080M ANCHO X 055M DE ALTO ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM SEGUN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA,TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	5.00	$ 366,318.00	$ 1,831,590.00	5.00	$ 1,831,590.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.40	S/I PUERTA VENTANA TIPO V-47, DIMENSIONES DE VANO 9.30M ANCHO X 2.60M DE ALTO COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS CORREDIZAS) 8 CUERPOS SUPERIORES FIJOS CON ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SEGUN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION	UND	1.00	$ 23,991,543.00	$ 23,991,543.00	1.00	$ 23,991,543.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.41	S/I VENTANA TIPO V-50, DIMENSIONES DE VANO 930M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 3,166,836.00	$ 3,166,836.00	1.00	$ 3,166,836.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.42	S/I VENTANA TIPO V-51, DIMENSIONES DE VANO 935M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 6,519,957.00	$ 13,039,914.00	2.00	$ 13,039,914.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.43	VENTANA TIPO V-52, DIMENSIONES DE VANO 925M ANCHO X 050M DE ALTO, COMPUESTA POR 8 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (4 CUERPOS FIJOS Y 4 HOJAS PROYECTANTES) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 6,519,957.00	$ 13,039,914.00	2.00	$ 13,039,914.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.44	S/I DE CUERPO FIJO CON ESTRUCTURA EN PERFILERIA DE ALUMINIO COLOR NATURAL Y VIDRIO TEMPLADO DE 5MM SUBDIVIDIDO EN SECCIONES IGUALES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	189.10	$ 991,945.00	$ 187,576,800.00	189.10	$ 187,576,800.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.45	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE CON PARALES A CADA 150 M, TRES APOYOS HORIZONTALES SEPARADOS EQUITATIVAMENTE Y PASAMANOS EN TUBERÍA DE 2" SEGÚN DISEÑO INCLUYE ANCLAJES A PISO EN CADA PARAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	521.54	$ 447,526.00	$ 233,402,710.00	521.54	$ 233,402,710.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.46	S/I DIVISIONES SANITARIA, EN ACERO INOXIDABLE CAL 20, ENTAMBORADO DE 1" CON RELLENO EN LAMINA DE PIESTIRENO Y ESPUMA POLIURETANO, TABIQUES, SEPARADORES, PUERTAS DE 060X160M Y COMPLEMENTOS PARA ENSAMBLAR EN SITIO	M2	116.89	$ 847,825.00	$ 99,102,264.00	116.89	$ 99,102,264.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.47	S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CAL 18 INCLUYE POCETA (DIMENSIONES 241MX060M) INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 2,510,284.00	$ 2,510,284.00	1.00	$ 2,510,284.00		$ -		$ -	-	$ -
3.05.48	S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE EN FORMA DE "U" SEGUN DISEÑO (320X050M) (174X060M) (215X06M) INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 4,891,865.00	$ 4,891,865.00	1.00	$ 4,891,865.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,341.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.05.49	S/I MESON CON ACABADO EN ACERO INOXIDABLE CON DOBLE POCETA UBICADAS SEGUN DISEÑO (393X06M) INCLUYE LOSA EN CONCRETO PARA SOPORTE, MURO DE APOYO ENCHAPADO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 3,938,372.00	$ 3,938,372.00	1.00	$ 3,938,372.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06	REVESTIMIENTO DE MUROS Y FACHADA												
3.06.01	S/I DE REVESTIMIENTO CON FIJACIÓN OCULTA PARA MURO EN COMPUESTO PLASTICO DE MADERA (WPC) ENCAPSULADO, ACABADO ACANALADO CON APARIENCIA EN MADERA INCLUYE PLATINA DE FIJACIÓN EN ALUMINIO	M2	169.12	$ 351,567.00	$ 59,457,011.00	30.22	$ 10,624,355.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.02	S/I REVESTIMIENTO COMPUESTO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCOMBUSTIBLE E=4MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	387.80	$ 437,544.00	$ 169,679,563.00	69.30	$ 30,321,799.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE REVESTIMINETO DE FACHADA EN PERFIL METALICO SEGUN DISEÑO INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	KG	18,428.70	$ 24,036.00	$ 442,989,091.00	3,293.30	$ 79,164,262.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.04	S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO SIMILAR A LA MADERA DIMENSIONES 95X30CM INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	978.73	$ 1,084,940.63	$ 1,061,863,941.00	174.91	$ 189,766,965.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.05	S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO COLOR BLANCO DIMENSIONES 95X30CM INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	604.56	$ 1,084,940.63	$ 655,933,405.00	108.05	$ 117,227,835.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.06	S/I DE REVESTIMIENTO EN POLICARBONATO 16MM, SELLO SECO Y SELLO DE ALVEOLOS CON SILICONA Y UPD DE ALUMINIO CONTROL SOLAR DEL 5% AL 25% Y FILTRO DE RAYOS UV DEL 999% INCLUYE PANELES, CONECTORES ,TAPAS, TERMOSELLOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	71.10	$ 1,079,475.00	$ 76,750,673.00	12.71	$ 13,720,127.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE FACHADA EN LAMINA ALUZINC PERFORADA SEGÚN DISEÑO INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACION , REMATE EN U PARA BORDES LATERALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	311.43	$ 372,108.00	$ 115,885,594.00	55.66	$ 20,711,531.00		$ -		$ -	-	$ -
3.06.08	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL SEGUN DISEÑO PARA SOPORTE DE REVESTIMINETO DE FACHADA EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCLUYE PLATINAS DE ANCLAJE, ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	KG	2,838.69	$ 24,030.00	$ 68,213,721.00	507.31	$ 12,190,659.00		$ -		$ -	-	$ -
3.07	CUBIERTA												
3.07.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	9,102.10	$ 20,768.00	$ 189,032,413.00	9,102.10	$ 189,032,413.00		$ -		$ -	-	$ -
3.07.02	S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA	M	187.38	$ 14,403.00	$ 2,698,834.00	187.38	$ 2,698,834.00		$ -		$ -	-	$ -
3.07.03	S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (038mm) x600mts	M2	1,022.80	$ 107,902.00	$ 110,362,166.00	1,022.80	$ 110,362,166.00		$ -		$ -	-	$ -
3.08	IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS Y VIGAS CANAL												
3.08.01	PLANTILLA DE NIVELACIÓN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS PARA CUBIERTAS	M2	933.65	$ 77,270.00	$ 72,143,136.00	933.65	$ 72,143,136.00		$ -		$ -	-	$ -
3.08.02	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	962.45	$ 70,878.00	$ 68,216,531.00	962.45	$ 68,216,531.00		$ -		$ -	-	$ -
3.09	CHUTE DE BASURAS												
3.09.01	S/I DE CHUTE CON DUCTERIA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ADICIONADO DE PASTA IGNIFUGA DE 60CM DE DIAMETRO e=2MM INCLUYE DUCTO,BOCAS,DISPENSADORES,TRAMO TERMINAL, CODO DESVIACION, SPRINKLER, DESFOGUES, LAVADO Y TAPON COMPUERTA EN ACERO INOXIDABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 8,660,848.00	$ 8,660,848.00	1.00	$ 8,660,848.00		$ -		$ -	-	$ -
3.09.02	S/I TUBERIA SANITARIA DE VENTILACION DE 4" L	M	18.00	$ 49,927.00	$ 898,686.00	18.00	$ 898,686.00		$ -		$ -	-	$ -
3.10	INSTALACIONES HIDRAULICAS												
3.10.01	EXCAVACION MANUAL	M3	128.98	$ 34,411.00	$ 4,438,331.00	128.98	$ 4,438,331.00		$ -		$ -	-	$ -

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.10.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	122.54	$ 88,636.00	$ 10,861,455.00	122.54	$ 10,861,455.00		$ -		$ -		$ -
3.10.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	6.45	$ 22,969.00	$ 148,150.00	6.45	$ 148,150.00		$ -		$ -		$ -
3.10.04	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P	UND	45.00	$ 33,057.00	$ 1,488,015.00	45.00	$ 1,488,015.00		$ -		$ -		$ -
3.10.05	PUNTO HIDRAULICO DE 3/4" PVC-P	UND	9.00	$ 42,545.00	$ 382,905.00	9.00	$ 382,905.00		$ -		$ -		$ -
3.10.06	PUNTO HIDRAULICO DE 1-1/4" PVC-P	UND	40.00	$ 88,485.00	$ 3,539,400.00	40.00	$ 3,539,400.00		$ -		$ -		$ -
3.10.07	S/I TUBERIA PRESION RDE 11 DE 3/4"	M	84.00	$ 16,380.00	$ 1,375,920.00	84.00	$ 1,375,920.00		$ -		$ -		$ -
3.10.08	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1"	M	18.00	$ 18,215.00	$ 327,870.00	18.00	$ 327,870.00		$ -		$ -		$ -
3.10.09	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1-1/4"	M	120.00	$ 24,304.00	$ 2,916,480.00	120.00	$ 2,916,480.00		$ -		$ -		$ -
3.10.10	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1-1/2"	M	42.00	$ 28,484.00	$ 1,196,328.00	42.00	$ 1,196,328.00		$ -		$ -		$ -
3.10.11	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 2"	M	66.00	$ 38,586.00	$ 2,546,676.00	66.00	$ 2,546,676.00		$ -		$ -		$ -
3.10.12	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 2-1/2"	M	102.00	$ 55,591.00	$ 5,670,282.00	102.00	$ 5,670,282.00		$ -		$ -		$ -
3.10.13	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 3"	M	78.00	$ 72,289.00	$ 5,638,542.00	78.00	$ 5,638,542.00		$ -		$ -		$ -
3.10.14	S/I TEE DE 3/4" PVC - P SCH 40	UND	35.00	$ 9,341.00	$ 326,935.00	35.00	$ 326,935.00		$ -		$ -		$ -
3.10.15	S/I TEE DE 1" PVC - P SCH 40	UND	2.00	$ 13,882.00	$ 27,764.00	2.00	$ 27,764.00		$ -		$ -		$ -
3.10.16	S/I TEE DE 1-1/4" PVC - P SCH 40	UND	57.00	$ 20,875.00	$ 1,189,875.00	57.00	$ 1,189,875.00		$ -		$ -		$ -
3.10.17	S/I TEE DE 1-1/2" PVC - P SCH 40	UND	8.00	$ 24,447.00	$ 195,576.00	8.00	$ 195,576.00		$ -		$ -		$ -
3.10.18	S/I TEE DE 2" PVC - P SCH 40	UND	23.00	$ 34,460.00	$ 792,580.00	23.00	$ 792,580.00		$ -		$ -		$ -
3.10.19	S/I TEE DE 2-1/2" PVC - P SCH 40	UND	4.00	$ 67,163.00	$ 268,652.00	4.00	$ 268,652.00		$ -		$ -		$ -
3.10.20	S/I TEE DE 3" PVC - P SCH 40	UND	7.00	$ 102,951.00	$ 720,657.00	7.00	$ 720,657.00		$ -		$ -		$ -
3.10.21	S/I CODO DE 90° 3/4" PVC - P SCH 40	UND	40.00	$ 8,700.00	$ 348,000.00	40.00	$ 348,000.00		$ -		$ -		$ -
3.10.22	S/I CODO DE 90°DE 1" SCH 40 PVC - P SCH 40	UND	2.00	$ 12,652.00	$ 25,304.00	2.00	$ 25,304.00		$ -		$ -		$ -
3.10.23	S/I CODO DE 90° DE 1-1/4" PVC - P SCH 40	UND	46.00	$ 15,576.00	$ 716,496.00	46.00	$ 716,496.00		$ -		$ -		$ -
3.10.24	S/I CODO DE 90° DE 1-1/2" PVC - P SCH 40	UND	3.00	$ 20,859.00	$ 62,577.00	3.00	$ 62,577.00		$ -		$ -		$ -
3.10.25	S/I CODO DE 90° DE 2" PVC - P SCH 40	UND	19.00	$ 29,284.00	$ 556,396.00	19.00	$ 556,396.00		$ -		$ -		$ -
3.10.26	S/I CODO DE 90° 2-1/2" PVC - P SCH 40	UND	5.00	$ 64,358.00	$ 321,790.00	5.00	$ 321,790.00		$ -		$ -		$ -
3.10.27	S/I CODO DE 90° DE 3" PVC - P SCH 40	UND	4.00	$ 82,545.00	$ 330,180.00	4.00	$ 330,180.00		$ -		$ -		$ -
3.10.28	S/I VALVULA DE CIERRE 3/4"	UND	15.00	$ 28,294.00	$ 424,410.00	15.00	$ 424,410.00		$ -		$ -		$ -
3.10.29	S/I VALVULA DE CIERRE 1-1/4"	UND	20.00	$ 57,270.00	$ 1,145,400.00	20.00	$ 1,145,400.00		$ -		$ -		$ -
3.10.30	S/I EQUIPO DE BOMBEO - qp: 160GPM - adt: 45M	UND	2.00	$ 9,000,340.00	$ 18,000,680.00	2.00	$ 18,000,680.00		$ -		$ -		$ -
3.10.31	S/I TANQUE HIDROACUMULADOR - vl: 132GI	UND	2.00	$ 5,434,738.00	$ 10,869,476.00	2.00	$ 10,869,476.00		$ -		$ -		$ -
3.10.32	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,611,678.00	$ 1,611,678.00	1.00	$ 1,611,678.00		$ -		$ -		$ -
3.10.33	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 2" - ACOMETIDA	M	30.00	$ 38,586.00	$ 1,157,580.00	30.00	$ 1,157,580.00		$ -		$ -		$ -
3.10.34	S/I SOPORTERIA TUBERIA PRESION	UND	187.00	$ 19,122.00	$ 3,575,814.00	187.00	$ 3,575,814.00		$ -		$ -		$ -
3.11	INSTALACIONES SANITARIAS												
3.11.01	EXCAVACION MANUAL	M3	158.17	$ 34,411.00	$ 5,442,788.00	158.17	$ 5,442,788.00		$ -		$ -		$ -
3.11.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	150.26	$ 88,636.00	$ 13,318,445.00	150.26	$ 13,318,445.00		$ -		$ -		$ -
3.11.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	7.91	$ 22,969.00	$ 181,685.00	7.91	$ 181,685.00		$ -		$ -		$ -
3.11.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP	UND	61.00	$ 48,525.00	$ 2,960,025.00	61.00	$ 2,960,025.00		$ -		$ -		$ -
3.11.05	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP	UND	47.00	$ 57,679.00	$ 2,710,913.00	47.00	$ 2,710,913.00		$ -		$ -		$ -
3.11.06	PUNTO SANITARIO DE 4" L - TP	UND	41.00	$ 92,460.00	$ 3,790,860.00	41.00	$ 3,790,860.00		$ -		$ -		$ -
3.11.07	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L -TP	M	150.00	$ 37,703.00	$ 5,655,450.00	150.00	$ 5,655,450.00		$ -		$ -		$ -
3.11.08	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 3" L -TP	M	72.00	$ 48,834.00	$ 3,516,048.00	72.00	$ 3,516,048.00		$ -		$ -		$ -
3.11.09	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP	M	216.00	$ 62,120.00	$ 13,417,920.00	216.00	$ 13,417,920.00		$ -		$ -		$ -
3.11.10	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm) - CORRUGADA	M	222.00	$ 76,226.00	$ 16,922,172.00	222.00	$ 16,922,172.00		$ -		$ -		$ -
3.11.11	S/I YEE DE 2" PVC-S	UND	34.00	$ 23,837.00	$ 810,458.00	34.00	$ 810,458.00		$ -		$ -		$ -
3.11.12	S/I YEE DE 3" PVC-S	UND	12.00	$ 37,597.00	$ 451,164.00	12.00	$ 451,164.00		$ -		$ -		$ -
3.11.13	S/I YEE DE 3x2" PVC-S	UND	24.00	$ 36,223.00	$ 869,352.00	24.00	$ 869,352.00		$ -		$ -		$ -
3.11.14	S/I YEE DE 4" PVC-S	UND	62.00	$ 55,769.00	$ 3,457,678.00	62.00	$ 3,457,678.00		$ -		$ -		$ -
3.11.15	S/I YEE DE 4x2" PVC-S	UND	30.00	$ 49,724.00	$ 1,491,720.00	30.00	$ 1,491,720.00		$ -		$ -		$ -
3.11.16	S/I YEE DE 4x3" PVC-S	UND	11.00	$ 49,724.00	$ 546,964.00	11.00	$ 546,964.00		$ -		$ -		$ -
3.11.17	S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S	UND	36.00	$ 16,161.00	$ 581,796.00	36.00	$ 581,796.00		$ -		$ -		$ -
3.11.18	S/I CODO DE 3" X 45° PVC-S	UND	2.00	$ 26,438.00	$ 52,876.00	2.00	$ 52,876.00		$ -		$ -		$ -
3.11.19	S/I CODO DE 4" X 45° PVC-S	UND	8.00	$ 36,649.00	$ 293,192.00	8.00	$ 293,192.00		$ -		$ -		$ -
3.11.20	S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S	UND	3.00	$ 20,270.00	$ 60,810.00	3.00	$ 60,810.00		$ -		$ -		$ -
3.11.21	S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 3" PVC-S	UND	5.00	$ 33,978.00	$ 169,890.00	5.00	$ 169,890.00		$ -		$ -		$ -
3.11.22	S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 4" PVC-S	UND	12.00	$ 45,380.00	$ 544,560.00	12.00	$ 544,560.00		$ -		$ -		$ -
3.11.23	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	15.00	$ 550,053.00	$ 8,250,795.00	15.00	$ 8,250,795.00		$ -		$ -		$ -
3.11.24	TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO	UND	2.00	$ 559,929.00	$ 1,119,858.00	2.00	$ 1,119,858.00		$ -		$ -		$ -
3.11.25	ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	UND	1.00	$ 1,614,839.00	$ 1,614,839.00	1.00	$ 1,614,839.00		$ -		$ -		$ -
3.11.26	S/I SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA	UND	263.00	$ 23,614.00	$ 6,210,482.00	263.00	$ 6,210,482.00		$ -		$ -		$ -
3.12	INSTALACIONES SANITARIAS - VENTILACION SANITARIA												
3.12.01	S/I TUBERIA DE SANITARIA VENTILACION DE 2" L	M	330.00	$ 30,957.00	$ 10,215,810.00	330.00	$ 10,215,810.00		$ -		$ -		$ -
3.12.02	S/I TUBERIA DE SANITARIA VENTILACION DE 3" L	M	72.00	$ 36,715.00	$ 2,643,480.00	72.00	$ 2,643,480.00		$ -		$ -		$ -
3.12.03	S/I YEE DE 3x2" PVC-S	UND	58.00	$ 36,223.00	$ 2,100,934.00	58.00	$ 2,100,934.00		$ -		$ -		$ -

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
			PLAZO INICIAL	16 MESES
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA		

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.12.04	S/I CODO DE 3" X 45° PVC-S	UND	38.00	$ 26,438.00	$ 1,004,644.00	38.00	$ 1,004,644.00		$ -		$ -	-	$ -
3.12.05	S/I SOPORTERIA TUBERIA SANITARIA	UND	168.00	$ 23,614.00	$ 3,967,152.00	168.00	$ 3,967,152.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13	**ELEMENTOS HIDROSANITARIOS**												
3.13.01	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE GRIFERIA CON SENSOR ELECTRONICO Y ACCESORIOS DE DESAGUES Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	33.00	$ 1,474,713.00	$ 48,665,529.00	33.00	$ 48,665,529.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.02	S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO, INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN	UND	3.00	$ 748,789.00	$ 2,246,367.00	3.00	$ 2,246,367.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.03	S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	8.00	$ 65,473.00	$ 523,784.00	8.00	$ 523,784.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.04	S/I GRIFERIA PARA DUCHA ANTIVANDALICA, DE SEGURIDAD INCLUYE VALVULA TIPO PUSH,CUERPO TUBO, PORTA ESCUDO, ESCUDO Y REGADERA DE SEGURIDAD	UND	1.00	$ 609,891.00	$ 609,891.00	1.00	$ 609,891.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.05	S/I DE TAZA ORINAL SANITARIO PARA FLUXÓMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE VALVULA Y ACCESORIOS	UND	9.00	$ 1,946,336.00	$ 17,517,024.00	9.00	$ 17,517,024.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.06	S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS	UND	9.00	$ 2,162,644.00	$ 19,463,796.00	9.00	$ 19,463,796.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.07	S/I DE TAZA PORCELANA SANITARIA PARA FLUXOMETRO DE ENTRADA SUPERIOR DE USO INSTITUCIONAL INCLUYE ASIENTO, FLUXOMETRO Y ACCESORIOS	UND	31.00	$ 2,108,843.00	$ 65,374,133.00	31.00	$ 65,374,133.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.08	S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"	UND	56.00	$ 19,518.00	$ 1,093,008.00	56.00	$ 1,093,008.00		$ -		$ -	-	$ -
3.13.09	S/I DE LAVATRAPEROS DE 050M X 050M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	6.00	$ 407,871.00	$ 2,447,226.00	6.00	$ 2,447,226.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS**												
3.14.01	EXCAVACION MANUAL	M3	211.19	$ 34,411.00	$ 7,267,259.00	211.19	$ 7,267,259.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	248.63	$ 81,203.00	$ 20,189,502.00	248.63	$ 20,189,502.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.03	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	46.20	$ 572,639.00	$ 26,455,922.00	58.00	$ 33,213,062.00		$ -	58.00	$ 33,213,062.00	58.00	$ 33,213,062.00
3.14.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	66.90	$ 11,844.00	$ 792,364.00	66.90	$ 792,364.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	21.66	$ 129,507.00	$ 2,805,122.00	21.66	$ 2,805,122.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.06	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	2.71	$ 534,844.00	$ 1,449,427.00	2.71	$ 1,449,427.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	6,104.42	$ 10,232.00	$ 62,460,425.00	8,549.93	$ 87,482,884.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS	M3	1.76	$ 909,646.00	$ 1,600,977.00	3.52	$ 3,201,954.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.09	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (LOSA INFERIOR)	M3	13.54	$ 902,360.00	$ 12,217,954.00	13.54	$ 12,217,954.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.10	S/I CINTA PVC PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES	M	40.50	$ 197,262.00	$ 7,989,111.00	42.50	$ 8,383,635.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.11	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (MUROS)	M3	35.86	$ 1,157,234.00	$ 41,498,411.00	35.86	$ 41,498,411.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.12	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (LOSA SUPERIOR)	M3	13.22	$ 1,100,345.00	$ 14,546,561.00	13.22	$ 14,546,561.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.13	TAPA DE INSPECCION 060X060M EN CONCRETO DE 4000 PSI, PARA TANQUES INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	3.00	$ 418,937.00	$ 1,256,811.00	3.00	$ 1,256,811.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.14	ESCALERA TIPO GATO DE 8 PASOS, ESTRUCUTRA DE SOPORTE EN ANGULO 2"X3/16 Y PASOS EN TUBO GALVANIZADO DE 1" INCLUYE ANCLAJES, ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA EPOXICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	3.00	$ 1,145,379.00	$ 3,436,137.00	3.00	$ 3,436,137.00		$ -		$ -	-	$ -
3.14.15	RELLENO CON MATERIAL SELLECIONADO COMPACTADO	M3	16.25	$ 88,636.00	$ 1,440,335.00	16.25	$ 1,440,335.00		$ -		$ -	-	$ -
3.15	**REDES DE GAS**												
3.15.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PROTECCIÓN DE CENTRO DE MEDICIÓN MEDIDAS ADECUADAS PARA MEDIDOR G10	UND	1.00	$ 204,976.00	$ 204,976.00	1.00	$ 204,976.00		$ -		$ -	-	$ -
3.15.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO PARA MEDIDOR INCLUYE, TUBERÍA Y ACCESORIOS DEL BASTÓN INTERNO PARA LA INSTALACIÓN DEL MEDIDOR G10	UND	1.00	$ 101,137.00	$ 101,137.00	1.00	$ 101,137.00		$ -		$ -	-	$ -
3.15.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PE80 2" RDE 11, ENTERRADA A 55 CMS DEL NIVEL DEL TERRENO, CINTA DE SEÑALIZACIÓN 20 CMS POR ENCIMA DE LA TUBERÍA RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA INCLUYE ELEVADORES, ACCESORIOS Y PRUEBAS	M	53.64	$ 65,221.00	$ 3,498,454.00	53.64	$ 3,498,454.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AC 1" SCH40, INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS	M	44.18	$ 66,872.00	$ 2,954,405.00	44.18	$ 2,954,405.00		$ -		$ -	-	$ -
3.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE CONEXIÓN HG 1" PARA ARTEFACTO A GAS, INCLUYE VÁLVULA, CONECTOR FLEXIBLE Y ACCESORIOS	UND	3.00	$ 169,947.00	$ 509,841.00	3.00	$ 509,841.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16	ASCENSORES												
3.16.01	EXCAVACION MANUAL	M3	19.31	$ 34,411.00	$ 664,476.00	29.61	$ 1,018,910.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.02	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	13.92	$ 11,844.00	$ 164,868.00	21.96	$ 260,094.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.03	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	2.97	$ 129,507.00	$ 384,636.00	4.55	$ 589,257.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.04	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	0.50	$ 534,844.00	$ 267,422.00	0.76	$ 406,481.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA FOSO	KG	611.56	$ 10,232.00	$ 6,257,482.00	1,325.23	$ 13,559,753.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.06	LOSA FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA FOSO DE ASCENSOR	M3	2.48	$ 876,257.00	$ 2,173,117.00	3.80	$ 3,329,777.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.07	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA PARA MUROS PERIMETRALES DE FOSO PARA ASCENSOR	M3	4.87	$ 1,309,876.00	$ 6,379,096.00	7.75	$ 10,151,539.00		$ -		$ -	-	$ -
3.16.08	S/I ASCENSOR CON UNIDAD MOTRIZ SIN SALA DE MAQUINAS,VELOCIDAD 1M/SEG - 60M/MIN , TIPO PASAJEROS DE 3 PARADAS CAPACÍDAD 630 KG, 8 PASAJEROS MAXIMO, MATERIALES DE CABINA EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE PASAMANOS, ESPEJO, BOTONERAS, ILUMINACION LED, ANUNCIO DE VOZ Y BOTON DE SONIDO EN CABINA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA NIVELACION CON BATERIA, VENTILADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDO PARA SU CORRECTO TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	UND	3.00	$ 221,689,374.69	$ 665,068,124.00	3.00	$ 665,068,124.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17	SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS												
3.17.01	EQUIPOS				$ -		$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH580VAEUBS1 DE 476,678 BTU/h	UND	1.00	$ 130,381,836.00	$ 130,381,836.00	1.00	$ 130,381,836.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH400VAEUBS1 DE 330,164 BTU/h	UND	1.00	$ 94,479,191.00	$ 94,479,191.00	1.00	$ 94,479,191.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH540VAEUBS1 DE 460020 BTU/h	UND	2.00	$ 123,585,549.00	$ 247,171,098.00	2.00	$ 247,171,098.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH420VAEUBS1 DE 377693 BTU/h	UND	1.00	$ 98,636,186.00	$ 98,636,186.00	1.00	$ 98,636,186.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH380VAEUBS1 DE 335475 BTU/h	UND	1.00	$ 89,586,778.00	$ 89,586,778.00	1.00	$ 89,586,778.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD EXTERIOR JTOH260VAEUBS1 DE 244537 BTU/h	UND	1.00	$ 65,261,042.00	$ 65,261,042.00	1.00	$ 65,261,042.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JTKS022H0PS0BS DE 12,000 BTU/h	UND	12.00	$ 3,851,090.00	$ 46,213,080.00	12.00	$ 46,213,080.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS040H0PSAS DE 12,000 BTU/h	UND	6.00	$ 3,851,090.00	$ 23,106,540.00	6.00	$ 23,106,540.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS055H0PSAS DE 18,000 BTU/h	UND	8.00	$ 4,886,438.00	$ 39,091,504.00	8.00	$ 39,091,504.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 2 VIAS JTKT071H0PSDAS DE 30,000 BTU/h	UND	5.00	$ 5,925,419.00	$ 29,627,095.00	5.00	$ 29,627,095.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 1 VIA JDKS080H0PSAS DE 24,000 BTU/h	UND	3.00	$ 5,431,359.00	$ 16,294,077.00	3.00	$ 16,294,077.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF112H0PSAQ DE 36,000 BTU/h	UND	3.00	$ 4,101,816.00	$ 12,305,448.00	3.00	$ 12,305,448.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF140H0PSAQ DE 48,000 BTU/h	UND	38.00	$ 4,462,922.00	$ 169,591,036.00	38.00	$ 169,591,036.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANEJADORA CASSETTE DE 4 VIAS JTKF160H0PSAQ DE 60,000 BTU/h	UND	16.00	$ 4,462,922.00	$ 71,406,752.00	16.00	$ 71,406,752.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 210CFM, 02 INWG	UND	2.00	$ 2,360,574.00	$ 4,721,148.00	2.00	$ 4,721,148.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 490CFM, 02 INWG	UND	1.00	$ 3,507,532.00	$ 3,507,532.00	1.00	$ 3,507,532.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 560CFM, 02 INWG	UND	1.00	$ 3,738,463.00	$ 3,738,463.00	1.00	$ 3,738,463.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 630 CFM, 0.2 INWG 110V-60HZ-1F	UND	2.00	$ 4,101,795.00	$ 8,203,590.00	2.00	$ 8,203,590.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.01.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO DE 630 CFM, 0.2 INWG 110V-60HZ-1F	UND	2.00	$ 4,879,264.00	$ 9,758,528.00	2.00	$ 9,758,528.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.17.01.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD DE VENTILACION HELICOCENTRIFUGA DE 350CFM, 02 INWG	UND	1.00	$ 2,916,656.00	$ 2,916,656.00	1.00	$ 2,916,656.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02	KIT DE CONEXIONES						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN EXTERIOR MODELO MC-NP31SA	UND	3.00	$ 3,745,300.00	$ 11,235,900.00	3.00	$ 11,235,900.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN EXTERIOR MODELO MC-NP21SA1	UND	4.00	$ 1,472,472.00	$ 5,889,888.00	4.00	$ 5,889,888.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP2582A3	UND	2.00	$ 3,082,434.00	$ 6,164,868.00	2.00	$ 6,164,868.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP902A3	UND	23.00	$ 1,091,245.00	$ 25,098,635.00	23.00	$ 25,098,635.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP692A3	UND	17.00	$ 867,888.00	$ 14,754,096.00	17.00	$ 14,754,096.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP452A3	UND	20.00	$ 726,250.00	$ 14,525,000.00	20.00	$ 14,525,000.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE CONEXIÓN INTERIOR BRANCH MODELO MW-NP282A3	UND	22.00	$ 644,533.00	$ 14,179,726.00	22.00	$ 14,179,726.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.03	CONTROLADOR						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CENTRAL DE CONTROL MODELO JWBA101EWS	UND	7.00	$ 19,148,173.00	$ 134,037,211.00	7.00	$ 134,037,211.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04	TUBERIAS DE COBRE TIPO K						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 3/4 " (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	23.00	$ 231,669.00	$ 5,328,387.00	23.00	$ 5,328,387.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/2 " (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	150.00	$ 210,818.00	$ 31,622,700.00	150.00	$ 31,622,700.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/4 " (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	42.00	$ 163,573.00	$ 6,870,066.00	42.00	$ 6,870,066.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1 1/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	91.00	$ 153,264.00	$ 13,947,024.00	91.00	$ 13,947,024.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	90.00	$ 140,767.00	$ 12,669,030.00	90.00	$ 12,669,030.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 7/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	26.00	$ 121,810.00	$ 3,167,860.00	26.00	$ 3,167,860.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	246.00	$ 112,120.00	$ 27,581,520.00	246.00	$ 27,581,520.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 5/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	466.00	$ 105,030.00	$ 48,943,980.00	466.00	$ 48,943,980.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1/2" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	167.00	$ 92,203.00	$ 15,397,901.00	167.00	$ 15,397,901.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 3/8" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	486.00	$ 85,486.00	$ 41,546,196.00	486.00	$ 41,546,196.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.04.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RIGIDA TIPO K DE 1/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	71.00	$ 81,922.00	$ 5,816,462.00	71.00	$ 5,816,462.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05	TUBERIAS DE DRENAJE PVC RD 21						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 2 1/2" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	12.00	$ 87,368.00	$ 1,048,416.00	12.00	$ 1,048,416.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 2" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	127.00	$ 79,817.00	$ 10,136,759.00	127.00	$ 10,136,759.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 1 1/2" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	238.00	$ 68,713.00	$ 16,353,694.00	238.00	$ 16,353,694.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 1" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	270.00	$ 61,142.00	$ 16,508,340.00	270.00	$ 16,508,340.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.05.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DRENAJE DE PRESION RD 21 3/4" (INCLUYE AISLAMIENTO)	M	145.00	$ 55,663.00	$ 8,071,860.00	145.00	$ 8,071,860.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06	DUCTERIA Y REJILLAS						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24	M2	213.00	$ 154,259.00	$ 32,857,167.00	213.00	$ 32,857,167.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA PARA EXTRACCION DE AIRE 6"X6"	UND	61.00	$ 141,532.00	$ 8,633,452.00	61.00	$ 8,633,452.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA PARA EXTRACCION DE AIRE 8"X8"	UND	4.00	$ 159,467.00	$ 637,868.00	4.00	$ 637,868.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES PARA EXTRACCION DE AIRE 10"X8"	UND	2.00	$ 169,090.00	$ 338,180.00	2.00	$ 338,180.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 14"X10"	UND	1.00	$ 219,295.00	$ 219,295.00	1.00	$ 219,295.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.17.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 16"X10"	UND	1.00	$ 227,592.00	$ 227,592.00	1.00	$ 227,592.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 20"X10"	UND	1.00	$ 260,076.00	$ 260,076.00	1.00	$ 260,076.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 22"X10"	UND	2.00	$ 277,850.00	$ 555,700.00	2.00	$ 555,700.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.06.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA TIPO CUBO DE ALETA FIJA CON PORTAFILTRO PARA EXTERIORES DE 24"X16"	UND	2.00	$ 336,592.00	$ 673,184.00	2.00	$ 673,184.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.07	CABLE ELECTRICO						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.07.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE APANTALLADO PARA SEÑAL 2 HILOS 2 X 18	M	1,200.00	$ 62,049.00	$ 74,458,800.00	1,200.00	$ 74,458,800.00		$ -		$ -	-	$ -
3.17.08	GAS REFRIGERANTE						$ -		$ -		$ -	-	$ -
3.17.08.01	SUMINISTRO Y CARGUE DE REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A	KG	170.00	$ 71,323.00	$ 12,124,910.00	170.00	$ 12,124,910.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18	ESCALERAS AUXILIARES 1												
3.18.01	EXCAVACION MANUAL	M3	45.24	$ 34,411.00	$ 1,556,754.00	50.60	$ 1,741,197.00		$ -	47.38	$ 1,630,393.00	47.38	$ 1,630,393.00
3.18.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	162.24	$ 81,203.00	$ 13,174,375.00	198.00	$ 16,078,194.00		$ -	136.28	$ 11,066,345.00	136.28	$ 11,066,345.00
3.18.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	1.56	$ 534,844.00	$ 834,357.00	1.76	$ 941,325.00		$ -	1.72	$ 919,932.00	1.72	$ 919,932.00
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	348.00	$ 572,639.00	$ 199,278,372.00	348.00	$ 199,278,372.00		$ -	348.00	$ 199,278,372.00	348.00	$ 199,278,372.00
3.18.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA DADOS DE CIMENTACION	KG	4,643.20	$ 10,232.00	$ 47,509,222.00	5,529.12	$ 56,573,956.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.06	CONCRETO DE 3500PSI PARA DADOS DE CIMENTACION	M3	35.20	$ 909,646.00	$ 32,019,539.00	43.04	$ 39,151,164.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	3,267.40	$ 10,232.00	$ 33,432,037.00	3,352.68	$ 34,304,622.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 045X100M	M	19.80	$ 453,527.00	$ 8,979,835.00	13.20	$ 5,986,556.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.09	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	17.20	$ 88,636.00	$ 1,524,539.00	12.85	$ 1,138,973.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.10	LOSA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), E= 010MT INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	43.70	$ 157,929.00	$ 6,901,497.00	43.70	$ 6,901,497.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.11	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	7,952.60	$ 10,232.00	$ 81,473,323.00	7,989.48	$ 81,748,359.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.12	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)	M3	8.40	$ 1,252,571.00	$ 10,521,596.00	8.40	$ 10,521,596.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.13	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) PARA SEGUNDO NIVEL	M3	8.40	$ 1,289,914.00	$ 10,835,278.00	8.40	$ 10,835,278.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.14	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) TERCER NIVEL	M3	8.40	$ 1,329,211.00	$ 11,165,372.00	8.40	$ 11,165,372.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.15	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS AEREAS	KG	2,022.40	$ 10,232.00	$ 20,693,197.00	4,040.68	$ 41,344,236.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.16	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 040*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	16.30	$ 503,260.00	$ 8,203,138.00	16.30	$ 8,203,138.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.17	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 030*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	21.78	$ 467,303.00	$ 10,177,859.00	21.78	$ 10,177,859.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.18	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGA DE SECCION 025*06M INCLUYE FORMALETA ARMADO Y DESENCOFRE	M	13.70	$ 451,883.00	$ 6,190,866.00	13.70	$ 6,190,866.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.19	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA ESCALERAS	KG	2,989.60	$ 10,232.00	$ 30,589,587.00	2,987.64	$ 30,569,532.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.20	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1 TRAMO DE 1ER A 2DOPISO INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE	M3	7.04	$ 1,792,549.00	$ 12,619,545.00	8.36	$ 14,985,710.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.21	CONCRETO 3500 PSI PARA ESCALERAS AUXILIAR 1 TRAMO DE 2DO A 3ER PISO INCLUYE FORMALETERIA, ENCOFRADO Y DESMONTE	M3	7.04	$ 1,812,836.00	$ 12,762,365.00	7.04	$ 12,762,365.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.22	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA LOSA CUBIERTA	KG	5,119.20	$ 10,232.00	$ 52,379,654.00	6,874.05	$ 70,335,382.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.23	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA ESPESOR LOSA. 0.20 M INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS RELACION CONCRETO 028m3/m2. FORMALETA Y CASETONES DE POLIESTILENO EXPANDIDO RELACION 032m3/m2	M2	56.20	$ 738,869.00	$ 41,524,382.00	55.84	$ 41,258,389.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.24	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO. ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M2	127.18	$ 188,057.00	$ 23,917,089.00	127.18	$ 23,917,089.00		$ -		$ -	-	$ -

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.18.25	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_SEGUNDO NIVEL	M2	100.90	$ 212,334.00	$ 21,424,501.00	100.90	$ 21,424,501.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.26	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS_TERCER NIVEL	M2	124.78	$ 214,071.00	$ 26,711,779.00	124.78	$ 26,711,779.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.27	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 020M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS,SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL	M2	16.74	$ 260,438.00	$ 4,359,732.00	16.74	$ 4,359,732.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.28	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 020M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS ALTURA SUPERIORES A 3M	M2	16.74	$ 286,451.00	$ 4,795,190.00	16.74	$ 4,795,190.00		$ -		$ -	-	$ -
3.18.29	PINTURA PARA EXTERIOR	M2	592.06	$ 30,815.00	$ 18,244,329.00	592.06	$ 18,244,329.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19	JARDINES INTERNOS												
3.19.01	VIGA DE CIMENTACION DE 025 MTS X 025 MTS DE 21MPA (3000 PSI) INCLUYE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2 CON ESTRIBOS DE 3/8 @ 015M	M	36.30	$ 126,146.00	$ 4,579,100.00	36.30	$ 4,579,100.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.02	LEVANTE DE MURO LINEAL EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA, DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO Y CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS	M	57.40	$ 81,374.00	$ 4,670,868.00	57.40	$ 4,670,868.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.03	VIGA CINTA DE 010 MTS X 012 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 ACERO DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020 MTS	M	57.40	$ 67,683.00	$ 3,885,004.00	57.40	$ 3,885,004.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.04	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1 3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS	M2	61.15	$ 75,034.00	$ 4,588,329.00	61.15	$ 4,588,329.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.05	IMPERMEABILIZACION CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	114.31	$ 70,878.00	$ 8,102,064.00	114.31	$ 8,102,064.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.06	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L +TP	M	44.50	$ 62,118.00	$ 2,764,251.00	44.50	$ 2,764,251.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.07	MATERIAL GRANULAR PARA FILTROS	M3	6.12	$ 183,261.00	$ 1,121,557.00	6.12	$ 1,121,557.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.08	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABONO ORGANICO	UND	54.00	$ 16,829.00	$ 908,766.00	54.00	$ 908,766.00		$ -		$ -	-	$ -
3.19.09	S/I DE PIEDRA DECORATIVA PARA JARDIN SECO SEGUN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	14.10	$ 219,521.00	$ 3,095,246.00	14.10	$ 3,095,246.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20	PUENTE DE CONEXIÓN												
3.20.01	EXCAVACION MANUAL	M3	82.10	$ 34,411.00	$ 2,825,143.00	88.93	$ 3,060,170.00		$ -	74.02	$ 2,547,102.00	74.02	$ 2,547,102.00
3.20.02	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	147.51	$ 81,203.00	$ 11,978,255.00	195.39	$ 15,866,254.00		$ -	126.86	$ 10,301,413.00	126.86	$ 10,301,413.00
3.20.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	1.23	$ 534,844.00	$ 657,858.00	3.16	$ 1,690,107.00		$ -	2.62	$ 1,401,291.00	2.62	$ 1,401,291.00
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	435.00	$ 572,639.00	$ 249,097,965.00	435.00	$ 249,097,965.00		$ -	435.00	$ 249,097,965.00	435.00	$ 249,097,965.00
3.20.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA ZAPATAS	KG	3,172.00	$ 10,232.00	$ 32,455,904.00	3,853.60	$ 39,430,035.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.06	CONCRETO DE 3500PSI PARA ZAPATAS	M3	56.44	$ 909,646.00	$ 51,340,420.00	64.97	$ 59,099,701.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.07	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN	KG	6,787.50	$ 10,232.00	$ 69,449,700.00	6,453.02	$ 66,027,301.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.08	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 045X100M	M	34.65	$ 453,527.00	$ 15,714,711.00	31.11	$ 14,109,225.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.09	CONCRETO DE 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN SECCION 050X150M	M	10.35	$ 430,754.00	$ 4,458,304.00	8.90	$ 3,833,711.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.10	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	107.25	$ 88,636.00	$ 9,506,211.00	107.25	$ 9,506,211.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.11	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	82.10	$ 22,969.00	$ 1,885,755.00	115.83	$ 2,660,905.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.12	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA COLUMNAS	KG	12,470.80	$ 10,232.00	$ 127,601,226.00	12,513.54	$ 128,038,541.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.13	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA)	M3	13.97	$ 1,252,571.00	$ 17,498,417.00	13.97	$ 17,498,417.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.14	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA ENTREPISO NIVEL 2 INCLUYES VIGAS	KG	5,176.00	$ 10,232.00	$ 52,960,832.00	10,805.99	$ 110,566,890.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.20.15	LOSA DE ENTREPISO 2DO NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0.60 M RELACION 0205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 030m3/m2	M2	174.80	$ 669,820.00	$ 117,084,536.00	174.80	$ 117,084,536.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.16	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28MPA) PARA SEGUNDO NIVEL	M3	13.97	$ 1,289,914.00	$ 18,020,099.00	13.97	$ 18,020,099.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.17	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA NIVEL TRES INCLUYE VIGAS	KG	5,176.00	$ 10,232.00	$ 52,960,832.00	10,805.99	$ 110,566,890.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.18	LOSA DE ENTREPISO TERCER NIVEL EN CONCRETO DE 3500 PSI H= 0.60 M RELACION 0205m3/m2, INCLUYE VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, FORMALETA Y CASETONES 030m3/m2	M2	174.80	$ 678,726.00	$ 118,641,654.00	174.80	$ 118,641,654.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.19	COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI (28 MPA) TERCER NIVEL	M3	13.97	$ 1,329,211.00	$ 18,569,078.00	13.97	$ 18,569,078.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.20	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA LOSA DE CUBIERTA	KG	7,739.20	$ 10,232.00	$ 79,187,494.00	7,739.20	$ 79,187,494.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.21	LOSA DE CUBIERTA EN CONCRETO DE 3500 PSI INCLUYE PLACA MACIZA ESP= 0.20 M VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, RELACION CONCRETO 028m3/m2, FORMALETA Y CASETONES DE POLIETILENO EXPANDIDO RELACION 032m3/m2	M2	153.70	$ 738,868.00	$ 113,564,012.00	153.70	$ 113,564,012.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.22	VIGA DE CIMENTACION 04X040M , EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	147.70	$ 332,582.00	$ 49,122,361.00	147.70	$ 49,122,361.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.23	BANCA PERIMETRO JARDINERA, EN CONCRETO DE 3000PSI, INCLUYE REFUERZOS EN ACERO, FORMALETERIA Y ACABADO ESMALTADO SOBRE SUPERFICIE SENTADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M	31.74	$ 331,182.00	$ 10,511,717.00	31.74	$ 10,511,717.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.24	S/I DE JUNTA HORIZONTAL SEGUN DISEÑO SERIE 520-100 h22 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y MEMBRANA	M	110.86	$ 4,191,186.40	$ 464,634,924.00	110.86	$ 464,634,924.00		$ -		$ -	-	$ -
3.20.25	S/I DE JUNTA HORIZONTAL SEGUN DISEÑO SERIE 702/03-100 (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y MEMBRANA	M	55.36	$ 3,244,360.25	$ 179,607,783.00	55.36	$ 179,607,783.00		$ -		$ -	-	$ -
4	SISTEMAS VOZ Y DATOS Y CCTV												
4.01.	BLOQUE N°1												
4.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS INCLUYE TOMA DOBLE RJ-45 NIVEL 6 A, EL FACE PLATE DOBLE , DOS JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 2 PATCH CORD DE 3 PIES + 2 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1)	UND	60.00	$ 672,119.00	$ 40,327,140.00	60.00	$ 40,327,140.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS INCLUYE TOMA SENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A, EL FACE PLATE SENCILLO , UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1)	UND	122.00	$ 470,273.00	$ 57,373,306.00	122.00	$ 57,373,306.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS TIPO AP INCLUYE ACCESS POINT, RJ-45 NIVEL 6 A, UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1)	UND	34.00	$ 1,268,152.00	$ 43,117,168.00	34.00	$ 43,117,168.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA PUNTOS DE CCTV INCLUYE TOMASENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A, EL FACE PLATE SENCILLO , UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1)	UND	19.00	$ 470,273.00	$ 8,935,187.00	19.00	$ 8,935,187.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1)	M	1,936.00	$ 112,238.00	$ 217,292,768.00	1,936.00	$ 217,292,768.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS EN BANDEJA PORTA CABLE INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1)	M	4,886.00	$ 51,943.00	$ 253,793,498.00	4,886.00	$ 253,793,498.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1)	M	2,999.00	$ 102,643.00	$ 307,826,357.00	2,999.00	$ 307,826,357.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS EN BANDEJA PORTA CABLE INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1)	M	9,042.00	$ 42,349.00	$ 382,919,658.00	9,042.00	$ 382,919,658.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA EL CCTV INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1)	M	369.00	$ 102,643.00	$ 37,875,267.00	369.00	$ 37,875,267.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
Representante	ORLANDO RIVERA MORA

FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
PLAZO INICIAL	16 MESES	
MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	$ 4,905,043,226.00
VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	DE 9/09/2022
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.01.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA EL CCTV EN BANDEJA PORTA CABLE INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1)	M	1,086.00	$ 42,349.00	$ 45,991,014.00	1,086.00	$ 45,991,014.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO PARA TELECOMUNICACIONES DE 42UR, INCLUYE. DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO ORGANIZADORES DE CABLE, DOS MULTITOMAS PARA RACK (BLOQUE 1)	UND	1.00	$ 11,327,359.00	$ 11,327,359.00	1.00	$ 11,327,359.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100X600 MM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (BLOQUE 1)	M	223.00	$ 297,098.00	$ 66,252,854.00	223.00	$ 66,252,854.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (BLOQUE 1)	M	153.00	$ 198,091.00	$ 30,307,923.00	153.00	$ 30,307,923.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DEL CCTV (BLOQUE 1)	UND	19.00	$ 684,448.00	$ 13,004,512.00	19.00	$ 13,004,512.00		$ -		$ -	-	$ -
4.01.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO DE 42RU PARA CCTV INCLUYE. DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO ORGANIZADORES DE CABLE, DOS MULTITOMAS PARA RACK, NVR, WD PURPLE, SWITCH POE (BLOQUE 1)	UND	1.00	$ 20,222,975.00	$ 20,222,975.00	1.00	$ 20,222,975.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02	BLOQUE N°1 ZONA CAM												
4.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA VOZ Y DATOS INCLUYE TOMA DOBLE RJ-45 CATEGORIA 6A. EL FACE PLATE DOBLE , DOS JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 2 PATCH CORD DE 3 PIES + 2 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1 - CAM)	UND	30.00	$ 672,119.00	$ 20,163,570.00	30.00	$ 20,163,570.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA DATOS INCLUYE TOMASENCILLA RJ-45 NIVEL 6 A. EL FACE PLATE SENCILLO , UNIDAD JACK RJ-45, CAJA 2X4 RADWELL, MARCACIÓN + 1 PATCH CORD DE 3 PIES + 1 PATCH CORD DE 10PIES (BLOQUE 1 - CAM)	UND	7.00	$ 470,273.00	$ 3,291,911.00	7.00	$ 3,291,911.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1 - CAM)	M	970.00	$ 112,238.00	$ 108,870,860.00	970.00	$ 108,870,860.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 4 PARES CATEGORIA 6A PARA LA RED DE VOZ Y DATOS EN BANDEJA PORTA CABLE INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1 - CAM)	M	2,434.00	$ 51,943.00	$ 126,429,262.00	2,434.00	$ 126,429,262.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS INCLUYE MARCACIÓN + TUBERIA IMC (BLOQUE 1 - CAM)	M	56.00	$ 102,643.00	$ 5,748,008.00	56.00	$ 5,748,008.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA LA RED DE DATOS EN BANDEJA PORTA CABLE INCLUYE MARCACIÓN (BLOQUE 1 - CAM)	M	166.00	$ 42,349.00	$ 7,029,934.00	166.00	$ 7,029,934.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RACK DE PISO DE 28 RU, INCLUYE. DOS BANDEJAS AUXILIAR, CUATRO ORGANIZADORES DE CABLE, DOS MULTITOMAS PARA RACK (BLOQUE 1 - CAM)	UND	1.00	$ 6,620,012.00	$ 6,620,012.00	1.00	$ 6,620,012.00		$ -		$ -	-	$ -
4.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO CERRADO PORTA CABLE DE 100 X 300 MM. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION, SOPORTES Y DEMAS PARA SU CORRECTA INSTALACION (BLOQUE 1 CAM)	M	62.00	$ 198,091.00	$ 12,281,642.00	62.00	$ 12,281,642.00		$ -		$ -	-	$ -
5	AUDIO Y TECNOLOGIAS												
5.01.	SALONES												
5.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO DE FORMATO 19"-ALTURA ÚTIL 14U-ANCHO 525 CM X FONDO 51 CM X ALTURA 62 CM-CAPACIDAD DE CARGA: 54 KG [120 LBS] INCLUYE ADAPTADOR INHALAMBRICO-INTERFASE USB-ESTÁNDAR IEEE 80211 B / G / N, MICRÓFONO CON FUNCIÓN DE PRIORIDAD, MICROFONO ALAMBRICO-RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 HZ – 16 KHZ-SENSIBILIDAD	UND	15.00	$ 3,109,425.00	$ 46,641,375.00	15.00	$ 46,641,375.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.02	PARLANTE DE TECHO PARA EMPOTRAR-POTENCIA(RMS): 30W/40W-IMPEDANCIA: 8 OHMS-TRANSFORMADOR DE LINEA, 70V/100V AC--RESPUESTA EN FRECUENCIA: 55HZ-18KHZ-SENSIBILIDAD(1W/1M): 86DB	UND	12.00	$ 475,337.00	$ 5,704,044.00	12.00	$ 5,704,044.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.01.03	BANDEJA PARA RACK DE 19 PULGADAS. DESLIZANTE-BANDEJA DE CREMALLERA DESLIZANTE DE 19 / 483 MM CON PUNTOS DE FIJACIÓN DE EQUIPO UNIVERSAL CAPACIDAD DE CARGA RECOMENDADA: 419 LBS / 19KG-LARGO: 20"-ANCHO: 19"-ALTO: 201"-HECHO DE ACERO DURADERO DE / 12 MM	UND	16.00	$ 819,895.00	$ 13,118,320.00	16.00	$ 13,118,320.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.04	TOMA MULTIPLE PROFESIONAL PARA RACK DE 19 PULGADAS	UND	16.00	$ 203,424.00	$ 3,254,784.00	16.00	$ 3,254,784.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.05	METROS DE CABLE POLARIZADO PARA PARLANTES LIBRE DE OXIGENO	M	1,580.00	$ 68,518.00	$ 108,258,440.00	1,580.00	$ 108,258,440.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.06	INTERFASE DE AUDIO-RCA STEREO	UND	16.00	$ 136,151.00	$ 2,178,416.00	16.00	$ 2,178,416.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.07	INTERFASE HDMI-CONECTOR HEMBRA HDMI DE PLACA	UND	15.00	$ 136,151.00	$ 2,042,265.00	15.00	$ 2,042,265.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.08	METROS DE CABLE DE AUDIO BLINDADO PARA INTERFASE	M	68.00	$ 15,297.00	$ 1,040,196.00	68.00	$ 1,040,196.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.09	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE VIDEO BEAM INTERACTIVO-TAMAÑO - DISTANCIA PROYECTADA: 60" A 100" - (354 - 601CM)-NÚMERO DE PIXELES: 1,024,000 PIXELES (1280 X 800) X 3-3,500 LUMENES-TECNOLOGÍA EPSON 3LCD DE 3 CHIPS-RESOLUCIÓN NATIVA: WXGA INCLUYE CABLE HDMI DE (10) METROS	UND	15.00	$ 18,414,241.00	$ 276,213,615.00	15.00	$ 276,213,615.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.10	PARLANTES SOBRE MURO-PARLANTE: 65"(166MM)-TWEETER: 1" (25MM) SILK DOME-RESPUESTA EN FRECUENCIA: 80HZ – 18KHZ-30 WTS-TRANSFORMADOR DE LINEA: 20W-10W-5W/100V	UND	62.00	$ 325,036.00	$ 20,152,232.00	62.00	$ 20,152,232.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.11	CONSOLA DE AUDIO-4 ENTRADAS HÍBRIDAS (XLR O LÍNEA)-4 ENTRADAS ESTÉREO DE LÍNEA-EQ DE 3 BANDAS PARA LOS PRIMEROS 4 CANALES-PROCESADOR DE EFECTOS- 1 AUXILIAR-DIMENSIONES(W X D X H)= 47 X 220 X 242 MM-PESO: 21 KG	UND	1.00	$ 2,132,876.00	$ 2,132,876.00	1.00	$ 2,132,876.00		$ -		$ -	-	$ -
5.01.12	TABLERO ACRÍLICO BORRABLE DE 120 X 240 CM	UND	15.00	$ 590,251.00	$ 8,853,765.00	15.00	$ 8,853,765.00		$ -		$ -	-	$ -
5.02	**SALAS DE JUNTAS**												
5.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE VIDEOCONFERENCIA INCLUYE:CAMARA WEB-MICROFONO-PARLANTE,CABLE HDMI (5) METROS,INTERFASE DE MICROFONOS CON CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	3.00	$ 12,134,182.00	$ 36,402,546.00	3.00	$ 36,402,546.00		$ -		$ -	-	$ -
5.02.02	TV DE 60 PULGADAS-SMARTV-4K-(3) HDMI-(1) USB-WIFI DIRECTO-BLUETOOH, INCLUYE SOPORTE PARA TV DE 60 PULGADAS-AXIAL-EQUALIZABLE	UND	3.00	$ 5,561,674.00	$ 16,685,022.00	3.00	$ 16,685,022.00		$ -		$ -	-	$ -
6	**CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD HUMANA**												
6.01.	**CONTROL DE ACCESO**												
6.01.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROLADOR DE ACCESO EN RED PARA 8 PUERTAS, ESCALABLE CON RANURA PARA EXPANSIÓN CON CAPACIDAD DE CONEXIÓN DE HASTA 12 TARJETAS DE EXPANSIÓN VÍA OSDP	UND	1.00	$ 6,153,199.00	$ 6,153,199.00	1.00	$ 6,153,199.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN RED, 4 PUERTOS WIEGAND, 4 SALIDAS DE RELEVO, 8 ENTRADAS DE CONTACTO SECO EN CUARTO ELECTRICO	UND	1.00	$ 2,955,513.00	$ 2,955,513.00	1.00	$ 2,955,513.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXPANSOR PARA CONTROLADOR DE ACCESO EN RED, 4 PUERTOS WIEGAND, 4 SALIDAS DE RELEVO, 8 ENTRADAS DE CONTACTO SECO DENTRO DE TORNIQUETE	UND	4.00	$ 2,334,522.00	$ 9,338,088.00	4.00	$ 9,338,088.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA DOBLE	UND	2.00	$ 2,380,545.00	$ 4,761,090.00	2.00	$ 4,761,090.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO PARA PUERTA SENCILLA	UND	1.00	$ 1,635,054.00	$ 1,635,054.00	1.00	$ 1,635,054.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.06	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO TIPO TORNIQUETE BIDIRECCIONAL EN ACERO INOXIDABLE CON BRAZO ABATIBLE Y ESPACIO FÍSICO PARA INTEGRACIÓN SMART CARD Y PANTALLA CON PICTOGRAMA TRICOLOR	UND	6.00	$ 17,629,641.00	$ 105,777,846.00	6.00	$ 105,777,846.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.07	SUMINISTRO E INSTALACION CONTROL DE ACCESO TIPO PEDESTAL PARA DISCAPACITADOS CON INTEGRACIÓN SMART CARD Y PANTALLA CON PICTOGRAMA TRICOLOR, BLOQUEO DE GIRO	UND	4.00	$ 23,164,097.00	$ 92,656,388.00	4.00	$ 92,656,388.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION LECTOR ENRROLADOR DE TARJETAS RFID 13,56MHZ, INTERFACE USB	UND	2.00	$ 853,261.00	$ 1,706,522.00	2.00	$ 1,706,522.00		$ -		$ -	-	$ -
6.01.09	PROGRAMACION E INTEGRACION DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	UND	1.00	$ 5,937,821.00	$ 5,937,821.00	1.00	$ 5,937,821.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.	**SEGURIDAD HUMANA**												

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	$ 4,905,043,226.00
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.02.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO SALIDA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE DERECHA FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	19.00	$ 74,305.00	$ 1,411,795.00	19.00	$ 1,411,795.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO SALIDA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE IZQUIERDA FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	17.00	$ 74,305.00	$ 1,263,185.00	17.00	$ 1,263,185.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE IZQUIERDA FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	6.00	$ 74,305.00	$ 445,830.00	6.00	$ 445,830.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.04	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE DERECHA FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	4.00	$ 74,305.00	$ 297,220.00	4.00	$ 297,220.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.05	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE RUTA DE EVACUACIÓN FOTOLUMINISCENTE (INDICACION DE PISO DE DESCARGA) FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	3.00	$ 74,305.00	$ 222,915.00	3.00	$ 222,915.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.06	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO FOTOLUMINISCENTE INDICACION PISO ACTUAL Y PISO DE DESCARGA) FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	6.00	$ 74,305.00	$ 445,830.00	6.00	$ 445,830.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.07	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE PUNTO DE ENCUENTRO PEDESTAL DOBLE CARA (PICTOGRAMA BLANCO SOBRE FONDO VERDE)	UND	4.00	$ 306,381.00	$ 1,225,524.00	4.00	$ 1,225,524.00		$ -		$ -	-	$ -
6.02.08	SUMINISTRO Y MONTAJE DE AVISO DE TOMA FIJA PARA BOMBEROS CLASE I FOTOLUMINISCENCIA PROBADA DE MÍNIMO 4 HORAS	UND	9.00	$ 74,305.00	$ 668,745.00	9.00	$ 668,745.00		$ -		$ -	-	$ -
7	SISTEMA DE DETECCION Y RED CONTRAINCENDIO												
7.01	SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO												
7.01.01	SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	201.00	$ 345,173.00	$ 69,382,773.00	201.00	$ 69,382,773.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.02	SALIDA PARA SIRENA CON ESTROBO (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	7.00	$ 313,436.00	$ 2,194,052.00	7.00	$ 2,194,052.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.03	SALIDA PARA ALTAVOZ ESTROBOSCÓPICO DE PARED (IncluyeTuberia EMT, Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	72.00	$ 313,436.00	$ 22,567,392.00	72.00	$ 22,567,392.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.04	SALIDA PARA ESTACION MANUAL DE ALARMA (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	19.00	$ 313,436.00	$ 5,955,284.00	19.00	$ 5,955,284.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.05	SALIDA PARA MODULO DE CONTROL SUPERVISADO (Incluye Tuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	6.00	$ 269,950.00	$ 1,619,700.00	6.00	$ 1,619,700.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.06	SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO UNA ENTRADA (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	3.00	$ 269,950.00	$ 809,850.00	3.00	$ 809,850.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.07	SALIDA PARA MODULO DE MONITOREO DOS ENTRADAS (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	13.00	$ 269,950.00	$ 3,509,350.00	13.00	$ 3,509,350.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.08	SALIDA PARA MODULO DE RELEVO DE CONTROL (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	17.00	$ 269,950.00	$ 4,589,150.00	17.00	$ 4,589,150.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.09	SALIDA PARA FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADORES (IncluyeTuberia EMT", Cajas de conexión, accesorios, cableado)	UND	3.00	$ 291,543.00	$ 874,629.00	3.00	$ 874,629.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO INTELIGENTE	UND	197.00	$ 339,010.00	$ 66,784,970.00	197.00	$ 66,784,970.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR DE HUMO TERMICO INTELIGENTE	UND	4.00	$ 291,684.00	$ 1,166,736.00	4.00	$ 1,166,736.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.12	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA CON ESTROBO	UND	7.00	$ 528,314.00	$ 3,698,198.00	7.00	$ 3,698,198.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.13	SUMINISTRO Y MONTAJE ALTAVOZ ESTROBOSCÓPICO DE PARED	UND	72.00	$ 651,362.00	$ 46,898,064.00	72.00	$ 46,898,064.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.14	SUMINISTRO Y MONTAJE ESTACION MANUAL DE ALARMA	UND	19.00	$ 784,632.00	$ 14,908,008.00	19.00	$ 14,908,008.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.15	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE CONTROL SUPERVISADO	UND	6.00	$ 310,330.00	$ 1,861,980.00	6.00	$ 1,861,980.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.16	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE MONITOREO UNA ENTRADA	UND	3.00	$ 234,608.00	$ 703,824.00	3.00	$ 703,824.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.17	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE MONITOREO DOS ENTRADAS	UND	13.00	$ 338,725.00	$ 4,403,425.00	13.00	$ 4,403,425.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.18	SUMINISTRO Y MONTAJE MODULO DE RELEVO DE CONTROL	UND	17.00	$ 589,595.00	$ 10,023,115.00	17.00	$ 10,023,115.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.19	SUMINISTRO Y MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADOR TIPO 1	UND	1.00	$ 8,365,655.00	$ 8,365,655.00	1.00	$ 8,365,655.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.20	SUMINISTRO Y MONTAJE FUENTE DE ALIMENTACION AUXILIAR Y AMPLIFICADOR TIPO 2	UND	2.00	$ 9,596,130.00	$ 19,192,260.00	2.00	$ 19,192,260.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.21	SUMINISTRO Y MONTAJE TECLADO REMOTO	UND	1.00	$ 2,583,963.00	$ 2,583,963.00	1.00	$ 2,583,963.00		$ -		$ -	-	$ -
7.01.22	SUMINISTRO Y MONTAJE PANEL DE CONTROL FACP CON AUDIOEVACUACION	UND	1.00	$ 35,763,575.00	$ 35,763,575.00	1.00	$ 35,763,575.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.01.23	PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRAINCENDIO	UND	1.00	$ 8,689,517.00	$ 8,689,517.00	1.00	$ 8,689,517.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02	SISTEMA EXTINCION CONTRAINCENDIO												
7.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC DR18 (235 PSI) Ø6" - AWWA C900, UL Y FM (incluye accesorios y soportes)	M	110.00	$ 868,220.00	$ 95,504,200.00	110.00	$ 95,504,200.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.02	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA PVC DR18 (235 PSI) Ø4" - AWWA C900, UL Y FM (incluye accesorios y soportes)	M	27.00	$ 783,190.00	$ 21,146,130.00	27.00	$ 21,146,130.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.03	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø6" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	2.00	$ 359,786.00	$ 719,572.00	2.00	$ 719,572.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.04	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 4" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	198.70	$ 285,119.00	$ 56,653,145.00	198.70	$ 56,653,145.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.05	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø2½" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	365.82	$ 187,179.00	$ 68,473,822.00	365.82	$ 68,473,822.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.06	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 10 Ø2 " - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	37.00	$ 157,213.00	$ 5,816,881.00	37.00	$ 5,816,881.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 4" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	12.00	$ 371,638.00	$ 4,462,056.00	12.00	$ 4,462,056.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.08	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø2½" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	5.00	$ 278,880.00	$ 1,394,400.00	5.00	$ 1,394,400.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.09	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø2" - ASTM A795 (incluye accesorios y soportes)	M	5.00	$ 195,404.00	$ 977,020.00	5.00	$ 977,020.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.10	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1½" - ASTM A53 (incluye accesorios y soportes)	M	40.00	$ 176,203.00	$ 7,048,120.00	40.00	$ 7,048,120.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.11	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1¼" - ASTM A53 (incluye accesorios y soportes)	M	213.67	$ 143,188.00	$ 30,595,194.00	213.67	$ 30,595,194.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.12	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ACERO CON COSTURA SCH 40 Ø1" - ASTM A53 (incluye accesorios y soportes)	M	1,212.80	$ 90,190.00	$ 109,382,432.00	1,212.80	$ 109,382,432.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.13	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR TIPO PENDENT K-5,6, NPT ½", COBERTURA ESTANDAR, TEMP: 155°f RESPUESTA RAPIDA, ACABADO, 250 PSI - UL/FM + ESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT +PORTAESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT(incluye accesorios y soportes)	UND	441.00	$ 97,059.00	$ 42,803,019.00	441.00	$ 42,803,019.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RISER DE ALIMENTACIÓN - ROCIADORES Ø2½" (SENSOR DE FLUJO Ø2½" - UL/FM + VALVULA BUTERBALL ROSCADA SUPERVISADA ELECTRICAMENTE - UL/FM Ø2½" + VALVULA CHEQUE RANURADA HORIZONTAL Ø2½" - UL/FM) (incluye accesorios y soportes)	UND	3.00	$ 2,469,511.00	$ 7,408,533.00	3.00	$ 7,408,533.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA RANURADA SUPERVISADA ELECTRICAMENTE - UL/FM Ø4" (incluye accesorios y soportes)	UND	3.00	$ 1,419,127.00	$ 4,257,381.00	3.00	$ 4,257,381.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA ROSCADA CLASE 150 Ø2" - UL FM O ASME (incluye accesorios y soportes)	UND	3.00	$ 442,320.00	$ 1,326,960.00	3.00	$ 1,326,960.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DRENAJE Y PRUEBA Ø1¼" FACTOR K: 5,6 (incluye accesorios y soportes)	UND	3.00	$ 1,087,295.00	$ 3,261,885.00	3.00	$ 3,261,885.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DESAIREADORA ROSCADA Ø½" + VALVULA COMPUERTA BRONCE ROSCADA CLASE 150 Ø½" - APROBADO) (incluye accesorios y soportes)	UND	6.00	$ 1,482,338.00	$ 8,894,028.00	6.00	$ 8,894,028.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN EN ÁNGULO ACABADO EN BRONCE NPT/NHS Ø2½" - UL / FM (NO RESTRICTORA) (incluye accesorios y soportes)	UND	9.00	$ 1,107,759.00	$ 9,969,831.00	9.00	$ 9,969,831.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO CON GLICERINA LISTADO CARATULA 2½" / 0 A 300 PSI (incluye accesorios y soportes)	UND	6.00	$ 242,103.00	$ 1,452,618.00	6.00	$ 1,452,618.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
		PLAZO INICIAL	16 MESES
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.02.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA DOBLE LLAVE EN BRONCE Ø 4" X 2 ½" x 2½" (+PORTAESCUDO PARA ROCIADORES TIPO PENDENT) (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 2,389,051.00	$ 2,389,051.00	1.00	$ 2,389,051.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE I (77 x 77 x 24 cms) (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 2,243,532.00	$ 2,243,532.00	1.00	$ 2,243,532.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MANGUERAS CLASE III (99 x 77 x 24 cms) (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 3,288,246.00	$ 3,288,246.00	1.00	$ 3,288,246.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL Y /O LONGITUDINAL Ø2½" Y Ø2 - LOOS & CO (CABLE GOLD) (incluye accesorios y soportes)	UND	64.00	$ 293,467.00	$ 18,781,888.00	64.00	$ 18,781,888.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE TRANSVERSAL Y /O LONGITUDINAL Ø4" - LOOS & CO (CABLE GOLD) (incluye accesorios y soportes)	UND	29.00	$ 306,348.00	$ 8,884,092.00	29.00	$ 8,884,092.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE SISMO-RESISTENTE 4 VIAS Ø2½ Y Ø4" (incluye accesorios y soportes)	UND	18.00	$ 503,229.00	$ 9,058,122.00	18.00	$ 9,058,122.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.27	SUMINISTRO DE BOMBA DIESEL TURBINA VERTICAL 250 GPM @ 130 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE 5 GPM @ 140 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) TANQUE DE ACPM (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE) DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION BATERIA P/BOMBA DIESEL TIPO D 12V 1500AMP DE ARRANQUE (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 358,720,641.64	$ 358,720,642.00	1.00	$ 358,720,642.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.28	INSTALACION DE BOMBA DIESEL TURBINA VERTICAL 250 GPM @ 130 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) BOMBA JOCKEY SUMERGIBLE 5 GPM @ 140 PSI DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA BOMBA (PLACAS, SOPORTES, ACCESORIOS Y DEMAS) TANQUE DE ACPM (VERIFICAR CAPACIDAD CON FABRICANTE) DEBE INCLUIR TODOS LOS COMPONENTES PARA EL LLENADO Y LA MEDICION BATERIA P/BOMBA DIESEL TIPO D 12V 1500AMP DE ARRANQUE (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 66,550,283.00	$ 66,550,283.00	1.00	$ 66,550,283.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXHOSTO (incluye accesorios y soportes)	UND	1.00	$ 697,678.00	$ 697,678.00	1.00	$ 697,678.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LBS (4A 80B:C o similar) + GABINETE PARA EXTINTOR PORTÁTIL DIMENSIONES: 650 mm x 300 mm x 250 ACERO LAMINADO EN FRIÓ 1 mm PINTURA ELECTROSTÁTICA O SIMILAR INCLUIR VIDRIO DE SEGURIDAD (incluye accesorios y soportes)	UND	21.00	$ 397,168.00	$ 8,340,528.00	21.00	$ 8,340,528.00		$ -		$ -	-	$ -
7.02.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTINTOR DIOXIDO DE CARBONO CO2 - 15 LBS (10B:C o similar) (incluye accesorios y soportes)	UND	7.00	$ 1,146,655.00	$ 8,026,585.00	7.00	$ 8,026,585.00		$ -		$ -	-	$ -
8	CUARTOS TECNICOS Y CAFETERIA												
8.01	ADECUACION DEL TERRENO CIMENTACION												
8.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	207.18	$ 34,411.00	$ 7,129,271.00	207.18	$ 7,129,271.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	207.18	$ 22,969.00	$ 4,758,717.00	207.18	$ 4,758,717.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.03	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	358.94	$ 81,203.00	$ 29,147,005.00	358.94	$ 29,147,005.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	84.64	$ 11,844.00	$ 1,004,845.00	84.64	$ 1,004,845.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	18.42	$ 129,507.00	$ 2,385,519.00	18.42	$ 2,385,519.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	78.58	$ 88,636.00	$ 6,965,017.00	78.58	$ 6,965,017.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.07	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	2.31	$ 534,844.00	$ 1,235,490.00	2.31	$ 1,235,490.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ ZAPATAS	KG	174.40	$ 10,232.00	$ 1,784,461.00	174.40	$ 1,784,461.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.09	CONCRETO DE 3000PSI (21mpa) PARA ZAPATAS	M3	16.12	$ 885,906.00	$ 14,280,805.00	16.12	$ 14,280,805.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.01.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ VIGA CIMENTACIÓN	KG	2,026.91	$ 10,232.00	$ 20,739,343.00		2,026.91	$ 20,739,343.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.11	VIGA DE CIMENTACION DE 025 MTS X 030 MTS 3000 PSI (21mpa)	M	165.28	$ 112,783.00	$ 18,640,774.00		165.28	$ 18,640,774.00		$ -		$ -	-	$ -
8.01.12	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 010MINCLUYE MALLA DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y SELLO	M2	280.65	$ 163,647.00	$ 45,927,531.00		280.65	$ 45,927,531.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES													
8.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA COLUMNAS	KG	710.31	$ 10,232.00	$ 7,267,892.00		710.31	$ 7,267,892.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.02	COLUMNAS DE 025 MTS X 025 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	31.60	$ 101,052.00	$ 3,193,243.00		31.60	$ 3,193,243.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA VIGAS	KG	5,952.13	$ 10,232.00	$ 60,902,194.00		5,952.13	$ 60,902,194.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.04	VIGA SUPERIOR DE 0.25MTS X 0.30MTS (21MPA) INCLUYE ENCOFRADO, CURADO Y DESENCOFRADO	M	84.60	$ 157,712.00	$ 13,342,435.00		84.60	$ 13,342,435.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.05	VIGA CULATA DE 015 MTS X 012 MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 ACEROS 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020 MTS	M	74.90	$ 88,724.00	$ 6,645,428.00		74.90	$ 6,645,428.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.06	CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 061M ESPESOR DE PLACA H=010M INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO	M	27.15	$ 254,643.00	$ 6,913,557.00		27.15	$ 6,913,557.00		$ -		$ -	-	$ -
8.02.07	PEDESTAL DE 060m X 060m x 105m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)ACERO DE REFUERZO, PLATINA DE CONEXION Y ANCLAJES	UND	12.00	$ 937,052.00	$ 11,244,624.00		12.00	$ 11,244,624.00		$ -		$ -	-	$ -
8.03	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMINETO													
8.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M COLOR BLANCO Y PEGA CON MORTERO 1:3. INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO	M2	299.81	$ 161,779.00	$ 48,502,962.00		299.81	$ 48,502,962.00		$ -		$ -	-	$ -
8.03.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M COLOR GRIS Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO	M2	4.10	$ 130,224.00	$ 533,918.00		4.10	$ 533,918.00		$ -		$ -	-	$ -
8.03.03	VIGA DINTEL DE 012m x 020m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020m	M	93.70	$ 91,314.00	$ 8,556,122.00		93.70	$ 8,556,122.00		$ -		$ -	-	$ -
8.03.04	VIGA CINTA DE 012m x 015m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020m	M	75.45	$ 88,724.00	$ 6,694,226.00		75.45	$ 6,694,226.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04	PISOS ENCHAPES Y ACABADOS													
8.04.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:4 E=004 MTS	M2	133.00	$ 79,574.00	$ 10,583,342.00		133.00	$ 10,583,342.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.02	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 030X030M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	15.75	$ 158,591.00	$ 2,497,808.00		15.75	$ 2,497,808.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	29.34	$ 46,902.00	$ 1,376,105.00		29.34	$ 1,376,105.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.04	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M	10.80	$ 23,573.00	$ 254,588.00		10.80	$ 254,588.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.05	ENCHAPE PARED BLANCA DE 045m x 030m	M2	29.70	$ 119,741.00	$ 3,556,308.00		29.70	$ 3,556,308.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.06	SUMINITRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (VIN) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES	M	10.80	$ 8,845.00	$ 95,526.00		10.80	$ 95,526.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.07	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR IGUAL A 300M (H<=300M)	M2	17.30	$ 22,393.00	$ 387,399.00		17.30	$ 387,399.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS	M2	17.30	$ 17,406.00	$ 301,124.00		17.30	$ 301,124.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.09	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	15.75	$ 112,559.00	$ 1,772,804.00		15.75	$ 1,772,804.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.10	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=010 MTS,ANCHO:060M INCLUYE: REFUERZO EN VARILLAS 3/8" @ 015 MTS Y ACABADO EN GRANITO	M	3.70	$ 287,431.00	$ 1,063,495.00		3.70	$ 1,063,495.00		$ -		$ -	-	$ -
8.04.11	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=010 MTS,ANCHO:030M INCLUYE: REFUERZO EN VARILLAS3/8" @ 015 MTS ACABADO ESMALTADO	M	1.90	$ 123,011.00	$ 233,721.00		1.90	$ 233,721.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05	CARPINTERIA METALICA													
8.05.01	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 100M ANCHO X 210 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 1,338,352.00	$ 2,676,704.00		2.00	$ 2,676,704.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.05.02	S/I DE PUERTA, TIPO (P-09) EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL DIMENSIONES 166M DE ANCHO X 210 M DE ALTO HOJA TIPO PERSIANA, PLEGABLES DE TRES CUERPOS DE 038M X 205M SEGUN DISEÑO INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 5,168,372.00	$ 5,168,372.00	1.00	$ 5,168,372.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05.03	S/I DE PUERTA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO NATURAL TIPO (P-13) DIMENSIONES 220 M ANCHOX 210 M DE ALTO 2 HOJAS TIPO PERSIANAS PLEGABLES DE DOS CUERPOS DE 037MX205M SEGÚN DISEÑO INCLUYE MARCO EN ALUMINIO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 5,271,078.00	$ 10,542,156.00	2.00	$ 10,542,156.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05.04	S/I PERSIANA ENROLLABLE, TIPO V-14, DIMENSIONES 188X120M, INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTÓN METÁLICO, ARGOLLAS PARA FIJACIÓN DE CANDADOS, BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO	UND	1.00	$ 1,866,732.00	$ 1,866,732.00	1.00	$ 1,866,732.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05.05	S/I VENTANA CORREDIZA, TIPO V-16, DIMENSIONES: 299M ANCHO X 045M ALTO, DOS HOJAS FIJAS Y UNA HOJA CORREDIZA CON MARCO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y VIDRIO NATURAL INCLUYE SEGURO MEDIALUNA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	2.00	$ 764,140.00	$ 1,528,280.00	2.00	$ 1,528,280.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05.06	S/I VENTANA FIJA, TIPO V-39, DIMENSIONES 141M ANCHO X 141M ALTO, CUERPO FIJO EN ALUMINIO NATURAL PERFIL 744 Y PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 1,644,571.00	$ 1,644,571.00	1.00	$ 1,644,571.00		$ -		$ -	-	$ -
8.05.07	S/I DE VENTANAS PROTECTORAS EN TUBO 1/2 X 1/2 CAL18 Y TUBO DE 3/4X3/4 CAL 18 INCLUYE PINTURA BASE Y ESMALTE COLOR A ELECCION	M2	11.05	$ 329,010.00	$ 3,635,561.00	11.05	$ 3,635,561.00		$ -		$ -	-	$ -
8.06	**REVESTIMIENTO DE FACHADA Y SISTEMAS DE PERGOLAS**												
8.06.01	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE SISTEMA DE PERGOLAS EN PERFIL METALICO SEGUN DISEÑO ACABADO PINTURA ANTICORROSIVA CAFETERIA	KG	2,576.50	$ 24,022.00	$ 61,892,683.00	2,576.50	$ 61,892,683.00		$ -		$ -	-	$ -
8.06.02	S/ I CIELO RASO EN ALUZINC 04MM, ACABADO LISO CON PINTURA POLIESTER HORNEABLE COLOR MADERA POR UNA CARA INCLUYE PORTA PANELES	M2	136.85	$ 587,228.00	$ 80,362,152.00	136.85	$ 80,362,152.00		$ -		$ -	-	$ -
8.06.03	S/I REVESTIMIENTO COMPUESTO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO CON NUCLEO EN POLIETILENO INCOMBUSTIBLE E=4MM INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	213.40	$ 437,544.00	$ 93,371,890.00	213.40	$ 93,371,890.00		$ -		$ -	-	$ -
8.06.04	COLUMNAS EN PERFIL PTE 200X200 (5MM) INCLUYE ANCLAJE, PERNOS DE FIJACION, PINTURA ANTICORROSIVA	M	50.40	$ 383,477.00	$ 19,327,241.00	50.40	$ 19,327,241.00		$ -		$ -	-	$ -
8.07	**CUBIERTA**												
8.07.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	691.80	$ 20,768.00	$ 14,367,302.00	691.80	$ 14,367,302.00		$ -		$ -	-	$ -
8.07.02	S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA	M	8.90	$ 14,403.00	$ 128,187.00	8.90	$ 128,187.00		$ -		$ -	-	$ -
8.07.03	S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (036mm) x600mts	M2	257.40	$ 107,902.00	$ 27,773,975.00	257.40	$ 27,773,975.00		$ -		$ -	-	$ -
8.07.04	S/I CANALETAS DE AGUAS LLUVIAS DE 030m x 030m EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACCESORIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO	M	40.70	$ 95,052.00	$ 3,868,616.00	40.70	$ 3,868,616.00		$ -		$ -	-	$ -
8.08	**IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL**												
8.08.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS PARA CUBIERTAS	M2	17.95	$ 77,270.00	$ 1,386,997.00	17.95	$ 1,386,997.00		$ -		$ -	-	$ -
8.08.02	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	26.38	$ 70,878.00	$ 1,869,762.00	26.38	$ 1,869,762.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**												
8.09.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4.32	$ 34,411.00	$ 148,656.00	4.32	$ 148,656.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.10	$ 88,636.00	$ 363,408.00	4.10	$ 363,408.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.03	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P	UND	3.00	$ 36,007.00	$ 108,021.00	3.00	$ 108,021.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.09.04	S/I TUBERIA PRESION RDE 11 DE 3/4"	M	12.00	$ 16,380.00	$ 196,560.00		12.00	$ 196,560.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.05	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1"	M	6.00	$ 18,215.00	$ 109,290.00		6.00	$ 109,290.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.06	S/I TEE DE 3/4" PVC-P SCH 40	UND	2.00	$ 9,341.00	$ 18,682.00		2.00	$ 18,682.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.07	S/I TEE DE 1" PVC-P SCH 40	UND	1.00	$ 13,882.00	$ 13,882.00		1.00	$ 13,882.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.08	S/I CODO 90° DE 3/4" PVC-P SCH 40	UND	4.00	$ 8,700.00	$ 34,800.00		4.00	$ 34,800.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.09	S/I CODO 90° DE 1" PVC-P SCH 40	UND	3.00	$ 12,652.00	$ 37,956.00		3.00	$ 37,956.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.10	S/I VALVULA DE CIERRE 3/4"	UND	2.00	$ 28,294.00	$ 56,588.00		2.00	$ 56,588.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.11	S/I VALVULA DE CIERRE 1"	UND	2.00	$ 41,813.00	$ 83,626.00		2.00	$ 83,626.00		$ -		$ -	-	$ -
8.09.12	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,611,678.00	$ 1,611,678.00		1.00	$ 1,611,678.00		$ -		$ -	-	$ -
8.1	**APARATOS SANITARIOS**													
8.10.01	EXCAVACION MANUAL	M3	14.40	$ 34,411.00	$ 495,518.00		14.40	$ 495,518.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13.68	$ 88,636.00	$ 1,212,540.00		13.68	$ 1,212,540.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.03	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP	UND	1.00	$ 48,525.00	$ 48,525.00		1.00	$ 48,525.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP	UND	2.00	$ 57,679.00	$ 115,358.00		2.00	$ 115,358.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.05	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L-TP	M	12.00	$ 37,703.00	$ 452,436.00		12.00	$ 452,436.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.06	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 3" L-TP	M	6.00	$ 48,834.00	$ 293,004.00		6.00	$ 293,004.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.07	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L-TP	M	36.00	$ 62,120.00	$ 2,236,320.00		36.00	$ 2,236,320.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.08	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm) - CORRUGADA	M	6.00	$ 76,226.00	$ 457,356.00		6.00	$ 457,356.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.09	S/I YEE DE 2" PVC-S	UND	3.00	$ 23,837.00	$ 71,511.00		3.00	$ 71,511.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.10	S/I YEE DE 3" PVC-S	UND	1.00	$ 37,597.00	$ 37,597.00		1.00	$ 37,597.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.11	S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S	UND	5.00	$ 16,161.00	$ 80,805.00		5.00	$ 80,805.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.12	S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S	UND	1.00	$ 20,270.00	$ 20,270.00		1.00	$ 20,270.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.13	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	3.00	$ 550,053.00	$ 1,650,159.00		3.00	$ 1,650,159.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.14	TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO	UND	2.00	$ 559,929.00	$ 1,119,858.00		2.00	$ 1,119,858.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.15	ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	UND	1.00	$ 1,614,839.00	$ 1,614,839.00		1.00	$ 1,614,839.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.16	S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO. INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN	UND	2.00	$ 748,789.00	$ 1,497,578.00		2.00	$ 1,497,578.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.17	S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	1.00	$ 65,473.00	$ 65,473.00		1.00	$ 65,473.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.18	S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"	UND	1.00	$ 19,518.00	$ 19,518.00		1.00	$ 19,518.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.19	S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 531,593.00	$ 531,593.00		1.00	$ 531,593.00		$ -		$ -	-	$ -
8.10.20	S/I DE LAVATRAPEROS DE 050M X 050M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 407,871.00	$ 407,871.00		1.00	$ 407,871.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11	**INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS**													
8.11.01	EXCAVACION MANUAL	M3	19.20	$ 34,411.00	$ 660,691.00		19.20	$ 660,691.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	18.24	$ 88,636.00	$ 1,616,721.00		18.24	$ 1,616,721.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.03	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L-TP	M	50.00	$ 62,120.00	$ 3,106,000.00		50.00	$ 3,106,000.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.04	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm) - CORRUGADA	M	30.00	$ 76,226.00	$ 2,286,780.00		30.00	$ 2,286,780.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.05	S/I CODO DE 4" X 90° PVC-S	UND	5.00	$ 34,027.00	$ 170,135.00		5.00	$ 170,135.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.06	S/I REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 5X4" PVC	UND	5.00	$ 32,847.00	$ 164,235.00		5.00	$ 164,235.00		$ -		$ -	-	$ -
8.11.07	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	4.00	$ 550,053.00	$ 2,200,212.00		4.00	$ 2,200,212.00		$ -		$ -	-	$ -
9	**JUEGOS INFANTILES**													
9.01	EXCAVACION MANUAL	M3	86.71	$ 34,411.00	$ 2,983,778.00		86.71	$ 2,983,778.00		$ -		$ -	-	$ -
9.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	112.72	$ 22,969.00	$ 2,589,066.00		112.72	$ 2,589,066.00		$ -		$ -	-	$ -
9.03	PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=015M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	722.56	$ 193,711.00	$ 139,967,820.00		722.56	$ 139,967,820.00		$ -		$ -	-	$ -
9.04	S/I DE SUPERFCIE AMORTIGUADORA DE IMPACTOS FABRICADA IN SITU ACABADO EN CAUCHO ACABADO EN COLOR ESPESOR 1CM Y CAPA DE RELLENO EN SDR 11 CMINCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	722.56	$ 703,430.29	$ 508,270,592.00		722.56	$ 508,270,592.00		$ -		$ -	-	$ -
9.05	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO, INCLUYE TRES DESLIZADEROS SENCILLOS, DOS TOBOGANES CUBIERTOS, PUENTE, TUBO DE ASCENSO Y DESCENSO, ESCALERAS DE ASCENSO Y DESCENSO Y PLATAFORMAS DE ESTACIONES ÁREA SEGURA DE 12.2 M X 8.0 M Y ALTURA DE 6.0 M	UND	1.00	$ 198,625,246.00	$ 198,625,246.00		1.00	$ 198,625,246.00		$ -		$ -	-	$ -
9.06	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO COLUMPIOS PARA PMR DE 369 X 2.01M Y ALTURA DE 2.28 M (DOS PUESTOS) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 31,986,506.00	$ 31,986,506.00		1.00	$ 31,986,506.00		$ -		$ -	-	$ -
9.07	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO TRIQUI DE 0.88 M X 0.16M Y ALTURA DE 1.42M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	2.00	$ 8,977,817.00	$ 17,955,634.00		2.00	$ 17,955,634.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
		PLAZO INICIAL	16 MESES		
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00	
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE	9/09/2022
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA	31/01/2023
		% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023	
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA				

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.08	S/I DE JUEGO INFANTIL TIPO BALANCIN DOBLE RESORTADO DE 312 X 054M Y ALTURA DE 082MTS	UND	2.00	$ 4,931,891.00	$ 9,863,782.00	2.00	$ 9,863,782.00		$ -		$ -	-	$ -
9.09	S/I DE JUEGOS INFANTIL TIPO, INCLUYE TRES DESLIZADEROS SENCILLOS, DESLIZADERO ESPIRAL, PASAMANOS, PUENTE, ESCALERAS DE ASCENSO Y DESCENSO, PLATAFORMAS DE ESTACIONES ÁREA SEGURA DE 11,4 M X 9,9 M Y ALTURA DE 4,3 M	UND	1.00	$ 100,385,989.00	$ 100,385,989.00	1.00	$ 100,385,989.00		$ -		$ -	-	$ -
9.10	S/I JUEGO INFANTIL TIPO ESFERA EN MALLA PARA ESCALAR DE 325M X 325M Y ALTURA DE 350M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 146,588,555.00	$ 146,588,555.00	1.00	$ 146,588,555.00		$ -		$ -	-	$ -
10	GIMNASIO AL AIRE LIBRE												
10.01	PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=015M INCLUYE ACERO DE REFUERZO JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	314.84	$ 193,711.00	$ 60,987,971.00	314.84	$ 60,987,971.00		$ -		$ -	-	$ -
10.02	RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE	M2	314.84	$ 173,262.00	$ 54,549,808.00	314.84	$ 54,549,808.00		$ -		$ -	-	$ -
10.03	S/I GIMNASIOS AL AIRE LIBRE DE 10 ELEMENTOS MECANICOS (SKY, REMO, SILLA PARQUE ROTACION,BICI ESTATICA, ESCALADOR,JINETE, BICICLETA CON CARGADOR, BANCA ABDOMEN CRONCH INCLINADA ,MULTIFUNCIONAL PMR 2 USUARIOS Y MULTIFUNCIONAL 1 TORRES 4 USUARIOS)	UND	1.00	$ 121,864,626.00	$ 121,864,626.00	1.00	$ 121,864,626.00		$ -		$ -	-	$ -
10.04	S/I MESA DE PING PONG EN CONCRETO, 120M X 240M ACABADO EN GRANITO PULIDO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	2.00	$ 10,845,085.00	$ 21,690,170.00	2.00	$ 21,690,170.00		$ -		$ -	-	$ -
10.05	S/I DE MESA DE AJEDREZ ACABADO EN CONCRETO AVANZADO DE 07X07M Y CUATRO DADOS SOLIDOS EN CONCRETO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	3.00	$ 4,838,654.00	$ 14,515,962.00	3.00	$ 14,515,962.00		$ -		$ -	-	$ -
11	CANCHAS POLIDEPORTIVAS												
11.01	ESCENARIO DEPORTIVO												
11.01.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR	M3	211.58	$ 11,186.00	$ 2,366,734.00	211.58	$ 2,366,734.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	275.05	$ 22,969.00	$ 6,317,623.00	275.05	$ 6,317,623.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.03	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO	M3	158.69	$ 143,623.00	$ 22,791,534.00	158.69	$ 22,791,534.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS	KG	6,072.46	$ 10,232.00	$ 62,133,411.00	6,072.46	$ 62,133,411.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.05	PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=015M INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	1,057.92	$ 147,298.00	$ 155,829,500.00	1,057.92	$ 155,829,500.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.06	RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS, INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE	M2	1,057.92	$ 173,262.00	$ 183,297,335.00	1,057.92	$ 183,297,335.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.07	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA PARAS LAS DIFERENTES DISCIPLINAS EN CANCHA MULTIFUNCIONAL	M	662.72	$ 8,816.00	$ 5,842,540.00	662.72	$ 5,842,540.00		$ -		$ -	-	$ -
11.01.08	S/I PORTERÍAS MULTIFUNCIONALES FIJAS (PAR)	UND	2.00	$ 6,113,771.00	$ 12,227,542.00	2.00	$ 12,227,542.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL												
11.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL	M3	54.56	$ 34,411.00	$ 1,877,454.00	54.56	$ 1,877,454.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	100.18	$ 22,969.00	$ 2,301,034.00	100.18	$ 2,301,034.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PILOTES	KG	12,117.60	$ 10,232.00	$ 123,987,283.00	12,117.60	$ 123,987,283.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.04	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE PERFORACION SEGUN DISEÑO	M3	25.50	$ 1,355,118.00	$ 34,555,509.00	25.50	$ 34,555,509.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	KG	2,003.72	$ 10,232.00	$ 20,502,063.00	2,003.72	$ 20,502,063.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.06	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 040X040 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M	136.40	$ 160,855.00	$ 21,941,986.00	136.40	$ 21,941,986.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.07	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4.50	$ 1,142,941.00	$ 5,143,235.00	4.50	$ 5,143,235.00		$ -		$ -	-	$ -
11.02.08	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (36MM) ALTURA 500M Y MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)	M	136.40	$ 2,409,156.94	$ 328,609,007.00	136.40	$ 328,609,007.00		$ -		$ -	-	$ -

Alcaldía de MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
12	CANCHA DE TENIS												
12.01	ESCENARIO DEPORTIVO												
12.01.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR	M3	168.49	$ 11,186.00	$ 1,884,729.00	168.49	$ 1,884,729.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	219.04	$ 22,969.00	$ 5,031,130.00	219.04	$ 5,031,130.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.03	RELLENO CON MATERIAL SUBBASE GRANULAR CLASE C COMPACTADO	M3	126.37	$ 143,623.00	$ 18,149,639.00	126.37	$ 18,149,639.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.04	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PLACAS	KG	4,835.64	$ 10,232.00	$ 49,478,268.00	4,835.64	$ 49,478,268.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.05	PLACA EN CONCRETO 21MPA, e=015M INCLUYE JUNTAS DE DILATACION Y SELLO	M2	842.45	$ 147,296.00	$ 124,091,200.00	842.45	$ 124,091,200.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.06	RECUBRIMIENTO PISO SINTETICO EN RESINAS 100% ACRILICAS INCLUYE LAVADO CON ACIDO FOSFORICO, CAPA IMPRIMANTE SINTETICA ACRILICA CON ARENILLA DE CUARZO Y CAPA DE SELLADO SINTETICA ACRILICA Y LATEX, COLOR PROTECTORA RESISTENTE A FACTORES AMBIENTALES Y AL DESGASTE	M2	842.45	$ 173,262.00	$ 145,964,572.00	842.45	$ 145,964,572.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.07	DEMARCACION CON PINTURA SINTETICA PARA PARA CANCHA DE TENIS	M	153.38	$ 8,816.00	$ 1,352,198.00	153.38	$ 1,352,198.00		$ -		$ -	-	$ -
12.01.08	S/I DE EQUIPAMENTO FIJO PARA TENIS INCLUYE MALLA, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 7,030,936.00	$ 7,030,936.00	1.00	$ 7,030,936.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02	CERRAMIENTO PERIMETRAL												
12.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	49.65	$ 34,411.00	$ 1,708,506.00	49.65	$ 1,708,506.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	88.43	$ 22,969.00	$ 2,031,149.00	88.43	$ 2,031,149.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA PILOTES	KG	9,896.04	$ 10,232.00	$ 101,256,281.00	9,896.04	$ 101,256,281.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.04	PILOTES EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE PERFORACION SEGUN DISEÑO	M3	20.83	$ 1,355,118.00	$ 28,227,108.00	20.83	$ 28,227,108.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.05	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	KG	1,823.32	$ 10,232.00	$ 18,656,210.00	1,823.32	$ 18,656,210.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.06	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 040X040 EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI)	M	124.12	$ 160,865.00	$ 19,966,564.00	124.12	$ 19,966,564.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.07	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3.68	$ 1,142,941.00	$ 4,206,023.00	3.68	$ 4,206,023.00		$ -		$ -	-	$ -
12.02.08	CERRAMIENTO ANTI IMPACTO EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA 4" (36MM) ALTURA 500M Y MALLA ESLABONADA INCLUYE PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVO PLATINAS REDONDAS SEGÚN DISEÑO (VER DETALLES)	M	124.12	$ 2,409,156.94	$ 299,024,560.00	124.12	$ 299,024,560.00		$ -		$ -	-	$ -
13	ANDENES Y PLAZOLETAS												
13.01	EXCAVACIONES Y RELLENOS												
13.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	55.41	$ 34,411.00	$ 1,906,714.00	55.41	$ 1,906,714.00		$ -		$ -	-	$ -
13.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	72.12	$ 22,969.00	$ 1,656,524.00	72.12	$ 1,656,524.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02	ACABADOS												
13.02.01	CONSTRUCCION BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI FUNDIDO EN SITU 010 X 030 M INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIAL SELECCIONADO, ACERO DE REFUERZO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN	M	5,126.47	$ 87,115.26	$ 446,593,787.00	5,126.47	$ 446,593,787.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.02	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M	233.65	$ 103,559.00	$ 24,196,560.00	233.65	$ 24,196,560.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.03	MURO DE CONTENCION EN CONCRETO DE 3000PSI	M3	144.56	$ 1,011,238.00	$ 146,184,565.00	144.56	$ 146,184,565.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.04	VIGA DE CIMENTACION DE 025 MTS X 025 MTS 21 mpa	M	196.55	$ 78,232.00	$ 15,376,500.00	196.55	$ 15,376,500.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.05	LEVANTE MURO JARDINERA H=50CM EN 2 HILADAS BLOQUE ESTRUCTURAL LISO COLOR BLANCO, ACABADO A LA VISTA. DIMENSIONES DE BLOQUE 015M X 020M X 040M INCLUYE MORTERO SECO, COLOR BLANCO, ACERO, CONCRETO 3000 PSI PARA DOVELAS Y ALFAJIA DE 010X020M	M	196.55	$ 104,398.00	$ 20,519,427.00	196.55	$ 20,519,427.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.06	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIMANO DE 020m X 010m X 006m COLOR NEGRO INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	2,419.78	$ 155,318.79	$ 375,837,307.00	2,419.78	$ 375,837,307.00		$ -		$ -	-	$ -

	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
13.02.07	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 020m X 020m X 006m COLOR GRIS INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	673.07	$ 159,536.06	$ 107,378,933.00	673.07	$ 107,378,933.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.08	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO RECTANGULAR EN CONCRETO TRÁFICO LIVIANO DE 010m X 020m X 006m COLOR GRIS INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1,522.65	$ 160,321.98	$ 244,114,269.00	1,522.65	$ 244,114,269.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.09	ACABADO DE PISO CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO RECTANGULAR TRÁFICO LIVIANO DE 020m X 010m X 006m COLOR ARENA INCLUYE ARENA H=5 CM, JUNTAS SELLADAS CON ARENA, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	510.60	$ 158,148.32	$ 80,750,530.00	510.60	$ 80,750,530.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.10	S/I ADOQUIN ALERTA TACTIL PREFABRICADA EN CONCRETO DE 020M X 020M X 006M COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO TOPEROL INCLUYE ARENA H=5CM, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 030M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M2	184.53	$ 187,402.00	$ 34,581,291.00	184.53	$ 34,581,291.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.11	S/I DE ADOQUIN GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 020m X 020m X 006m COLOR AMARILLO TEXTURA TIPO ACANALADA (2 HILERAS) CON MORTERO 1:4INCLUYE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 030M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	458.60	$ 95,006.00	$ 43,569,752.00	458.60	$ 43,569,752.00		$ -		$ -	-	$ -
13.02.12	S/I FRANJA DEMARCADORA PARA LIMITADOS VISUALES CON ADOQUÍN PREFABRICADO EN CONCRETO DE 020mX010m X006m COLOR AMARILLO PARA EMBEBER EN MORTERO, APAREJADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE MATERIAL SELECCIONADO DE 030M Y JUNTAS SELLADAS CON ARENA	M	540.17	$ 39,920.00	$ 21,509,569.00	540.17	$ 21,509,569.00		$ -		$ -	-	$ -
14	PAISAJISMO												
14.01	EMPRADIZACION TAPETE GRAMA SOICIA JAPONICA - INCLUYE ADECUACION TERRENO ABONO CON TIERRA NEGRA Y/O ALUVION	M2	3,026.50	$ 46,822.00	$ 141,706,783.00	3,026.50	$ 141,706,783.00		$ -		$ -	-	$ -
14.02	SUMINITRO Y PLANTACIÓN DE PALMA REAL, PALMA COLA DE ZORRO ALTURA MAYOR O IGUAL A 150M	UND	8.00	$ 146,901.00	$ 1,175,208.00	8.00	$ 1,175,208.00		$ -		$ -	-	$ -
14.03	SUMINISTROS Y SIEMBRA DE ÁRBOLES MADERABLES DE ESPECIES NATIVAS DE 15M DE ALTURA, INCLUYE EXCAVACION, ABONO ORGANICO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	1,000.00	$ 105,704.00	$ 105,704,000.00	1,000.00	$ 105,704,000.00		$ -		$ -	-	$ -
14.04	SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES FRUTALES NATIVOS ALTURA DE 1 A 1.50 METROS, INCLUYE ABONO, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	UND	650.00	$ 105,058.00	$ 68,287,700.00	650.00	$ 68,287,700.00		$ -		$ -	-	$ -
14.05	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES, INCLUYE HIDRORETENEDOR, MICRORRIZAS Y ABONO ORGANICO	UND	4,119.00	$ 16,829.00	$ 69,318,651.00	4,119.00	$ 69,318,651.00		$ -		$ -	-	$ -
15	MOBILIARIO URBANO												
15.01.01	S/I CICLOPARQUEADERO EN CONCRETO PULIDO REFORZADO CON FIBRA, ACABADO LISO GRIS INCLUYE BASE DE APOYO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (SEGÚN DISEÑO)	UND	24.00	$ 456,106.00	$ 10,946,544.00	24.00	$ 10,946,544.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.02	S/I BOLARDOS ALTO EN HIERRO TIPO M53 - IDU EMPOTRADOS EN CONCRETO; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	26.00	$ 365,432.00	$ 9,501,232.00	26.00	$ 9,501,232.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.03	S/I BOLARDO EN CONCRETO COLOR GRIS CON ACCESORIO EN CONCRETO COLOR CAFE SEGUN DISEÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	44.00	$ 1,008,127.00	$ 44,357,588.00	44.00	$ 44,357,588.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.04	S/I PUNTO ECOLOGICO DE 3 CESTAS DE BASURA EN CONCRETO Y POLIETILENO, FORMA TRIANGULAR INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	14.00	$ 2,930,853.00	$ 41,031,942.00	14.00	$ 41,031,942.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.05	S/I BANCA OVALADA EN CONCRETO AVANZADO, ACABADO EN CONCRETO A LA VISTA Y TEXTURA EN MADERA	UND	8.00	$ 4,570,256.00	$ 36,562,048.00	8.00	$ 36,562,048.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.06	S/I BANCA CON ESPALDAR EN CONCRETO REFORZADO COLOR GRIS, TEXTURA DE MADERA DE 040M X040M X 180M	UND	55.00	$ 1,693,238.00	$ 93,128,090.00	55.00	$ 93,128,090.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
		PLAZO INICIAL	16 MESES
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 49,329,918,941.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%
Representante	ORLANDO RIVERA MORA		

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
15.01.07	S/I AVISOS GENERALES SEGUN DISEÑO	UND	12.00	$ 679,847.00	$ 8,158,164.00		12.00	$ 8,158,164.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.08	S/I AVISOS CIVICOS SEGUN DISEÑO	UND	7.00	$ 512,653.00	$ 3,588,571.00		7.00	$ 3,588,571.00		$ -		$ -	-	$ -
15.01.09	S/I DE BARANDA DE PROTECCION EN TUBO GALVANIZADO SEGUN DISEÑO, (FIJADO AL CONCRETO) INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, PINTURA DE ACABADO FINAL DE ESMALTE	M	692.48	$ 366,732.00	$ 253,954,575.00		692.48	$ 253,954,575.00		$ -		$ -	-	$ -
16	BAHIAS Y PARQUEADEROS													
16.01	EXCAVACIONES													
16.01.01	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION Y CANALES	M3	1,124.89	$ 11,186.00	$ 12,583,020.00		1,124.89	$ 12,583,020.00		$ -		$ -	-	$ -
16.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	1,462.36	$ 22,969.00	$ 33,588,947.00		1,462.36	$ 33,588,947.00		$ -		$ -	-	$ -
16.02	ADECUACION DEL TERRENO													
16.02.01	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	3,279.39	$ 11,844.00	$ 38,841,095.00		3,279.39	$ 38,841,095.00		$ -		$ -	-	$ -
16.02.02	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR) INCLUYE MAQUINARIA	M3	886.88	$ 148,202.00	$ 131,437,390.00		886.88	$ 131,437,390.00		$ -		$ -	-	$ -
16.02.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	591.26	$ 130,725.00	$ 77,292,464.00		591.26	$ 77,292,464.00		$ -		$ -	-	$ -
16.03	CONCRETOS													
16.03.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA PLACAS	KG	36,125.36	$ 10,232.00	$ 369,634,684.00		36,125.36	$ 369,634,684.00		$ -		$ -	-	$ -
16.03.02	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (38MPA)	M3	561.69	$ 1,017,948.00	$ 571,771,212.00		561.69	$ 571,771,212.00		$ -		$ -	-	$ -
16.04	SEÑALIZACION													
16.04.01	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO CON LAMINA RETROREFLECTIVA DE 60CM X 60CM	UND	5.00	$ 456,627.00	$ 2,283,135.00		5.00	$ 2,283,135.00		$ -		$ -	-	$ -
16.04.02	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	1,236.75	$ 16,076.00	$ 19,881,993.00		1,236.75	$ 19,881,993.00		$ -		$ -	-	$ -
16.04.03	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	84.62	$ 146,248.00	$ 12,375,506.00		84.62	$ 12,375,506.00		$ -		$ -	-	$ -
16.04.04	S/I REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PERNADO	M	6.00	$ 409,006.00	$ 2,448,036.00		6.00	$ 2,448,036.00		$ -		$ -	-	$ -
16.04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS PREFABRICADO EN CONCRETO	UND	182.00	$ 93,293.00	$ 16,979,326.00		182.00	$ 16,979,326.00		$ -		$ -	-	$ -
17	PARADERO DE BUSES													
17.01	ADECUACION DEL TERRENO Y CIMENTACION													
17.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	18.24	$ 34,411.00	$ 627,657.00		18.24	$ 627,657.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	18.24	$ 22,969.00	$ 418,955.00		18.24	$ 418,955.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.03	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)	M2	88.20	$ 81,203.00	$ 7,162,105.00		88.20	$ 7,162,105.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.04	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	19.94	$ 11,844.00	$ 236,169.00		19.94	$ 236,169.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.05	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	4.44	$ 129,507.00	$ 575,011.00		4.44	$ 575,011.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.06	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	31.80	$ 88,636.00	$ 2,818,625.00		31.80	$ 2,818,625.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.07	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	0.44	$ 534,847.00	$ 235,333.00		0.44	$ 235,333.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.08	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa_ ZAPATAS	KG	216.00	$ 10,232.00	$ 2,210,112.00		216.00	$ 2,210,112.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.09	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3.11	$ 773,717.00	$ 2,406,260.00		3.11	$ 2,406,260.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.10	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_ VIGA CIMENTACIÓN	KG	419.50	$ 10,232.00	$ 4,292,324.00		419.50	$ 4,292,324.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.11	VIGA DE CIMENTACION DE 025 MTS X 030 MTS 3000 PSI (21mpa)	M	39.14	$ 112,783.00	$ 4,414,327.00		39.14	$ 4,414,327.00		$ -		$ -	-	$ -
17.01.12	PLACA EN CONCRETO 21 Mpa, E= 010MINCLUYE MALLA DE REFUERZO, JUNTA DILATACION Y SELLO	M2	56.66	$ 163,647.00	$ 9,272,239.00		56.66	$ 9,272,239.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02	ELEMENTOS ESTRUCTURALES													
17.02.01	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA COLUMNAS	KG	341.18	$ 10,232.00	$ 3,490,954.00		341.18	$ 3,490,954.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.02	COLUMNAS DE 025 MTS X 025 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	30.80	$ 102,413.00	$ 3,154,320.00		30.80	$ 3,154,320.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.03	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa_PARA VIGAS SUPERIORES	KG	735.84	$ 10,232.00	$ 7,529,115.00		735.84	$ 7,529,115.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.04	VIGA SUPERIOR DE 025 MTS X 030 MTS EN CONCRETO DE 21Mpa	M	35.14	$ 101,052.00	$ 3,550,967.00		35.14	$ 3,550,967.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.05	VIGA DE BORDE DE 010MTS X 030MTS EN CONCRETO DE 3000PSI	M	12.47	$ 72,902.00	$ 909,088.00		12.47	$ 909,088.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.06	VIGA CINTA DE 012 MTS X 020MTS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020 MTS	M	38.46	$ 73,659.00	$ 2,832,925.00		38.46	$ 2,832,925.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.07	CONCRETO 3000PSI PARA PLACA CANAL ANCHO TOTAL 042M ESPESOR DE PLACA H=010M INCLUYE FORMALETERIA, ARMADO,DESMONTE Y ACERO DE REFUERZO	M	13.48	$ 246,741.00	$ 3,326,069.00		13.48	$ 3,326,069.00		$ -		$ -	-	$ -
17.02.08	CONCRETO DE 3000 PSI PARA PLACA DE LOSA ESPESOR DE LOSA 10CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	13.48	$ 285,428.00	$ 3,847,569.00		13.48	$ 3,847,569.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	25/04/2023

			CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
17.03	MAMPOSTERIA Y ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO												
17.03.01	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, CON DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M COLOR BLANCO Y PEGA CON MORTERO 1:3, INCLUYE DOVELAS RELLENAS CON MORTERO Y ACERO DE REFUERZO SEGUN DISEÑO	M2	36.74	$ 161,779.00	$ 5,943,760.00	36.74	$ 5,943,760.00		$ -		$ -	-	$ -
17.03.02	VIGA CINTA DE 012m x 015m EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS 1/4 @020m	M	4.54	$ 88,724.00	$ 402,807.00	4.54	$ 402,807.00		$ -		$ -	-	$ -
17.03.03	LEVANTE LINEAL MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO, (UNA HILADA) CON DIMENSIONES DE 012M X 020M X 040M COLOR BLANCO Y PEGA CON MORTERO SECO CON COLOR INCLUYE ALFAJIA SEGÚN DISEÑO	M	15.54	$ 56,255.00	$ 874,203.00	15.54	$ 874,203.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04	PISOS ENCHAPES Y ACABADOS												
17.04.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS	M2	8.20	$ 75,034.00	$ 615,279.00	8.20	$ 615,279.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.02	PLANTILLA EN MORTERO 1:3, ESPESOR MAXIMO 005MT, ACABADO ALLANADO MECANICO INCLUYE SELLADO PARA PISO, CORTES Y JUNTAS DE DILATACION SEGUN DISEÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION	M2	44.50	$ 164,817.00	$ 7,334,357.00	44.50	$ 7,334,357.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.03	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M2	7.69	$ 46,902.00	$ 360,676.00	7.69	$ 360,676.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.04	PAÑETE LINEAL IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3	M	7.20	$ 23,573.00	$ 169,726.00	7.20	$ 169,726.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.05	ENCHAPE PARED BLANCA DE 045m x 030m	M2	17.64	$ 119,741.00	$ 2,112,231.00	17.64	$ 2,112,231.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUINERO DE PLASTICO (WIN) PARA REMATES DE FILOS ENCHAPES	M	3.60	$ 8,845.00	$ 31,842.00	3.60	$ 31,842.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.07	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR ALTURA MENOR A E IGUAL 300M (H<=0300M)	M2	9.68	$ 22,393.00	$ 216,764.00	9.68	$ 216,764.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.08	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS)	M2	9.68	$ 17,406.00	$ 168,490.00	9.68	$ 168,490.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.09	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	8.20	$ 112,559.00	$ 922,994.00	8.20	$ 922,994.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.10	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=010 MTS, ANCHO 060M INCLUYE REFUERZO EN VARILLA 3/8" @ 015 MTS Y ACABADO EN GRANITO	M	2.85	$ 287,431.00	$ 819,178.00	2.85	$ 819,178.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.11	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI, e=010 MTS, ANCHO 030M APOYA BRAZO INCLUYE: REFUERZO EN VARILLA 3/8" @015M ACABADO ESMALTADO	M	1.40	$ 123,011.00	$ 172,215.00	1.40	$ 172,215.00		$ -		$ -	-	$ -
17.04.12	PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 030X030 M INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	8.30	$ 158,591.00	$ 1,316,305.00	8.30	$ 1,316,305.00		$ -		$ -	-	$ -
17.05	CARPINTERÍA METALICA												
17.05.01	S/I DE PUERTA METÁLICA TIPO (P-02) DIMENSIONES 100M ANCHO X 210 M ALTO UNA HOJA BATIENTE EN LAMINA CAL 20 ACABADO SEGUN DISEÑO EN UNA SOLA CARA, INCLUYE MARCO METÁLICO, BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PALANCA, ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR GRIS BASALTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN	UND	1.00	$ 1,338,352.00	$ 1,338,352.00	1.00	$ 1,338,352.00		$ -		$ -	-	$ -
17.05.02	S/I PERSIANA ENRROLLABLE, TIPO V-29 DIMENSIONES DE 100M DE ANCHO X120M DE ALTO INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTON METALICO, ARGOLLAS PARA FIJACION DE CANDADOS. BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO	UND	1.00	$ 1,908,278.00	$ 1,908,278.00	1.00	$ 1,908,278.00		$ -		$ -	-	$ -
17.05.03	S/I PERSIANA ENRROLLABLE, TIPO V-45, DIMENSIONES: 1.40M ANCHO X 1.20M ALTO, INCLUYE RIELES LATERALES, FRONTON METALICO, ARGOLLAS PARA FIJACION DE CANDADOS. BASE ANTICORROSIVA COLOR GRIS, ACABADO COLOR GRIS BASALTO	UND	1.00	$ 1,391,183.00	$ 1,391,183.00	1.00	$ 1,391,183.00		$ -		$ -	-	$ -
17.05.04	S/I VENTANA TIPO V-46, DIMENSIONES DE VANO 2.20M ANCHO X0.45M DE ALTO, COMPUESTA POR 3 CUERPOS DE DIMENSIONES IGUALES EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO DE 10MM (2CUERPOS FIJOS Y UNA HOJA CORREDIZA) SEGÚN DISEÑO INCLUYE CERRADURA, TIRADERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION E INSTALACION	UND	1.00	$ 728,424.00	$ 728,424.00	1.00	$ 728,424.00		$ -		$ -	-	$ -
17.06	REVESTIMIENTO DE FACHADA												
17.06.01	S/I DE PANEL EN ALUZINC LINEAL TIPO CORTASOL ACABADO SIMILAR A LA MADERA DIMENSIONES 95X30CM INCLUYE ESTRUCTURA DE FIJACION Y NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	44.00	$ 1,172,559.00	$ 51,593,916.00	44.00	$ 51,593,916.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA

FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
PLAZO INICIAL	16 MESES	
MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
VALOR CONTRACTUAL	$ 46,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
		DE 9/09/2022
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
17.06.02	S/I DE REVESTIMIENTO CON FIJACIÓN OCULTA PARA MURO EN COMPUESTO PLASTICO DE MADERA (WPC) ENCAPSULADO, ACABADO ACANALADO CON APARIENCIA EN MADERA INCLUYE PLATINA DE FIJACION EN ALUMINIO	M2	15.44	$ 351,567.00	$ 5,428,194.00		15.44	$ 5,428,194.00		$ -		$ -	-	$ -
17.07	CUBIERTA													
17.07.01	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR. PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTÉTICO	KG	81.00	$ 20,768.00	$ 1,682,208.00		81.00	$ 1,682,208.00		$ -		$ -	-	$ -
17.07.02	S/I CONTRAVIENTOS Y TENSORES PARA CUBIERTA EN VARILLA DE 1/2" ROSCADA PARA CUBIERTA	M	2.50	$ 14,403.00	$ 36,008.00		2.50	$ 36,008.00		$ -		$ -	-	$ -
17.07.03	S/I CUBIERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL 28 (035mm) x600mts	M2	30.94	$ 107,902.00	$ 3,338,488.00		30.94	$ 3,338,488.00		$ -		$ -	-	$ -
17.08	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL													
17.08.01	PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1 3 IMPERMEABILIZADO E=004 MTS PARA CUBIERTAS	M2	20.60	$ 77,270.00	$ 1,591,762.00		20.60	$ 1,591,762.00		$ -		$ -	-	$ -
17.08.02	IMPERMEABILIZACION PARA CUBIERTA CON MANTO DE POLIESTER NO TEJIDO O SIMILAR INCLUYE IMPRIMANTE	M2	29.04	$ 70,878.00	$ 2,058,297.00		29.04	$ 2,058,297.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09	INSTALACIONES HIDRAULICAS													
17.09.01	EXCAVACION MANUAL	M3	7.20	$ 34,411.00	$ 247,759.00		7.20	$ 247,759.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	6.84	$ 88,636.00	$ 606,270.00		6.84	$ 606,270.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.03	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" PVC-P	UND	2.00	$ 33,067.00	$ 66,134.00		2.00	$ 66,134.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.04	S/I TUBERIA PRESION RDE 11 DE 3/4"	M	12.00	$ 16,380.00	$ 196,560.00		12.00	$ 196,560.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.05	S/I TUBERIA PRESION RDE 21 DE 1"	M	18.00	$ 18,215.00	$ 327,870.00		18.00	$ 327,870.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.06	S/I TEE DE 3/4" PVC-P SCH 40	UND	1.00	$ 9,341.00	$ 9,341.00		1.00	$ 9,341.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.07	S/I TEE DE 1" PVC-P SCH 40	UND	1.00	$ 13,882.00	$ 13,882.00		1.00	$ 13,882.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.08	S/I CODO 90° DE 3/4" PVC-P SCH 40	UND	4.00	$ 8,700.00	$ 34,800.00		4.00	$ 34,800.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.09	S/I CODO 90° DE 1" PVC-P SCH 40	UND	3.00	$ 12,652.00	$ 37,956.00		3.00	$ 37,956.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.10	S/I VALVULA DE CIERRE 3/4"	UND	2.00	$ 28,294.00	$ 56,588.00		2.00	$ 56,588.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.11	S/I VALVULA DE CIERRE 1"	UND	1.00	$ 41,813.00	$ 41,813.00		1.00	$ 41,813.00		$ -		$ -	-	$ -
17.09.12	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO	UND	1.00	$ 1,611,678.00	$ 1,611,678.00		1.00	$ 1,611,678.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10	INSTALACIONES SANITARIAS													
17.10.01	EXCAVACION MANUAL	M3	8.64	$ 34,411.00	$ 297,311.00		8.64	$ 297,311.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	13.68	$ 88,636.00	$ 1,212,540.00		13.68	$ 1,212,540.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.03	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO - SP - TP	UND	1.00	$ 48,525.00	$ 48,525.00		1.00	$ 48,525.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.04	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED - TP	UND	1.00	$ 57,679.00	$ 57,679.00		1.00	$ 57,679.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.05	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 2" L -TP	M	12.00	$ 37,703.00	$ 452,436.00		12.00	$ 452,436.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.06	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP	M	6.00	$ 62,120.00	$ 372,720.00		6.00	$ 372,720.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.07	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm) - CORRUGADA	M	18.00	$ 76,226.00	$ 1,372,068.00		18.00	$ 1,372,068.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.08	S/I YEE DE 2" PVC-S	UND	3.00	$ 23,837.00	$ 71,511.00		3.00	$ 71,511.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.09	S/I CODO DE 2" X 45° PVC-S	UND	1.00	$ 16,161.00	$ 16,161.00		1.00	$ 16,161.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.10	S/I ADAPTADOR DE LIMPIEZA DE 2" PVC-S	UND	1.00	$ 20,270.00	$ 20,270.00		1.00	$ 20,270.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.11	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	2.00	$ 550,053.00	$ 1,100,106.00		2.00	$ 1,100,106.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.12	TRAMPA DE GRASAS PRE-FABRICADA ACERO	UND	1.00	$ 559,929.00	$ 559,929.00		1.00	$ 559,929.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.13	ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO	UND	1.00	$ 1,614,839.00	$ 1,614,839.00		1.00	$ 1,614,839.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.14	S/I DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS PROFESIONAL PICO FLEXIBLE DE 360°, MONOCONTROL DE DOBLE FLUJO INCLUYE SIFON DE DESGUE Y MANGUERA DE CONEXIÓN	UND	1.00	$ 748,789.00	$ 748,789.00		1.00	$ 748,789.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.15	S/I LLAVE COMUN PESADA TIPO MONOCONTROL PARA POCETA DE ASEO	UND	1.00	$ 65,473.00	$ 65,473.00		1.00	$ 65,473.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.16	S/I REJILLA DE PISO PVC 3x2"	UND	1.00	$ 19,518.00	$ 19,518.00		1.00	$ 19,518.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.17	S/I DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR (1 POCETA) EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	1.00	$ 531,593.00	$ 531,593.00		1.00	$ 531,593.00		$ -		$ -	-	$ -
17.10.18	S/I DE LAVATRAPEROS DE 050M X 050M INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 407,871.00	$ 407,871.00		1.00	$ 407,871.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11	INSTALACIONES AGUAS LLUVIAS													
17.11.01	EXCAVACION MANUAL	M3	4.32	$ 34,411.00	$ 148,656.00		4.32	$ 148,656.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.10	$ 88,636.00	$ 363,408.00		4.10	$ 363,408.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.03	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 4" L -TP	M	6.00	$ 62,120.00	$ 372,720.00		6.00	$ 372,720.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.04	S/I TUBERIA DE SANITARIA DE 6" (160mm) - CORRUGADA	M	12.00	$ 76,226.00	$ 914,712.00		12.00	$ 914,712.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.05	S/I CODO DE 4" X 90° PVC-S	UND	5.00	$ 34,027.00	$ 170,135.00		5.00	$ 170,135.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.06	S/I REJILLA TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 5X4" PVC	UND	5.00	$ 32,847.00	$ 164,235.00		5.00	$ 164,235.00		$ -		$ -	-	$ -
17.11.07	CAJAS DE REGISTRO PRE-FABRICADA	UND	4.00	$ 550,053.00	$ 2,200,212.00		4.00	$ 2,200,212.00		$ -		$ -	-	$ -
18	ESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y DRENAJES SUPERFICIALES													
18.01	EXCAVACION MANUAL	M3	182.89	$ 34,411.00	$ 6,293,428.00		182.89	$ 6,293,428.00		$ -		$ -	-	$ -
18.02	RELLENOS CON MATERIAL DE EXCAVACION	M3	182.89	$ 27,891.00	$ 5,100,985.00		182.89	$ 5,100,985.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
		PLAZO INICIAL	16 MESES
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
18.03	RELLENO CON ARENA PARA CAMA DE TUBERIAS SANITARIAS E= 005M	M3	4.10	$ 114,184.00	$ 468,154.00	4.10	$ 468,154.00		$ -		$ -	-	$ -
18.04	S/I TUBERIA PVC 12" O 315MM	M	16.24	$ 198,191.00	$ 3,218,622.00	16.24	$ 3,218,622.00		$ -		$ -	-	$ -
18.05	S/I TUBERIA PVC 10" O 250MM	M	42.18	$ 143,405.00	$ 6,048,823.00	42.18	$ 6,048,823.00		$ -		$ -	-	$ -
18.06	S/I TUBERIA PVC 8" O 200MM	M	22.71	$ 104,457.00	$ 2,372,218.00	22.71	$ 2,372,218.00		$ -		$ -	-	$ -
18.07	S/I TUBERIA PVC 6" O 160MM	M	149.42	$ 76,226.00	$ 11,389,689.00	149.42	$ 11,389,689.00		$ -		$ -	-	$ -
18.08	S/I TUBERIA PVC 4" O 110MM	M	34.14	$ 49,550.00	$ 1,691,637.00	34.14	$ 1,691,637.00		$ -		$ -	-	$ -
18.09	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	375.77	$ 11,844.00	$ 4,450,620.00	375.77	$ 4,450,620.00		$ -		$ -	-	$ -
18.10	S/I DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO DE ESTRUCTURAS	M3	21.11	$ 194,166.00	$ 4,098,844.00	21.11	$ 4,098,844.00		$ -		$ -	-	$ -
18.11	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR)	M3	42.31	$ 129,507.00	$ 5,479,441.00	42.31	$ 5,479,441.00		$ -		$ -	-	$ -
18.12	CUNETA EN CONCRETO DE 21Mpa, VACIADA IN SITU NO INCLUYE CONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE APOYO	M3	49.24	$ 991,887.00	$ 48,840,516.00	49.24	$ 48,840,516.00		$ -		$ -	-	$ -
18.13	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa PARA CUNETAS	KG	4,580.67	$ 10,232.00	$ 46,869,415.00	4,580.67	$ 46,869,415.00		$ -		$ -	-	$ -
18.14	CAJA DE INSPECCION TIPO1 (110X090X035M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	$ 1,424,869.00	$ 2,849,738.00	2.00	$ 2,849,738.00		$ -		$ -	-	$ -
18.15	CAJA DE INSPECCION TIPO 2 (130X130X045M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,688,737.00	$ 1,688,737.00	1.00	$ 1,688,737.00		$ -		$ -	-	$ -
18.16	CAJA DE INSPECCION TIPO 3 (130X130X040M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	$ 1,664,792.00	$ 3,329,584.00	2.00	$ 3,329,584.00		$ -		$ -	-	$ -
18.17	CAJA DE INSPECCION TIPO 3B (130X130X045M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, ACCESORIOS PARA PASANTES DE TUBERIA Y TAPA REMOVIBLE TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,788,578.00	$ 1,788,578.00	1.00	$ 1,788,578.00		$ -		$ -	-	$ -
18.18	CAJA DE INSPECCION TIPO4 (07X09X027M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,126,669.00	$ 1,126,669.00	1.00	$ 1,126,669.00		$ -		$ -	-	$ -
18.19	CAJA DE INSPECCION TIPO4B (07X090X030M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	$ 1,256,912.00	$ 2,513,824.00	2.00	$ 2,513,824.00		$ -		$ -	-	$ -
18.20	CAJA DE INSPECCION TIPO4 C (07X09X042M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,135,822.00	$ 1,135,822.00	1.00	$ 1,135,822.00		$ -		$ -	-	$ -
18.21	CAJA DE INSPECCION TIPO5 (07X09X060M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	2.00	$ 1,160,428.00	$ 2,320,856.00	2.00	$ 2,320,856.00		$ -		$ -	-	$ -
18.22	CAJA DE INSPECCION TIPO6 (07X110X034M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,087,452.00	$ 1,087,452.00	1.00	$ 1,087,452.00		$ -		$ -	-	$ -
18.23	CAJA DE INSPECCION TIPO 7 (07X090X038M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO, UNIONES PARA CONEXION DE TUBERIA Y TAPA TIPO REJILLA SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 969,678.00	$ 969,678.00	1.00	$ 969,678.00		$ -		$ -	-	$ -
18.24	CAJA DE INSPECCION TIPO 8 (130X130X070M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,183,737.00	$ 1,183,737.00	1.00	$ 1,183,737.00		$ -		$ -	-	$ -
18.25	CAJA DE INSPECCION TIPO 9 (130X130X070M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,161,376.00	$ 1,161,376.00	1.00	$ 1,161,376.00		$ -		$ -	-	$ -
18.26	CAJA DE INSPECCION TIPO 10 (130X130X070M), EN CONCRETO DE 3000PSI INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y TAPA REMOVIBLE SEGUN DISEÑO	UND	1.00	$ 1,316,016.00	$ 1,316,016.00	1.00	$ 1,316,016.00		$ -		$ -	-	$ -
18.27	S/I DE REJILLA METALICA 30CM PARA CUNETAS INCLUYE CONTRAMARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	42.57	$ 456,359.00	$ 19,427,160.00	42.57	$ 19,427,160.00		$ -		$ -	-	$ -

Alcaldía de MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	15 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
18.28	S/I DE REJILLA METALICA 20CM PARA CUNETAS INCLUYE CONTRA MARCO EN ANGULO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M	179.87	$ 334,351.00	$ 60,139,714.00	179.87	$ 60,139,714.00		$ -		$ -	-	$ -
19	SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES												
19.01	SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS												
19.01.01	EXCAVACION MANUAL	M3	92.72	$ 34,411.00	$ 3,190,588.00	92.72	$ 3,190,588.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	81.12	$ 88,636.00	$ 7,190,152.00	81.12	$ 7,190,152.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	92.72	$ 22,969.00	$ 2,129,686.00	92.72	$ 2,129,686.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.04	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" (PARA BAJANTE) Hprom= 15 m	M	415.95	$ 62,243.00	$ 25,889,976.00	415.95	$ 25,889,976.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.05	S/I REJILLA TRAGANTE Hprom= 15 m	UND	30.00	$ 103,580.00	$ 3,107,400.00	30.00	$ 3,107,400.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.06	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4" (PARA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	31.71	$ 62,120.00	$ 1,969,825.00	31.71	$ 1,969,825.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.07	S/I TUBERIA SANITARIA DE 6" (PARA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	178.31	$ 76,227.00	$ 13,592,036.00	178.31	$ 13,592,036.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.08	S/I TUBERIA SANITARIA DE 8" (PARA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	181.74	$ 104,458.00	$ 18,984,197.00	181.74	$ 18,984,197.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.09	S/I TUBERIA SANITARIA DE 10" (PARA COLECTORES, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN)	M	76.50	$ 143,405.00	$ 10,970,483.00	76.50	$ 10,970,483.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.10	S/I CODO DE 4" X 90°	UND	93.00	$ 34,027.00	$ 3,164,511.00	93.00	$ 3,164,511.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.11	CAJAS DE REGISTRO EN MAMPOSTERÍA IMPERMEABILIZADA 40X40 (INCLUYE EXCAVACIÓN)	UND	34.00	$ 468,067.00	$ 15,914,278.00	34.00	$ 15,914,278.00		$ -		$ -	-	$ -
19.01.12	S/I CANALETA METALICA	M	19.95	$ 505,589.00	$ 10,086,501.00	19.95	$ 10,086,501.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS Y CÁRCAMOS												
19.02.01	EXCAVACION MANUAL	M3	211.73	$ 34,411.00	$ 7,285,841.00	211.73	$ 7,285,841.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	264.66	$ 22,969.00	$ 6,078,976.00	264.66	$ 6,078,976.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.03	GEOTEXTIL PARA SEPARACION DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	72.20	$ 11,844.00	$ 855,137.00	72.20	$ 855,137.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.04	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES (TIPO PIEDRA RAJON O SIMILAR	M3	20.60	$ 129,507.00	$ 2,667,844.00	20.60	$ 2,667,844.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.05	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)	M3	3.63	$ 534,844.00	$ 1,941,484.00	3.63	$ 1,941,484.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.06	ACERO DE REFUERZO Fy = 420 Mpa	KG	7,673.05	$ 10,232.00	$ 78,510,648.00	7,673.05	$ 78,510,648.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.07	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (LOSA INFERIOR)	M3	19.33	$ 902,360.00	$ 17,442,619.00	19.33	$ 17,442,619.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.08	S/I CINTA PVC PARA SELLAR E IMPERMEABILIZAR JUNTAS EN TANQUES	M	30.75	$ 197,262.00	$ 6,065,807.00	30.75	$ 6,065,807.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.09	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (MUROS)	M3	85.44	$ 1,157,234.00	$ 98,874,073.00	85.44	$ 98,874,073.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.10	CONCRETO RESISTENCIA 28 MPA CLASE C (LOSA SUPERIOR)	M3	19.33	$ 1,100,345.00	$ 21,269,669.00	19.33	$ 21,269,669.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.11	S/I CODO 90° 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	UND	8.00	$ 151,148.00	$ 1,209,184.00	8.00	$ 1,209,184.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.12	S/I NIPLE EN 4" HG PARA VENTILACIÓN DE TANQUE	UND	4.00	$ 133,217.00	$ 532,868.00	4.00	$ 532,868.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.13	S/I PASAMUROS DE 4" HG X 030m A INOXIDABLE	UND	4.00	$ 359,765.00	$ 1,439,060.00	4.00	$ 1,439,060.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.14	S/I ESCOTILLA DE ACCESO A TANQUE 08X08 M	UND	3.00	$ 1,846,272.00	$ 5,538,816.00	3.00	$ 5,538,816.00		$ -		$ -	-	$ -
19.02.15	PELDAÑOS PRE-FABRICADOS PARA ESCALERA DE ACCESO AL TANQUE	UND	42.00	$ 82,214.00	$ 3,452,988.00	42.00	$ 3,452,988.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03	SISTEMA DE BOMBEO												
19.03.01	ESTACIÓN DE BOMBEO COMPACTA DE BAJO PERFIL (incluye valvula mariposa aislamiento entrada y descarga, valvula de retencion, caja de aluminio, termostato y ventilador en caja mecánica, controles de bombas, relé de arranque, impulsor de frecuencia variable para control de presión, pantalla táctil o monocromatica) (Hasta 68 GPM a 32 PSI o hasta 24 GPM a 41 PSI)	UND	1.00	$ 63,573,177.00	$ 63,573,177.00	1.00	$ 63,573,177.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.02	S/I EQUIPO DE FILTRACIÓN AUTOMÁTICA DE DISCO AUTOLIMPIANTE, INCLUYE VÁVULAS DE 2" Y MANIFOLD DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	UND	1.00	$ 15,078,628.00	$ 15,078,628.00	1.00	$ 15,078,628.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.03	S/I CONTROLADOR DE FILTRACIÓN PARA RETROLAVADO DE FILTRO	UND	1.00	$ 8,278,474.00	$ 8,278,474.00	1.00	$ 8,278,474.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.04	S/I JUEGO DE NIPLES HD COMPLEMENTARIO PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO	UND	1.00	$ 2,373,534.00	$ 2,373,534.00	1.00	$ 2,373,534.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.05	S/I JUEGO DE ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA ESTACIÓN DE BOMBEO Y FILTRADO	UND	1.00	$ 1,874,565.00	$ 1,874,565.00	1.00	$ 1,874,565.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.06	S/I PROGRAMADOR	UND	1.00	$ 1,013,380.00	$ 1,013,380.00	1.00	$ 1,013,380.00		$ -		$ -	-	$ -
19.03.07	S/I VALVULAS SOLENOIDES 2"(INCLUYE CABLES DE CONEXIÓN A TABLERO)	UND	3.00	$ 1,152,961.00	$ 3,458,883.00	3.00	$ 3,458,883.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
		PLAZO INICIAL	16 MESES		
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00	
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE	9/09/2022
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA	31/01/2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA	
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023	

		CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
19.04	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO												
19.04.01	EXCAVACION MANUAL	M3	428.62	$ 34,411.00	$ 14,749,243.00	428.62	$ 14,749,243.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	426.25	$ 88,636.00	$ 37,781,095.00	426.25	$ 37,781,095.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	535.77	$ 22,969.00	$ 12,306,101.00	535.77	$ 12,306,101.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.04	S/I TUBERIA PVC RDE 26 DE 3/4"	M	761.29	$ 12,448.00	$ 9,476,538.00	761.29	$ 9,476,538.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.05	S/I TUBERIA DE PRESION RDE 21 DE 1"	M	450.86	$ 18,215.00	$ 8,212,415.00	450.86	$ 8,212,415.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.06	S/I TUBERIA PVC RDE 21 DE 2"	M	283.74	$ 38,585.00	$ 10,948,392.00	283.74	$ 10,948,392.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.07	LINEA DE GOTEO SUBTERRANEO	M	10,210.80	$ 18,512.00	$ 189,022,330.00	10,210.80	$ 189,022,330.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.08	MANGUERA LISA 18MM	M	540.00	$ 8,994.00	$ 4,856,760.00	540.00	$ 4,856,760.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.09	TEE REDUC PVC-P SCH 40 3/4"X1/2"	UND	938.00	$ 9,534.00	$ 8,942,892.00	938.00	$ 8,942,892.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.10	S/I TEE PVC de 3/4" SCH 40	UND	90.00	$ 9,341.00	$ 840,690.00	90.00	$ 840,690.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.11	TEE PVC SCH 40 1"	UND	350.00	$ 13,882.00	$ 4,859,700.00	350.00	$ 4,859,700.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.12	TEE PVC SCH 40 2"	UND	18.00	$ 34,460.00	$ 620,280.00	18.00	$ 620,280.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.13	S/I CODO PVC 90G SCH 40 3/4"	UND	194.00	$ 8,700.00	$ 1,687,800.00	194.00	$ 1,687,800.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.14	S/I CODO PVC 90G SCH 40 1"	UND	26.00	$ 12,652.00	$ 328,952.00	26.00	$ 328,952.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.15	S/I CODO PVC 90G SCH 40 2"	UND	11.00	$ 29,284.00	$ 322,124.00	11.00	$ 322,124.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.16	S/I CODO PVC-P 2225G SCH 40 1"	UND	5.00	$ 12,670.00	$ 63,350.00	5.00	$ 63,350.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.17	S/I CODO PVC-P 1125G SCH 40 1"	UND	11.00	$ 12,670.00	$ 139,370.00	11.00	$ 139,370.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.18	S/I CODO PVC-P 45G SCH 40 1"	UND	30.00	$ 14,306.00	$ 429,180.00	30.00	$ 429,180.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.19	S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 3/4"X1/2"	UND	139.00	$ 10,810.00	$ 1,502,590.00	139.00	$ 1,502,590.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.20	S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 1"X1/2"	UND	327.00	$ 11,634.00	$ 3,804,318.00	327.00	$ 3,804,318.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.21	S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 1"X3/4"	UND	47.00	$ 11,634.00	$ 546,798.00	47.00	$ 546,798.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.22	S/I BUJE SOLD PVC-P SCH 40 2"X1"	UND	15.00	$ 17,502.00	$ 262,530.00	15.00	$ 262,530.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.23	S/I UNION 17 MM ESTRIA X ESTRIA	UND	1,430.00	$ 4,822.00	$ 6,895,460.00	1,430.00	$ 6,895,460.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.24	S/I TEE ESTRIADA 17 MM	UND	1,335.00	$ 10,994.00	$ 14,676,990.00	1,335.00	$ 14,676,990.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.25	S/I CODO ESTRIADO 17MM	UND	278.00	$ 8,202.00	$ 2,280,156.00	278.00	$ 2,280,156.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.26	S/I VENTOSA (VALVULA AIRE) DOBLE 1	UND	86.00	$ 161,462.00	$ 13,885,732.00	86.00	$ 13,885,732.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.27	S/I VALVULA DE DRENAJE FLUSHING 16 MM	UND	82.00	$ 28,291.00	$ 2,319,862.00	82.00	$ 2,319,862.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.28	S/I CAJA PARA VALVULAS REDONDA 6"	UND	86.00	$ 44,104.00	$ 3,792,944.00	86.00	$ 3,792,944.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.29	S/I CAJA PARA VALVULAS RECTANGULAR	UND	71.00	$ 185,197.00	$ 13,148,987.00	71.00	$ 13,148,987.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.30	S/I VALVULA DE BOLA ROSCADA PVC DE 3/4	UND	71.00	$ 31,830.00	$ 2,259,930.00	71.00	$ 2,259,930.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.31	S/I FILTRO DE DISCO JIMTEN 3/4"	UND	71.00	$ 129,131.00	$ 9,168,301.00	71.00	$ 9,168,301.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.32	S/I ADAPTADOR MACHO PVC SCH 40 3/4"	UND	71.00	$ 11,339.00	$ 805,069.00	71.00	$ 805,069.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.33	S/I ADAPTADOR HEMBRA PVC SCH 40 3/4"	UND	71.00	$ 11,470.00	$ 814,370.00	71.00	$ 814,370.00		$ -		$ -	-	$ -
19.04.34	S/I KIT PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE ARBOLES	UND	1.00	$ 1,202,211.00	$ 1,202,211.00	1.00	$ 1,202,211.00		$ -		$ -	-	$ -
20	DISEÑO ELECTRICO												
	SUBESTACION ELECTRICA						$ -		$ -		$ -	-	$ -
20.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR (IP 2X), 175KV, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 12 PARA LA PERFILERÍA Y CALIBRE 14 PARA PUERTAS Y TAPAS, CON BARRA DE TIERRA NO AISLADA 5X30MM, VISOR EN POLICARBONATO, PLACA DE PELIGRO Y REJILLA DE PROTECCIÓN EL ACABADO FINAL DE LA CELDA ES EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 DIMENSIONES 2200X1100X1200 MM CELDA CERTIFICADA BAJO RETIE 2013	UND	1.00	$ 36,911,383.00	$ 36,911,383.00	1.00	$ 36,911,383.00		$ -		$ -	-	$ -
20.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE, ACOMETIDA EN CABLE XLPE AL 133% AL, EN 3NO 1/0 AL EN DUCTERIA PVC DE 3" DESDE PUNTO DE CONEXION HASTA CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN EN SUBESTACIÓN	M	40.00	$ 229,204.00	$ 9,168,160.00	40.00	$ 9,168,160.00		$ -		$ -	-	$ -
20.03	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CELDA PARA TRANSFORMADOR SECO 1250 KVA, USO INTERIOR (IP 2X), 175KV, EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 14 PARA LA PERFILERÍA Y CALIBRE 16 PARA PUERTAS Y TAPAS, CON BARRA DE TIERRA NO AISLADA 5X30MM, 2 VISORES EN VIDRIO TEMPLADO CON EMPAQUE, SISTEMA DE ILUMINACIÓN, PLACA DE PELIGRO Y REJILLA DE PROTECCIÓN EL ACABADO FINAL DE LA CELDA ES EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 DIMENSIONES APROXIMADAS 2200X2200X1600 MM CELDA CERTIFICADA BAJO RETIE 2013	UND	1.00	$ 20,718,027.00	$ 20,718,027.00	1.00	$ 20,718,027.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA		

FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
PLAZO INICIAL	16 MESES	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
		DE 9/09/2022
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE XLPE AL 133% EN 3NO 1/0 AL EN CARCAMOS DESDE CELDA PARA SECCIONADOR EN MEDIA TENSIÓN HASTA CELDA PROTECCIÓN TRANSFORMADOR 1250 KVA EN SUBESTACIÓN	M	12.00	$ 283,654.00	$ 3,403,848.00	12.00	$ 3,403,848.00		$ -		$ -	-	$ -
20.05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 1250 KVA 13200/460-266V	UND	1.00	$ 192,557,624.00	$ 192,557,624.00	1.00	$ 192,557,624.00		$ -		$ -	-	$ -
20.06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA Y DISTRIBUCION 1600A (T-GENERAL-CIS), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1740A TIPO ML DE 10 CTOS, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS: 2000X1400X800 MM, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR	UND	1.00	$ 101,672,951.00	$ 101,672,951.00	1.00	$ 101,672,951.00		$ -		$ -	-	$ -
20.07	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 5(3No500 KMC CU) FASES, 5(1No500 KCM CU) NEUTRO 5(1No 2/0 CU) TIERRA DESDE TRANSFORMADOR DE 1250 KVA HASTA TABLERO GENERAL T-GENERAL-CIS EN SUBESTACIÓN	M	12.00	$ 6,533,085.00	$ 78,397,020.00	12.00	$ 78,397,020.00		$ -		$ -	-	$ -
20.08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 5(3No500 KMC CU) FASES, 5(1No500 KCM CU) NEUTRO, 5(1No 2/0 CU) TIERRA DESDE GENERADOR ELECTRICO DE 1250 KVA HASTA TABLERO GENERAL T-GENERAL-CIS EN SUBESTACIÓN	M	25.00	$ 6,533,085.00	$ 163,327,125.00	25.00	$ 163,327,125.00		$ -		$ -	-	$ -
20.09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GENERADOR O PLANTA DE EMERGENCIA DE 1250 KVA, 460/266V	UND	1.00	$ 656,664,719.91	$ 656,664,720.00	1.00	$ 656,664,720.00		$ -		$ -	-	$ -
20.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, CABINA INSONORA, CABLEADO DE CONTROL DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 1250 KVA, 460/266V	UND	1.00	$ 117,398,677.00	$ 117,398,677.00	1.00	$ 117,398,677.00		$ -		$ -	-	$ -
20.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3XNo 14 PARA SEÑAL DE ENCENDIDO DE GENERADOR ELECTRICO	M	25.00	$ 15,997.00	$ 399,925.00	25.00	$ 399,925.00		$ -		$ -	-	$ -
20.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ARMADO DE PUNTO DE CONEXIÓN, ESTRUCTURA PASO DE RED AEREA TRIFASICA 13,2 KV A SUBTERRANEA XLPE No 1/0 CON SECCIONADOR MT	UND	1.00	$ 4,894,505.00	$ 4,894,505.00	1.00	$ 4,894,505.00		$ -		$ -	-	$ -
20.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE MEDIDA TIPO EXTERIOR, MEDIDA INDIRECTA NORMA AFINIA	UND	1.00	$ 37,558,658.00	$ 37,558,658.00	1.00	$ 37,558,658.00		$ -		$ -	-	$ -
20.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 2(3No500 KMC CU) FASES, 2(1No500 KCM CU) NEUTRO, 2(1No 2/0 CU) TIERRA EN TUBERIA PVC DE 4" DESDE T-GENERAL-CIS HASTA TRANSFORMADOR No 2 EN SUBESTACIÓN	M	12.00	$ 2,868,787.00	$ 34,425,444.00	12.00	$ 34,425,444.00		$ -		$ -	-	$ -
20.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR BAJA - BAJA DE 400 KVA 460/220-127V	UND	1.00	$ 74,828,012.00	$ 74,828,012.00	1.00	$ 74,828,012.00		$ -		$ -	-	$ -
20.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE 4(3No500 KMC CU) FASES, 4(1No500 KCM CU) NEUTRO, 4(1No 2/0 CU) TIERRA EN TUBERIA PVC DE 4" DESDE TRANSFORMADOR No 2 DE 400 KVA HASTA T-NORMAL-CIS EN SUBESTACION	M	12.00	$ 5,537,177.00	$ 66,446,124.00	12.00	$ 66,446,124.00		$ -		$ -	-	$ -
20.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 1100A (T-NORMAL-CIS), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 1240A TIPO ML DE 14 CTOS. FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS: 2000X1400X800 MM	UND	1.00	$ 89,721,454.00	$ 89,721,454.00	1.00	$ 89,721,454.00		$ -		$ -	-	$ -

	CONTRATO DE OBRA N° LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
		PLAZO INICIAL	16 MESES	
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA: CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante: CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR: CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante: ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE GABINETE DE ILUMINACION EXTERIOR TN-EXT-P1, EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLITICO ROJO DE 150A TIPO ML DE 32 CTOS. CON CONTACTORES Y STAR - STOP FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS 1000X1000X400 MM	UND	1.00	$ 19,883,936.00	$ 19,883,936.00	1.00	$ 19,883,936.00		$ -		$ -	-	$ -
20.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo6 PARA FASES + 1XNo6 PARA NEUTRO + 1XNo 8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No6, No8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA TN-SUB-P1 EN SUBESTACIÓN	M	12.00	$ 161,760.00	$ 1,941,120.00	12.00	$ 1,941,120.00		$ -		$ -	-	$ -
20.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo4 PARA NEUTRO + 1XNo 6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No4, No6 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA TN-EXT-P1 EN SUBESTACIÓN	M	12.00	$ 182,453.00	$ 2,189,436.00	12.00	$ 2,189,436.00		$ -		$ -	-	$ -
20.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SISTEMA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR 9 VARILLAS DE TIERRA DE 2.4 METROS, INTERCONECTADA CON CABLE NO 2/0 DESNUDO Y SOLDADURA EXOTERMICA, INCLUYE MEDICIÓN CON TELUROMETRO Y DISEÑOS	UND	1.00	$ 13,122,090.00	$ 13,122,090.00	1.00	$ 13,122,090.00		$ -		$ -	-	$ -
20.22	SERVICIO DE GRUA EN CALIENTE	HR	24.00	$ 636,278.00	$ 15,270,672.00	24.00	$ 15,270,672.00		$ -		$ -	-	$ -
20.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPT PARA POSTE DE MT	UND	1.00	$ 578,262.00	$ 578,262.00	1.00	$ 578,262.00		$ -		$ -	-	$ -
20.24	TERMINALES PREMOLDEADOS PARA EXTERIOR X 3 E INTERIOR X 3	UND	4.00	$ 1,562,145.00	$ 6,248,580.00	4.00	$ 6,248,580.00		$ -		$ -	-	$ -
20.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO CONDUIT 3" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE	UND	1.00	$ 1,304,692.00	$ 1,304,692.00	1.00	$ 1,304,692.00		$ -		$ -	-	$ -
20.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT PVC PESADO 3" SUBTERRÁNEA	M	40.00	$ 78,843.00	$ 3,153,720.00	40.00	$ 3,153,720.00		$ -		$ -	-	$ -
20.27	SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 325(70x70x90)	UND	2.00	$ 2,017,482.00	$ 4,034,964.00	2.00	$ 4,034,964.00		$ -		$ -	-	$ -
20.28	SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCIÓN SB 300(100x100x140)	UND	16.00	$ 3,496,822.00	$ 52,437,330.00	15.00	$ 52,437,330.00		$ -		$ -	-	$ -
	SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS						$ -		$ -		$ -	-	$ -
20.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	924.00	$ 315,591.00	$ 291,606,084.00	924.00	$ 291,606,084.00		$ -		$ -	-	$ -
20.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R. CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	480.00	$ 295,227.00	$ 141,708,960.00	480.00	$ 141,708,960.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
			PLAZO INICIAL	16 MESES
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
			VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 220V CON TOMA MIRADA CHINA CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 20A, LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 35 M)	UND	7.00	$ 1,054,957.00	$ 7,384,699.00	7.00	$ 7,384,699.00		$ -		$ -	-	$ -
20.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA TRIFASICA A 220V CON TOMA 3F + TIERRA + NEUTRO CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA, 20A, LEVITON, BLANCO, 220V Y CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 35 M)	UND	2.00	$ 1,749,380.00	$ 3,498,760.00	2.00	$ 3,498,760.00		$ -		$ -	-	$ -
20.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V REGULADO CON TOMA DOBLE CON TIERRA AISLADA 15A, LEV REF 5262-0IG, NARANJA, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	194.00	$ 314,883.00	$ 61,087,302.00	194.00	$ 61,087,302.00		$ -		$ -	-	$ -
20.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 110V GFCI CON TOMA DOBLE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA CON LED INDICADOR, 15A, LEV REF N7599-W, BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 AWG-CU-THHN/THWN-90°C, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	30.00	$ 358,553.00	$ 10,756,590.00	30.00	$ 10,756,590.00		$ -		$ -	-	$ -
20.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	47.00	$ 259,073.00	$ 12,176,431.00	47.00	$ 12,176,431.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
			PLAZO INICIAL	16 MESES
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
			VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
	Representante	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016		
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20,36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE DOBLE Y SEGUN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	44.00	$ 281,719.00	$ 12,395,636.00	44.00	$ 12,395,636.00		$ -		$ -	-	$ -
20,37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE TRIPLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	38.00	$ 303,259.00	$ 11,523,842.00	38.00	$ 11,523,842.00		$ -		$ -	-	$ -
20,38	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE SENCILLO Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (SALIDA PROMEDIO DE 450 M)	UND	18.00	$ 292,881.00	$ 5,271,858.00	18.00	$ 5,271,858.00		$ -		$ -	-	$ -
20,39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE SWICHE CONMUTABLE DOBLE Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 4 M)	UND	2.00	$ 325,518.00	$ 651,036.00	2.00	$ 651,036.00		$ -		$ -	-	$ -
20,40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO CON SENSOR DE MOVIMIENTO LEV REF OSC04-10W CON UNIDAD DE CONTROL BLANCO, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL INCLUYE CAJAS 4"X2" METALICA, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SALIDA PROMEDIO DE 1 M)	UND	36.00	$ 1,213,129.00	$ 43,672,644.00	36.00	$ 43,672,644.00		$ -		$ -	-	$ -
20,41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 LED DE INCRUSTAR DE 45W 6500K, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	165.00	$ 482,545.00	$ 79,619,925.00	165.00	$ 79,619,925.00		$ -		$ -	-	$ -
20,42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMETICA 120X10CM DE SOBREPONER LED 40W, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	75.00	$ 342,175.00	$ 25,663,125.00	75.00	$ 25,663,125.00		$ -		$ -	-	$ -
20,43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X30 CM DE INCRUSTAR LED 40W, INCLUYE MARCO, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	234.00	$ 425,361.00	$ 99,534,474.00	234.00	$ 99,534,474.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
		PLAZO INICIAL	16 MESES
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 18W DE 8" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	64.00	$ 183,931.00	$ 11,771,584.00	64.00	$ 11,771,584.00		$ -		$ -	-	$ -
20.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	31.00	$ 124,614.00	$ 3,869,234.00	31.00	$ 3,869,234.00		$ -		$ -	-	$ -
20.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 120X10 LED DE 40W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	292.00	$ 404,255.00	$ 118,042,460.00	292.00	$ 118,042,460.00		$ -		$ -	-	$ -
20.47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED DE PISO 9W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	59.00	$ 380,968.00	$ 22,477,112.00	59.00	$ 22,477,112.00		$ -		$ -	-	$ -
20.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED APLIQUE 12W Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	$ 230,571.00	$ 922,284.00	4.00	$ 922,284.00		$ -		$ -	-	$ -
20.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 100W 3000 K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	27.00	$ 576,968.00	$ 15,578,136.00	27.00	$ 15,578,136.00		$ -		$ -	-	$ -
20.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED SPRING 60W NW Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	85.00	$ 3,412,829.14	$ 290,090,477.00	85.00	$ 290,090,477.00		$ -		$ -	-	$ -
20.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED STREET 35W NW URBAN Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	137.00	$ 3,002,846.77	$ 411,390,008.00	137.00	$ 411,390,008.00		$ -		$ -	-	$ -
20.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 4,5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO SENCILLO ESPACIO PARA 1 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	115.00	$ 5,092,691.61	$ 585,659,535.00	115.00	$ 585,659,535.00		$ -		$ -	-	$ -
20.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 4,5 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON BRAZO DOBLE ESPACIO PARA 2 LUMINARIA, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	53.00	$ 5,803,846.53	$ 307,603,866.00	53.00	$ 307,603,866.00		$ -		$ -	-	$ -
20.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,40X0,40X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	118.00	$ 981,228.00	$ 115,784,904.00	118.00	$ 115,784,904.00		$ -		$ -	-	$ -
20.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 0,60X0,60X0,60 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	3.00	$ 1,651,420.00	$ 4,954,260.00	3.00	$ 4,954,260.00		$ -		$ -	-	$ -
20.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 1,00X1,00X1,00 METROS, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	3.00	$ 4,310,505.00	$ 12,931,518.00	3.00	$ 12,931,518.00		$ -		$ -	-	$ -
20.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO DE 0,30X0,30X0,60 METROS PARA POSTE METALICO DE BRAZO SENCILLO Y BRAZO DOBLE, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	168.00	$ 819,222.00	$ 137,629,296.00	168.00	$ 137,629,296.00		$ -		$ -	-	$ -
20.58	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE 24 METROS PARA PUESTA TIERRA EN ILUMINACION EXTERIOR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	118.00	$ 615,403.00	$ 72,617,554.00	118.00	$ 72,617,554.00		$ -		$ -	-	$ -
20.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCTO SUBTERRANEO 2xNo1-1/2", INCLUYE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	M	2,637.00	$ 84,969.00	$ 224,063,253.00	2,637.00	$ 224,063,253.00		$ -		$ -	-	$ -
20.60	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	45.00	$ 33,116.00	$ 1,490,220.00	45.00	$ 1,490,220.00		$ -		$ -	-	$ -

Alcaldía de MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD: MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.61	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	89.00	$ 35,121.00	$ 3,125,769.00		89.00	$ 3,125,769.00		$ -		$ -	-	$ -
20.62	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	$ 49,935.00	$ 49,935.00		1.00	$ 49,935.00		$ -		$ -	-	$ -
20.63	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X15 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	102.00	$ 62,094.00	$ 6,333,588.00		102.00	$ 6,333,588.00		$ -		$ -	-	$ -
20.64	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X20 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	7.00	$ 61,225.00	$ 428,575.00		7.00	$ 428,575.00		$ -		$ -	-	$ -
20.65	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X30 AMP, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	4.00	$ 141,660.00	$ 566,640.00		4.00	$ 566,640.00		$ -		$ -	-	$ -
20.66	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 50 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	6.00	$ 688,928.00	$ 4,133,568.00		6.00	$ 4,133,568.00		$ -		$ -	-	$ -
20.67	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 60 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	2.00	$ 688,928.00	$ 1,377,856.00		2.00	$ 1,377,856.00		$ -		$ -	-	$ -
20.68	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 80 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	3.00	$ 794,212.00	$ 2,382,636.00		3.00	$ 2,382,636.00		$ -		$ -	-	$ -
20.69	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL DE 125 AMP REGULABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	2.00	$ 894,450.00	$ 1,788,900.00		2.00	$ 1,788,900.00		$ -		$ -	-	$ -
20.70	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFASICO DE 42 CIRCUITOS INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	13.00	$ 1,312,096.00	$ 17,057,248.00		13.00	$ 17,057,248.00		$ -		$ -	-	$ -
20.71	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo8 PARA FASES + 1XNo 8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE TN-EXT-P1 HASTA ILUMINACIÓN EXTERIOR	M	2,637.00	$ 53,605.00	$ 141,356,385.00		2,637.00	$ 141,356,385.00		$ -		$ -	-	$ -
20.72	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE CABLE ENCAUCHETADO 3XNO14 PARA FASES Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, CONDUCTORES DE COBRE ENCAUCHETADO NO14 , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CAJA DE REGISTRO HASTA LAMPARAS - ILUMINACION EXTERIOR	M	1,800.00	$ 17,045.00	$ 30,681,000.00		1,800.00	$ 30,681,000.00		$ -		$ -	-	$ -
20.73	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 300A (T-NEST-P1), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 427A TIPO ML DE 12 CTOS, INCLUYE BY-PASS DE 125A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS 1200X1400X600 MM	UND	1.00	$ 48,281,354.00	$ 48,281,354.00		1.00	$ 48,281,354.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	25/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.74	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 300A (T-NOST-P1), USO INTERIOR (IP 40), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 427A TIPO ML DE 12 CTOS, INCLUYE BY-PASS DE 125A, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS: 1200X1400X600 MM	UND	1.00	$ 48,281,354.00	$ 48,281,354.00	1.00	$ 48,281,354.00		$ -		$ -	-	$ -
20.75	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCIÓN 160A (T-BOMBAS-1-CIS), USO INTERIOR (IP 40); EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 200A TIPO ML DE 8 CTOS, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS: 1200X1000X600 MM	UND	1.00	$ 24,295,805.00	$ 24,295,805.00	1.00	$ 24,295,805.00		$ -		$ -	-	$ -
20.76	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo4/0 PARA FASES + 1XNo4/0 PARA NEUTRO + 1XNo 2/0 PARA TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No4/0 Y No2/0 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-NEST-P1	M	130.00	$ 1,204,727.00	$ 156,614,510.00	130.00	$ 156,614,510.00		$ -		$ -	-	$ -
20.77	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo2/0 PARA FASES + 1XNo2/0 PARA NEUTRO + 1XNo 1/0 PARA TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No2/0 Y No1/0 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-NOST-P1	M	85.00	$ 896,319.00	$ 76,187,115.00	85.00	$ 76,187,115.00		$ -		$ -	-	$ -
20.78	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2(3XNo2/0 PARA FASES + 1XNo2/0 PARA NEUTRO + 1XNo 1/0 PARA TIERRA), INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No2/0 Y No1/0 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA CD-BOMBAS-1-CIS	M	130.00	$ 894,564.00	$ 116,293,320.00	130.00	$ 116,293,320.00		$ -		$ -	-	$ -
20.79	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TUBERIA PVC DE 3", OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-SEST-P1	M	60.00	$ 55,699.00	$ 3,341,940.00	60.00	$ 3,341,940.00		$ -		$ -	-	$ -
20.80	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-SOST-P1	UND	85.00	$ 55,805.00	$ 4,743,425.00	85.00	$ 4,743,425.00		$ -		$ -	-	$ -
20.81	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA CD-BOMBAS-3-CIS	M	32.00	$ 59,005.00	$ 1,888,160.00	32.00	$ 1,888,160.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022
		PLAZO INICIAL	16 MESES
		MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS
		FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00
		VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:	$ 4,905,043,226.00
PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	
DE	9/09/2022
HASTA	31/01/2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.82	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 2-1/2", OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA TN-GRAD-P1	M	130.00	$ 51,305.00	$ 6,669,650.00	130.00	$ 6,669,650.00		$ -		$ -	-	$ -
20.83	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION 600A (T-AA-1-P4), USO EXTERIOR (IP 65), EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, CON ACABADO FINAL EN PINTURA EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA, COLOR GRIS CLARO RAL 7035 EL TABLERO TENDRÁ UN BARRAJE TRIFÁSICO PRINCIPAL EN COBRE ELECTROLÍTICO ROJO DE 715A TIPO ML DE 10 CTOS, FRENTE MUERTO METÁLICO ABATIBLE Y BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA AISLADAS DIMENSIONES APROXIMADAS: 1400X1200X800 MM	UND	1.00	$ 35,939,393.00	$ 35,939,393.00	1.00	$ 35,939,393.00		$ -		$ -	-	$ -
20.84	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 4(3XNo4/0 PARA FASES + 1XNo4/0 PARA NEUTRO + 1XNo 1/0 PARA TIERRA). INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", CONDUCTORES DE COBRE No4/0 Y No1/0 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-AA-1-P4	M	135.00	$ 2,286,429.00	$ 308,667,915.00	135.00	$ 308,667,915.00		$ -		$ -	-	$ -
20.85	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA PVC DE 3", OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NORMAL-CIS HASTA T-AA-2-P4	M	70.00	$ 56,219.00	$ 3,935,330.00	70.00	$ 3,935,330.00		$ -		$ -	-	$ -
20.86	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo6 PARA FASES + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No6 Y No8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-AA-1-P4 HASTA CVRF-P4-01	M	14.00	$ 148,925.00	$ 2,084,950.00	14.00	$ 2,084,950.00		$ -		$ -	-	$ -
20.87	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo2 PARA FASES + 1XNo4 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE No2 Y No4 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-AA-1-P4 HASTA CVRF-P3-02, CVRF-P2-02 Y CVRF-P1-02	M	59.00	$ 268,277.00	$ 15,828,343.00	59.00	$ 15,828,343.00		$ -		$ -	-	$ -
20.88	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo1/0 PARA FASES + 1XNo2 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No1/0 Y No2 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-AA-1-P4 HASTA CVRF-P3-01, CVRF-P2-01 Y CVRF-P1-01	M	92.00	$ 377,934.00	$ 34,769,928.00	92.00	$ 34,769,928.00		$ -		$ -	-	$ -
20.89	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo8 PARA FASES + 1XNo8 PARA NEUTRO + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No8 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TAA-1-P1, TAA-2-P1 Y TAA-3-P1	M	36.00	$ 119,023.00	$ 4,284,828.00	36.00	$ 4,284,828.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,916,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.90	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo4 PARA NEUTRO + 1XNo6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No4 Y No6 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TI-1-P1, ASCENSOR No 1 Y ASCENSOR No 2	M	142.00	$ 222,612.00	$ 31,610,904.00	142.00	$ 31,610,904.00		$ -		$ -	-	$ -
20.91	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo2 PARA NEUTRO + 1XNo6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No2, No4 Y No6 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TR-1-P1, ENTRADA UPS DE 20 KVA Y SALIDA UPS DE 20 KVA	M	28.00	$ 246,243.00	$ 6,894,804.00	28.00	$ 6,894,804.00		$ -		$ -	-	$ -
20.92	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo1/0 PARA FASES + 1XNo1/0 PARA NEUTRO + 1XNo2 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE No1/0 Y No2 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NEST-P1 HASTA TN-1-P1	M	12.00	$ 440,788.00	$ 5,289,456.00	12.00	$ 5,289,456.00		$ -		$ -	-	$ -
20.93	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo8 PARA FASES + 1XNo8 PARA NEUTRO + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No8 THHN/THWN, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBL AGUA POTABLE, TBL BOMBA JOCKER Y TBL AGUAS RESIDUALES	M	36.00	$ 129,772.00	$ 4,671,792.00	36.00	$ 4,671,792.00		$ -		$ -	-	$ -
20.94	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo6 PARA FASES + 1XNo6 PARA NEUTRO + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No6 Y No8 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBLBOMBAS No 2	M	12.00	$ 166,591.00	$ 1,999,092.00	12.00	$ 1,999,092.00		$ -		$ -	-	$ -
20.95	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo4 PARA NEUTRO + 1XNo6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No 4 Y No6 THHN/THWN , OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE CD-BOMBAS-1-CIS HASTA TBLBOMBAS No 1	M	12.00	$ 224,313.00	$ 2,691,756.00	12.00	$ 2,691,756.00		$ -		$ -	-	$ -
20.96	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo6 PARA FASES + 1XNo6 PARA NEUTRO + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No6 Y No8 THHN/THWN, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TI-2-P1	M	12.00	$ 166,591.00	$ 1,999,092.00	12.00	$ 1,999,092.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

COD:MPSP8341/F2

ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56
Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ NORIEGA
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016
Representante:	ORLANDO RIVERA MORA

FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
PLAZO INICIAL	16 MESES	
MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	DE 9/09/2022 HASTA 31/01/2023
% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA			
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
20.97	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo8 PARA FASES + 1XNo8 PARA NEUTRO + 1XNo8 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No8 THHN/THWN LS, FR, HF, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TAA-4-P1, TAA-5-P1 Y TAA-6-P1	M	36.00	$ 129,772.00	$ 4,671,792.00	36.00	$ 4,671,792.00		$ -		$ -	-	$ -
20.98	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo4 PARA NEUTRO + 1XNo6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No4 Y No6 THHN/THWN LS, FR, HF, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA ASCENSOR No 3	M	48.00	$ 222,921.00	$ 10,700,208.00	48.00	$ 10,700,208.00		$ -		$ -	-	$ -
20.99	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo4 PARA FASES + 1XNo2 PARA NEUTRO + 1XNo6 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1-1/2", CONDUCTORES DE COBRE No2, No4 Y No6 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TR-2-P1, ENTRADA UPS DE 20 KVA Y SALIDA UPS DE 20 KVA	M	28.00	$ 246,243.00	$ 6,894,804.00	28.00	$ 6,894,804.00		$ -		$ -	-	$ -
20.100	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo1/0 PARA FASES + 1XNo1/0 PARA NEUTRO + 1XNo2 PARA TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 2", CONDUCTORES DE COBRE No1/0 Y No2 THHN/THWN , OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, DESDE T-NOST-P1 HASTA TN-2-P1	M	12.00	$ 440,788.00	$ 5,289,456.00	12.00	$ 5,289,456.00		$ -		$ -	-	$ -
20.101	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 3XNo12 PARA FASE, NEUTRO Y TIERRA, INCLUYE CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE No12 THHN/THWN LIBRES DE HALOGENOS, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA RAMALES DE DISTRIBUCIÓN	M	2,856.00	$ 51,544.00	$ 147,209,664.00	2,856.00	$ 147,209,664.00		$ -		$ -	-	$ -
20.102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	$ 60,510,978.00	$ 60,510,978.00	1.00	$ 60,510,978.00		$ -		$ -	-	$ -
20.103	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LED EMERGENCIA AVISO DE SALIDA PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UND	15.00	$ 509,116.00	$ 7,636,740.00	15.00	$ 7,636,740.00		$ -		$ -	-	$ -
20.104	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA R1 2 X 6W 120-277 PARA SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA	UND	99.00	$ 279,040.00	$ 27,624,960.00	99.00	$ 27,624,960.00		$ -		$ -	-	$ -
20.105	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE UPS ONLINE DE 20 KVA 3F - 220V	UND	2.00	$ 51,509,215.00	$ 103,018,430.00	2.00	$ 103,018,430.00		$ -		$ -	-	$ -
	ILUMINACION EXTERIOR CANCHAS						$ -		$ -		$ -	-	$ -
20.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED REFLECTOR DE 300W 5000K Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	18.00	$ 4,235,534.00	$ 76,239,612.00	18.00	$ 76,239,612.00		$ -		$ -	-	$ -
20.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE METÁLICO DE 10 METROS GALVANIZADO Y PINTADO AL CALOR, CON ESTRUCTURA DE 2,5 METROS Y ESPACIO PARA 3 LUMINARIA - TIPO REFLECTOR, OBRA CIVIL Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	UND	18.00	$ 7,535,627.00	$ 135,641,286.00	18.00	$ 135,641,286.00		$ -		$ -	-	$ -

MONTERÍA	CONTRATO DE OBRA N°	LP-SPM-017-2022	FECHA DE INICIACION:	9 de septiembre de 2022	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
			PLAZO INICIAL	16 MESES	
			MODIFICATORIO EN PLAZO #1	(15) MESES Y 20 DIAS	VALOR PRESENTE ACTA AMORTIZADA:
			FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de diciembre de 2023	
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	VALOR CONTRACTUAL	$ 48,329,918,941.00	$ 4,905,043,226.00
			VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	$ 6,131,304,033.00	PERIODO DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1
	CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56			DE 9/09/2022
	Representante:	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 6,131,304,033.00	HASTA 31/01/2023
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			% OBRA FINANCIERO PRESENTE ACTA	12.69%	FECHA DE LA PRESENTE ACTA
COD:MPSP8341/F2	INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERIA 016			
ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1	Representante:	ORLANDO RIVERA MORA	% OBRA FINANCIERO ACUMULADO A LA FECHA	12.69%	26/04/2023

					CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE 01		ACUMULADO EN ACTAS		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNIT	VALOR		CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP	ITEMS NO PREVISTOS													
NP 001	DESCABECE DE PILOTES 0.40 x 0.40 H= 0.50m	UND	0	$168,374.00			286.00	$ 48,154,964.00				$ -	-	$ -
								$ -		$ -		$ -	-	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 47,900,957,005.00			$ 47,900,957,005.00		$ -		$ 5,987,638,486.00		$ 5,987,638,486.00
	PGIO				$ 118,151,730.00			$ 118,151,730.00				$ 43,091,635.60		$ 43,091,635.60
	PAPSO				$ 140,036,652.00			$ 140,036,652.00				$ 36,357,276.59		$ 36,357,276.59
	1.TRAMITES Y LICENCIAS AMBIENTALES				$ 75,942,000.00			$ 75,942,000.00				$ 63,716,635.00		$ 63,716,635.00
	2.CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAL				$ 37,884,000.00			$ 37,884,000.00						$ -
	3.CERTIFICACIÓN RETILAP				$ 35,349,600.00			$ 35,349,600.00						$ -
	4.TRAMITES DE LEGALIZACION ANTE OPERADOR DE RED ELECTRICA				$ 18,480,000.00			$ 18,480,000.00						$ -
	6.CERTIFICACION Y TRAMITE ANTE OPERADOR DE REDES DE GAS NATURAL COCINA EDIFICIO 1				$ 2,617,954.00			$ 2,617,954.00						$ -
	7.TRAMITES DE REVISION DE DISEÑO DE ACOMETIDA ANTE PRESTADOR DE SERVICIO DE				$ 500,000.00			$ 500,000.00				$ 500,000.00		$ 500,000.00
	TOTAL TRAMITES, LEGALIZACION, LICENCIAS (TYC)				$ 170,773,554.00			$ 170,773,554.00		$ -		$ 64,216,635.00		$ 64,216,635.00
	VALOR TOTAL OBRA AJUSTADA				$ 48,329,918,941.00			$ 48,329,918,941.00		$ -		$ 6,131,304,033.00		$ 6,131,304,033.00
	ANTICIPO				20%							$ 1,226,260,807.00		
	VALOR TOTAL											$ 4,905,043,226.00		

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 48,329,918,941.00	V/R ANTICIPO INICIAL:	$ 9,665,983,788.00
V/R ADICIONES:		V/R ANTICIPO ADICION:	$ -
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 48,329,918,941.00	V/R TOTAL ANTICIPO:	$ 9,665,983,788.00

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO VALOR CONTRACTUAL	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		$ 6,131,304,033.00	12.69%	$ 1,226,260,807.00	$ 8,439,722,981.00	$ 4,905,043,226.00	12.69%
	TOTAL		$ 6,131,304,033.00	12.69%	$ 1,226,260,807.00	$ 8,439,722,981.00	$ 4,905,043,226.00	12.69%

El recibo por parte de la interventoria de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron el **26 de abril de 2023**

TOTAL NETO A PAGAR: $ 4,905,043,226.00

SON: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/C

CONSORCIO CIS 56		CONSORCIO KALAR MONTERIA 016	
REP. LEGAL	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA	REP. LEGAL	ORLANDO RIVERA MORA
CONTRATISTA		INTERVENTORÍA	

ACTA PARCIAL DE PGIO Y PAPSO. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.						ACUMULADO EN ACTAS		PGIO Y PAPSO EJECUTADO			
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)								PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. BASE	CANTIDAD	VALOR ($)	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	1. IMPLEMETACION PGIO - EJE S&SO										
1.1	Kit de Emergencias El Kit incluye: extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor) camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)	UND	$ 165,611.00	4.00	$ 662,444.00	-	$ -	1.00	$ 165,611.00	1.00	$ 165,611.00
1.2	Kit para trabajos en alturas El Kit incluye: Arnes. Barbuquejo para el casco de dotación, eslinga, línea de vida, punto de anclaje fijo.	UND	$ 391,447.00	40.00	$ 15,657,880.00	-	$ -	15.00	$ 5,871,705.00	15.00	$ 5,871,705.00
1.3	Kit para trabajos con soldadura Careta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levantable - guantes - overol especial.	UND	$ 53,196.00	20.00	$ 1,063,920.00	-	$ -	2.00	$ 106,392.00	2.00	$ 106,392.00
1.4	Kit señalización SST El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP sustancias peligrosas ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.	UND	$ 25,093.00	4.00	$ 100,372.00	-	$ -	4.00	$ 100,372.00	4.00	$ 100,372.00
1.5	Examen médico ocupacional de ingreso y egreso Examen de ingreso y egreso que incluye agudeza visual, talla y peso, tensión arterial serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas.	UND	$ 80,296.00	60.00	$ 4,817,760.00	-	$ -	10.00	$ 802,960.00	10.00	$ 802,960.00
1.6	Examen médico ocupacional - examen para ingreso trabajos en alturas Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial serología + hemograma, colesterol total y triglicéridos y glicemia en ayunas.	UND	$ 126,467.00	40.00	$ 5,058,680.00	-	$ -	7.00	$ 885,269.00	7.00	$ 885,269.00
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					$ 27,361,056.00		$ -		$ 7,932,309.00		$ 7,932,309.00
	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL										
2.1	Kit señalización Ambiental El kit incluye señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.	UND	$ 20,056.00	4.00	$ 80,224.00	-	$ -	1.00	$ 20,056.00	1.00	$ 20,056.00
2.2	Kit para desperdicios sólidos Incluye tres (3) canecas para de 65 litros compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la interpene, de facil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plastico de alta densidad, calibre de 2" de 65 x 85 cm-	UND	$ 431,216.00	4.00	$ 1,724,864.00	-	$ -	1.00	$ 431,216.00	1.00	$ 431,216.00
2.3	Lavado de Herramientas Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material: polietileno, irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.	UND	$ 135,381.00	4.00	$ 541,524.00	-	$ -	2.00	$ 270,762.00	2.00	$ 270,762.00
2.4	Cubrimiento de Materiales Granulares Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.	UND	$ 30,084.00	6.00	$ 180,504.00	-	$ -	2.00	$ 60,168.00	2.00	$ 60,168.00
2.5	Cubrimiento de escombros Cubrimiento de escombros tela verde para cerramiento de 2.10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.	UND	$ 30,084.00	6.00	$ 180,504.00	-	$ -	2.00	$ 60,168.00	2.00	$ 60,168.00
2.6	Alquiler baño portatil Suministro de baño portatil	UND	$ 340,961.00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -
2.7	Kit aseo Edificación El kit de aseo consta de pica, pala con mango, escoba, balde plastico 25 lt.	UND	$ 25,070.00	4.00	$ 100,280.00	-	$ -	1.00	$ 25,070.00	1.00	$ 25,070.00
2.8	Kit aseo Infraestructura El kit consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy con llanta neumatica) como mínimo de H 45cm, balde plastico de 25 lt, cepillo de casquillo de 37 x 7	UND	$ 172,486.00	4.00	$ 689,944.00	-	$ -	1.00	$ 172,486.00	1.00	$ 172,486.00
2.9	Brigada de aseo Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementacion y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional (2 ayudante)	MES	$ 3,109,528.00	15.66	$ 48,695,208.48	-	$ -	5.00	$ 15,547,640.00	5.00	$ 15,547,640.00
2.10	Kit de derrames pequeños El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre guantes, estopa y aserrin	UND	$ 20,056.00	4.00	$ 80,224.00	-	$ -	1.00	$ 20,056.00	1.00	$ 20,056.00
2.11	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental, eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	MES	$ 441,682.49	16.00	$ 7,066,919.89	-	$ -	5.00	$ 2,208,412.47	5.00	$ 2,208,412.47
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE AMBIENTAL POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					$ 59,340,196.00		$ -		$ 16,816,034.47		$ 16,816,034.47
	3. IMPLEMETACION PGIO - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA										
3.1	suministro e instalacion de valla informativa del proyecto	UND	$ 700,021.00	1.00	$ 700,021.00	-	$ -	1.00	$ 700,021.00	1.00	$ 700,021.00

ACTA PARCIAL DE PGIO Y PAPSO. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.							ACUMULADO EN ACTAS		PGIO Y PAPSO EJECUTADO			
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)									PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. BASE	CANTIDAD		VALOR ($)						
3.2	cerrmiento tipo 3 consta de postes de madera rolliza de 2m de altura libre enterrados como minimo 0,3m, entre los postes debe haber doble cinta de demarcacion de peligro calibre 4.con franjas amarillas y negras y con el texto "peligro". Adicionalmente entre postes debe disponerse de tela verde para cerramiento con una altura igual al poste,Separacion entre postes maximo de 5m.	M/MES	$ 16,043.00	-	$	-	-	$ -		$ -	-	$ -
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO -EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA POR EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN					$	700,021.00		$ -		$ 700,021.00		$ 700,021.00
4. IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO												
4.1	SEÑALES PREVENTIVAS	UND	$ 49,592.00	8.00	$	396,736.00	-	$ -	8.00	$ 396,736.00	8.00	$ 396,736.00
4.2	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND	$ 49,734.00	8.00	$	397,872.00	-	$ -	2.00	$ 99,468.00	2.00	$ 99,468.00
4.3	SEÑALES INFORMATIVAS	UND	$ 49,876.00	4.00	$	199,504.00	-	$ -		$ -	-	$ -
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO POR EL TERMINO DE EJECUCION					$	994,112.00		$ -		$ 496,204.00		$ 496,204.00
5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD												
5.1	ENSAYO CONCRETO A COMPRESION	UND	$ 10,031.00	573.00	$	5,747,763.00	-	$ -	210.00	$ 2,106,510.00	210.00	$ 2,106,510.00
5.2	ENSAYO GRANULOMETRICO	UND	$ 50,156.00	3.00	$	150,468.00	-	$ -	3.00	$ 150,468.00	3.00	$ 150,468.00
5.3	ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE GRANULOMETRIA Y LIMITES)	UND	$ 125,390.00	3.00	$	376,170.00	-	$ -	1.00	$ 125,390.00	1.00	$ 125,390.00
5.4	CONTENIDOS DE MATERIAL ORGANICO	UND	$ 45,134.00	3.00	$	135,402.00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.5	ENSAYO DE CBR	UND	$ 401,251.00	3.00	$	1,203,753.00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.6	CONTENIDO DE SALES SOLUBLES	UND	$ 80,250.00	3.00	$	240,750.00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.7	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	UND	$ 310,969.00	4.00	$	1,243,876.00	-	$ -		$ -	-	$ -
5.8	ENSAYO DE DENSIDAD	UND	$ 45,140.00	120.00	$	5,416,800.00	-	$ -	5.00	$ 225,700.00	5.00	$ 225,700.00
5.9	ENSAYO CONCRETO A FLEXION	UND	$ 20,062.00	45.00	$	902,790.00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
TOTAL IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE CALIDAD					$	15,417,772.00		$ -		$ 2,608,068.00		$ 2,608,068.00
NO PREVISTOS												
NP01	BAÑO PROVISIONAL EN ZINC, INCLUYE MUROS EN ZINC, SANITARIO, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y PUERTA EN ZINC	UND	$ 340,961.00	3.00	$	1,022,883.00	-	$ -	2.00	$ 681,922.00	2.00	$ 681,922.00
NP02	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN ZINC H=2,00 M	M	$ 68,151.00	195.39	$	13,315,690.00	-	$ -	173.98	$ 11,857,077.13	173.98	$ 11,857,077.13
TOTAL NO PREVISTOS					$	14,338,573.00		$ -		$ 12,539,999.13		$ 12,539,999.13
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) (1 + 2 + 3 + 4)					$	118,151,730.00		$ -		$ 43,091,635.60		$ 43,091,635.60
COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO								$ -		$ -		$ -
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. BASE	CANTIDAD	TIEMPO DE EJECUCION	VALOR ($)	-				-	
6.1	Cubrebocas	und	$ 1,010	1629.00		$ 1,645,290.00	-	$ -	1,629.00	$ 1,645,290.00	1,629.00	$ 1,645,290.00
6.2	Guantes de nitrilo o latex para actividades de limpieza y desinfección	und	$ 604	1629.00		$ 983,916.00	-	$ -	1,629.00	$ 983,916.00	1,629.00	$ 983,916.00
6.3	Careta de protección facial, como barrera adicional cuando los trabajadores no puedan asegurar el distanciamiento físico de 2 metros, por las condiciones de la actividad que realizan.	und	$ 25,152	153.00		$ 3,848,256.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.4	Examen de antigeno para COVID-19	und	$ 170,000	108.00		$ 18,360,000.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.5	Uniforme antifluido para el personal de limpieza y desinfección y encargados del punto biologio.	und	$ 65,659	13.00		$ 853,567.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.6	kit de 3 Pendones informativos sobre el COVID -19 (tencinas lavado de manos, Informacion covid, medidas de proteccion)	und	$ 55,557	4.00		$ 222,228.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.7	Aviso sobre las tecnicas de lavado de mano, que se debe ubicar en cada lavamanos.	und	$ 18,031	4.00		$ 72,124.00	-	$ -	1.00	$ 18,031.00	1.00	$ 18,031.00
6.8	Caneca de residuos no aprobechables de 100 lts	und	$ 95,862	4.00		$ 383,448.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.9	Bolsas para las canecas de residuos	und	$ 1,616	1629.00		$ 2,632,464.00	-	$ -	1,629.00	$ 2,632,464.00	1,629.00	$ 2,632,464.00
6.10	Lavamanos portatil	und	$ 601,034	4.00		$ 2,404,136.00	-	$ -	2.00	$ 1,202,068.00	2.00	$ 1,202,068.00
6.11	Toallas individuales desechables.	und	$ 95	351786.00		$ 33,276,037.00	-	$ -	283,415.00	$ 26,808,707.64	283,415.00	$ 26,808,707.64
6.12	Jabon liquido antiséptico	litro	$ 4,035	704.00		$ 2,840,640.00	-	$ -	704.00	$ 2,840,625.95	704.00	$ 2,840,625.95
6.13	Jabón desengrasante industrial para limpiar las superficies.	litro	$ 3,156	74.00		$ 233,544.00	-	$ -		$ -	-	$ -
6.14	Hipoclorito de uso domestico	litro	$ 2,802	98.00		$ 274,596.00	-	$ -		$ -	-	$ -

ACTA PARCIAL DE PGIO Y PAPSO. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.														
P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)								ACUMULADO EN ACTAS		PGIO Y PAPSO EJECUTADO				
										PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA N° 1		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	VR. BASE	CANTIDAD	VALOR ($)								
6.15	Gel antibacterial (Concentración de alcohol 70 % o superior).	litro	$ 11.100	704.00		$ 7 814.400.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
6.16	Alcohol en concentración de 70% o superior.	litro	$ 9.050	1407.00		$ 12.733.350.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
6.17	Dispensadores de jabón/gel antibacterial de pedal	und	$ 113.087	2.00		$ 226.174,00	-	$ -	2.00	$ 226.174,00	2,00	$ 226.174,00		
6.18	Tarros atomisadores de alcohol	und	$ 6.970	2.00		$ 13.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -		
6.19	Fumigador Pulverizadora Manual de 20 litros	und	$ 1 261.667	2.00		$ 2 523,334.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
6.20	Brigada de control de ingreso y salida de personal, limpieza y desinfeccion de areas de trabajo (2 ayudantes) incluyen prestaciones	Und/Mes	$ 3 109,528	1.00	15.660	$ 48.695.208.00	-	$ -		$ -	-	$ -		
TOTAL COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO						**$ 140,036,652.00**		**$ -**		**$ 36,357,276.59**		**$ 36,357,276.59**		

LISETH PETRO

LISETH PETRO DIAZ
DIRECTORA DE OBRA
CONSORCIO CIS 56

ALFREDO CABARCAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO		
ITEM	1.1	Kit de Emergencias El Kit incluye: extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor), camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)		UNIDAD	UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
1.10	Kit de Emergencias El Kit incluye: extintor de 10 lbs (señalización en acrílico de 22 cm x 15 de extintor), camilla rígida, reflectivos y botiquín con elementos necesarios)	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00








BOTIQUIN

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO
ITEM	1.2	Kit para trabajos en alturas El Kit Incluye: Arnes, Barbuquejo para el casco de dotación, eslinga, linea de vida, punto de anclaje fijo.	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
1.2	Kit para trabajos en a turas El Kit Incluye: Arnes, Barbuquejo para el casco de dotación, eslinga, linea de vida, punto de anclaje fijo.	UND								0.00
									15.00	15.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										15.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										15.00











CONSORCIO CIS 56

MONTERÍA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO**
ITEM	**1.3**	**Kit para trabajos con soldadura Careta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levantable - guantes - overol especial.**	**UNIDAD: UND**

# ÍTEM	**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UNIDAD**	**LOCALIZACIÓN**		**DIMENSIÓN**				**CANTIDAD**	**VOL ACUMULADO**
			ESTRUCTURA	**DESCRIPCIÓN**	**LONGITUD (m)**	**ANCHO (m)**	**ESPESOR PROMEDIO (m)**	**PESO (KG)**		
1.3	Kit para trabajos con soldadura Careta para soldar fabricada en material termoplástico portavidrio levantable - guantes - overol especial.	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										**2.00**
ACUMULADO ANTERIOR										**0.00**
PRESENTE ACTA										**2.00**





MONTERÍA | 56 CONSORCIO CIS


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO**
ITEM	1.4	**Kit señalización SST** **El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.**	**UNIDAD**: **UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
1.4	Kit señalización SST El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - uso de EPP, sustancias peligrosas, ruta de evacuación, punto de encuentro, baños.	UND								0.00
									4.00	4.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ITEM										**4.00**
ACUMULADO ANTERIOR										**0.00**
PRESENTE ACTA										**4.00**


24/04/2023 4:53:52 p. m.
6-29 Carrera 1b
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56

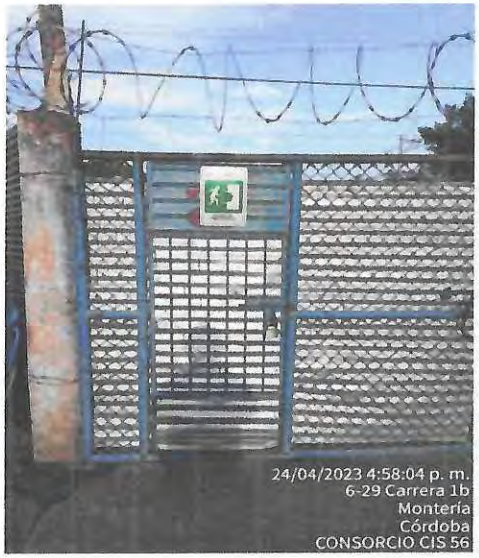
24/04/2023 4:58:04 p. m.
6-29 Carrera 1b
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56


6-29 Carrera 1b
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56


6-29 Carrera 1b
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56


VÍA DE EVACUACIÓN
6-29 Carrera 1b
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56


24/04/2023 4:52:36 p. m.
135 Calle 6
Montería
Córdoba
CONSORCIO CIS 56


USA GUANTES
USE CASCO
USE GAFAS
USE MASCARILLA




BAÑO


BAÑO


BAÑO


BAÑO

MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO**

ITEM	**1.5**	**Examen médico ocupacional de ingreso y egreso** **Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo el personal excepto personal de trabajo en alturas.**	**UNIDAD** / **UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
1.5	Examen médico ocupacional de ingreso y egreso Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serología para todo e personal excepto personal de trabajo en alturas.	UND								0.00
									10.00	10.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						10.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						10.00

VER FACTURA DE PAGO DE EXAMENES

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	1. IMPLEMETACIÓN PGIO - EJE S&SO
ITEM	1.6	Examen médico ocupacional + examen para ingreso trabajos en alturas Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serologia + hemograma, colesterol total y triglicéridos y glicemia en ayunas.	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
1.6	Examen médico ocupacional + examen para ingreso trabajos en alturas Examen de ingreso y egreso que incluye: agudeza visual, talla y peso, tensión arterial, serologia + hemograma, colesterol total y triglicéridos y glicemia en ayunas.	UND								0.00
									7.00	7.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										7.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										7.00

VER FACTURA DE PAGO DE EXAMENES

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL**		
ITEM	**2.1**	**Kit señalización Ambiental** **El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.1	Kit señalización Ambiental El kit incluye: señal de 15 x 15 cm - reciclable, señal de 15 x15 cm- orgánico, señal de 15 x 15 cm - sustancias peligrosas.	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						1.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						1.00


PUNTO
ECOLÓGICO


PUNTO
ECOLÓGICO


PUNTO
ECOLÓGICO



MONTERÍA | 56

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL**		
ITEM	**2.2**	**Kit para desperdicios sólidos Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la interperie, de facil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-**		**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.2	Kit para desperdicios sólidos Incluye tres (3) canecas para de 65 litros, compuesta de dos piezas (tapa y contenedor) resistente a la interperie, de facil limpieza y cargue, en polietileno de alta densidad, redonda - bolsas para basura color negra (24 mensuales), rojo (4 mensuales) y verde (4 mensuales) de material plástico de alta densidad, calibre de 2", de 65 x 85 cm-	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL
ITEM	2.3	Lavado de Herramientas Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN: ESTRUCTURA	LOCALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN	DIMENSIÓN: LONGITUD (m)	DIMENSIÓN: ANCHO (m)	DIMENSIÓN: ESPESOR PROMEDIO (m)	DIMENSIÓN: PESO (KG)	CANTIDAD	VOL ACUMULADO
2.3	Lavado de Herramientas Caneca para lavado de herramientas con capacidad para 55 galones, redonda, con tapa, material; polietileno. Irrompible, alta densidad, resistente a carga estática, resistente a la exposición a la intemperie. Color: de acuerdo con la disponibilidad con la que se cuente.	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										2.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										2.00





MONTERÍA | 56

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL**

ITEM	**2.4**	**Cubrimiento de Materiales Granulares** **Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.**	**UNIDAD**	**UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.4	Cubrimiento de Materiales Granulares Cubrimiento de materiales granulares (bases, subbase, arena, con plástico calibre 6 de 3 m de ancho x 10m de longitud para 30m2 por frente de obra.	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										2.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										2.00



MONTERÍA 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Pagina 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL		
ITEM	2.5	Cubrimiento de escombros Cubrimiento de escombros tela verde para cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.		UNIDAD	UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.5	Cubrimiento de escombros Cubrimiento de escombros tela verde para cerramiento de 2,10m de ancho x 15 de longitud para 30m2 por frente de obra.	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						2.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						2.00





MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL		
ITEM	2.7	Kit aseo Edificación El kit de aseo consta de pica, pala con mango, escoba, balde plastico 25 lt.		UNIDAD	UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.7	Kit aseo Edificación El kit de aseo consta de pica, pala con mango, escoba, balde plastico 25 lt.	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Pagina 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL
ITEM	2.8	Kit aseo Infraestructura El kit consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy con llanta neumatica), como mínimo de H:45cm, balde plástico de 25 lt, cepillo de casquillo de 37 x 7	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.8	Kit aseo Infraestructura El kit consta de pala con mango, carretilla (tipo boggy con llanta neumatica), como mínimo de H:45cm, ba de plástico de 25 lt, cepillo de casquillo de 37 x 7	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00



MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	**MUNICIPIO**	MONTERIA	**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No:**	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL**

ITEM	2.9	**Brigada de aseo** **Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementacion y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional (2 ayudante)**	**UNIDAD**	**MES**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.9	Brigada de aseo Suministro de brigada de aseo necesaria para la implementacion y mantenimiento del PGIO. Incluye el factor prestacional (2 ayudante)	MES								0.00
									5.00	5.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										5.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										5.00





MONTERÍA 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL
ITEM	2.10	Kit de derrames pequeños El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.10	Kit de derrames pequeños El kit consta de pala con mango, balde plástico de 25 lt, bolsa roja de calibre, guantes, estopa y aserrín	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						1.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						1.00


KIT ANTIDERRAME


KIT ANTIDERRAME

MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	2. IMPLEMETACION PGIO - EJE AMBIENTAL
ITEM	2.11	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental, eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	UNIDAD: MES

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
2.11	Generación de informes, impresión de información, adquisición de información, capacitaciones y mantenimiento del plan de implementación de PGIO eje ambiental, eje de seguridad industrial y salud ocupacional.	MES								0.00
									5.00	5.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						5.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						5.00





MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	3. IMPLEMETACION PGIO - EJE DE SEGURIDAD Y/O OBRA
ITEM	3.1	suminstro e instlacion de valla informativa del proyecto	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
3.10	suminstro e instlacion de valla informativa del proyecto	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00


Centro Integrado de Servicio "Ahora la GENTE"
Universidad del Sur
Alcaldía de
MONTERÍA
Gobierno de la
GENTE
Obras que benefician a la GENTE

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 3

DEPARTAMENTO	CORDOBA			**FECHA**	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	**MUNICIPIO**	MONTERIA		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	**CONTRATO No.**	LP-SPM-017-2022		
		CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	**P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)**	**SUBCAPITULO**	**4. IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO**
ITEM	**4.1**	**SEÑALES PREVENTIVAS**	**UNIDAD: UND**

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
4.10	SEÑALES PREVENTIVAS	UND								0.00
									8.00	8.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										8.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										8.00














MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	4. IMPLEMETACION PGIO - EJE MANEJO DE TRAFICO
ITEM	4.2	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
4.20	SEÑALES REGLAMENTARIAS	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										2.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										2.00


30


30

MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
ITEM	5.1	ENSAYO CONCRETO A COMPRESION	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
5.10	ENSAYO CONCRETO A COMPRESION	UND								0.00
									210.00	210.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
				TOTAL ÍTEM						210.00
				ACUMULADO ANTERIOR						0.00
				PRESENTE ACTA						210.00

VER CERTIFICADO DE ENSAYOS DE INTERVENTORIA

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
ITEM	5.2	ENSAYO GRANULOMETRICO	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
5.20	ENSAYO GRANULOMETRICO	UND								0.00
									3.00	3.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										3.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										3.00

VER CERTIFICADO DE ENSAYOS DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
ITEM	5.3	ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE GRANULOMETRIA Y LIMITES)	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
5.30	ENSAYOS DE PROCTOR MODIFICADO (INCLUYE GRANULOMETRIA Y LIMITES)	UND								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00

VER CERTIFICADO DE ENSAYOS DE INTERVENTORIA

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	5. IMPLEMETACION PGIO - EJE CALIDAD
ITEM	5.8	ENSAYO DE DENSIDAD	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
5.80	ENSAYO DE DENSIDAD	UND								0.00
									5.00	5.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										5.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										5.00

VER CERTIFICADO DE ENSAYOS DE INTERVENTORIA

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO
ITEM	6.1	Cubrebocas	UNIDAD: und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.10	Cubrebocas	und								0.00
									1629.00	1629.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1629.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1629.00


3M
Particulate Respirator N95
Respirador contra partículas N95
9502+N95


Protexis

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO
ITEM	6.2	Guantes de nitrilo o latex para actividades de limpieza y desinfección	UNIDAD: und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.2	Guantes de nitrilo o latex para actividades de limpieza y desinfección	und								0.00
									1629.00	1629.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1629.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1629.00










	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO		
ITEM	6.7	Aviso sobre las tecnicas de lavado de mano, que se debe ubicar en cada lavamanos.		UNIDAD	und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.7	Aviso sobre las tecnicas de lavado de mano, que se debe ubicar en cada lavamanos.	und								0.00
									1.00	1.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1.00


BAÑO

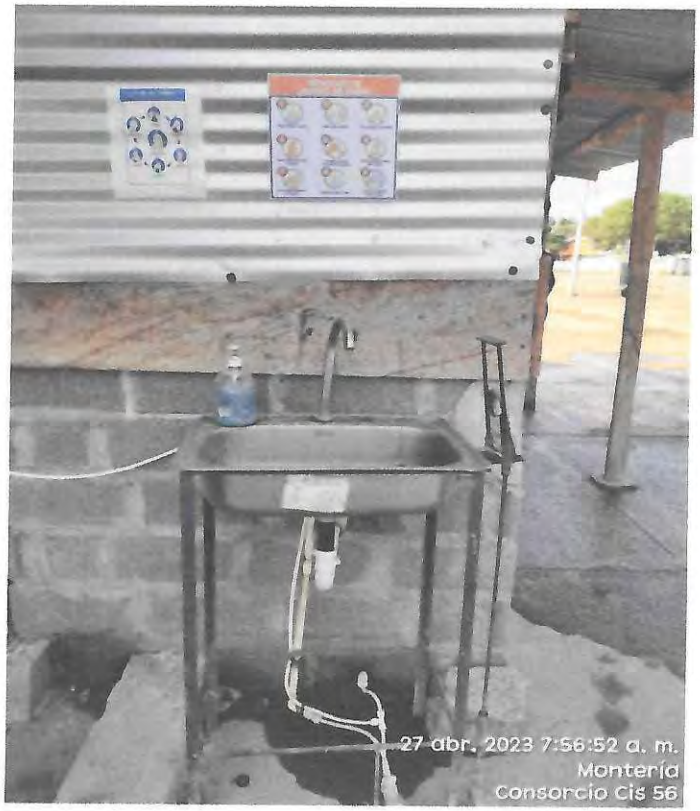
27 abr. 2023 7:56:52 a. m.
Montería
Consorcio Cis 56

MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO		
ITEM	6.9	Bolsas para las canecas de residuos		UNIDAD	und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.9	Bolsas para las canecas de residuos	und								0.00
									1629.00	1629.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										1629.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										1629.00








MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO
ITEM	6.10	Lavamanos portatil	UNIDAD: und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.10	Lavamanos portatil	und								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										0.00
ACUMULADO ANTERIOR										2.00
PRESENTE ACTA										0.00
										2.00

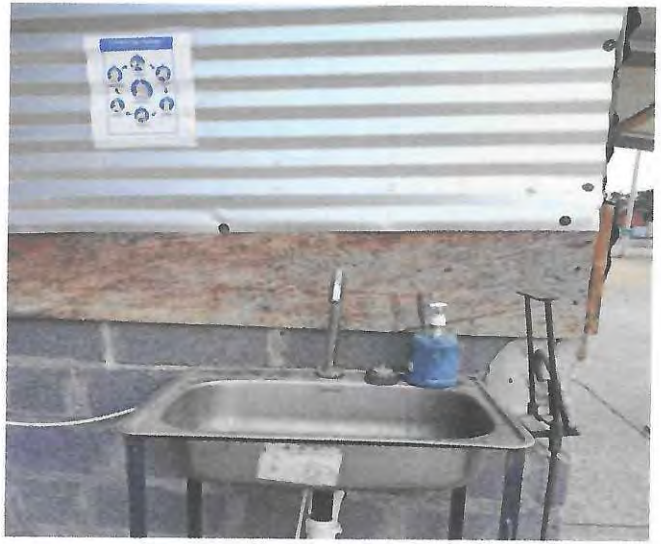



MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO		
ITEM	6.11	Toallas individuales desechables.		UNIDAD	und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.11	Toallas individuales desechables.	und								0.00
									283415.00	283415.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										283415.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										283415.00






MONTERÍA / CONSORCIO CIS 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO
ITEM	6.12	Jabon líquido antiséptico	UNIDAD: litro

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.12	Jabon líquido antiséptico	litro								0.00
									704.00	704.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										704.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										704.00

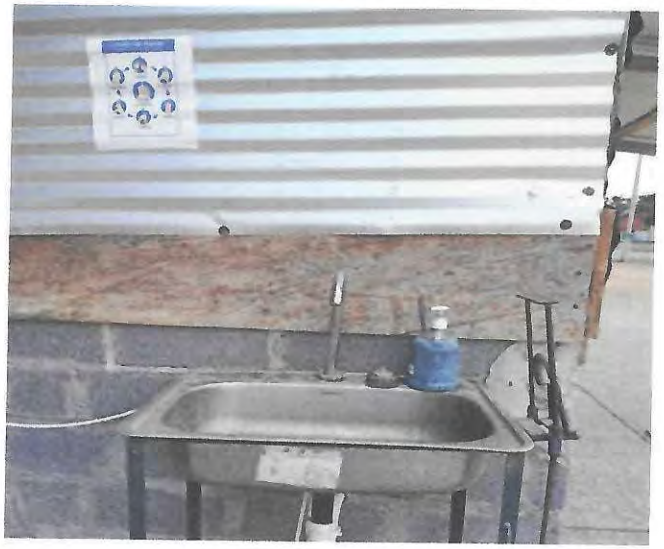




MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO	SUBCAPITULO	COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA PAPSO
ITEM	6.17	Dispensadores de jabón/gel antibacterial de pedal	UNIDAD: und

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
6.17	Dispensadores de jabón/gel antibacterial de pedal	und								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										2.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										2.00

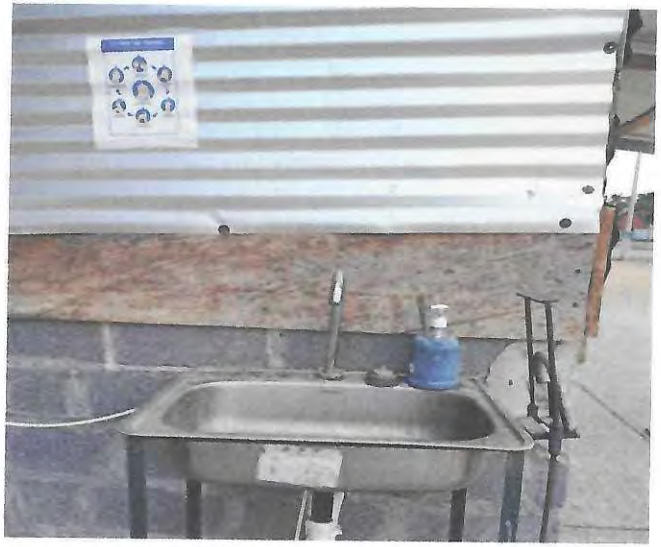



MONTERÍA 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	NO PREVISTOS
ITEM	NP01	BAÑO PROVISIONAL EN ZINC; INCLUYE MUROS EN ZINC, SANITARIO, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y PUERTA EN ZINC	UNIDAD: UND

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
NP01	BAÑO PROVISIONAL EN ZINC; INCLUYE MUROS EN ZINC, SANITARIO, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y PUERTA EN ZINC	UND								0.00
									2.00	2.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										2.00
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										2.00


BAÑO

MONTERÍA / 56	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 2

DEPARTAMENTO	CORDOBA	MUNICIPIO	MONTERIA	FECHA	31/01/2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56	CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022		
INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CONTRATO No:	CMA-SPM-016-2022		
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"				

CAPITULO	P. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	SUBCAPITULO	NO PREVISTOS
ITEM	NP02	CERRAMIENTO PROVICIONAL EN ZINC H=2.00 M	UNIDAD: M

# ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	VOL ACUMULADO
			ESTRUCTURA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ESPESOR PROMEDIO (m)	PESO (KG)		
NP02	CERRAMIENTO PROVICIONAL EN ZINC H=2.00 M	M								0.00
					173.98					173.98
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
										0.00
TOTAL ÍTEM										173.98
ACUMULADO ANTERIOR										0.00
PRESENTE ACTA										173.98







ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:		PROYECTO U OBRA:	
CONSORCIO CIS 56		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.	
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	NP-002	UNIDAD:	M
CERRAMIENTO PROVICIONAL EN ZINC H=2.00 M			

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario
HERRAMIENTAS MENORES 5% DE LA MANO DE OBRA				$ 889,00
			Sub-Total	$ 889,00

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario
TEJA ZINC ONDULADA 2.134X0.80MT CAL 34 0.20MM	m2	$ 15.463,00	1,50	$ 23.195,00
LISTON 2 X 4 X 4.5	un	$ 30.000,00	0,50	$ 15.000,00
LISTON 2 X 2 X 4.5	un	$ 15.000,00	0,40	$ 6.000,00
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5	un	$ 7.500,00	0,30	$ 2.250,00
CLAVO CON CABEZA 2PGX12 10UND	lb	$ 3.300,00	0,10	$ 330,00
CLAVO CON CABEZA 2-1/2PGX11 10UND	lb	$ 3.500,00	0,10	$ 350,00
Desperdicio 5%		$ 47.125	5%	$ 2.356,00
			Sub-Total	$ 49.481,00

3. Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario
				Sub-Total	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE	$ 33.334	$ 26.667	$ 60.001	7,2436	$ 8.283,00
OFICIAL DE OBRA	$ 40.000	$ 28.800	$ 68.800	7,2436	$ 9.498,00
				Sub-Total	$ 17.781,00

5. Costos Indirectos

Total Costos Indirectos: $ 68.151,00

Descripción	Porcentaje	Vr.Unitario
Administracion		$ -
Imprevistos		$ -
Utilidad		$ -
	Sub-Total	$ -

Valor Unitario Total :	68.151,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
CONSORCIO CIS 56	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: UND
BAÑO PROVISIONAL EN ZINC; INCLUYE MUROS EN ZINC, SANITARIO, TUBERÍA HIDROSANITARIA Y PUERTA EN ZINC	

1. Equipos

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario
HERRAMIENTAS MENORES 5% DE LA MANO DE OBRA				$ 1.004,00
			Sub-Total	$ 1.004,00

2. Materiales en Obra

Descripción	Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario
TEJA ZINC ONDULADA 2.134X0.80MT CAL 34 0.20MM	m2	$ 15.463,00	7,00	$ 108.241,00
LISTON 2 X 4 X 4.5	un	$ 30.000,00	0,50	$ 15.000,00
LISTON 2 X 2 X 4.5	un	$ 15.000,00	0,50	$ 7.500,00
VARETA BLANCA 2 X1 X4.5	un	$ 7.500,00	0,50	$ 3.750,00
CLAVO CON CABEZA 2PGX12 10UND	lb	$ 3.300,00	0,20	$ 660,00
CLAVO CON CABEZA 2-1/2PGX11 10UND	lb	$ 3.500,00	0,20	$ 700,00
SANITARIO BLANCO (ECONOMICO)	un	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00
TUBO SANITARIO 4"	m	$ 19.650,00	0,50	$ 9.825,00
CODO 90° SANITARIA 4	un	$ 13.900,00	1,00	$ 13.900,00
TUBO PRES RDE 13.5 1/2"	m	$ 2.483,00	1,00	$ 2.483,00
CODO 90° PRESIÓN PVC 1/2	un	$ 1.100,00	1,00	$ 1.100,00
ADAPTADOR MACHO 1/2	un	$ 500,00	1,00	$ 500,00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	un	$ 89.900,00	0,07	$ 6.216,00
Desperdicio 5%		$ 319.875	0%	$ -
			Sub-Total	$ 319.875,00

3. Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario
				Sub-Total	$ -

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario
AYUDANTE	$ 33.334	$ 26.667	$ 60.001	6,413909975	$ 9.355,00
PLOMERO	$ 40.000	$ 28.800	$ 68.800	6,413909975	$ 10.727,00
				Sub-Total	$ 20.082,00

5. Costos Indirectos

Total Costos Indirectos: $ 340.961,00

Descripción	Porcentaje	Vr.Unitario
Administracion		$ -
Imprevistos		$ -
Utilidad		$ -
	Sub-Total	$ -

Valor Unitario Total :	340.961,00
