IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTRATACION			
	LISTA DE CHEQUEO PAGOS PARCIALES DE CONTRATOS OBRA E INTERVENTORIA			
	Codigo:FR-GCO-88	Vigencia:27/04/2022	Versión:1	Pagina: 1 de 1

CONTRATO No. 414 DE 2022	9	11	AÑO	2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA : INTERCONDI SAS

PERIODO DEL INFORME DESDE	DIA	18	MES	11	AÑO: 2022
HASTA	DIA	15	MES	3	AÑO: 2023

No	FORMATO	DOCUMENTO/TRAMITE	DOCUMENTOS					RESPONSABLE
			AF	CONT	SI	NO	N/A	
1	FR-GCO-88	Verificación de la lista de Chequeo	X		X			Interventor Supervisor designado
2		Copia Minuta de contrato	X		X			Interventor Supervisor designado
3		Copia del certificado de registro presupuestal	X		X			Interventor Supervisor designado
4		Factura	X		X			Contratista
5		Rut Primera Cuenta	X		X			Contratista
6	FR-GCO-81	Informe de actividades del contratistas	X		X			Contratista
7	FR-GCO-83	Certificación de cumplimiento	X		X			Supervisor designado
8	FR-GCO-86	Certificación de pago de seguridad Social	X		X			Supervisor designado
9		certificado del revisor fiscal (incluir soportes del revisor)	X		X			Contratista
10		Verificación pago seguridad social integral Salud, pensión y riesgos Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago	X		X			Supervisor designado
11		Informe de supervision	N/A					Supervisor designado
12	FR-GCO-82	formato de pago parcial	X		X			Interventor Supervisor designado
13	FR-GCO-98/ FR-GCO-85	Acta parcial	X		X			Interventor Supervisor designado
14		Memorias de calculo	N/A				X	contratista e interventoria
15		Legalizacion del plan de invesión para el primer pago	N/A				X	contratista e interventoria
16		Certificado y consignación de rendimientos financieros					X	contratista e interventoria

NOTA: Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva

ALVARO PATIÑO MONTOYA
SUPERVISOR

CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER VILLAVICENCIO
NIT	822.000.538-2
CONTRATISTA	INTERCONDI S.A.S.
NIT N°	901199491-6
REPRESENTANTE LEGAL	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
C.C.	1.020.797.397 de Bogotá D.C.
OBJETO	"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
VALOR	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE.
PLAZO	DOS (02) MESES Y CINCO DIAS o hasta el 30 de diciembre de 2022, contados a partir del acta de inicio.

Entre los suscritos, a saber: **ALVARO PATIÑO MONTOYA,** mayor de edad, con domicilio en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 16.280.669 de Palmira, en su condición de representante legal del **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER** NIT 822.000.538-2, nombrado mediante Decreto N° 1000-24/269 del 26 de julio de 2022 y posesionado mediante acta N° 1100-04.83/032 del 27 de julio de 2022, facultado para contratar en nombre y representación del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio, quien en adelante se denominará EL **INSTITUTO**, por una parte; y por la otra, **INTERCONDI S.A.S.** identificada con NIT. 901199491-6, representada legalmente por señor **DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO**, identificado con C.C. 1.020.797.397 de Bogotá D.C., con domicilio en la Calle 19 #41-39 Villavicencio-Meta, Cel: 3228885459, Email: intercondisas@gmail.com, quien para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE INTERVENTORIA** teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **I.** La constitución política en el artículo 2 señala que "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (...)".. **II.** Que el artículo 311 de la Constitución Política, establece que, "Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes". **III.** Que El artículo 52 de la Constitución Política de Colombia reconoce el derecho que tienen todos los colombianos a la recreación, el deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. **IV.** Que Este principio es desarrollado en la Ley del Deporte, Ley 181 de 1995, que clasifica al deporte como un derecho social y un factor básico en la formación integral de la persona. De acuerdo con el capítulo 4 de la mencionada Ley, el fomento, desarrollo y práctica de las actividades deportivas y de recreación está regida por los siguientes principios, Universalidad, Participación comunitaria,

Participación ciudadana, Integración funcional, Democratización y Ética deportiva. **V.** La Ley define también las entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, a saber: el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre - MINDEPORTES, como ente rector del Sistema, el Comité Olímpico Colombiano, el Comité Paralímpico Colombiano y las Federaciones deportivas; las ligas deportivas, así como las asociaciones y los clubes deportivos. **VI.** Que el "Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión (...). **VII.** En lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad", éste contempla las políticas relacionadas con el sector del deporte, las cuales están orientadas a la formación de ciudadanos integrales para la convivencia pacífica a través de la construcción de proyectos de vida en torno al deporte y el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas, entre otras. **VIII.** Teniendo en cuenta la Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. En el Artículo 3°. Funciones de los municipios numeral 3. "Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal". Numeral 7 "Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de especial protección constitucional". **IX.** Por su parte la ley 136 de 1994 prescribe en el artículo 3° que son funciones del municipio "5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados directamente y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la nación, en los términos que defina la ley". **X.** En lo que respecta al Plan de Desarrollo Municipal "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023" el cual "busca garantizar los derechos de sus ciudadanos, haciendo énfasis en los derechos a la salud, educación, seguridad, igualdad de género y deporte y recreación. Esto con miras a construir una ciudad de derechos para los hogares y los ciudadanos, sin distinción de edades, sexos, pueblos y credos.". **XI.** El sector de deporte y la recreación dentro Plan de Desarrollo Municipal "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023" es "Vista...como un proceso de desarrollo, mejoramiento y conservación de las capacidades, aptitudes y actitudes motrices de los miembros de una comunidad y estableciéndose como un parámetro para el logro de hábitos de vida saludable para el fomento y promoción de la práctica del deporte y la recreación en el IMDER junto con las escuelas de formación deportiva, programa de carácter formativo, donde los niños, niñas y jóvenes pueden iniciar el aprendizaje, fundamentación, perfeccionamiento y especialización de uno o varios deportes afianzando su formación integral como personas y deportistas. Se han constituido en el eje y motor principal del Deporte que el Municipio de Villavicencio ha liderado a través del Instituto de Deporte y Recreación Municipal IMDER. **XII.** El artículo 70 de la Ley 181 de 1995, por medio de la cual se estimula el "fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte", establece que los municipios tendrán a su cargo la construcción, administración, mantenimiento y adecuación de los escenarios deportivos. **XIII.** Mediante el acuerdo 057 de 1995 se creó el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio -IMDER-; dentro de sus funciones se le asignó definir el manejo,

administración y funcionamiento de los escenarios deportivos y recreativos del municipio que se encuentren bajo su custodia o aquellos que hayan sido cedidos en su administración o control. **XIV.** En referencia a los escenarios recreo-deportivos del municipio de Villavicencio, el IMDER a través del seguimiento y caracterización a la infraestructura deportiva de la ciudad ha evidenciado que el principal problema es el mal estado de los escenarios no aptos para la integración social, comunitaria, recreación y deporte, generado por la falta de inversión institucional en el mantenimiento de escenarios; la baja presentación de proyectos de construcción y/o mejoramiento de este tipo de escenarios y problemas en la titularidad de los predios destinados para los mismos. Lo anterior hace que se presenten escenarios en mal estado e ineficientes para la integración social, recreación y deporte; inexistencia de escenarios óptimos al servicio de la comunidad y la no ejecución de proyectos o aprobación de los mismos. **XV.** La anterior necesidad se genera debido a que los espacios públicos para la recreación, la actividad física y el deporte son insuficientes e inadecuados para la población que restringe la capacidad para practicar algún deporte, realizar actividades recreativas o que desea aprovechar su tiempo al aire libre. **XVI.** Lo anterior, conlleva al bajo interés de los villavicenses en realizar actividad recreativas y deportivas, a que exista un inadecuado uso del tiempo libre, bajo esparcimiento individual y en familia que conllevan al aumento de los niveles de sedentarismo a nivel municipal. **XVII.** Conforme a las necesidades encontradas en la falta de mantenimiento y/o mejoramiento de los escenarios deportivos, de recreación y ocio, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER ve la necesidad de realizar la inversión a 15 escenarios recreo-deportivos de Villavicencio los cuales les fue consultada la titularidad del predio a nombre del municipio de Villavicencio con su respetiva cedula catastral y número de matrícula inmobiliaria, es de mencionar que estos escenarios se encuentran cedidos o bajo custodia del instituto. **XVIII.** La Constitución Política de Colombia, en su Título II, "De los derechos, las garantías y los deberes"; Capitulo II, "De los derechos sociales, económicos y culturales", establece en forma clara, que los derechos de los niños, son prevalentes sobre los demás derechos, colocándolos así, en nuestro sentir, como aquellos que merecen todo el esfuerzo y atención no solo del Estado, sino también de parte de los particulares, para garantizar su efectiva aplicación y respeto. **XIX.** Es tal la relevancia que le da la Asamblea Nacional Constituyente a los derechos fundamentales de los niños, que enuncia aquellos que, a su juicio, y dentro de lo establecido en el derecho internacional, deben ser prioritarios e inalienables. Estos son: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Además de esto ordena una protección especial, no solo de los derechos contemplados en la Carta Política, sino que también en forma taxativa cobija los preestablecidos en las Leyes y los tratados internacionales, ratificados por nuestro Estado, tal y como lo consigna el Art. 44. **XX.** Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. **XXI.** El municipio de Villavicencio mediante el Plan de Desarrollo Municipal "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023", busca beneficiar a la población con escenarios de recreación y deportivos generando espacios de aprovechamiento del tiempo libre y habito de estilos de vida saludable para la población. **XXII.** Tener escenarios deportivos adecuados, es suplir la falta de ambientes propicios para la recreación, el deporte y desarrollo del pensamiento en los niños y jóvenes de una

sociedad. **XXIII.** El Municipio de Villavicencio en la actualidad cuenta con una infraestructura física para la recreación y el deporte de los niños y jóvenes, no obstante, los equipamientos existentes están en avanzado estado de deterioro, por lo cual, se requiere habilitar los escenarios a través del mejoramiento y adecuación, habilitando espacios recreativos, artísticos y culturales para los niños y jóvenes, así como también polideportivos con espacio social para el desarrollo de múltiples deportes, el cual tiene como beneficiarios principalmente los habitantes de los barrios Vizcaya 1, Guatapé, san Jorge IV, santa fe, kirpas, doce de octubre, villa Mélida, villa del palmar, villa Alejandra, Canaima 2, divino niño, la carolina, hacaritama, la coralina y Ariguaní, y demás barrios aledaños. Con esta inversión en este sector del área urbana del municipio, se pretende generar un efecto positivo con enfoque deportivo y recreativo en la integridad física de los niños, niñas, adolescentes y comunidad general. **XXIV.** El municipio, propende por la satisfacción de las necesidades básicas de la población, y en cumplimiento de ello, el instituto está interesado en encaminar sus acciones a desarrollar programas, proyectos y actividades en la búsqueda del bienestar de la población. El municipio dentro de su plan de desarrollo "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023" pretende realizar el mantenimiento, mejoramiento y adecuación de 15 escenarios recreo-deportivos, incentivando la recreación y el deporte en la comunidad general del Municipio. **XXV.** Dentro del Plan de Desarrollo Municipal "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023" (Acuerdo 410 de 2020) por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Villavicencio (Meta) así: EJE ESTRATÉGICO: (5) ciudad garante de derechos, LÍNEA: (4) gestión, construcción y mantenimiento de escenarios recreodeportivos y de la actividad física, PROGRAMA: 2, mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva META PRODUCTO: Construir Mejorar y/o Adecuar Escenarios Deportivos Para La Práctica Deportiva, Recreativa Y Aprovechamiento Del Tiempo Libre. META RESULTADO: (233) Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER. **XXVI.** Que el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER a través de la Subdirección Técnica desarrolló los respectivos estudios previos.**XXVII.** Que se adelantó la etapa de Pre-Pliegos de Condiciones y cronograma de actividades, los cuales estuvieron disponibles para consulta en la página del SECOP II www.contratos.gov.co en los términos de ley. **XXVIII.** Que, en el periodo comprendido entre el 13 al 20 de octubre del 2022, se presentaron tres (03) observaciones al proyecto pliego de condiciones del proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2022, las cuales fueron respondidas en el termino oportuno. **XXIX.** Que mediante Resolución Administrativa N° 201 del 21 de octubre de 2022, se ordenó la apertura del Proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2022 y la publicación en la página Web del SECOP II www.contratos.gov.co de los pliegos definitivos y el cronograma previsto para el desarrollo del mismo. **XXX.** Que durante el 21 de octubre de 2022, no se presentaron observaciones al pliego de condiciones definitivo del proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2021. **XXXI.** Que efectuada la apertura de los requisitos habilitantes conforme a lo preceptuado en el decreto 1082 de 2015, y realizado el debido procedimiento, el día 25 de octubre del 2022 a las 9:00 AM., se llevó a cabo la audiencia de cierre de la convocatoria y apertura de propuestas de los requisitos habilitantes del proceso de CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2022, de la cual quedo el registro en la plataforma del SECOP II. **XXXII.** Que al proceso de selección se presentaron DOS (02) propuestas así: 1) **INTERCONDI S.A.S.**, identificada con NIT No. 901199491-6, representada legalmente por DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.020.797.397 de Bogotá D.C., y 2) **CONSORCIO RECREO DEPORTIVO**, representado legalmente por JUAN CAMILO POSADA VARELA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.094.921.302 de Armenia, el cual se encuentra conformado por INTERCONS DE COLOMBIA SAS identificado con N.I.T

900849552-3 con un porcentaje de participación del 75%, y el OMICRON DEL LLANO S.A.S., identificado con N.I.T 900204854-4 con un porcentaje de participación del 25%. **XXXIII.** Que, conforme al cronograma del proceso, se procedió por parte del comité designado para tal fin, a verificar los requisitos habilitantes de las propuestas presentadas, siendo las mismas publicadas en la página la plataforma del SECOP II www.contratos.gov.co. **XXXIV.** Que el informe preliminar de verificación de los requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas permaneció a disposición de los interesados y de los veedores en la página del SECOP I www.contratos.gov.co. **XXXV.** Que, dentro del proceso de verificación el proponente **INTERCONDI S.A.S.**, resulto **INHABILITADO** jurídicamente, **HABILITADO** técnica, económica, financiera y organizacionalmente. **XXXVI.** Que, dentro del proceso de verificación el proponente **CONSORCIO RECREO DEPORTIVO**, resulto **HABILITADO** jurídicamente, **INHABILITADO** técnica y económicamente, HABILITADO financiera y organizacionalmente. **XXXVII.** Que durante el termino de traslado y presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, durante tres (03) días hábiles, desde el día 27 de octubre hasta 01 de noviembre del 2022. **XXXVIII.** Que, durante este periodo, el proponente **INTERCONDI S.A.S.** envió subsanación a través de la plataforma del SECOP II para la verificación final, la entidad dio respuesta el 04 de noviembre de 2022, publicando el INFORME DE FINAL DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION. **XXXIX.** Que se tiene que el proponente **INTERCONDI S.A.S.**, subsanó los requerimientos realizados en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes, siendo HABILITADA. **XXXX.** Que como resultado de la evaluación de los factores de ponderación establecidos en el pliego de condiciones del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2022. **XLI.** Que una vez verificada y habilitada la propuesta presentada por **INTERCONDI S.A.S.**, el comité evaluador procedió a realizar, la ponderación y calificación de los factores de evaluación que se relacionan a continuación, en donde el proponente obtuvo el puntaje de 98 puntos sobre 100 puntos. **XLII.** Que, conforme a lo anterior, el comité asesor recomendó al Director de la entidad acoger los informes de verificación y evaluación y el de consistencia de la propuesta económica y en consecuencia adjudicar el proceso de Concurso de Méritos Abierto N° CM-001-2022, adelantada por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio – IMDER, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO",** al proponente **INTERCONDI SAS**, identificada con NIT No. 901199491-6, representada legalmente por DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO, identificado con cedula de ciudadanía No 1.020.797.397 de Bogotá D.C., por un valor de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE XLIII.** Que el objeto a contratar se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones. **XLIV.** Que el presente proyecto a contratar cuenta con Banco de Proyectos del INSTITUTO BPPIM 2020-050001-0259 / 2020-050001-0285. **XLV.** Que por medio de Resolución No 208 del 08 de noviembre de 2022 *"Por medio de la cual se adjudica un contrato correspondiente al proceso de Concurso de Méritos Abierto N° CMA – 001 - 2022", se* adjudicó el presente Contrato, el cual se regirá por la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del Contrato es: **"INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".** La interventoría a desarrollar tiene

como especificaciones técnicas las señaladas en el pliego de condiciones definitivo y la propuesta presentada por el contratista. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. **CLAUSULA SEGUNDA - DEFINICIONES:** Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio:

Definiciones	
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución de la obra pública objeto del presente Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de la obra.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el interventor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada [En caso que las obligaciones contractuales se pacten con ítem de obra]
Anexo Técnico	Es el documento anexo al presente Contrato en el que se describen las especificaciones técnicas de construcción y/o mantenimiento, presupuesto, alcance del proyecto, localización y área de influencia y actividades y cualquier otra que las partes consideren relevante.
Contratante	Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio – IMDER
Contratista	INTERCONDI S.A.S. representado legalmente por DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO, identificado con C.C. 1.020.797.397 de Bogotá D.C.
Contrato	Es el presente acuerdo de voluntades.

CLAUSULA TERCERA – DESCRIPCION DEL OBJETO DEL CONTRATO: Con el cumplimiento del presente objeto se pretende realizar la contratación de la interventoría al Contrato de Obra resultante del proceso de contratación LP-001-2022, con objeto: "MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO", adelantado por la modalidad de selección de Licitación Pública que se viene adelantando en la Plataforma SECOP II por parte de la entidad. El interventor que se contrate deberá cumplir con la función principal de controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar el cumplimiento a cabalidad de las actividades de carácter técnico, legal, administrativa, ambiental y contable del contrato de obra desde su iniciación, durante su ejecución y hasta la liquidación del contrato; debiendo para ello tener en cuenta el cumplimiento en obra de los diseños, especificaciones y planos aprobados. **ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO:** Con la ejecución del objeto contractual producto de los actuales estudios, se pretende dar cumplimiento a lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal "Villavicencio Cambia Contigo 2020-2023", de acuerdo con las siguientes metas de producto e indicadores:

EJE ESTRATEGICO 5:	Ciudad Garante de Derechos
PROGRAMA:	17. Ciudad Activa
META:	233 "Realizar mantenimiento y mejoramiento a la infraestructura deportiva, recreativa y administrativa a cargo del IMDER".

PRODUCTO:	64
INDICADOR DE PRODUCTO	"Infraestructuras deportivas, recreativas y administrativas mejoradas"
NOMBRE DEL PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RECREATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."
CÓDIGO BPPIM / BPIN	2020-050001-0259 / 2020-050001-0285

Para tal efecto la Secretaria de Planeación Municipal expidió el Certificado No. 1351-60/3249 del 19 de agosto de 2022, en el cual consta que el anterior proyecto se encuentra registrado en el banco de programas y proyectos de inversión municipal contenido en **PLAN DE DESARROLLO: "VILLAVICENCIO CAMBIA CONTIGO 2020-2023"** en el 4. SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN, con **RUBRO PRESUPUESTAL:** 2.3.43.4301.1604.0259.03.2.02.02.008.01. **ESPECIFICACIONES TECNICAS.** Para dar cumplimiento a las actividades descritas en el proyecto, se deberá tener en cuenta por parte del contratista las especificaciones técnicas requeridas para el desarrollo del contrato, con el fin de obtener resultados óptimos de calidad. El IMDER realizará la supervisión de tal forma que cada actividad desarrollada se ajuste a dichas directrices incluyendo las especificaciones técnicas. En este orden de ideas, el contratista deberá realizar la Interventoría de la Obra con base en los documentos técnicos del contrato de obra que detallen las obras a realizar, las cuales entonces también constituyen las especificaciones técnicas del presente contrato, y para lo cual deberá cumplir con las obligaciones generales y especificas descritas en la clausula octava. **CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del Contrato es la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE,** IVA incluido, conforme a la propuesta, la cual hace parte integral de este contrato según sus valores unitarios así:

PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA							
1. COSTOS DE PERSONAL							
ITEM	CATEGORIA	CARGO	DEDICACION (hombre - mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR TOTAL
A	**PERSONAL PROFESIONAL**	**PERSONAL PROFESIONAL**					
1	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	10%	1	2,17	$ 4.100.000,00	$ 889.700,00
2	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	1	2,17	$ 3.331.342,62	$ 7.229.013,49
3	INGENIERO SISO O PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%	1	2,17	$ 2.200.000,00	$ 4.774.000,00
B	**PERSONAL TECNICO**	**PERSONAL TECNICO**					
1	INGENIERO JUNIOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	100%	1	2,17	$ 1.245.876,00	$ 2.703.550,92
2	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	25%	1	2,17	$ 1.539.775,00	$ 835.327,94
3	CADENERO	CADENERO	25%	1	2,17	$ 1.143.960,00	$ 620.598,30
A+B	**SUBTOTAL PERSONAL**	**SUBTOTAL PERSONAL**					**$ 17.052.190,64**
FACTOR MULTIPLICADOR (FM)							2,2
C	**SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B+C) * FM**						**$ 37.514.819,41**
2. COSTOS DIRECTOS							

ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR	VALOR TOTAL
1	Vehículo Campero Pick - Up, Camioneta (incluye conductor y combustible)	ALQUILER DE CAMIONETA DE CILINDRAJE 1300 A 2000 CC	MES	1	2,17	$ 2.150.595,06	$ 4.666.791,28
2	Equipo de Topografía	ALQUIER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIONES, NIVELES DE PRECISION, GPS, ENTRE OTROS)	MES	1	0,54	$ 2.216.990,45	$ 1.197.174,84
3	Laboratorio	LABORATORIOS INTERVENTORIA (Incluye Equipo Completo y Entrega de informes de Ensayos y Resultados)	MES	1	2,17	$ 1.610.000,00	$ 3.493.700,00
D	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 9.357.666,12
							$ 46.872.485,54
E	TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (D+E)						$ 8.905.772,25
F	IVA 19% SOBRE (F)						$ 55.778.257,79
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F)						$ 55.778.257,79
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (F+G) REDONDEADO						

FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado por el **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER** al contratista mediante actas parciales, conforme al avance de ejecución de la obra intervenida según lo avalado por la interventoría, sin superar el ochenta (80%) por ciento del valor del contrato, el saldo restante es decir el veinte (20%) por ciento se pagará con la suscripción del recibo del acta final y de liquidación, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: - Informe final de la supervisión, - Informe de la interventoría, - Suscripción del acta de recibo final de obra, - Cumplimiento de aportes al Régimen de Seguridad Social en Salud, - Certificados de cumplimiento por parte del interventor, - Suscripción del acta de Liquidación del contrato. En todo caso, cada pago estará sujeto a la aprobación del Programación Anual Mensualizada de Caja -PAC-, y con cada cobro deberá presentar los requisitos anteriormente descritos conforme al avance de ejecución. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 las cuentas que presente el contratista serán tramitadas en el estricto orden que le corresponda según la fecha de radicación. **CLAUSULA QUINTA - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** El INSTITUTO pagará al Contratista el valor del presente Contrato según Certificado de Disponibilidad, N° 516 del 11 de octubre 2022, **por un valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($55.806.663,09) M/CTE,** así:

FUENTE	*CÓDIGO PRESUPUESTAL*	*PROYECTO*	*CDP No.*	*VALOR*
I.C.D.E	*2.3.43.4301.1604.0-259.03.2.02.02.008*	*MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META*	*516*	*$55.806.663*
TOTAL				*$55.806.663*

CLAUSULA SEXTA - DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista hace las siguientes declaraciones: **1.** Conoce y acepta los Documentos del Proceso. **2.** Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió del INSTITUTO respuesta

oportuna a cada una de las solicitudes. **3.** Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. **4.** Conoce las consecuencias de incumplir el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo N° 6 del Pliego de Condiciones definitivo. **5.** El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. **6.** El valor del Contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. **7.** El Contratista durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las actividades necesarias para la ejecución final de la obra, cumpliendo con el Cronograma presentado en el marco del presente Contrato y aprobado por la interventoría. **8.** El Contratista al momento de la celebración del presente Contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. **CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución es de **DOS (02) MESES y CINCO (05) DÍAS** o hasta el 30 de diciembre de 2022, contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato; circunstancias estas que se entienden cumplidas con la suscripción del contrato y expedido del registro presupuestal, aprobación de las pólizas por parte del INSTITUTO, y la suscripción del acta de inicio. **CLAUSULA OCTAVA - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: GENERALES.** 1) Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica, administrativa, financiera, contable y Jurídica y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del Interventor o sus empleados con el INSTITUTO. 2) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante las constancias de pago. 3) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 4) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 5) Dar cumplimiento al Plan de trabajo, presentado y aprobado por el supervisor. En caso de requerirse ajuste al mismo, deberá presentar la justificación que soporta dicha solicitud y la respectiva propuesta, siempre y cuando esta no sea de inferior calidad, requerimientos y obligaciones. 6) Asistir a las reuniones que se programen en el desarrollo de la Interventoría. 7) Desarrollar la interventoría con el equipo de trabajo propuesto. El INTERVENTOR sólo podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo del contratista previa autorización escrita del supervisor designado por la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. Dicho reemplazo solo se autorizará por causas debidamente justificadas. 8) Contar con vehículos necesarios para realizar desplazamientos al sitio de la obra y los demás que se requieran para el cumplimiento de las actividades de interventoría y supervisión del contrato de obra. 9) Diligenciar y actualizar la base de datos o sistemas de información que el INSTITUTO establezca como medio de control y seguimiento al proyecto. 10) Atender oportunamente los requerimientos y consultas que le realice el instituto. 11) Acatar de forma inmediata las indicaciones que el IMDER le señale a la interventoría en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar. 12) Presentar informes mensuales y final de interventoría, los cuales deberán contener la siguiente información: a. Área Técnica: 1. Descripción y cantidades de las actividades ejecutadas. 2. Gráficos de cantidades de obra 3. Control de programación 4. Control de equipos 5. Resumen de modificación de cantidades de obra y especificaciones 6. Resultados de ensayos y pruebas 7. Comentarios y recomendaciones b. Área Administrativa: 8. Actas de comités de

obra 9. Resumen del estado de contratos y subcontratos. 10. Información sobre personal, equipos e insumos. 11. Registro fotográfico c. Área Ambiental: 12. Seguimiento a la disposición de materiales. 13. Control de material particulado 14. Protección fuentes hídricas. d. Área Contable y Financiera: 15. Control de presupuesto e inversión 16. Reporte de multas y sanciones 17. Comentarios y recomendaciones. e. Información del Contrato de Obra e Interventoría: 18. Número del contrato 19. Objeto 20. Valor 21. Plazo 22. Vigencia de las garantías 23. Estado de las actas de pago parcial 24. Valor de las actas pagadas 25. Valor de las actas en trámite. **ESPECIFICAS:** 1) La interventoría deberá conocer los estudios técnicos y las especificaciones técnicas para poder llevar a cabo la ejecución y Vigilancia de las obras en los sectores donde se va a intervenir, deberá Informar al INSTITUTO en caso de inexistencia o falta de coherencia entre estos. 2) Verificar la existencia de las licencias y documentos requeridos para la ejecución del contrato de obra. 3) Establecer que las especificaciones particulares del contrato de obra y su cuantificación estén definidas y coincidan con los planos. 4) Conocer la propuesta presentada por el contratistas de obra, así como el contrato, pólizas, pliegos de condiciones y demás documentos. 5) Coordinar con el contratista de obra las actividades preliminares del contrato, tales como organización del sitio en cuanto a ubicación de oficinas y campamentos, almacenamiento de materiales y equipos, instalación de vallas de identificación, rutas, sitios de ingreso y salida de vehículos, señalizaciones, cerramientos provisionales y medidas ambientales y de seguridad industrial, en el caso de ser necesarios. 6) Exigir, recibir y aprobar en el plazo estipulado: Programación de trabajos, organigrama del personal de nómina y contratado, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos. 7) Verificar que los contratistas de obra vinculen el personal idóneo de conformidad con estipulado en el respectivo proceso. 8) Suscribir junto con el contratista de obra, las actas de iniciación, modificación, prórroga, suspensión, terminación, recibo y liquidación del contrato de obra correspondientes. 9) Realizar, junto con el contratista de obra, dentro de los cinco (05) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, una revisión de los estudios técnicos, especificaciones técnicas. 10) Abrir y llevar conjuntamente con del contratista de obra, una memoria diaria de la obra (Bitácora), anotar las acciones diarias, la celebración periódica de comités técnicos de obra o administrativos, los exámenes directos en obra, los conceptos u observaciones. 11) Exigir a el contratista de obra el inicio de los trabajos en las fechas programadas. 12) Responder al instituto, por cualquier retraso en el desarrollo del contrato, excepto si la causa es imputable al contratista de obra por incumplimiento o desacato de órdenes. 13) Revisar, antes y durante la ejecución del contrato de obra, las referencias topográficas (puntos topográficos, coordenadas y cotas), de tal forma que permitan al constructor localizar adecuadamente las obras sobre el terreno. 14) Exigir al contratista de obra, la permanencia de las referencias topográficas establecidas, su protección, traslado o reposición, cuando sea necesario. 15) Organizar comités técnicos de obra y/o administrativos para el contrato de obra, con participación del contratista y/o sus profesionales en obra, el ordenador del gasto o su delegado, el supervisor. 16) Exigir la calidad establecida contractualmente de materiales e ítems de construcción, mediante exámenes directos en las obras, análisis, pruebas y ensayos de laboratorio sobre los materiales o sobre su aplicación en el contrato de obra. 17) Exigir la aplicación y cumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias establecidas en el Código eléctrico colombiano NTC 2050, Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE, Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público RETILAP, Las normas del operador de red OR, NTC 4552 para protección contra rayos, y demás normas correspondientes y aplicables al caso. 18) Exigir el cumplimiento de las normas enunciadas en Urbanismo y Espacio Público a. Accesibilidad al medio físico: Ley 12 de 1987 y Manual de Accesibilidad al espacio público el transporte, modificada por la Ley 361 de 1997. b. Normas técnicas promulgadas por el Instituto

Colombiano de normas técnicas ICONTEC. 19) Aprobar o reprobar la iniciación y/o terminación de los ítems contratados en el proyecto. 20) Ordenar en las obras, la remoción y/o reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando el plazo respectivo. 21) Exigir el cumplimiento de la cantidad contratada para los ítems de construcción, conforme a mediciones diarias o periódicas de los ítems ejecutados y dejar constancia escrita para las obras. 22) Verificar directa y continuamente en las obras, la calidad y cantidad del personal, de acuerdo a lo establecido en la propuesta. 23) Verificar directa y continuamente en las obras, que el contratista de obra disponga de la maquinaria, equipos y el correcto funcionamiento de los mismos. 24) Verificar que el contratista de obra cumpla las normas de seguridad industrial, higiene, ambientales y requisitos para el manejo de impacto ambiental y urbano, las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscal. 25) Constatar respecto del personal que vinculen los contratistas de obra: a. Preferentemente contratación de personal de la región. b. Inscripción oportuna al sistema de seguridad social integral y parafiscales conforme a lo estipulado en el contrato y en la propuesta y exigir las constancias de pago mensual. c. Liquidación periódica, mensual o quincenal, de la nómina. d. Presentación del finiquito de las liquidaciones de su personal. e. Atención a sus reclamaciones. f. Cumplimiento de las normas de seguridad para operar vehículos, máquinas y herramientas. g. Señalización en aspectos de seguridad industrial, vial, etc. h. Reporte de los accidentes de trabajo a la EPS y a la ARL, dentro de las 24 horas siguientes. i. Cumplimiento de las normas en materia de salud ocupacional. 26) Solicitar al contratista de obra, informes mensuales sobre el cumplimiento de la programación, personal, frentes y cuadrillas de obra, inventarios de materiales y equipos e inversión de los anticipos. 27) Elaborar, acorde con los cortes mensuales de las obras, las actas de recibo parcial, las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista de la obra. 28) Elaborar, acorde con el contratista de obra, la revisión de precios para cada una de las actas de recibo, aplicando el sistema y los índices pactados. 29) Exigir el cumplimiento de las programaciones de las obras contratadas, pudiendo modificarse de común acuerdo con el contratista de obra, cuando por razones técnicas o, la naturaleza de la misma, se haga necesario, pero sin modificación el plazo pactado en el contrato. Cualquier modificación se informará al INSTITUTO, adjuntando la programación de obra y flujo de caja correspondiente. 30) Resolver las consultas que formulen el contratista de obra y hacer las observaciones necesarias. Las dudas que no pueda absolver o no sean de su competencia las remitirá oportunamente para consulta y decisión del INSTITUTO. 31) Remitir oportunamente al INSTITUTO los estudios modificatorios al contrato como adicionales al plazo, mayores cantidades de obra, obras complementarias o adicionales con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones. 32) En caso de obras complementarias o adicionales, suscribir en forma conjunta con el contratista de obra, actas de acuerdo de precios para aquellos ítems cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los análisis de precios unitarios, estudios de mercado. 33) Estudiar las solicitudes de ampliación del plazo, junto con los documentos técnicos que la justifiquen, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 34) Rendir concepto sobre las solicitudes de cambio de personal que realice el Contratista de la Obra, debiendo tener presente las mismas o mejores calidades e incluso obtener el mismo puntaje que recibió el profesional inicialmente propuesto en la oferta presentada al INSTITUTO, de conformidad con los pliegos de condiciones y la evaluación que para el efecto haya hecho la entidad 35) Remitir la solicitud justificada de suspensión temporal del contrato por fuerza mayor o caso fortuito y suscribir conjuntamente con el contratista de obra y la Supervisión el acta de suspensión temporal de cada contrato de requerirse. 36) Suscribir, junto con el contratista de obra, y la Supervisión las actas de reiniciación, dejando constancia del tiempo de suspensión temporal o paralización y del vencimiento final del contrato. 37) Estudiar la revisión o actualización de precios, para aprobación

del INSTITUTO o de la Supervisión y elaborar el acta que contenga los ajustes, cuando a ello hubiere lugar. 38) Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista de obra y supervisor delegado por el INSTITUTO, el acta de recibo final del contrato. 39) Presentar informes mensuales de interventoría sobre la ejecución del contrato de obra objeto de la vigilancia, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual, anexos, ensayos de laboratorio y los que solicite la Supervisión. 40) Presentar el informe final sobre la interventoría del contrato, incluyendo reseña fotográfica o documento audiovisual, ensayos de laboratorio y los que solicite la Supervisión. 41) Llevar un control técnico que deberá contener copia de todos los documentos derivados del seguimiento, como son: a. Análisis de precios unitarios de actividades no previstas. b. Cuadro de control de ajustes. c. Acta de cambio de especificaciones. d. Acta de fijación de precios no previstos cuando se presente e. Cuadro resumen de pruebas de laboratorio. f. Análisis unitarios de los ítems contratados. g. Correspondencia. h. Actas de comité técnico o de obra i. Equipo y personal utilizado por cada contratista de obra j. Informe ejecutivo sobre las actividades ambientales y técnicas del contrato. 42) Elaborar y aprobar la liquidación que debe presentar el contratista de obra y en desarrollo de ello, verificar: a. Actas de Recibo Final, acompañadas de la respectiva factura de los contratistas de obra, las cuales deberán ser firmada por el contratista, la interventoría y el supervisor designado por el instituto. b. Suscripción del Acta de liquidación del contrato de obra. c. Acta de Liquidación del contrato de obra, los cuales deberán ser firmadas por el contratista, la interventoría y el supervisor designado por el instituto. d. Verificar las modificaciones a los amparos de estabilidad de la obra. e. Cumplimiento de las obligaciones de seguridad social integral. 43) Garantizar que el ejecutor del contrato mantenga vigentes las pólizas y demás obligaciones contractuales durante el desarrollo del proyecto. 44) Dar concepto al INSTITUTO en relación con los posibles cambios en el contrato que puedan surgir en el desarrollo del proyecto. 45) Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir. 46) Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios, recomendaciones y demás trabajos que se requiera en desarrollo del contrato, proponiendo alternativas de solución para los inconvenientes que se presenten durante la ejecución de la obra. 47) Adoptar medidas que tiendan a solucionar eventuales controversias. 48) Revisión y Aprobación de los documentos que soporten las solicitudes de los pagos que realice el INSTITUTO a el Contratista del proyecto. 49) Informar inmediatamente se detecte las irregularidades que se puedan presentar en el desarrollo del contrato. 50) Responder por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al instituto derivados de la celebración y ejecución del contrato respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 51) Las demás que de acuerdo con los pliegos de condiciones le estén asignadas al cumplimiento del contratista y, las demás que por ley le correspondan. **PARÁGRAFO:** De conformidad con el Articulo 1, Parágrafo 3, Inciso 5 de la Ley 1882 del 15 de enero de 2018 , preceptúa : " (...) Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría. . **CLAUSULA NOVENA - DERECHOS DEL CONTRATISTA:** Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula cuarta del presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA - OBLIGACIONES DEL**

CONTRATANTE: 1. Coordinar la organización de los procesos técnicos, administrativos y financieros previos y demás trámites requeridos para la ejecución del contrato. **2.** Realizar oportunamente los desembolsos a favor del contratista, conforme a lo aquí señalado en la forma de pago y dentro de la cláusula del contrato. **3.** Suministrar al contratista la información y documentación requerida para el cabal cumplimiento de su labor. **4.** Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. **5.** Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **6.** Exigir al contratista le ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. **7.** Constituir las Reservas Presupuéstales necesarias para cumplir con sus obligaciones. **8.** Vigilar la debida y oportuna ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. **9.** Ejercer la supervisión del contrato desde la dependencia asignada o responsable. **10.** Aprobar las garantías exigidas. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS DEL CONTRATANTE: 1.** Hacer uso de las cláusulas excepcionales del Contrato. **2.** Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho consagrado a la Entidad contratante de manera legal o contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA** es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cláusula primera del presente Contrato, igualmente responsable por los daños que ocasionen sus empleados, consultores y/o profesionales, los empleados, consultores y/o profesionales de sus subcontratistas, al INSTITUTO en la ejecución del objeto del presente Contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. **CLAUSULA DECIMA TERCERA - TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL CONTRATO:** El INSTITUTO puede terminar el presente contrato en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por mutuo acuerdo expresado por escrito, **b)** Por incumplimiento del objeto del contrato, **c)** Por vencimiento de su vigencia, así mismo modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA CUARTA - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO:** Para adelantar el procedimiento tendiente a verificar los presuntos incumplimientos en los que pueda incurrir el contratista con relación a las obligaciones derivadas del presente contrato, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, respetando para el investigado y los terceros interesados en la decisión, el derecho fundamental al debido proceso. **CLAUSULA DECIMA QUINTA - MULTAS:** En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones legales y/o contractuales, el INSTITUTO, podrá imponer al CONTRATISTA, multas diarias sucesivas del 1 % del valor total del contrato no ejecutado, de acuerdo con el informe presentado por el interventor y/o supervisor, sin que estas sobre pasen el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. Las multas se harán exigibles cuando el contratista incumpla parcialmente cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, sin perjuicio de hacer exigible la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato cundo estas hayan sido pactadas. El pago de las multas y/o sanciones a que se refiere esta cláusula podrá exigirse directamente por el INSTITUTO si dicho pago no se hubiese efectuado durante el término de duración del contrato y se tendrá en cuenta al momento de su liquidación. En todo caso se dará cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. el contratista autoriza expresamente al EL INSTITUTO para que se le deduzca de cualquier pago que se le adeude, el valor correspondiente al apremio que resultare del citado procedimiento. **CLAUSULA DECIMA SEXTA - PENAL PECUNIARIA:** En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial, o de caducidad, el INSTITUTO hará efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) del valor del contrato

y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al INSTITUTO, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. Esta cláusula se hará exigible cuando a juicio del INSTITUTO y previo informe de la interventoría, el contratista incurra en incumplimiento del contrato. el contratista autoriza al INSTITUTO para descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma que éste último le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento pactada. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA - CADUCIDAD:** Previo requerimiento por escrito, EL INSTITUTO podrá declarar la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento definitivo, parcial o total imputable a EL CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del mismo o evidencie que puede conducir a su paralización. En caso que EL INSTITUTO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA - GARANTÍAS**: El Contratista debe presentar dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato una garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual a favor del INSTITUTO expedida en una compañía de seguros, legalmente establecida en el País, una póliza única a favor del INSTITUTO, que contenga los siguientes amparos:

GARANTIA	VALOR (%)	DURACIÓN
Cumplimiento	10% del valor del contrato	Esta garantía debe tener una vigencia mínima del plazo del contrato y seis (6) meses más hasta la liquidación del contrato.
Calidad del servicio.	10% del valor del contrato	Esta garantía debe tener una vigencia mínima del plazo del contrato y seis (6) meses más hasta la liquidación del contrato. Adicionalmente una vez se dé recibido a la obra objeto de la interventoría, el contratista deberá ampliar el plazo de este amparo por el término de la estabilidad de la obra
Pago de salarios y prestaciones sociales	5% del valor del contrato	Por el término de duración del contrato y tres (03) años mas
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	Por término igual al plazo del contrato.

PARAGRAFO : El contratista deberá aportar las pólizas en original, y su correspondiente recibo de pago deberá ser aportado en original, so pena de que la misma no sea aprobada por el **INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER** y suscrita por el Representante legal de la persona jurídica o el proponente plural o persona natural según sea el caso (Contratista). **CLAUSULA DECIMA NOVENA - INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El Contratista es una entidad independiente del INSTITUTO y en consecuencia, el INSTITUTO no es su representante, agente o mandatario, **EL CONTRATISTA** no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del INSTITUTO ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **CLAUSULA VIGESIMA - CESIONES:** El Contratista no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato sin la autorización previa y por escrito del INSTITUTO. Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el INSTITUTO está facultado a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente al ordenador del gasto del INSTITUTO y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo

el cumplimiento del Contrato, el INSTITUTO exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en la cláusula 18 del presente Contrato. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA,** NO puede subcontratar con cualquier tercero la ejecución de las actividades relacionadas con el objeto del presente Contrato. El Contratista debe mantener indemne a la Entidad Contratante de acuerdo con la cláusula vigésima cuarta. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR:** Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Las controversias o diferencias que surjan entre el contratista y la Entidad Estatal, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se resolverán empleando el siguiente procedimiento: Si en el término de ocho (8) días hábiles del no arreglo directo, y las Partes no llegasen a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. **CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** El contratista se compromete a exonerar y acuerda en forma irrevocable mantener indemne al INSTITUTO contra todo reclamo, demanda, acción legal, daño o responsabilidad y costos de cualquier tipo o naturaleza que se entable y pueda causarse o surgir por daños, lesiones a personas públicas o privadas, físicas o jurídicas o dependientes cualquiera fuera la causal del reclamo, responsabilidad que se mantendrá aun terminando el contrato por cualquier causa por él o su personal durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente contrato. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal, daño o responsabilidad contra el INSTITUTO por asunto que según el contrato sean responsabilidad del contratista se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas para mantener indemne al INSTITUTO y adelante los trámites para llegar a un acuerdo del conflicto. La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costos, sin que la enunciación sea limitativa. En cualquiera de los eventos previstos en este numeral si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del INSTITUTO este podrá hacerlo directamente previa comunicación escrita al contratista quién pagará todos los gastos en que la entidad incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, el INSTITUTO tendrá derecho a descontar tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de las actividades objeto del contrato o a utilizar otro medio legal. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las Partes deban hacer en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas sólo si son entregadas personalmente o por correo electrónico a la persona y a las direcciones indicadas a continuación:

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER	CONTRATISTA
Subdirección Técnica	INTERCONDI S.A.S.

Dirección: Carrera 41 – calle 5b Parque Urbanización Villa Bolívar.	Calle 19 #41-39 Villavicencio – Meta
Teléfono: 663 10 62	Teléfono: (608) 6615651, Celular: 3228885459
E-mail: contratacion@imdervillavicencio.gov.co	Email: intercondisas@gmail.com

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - SUPERVISION: La Vigilancia, Control y Supervisión de la ejecución del Contrato de interventoría, estará a cargo de la subdirección técnica; quien representará al INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER ante el CONTRATISTA, coordinará y tendrá la responsabilidad, entre otras, de velar por el cumplimiento del contrato, aceptar el trabajo desarrollado y autorizar su pago. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Conforme al artículo 1, del Decreto 392 del 26 de febrero de 2018, EL INTERVENTOR deberá garantizar el seguimiento durante la ejecución del contrato. De las condiciones del artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad. Las entidades estatales a través de los supervisores o interventores del contrato según corresponda, deberán verificar durante la ejecución del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta. El contratista deberá aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre. Esta verificación se hará con el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificará la vigencia de dicha certificación, de conformidad con la normativa aplicable. La reducción del número de trabajadores con discapacidad acreditado para obtener el puntaje adicional constituye incumplimiento del contrato por parte del contratista, y dará lugar a las consecuencias del incumplimiento previstas en el contrato y en las normas aplicables. El procedimiento para la declaratoria de incumplimiento de que trata el presente artículo deberá adelantarse con observancia a los postulados del debido proceso, en aplicación de los principios que rigen la actividad contractual teniendo presente los casos de fuerza mayor o caso fortuito. **CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA - ANEXOS DEL CONTRATO:** Los siguientes documentos hacen parte integral del presente Contrato: **1.** Estudios y documentos previos. **2.** Análisis del sector. **3.** El Pliego de Condiciones del proceso de selección N° CM-001-2022, sus anexos, adendas o cualquier otro Documento del Proceso. **4.** La Oferta presentada por el Contratista. **4.** Las actas, acuerdos, informes y documentos precontractuales **5.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal. **6.** Registro Presupuestal. **7.** Pólizas y sus aprobaciones. **8.** Los demás documentos que se den en el marco de la ejecución del presente contrato de interventoria. **CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes, y para su ejecución de la aprobación de garantía de que trata la cláusula décima octava, aprobación del contrato de fiducia, y suscripción del acta de inicio del presente Contrato. **CLAUSULA VIGESIMA NOVENA - REGISTRO Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. **CLAUSULA TRIGESIMA - CONFIDENCIALIDAD:** En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial. **CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN:** El presente contrato será objeto de liquidación bilateral dentro de los dentro de los cuatro (4) meses siguientes

a la fecha de terminación del plazo establecido en el contrato y el acta de recibo final, o en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. **PARAGRAFO:** Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, las partes deben liquidar el Contrato. En caso que el Contratista se oponga o no exista un Acta de Recibo Final, el Contratante puede liquidar unilateralmente el presente Contrato, dentro del término establecido en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. **CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** La ejecución del contrato se realizará en el Municipio de Villavicencio-Meta. **CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Por razones de fuerza mayor y/o caso fortuito u otros eventos considerados como excepcionales. Las partes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta donde conste tal evento, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. Cuando se reanude el contrato, se elaborará un acta por quienes firmaron la de suspensión. El interventor del contrato deberá informar en forma inmediata tanto al subdirector Técnico y a la oficina jurídica de los hechos de suspensión y reanudación del contrato. De igual forma, el CONTRATISTA se obliga a informar tal evento a la Compañía Aseguradora para efectos de la suspensión de la vigencia de la garantía única que ampara el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

Para constancia, se firma en el INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO – IMDER a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2022.

EL INSTITUTO,

ALVARO PATIÑO MONTOYA
Director General
Representante Legal

EL CONTRATISTA,

DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
C.C. No. 1.020.797.397 de Bogotá D.C.
INTERCONDI S.A.S.
NIT 901199491-6
Contratista

Elaboró: Nelson Peña
Cargo: Abogado – Contratista

Revisó: Carolina Carrillo
Cargo: Abogada - Contratista

Revisó: Omar Betancourt
Cargo: Abogado – Dirección

IMDER

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION DE VILLAVICENCIO - IMDER

PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Código: FR-AFI-17 | Vigencia: 06-03-2020 | Versión: 3 | Página 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Fecha expedición: 10 de Noviembre de 2022

Disponibilidad N°: 516 Vigencia: VIG

Dependencia

Numero: **506** Pág. 1

Tercero\Contratista: 901199491-6- INTERCONDI SAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA

NRO. 414

Código Cuenta	Clasificador	Descripción	Valor
2.3.43.4301.1604.-0259.03.2.02.02.0-08.01	I.C.D.E (Ingresos Corrientes Destinacion Especif.)/83310 - SERVICIOS DE ASESORÍA EN INGENIERÍA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	$55,778,257.79

Valor en letras

concepto: CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PES- **Total:** **$55,778,257.79**

INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

MARIA CATALINA RAMOS VALENCIA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

IMDER
Instituto Municipal de Deporte y Recreación

Villavicencio
CAMBIA CONTIGO

CONTRATO: INTERCONDI SAS CONT 414 DE 2022			
DESCUENTOS DE IMPUESTOS DE LEY IMDER - 2023			
DESCRIPCION	**Base**	**Porcentajes de retención**	**Valor**
ESTAMPILLAS			$ 37,460,708
PRO TURISMO 2%	-	2%	$ 749,214
PRO CULTURA 2%	-	2%	$ 749,214
ADULTO MAYOR 2%	-	2%	$ 749,214
IMPUESTO RETEICO 5X1000	305-7112	5	$ -
UNILLANOS 1%	$ 32,480,001	1%	$ 374,607
PRODEPORTE 1%		1.5%	$ -
PROHOSPITAL 1%	$ 32,480,001	1%	$ -
CONTRIBUCION OBRA PUBLICA 5%	0	5%	$ -
IVA DECLARADO (19%) 15%	15%	$ 7,117,535	$ 1,067,630
Otros descuentos del Proveedor		$ -	
RETENCIÓN EN LA FUENTE			
Compras generales (declarantes)	$ 1.026.000	2.50%	$ -
Compras generales (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Compras de combustibles derivados del petróleo	100%	0.10%	$ -
Compras de vehículos	100%	1%	$ -
Servicios generales (declarantes)	$152.00	4%	$ -
Servicios generales (no declarantes)	$152.00	6%	$ -
Servicios de transporte de carga	$152.00	1%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (declarantes)	$152.00	3.50%	$ -
Servicios de hoteles y restaurantes (no declarantes)	$152.00	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes muebles	100%	4%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Arrendamiento de bienes inmuebles (no declarantes)	$ 1.026.000	3.50%	$ -
Honorarios y comisiones (personas jurídicas)	100%	11%	$ 4,120,678
Honorarios y comisiones (no declarantes)	100%	10%	$ -
Contratos de Obra de Construcción	$1,026,000	2%	$ -

Especificaciones del Iva		
	Base	**Valor iva**
IVA 19%	$ 37,460,708.01	$ 7,117,535.00
IVA 5%	$ -	$ -
IVA 0	$ -	$ -
TOTAL	$ 37,460,708.01	$ 7,117,535.00
	$	44,578,243.01

SUBTOTAL	$ 37,460,708
IVA	$ 7,117,535
TOTAL DESCUENTOS	$ 7,810,558
VALOR A PAGAR	$ 36,767,685

Especificaciones Inventario	
Con entrada de Almacen	$ -
Sin entrada de Almacen	$ -
Dotacion de equipos	
TOTAL	$ -

Observaciones: Sin observaciones N/A

INTERCONDI
OBRAS CIVILES S.A.S

INTERCONDI S.A.S.

NIT 901199491-6
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764039997566
Fecha 22/11/2022 - 22/11/2023
Autorización de Facturación Electrónica del FEIN11 al FEIN50

Departamento	Fecha		
Meta	02	05	2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FEIN15

Cliente:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACION IMDER VILLAVICENCIO	**NIT:**	822000538	**Fecha de firmado:**	02/05/2023 10:32:51
Dirección:	CR 41 5 B PARQUE BARRIO VILLA BOLIVAR	**Departamento:**	Meta	**Teléfono:**	6631062
Email:	contabilidad@imdervillavicencio.gov.co	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Vencimiento:	Junio 02 del 2023	**Hora emisión:**	10:32:49	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	02/06/2023				

Total de Lineas: 1

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	001	1,00	Acta parcial 1 Contrato de Interventoria No. 414 de 2022 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ".	10	$37.460.708,01	$37.460.708,01

SON: (CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS UN CENTAVOS)

CUFE: 54165da6319cca6f6d6421adcdeab607a4f2627a9089ea940e548fbb2611b5cfffd8fa06020071ee75a7fb7e0eaaeae9

NOTAS:

SUBTOTAL:	$37.460.708,01
IVA	$7.117.535,00
TOTAL:	$44.578.243,01

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$37.460.708,01	19,00%	$7.117.535,00

Firma Digital: C9uCKxQJgys/f1jmyabeX7HOArWckokEGW60FKDKb/ezlwaINP9wC6FA1euP33tg
lRRUxgsZeee808M9ZzQgKnJfk7U3tA7NdeMJdkGS1/wD7YnS6y
T5LxDMk6krDo0Y kLM3mak6TcpNE+ROuTvc38uxGfjB8HZs74iexsSULcmikfiEVHnXkR/myUt/tg/1 79WMI1N8biYRonPmQvCmanZnZRBCCUq70gU
gbYNGMO+8C+GpO3qZKjHM5n+65heP JsFki7vl482KiXtZMgIgjSLNGsX3ayAEGF0lo0zNCgP3czNul0oPX4+A9qPCuffQ NFgKSPneWsLhLqSTz5GD
Cg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14853323301

(415)7707212489984(8020) 000001485332330 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
INTERCONDI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 54 D 183 50 IN 26

42. Correo electrónico intercondisas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 4 3 9 3 3 2	6 0 8 6 6 3 2 7 5 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 8 0 7 1 7	4 2 9 0	2 0 1 8 0 7 1 7	7 7 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 23 / 14 : 11: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ BUITRAGO DAVID RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853323301

(415)7707212489984(8020) 000001485332330 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 8 0 7 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 8 0 7 2 5	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 9 9 0 0 0 7	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia		
80. Desde	2 0 1 8 0 7 1 7	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 8 0 7 2 5		-
2	8 0	2 0 1 8 0 7 2 5		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 Hoja 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14853323301

(415)7707212489984(8020) 000001485332330 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 9 9 4 9 1	6	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 8 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 2 0 7 9 7 3 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	BUITRAGO	DAVID	RICARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 7 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 2 8 7 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RODRIGUEZ	BERMUDEZ	DAVID	LEONARDO ANDRES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado Bancario

Viernes, 28 de Abril de 2023

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INTERCONDI SAS identificado(a) con NIT 901199491, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05700000950	2018/09/20	ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1
18/11/2022 al 15/03/2023

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER DE VILLAVICENCIO META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 414 de 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

INFORME ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1

PERIODO:
18/11/2022 al 15/03/2023

CONTENIDO

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4
1. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4
2. INFORMACIÓN FINANCIERA 4
3. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA 5
3.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 5
3.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 7
4. PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 9
4.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 9
4.2 RELACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE INTERVENTORÍA 11
B. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA 12
5. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA. 12
6. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUPENSIONES. 12
7. INFORMACION FINANCIERA 14
8. CONTROL PROGRAMACION Y AVANCE FISICO DE OBRA 14
9. GRAFICA AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO DE OBRA 15
10. GRAFICA AVANCE FINANCIERO ACUMULADO VS FINANCIERO PROGRAMADO DE OBRA 16
11. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO 16
12. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE OBRA 16
12.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 16
12.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 18
13. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES. 19
13.1 PERSONAL DE OBRA POR FRENTE DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 19
13.1.1 ..... PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATISTA DE OBRA 19
13.2 RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA 22
14. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 23
14.1 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1 33
15. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL 35

15.1 ORGANIGRAMA PERSONAL DE INTERVENTORIA 35
15.2 ORGANIGRAMA PERSONAL DE OBRA 36
16. ACTAS SUSCRITAS 36
17. CONTROL DE CALIDAD 37
17.1 RESULTADOS DE LABORATORIO 38
18. ESTADO DEL TIEMPO 38
19. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR 41

INFORME GESTION DE INTERVENTORÍA

(18/11/2022 a 09/03/2023)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	414 de 2022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"
CONTRATISTA:	INTERCONDI S.A.S
NIT:	901.199.491-6
REPRESENTANTE:	DAVID RICARDO RODRÍGUEZ BUITRAGO
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	09 DE NOVIEMBRE DE 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
TERMINO DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2022 (35 Días)
FECHA REINICIO No. 1:	01 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA No. 1	03 DE FEBRERO DE 2023 (23 DIAS)
PRORROGA No. 2	24 DE FEBRERO DE 2023 (15 DIAS)
PRORROGA No. 3	13 DE MARZO DE 2023 (8 DIAS)
FECHA DE TERMINACION PREVISTA:	21 DE MARZO DE 2023

Tabla 1 Información básica del contrato de interventoría No. 414 de 2022

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS	CDP	RP	CDR
I.C.D.E. (ingresos corrientes destinación Especif.) / 83310 – Servicios de Asesoría en ingeniería	$ 55.778.257,79	516	506	
TOTALES	**$ 55.778.257,79**			
RELACIÓN DE PAGOS				

ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
	$ 44.578.243,01	ACTA PARCIAL No. 1 (En trámite)	15-03-2023
TOTALES	$ 44.578.243,01		
BALANCE DEL ANTICIPO			

Tabla 2 iinformación financiera contrato de interventoría 414 de 2022

3. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

3.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

La póliza única de cumplimiento en favor de entidades estatales No.30-44-101049760 fue expedida por la compañía, seguros del estado. El objeto de esta póliza es garantizar el pago de los prejuicios ocasionados por el incumplimiento a cargo del contratista derivados de contrato de interventoría No 414 de 2022 cuyo objeto es: interventoría técnica, legal, administrativas, ambientales y contables al mantenimiento, mejoramiento y adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio.

En el siguiente cuadro se muestran las vigencias de las garantías según suscripción, acta de inicio, acta de reinicio, acta de prorroga No. 1, acta de prorroga No. 2 y acta de prorroga No. 3 del contrato de interventoría 414 de 2022.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Suscripción	Seguros del estado s.a.	30-44-101017785	Cumplimiento del contrato	10/11/2021	15/07/2023	5,577,825.78	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	10/11/2021	15/07/2026	2,788,912.89	Activa
			Calidad del Servicio	10/11/2021	15/01/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 3 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según suscripción.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de inicio	Seguros del estado s.a.	30-44-101049760	Cumplimiento del contrato	10/11/2021	15/07/2023	5,577,825.78	Activa

			sociales e indemnizaciones				
			Calidad del Servicio	10/11/2021	15/07/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 4 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de inicio

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Reinicio	Seguros del estado s.a.	30-44-101049760	Cumplimiento del contrato	18/11/2021	28/08/2023	5,577,825.78	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18/11/2021	23/01/2026	2,788,912.89	Activa
			Calidad del Servicio	18/11/2021	23/07/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 5 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Reinicio

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 1	Seguros del estado s.a.	30-44-101049760	Cumplimiento del contrato	18/11/2021	25/09/2023	5,577,825.78	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18/11/2021	23/03/2026	2,788,912.89	Activa
			Calidad del Servicio	18/11/2021	25/09/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 6 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 1

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 2	Seguros del estado s.a.	30-44-101049760	Cumplimiento del contrato	18/11/2021	10/10/2023	5,577,825.78	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18/11/2021	07/04/2026	2,788,912.89	Activa
			Calidad del Servicio	18/11/2021	10/10/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 7 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 2

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 3	Seguros del estado s.a.	30-44-101049760	Cumplimiento del contrato	18/11/2021	18/10/2023	5,577,825.78	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	18/11/2021	15/04/2026	2,788,912.89	Activa
			Calidad del Servicio	18/11/2021	18/10/2023	5,577,825.78	Activa

Tabla 8 Póliza de cumplimiento contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 3

3.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 30-40-101017785 fue expedida por la compañía Aseguradora seguros del estado S.A. El objeto de esta póliza es amparar los prejuicios patrimoniales y extrapatrimoniales hasta el importe asegurado señalado en la caratula de la póliza para cada cobertura, que cauce directamente el asegurado con motivo de una determinada Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato de interventoría No. 414 de 2022 cuyo objeto es interventoría técnica, legal, administrativas, ambientales y contables al mantenimiento, mejoramiento y adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio

En el siguiente cuadro se muestran las vigencias de las garantías según suscripción, acta de inicio, acta de reinicio, acta de prorroga No. 1, acta de prorroga No. 2 y acta de prorroga No. 3 del contrato de interventoría No. 414 de 2022

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Suscripción	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	10/11/2022	15/01/2023	200,000,000.00	Activa

Tabla 9 Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según suscripción.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de inicio	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	18/11/2022	23/01/2023	200,00,000.00	Activa

Tabla 10 Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de inicio.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Reinicio	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	18/11/2022	28/02/2023	200,00,000.00	Activa

Tabla 11 Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Reinicio.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 1	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	18/11/2022	28/02/2023	232,00,000.00	Activa

Tabla 12Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 1

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 2	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	18/11/2022	07/04/2023	232,00,000.00	Activa

Tabla 13 Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 2

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 3	Seguros del estado s.a.	30-40-101017785	Predios, labores y operaciones	18/11/2022	15/04/2023	232,00,000.00	Activa

Tabla 14 Póliza R.C.E. contrato de interventoría 414 de 2022, según acta de Prorroga No. 3

4. PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

4.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

NOVIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Tabla 15 Información personal profesional de Noviembre 2022, contrato de interventoría No 414 del 2022

DICIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Tabla 16 Información personal profesional de diciembre 2022, contrato de interventoría No 414 del 2022

FEBRERO 2023

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Tabla 17 Información personal profesional de febrero 2023, contrato de interventoría No 414 del 2022

MARZO 2023

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Tabla 18 Información personal profesional de marzo 2023, contrato de interventoría No 414 del 2022

Es de anotar, que el personal de interventoría descrito anteriormente laboro en los frentes de obra activos en los periodos relacionados, los cuales corresponden a:

- Polideportivo séptima de la esperanza
- Polideportivo gaviotas

- Polideportivo santa marta
- Placa deportiva las palmas
- Placa deportiva santa helena
- Placa deportiva Viscaya 6
- Placa deportiva el Paraíso
- Placa deportiva la alborada
- Placa deportiva Villa Bolivar
- Placa deportiva playa rica
- Cancha sintética villa bolivar

4.2 RELACIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DE INTERVENTORÍA

RELACION EQUIPOS Y MAQUINARIA DE INTERVENTORIA			
Cantidad	**Maquinaria y Equipos**	**Estado**	**Mes**
1	Estación topográfica	Activo	Noviembre-22
		Activo	Diciembre-22
		Activo	Febrero-23
		Activo	Marzo-23
1	CAMIONETA RENAULT DUSTER OROCH CILINDRAJE C.C 1.998	Activo	Noviembre-22
		Activo	Diciembre-22
		Activo	Febrero-23
		Activo	Marzo-23

Tabla 19 maquinaria y equipos contrato de interventoría 414 de 2022

B. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

5. INFORMACIÓN BÁSICA CONTRATO DE OBRA.

CONTRATO DE OBRA No.	411 DE 2022
OBJETO:	"MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "
CONTRATISTA:	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA – COINAR
NIT:	901.199.491-6
REPRESENTANTE:	CAMILO ANDRES NIÑO MORALES
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER
VALOR INICIA DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 671.661.036,15) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	8 DE NOVIEMBRE DE 20212
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES Y CINCO (05) DÍAS
TERMINO DEL CONTRATO:	22 DE ENERO DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	22 DE ENERO DE 2023
FECHA DE SUSPENSION No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2022 (35 Días)
FECHA REINICIO No. 1:	01 DE FEBRERO DE 2023
PRORROGA No. 1:	24 DE FEBRERO DE 2023 (15 DIAS)
MODIFICACION No. 1:	07 DE MARZO DE 2023
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 671.530.576.15
PRORROGA No. 2:	13 DE MARZO DE 2023 (8 DIAS)
FECHA DE TERMINACION PREVISTA:	21 DE MARZO DE 2023
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA:	93.52%

Tabla 20 información básica de contrato de obra 411 DE 2022

6. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUPENSIONES.

PRORROGA SUSPENSIÓN N°	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
SUSPENSION No. 1	*Debido a que algunos de los proveedores de los materiales que se requieren para la intervención de los escenarios deportivos objeto de este contrato, nos suministran los respectivos materiales hasta el próximo año. Entre ellos se*	28-12-2022	28-12-22 A 31-01-2023	26-02-2023

	encuentra el proveedor de la grama sintética que se va a cambiar en el parque de villa bolívar, el contratista de la demarcación de las placas deportivas y la ferretería que va a suministrar la malla eslabonada"			
PRORROGA No. 1	1. *Teniendo en cuenta el oficio emitido por parte del proveedor de los juegos biosaludables donde manifiestan los inconvenientes que han surgido en la fabricación de estos elementos por falta de materia prima (tubería) debido a temas logísticos y atrasos en el trasporte, se solicita a la entidad se prorrogue el tiempo de 15 días para la fabricación e instalación de estos elementos que hacen parte del cumplimiento de las actividades contractuales en los escenarios deportivos de los barrios Santa Martha y del barrio Villa Bolívar.* 2. *Según oficio por parte del subcontratista que va a realizar los trabajos de pintura para la placa deportiva en el escenarios del barrio villa bolívar, solicita un tiempo adicional debido al atraso en la producción por parte del proveedor para poder cumplir y entregar con satisfacción esta actividad.*	24-02-2023	27-02-23 A 13-03-23	13-03-2023
PRORRGA No. 2	*Teniendo en cuenta el oficio emitido por parte del proveedor de las mesas de ping pong, donde manifiestan los inconvenientes que han surgido en la fabricación de estos elementos por falta de materia prima de la lámina cold roll cal 16, debido a temas logísticos y atrasos en el trasporte, se solicita a la entidad se prorrogue el contrato de obra N° 411 del 2022 por un tiempo de 8 días. Esto con el fin de suministrar e instalar estos elementos que hacen parte del cumplimiento de las actividades contractuales en el escenario deportivo del barrio Villa Bolívar*	13-03-2023	13-03-23 a 21-03-23	21-03-2023

7. INFORMACION FINANCIERA

FUENTE DE FINANCIACIÓN	RECURSOS	CDP	RP	CDR
S.G.P. LIBRE INVERSION/54590-OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCION	$ 116.962.862,99			
S.G.P. LIBRE INVERSION/54590-OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCION	$ 314.597.799,16	342	505	
S.G.P. LIBRE INVERSION	$ 240.100.374,00			
TOTALES	$ 671.661.036,15			

RELACIÓN DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
	$ 536.841.284.35	ACTA PARCIAL No.1 (En trámite)	15-03-2023
TOTALES	$ 536.841.284.35		

BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR PAGAR
N/A	N/A		
TOTALES			

Tabla 21 información financiera contrato de obra 411 de 2022

8. CONTROL PROGRAMACION Y AVANCE FISICO DE OBRA


MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MES		ACUMULADO		MES		ACUMULADO	
1	11.25%	$ 75.563.825.42	11.25%	$ 75.563.825.42	11.25%	$ 75.563.825.42	11.25%	$ 75.563.825.42
2	4.15%	$ 27.842.476,12	15.40%	$ 103.406.301,54	4.15%	$ 27.842.476,12	15.40%	$ 103.406.301,54
3	70.04%	$ 470.451.843.34	85.44%	$ 573.858.144.88	60.30%	$ 404.995.640.71	75.69%	$ 508.401.942.25
4	14.56%	$ 97.802.891.24	100.00 %	$ 671.530.576.15	17.81%	$119.585.331.90	93.52%	$ 627.987.274.15

Tabla 22 información programación y avance físico de obra, contrato de obra 411 de 2022

NOTA: El avance del 93.52% corresponde hasta el 09 de marzo de 2023, correspondiente a la fecha de corte de la presente parcial. El porcentaje programado correspondiente al

100.00 % es hasta la fecha de terminación del contrato según la prorroga No.2 del contrato de obra.


9. GRAFICA AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO DE OBRA

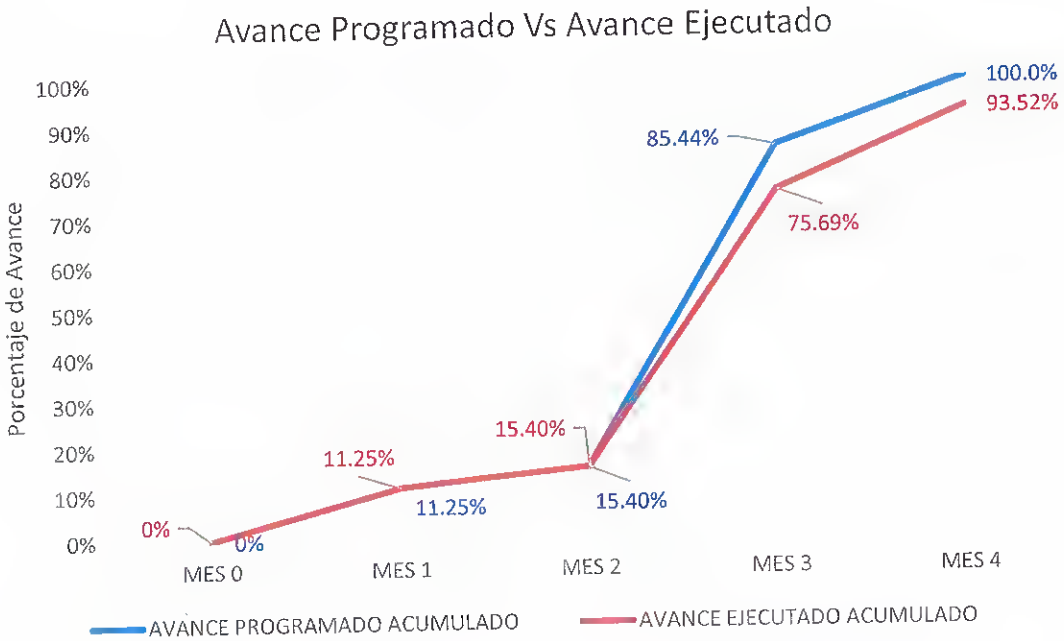

A la fecha del presente informe el contrato de obra tiene una ejecución física del 93.52% respecto al 100.00% programado hasta el 21 de marzo de 2023. Lo anterior, teniendo en cuenta la reprogramación de obra presentada por el contratista en la solicitud de prorroga No. 2 para el contrato de obra No. 411 de 2022.

Para la presente acta parcial de obra No. 1 se tiene una ejecución del 79.94 % que corresponde a la suma de $ 536.841.284.35, que comprende el periodo de ejecución del 18 de noviembre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023.

10. GRAFICA AVANCE FINANCIERO ACUMULADO VS FINANCIERO PROGRAMADO DE OBRA

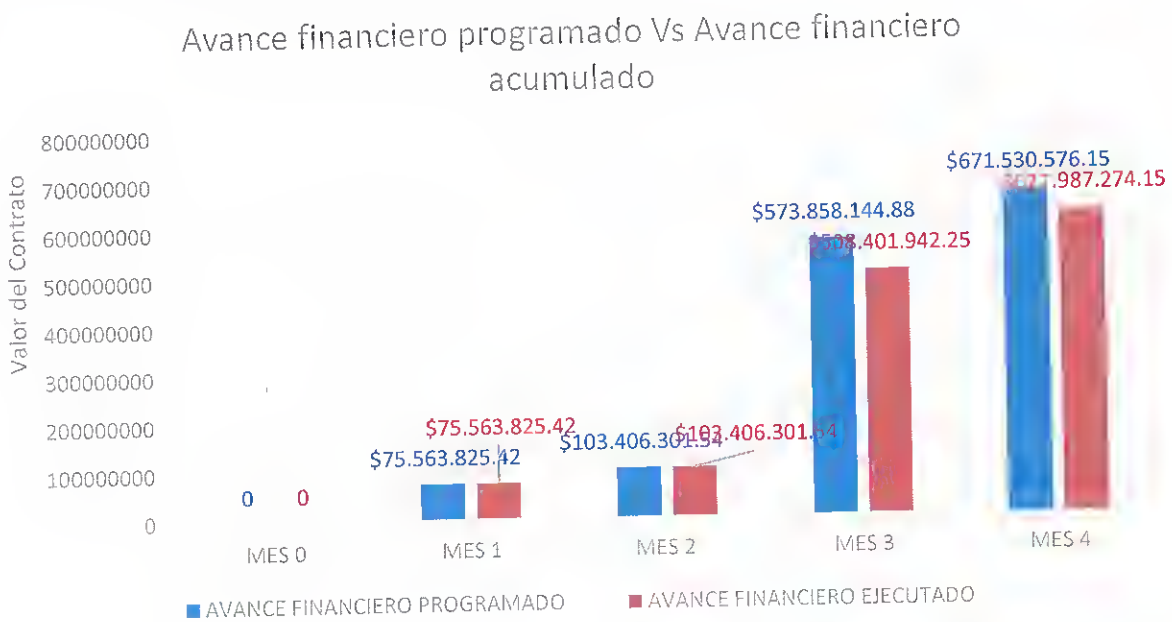

11. MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
Acta Modificatoria o aclaratoria No.1	Se modifico la cláusula 5 – Valor del contrato

Tabla 23 Aclaratorios realizados contrato obra 411 de 2022

12. VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE OBRA

12.1 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

La póliza única de cumplimiento en favor de entidades estatales No.30-44-101049745 fue expedida por la compañía Seguros del Estado S.A. El objeto de esta póliza es garantizar el pago de los prejuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones en el desarrollo del contrato de obra No. 411 de

2022 cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio.

En el siguiente cuadro se muestran las vigencias de las garantías según suscripción, acta de inicio, acta de reinicio, prorroga No. 1 y prorroga No. 2 del contrato de obra No 411 de 2022.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Suscripción	Seguros del Estado S.A.	30-44-101049745	Cumplimiento del contrato	08/11/2022	15/07/2023	67.166.103,62	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	08/11/2022	15/01/2026	33.583.051,81	Activa
			Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		67.166.103,62	Activa

Tabla 24 Póliza de cumplimiento contrato de obra 411 de 2022, según suscripción

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de inicio	Seguros del Estado S.A.	30-44-101049745	Cumplimiento del contrato	18/11/2022	25/07/2023	67.166.103,62	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18/11/2022	25/01/2026	33.583.051,81	Activa
			Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		67.166.103,62	Activa

Tabla 25 Póliza de cumplimiento contrato de obra 411 de 2022, según acta de inicio

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Reinicio	Seguros del Estado S.A.	30-44-101049745	Cumplimiento del contrato	18/11/2022	29/08/2023	67.166.103,62	Activa
			Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18/11/2022	25/01/2026	33.583.051,81	Activa
			Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		67.166.103,62	Activa

Tabla 26 Póliza de cumplimiento contrato de obra 411 de 2022, según acta de Reinicio

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Prorroga No. 1	Seguros del Estado S.A.	30-44-101049745	Cumplimiento del contrato	18/11/2022	15/09/2023	67.166.103,62	Activa
			Pago de salarios, prestaciones			33.583.051,81	Activa

			sociales legales e indemnizaciones	18/11/2022	15/03/2026		
			Estabilidad y calidad de la obra	5 años, 0 meses y 0 días		67.166.103,62	Activa

Tabla 27 Póliza de cumplimiento contrato de obra 411 de 2022, según acta de Prorroga No.1

12.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

La póliza de seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual No 30-40-101017779 fue expedida por la compañía Seguros del Estado S.A. El objeto de esta póliza es garantizar el pago de los prejuicios causados con ocasión del incumplimiento de las obligaciones en el desarrollo del contrato de obra No. 411 de 2022 cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de escenarios recreo deportivos en el municipio de Villavicencio.

En el siguiente cuadro se muestran las vigencias de las garantías según suscripción, acta de inicio, acta de reinicio, acta de prorroga No. 1 y acta de prorroga No. 2 del contrato de obra No 411 de 2022.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Suscripción	Seguros del Estado S.A.	30-40-101017779	Predios labores y operaciones	08/11/2022	15/01/2023	200.000.000,00	Activa

Tabla 28 Póliza R.C.E. contrato de obra 411 de 2022, según suscripción.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Inicio	Seguros del Estado S.A.	30-40-101017779	Predios labores y operaciones	18/11/2022	24/01/2023	200.000.000,00	Activa

Tabla 29 Póliza R.C.E. contrato de obra 411 de 2022, acta de inicio.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de Reinicio	Seguros del Estado S.A.	30-40-101017779	Predios labores y operaciones	18/11/2022	28/02/2023	200.000.000,00	Activa

Tabla 30 Póliza R.C.E. contrato de obra 411 de 2022, según acta de reinicio.

MODIFICACIÓN SEGÚN	COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS Nº	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS PÓLIZAS
				DESDE	HASTA		
Acta de prorroga No. 1	Seguros del Estado S.A.	30-40-101017779	Predios labores y operaciones	18/11/2022	15/03/2023	200.000.000,00	Activa

Tabla 31 Póliza R.C.E. contrato de obra 411 de 2022, según acta de prorroga No. 1

13. VERIFICACIÓN DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES.

A continuación, se relaciona los profesionales, personal de obra y la verificación de pagos de seguridad social del contratista objeto de VERIFICACIÓN de la interventoría.

13.1 PERSONAL DE OBRA POR FRENTE DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

13.1.1 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRATISTA DE OBRA

- NOVIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2022 "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. CEDULA	ARL	EPS	AFP
1	ALFONSO MELO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	86.063.649	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
2	JOSÉ LUIS CAAMAÑO COHECHA	RESIDENTE DE OBRA 1	1121823941	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
3	CARLOS ALBERTO GARAVITO CASTELLANOS	RESIDENTE DE OBRA 2	79690097	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
4	DIANA CAROLINA CUERVO VANEGAS	PROFESSIONAL SST DE OBRA	40327876	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS
5	CAMILO NIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	1121827016	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
6	DANIELA JIMENEZ	AUX. DE INGENIERÍA	1121868384	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
7	CARLOS PEDRAZA AGUDELO	MAESTRO DE OBRA	7852129	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES

Tabla 32 Información personal profesional de noviembre de 2022, contrato de obra No 411 del 2022

- DICIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2022 "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. CEDULA	ARL	EPS	AFP
1	ALFONSO MELO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	86.063.649	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
2	JOSÉ LUIS CAAMAÑO COHECHA	RESIDENTE DE OBRA 1	1121823941	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
3	CARLOS ALBERTO GARAVITO CASTELLANOS	RESIDENTE DE OBRA 2	79690097	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR

4	DIANA CAROLINA CUERVO VANEGAS	PROFESSIONAL SST DE OBRA	40327876	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS
5	CAMILO NIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	1121827016	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
6	DANIELA JIMENEZ	AUX. DE INGENIERÍA	1121868384	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
7	CARLOS PEDRAZA AGUDELO	MAESTRO DE OBRA	7852129	COLPATRIA	SALUD TOTAL	COLPENSIONES
8	JOSE ROBERT TRIANA	MAESTRO DE OBRA	1123140854	COLPATRIA	NUEVA EPS	COLFONDOS
9	ALEJANDRO BELTRAN LEON	AYUDANTE	70755829	COLPATRIA	FAMISANAR	C OLPENSIONES
10	YURY GONZALEZ	AYUDANTE	3012060058	COLPATRIA	CAJACOPI	PROTECCION
11	HUMBERTO PEDRAZA	86006103	AYUDANTE	COLPATRIA	FAMISANAR	PROTECCION
12	DAWINSON PINILLA	1122653964	AYUDANTE	COLPATRIA	CAJACOPI	PORVENIR
13	LUIS ERNESTO SALAS	1123864125	AYUDANTE	COLPATRIA	CAPITAL SALUD	PORVENIR
14	RICARDO SUAREZ	74321194	AYUDANTE	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR

Tabla 33 Información personal profesional de diciembre, contrato de obra No 411 del 2022

- FEBRERO 2023

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2022 "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. CEDULA	ARL	EPS	AFP
1	ALFONSO MELO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	86.063.649	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
2	JOSÉ LUIS CAAMAÑO COHECHA	RESIDENTE DE OBRA 1	1121823941	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
3	CARLOS ALBERTO GARAVITO CASTELLANOS	RESIDENTE DE OBRA 2	79690097	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
4	DIANA CAROLINA CUERVO VANEGAS	PROFESSIONAL SST DE OBRA	40327876	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS
5	CAMILO NIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	1121827016	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
6	DANIELA JIMENEZ	AUX. DE INGENIERÍA	1121868384	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
7	CARLOS CELY	MAESTRO DE OBRA	4284618	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR

8	YENIFER LOMBANA	AYUDANTE	26428197	COLPATRIA	NUEVA EPS	PORVENIR
9	RIBON DANIEL	AYUDANTE	15451637	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
10	JOSE ROMERO	AYUDANTE	1104016955	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
11	JONNY SUAREZ	AYUDANTE	1073237376	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR
12	JHON PEREZ	AYUDANTE	79637962	COLPATRIA	FAMISANAR	PORVENIR

Tabla 34 Información personal profesional de febrero-2023, contrato de obra No 411 del 2022

- MARZO 2023

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2022 "MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. CEDULA	ARL	EPS	AFP
1	ALFONSO MELO FLOREZ	DIRECTOR DE OBRA	86.063.649	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
2	JOSÉ LUIS CAAMAÑO COHECHA	RESIDENTE DE OBRA 1	1121823941	COLPATRIA	SANITAS	COLPENSIONES
3	CARLOS ALBERTO GARAVITO CASTELLANOS	RESIDENTE DE OBRA 2	79690097	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
4	DIANA CAROLINA CUERVO VANEGAS	PROFESSIONAL SST DE OBRA	40327876	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS
5	CAMILO NIÑO	REPRESENTANTE LEGAL	1121827016	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
6	DANIELA JIMENEZ	AUX. DE INGENIERÍA	1121868384	COLPATRIA	SANITAS	PORVENIR
7	CARLOS CELY	MAESTRO DE OBRA	4284618	COLPATRIA	SALUD TOTAL	PORVENIR
9	LUIS GALVIS	AYUDANTE	1121869891	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR

Tabla 35 Información personal profesional de febrero-2023, contrato de obra No 411 del 2022

Es de anotar, que el personal de obra descrito anteriormente laboro en los frentes de obra activos en los periodo antes mencionados, los cuales corresponden a:

- Polideportivo séptima de la esperanza
- Polideportivo gaviotas
- Polideportivo santa marta
- Placa deportiva las palmas

- Placa deportiva santa helena
- Placa deportiva Viscaya 6
- Placa deportiva el Paraíso
- Placa deportiva la alborada
- Placa deportiva Villa Bolivar
- Placa deportiva playa rica
- Cancha sintética villa bolivar

13.2 RELACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA

La interventoría ha venido llevando el control de la maquinaria y equipo con el que dispone el contratista en obra, además que este cuente con las copias en obra del registro de inspección que se les realiza a estos.

A continuación, se relaciona la maquinaria y equipo con el que dispone el contratista en la obra:

RELACION EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OBRA		
Cantidad	**Maquinaria y Equipos**	**Estado**
1	Demoledor sds 21j dewalt	Activo
1	Hidro lavadora eléctrica de 1800 psi	Activo
1	Hidro lavadora diésel de 2400 psi	Activo
1	Vehículo tipo NKR de carga de estacas marca Chevrolet	Activo
2	Rana compactadora	Activo
1	Herramienta menor	Activo
1	Vibrocompactador	Activo
1	Pulidora tronzadora	Activo

Tabla 36 maquinaria y equipos contrato de obra 411 de 2022.

14. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Se relaciona la ejecución de obra comprendida entre el 18 de Noviembre de 2022 al 15 de Marzo de 2023:

MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"													
CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACION No. 1		AVANCE A LA FECHA		PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1		PENDIENTE POR EJECUTAR	
ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
POLIDEPORTIVOS													
POLIDEPORTIVO SEPTIMA DE LA ESPERANZA													
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO													
1.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	1.00	$ 718.832.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
1.2	PINTURA TUBO D= 2 1/2	ML	13.70	$ 9.088.00	$ 124.505.60	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	0.00	$ -
1.3	PINTURA TUBO D= 4"	ML	9.10	$ 11.441.00	$ 104.113.10	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	0.00	$ -
NP. 1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML	0.00	$ 2.723.00	$ -	24.50	$ 66.713.50	24.50	$ 66.713.50	24.50	$ 66.713.50	0.00	$ -
NP. 2	DESMONTE DE TABLERO ACRILICO	UN	0.00	$ 15.500.00	$ -	1.00	$ 15.500.00	1.00	$ 15.500.00	1.00	$ 15.500.00	0.00	$ -
NPC. 2	SUMINISTRO E INSTAL TABLERO ACRILICO	UN	0.00	$ 640.614.00	$ -	1.00	$ 640.614.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	1.00	$ 640.614.00
				SUBTOTAL	$ 947.450.70		$ 1.689.022.00		$ 1.048.408.00		$ 1.048.408.00		$ 640.614.00
MURO Y MALLA ESLABONADA:CERRAMIENTO													
2.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	126.00	$ 6.638.00	$ 836.388.00	151.20	$ 1.003.665.60	151.20	$ 1.003.665.60	151.20	$ 1.003.665.60	0.00	$ -
2.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	126.00	$ 12.454.00	$ 1.569.204.00	126.20	$ 1.571.694.80	126.20	$ 1.571.694.80	126.20	$ 1.571.694.80	0.00	$ -
2.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	94.03	$ 19.220.00	$ 1.807.256.60	96.61	$ 1.856.844.20	96.61	$ 1.856.844.20	96.61	$ 1.856.844.20	0.00	$ -
2.4	MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	14.52	$ 141.051.00	$ 2.048.060.52	20.79	$ 2.932.450.29	20.79	$ 2.932.450.29	20.79	$ 2.932.450.29	0.00	$ -
2.5	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	79.18	$ 118.810.00	$ 9.407.375.80	75.82	$ 9.008.174.20	75.82	$ 9.008.174.20	75.82	$ 9.008.174.20	0.00	$ -
2.6	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	116.56	$ 9.167.00	$ 1.068.505.52	116.56	$ 1.068.505.52	116.56	$ 1.068.505.52	116.56	$ 1.068.505.52	0.00	$ -
2.7	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE ACTIVIDAD: TENSIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	218.05	$ 16.809.00	$ 3.665.237.34	183.00	$ 3.076.047.00	1.00	$ 16.809.00	0.00	$ 0.00	182.00	$ 3.059.238.00
				SUBTOTAL	$ 20.402.027.78		$ 20.517.381.61		$ 17.458.143.61		$ 17.441.334.61		$ 3.059.238.00
GRADERIAS													

3.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	127.28	$ 6.638.00	$ 844.884.64	139.13	$ 923.544.94	139.13	$ 923.544.94	139.13	$ 923.544.94	0.00	$ -
3.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	127.28	$ 15.910.00	$ 2.025.024.80	139.13	$ 2.213.558.30	139.13	$ 2.213.558.30	139.13	$ 2.213.558.30	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 2.869.909.44		$ 3.137.103.24		$ 3.137.103.24		$ 3.137.103.24		$ -
CUBIERTA													
4.1	CONTRAVIENTOS D= 1/2 , INCLUYE ANTICORR. Y PINTU	ML	28.80	$ 13.467.00	$ 387.849.60	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 387.849.60		$ 0.00		$ 0.00		$ 0.00		$ -
	TOTAL POLIDEPORTIVO SEPTIMA DE LA ESPERANZA				$ 24.607.237.52		$ 25.343.506,85		$ 21.643.654.85		$ 21.626.845.85		$ 3.699.852.00
	POLIDEPORTIVO GAVIOTAS												
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO													
5.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	1.00	$ 718.832.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
5.2	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.00	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NPC 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	0.00	$ 159.232.00	$ -	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 8.963.040.00		$ 10.709.276.00		$ 10.709.276.00		$ 2.465.068.00		$ -
MURO Y MALLA ESLABONADA:CERRAMIENTO													
6.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	134.65	$ 6.638.00	$ 893.806.70	158.79	$ 1.054.048.02	158.79	$ 1.054.048.02	158.79	$ 1.054.048.02	0.00	$ -
6.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	134.65	$ 12.454.00	$ 1.676.931.10	133.79	$ 1.666.220.66	133.79	$ 1.666.220.66	133.79	$ 1.666.220.66	0.00	$ -
6.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	49.80	$ 19.220.00	$ 957.156.00	75.00	$ 1.441.500.00	75.00	$ 1.441.500.00	75.00	$ 1.441.500.00	0.00	$ -
6.4	MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	49.8	$ 141.051.00	$ 7.024.339.80	75.00	$ 10.578.825.00	75.00	$ 10.578.825.00	75.00	$ 10.578.825.00	0.00	$ -
6.5	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	99.60	$ 9.167.00	$ 913.033.20	99.60	$ 913.033.20	99.60	$ 913.033.20	99.60	$ 913.033.20	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 11.465.266.80		$ 15.653.626.88		$ 15.653.626.88		$ 15.653.626.88		$ -
GRADERIAS													
7.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	336.19	$ 6.638.00	$ 2.231.629.22	294.72	$ 1.956.351.36	294.72	$ 1.956.351.36	294.72	$ 1.956.351.36	0.00	$ -
7.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	336.19	$ 15.910.00	$ 5.348.782.90	294.72	$ 4.688.995.20	294.72	$ 4.688.995.20	294.72	$ 4.688.995.20	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 7.580.412.12		$ 6.645.346.56		$ 6.645.346.56		$ 6.645.346.56		$ -
CUBIERTA													
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD = 1,20 METROS	ML	62.00	$ 250.006.00	$ 15.500.372.00	62.00	$ 15.500.372.00	62.00	$ 15.500.372.00	62.00	$ 15.500.372.00	0.00	$ -
8.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	91	$ 77.646.00	$ 7.065.786.00	91.00	$ 7.065.786.00	91.00	$ 7.065.786.00	91.00	$ 7.065.786.00	0.00	$ -
8.3	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UN	56	$ 23.778.00	$ 1.331.568.00	56.00	$ 1.331.568.00	56.00	$ 1.331.568.00	56.00	$ 1.331.568.00	0.00	$ -

					SUBTOTAL	$ 23.897.726.00		$ 23.897.726.00		$ 23.897.726.00		$ 23.897.726.00		$ -
					TOTAL POLIDEPORTIVO GAVIOTAS	$ 51.906.444.92		$ 56.905.975.44		$ 56.905.975.44		$ 48.661.767.44		$ -
					POLIDEPORTIVO SANTA MARTHA									
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO														
9.1	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NPC 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	0.00	$ 159.232.00	$ -	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	0.00	$ -
					SUBTOTAL	$ 8.244.208.00		$ 9.990.444.00		$ 9.990.444.00		$ 1.746.236.00		$ -
MUROS CONTRA IMPACTO Y MALLAS ESLABONADAS														
10.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	100.430	$ 6.638.00	$ 666.654.34	300.00	$ 1.991.400.00	300.00	$ 1.991.400.00	300.00	$ 1.991.400.00	0.00	$ -
10.2	DINTEL LADRILLO TOLETE .24*.12*.06 STA/FE	ML	20.000	$ 58.370.00	$ 1.167.400.00	20.00	$ 1.167.400.00	0.00	$ -	0.00	$ -	20.00	$ 1.167.400.00
10.3	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	100.430	$ 14.106.00	$ 1.416.665.58	300.00	$ 4.231.800.00	300.00	$ 4.231.800.00	300.00	$ 4.231.800.00	0.00	$ -
10.4	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	255.653	$ 9.167.00	$ 2.343.566.74	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.5	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	51.820	$ 19.220.00	$ 995.980.40	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
10.6	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	80.270	$ 118.810.00	$ 9.536.878.70	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					SUBTOTAL	$ 16.127.145.76		$ 7.390.600.00		$ 6.223.200.00		$ 6.223.200.00		$ 1.167.400.00
PEDESTALES DE ESTRUCTURA METALICA														
11.1	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	7.43	$ 14.106.00	$ 104.754.79	7.43	$ 104.754.79	7.43	$ 104.754.79	7.43	$ 104.754.79	0.00	$ -
					SUBTOTAL	$ 104.754.79		$ 104.754.79		$ 104.754.79		$ 104.754.79		$ -
ARQUITECTONICOS URBANISTICOS														
12.1	PODA ARBOL ENTRE 5 A10 MTS	UN	5.00	$ 185.764.00	$ 928.820.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
12.2	GIMNASIO AIRE LIBRE: EL ASCENSOR O SIMIL (El eleva	UN	1.00	$ 4.388.068.00	$ 4.388.068.00	1.00	$ 4.388.068.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4.388.068.00
12.3	GIMNASIO AIRE LIBRE: ESQUI O SIMIL (la elíptica)	UN	1.00	$ 4.650.025.00	$ 4.650.025.00	1.00	$ 4.650.025.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4.650.025.00
12.4	GIMNASIO AIRE LIBRE:MASAJE MOVIMI.O SIMIL(RODILLO)	UN	1.00	$ 4.322.700.00	$ 4.322.700.00	1.00	$ 4.322.700.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4.322.700.00
12.5	REPARACION MODULO JUEGO INFANTIL EXIST T. Pasamanos, rebal, columpio.	UN	1.00	$ 1.683.459.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	0.00	$ -	0.00	$ -
					SUBTOTAL	$ 15.973.072.00		$ 15.044.252.00		$ 1.683.459.00		$ -		$ 13.360.793.00
					TOTAL POLIDEPORTIVO SANTA MARTHA	$ 40.449.180.55		$ 32.530.050.79		$ 18.001.857.79		$ 8.074.190.79		$ 14.528.193.00
					PLACAS DEPORTIVAS									
					PLACA DEPORTIVA LAS PALMAS									
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO														
13.1	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	294.00	$ 13.649.00	$ 4.012.806.00	296.00	$ 4.040.104.00	296.00	$ 4.040.104.00	296.00	$ 4.040.104.00	0.00	$ -

13.2	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (CON/RELLEN)	GL	1.00	$ 1.260.369.00	$ 1.260.369.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
13.3	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	2.00	$ 159.232.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	0.00	$ -
13.4	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.00	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NP.4	REHAB Y MEJORA SUPERFI EXIS PLACA CONC CANCHA MULT	M2	0.00	$ 45.119.00	$ -	5.92	$ 267.104.48	5.92	$ 267.104.48	5.92	$ 267.104.48	0.00	$ -
NPC. 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	0.00	$ 718.832.00		1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 13.835.847.00		$ 15.016.484.48		$ 15.016.484.48		$ 6.772.276.48		$ -
MUROS CONTRA IMPACTO Y MALLAS ESLABONADAS													
14.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	32.09	$ 6.638.00	$ 213.013.42	56.15	$ 372.723.70	56.15	$ 372.723.70	56.15	$ 372.723.70	0.00	$ -
14.2	DINTEL LADRILLO TOLETE .24*.12*.06 STA/FE	ML	4.00	$ 58.370.00	$ 233.480.00	4.00	$ 233.480.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 233.480.00
14.3	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	32.09	$ 12.454.00	$ 399.648.86	31.15	$ 387.942.10	31.15	$ 387.942.10	31.15	$ 387.942.10	0.00	$ -
14.4	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	37.60	$ 19.220.00	$ 722.672.00	37.60	$ 722.672.00	37.60	$ 722.672.00	37.60	$ 722.672.00	0.00	$ -
14.5	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	37.60	$ 118.810.00	$ 4.467.256.00	37.60	$ 4.467.256.00	37.60	$ 4.467.256.00	37.60	$ 4.467.256.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 6.036.070.28		$ 6.184.073.80		$ 5.950.593.80		$ 5.950.593.80		$ 233.480.00
ARQUITECTONICOS URBANISTICOS													
15.1	PODA ARBOL ENTRE 5 A10 MTS	UN	5.00	$ 185.764.00	$ 928.820.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
15.2	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	9.00	$ 53.079.00	$ 477.711.00	4.00	$ 212.316.00	4.00	$ 212.316.00	4.00	$ 212.316.00	0.00	$ -
15.3	BANCA PREFABRICADA M-40.INC TRANSPORTE	UN	4.00	$ 211.723.00	$ 846.892.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 6	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31	UN	0.00	$ 711.813.00	$ -	4.00	$ 2.847.252.00	4.00	$ 2.847.252.00	4.00	$ 2.847.252.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 2.253.423.00		$ 3.059.568.00		$ 3.059.568.00		$ 3.059.568.00		$ -
	TOTAL PLACA DEPORTIVA LAS PALMAS				$ 22.125.340.28		$ 24.260.126.28		$ 24.026.646.28		$ 15.782.438.28		$ 233.480.00
	PLACA DEPORTIVA SANTA HELENA												
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO													
16.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (CON/RELLEN)	GL	1.00	$ 1.260.369.00	$ 1.260.369.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
16.2	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	2.00	$ 159.232.00	$ 318.464.00	1.00	$ 159.232.00	1.00	$ 159.232.00	1.00	$ 159.232.00	0.00	$ -
16.3	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.00	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NPC. 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	0.00	$ 718.832.00	$ -	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 9.823.041.00		$ 10.550.044.00		$ 10.550.044.00		$ 2.305.836.00		$ -
MUROS CONTRA IMPACTO Y MALLAS ESLABONADAS													

17.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	60.49	$ 6.638.00	$ 401.532.62	78.78	$ 522.941.64	78.78	$ 522.941.64	78.78	$ 522.941.64	0.00	$ -
17.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	60.49	$ 12.454.00	$ 753.342.46	53.78	$ 669.776.12	53.78	$ 669.776.12	53.78	$ 669.776.12	0.00	$ -
17.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	113.85	$ 19.220.00	$ 2.188.197.00	113.85	$ 2.188.197.00	113.85	$ 2.188.197.00	113.85	$ 2.188.197.00	0.00	$ -
17.4	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	113.85	$ 118.810.00	$ 13.526.518.50	113.85	$ 13.526.518.50	113.85	$ 13.526.518.50	113.85	$ 13.526.518.50	0.00	$ -
17.5	PINTURA TUBO D= 2 1/2	ML	62.10	$ 9.088.00	$ 564.364.80	62.10	$ 564.364.80	62.10	$ 564.364.80	62.10	$ 564.364.80	0.00	$ -
NP. 1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML	0.00	$ 2.723.00	$ -	62.10	$ 169.098.30	62.10	$ 169.098.30	62.10	$ 169.098.30	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 17.433.955.38		$ 17.640.896.36		$ 17.640.896.36		$ 17.640.896.36		$ -
GRADERIAS													
18.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	224.29	$ 6.638.00	$ 1.488.837.02	230.25	$ 1.528.399.50	230.25	$ 1.528.399.50	230.25	$ 1.528.399.50	0.00	$ -
18.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	224.29	$ 15.910.00	$ 3.568.453.90	230.25	$ 3.663.277.50	230.25	$ 3.663.277.50	230.25	$ 3.663.277.50	0.00	$ -
18.3	PODA ARBOL ENTRE 5 A10 MTS	UN	5.00	$ 185.764.00	$ 928.820.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 5.986.110.92		$ 5.191.677.00		$ 5.191.677.00		$ 5.191.677.00		$ -
	TOTAL PLACA DEPORTIVA SANTA HELENA				$ 33.243.107.30		$ 33.382.617.36		$ 33.382.617.36		$ 25.138.409.36		$ -
	PLACA DEPORTIVA VISCAYA 6												
	PLACA DEPORTIVA DE JUEGO												
19.1	DEMOLI ANDEN,PLACAS,SARDIN.Inc cargue manual,ret5k	M3	68.07	$ 154.121.00	$ 10.491.438.41	44.54	$ 6.864.549.34	44.54	$ 6.864.549.34	44.54	$ 6.864.549.34	0.00	$ -
19.2	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO	M2	25.	$ 7.618.00	$ 190.450.00	25.00	$ 190.450.00	25.00	$ 190.450.00	25.00	$ 190.450.00	0.00	$ -
19.3	RELLENO MAT.TAM.MAX.2" INCLUYE CAMPACTACION MANUAL 5KM	M3	38.03	$ 84.932.00	$ 3.229.963.96	140.43	$ 11.927.000.76	140.43	$ 11.927.000.76	140.43	$ 11.927.000.76	0.00	$ -
19.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano	M2	316.91	$ 9.187.00	$ 2.911.452.17	319.95	$ 2.939.380.65	319.95	$ 2.939.380.65	319.95	$ 2.939.380.65	0.00	$ -
19.5	PLACA CONTRAP e=12 cm(20.7Mpa,3000psi) Inc ME M262	M2	316.91	$ 146.128.00	$ 46.309.424.48	319.95	$ 46.753.653.60	319.95	$ 46.753.653.60	319.95	$ 46.753.653.60	0.00	$ -
19.6	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (CON/RELLEN)	GL	1.00	$ 1.260.369.00	$ 1.260.369.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
19.7	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 7	EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms	M3	0.00	$ 23.661.00	$ -	73.24	$ 1.732.931.64	73.24	$ 1.732.931.64	73.24	$ 1.732.931.64	0.00	$ -
NP. 6	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31	UN	0.00	$ 711.813.00	$ -	2.00	$ 1.423.626.00	2.00	$ 1.423.626.00	2.00	$ 1.423.626.00	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NPC 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	0.00	$ 159.232.00	$ -	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	0.00	$ -
NPC. 8	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	0.00	$ 13.649.00	$ -	165.60	$ 2.260.274.40	165.60	$ 2.260.274.40	165.60	$ 2.260.274.40	0.00	$ -
NPC 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	0.00	$ 718.832.00	$ -	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -

				SUBTOTAL	$ 72.637.306.02		$ 84.801.142.39		$ 84.801.142.39		$ 76.556.934.39		$ -
MUROS CONTRA IMPACTO													
20.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	67.30	$ 6.638.00	$ 446.737.40	70.22	$ 466.120.36	70.22	$ 466.120.36	70.22	$ 466.120.36	0.00	$ -
20.2	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	67.30	$ 14.106.00	$ 949.333.80	70.22	$ 990.523.32	70.22	$ 990.523.32	70.22	$ 990.523.32	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.396.071.20		$ 1.456.643.68		$ 1.456.643.68		$ 1.456.643.68		$ -
MALLAS													
21.1	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,	M2	128.74	$ 9.167.00	$ 1.180.159.58	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 1.180.159.58		$ -		$ -		$ -		$ -
				TOTAL PLACA DEPORTIVA VISCAYA 6	$ 75.213.536.80		$ 86.257.786.07		$ 86.257.786.07		$ 78.013.578.07		$ -
				PLACA DEPORTIVA EL PARAISO									
	PLACA DEPORTIVA DE JUEGO												
22.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	1.00	$ 718.832.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
22.2	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.00	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
22.3	CAMBIO BOMBILLO TIPO BOMBILLO 1000W. Metal Halide	UN	1.00	$ 213.726.00	$ 213.726.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NPC 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	0.00	$ 159.232.00	$ -	1.00	$ 159.232.00	1.00	$ 159.232.00	1.00	$ 159.232.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 9.176.766.00		$ 10.550.044.00		$ 10.550.044.00		$ 2.305.836.00		$ -
MURO Y MALLA ESLABONADA: CERRAMIENTO													
23.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	77.79	$ 6.638.00	$ 516.370.02	104.68	$ 694.865.84	104.68	$ 694.865.84	104.68	$ 694.865.84	0.00	$ -
23.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	77.79	$ 12.454.00	$ 968.796.66	79.68	$ 992.334.72	79.68	$ 992.334.72	79.68	$ 992.334.72	0.00	$ -
23.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	87.36	$ 19.220.00	$ 1.679.059.20	87.36	$ 1.679.059.20	87.36	$ 1.679.059.20	87.36	$ 1.679.059.20	0.00	$ -
23.4	MALLA ESLABON CORR. Incl. sumin, instalcion	M2	87.36	$ 51.965.00	$ 4.539.662.40	87.36	$ 4.539.662.40	87.36	$ 4.539.662.40	87.36	$ 4.539.662.40	0.00	$ -
23.5	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE ACTIVIDAD: TENSIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	133.05	$ 16.809.00	$ 2.236.361.51	132.80	$ 2.232.235.20	132.80	$ 2.232.235.20	132.80	$ 2.232.235.20	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 9.940.249.79		$ 10.138.157.36		$ 10.138.157.36		$ 10.138.157.36		$ -
GRADERIAS													
24.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	212.82	$ 6.638.00	$ 1.412.699.16	181.63	$ 1.205.659.94	181.63	$ 1.205.659.94	181.63	$ 1.205.659.94	0.00	$ -
24.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	212.82	$ 15.910.00	$ 3.385.966.20	181.63	$ 2.889.733.30	181.63	$ 2.889.733.30	181.63	$ 2.889.733.30	0.00	$ -

24.3	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	6.00	$ 51.533.00	$ 309.198.00	6.00	$ 309.198.00	6.00	$ 309.198.00	6.00	$ 309.198.00	0.00	$ -
24.4	DEMOLICION MUROS 0.15, cargue manual, retiro5km	M2	2.00	$ 11.032.00	$ 22.064.00	2.00	$ 22.064.00	2.00	$ 22.064.00	2.00	$ 22.064.00	0.00	$ -
24.5	PAÑETE LISO MURO MORTER01:3 e= 0,025 mts	M2	22.90	$ 26.854.00	$ 614.956.60	22.90	$ 614.956.60	22.90	$ 614.956.60	22.90	$ 614.956.60	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 5.744.883.96		$ 5.041.611.84		$ 5.041.611.84		$ 5.041.611.84		$ -
	TOTAL PLACA DEPORTIVA EL PARAISO				$ 24.861.899.75		$ 25.729.813.20		$ 25.729.813.20		$ 17.485.605.20		
	PLACA DEPORTIVA LA ALBORADA												
	PLACA DEPORTIVA DE JUEGO												
25.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	2.00	$ 718.832.00	$ 1.437.664.00	2.00	$ 1.437.664.00	2.00	$ 1.437.664.00	2.00	$ 1.437.664.00	0.00	$ -
25.2	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	238.12	$ 13.649.00	$ 3.250.099.88	238.12	$ 3.250.099.88	238.12	$ 3.250.099.88	238.12	$ 3.250.099.88	0.00	$ -
25.3	PINTURA TUBO D= 2 1/2	ML	13.70	$ 9.088.00	$ 124.505.60	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	0.00	$ -
25.4	PINTURA TUBO D= 4"	ML	9.10	$ 11.441.00	$ 104.113.10	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	0.00	$ -
25.5	SUMINISTRO EINSTAL TABLERO ACRILICO	UN	4.00	$ 640.614.00	$ 2.562.456.00	4.00	$ 2.562.456.00	0.00	$ -	0.00	$ -	4.00	$ 2.562.456.00
25.6	PODA ARBOL ENTRE 5 A10 MTS	UN	5.00	$ 185.764.00	$ 928.820.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NP.4	REHAB Y MEJORA SUPERFI EXIS PLACA CONC CANCHA MULT	M2	0.00	$ 45.119.00	$ -	12.50	$ 563.987.50	12.50	$ 563.987.50	12.50	$ 563.987.50	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	2.00	$ 475.924.00	2.00	$ 475.924.00	2.00	$ 475.924.00	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 8.407.658.58		$ 8.537.493.88		$ 5.975.037.88		$ 5.975.037.88		$ 2.562.456.00
	GRADERIAS												
26.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	189.86	$ 6.638.00	$ 1.260.290.68	281.45	$ 1.868.265.10	281.45	$ 1.868.265.10	281.45	$ 1.868.265.10	0.00	$ -
26.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	189.86	$ 15.910.00	$ 3.020.672.60	231.45	$ 3.682.369.50	231.45	$ 3.682.369.50	231.45	$ 3.682.369.50	0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 4.280.963.28		$ 5.550.634.60		$ 5.550.634.60		$ 5.550.634.60		$ -
	CERRAMIENTO												
NP 8	PORTON PARA CERRAMIENTO DE 2X2, tubo galvanizado, angulo 1 1/8, malla eslabonada	UN	0.00	$ 4.097.000.00	$ -	1.00	$ 4.097.000.00	1.00	$ 4.097.000.00	1.00	$ 4.097.000.00	0.00	$ -
					$ -		$ 4.097.000.00		$ 4.097.000.00		$ 4.097.000.00		$ -
	PARQUE INFANTIL												
27.1	REPARACION MODULO JUEGO INFANTIL EXIST T. Pasamanos, rebal, columpio.	UN	1.00	$ 1.683.459.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	0.00	$ -	0.00	$ -
27.2	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	78.77	$ 6.638.00	$ 522.875.26	97.52	$ 647.337.76	97.52	$ 647.337.76	97.52	$ 647.337.76	0.00	$ -
27.3	PINTU.VINIL GRIS BASALTO EXTERIOR 3 MANOS	M2	28.77	$ 12.564.00	$ 361.466.28	27.74	$ 348.525.36	27.74	$ 348.525.36	27.74	$ 348.525.36	0.00	$ -
					$ 2.567.800.54		$ 2.679.322.12		$ 2.679.322.12		$ 995.863.12		$ -
	ADECUACION DE ZONAS VERDES												
28.1	PODA DE CESPED CON GUAD SIN VALLA INC REC. DISP FI	M2	4406.80	$ 269.00	$ 1.185.429.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 1.185.429.20		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL PLACA DEPORTIVA LA ALBORADA				$ 16.441.851.60		$ 20.864.450.60		$ 18.301.994.60		$ 16.618.535.60		$ 2.562.456.00
	PLACA DEPORTIVA VILLA BOLIVAR												

PLACA DEPORTIVA DE JUEGO														
29.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	1.00	$ 718.832.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29.2	PINTURA PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS	M2	640.77	$ 29.663.00	$ 19.007.160.51	639.60	$ 18.972.454.80	639.60	$ 18.972.454.80	0.00	$ -	0.00	$ -
29.3	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UN	2.00	$ 159.232.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	2.00	$ 318.464.00	0.00	$ -
29.4	SUMINE INS CANCHA MULT BASKET Y MICRO ANTI VANDAL	UN	2.00	$ 4.122.104.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	2.00	$ 8.244.208.00	0.00	$ -	0.00	$ -
29.5	REJILLA ANG.1"*3/16 y 1/2" cada 4cms A=.30 mts	ML	10.63	$ 167.019.00	$ 1.775.411.97	10.63	$ 1.775.411.97	10.63	$ 1.775.411.97	10.63	$ 1.775.411.97	0.00	$ -
29.6	LIMPIEZA REJILLA	ML	107.14	$ 2.406.00	$ 257.778.84	107.14	$ 257.778.84	107.14	$ 257.778.84	107.14	$ 257.778.84	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN	0.00	$ 237.962.00	$ -	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	6.00	$ 1.427.772.00	0.00	$ -
NP. 9	LEVANTAMIENTO DE PINTURA Y PULIDO DE PISO DE CONCRETO	M2	0.00	$ 16.200.00	$ -	639.60	$ 10.361.520.00	639.60	$ 10.361.520.00	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 30.321.855.32		$ 42.076.441.61		$ 42.076.441.61		$ 3.779.426.81		$ -
MALLA DE CERRAMIENTO														
30.1	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	201.00	$ 9.167.00	$ 1.842.567.00	201.00	$ 1.842.567.00	201.00	$ 1.842.567.00	201.00	$ 1.842.567.00	0.00	$ -
NP. 10	ARREGLO ANCLAJE MUROS CONTRA IMPACTO (INCLUYE SOLDADURA)			$ 3.298.000.00	$ -	1.00	$ 3.298.000.00	1.00	$ 3.298.000.00	1.00	$ 3.298.000.00	0.00	$ -
					$ 1.842.567.00		$ 5.140.567.00		$ 5.140.567.00		$ 5.140.567.00		$ -
	GRADERIAS													
31.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	65.45	$ 6.638.00	$ 434.457.10	265.87	$ 1.764.845.06	265.87	$ 1.764.845.06	265.87	$ 1.764.845.06	0.00	$ -
31.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	65.45	$ 15.910.00	$ 1.041.309.50	64.87	$ 1.032.081.70	64.87	$ 1.032.081.70	64.87	$ 1.032.081.70	0.00	$ -
					$ 1.475.766.60		$ 2.796.926.76		$ 2.796.926.76		$ 2.796.926.76		$ -
REPARACION PARQUE INFANTIL - BIOSALUDABLES														
32.1	REPARACION MODULO JUEGO INFANTIL EXIST T. Pasamanos, rebal, columpio.	UN	3.00	$ 1.683.459.00	$ 5.050.377.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
32.2	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	8.00	$ 825.564.00	$ 6.604.512.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
NPC. 4	GIMNASIO AIRE LIBRE: EL ASCENSOR O SIMIL (El eleva	UN	0.00	$ 4.388.068.00	$ -	1.00	$ 4.388.068.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4.388.068.00
NPC. 5	GIMNASIO AIRE LIBRE: ESQUI O SIMIL (la elíptica)	UN	0.00	$ 4.650.025.00	$ -	1.00	$ 4.650.025.00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 4.650.025.00
					$ 11.654.889.00		$ 9.038.093.00		$ -		$ -		$ 9.038.093.00
	CICLORUTA													
33.1	PINTURA TRAFICO PARA CICLORUTA	M2	445.02	$ 41.564.00	$ 18.496.811.28	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
33.2	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS MET	ML	95.05	$ 19.432.00	$ 1.846.929.61	129.71	$ 2.520.524.72	129.71	$ 2.520.524.72	129.71	$ 2.520.524.72	0.00	$ -
					$ 20.343.740.89		$ 2.520.524.72		$ 2.520.524.72		$ 2.520.524.72		$ -
	PARQUE DE AGUA													
34.1	PINTURA TUBO D= 4"	ML	68.20	$ 11.441.00	$ 780.276.20	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 780.276.20		$ -		$ -		$ -		$ -
	PLATAFORMAS DE MADERA													

35.1	DESMONTE CONTRAPISO MADERA (INCLUYE RETIRO, TRANS.5KM)	M2	252.08	$ 5.378.00	$ 1.355.686.24	60.00	$ 322.680.00	60.00	$ 322.680.00	60.00	$ 322.680.00	0.00	$ -
35.2	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (17.24Mpa, 2500psi)	M2	252.08	$ 90.701.00	$ 22.863.908.08	60.00	$ 5.442.060.00	60.00	$ 5.442.060.00	60.00	$ 5.442.060.00	0.00	$ -
35.3	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	753.70	$ 9.578.00	$ 7.218.938.60	179.40	$ 1.718.293.20	179.40	$ 1.718.293.20	179.40	$ 1.718.293.20	0.00	$ -
35.4	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE MESA DE PING PONG EN FIBRA DE VIDRIO DE 2.74X1.52M	UN	3.00	$ 6.472.801.00	$ 19.418.403.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
N.P 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE PING PONG PARA AIRE LIBRE EN TUBERIA REDONDA DE 1 1/4" 2 MM, ANGULO DE 1 1/4" 1/8" Y TABLERO EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 16	UND		$ 6.100.000.00		2.00	$ 12.200.000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 12.200.000.00
					$ 50.856.935.92		$ 19.683.033.20		$ 7.483.033.20		$ 7.483.033.20		$ 12.200.000.00
	TOTAL PLACA DEPORTIVA VILLA BOLIVAR				##########		$ 81.255.586,29		$ 60.017.493.29		$ 21.720.478.49		$ 21.238.093.00
	PLACA DEPORTIVA PLAYA RICA												
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO													
36.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	GL	1.00	$ 718.832.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	1.00	$ 718.832.00	0.00	$ -
36.2	SUMINISTRO EINSTAL TABLERO ACRILICO	UN	2.00	$ 640.614.00	$ 1.281.228.00	2.00	$ 1.281.228.00	0.00	$ -	0.00	$ -	2.00	$ 1.281.228.00
36.3	PINTURA TUBO D= 2 1/2	ML	13.70	$ 9.088.00	$ 124.505.60	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	14.00	$ 127.232.00	0.00	$ -
36.4	PINTURA TUBO D= 4"	ML	9.10	$ 11.441.00	$ 104.113.10	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	10.50	$ 120.130.50	0.00	$ -
NP. 1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML		$ 2.723.00		24.50	$ 66.713.50	24.50	$ 66.713.50	24.50	$ 66.713.50	0.00	$ -
					$ 2.228.678.70		$ 2.314.136.00		$ 1.032.908.00		$ 1.032.908.00		$ 1.281.228.00
MURO Y MALLA ESLABONADA: CERRAMIENTO													
37.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	145.20	$ 6.638.00	$ 963.837.60	142.21	$ 943.989.98	142.21	$ 943.989.98	142.21	$ 943.989.98	0.00	$ -
37.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	145.20	$ 12.454.00	$ 1.808.320.80	117.21	$ 1.459.733.34	117.21	$ 1.459.733.34	117.21	$ 1.459.733.34	0.00	$ -
37.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	52.44	$ 19.220.00	$ 1.007.896.80	72.36	$ 1.390.720.76	72.36	$ 1.390.720.76	72.36	$ 1.390.720.76	0.00	$ -
37.4	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc diagona	M2	52.44	$ 118.810.00	$ 6.230.396.40	72.36	$ 8.596.853.98	72.36	$ 8.596.853.98	72.36	$ 8.596.853.98	0.00	$ -
37.5	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L), TAPAS,<,PL	M2	287.04	$ 9.167.00	$ 2.631.295.68	267.08	$ 2.448.322.36	267.08	$ 2.448.322.36	267.08	$ 2.448.322.36	0.00	$ -
					$ 12.641.747.28		$ 14.839.620.42		$ 14.839.620.42		$ 14.839.620.42		$ -
GRADERIAS													
38.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	174.24	$ 6.638.00	$ 1.156.605.12	110.18	$ 731.374.84	110.18	$ 731.374.84	110.18	$ 731.374.84	0.00	$ -
38.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	174.24	$ 15.910.00	$ 2.772.158.40	110.18	$ 1.752.963.80	110.18	$ 1.752.963.80	110.18	$ 1.752.963.80	0.00	$ -
					$ 3.928.763.52		$ 2.484.338.64		$ 2.484.338.64		$ 2.484.338.64		$ -
PARQUE INFANTIL , BIOSALUDABLES													

39.1	REPARACION MODULO JUEGO INFANTIL EXIST T. Pasamanos, rebal, columpio.	UN	1.00	$ 1.683.459.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	1.00	$ 1.683.459.00	0.00	$ -
39.2	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	6.00	$ 825.564.00	$ 4.953.384.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					$ 6.636.843.00		$ 1.683.459.00		$ 1.683.459.00		$ 1.683.459.00		$ -
	TOTAL PLACA DEPORTIVA PLAYA RICA				$ 25.436.032,50		$ 21.321.554.06		$ 20.040.326,06		$ 20.040.326.06		$ 1.281.228.00
	CANCHA DEPORTIVA												
	CANCHA SINTETICA VILLA BOLIVAR												
PLACA DEPORTIVA DE JUEGO													
40.1	RETIRO CESPED ARTIF MONOFI (INC. TRANS. 5KM)	M2	1404.00	$ 2.046.00	$ 2.872.584.00	1500.00	$ 3.069.000.00	1500.00	$ 3.069.000.00	1500.00	$ 3.069.000.00	0.00	$ -
40.2	RELLENO MAT.TAM. MAX. 2". Inc compact manual (5km)	M3	82.50	$ 84.932.00	$ 7.006.890.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
40.3	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1404.00	$ 4.363.00	$ 6.125.652.00	1500.00	$ 6.544.500.00	1500.00	$ 6.544.500.00	1500.00	$ 6.544.500.00	0.00	$ -
40.4	CESPED ARTIF MONOFI 50%,FIBRI 50% h= 6cm, Arena+Caucho sum, insta, arena sílice, caucho	M2	1404.00	$ 159.612.00	$ 224.095.248,00	1500.00	$ 239.418.000.00	1500.00	$ 239.418.000.00	1500.00	$239.418.000.00	0.00	$ -
NP 5	DEMARCACION DE CANCHA SINTETICA	M2		$ 159.612.00	$ -	35.00	$ 5.586.420.00	35.00	$ 5.586.420.00	35.00	$ 5.586.420.00	0.00	$ -
NP. 11	RETIRO DE CAUCHO Y ARENA (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)	M2		$ 5.723.51	$ -	1500.00	$ 8.585.265.21	1500.00	$ 8.585.265.21	1500.00	$ 8.585.265.21	0.00	$ -
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UN		$ 237.962.00		2.00	$ 475.924.00	2.00	$ 475.924.00	2.00	$ 475.924.00	0.00	$ -
					$ 240.100.374,00		$ 263.679.109.21		$ 263.679.109.21		$263.679.109.21		$ -
	TOTAL CANCHA SINTETICA VILLA BOLIVAR				$ 240.100.374,00		$ 263.679.109.21		$ 263.679.109.21		$ 263.679.109.21		$ -
	TOTAL ESCENARIOS DEPORTIVOS				$ 671.661.036,15		$ 671.530.576.15	93.52%	$ 627.987.274.15	79.94%	$ 536.841.284.35	6.48%	$ 43.543.302.00

Tabla 37 Tabla avance de ejecución físico y financiero, contrato de obra 411 de 2022.

14.1 ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 1

A continuación, se relaciona la ejecución del contrato de interventoría No. 414 de 2022, para el pago del acta parcial de obra No. 1, teniendo en cuenta la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de dicho contrato


CONDICIONES INICIALES								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	CATEGORIA	CARGO/OFICIO	DEDICACION (Hombre/mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1. COSTOS DE PERSONAL													
A	PERSONAL PROFESIONAL												
1	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	10%	1	2.17	$ 4.100.000.00	$ 889.700.00	0.00	$ -	1.73	$ 709.300.00	1.73	$ 709.300.00
2	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	1	2.17	$ 3.331.342.62	$ 7.229.013.49	0.00	$ -	1.73	$ 5.763.222.73	1.73	$ 5.763.222.73
3	INGENIERRO SISO O PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%	1	2.17	$ 2.200.000.00	$ 4.774.000.00	0.00	$ -	1.73	$ 3.806.000.00	1.73	$ 3.806.000.00
B	PERSONAL TECNICO												
1	INGENIERO JUNIOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	100%	1	2.17	$ 1.245.876.00	$ 2.703.550.92	0.00	$ -	1.73	$ 2.155.365.48	1.73	$ 2.155.365.48
2	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	25%	1	2.17	$ 1.539.775.00	$ 835.327.94	0.00	$ -	1.73	$ 665.952.69	1.73	$ 665.952.69
3	CADENERO	CADENERO	25%	1	2.17	$ 1.143.960.00	$ 620.598.30	0.00	$ -	1.73	$ 494.762.70	1.73	$ 494.762.70
A+B	SUBTOTAL PERSONAL						$ 17.052.190.64		$ -		$ 13.594.603.60		$ 13.594.603.60
	FACTOR MULTIPLICADOR						2.20		2.20		2.20		2.20
C	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*FM						$ 37.514.819.41		$ -		$ 29.908.127.92		$ 29.908.127.92
2. COSTOS DIRECTOS													
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR	VALOR TOTAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1	vehículo campero pick-up,camioneta (incluye conductor y combustible)	ALQUILER DE CAMIONETA DE CILINDRAJE 1300 A 2000 CC	MES	1	2.17	$ 2.150.595.06	$ 4.666.791.28	0.00	$ -	1.69	$ 3.634.505.65	1.69	$ 3.634.505.65
2	Equipo de topografía	ALQUILER DE EQUIPO DE	MES	1	0.54	$ 2.216.990.45	$ 1.197.174.84	0.00	$ -	0.54	$ 1.197.174.84	0.54	$ 1.197.174.84

		TOPOGRAFIA (ESTACIONES, NIVELES DE PRECISION, GPS, ENTRE OTROS)											
3	Laboratorio	LABORATORIOS DE INTERVENTORIA (Incluye Equipo completo y Entrega de informes de Ensayos y Resultados)	MES	1	2.17	$ 1.610.000.00	$ 3.493.700.00	0.00	$ -	1.69	$ 2.720.900.00	1.69	$ 2.720.900.00
D	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 9.357.666.12		$ -		$ 7.552.580.49		$ 7.552.580.49
E	TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (D+E)						$ 46.872.485.54		$ -		$ 37.460.708.41		$ 37.460.708.41
F	IVA 19% SOBRE(F)						$ 8.905.772.25	0%	$ -	79.92%	$ 7.117.534.60	79.92%	$ 7.117.534.60
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA(E+F)						$ 55.778.257.79		$ -		$ 44.578.243.01		$ 44.578.243.01
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F) REDONDEADO						$ 55.778.257.79		$ -		$ 44.578.243.01		$ 44.578.243.01


CUADRO RESUMEN	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.778.257.79
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 55.778.257.79
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 44.578.243.01
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA	79.92%

15. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

15.1 ORGANIGRAMA PERSONAL DE INTERVENTORIA

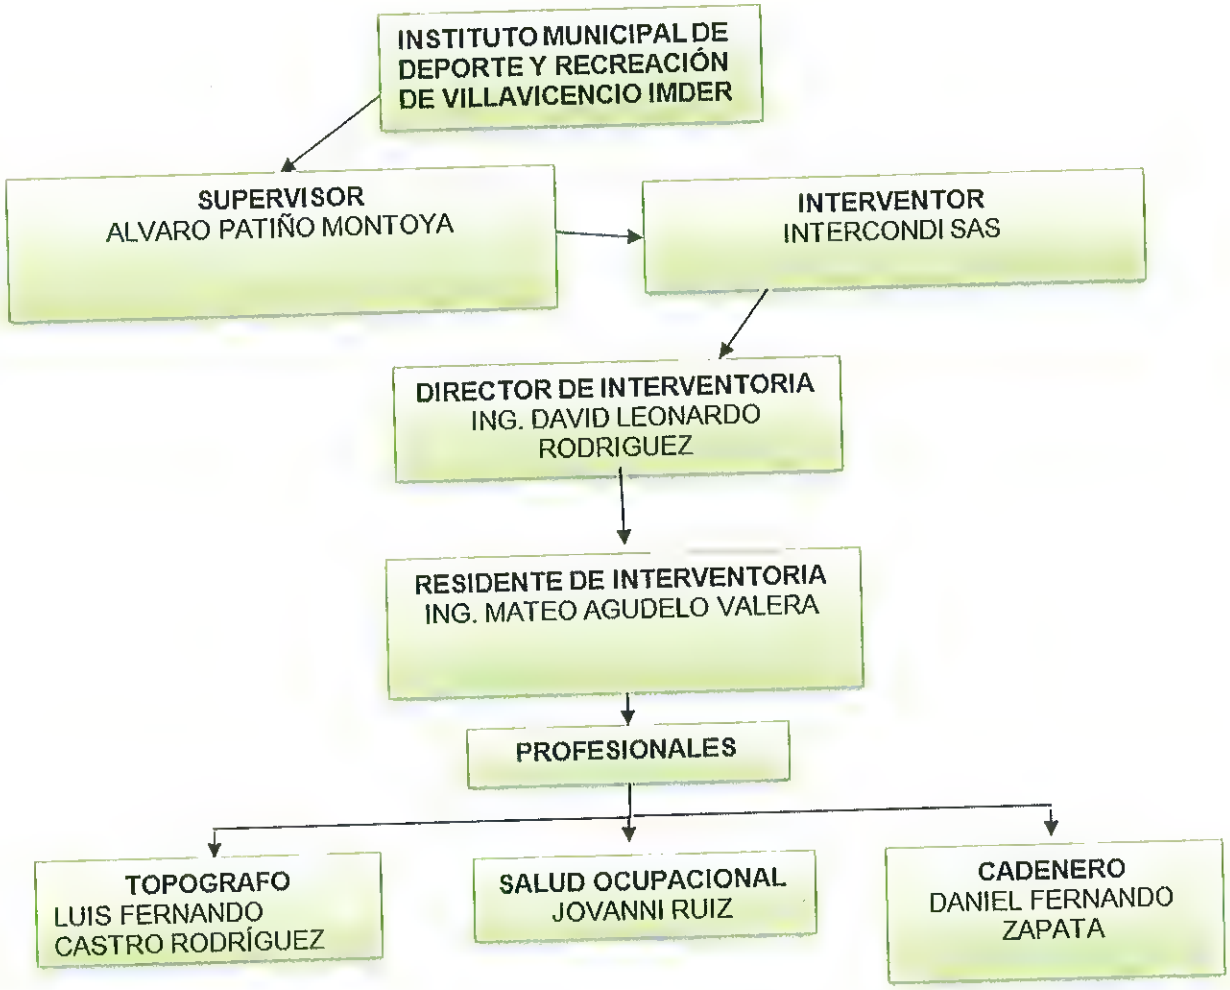

15.2 ORGANIGRAMA PERSONAL DE OBRA

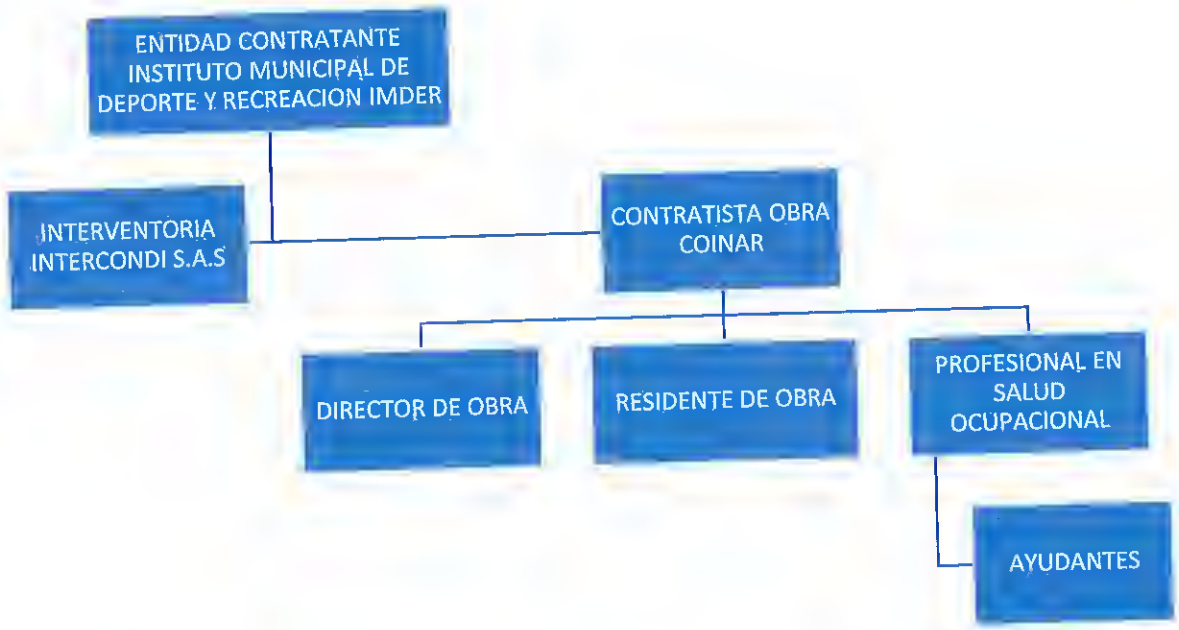

16. ACTAS SUSCRITAS

FECHA	ACTAS SUSCRITAS
18 de noviembre de 2022	**Acta de Inicio,** suscrita por el representante legal del contrato de obra 411 de 2022 y el representante legal del contrato de interventoría 414 de 2022.
22 de noviembre de 2022	**Acta de reunión,** comité de obra No.1 en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría y personal del IMDER.
26 de noviembre de 2022	**Acta de socialización,** en los escenarios deportivos de los barrios santa helena, paraiso, Vizcaya y playa rica en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y la comunidad en general.
06 de diciembre de 2022	**Acta de reunión,** comité de obra No. 2 en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría y personal del IMDER
09 de diciembre de 2022	**Acta de socialización,** en los escenarios deportivos de los barrios las gaviotas, esperanza, palmas y alborada en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y la comunidad en general.
13 de diciembre de 2022	**Acta de reunión,** comité de obra No. 3 en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y la comunidad en general.
28 de Diciembre de 2022	**Acta de suspensión,** Se realizo debido al suministro de materiales de los proveedores de la malla electrosoldada, las canchas antivandálicas y el césped sintético.

01 de febrero de 2023	**Acta de reinicio,** se da reinicio a las actividades propias del contrato
01 de febrero de 2023	**Acta de socialización,** en el escenario deportivo del barrio villa bolívar en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER, directores de escuelas deportivas y la comunidad en general.
03 de febrero de 2023	**Acta de prorroga No. 1,** Se concede prorroga No. 1 para el contrato de interventoría por un periodo de 23 días con el fin de poder continuar con las obligaciones contractuales.
11 de febrero de 2023	**Acta de socialización,** en el escenario deportivo del barrio villa santa martha en acompañamiento de personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER, directores de escuelas deportivas y la comunidad en general.
23 de febrero de 2023	**Acta de socialización,** una vez se terminó la instalación del césped sintético en la cancha del escenario deportivo del barrio villa bolívar, se llevo a cabo la socialización sobre el mantenimiento y cuidados de dicho césped para mayor durabilidad.
24 de febrero de 2023	**Acta de prorroga No.1,** Se otorga una prórroga No.1 para el contrato de obra, debido a la demora del suministro de los biosaludables y la pintura para la placa deportiva del barrio villa Bolívar.
24 de febrero de 2023	**Acta de prorroga No. 2,** Se concede prorroga No. 2 para el contrato de interventoría por un periodo de 15 días con el fin de poder continuar con las obligaciones contractuales.
07 de marzo de 2023	**Acta de modificación No. 1,** teniendo en cuenta las mayores y menores cantidades de obra, así como la necesidad de incluir ítems no previstos, se procedió a realizar el acta de modificación No. 1 del contrato de obra No. 411 de 2022.
13 de marzo de 2023	**Acta de prorroga No. 2,** Se otorga prorroga No.2 para el contrato de obra, debido a que a la fecha no se habían podido instalar las meses de ping pong en el escenario deportivo de villa bolívar, ya que el proveedor tuvo inconvenientes con los materiales para su fabricación.
13 de marzo de 2023	**Acta de prorroga No. 3,** Se concede prorroga No. 3 para el contrato de interventoría por un periodo de 8 días con el fin de poder continuar con el seguimiento y control de contrato objeto de esta interventoria.

17. CONTROL DE CALIDAD

Se procedió a realizar la toma de densidades por el método del cono de arena siguiendo la norma INV E-161-13, para el relleno de material de 2" debidamente compactado, empleado para la construcción de placa en concreto en el escenario deportivo del barrio Vizcaya 6.

Esta Interventoría tomo muestras del concreto para la placa del escenario deportivo del barrio Vizcaya 6 y Villa bolivar, conforme la Norma Técnica NTC – 550, las cuales se garantiza el curado inicial por 24 horas procediéndose a ser desmoldados, posteriormente se procede a almacenar las muestras en tanques de almacenamiento de agua, siendo este

un ambiente adecuado para garantizar el curado final de los mismos hasta que sean transportados al laboratorio para ser sometidos a falla.

17.1 RESULTADOS DE LABORATORIO

- DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA

FECHA DE TOMA	NORMA	UBICACION	%COMPACTACION OBTENIDOS	CUMPLE
15-12-22	INV E-161-13	Placa Viscaya	100.29%	SI
			96.63%	
			96.83%	
			97.00%	

- ENSAYO A COMPRESION EN CILINDROS DE CONCRETO

FECHA DE TOMA	NORMA	UBICACION	EDAD DE CURADO	RESISTENCIA OBTENIDA	CUMPLE
16-12-23	NTC-550 de 2017 NTC-673 de 2010	Placa Viscaya	14 DIAS	79.00%	SI
			28 DIAS	102.40%	SI
19-12-23	NTC-550 de 2017 NTC-673 de 2010	Placa Viscaya	28 DIAS	102.20%	SI
04-02-23	NTC-550 de 2017 NTC-673 de 2010	Placa Villa Bolivar	14 DIAS	76.00%	SI
			28 DIAS	102.2%	SI


NOTA: Los resultados de laboratorio se adjuntan al presente informe.


18. ESTADO DEL TIEMPO


A continuación, se relaciona el estado del tiempo durante el periodo comprendido del 18 de noviembre de 2022 al 09 de marzo de 2023.

El presente análisis se determinó por el reporte diario realizado y reportado respectivamente en la bitácora.

- NOVIEMBRE 2022

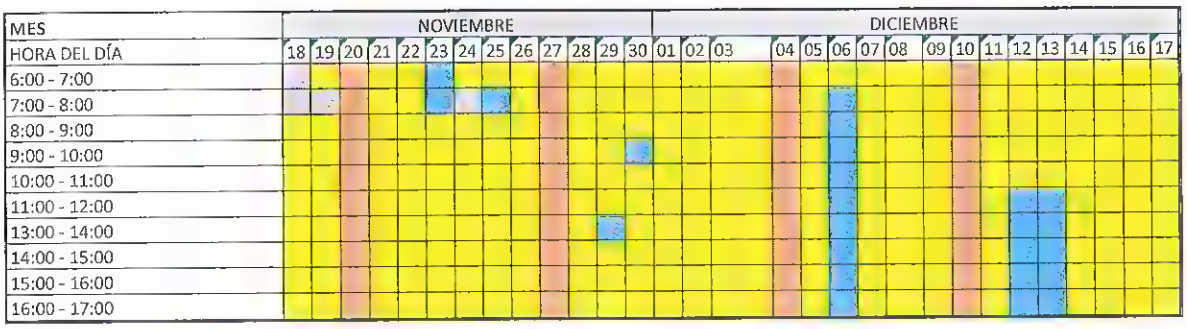


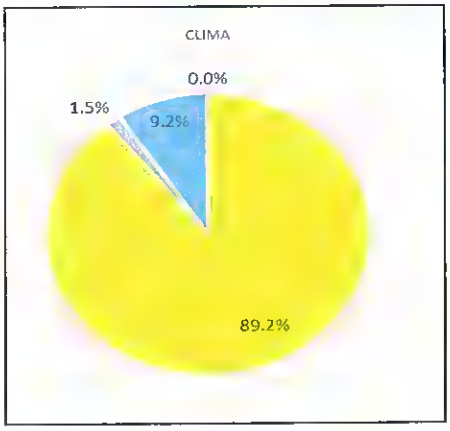






- DICIEMBRE 2022

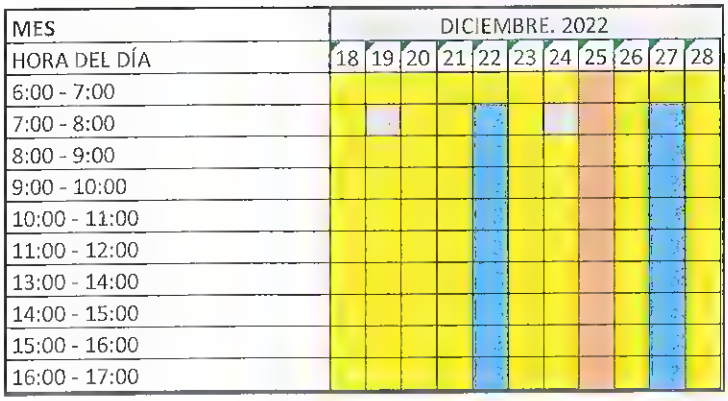

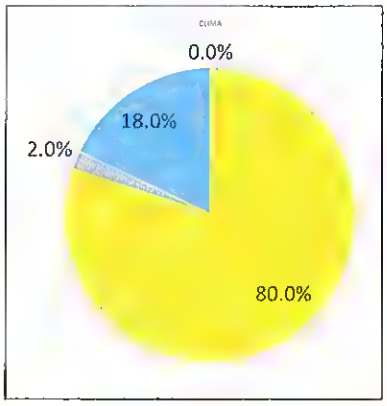







- FEBRERO 2023

MES	feb-23																										
HORA DEL DÍA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
6:00 - 7:00																												
7:00 - 8:00																												
8:00 - 9:00																												
9:00 - 10:00																												
10:00 - 11:00																												
11:00 - 12:00																												
13:00 - 14:00																												
14:00 - 15:00																												
15:00 - 16:00																												
16:00 - 17:00																												

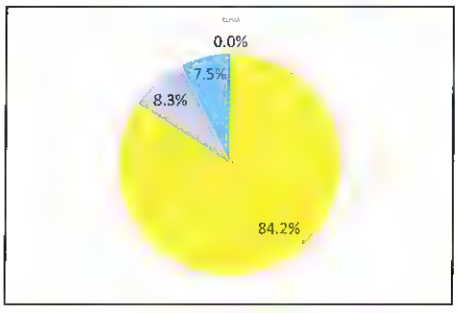





19. OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR

- El contrato 411 de 2022 a la fecha presenta una ejecución física del 93.52%, que corresponde a la ejecución de las actividades propias del contrato en los diferentes escenarios deportivos desde el 18 de noviembre de 2022 hasta el 09 de marzo de 2023.

- Se evidencio desde el inicio del contrato y durante la ejecución de las actividades, unas mayores y menores cantidades de obra; así como la necesidad de incluir ítems no previstos necesarios para el correcto y continuo desarrollo del mejoramiento de los escenarios deportivos objeto del contrato. Por lo que se procedió a realizar el acta de modificación de cantidades No.1 del contrato de obra No. 411 de 2022.

- El día 28 de diciembre de 2022 se procedió a suspender el contrato de obra No. 411 de 2022 por un periodo de 35 días, atendiendo la solicitud emitida por el contratista de obra, por lo que la interventoría solicito a la entidad suspender el contrato de interventoría No. 414 de 2022 el mismo tiempo que el contrato de obra.

- Teniendo en cuenta que la fecha de terminación del contrato de interventoría correspondía al 03 de febrero de 2023 y la fecha de terminación del contrato de obra objeto de esta interventoría vencía el 26 de febrero de 2023; se solicito una prórroga por un periodo de 23 días, con el fin de continuar con el seguimiento, control y cumplimiento con las obligaciones adquiridas.

- En el mes de febrero de 2022, el contratista COINAR LTDA solicito una prorroga por un periodo de 15 días calendario, ya que el proveedor que suministra los biosaludables a instalar en el escenario deportivo de santa marta y villa Bolívar presento inconvenientes con los suministros necesarios para su fabricación. De igual manera, el proveedor de la pintura para la placa deportiva del barrio villa bolívar presento inconvenientes para el suministro. Por lo tanto, esta interventoría avalo dicha prorroga y se dio trámite ante la entidad contratante; por lo que se procedió a solicitar el mismo tiempo de prorroga para el contrato de interventoría, con el fin de continuar con el control y seguimiento al contrato de obra.

- Durante la ejecución del contrato de obra, tanto el contratista como la interventoría tomo las respectivas muestras de concreto de la placa fundida

en el barrio vizcaya y en la placa del escenario deportivo del barrio villa bolivar, en donde se obtuvo las resistencias del concreto requeridas.

- Antes de dar inicio a las actividades en cada uno de los escenarios deportivos, se procedió a realizar la socialización, en donde se dio a conocer las labores a realizar y el alcance del proyecto. En dicha socialización se conto con el personal del contratista, personal de la interventoría, personal del IMDER, el presidente de la junta de acción comunal del respectivo barrio y la comunidad en general

- En cada uno de los escenarios se procedió a instalar la valla informativa del proyecto, dando cumplimiento con las obligaciones del contratista.

- El día 13 de marzo de 2023, el contratista presento solicitud de prorroga No. 2 por un periodo de 8 días calendario, teniendo en cuenta los inconvenientes que tuvo el proveedor para suministrar las mesas de ping pong del escenario deportivo del barrio villa bolivar.

- Con base en el presente informe, la interventoría solicita el pago del Acta Parcial de interventoría 01, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. ($ 44.578.243,01), correspondiente al corte del 18 de noviembre de 2022 hasta el 15 de marzo de 2023.

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERCONDI SAS.

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTA PARCIAL No. 1

POLIDEPORTIVO SEPTIMA DE LA ESPERANZA

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER, el presidente de la junta de acción comunal y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
1.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00 %

Se realizo la demarcación de la cancha polifuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
1.2	PINTURA TUBO D= 2 ½"	ML	14.00	14.00	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 2 ½" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
1.3	PINTURA TUBO D= 4"	ML	10.50	10.50	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 4" de las canchas existentes en el escenario deportivo




ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	151.20	151.20	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	126.20	126.20	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER

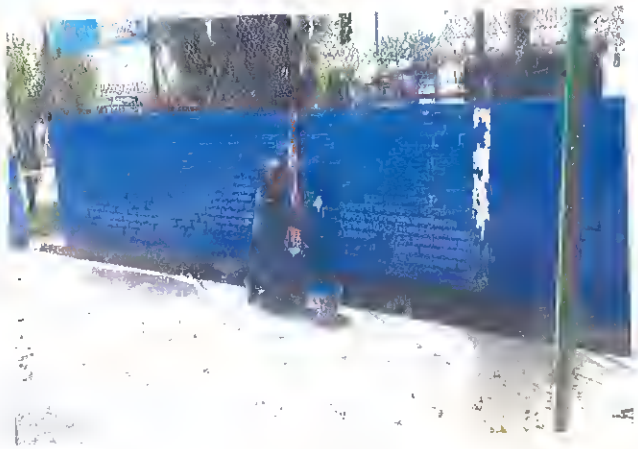

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	96.61	96.61	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.4	MODULOS EN MALLA PROTECCION	M2	20.79	20.79	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de los módulos en malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de los mismos en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.5	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc	M2	75.82	75.82	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
2.6	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L),	M2	116.56	116.56	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
3.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	139.13	139.13	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
3.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	139.13	139.13	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte de acuerdo con los colores estipulados por el IMDER.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML	24.5	24.5	100.00%

Se procedió a lijar la superficie de los tubos de 2 ½" y 4" de las canchas existentes en el escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 2	DESMONTE DE TABLERO ACRILICO	UND	1.0	1.0	100.00%

Se realizo el desmonte del tablero acrílico existente de una de las canchas para reemplazarlo ya que se encontraba en mal estado



REGISTRO FOTOGRAFICO POLIDEPORTIVO GAVIOTAS

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
5.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00 %

Se realizo la demarcación de la cancha polifuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
6.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	158.79	158.79	99.36%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
6.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	133.79	133.79	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
6.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	75.00	75.00	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
6.4	MODULOS EN MALLA PROTECCION	M2	75.00	75.00	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de los módulos en malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de los mismos en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
6.5	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L),	M2	99.60	99.60	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
7.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	294.72	294.72	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
7.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	294.72	294.72	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte de acuerdo con los colores estipulados por el IMDER.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, LD = 1,20 METROS	ML	62.00	62.00	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la canal en lamina galvanizada en la cubierta del escenario deportivo, puesto que se encontraba en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
8.2	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	91.00	91.00	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de tubería PVC 4" para las bajantes de aguas lluvias de la cubierta existente del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
8.3	CODO 45° EN PVC D=4" SANITARIO	UND	56.00	56.00	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de codos en PVC 4" para las bajantes de aguas lluvias de la cubierta existente del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el desmonte de las cachas existentes en el escenario, con el fin de instalar canchas multifuncionales antivandálicas.



REGISTRO FOTOGRAFICO POLIDEPORTIVO SANTA MARTHA

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER, el presidente de la junta de acción comunal y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
10.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	300.00	300.00	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto del escenario deportivo existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
10.3	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	300.00	300.00	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con vinilo tipo coraza de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
11.1	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	7.43	7.43	100.00%

Se procedió a pintar los pedestales de la estructura metálica del escenario con vinilo tipo coraza de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el desmonte de las cachas existentes en el escenario, con el fin de instalar canchas multifuncionales antivandálicas.




REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA LAS PALMAS

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoria, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra

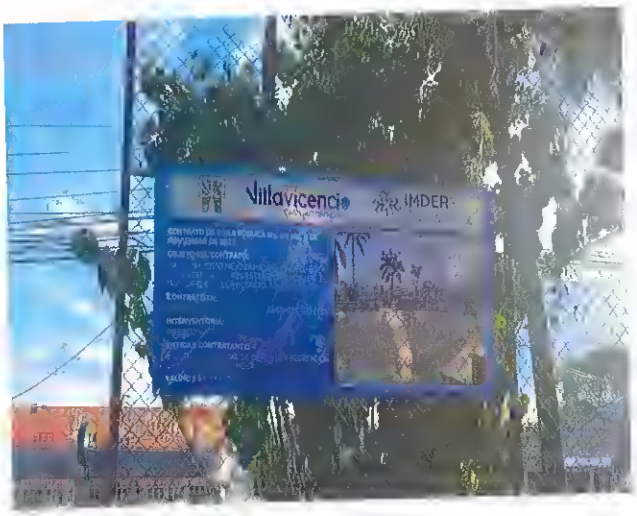


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
13.1	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	296.00	296.00	100.00%

Se realiza el lavado de las juntas de la placa deportiva y se procede a instalar el sello de las juntas en poliuretano.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
13.3	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el desmonte de las canchas existentes en el escenario deportivo.

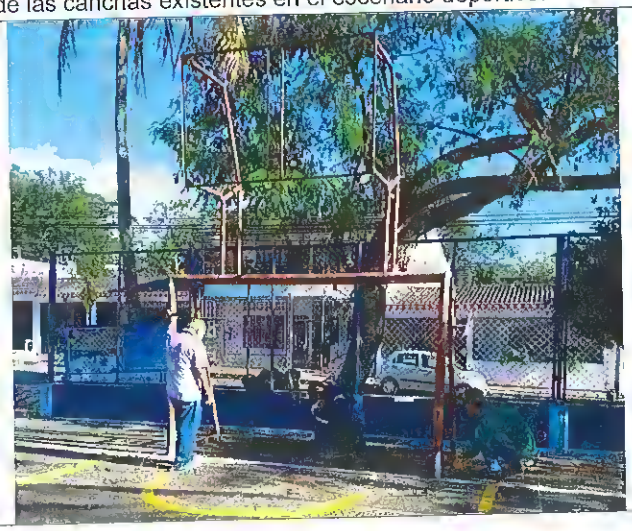

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
14.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	56.15	56.15	10.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
14.3	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	31.15	31.15	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
14.4	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	37.60	37.60	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
14.5	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc	M2	37.6	37.6	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
15.2	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UND	4.00	4.00	100.00%

Se realizo el desmonte y retito de las bancas existentes que se encuentran en mal estado.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 4	REHAB Y MEJORA SUPERFI EXIS PLACA CONC CANCHA MULT	M2	5.92	5.92	100.00%

Se realizo el lavado de los sellos de las juntas de la placa deportiva existente con el fin de poder realizar la instalación del sello en poliuretano.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha mulfuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 6	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31	UND	4.00	4.00	100.00%

Se realizo el suministro e instalación de la banca en concreto sin espaldar ref. M-31 a los laterales de la placa deportiva del escenario deportivo.



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA SANTA HELENA

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER, el presidente de la junta de acción comunal y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
16.2	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	1.00	1.00	100.00 %

Se realizo el desmonte de la cancha existente en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
17.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	78.78	78.78	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
17.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	53.78	53.78	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
17.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	113.85	113.85	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
17.4	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc	M2	113.85	113.85	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
17.5	PINTURA TUBO D= 2 ½"	ML	62.10	62.10	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 2 ½" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
18.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	230.25	230.25	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
18.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	230.25	230.25	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte de acuerdo con los colores estipulados por el IMDER.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML	62.10	62.10	100.00%

Se realizo lijado de la tubería de 2 ½" existente del muro contra impacto del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha mulfuncional sobre la placa deportiva existente



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA VISCAYA 6

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad

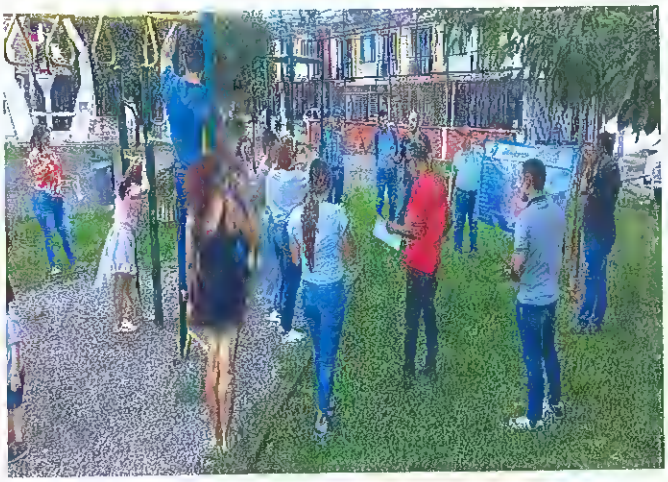

INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
19.1	DEMOLI ANDEN,PLACAS,SARDIN.Inc cargue manual,ret5k	M3	44.54	45.54	100.00%

Se realizo demolición de la placa de concreto existente en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
19.2	DESCAPOTE MANUAL INC RETIRO	M2	25.0	25.0	100.00%

Se realizo el descapote manual de las áreas verdes aledañas a la placa existente.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
19.3	RELLENO MAT.TAM.MAX.2" INCLUYE CAMPACTACION MANUAL 5KM	M3	140.43	140.43	100.00%

Se procedió a realizar relleno con material tamaño máximo de 2" en capa debidamente compactadas.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
19.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUIT (manual) inc plano.	M2	319.95	319.95	100.00%

Se realizo la localización y replanteo para la placa en concreto a construir en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
19.5	PLACA CONTRAP e=12 cm(20.7Mpa,3000psi) inc ME M262	M2	319.95	319.95	100.00%

Se procedió a fundir la placa en concreto e=12 cm de 3000 PSI reforzada con malla electrosoldada



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
20.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	70.22	70.22	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
20.2	PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	70.22	70.22	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario deportivo con vinilo tipo coraza de acuerdo con los colores determinados por el IMDER




ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 6	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-31	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el suministro e instalación de la banca en concreto sin espaldar ref. M-31 a los laterales de la placa deportiva del escenario deportivo.

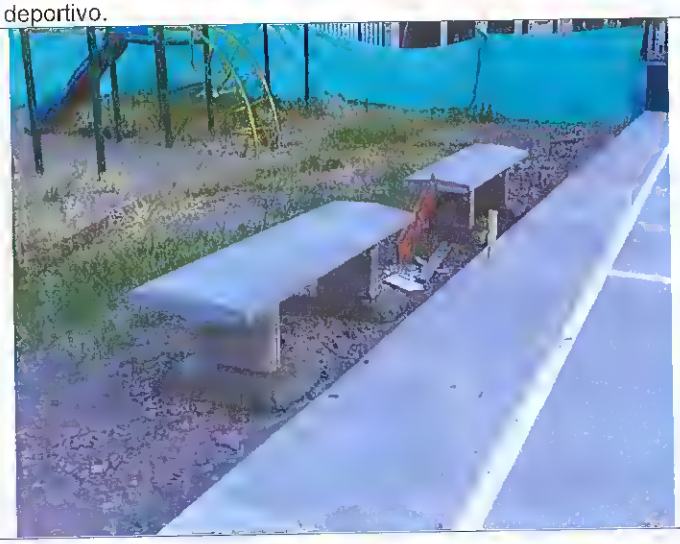

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 7	EXCAVACION MECANICA CONGLOM, Incl retiro 5 kms	M3	73.24	73.24	100.00%

Se realizo excavación mecánica, con el fin de retirar el material existente para la instalación del material de rio de 2" para la nivelación de la placa a construir



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el desmonte de las canchas existentes con el fin de reemplazaras por canchas multifuncionales antivandálicas



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 8	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	165.60	165.60	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha mulfuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NPC. 7	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha mulfuncional sobre la placa deportiva existente



TOMA DE DENSIDADES

Una vez que el contratista realizo el relleno de material tamaño máximo de 2" debidamente compactado, se procedió a tomar muestras para toma de densidades para verificar el porcentaje de compactación requerido. Esto con el fin de poder fundir la placa de concreto de 3000 PSI.



TOMA MUESTRAS DE CONCRETO
Se procedió a tomar muestras de concreto utilizado para fundir la placa del escenario deportivo. Esto para poder verificar en el laboratorio la resistencia del concreto que se requiere.



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA EL PARAISO

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
22.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD (SIN/RELLEN)	UND	1.00	1.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha polifuncional del escenario deportivo con pintura de trafico pesado de acuerdo a las instrucciones y colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
23.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	104.68	104.68	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes en este escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
23.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	79.68	79.68	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
23.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	87.36	87.36	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
23.4	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc	M2	87.36	87.36	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
23.5	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON #3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE ACTIVIDAD: TENSIÓN. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE.	M2	132.80	132.80	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla de nylon para el cerramiento de los muros contra impacto del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
24.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	181.63	181.63	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
24.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	181.63	181.63	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte de acuerdo con los colores estipulados por el IMDER.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
24.3	MURO BLOQUE FLEX No410x20x30cms morte tipo S(1:3)	M2	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación del bloque flexa No. 4 para el arreglo de los muros de las graderías del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
24.4	DEMOLICION MUROS 0.15, cargue manual, retiro5km	M2	2.00	2.00	100.00%

Se realizo la demolición de los muros que se encontraban en mal estado de las graderías del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
24.5	PAÑETE LISO MURO MORTER01:3 e= 0,025 mts	M2	22.90	22.90	100.00%

Se realizo el pañete de los muros que se repararon de las graderías del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCEITEM
NPC. 6	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	1.00	1.00	100.00%

Se realizo el desmonte de la cancha existente en el escenario deportivo.



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA LA ALBORADA

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
25.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	2.00	2.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha polifuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
25.2	SELLO DE JUNTAS EN POLIURETANO	ML	238.12	238.12	100.00%

Se realiza el lavado de las juntas de la placa deportiva y se procede a instalar el sello de las juntas en poliuretano.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
25.3	PINTURA TUBO D= 2 ½"	ML	14.00	14.00	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 2 ½" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
25.4	PINTURA TUBO D= 4"	ML	10.50	10.50	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 4" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
26.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	281.45	281.45	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
26.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	231.45	231.45	100.00%

Se procedió a pintar las graderias del escenario con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
27.2	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	97.52	97.52	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías, muros y senderos del parque infantil



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
27.3	PINTU.VINIL GRIS BASALTO EXTERIOR 3 MANOS	M2	27.74	27.74	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del parque infantil con pintura para exteriores.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 4	REHAB Y MEJORA SUPERFI EXIS PLACA CONC CANCHA MULT	M2	12.50	12.50	100.00%

Se realizo el lavado de los sellos de las juntas de la placa deportiva existente con el fin de poder realizar la instalación del sello en poliuretano.



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 8	PORTON PARA CERRAMIENTO DE 2X2, tubo galvanizado, angulo 1 1/8, malla eslabonada	UND	1.00	1.00	100.00%

Se procedió a instalar el portón para el cerramiento del escenario deportivo, atendiendo las peticiones de la comunidad.



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA VILLA BOLIVAR

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
29.3	DESM. CANCHA BALONCESTO. Inc retiro	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el desmonte de las canchas existentes en el escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
29.5	REJILLA ANG.1"*3/16 y 1/2" cada 4cms A=.30 mts	ML	10.63	10.63	100.00%

Se realizo el suministro de la rejilla en ángulo de las áreas en donde hacia falta dicha rejilla en la placa deportiva del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
29.6	LIMPIEZA REJILLA	ML	107.14	107.14	100.00%

Se realizo la limpieza de la rejilla existente alrededor de la placa deportiva del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
30.1	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L),	M2	201.00	201.00	100.00%

Se realizo el suministro y pintura de la malla eslabonada de los muros contra impacto del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
31.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	265.87	265.87	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
31.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	64.87	64.87	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte domestico



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
33.2	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS MET	M2	129.71	129.71	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte domestico



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
35.1	DESMONTE CONTRAPISO MADERA (INCLUYE RETIRO. TRANS.5KM)	M2	60.00	60.00	100.00%

Se procedió a realizar el desmonte del piso en madera de la plataforma existente aledaña a la placa deportiva del escenario deportivo, ya que se encontraba en mal estado.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
35.2	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (17.24Mpa, 2500psi)	M2	60.00	60.00	100.00%

Se procedió a realizar el vaciado en concreto de 2500 Psi de la placa aledaña a la placa deportiva del escenario



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
35.3	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	179.40	179.40	100.00%

Se procedió a realizar el vaciado en concreto de 2500 Psi de la placa aledaña a la placa deportiva del escenario



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	6.00	6.00	100.00%

Se realizo el anclaje en concreto reforzado para la instalación de las canchas multifuncionales antivandálicas del escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP. 10	ARREGLO ANCLAJE MUROS CONTRA IMPACTO (INCLUYE SOLDADURA)	UND	1.00	1.00	100.00%

Se realizo el lavado arreglo de los tubos de anclaje



TOMA MUESTRAS DE CONCRETO
Se procedió a tomar muestras de concreto utilizado para fundir la placa aledaña a la cancha deportiva. Esto para poder verificar en el laboratorio la resistencia del concreto que se requiere.



REGISTRO FOTOGRAFICO PLACA DEPORTIVA PLAYA RICA

SOCIALIZACION DEL CONTRATO
Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se conto con la presencia del personal de obra, personal de interventoria, personal del IMDER y comunidad



INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Se instalo la valla en el escenario deportivo, en donde se especifica la información del contrato de obra



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
36.1	DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU.TRAF.PESAD	GL	1.00	1.00	100.00%

Se realizo la demarcación de la cancha mulfuncional sobre la placa deportiva existente



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
36.3	PINTURA TUBO D= 2 ½"	ML	14.00	14.00	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 2 ½" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
36.4	PINTURA TUBO D= 4"	ML	10.50	10.50	100.00%

Se realizo la pintura del tubo de 4" de las canchas existentes en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
37.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	142.21	142.21	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de los muros contra impacto existentes del escenario deportivo




ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
37.2	PINTURA ESMALTE DOMESTICO SOBRE MURO LADRILLO	M2	117.21	117.21	100.00%

Se procedió a pintar los muros contra impacto con esmalte domestico de acuerdo con los colores determinados por el IMDER



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
37.3	DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO	M2	72.36	72.36	100.00%

Se realizo el desmonte de la reja y la malla de cerramiento de los muros contra impacto del escenario, que se encontraban en mal estado

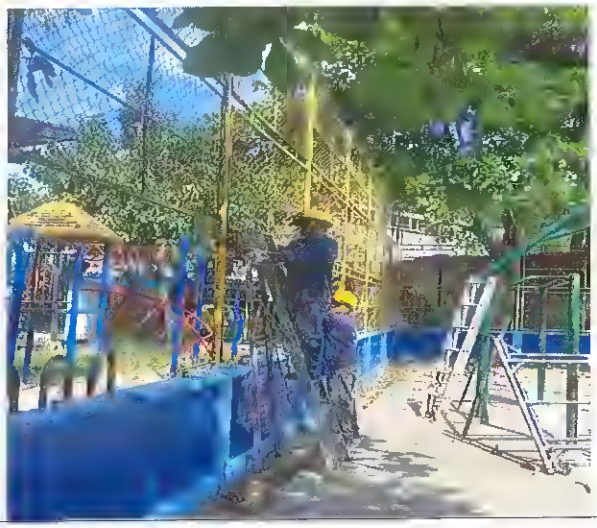

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
37.4	MALLA ESLABON CORR./ < FIJA S-I 1*3/16 inc	M2	72.36	72.36	100.00%

Se realizo el suministro y la instalación de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
37.5	PINTURA MALLA ESLABON/T. GALV 2"(L),	M2	267.08	267.08	100.00%

Se realizo el suministro y pintura de la malla eslabonada de las áreas en donde se hizo el desmonte de la misma en los muros contra impacto.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
38.1	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	110.18	110.18	100.00%

Se realiza el lavado y limpieza de las graderías existentes en el escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
38.2	PINTURA EN ESMALTE XA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	110.18	110.18	100.00%

Se procedió a realizar la pintura de las graderías del escenario deportivo con esmalte domestico



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
39.1	REPARACION MODULO JUEGO INFANTIL EXIST T. Pasamanos, rebal, columpio.	UND	1.00	1.00	100.00%

Se procedió a realizar las reparaciones del juego infantil existente en el escenario deportivo



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP.1	ACTIVIDAD DE LIJADO PARA PREPARACION DE SUPERFICIE	ML	24.50	24.50	100.00%

Se procedió a realizar el lijado de los tubos de las canchas existentes en el escenario deportivo para su posterior pintura



REGISTRO FOTOGRAFICO CANCHA SINTETICA VILLA BOLIVAR

Se socializo con personal del IMDER y los lideres de las escuelas de futbol el cuidado y mantenimiento del césped para su correcto uso y durabilidad.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
40.1	RETIRO CESPED ARTIF MONOFI (INC. TRANS. 5KM)	M2	1500.00	1500.00	100.00%

Se realizo el retiro del césped existente en la cancha sintética del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
40.3	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	1500.00	1500.00	100.00%

Se realizo la imprimación con emulsión asfáltica en la cancha sintética del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
40.4	CESPED ARTIF MONOFI 50%,FIBRI 50% h= 6cm, Arena+Caucho sum, insta, arena sílice, caucho	M2	1500.00	1500.00	100.00%

Se realizo el suministro e instalación del césped artificial incluyendo arena y caucho en la cancha sintética del escenario deportivo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP.3	ANCLAJE PARA CANCHA	UND	2.00	2.00	100.00%

Se realizo el anclaje para uno de los arcos existentes en la cancha sintetica, ya que para cumplir con las medidas reglamentarias se vio la necesidad de correrlo.



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP.5	DEMARCACION DE CANCHA SINTETICA	M2	35.00	35.00	100.00%

Se realizo la demarcación de las dos canchas internas



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	AVANCE ITEM
NP.11	RETIRO DE CAUCHO Y ARENA (INCLUYE TRANSPORTE 5 KM)	M2	1500.00	1500.00	100.00%

Se realizo el retiro del caucho y arena sobrante, una vez q se realizo el retiro del césped existente en la cancha del escenario deportivo.



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN VILLAVICENCIO – IMDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 414 de 2022

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

INFORME PARA PARCIAL N. 01 - AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

PROYECTÓ	REVISÓ
Jeiler Jovanni Ruiz Cárdenas Profesional SST	Ing. DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ. Director de interventoría

NOVIEMBRE 2022 A MARZO 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. RESUMEN DEL INFORME 3
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 4
2.1. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS 5
2.2. RESUMEN ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST. 6
3. MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA. 9
3.1. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO. 9
3.2 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 9
3.2.1 MANEJO DE CAMPAMENTOS., OFICINA Y CENTROS DE ACOPIO. 10
3.2.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 10
3.3.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. 10
3.3.4. VEHÍCULOS CONTRATISTA 10
3.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
3.4.1. EMPLEOS CONTRATISTA 11
3.4.4. ACTIVIDADES SST 12
3.5. INDICADORES 13
3.5.1. INDICADORES AMBIENTALES 13
3.5.3. INDICADORES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 14
4. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA AMBIENTAL, SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15
4.1.1 PERSONAL SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15
4.2 COMITES INTEGRALES Y COMITÉS AMBIENTALES, SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 15
4.3 VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES: 16
4.4. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS. 16
4.5. LISTA DE CHEQUEO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST, EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 17
4.6. CUMPLIMIENTOS DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA LA PREVENCIÓN DEL COVID – 19. 18
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18
5.1 CONCLUSIONES 18
5.2 RECOMENDACIONES 18
6. ANEXOS 19

1. RESUMEN DEL INFORME

En el presente informe se describen las actividades Ambientales y SST realizados por el Contratista y la Interventoría, en la etapa constructiva del proyecto **"MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".** En el cumplimiento del contrato de interventoría N. 414 de 2022 cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**" El presente informe abarca el periodo comprendido del mes de 18 noviembre de 2022 al 09 de marzo de 2023.

En capítulo 1: presenta una descripción del proyecto, localización especificada las obras a ejecutar constructivas, ambientales y de SST.

En el capítulo 2, se informa la ejecución en el tema de Seguridad y Salud en el trabajo ejecutado por el contratista en el periodo evaluado.

El capítulo 3, detalla la gestión SST desarrollada por la Interventoría, donde se destacan los aspectos más relevantes durante el periodo evaluado.

En el capítulo 4: se presenta las conclusiones y recomendaciones en el del periodo evaluado y de la actividad ambiental y SST.

El capítulo 5: presentan los soportes y formatos que registran la actividad Ambiental y de SST.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO.


DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

En cumplimiento de las funciones conferidas a través del contrato de interventoría No 414 de 2022, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" INTERCONDI S.A.S**, somete a consideración del Instituto Municipal De Deporte Y Recreación Villavicencio – IMDER el informe ejecutivo para parcial N.1 de interventoría, que contiene el consolidado de actividades ejecutadas en el periodo del 18 noviembre de 2022 al 09 de marzo de 2023.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar en el presente proyecto se encuentran localizadas en las siguientes zonas comunales:

N°	DESCRIPCION
1	Polideportivo séptima de la esperanza comuna 7
2	Polideportivos gaviotas comuna 5
3	Polideportivo santa martha comuna 7
4	Placa deportiva las palmas comuna 7
5	Placa deportiva santa helena comuna 4
6	Placa deportiva vizcaya 6 comuna 6
7	Placa deportiva el paraíso comuna 4
8	Placa deportiva la alborada comuna 7
9	Placa deportiva villa bolívar comuna 7
10	Placa deportiva playa rica comuna 8

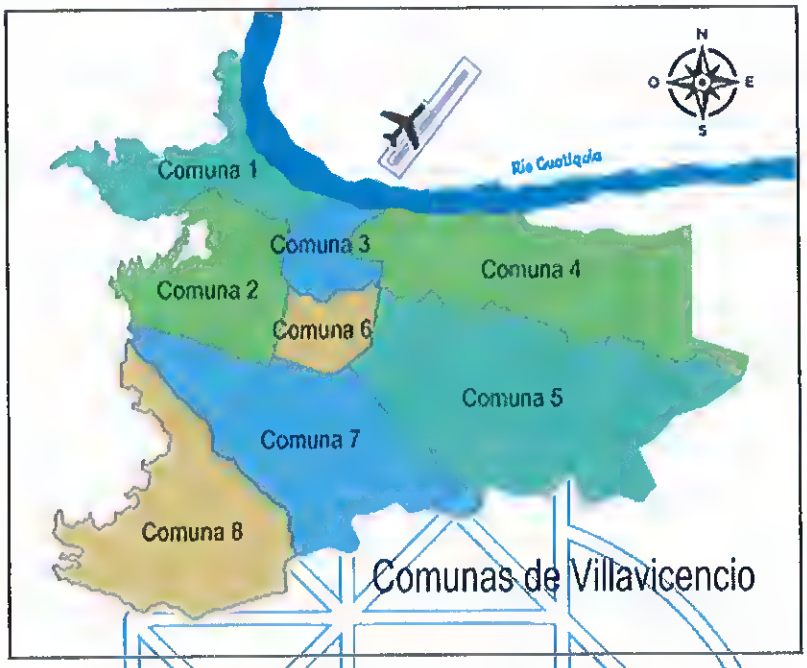

Fuente: google Wikipedia

Figura 1. Localización general del proyecto

2.1. RESUMEN DE OBRAS EJECUTADAS

Las actividades constructivas desarrolladas por el contratista en el periodo evaluado se enuncian a continuación, se encuentra relacionadas en los informe mensuales de interventoría números 1,2 y 3 donde se pueden observar las actividades ejecutas mes a mes en los periodos reportados.

Las actividades constructivas desarrolladas por el contratista en el periodo evaluado se enuncian a continuación:

GRUPO DE TRABAJO	ACTIVIDADES
Gestión administrativa	◦ Elaboración de planes, programas y sistema para la ejecución del proyecto ◦ Elaboración de informes mensuales
Socialización de obra	◦ Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo y se resolvieron las dudas e inquietudes. Se contó con la presencia del personal de obra, personal de interventoría, personal del IMDER y comunidad
Visita de obra	◦ Verificación de actividades para ejecución del contrato
Placa de concreto	◦ Se procedió a fundir la placa en concreto e=12 cm de 3000 PSI reforzada con malla electro-soldada
Demarcación de canchas	◦ Se realizó la demarcación de la cancha polifuncional sobre la placa deportiva existente

sello de juntas en poliuretano	• Se realiza el lavado de las juntas de la placa deportiva y se procede a instalar el sello de las juntas en poliuretano
pinturas	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
limpieza	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Desmontes	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Anclajes	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Sello de juntas	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Cerramientos para escenarios	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Demolición	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Reparaciones	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Mantenimientos	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Instalación de malla eslabón	• Se realiza actividades en los diferentes escenarios deportivos
Césped artificial	• Se realiza actividades en escenarios deportivos

2.2. RESUMEN ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST.

En el desarrollo de las actividades ejecutadas en el área SST, de maquinaria y equipos y vehículos, se encuentran en los informes mensuales de interventoría número 1,2 y 3

Las actividades constructivas desarrolladas por el contratista en el periodo evaluado se enuncian a continuación:

GRUPOS DE TRABAJO	ACTIVIDADES
GRUPO DE TRABAJO	• Se hizo entrega del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo • Elaboración del informe mensual
Gestión administrativa	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas y condiciones de transporte • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar

Socialización de obra	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas de trabajo . • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Visita de obra	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Placa de concreto	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas y condiciones de transporte • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Demarcación de canchas	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas de trabajo . • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
sello de juntas en poliuretano	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
pinturas	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas y condiciones de transporte • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
limpieza	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas de trabajo . • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar.

	• Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Desmontes	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Anclajes	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas y condiciones de transporte • Se realizo la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Sello de juntas	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas de trabajo • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Cerramientos para escenarios	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Demolición	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas y condiciones de transporte • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Reparaciones	• Los trabajadores se les realizo su respectivas capacitaciones, uso adecuado de sus elementos de protección personal, adecuaciones de las condiciones locativas de trabajo . • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Mantenimientos	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar.

	• Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Retiro de césped	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Imprimación Asfáltica	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar
Césped artificial	• Se realiza las respectiva señalización de las áreas de trabajo de alto riesgo y locativas de trabajo. • Se realizó la respectiva inducción a los posibles riesgos en cada actividad a realizar. • Entrega de elementos de protección personal para cada actividad a realizar

3. MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRA.

A continuación, se presenta un análisis del informe Ambiental, SST y de maquinaria, equipos y vehículos y las medidas implementadas por el contratista en el periodo objeto de evaluación:

3.1. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD TRABAJO.

- Para el desarrollo de las actividades Ambientales, SST del Contratista contó en el periodo evaluado con la participación del siguiente personal:

CARGO	CANTIDAD
Prof. SST	1
TOTAL	1

Tabla 1. Personal Sistema de Gestión SST

El contratista da cumplimiento a la contratación del personal calificado para el cargo de profesional en salud ocupacional, requerido por parte de supervisión e interventoría.

3.2 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

3.2.1 MANEJO DE CAMPAMENTOS , OFICINA Y CENTROS DE ACOPIO.

- Para el periodo evaluado el contratista conto con un campamento fijo ubicado en la CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo en la ciudad de Villavicencio, en el cual dispone de 2 unidades sanitarias. las instalaciones cuenta con; cocina, oficinas y bodega para el acopio de los materiales constructivo, vestier de los trabajadores y ejecución de protocolos de bioseguridad contra prevención de contagio covid- 19.
- Se ubicaron en el campamento fijo, adecuación de vestier para el cambio de ropa de los trabajadores dotadas de agua para hidratación del personal, kit de emergencia y publicación de la cartelera SST.

Los campamentos – oficina los vestier se encuentra ubicado en la siguiente dirección:

CAMPAMENTO	UBICACIÓN
Fijo	CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
Adecuación de vestier	CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio

Tabla 2. Campamentos.

3.2.2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Para los períodos reportados des de noviembre del 2022 hasta el 9 de marzo del presente año, se desarrollaron actividades constructivas, las cuales se requirieron el uso de los materiales en el cual esta interventoría lleva un registro y se encuentran plasmados en los informes mensuales de interventoría

3.3.3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

El Contratista en el periodo evaluado no se ha generado el retiro del material producto de las excavaciones u obras afines realizadas en la ejecución del contrato. En el cumplimiento de la actividad de retiro de material para los sitios de disposición final aprobados por la Interventoría. en el cual esta interventoría lleva un registro y se encuentran plasmados en los informes mensuales de interventoría

En el frente de obra los trabajadores implementaran actividades de orden, aseo y limpieza y dispusieron los residuos sólidos ordinarios en bolsas plásticas los cuales realizaran la disposición final a empresa encargada en la recolección.

3.3.4. VEHÍCULOS CONTRATISTA

Para el transporte del material de proveniente de la obra, el contratista informara el uso de los vehículos como tipo volquetas y entregara a esta interventoría la documentación pertinente para el tránsito en obra y las vías aledañas a la ejecución del contrato. en el cual esta interventoría lleva un registro y se encuentran plasmados en los informes mensuales de interventoría

A continuación, se relaciona en la siguiente tabla, los siguientes vehículos de trasporte:

TIPO	PLACA
No se utilizó en el periodo	

Tabla 3. Vehículos usados en el periodo.

3.3. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.4.1. EMPLEOS CONTRATISTA

Esta interventoría tiene como objetivo velar por la calidad del desarrollo del proyecto: "**MANTENIMIENTO DE MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIO RECREO-DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**" y se compromete con el cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente, con el objetivo de destinar procedimientos de prevención, promoción y atención en diferentes entidades.

Se realiza la verificación de pagos a los aportes de las afiliaciones a los aportes al Sistema General de aportes parafiscales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la obra.

El pago de las planillas de seguridad social y relación de personal en el periodo evaluado se encuentran en el **anexo del informe presentado por el contratista**.

3.4.2. ACCIDENTES LABORALES

Durante el periodo reportado de noviembre de 2022 a 9 marzo de 2023, no se presentó ningún accidente laboral y no se informaron enfermedades laborales.

En el **Anexo No. 2** se adjuntará las estadísticas de accidentalidad mensual.

3.4.3. MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Se llevará registro de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en el periodo evaluado se describirá de la siguiente manera. En el cual esta interventoría lleva un registro y se encuentran plasmados en los informes mensuales de interventoría

En este periodo se utilizó la siguiente maquinaria y equipos en el periodo:

TIPO	CANTIDAD
Demoledor sds 21j dewalt	1
Hidro lavadora eléctrica de de 1800 psi	1
Hidro lavadora diésel de 2400 psi	1
Vehiculos tipo NKR de carga de estacas marca Chevrolet	1
Ranas compactadora	1
Vibrocompactador	1

Tabla 4. Maquinaria en el periodo evaluado.

Para ayudas de las labores constructivas, el contratista realizara el uso de herramientas, en el cual se genera inspecciones, registro y control.

TIPO
Escobas
Palas
Cepillos – escobones

Tabla 5. Equipos usados en el periodo evaluado.

Las respectivas inspecciones de maquinaria, equipos y vehículos se detallan en los **Anexos correspondientes en los informes mensuales.**

3.4.4. ACTIVIDADES SST

Las actividades mínimas de cumplimiento en el área SST por parte del contratista para los periodos evaluado, actividades de ejecución cuales:

- Cumplir con las Afiliaciones y pagos a EPS, ARL y AFP de todos sus trabajadores administrativos y operativos a su cargo.
- Cumplimiento y evidencia de la capacitación a los trabajadores ingresados en el periodo en los temas de inducción en el áreas SST, percepción y prevención del riesgo – identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo, inspección de seguridad, liderazgo, compromiso y responsabilidades, prevención de riesgo psicosocial, conservación auditiva .
- Elaboración de inducciones y notificaciones de riesgo a los trabajadores que ingresaron en el periodo evaluado.
- Implementación de exámenes ocupaciones a los trabajadores que ingresaron en el periodo evaluado.
- Realizar las inspecciones planeadas y no planeadas para los frentes de obra las actividades SST necesarias para el desarrollo de las labores constructivas.
- Informar y soportar indicadores de accidentalidad para el periodo reportado, el accidente laboral y enfermades laborales
- Realizar capacitaciones al personal según el cronograma de capacitación según en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Garantizar el suministro agua para la hidratación del personal en los frentes de obra.
- Garantizar asistencia a los Comités Intégrale-s y al Comité ambiental, SST y de maquinaria, equipos y vehículos desarrollados en el periodo evaluado.
- Presentar los soportes de las inspecciones realizadas en el periodo evaluado las por ejemplo: inspección de botiquín, extintor, maquinaria, equipos, inspección de arnés, inspección de excavaciones, herramienta menor y reposición de EPPS.
- Implementación de permisos de trabajo para actividades de alto riesgo
- Conformación de comités SST y entrenamiento de brigadas de emergencia.

- Cumplir con la ejecución de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

3.5. INDICADORES

- Para el periodo evaluado se tomará las variables en ejecución para valorar el cumplimiento implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- los indicadores SST estipulado para verificación cumplimiento del contratista **COINAR LTDA** son los siguientes:

3.5.1. INDICADORES AMBIENTALES

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores de Gestión en el área ambiental				
Personal HSEQ	N° de Asesores SST	* 100%	1	100%
	N° de Asesores SST requerido contractualmente		1	
Comités SGA-SST y Maquinaria, equipos y vehículos	Nº de comités SGA-SST y Maquinaria, equipos y vehículos realizados.	* 100%	1	100%
	Nº de comités SGA-SST y Maquinaria, equipos y vehículos programados.		1	
Eficiencia en la Gestión de hallazgos	N° Solicitudes Atendidas	*100	1	100%
	N° Solicitudes realizadas por Interventoría		1	
Suministro de Materiales	m3 de material MDC-2 empleado en el periodo.	N/A		N/A
	m3 de material MDC-2 certificado en el periodo.			
	m3 de material sub base empleado en el periodo			
Retiro y disposición Final de escombros(RCD)	m3 de escombros generados en el periodo.	N/A		N/A
	m3 de escombros certificados en el periodo			

Tabla 6. Indicadores Ambientales.

3.5.2 INDICADORES SST

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores de cobertura				
Cubrimiento capacitaciones	N° trabajadores que asistieron a las capacitaciones	*100%	49	100%
	Total de trabajadores programados		49	

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Indicadores de cumplimiento				
Cumplimiento de Actividades	N° Actividades ejecutadas en el período	*100%	50	100%
	N° Actividades programadas		50	
Inspecciones Planeadas	N° inspecciones realizadas en el período	*100%	12	100%
	N° inspecciones programadas		12	
Ejecución	N° capacitaciones realizadas en el período	*100%	13	100%
	N° capacitaciones programadas		13	
Reuniones COPASST	N° de reuniones realizadas	*100%	1	100%
	N° de reuniones programadas		1	
Indicadores de cobertura				
Cumplimiento de inducciones	N° de inducciones realizada en el período	*100%	13	100%
	N° de trabajadores que ingresaron en el período		13	
Exámenes médicos ocupacionales de ingreso	N° de exámenes ocupacionales de ingreso	*100%	13	100%
	Total de trabajadores nuevos		13	
Exámenes médicos ocupacionales periódicos	N° de exámenes ocupacionales periódicos realizados	*100%		100%
	Total de trabajadores programados			
Exámenes médicos ocupacionales de Egreso	N° de exámenes ocupacionales de retiro realizados	*100%		100%
	Total de trabajadores programados			

Tabla 7. Indicadores SST

3.5.3. INDICADORES DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Inspecciones diarias maquinaria, equipos y vehículos	N° de inspecciones diligenciados y entregados en el período	*100%	15	1003%
	No. Total de inspecciones a entregar		15	
Documentación de vehículos (SOAT, Revisión tecnicomecánica)	N° de vehículos con documentación completa en el período	N/A		N/A
	No. Total de vehículos del proyecto.			

INDICADOR	VARIABLES	PORCENTAJES	VALORES	CUMPLIMIENTO
Documentación de maquinaria y equipos	N° de máquinas y equipos vehículos con documentación completa en el período	N/A		N/A
	No. Total de maquinaria y equipos vehículos del proyecto.			

Tabla 8. Indicadores de maquinaria, equipos y vehículos.

4. ACCIONES DE LA INTERVENTORIA AMBIENTAL, SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Para el desarrollo de las actividades de supervisión ambiental, SST, maquinaria, equipos y vehículos INTERCONDI SAS, cuenta con la participación del siguiente personal:

CARGO	CANTIDAD
Director interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Topógrafo	1
Residente SST	1
Cadenero	1
Inspector de interventoría	1

Tabla 9. Personal Interventoría intercondi sas

Los pagos de seguridad social del personal de Interventoría se encuentran en los **Anexo No. 1.** Se adjunta la relación según la participación de cada profesional en los meses requeridos en el desarrollo del contrato de esta interventoría y de obra.

4.1.1 PERSONAL SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Para el desarrollo de la gestión ambiental, SST y de maquinaria, equipos y vehículos el **INTERCONDI S.A.S** cuenta con la participación del siguiente personal:

CARGO	CANTIDAD
Residente SST	1

Tabla 10. Personal SST de Interventoría.

4.2 COMITES INTEGRALES Y COMITÉS AMBIENTALES, SST Y MAQUÍNARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Para el desarrollo del contrato de obra se desarrollarán reuniones entre Contratista; Interventoría e instituto municipal de deporte y recreación, donde se trataron temas inherentes al contrato de obra y se analizaran cada una de las áreas. En el anexo técnico se presentan los soportes de los comités integrales.

Se anexa copia de reunión de comités integrales con participación de contratista e interventoría en el anexo **NO.3**

4.3 VISITAS DE SEGUIMIENTO E INSPECCIONES:

La Interventoría genero visitas de verificación y seguimiento a las actividades constructivas, durante el recorrido realizado por los diferentes puntos donde se encuentre ejecución el contrato se notificaron los hallazgos encontrados según inspecciones realizadas en área SST. Donde se generaron las observaciones y requerimientos respectivos. El contratista subsana y atiende el hallazgo encontrado dándole solución en campo.

4.4. GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS.

Las actividades que se realizara por parte de la Interventoría, en el área ambiental, SST y de maquinaria, equipos y vehículos se describen a continuación:

- Verificación de los procedimientos SST implementados en los frentes de obra.
- Verificación de la documentación para el ingreso del personal del contratista (afiliaciones al SGSS).
- Verificación de los procedimientos de inducción, notificación de riesgos, políticas SST, procedimientos de seguridad, etc.; implementados por el contratista.
- Atención de los comunicados remitidos por el Contratista y el instituto municipal de deporte y recreación – IMDER.
- Revisión del informe mensual presentado por el Contratista.
- Durante el periodo evaluado no se presentaron accidentes de trabajo para la Interventoría; los indicadores de accidentalidad permanecieron en cero.
- Elaboración de informe de Interventoría mensual Ambiental y SST.

Se adjunta cronograma de actividades en el área SST en el **anexo 5**

A continuación, se presentan los siguientes cuadros el resumen las actividades SST, que desarrolló la Interventoría en el periodo evaluado.

ACTIVIDADES BÁSICAS

Actividades Básicas	Personal Convocado	Personal Asistente	Indicador de Cumplimiento %	Observaciones
Afiliaciones y Pagos seguridad social	6	6	100	
Inducciones, notificaciones de riesgos	6	6	100	

Actividades Básicas	Personal Convocado	Personal Asistente	Indicador de Cumplimiento %	Observaciones
Exámenes médicos			100	
Estadística mensual de ausentismo por AT y/o Enfermedad común	6	6	100	
Reunión COPASST	6	6	100	
Reunión de convivencia laboral	1	1	100	

Tabla 11. Actividades básicas SST

Los soportes de la gestión se presentan en los Anexos No, 2, 3,

INDICADORES DE GESTION SST INTERCONDI S.AS.

COMPONENTE	INDICADOR
Seguridad y Salud en el Trabajo	Índice de Frecuencia = (Nº de accidentes trabajo reportados en el periodo (0) / horas hombre trabajadas en el periodo (2082,48) x 200.000 = 0 Índice de Severidad = (Nº de días de incapacidad o cargados por AL en el periodo (0) / horas hombre trabajadas en el periodo (2082,48) x 200000 = 0 Índice de lesiones incapacitantes = (índice de frecuencia (0) X Índice de Severidad (0) / 1000 = 0 Tasa de ausentismo general = ((Nº de horas perdidas por EC (0) + AT (0) + EP (0) + Permisos (0)) / (horas hombre trabajadas en el periodo (2082,48) X 100 = 0,0%

Tabla 12. Indicadores de la gestión SST

El registro del cálculo de los indicadores de accidentalidad se detalla en el Anexo No. 2.

4.5. LISTA DE CHEQUEO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL, SST, EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Durante el desarrollo de las actividades Constructivas, el contratista debe cumplir con la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud ene le trabajo, durante la elaboración de las diferentes actividades del contrato de obra. Según el recorrido realizado por los diferentes puntos donde se encuentren realizando actividades, se generara observaciones dada por esta interventoría con los requerimientos y solicitudes en el área ambiental, SST y de equipos. Donde se deben subsanar o corregir en el menos tiempo posible para cumplir con los objetivos requeridos en el SGSST.

4.6. CUMPLIMIENTOS DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRA LA PREVENCIÓN DEL COVID – 19.

Esta interventoría realizara la ejecución del protocolo de bioseguridad contra prevención de covid-19 de la siguiente manera:

- se capacita a los trabajadores para toma de conciencia en la problemática presentada.
- Se dispuso un lavamanos con agua limpia y elementos como jabón líquido, alcohol con concentración al 70% y toallas desechables.
- Se realiza desinfección de puesto y herramienta de trabajo antes durante y después de cada labor.
- Se vigila que el lugar de trabajo cuente con la ventilación adecuada y circulación de aire.

Se adjunta el formato de seguimiento al protocolo de bioseguridad se detalla en el **Anexo No. 6.**

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

- La Interventoría realizó la supervisión al contratista para el cumplimiento de la normatividad ambiental, SST y de equipos.
- La Interventoría realizó las actividades programadas en el SGSST en el periodo evaluado.
- Se realiza un acompañamiento permanente en el área ambiental, SST y equipos para la conciliación y mejoras de las actividades de obra a implementar, no obstante, pese a los requerimientos se encuentran incumplimientos.
- Durante la ejecución de las actividades en el periodo reportado no se presentó ningún accidente laboral, y no se presentó ningún reporte de enfermedades laborales.
- La interventoría no presento accidentes laborales ni reporte de enfermedades laborales en el mes evaluado.
- Realizar el cumplimiento y ejecución del sistema de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución del contrato de obra.

5.2 RECOMENDACIONES

- es importante entregar la documentación correspondiente a tiempo, para evitar retrasos oportunos en la ejecución de la elaboración de los informes pertinentes.
- Es de destacar las interrelaciones de las partes interesadas para el desarrollo del Contrato con el fin de identificar oportunamente situaciones o condiciones de riesgo que puedan afectar el normal desarrollo de la obra.

6. ANEXOS

GESTION SST	
Anexo 1	Relación del personal de interventoría
Anexo 2	Indicadores de accidentalidad
Anexo 3	Formato de comité de obra SST interventoría obra
Anexo 4	Lista de chequeo – vista de obra
Anexo 5	Cronograma de actividades SST
Anexo 6	Formato de cumplimiento Covid-19
Anexo 7	Registro fotográfico

ANEXO 1 RELACIÓN DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

CONTROL DE PERSONAL

CONTRATO No:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 414 de 2022	CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER DE VILLAVICENCIO META
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	INTERVENTOR:	INTERCONDI S.A.S
		PERIODO:	NOVIEMBRE 2022 A 9 MARZO 2023

No	NOMBRE	CARGO	C.C.	CUMPLE PERFIL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
		PERSONAL INGRESADO				
		PERSONAL ANTIGUO				
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SI		
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SI		
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS	Inspector	1.01.8410.252	SI		
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SI		
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	topografo	86.076.792	SI		
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	cadenero	1.121.902.636	SI		
		PERSONAL TRASLADO				
		PERSONAL RETIRO				

NOTA:	Este personal la mayoria está bajo la modalidad de contratación por prestación de servicio, por tal razón presenta su aporte a seguridad social como independiente y con el nuevo decreto 1273 del 2018 del misterio de salud y protección social "El pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) "

INTERVENTORIA

ANEXO 2 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 414 de 2022	Hoja 1 de 1 Fecha		
		9	MARZO	2023
		DD	MM	AA

OBJETO DE INTERVENTORIA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO."

INFORME MENSUAL DE ACCIDENTES LABORALES

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES	DIAS PERDIDOS O CARGADOS	I.F.	I.S.	I.L.I.	I.D.P.	TASA
17 de noviembre al 18 de diciembre del 2022	6	1200	0	0	0	0	0	0	0
18 al 28 de diciembre del 2022	6	432	0	0	0	0	0	0	0
1 al 28 de febrero del 2023	6	450,48	0	0	0	0	0	0	0
1 AL 09 de marzo 2023	6	9	0	0	0	0	0	0	0

ANEXO 3 FORMATO DE COMITÉ DE OBRA SST INTERVENTORÍA OBRA

INTERCONDI S.A.S.

COMITÉ ACTA DE REUNION AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATO No. 414 DE 2022	FECHA: 17 /12/2022	HOJA ___ DE ___

TIPO DE CONTRATO:	Interventoria
OBJETO PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT INTERVENTORIA:	901.199.491-6
CONTRATISTA :	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA – COINAR
OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:	901.199.491-6

Siendo las _____8.00 am ___ de el día ___17___ de __12_____de __2022_____; se reunieron las siguientes personas , para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia

AGENDA

1. Indicadores de accidentalidad
2. Condiciones de seguridad en obra
3. Señalización en obra
4. Certificación de residuo final de material de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de área SST por parte de la interventoría y del contratista para tratar los temas correspondientes anteriormente enunciado:

1. Durante el periodo reportado del 17 noviembre al 18 diciembre del presente año, se presento (0) accidente de tipo laborar y no enfermedad profesional por tal razón los indicadores de accidentalidad es 0% según indicadores. se anexa indicadores de accidentalidad
2. Se verifica documentación correspondiente a las inspecciones, permisos de trabajo, condiciones de puestos de trabajo.
3. Durante los recorridos realizados por los diferentes puntos donde se encuentra ejecución el contrato, se evidencia la señalización de la obra, utilización de elementos de protección personal de los trabajadores vinculados directamente. Durante el recorrido realizado se emite observaciones por parte la interventoría donde el contratista realiza las acciones de mejora durante la jornada del mismo día.
4. Se realiza seguimiento constante por parte de esta interventoría. En la cual se justifica en los anexos correspondiente al informe mensual.

COMPROMISOS

INTERVENTORIA	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
C.C. O NIT	C.C. O NIT

INTERCONDI S.A.S.

COMITÉ ACTA DE REUNION AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATO No. 414 DE 2022	FECHA: 28 /12/2022	HOJA ___ DE ___

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT INTERVENTORIA:	901.199.491-6
CONTRATISTA :	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA – COINAR
OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:	901.199.491-6

Siendo las _____8.00 am ___ de el día ___28___ de __12_____de __2022_____; se reunieron las siguientes personas , para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia

AGENDA

1. Indicadores de accidentalidad
2. Condiciones de seguridad en obra
3. Señalización en obra
4. Certificación de residuo final de material de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de área SST por parte de la interventoría y del contratista para tratar los temas correspondientes anteriormente enunciado:

1. Durante el periodo reportado del 18 al 28 de diciembre del presente año, se presento (0) accidente de tipo laborar y no enfermedad profesional por tal razón los indicadores de accidentalidad es 0% según indicadores. se anexa indicadores de accidentalidad
2. Se verifica documentación correspondiente a las inspecciones, permisos de trabajo, condiciones de puestos de trabajo.
3. Durante los recorridos realizados por los diferentes puntos donde se encuentra ejecución el contrato, se evidencia la señalización de la obra, utilización de elementos de protección personal de los trabajadores vinculados directamente. Durante el recorrido realizado se emite observaciones por parte la interventoría donde el contratista realiza las acciones de mejora durante la jornada del mismo día.
4. Se realiza seguimiento constante por parte de esta interventoría. En la cual se justifica en los anexos correspondiente al informe mensual.

COMPROMISOS

INTERVENTORÍA		CONTRATISTA	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:		NOMBRE:	
C.C. O NIT		C.C. O NIT	

INTERCONDI S.A.S.

COMITÉ ACTA DE REUNION AMBIENTAL, SST Y DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

CONTRATO No. 414 DE 2022	FECHA: 28 /02/2023	HOJA ___ DE ___

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
OBJETO PROYECTO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT INTERVENTORIA:	901.199.491-6
CONTRATISTA :	CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA – COINAR
OBJETO PROYECTO:	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT:	901.199.491-6

Siendo las ____8.00 am ___ de el día ___28___ de __02_____de __2023_____; se reunieron las siguientes personas , para tratar los temas relacionados con el contrato de la referencia

AGENDA

1. Indicadores de accidentalidad
2. Condiciones de seguridad en obra
3. Señalización en obra
4. Certificación de residuo final de material de obra

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a la reunión de área SST por parte de la interventoría y del contratista para tratar los temas correspondientes anteriormente enunciado:

1. Durante el periodo reportado del 1 al 28 de febrero del presente año, se presento (0) accidente de tipo laborar y no enfermedad profesional por tal razón los indicadores de accidentalidad es 0% según indicadores. se anexa indicadores de accidentalidad
2. Se verifica documentación correspondiente a las inspecciones, permisos de trabajo, condiciones de puestos de trabajo.
3. Durante los recorridos realizados por los diferentes puntos donde se encuentra ejecución el contrato, se evidencia la señalización de la obra, utilización de elementos de protección personal de los trabajadores vinculados directamente. Durante el recorrido realizado se emite observaciones por parte la interventoría donde el contratista realiza las acciones de mejora durante la jornada del mismo día.
4. Se realiza seguimiento constante por parte de esta interventoría. En la cual se justifica en los anexos correspondiente al informe mensual.

COMPROMISOS

INTERVENTORIA	CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
C.C. O NIT	C.C. O NIT

ANEXO 4 LISTA DE CHEQUEO – VISTA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*17 de noviembre al 18 de diciembre del 2022*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PERSONAL Y EQUIPOS	El asesor SST cumple con la dedicación establecida en el pliego de condiciones.	X			
	El Contratista entrega a la Interventoría las correcciones resultantes de las observaciones a los informes emitidas por la interventoría y/o IMDER tres días hábiles después de que le sean radicadas.	X			
Manejo de Vegetación y Paisaje.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN ZONAS VERDES E INDIVIDUOS ARBOREOS.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales presentes en los frentes de obra a intervenir.			X	
	Las zonas verdes del área de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			
	El Contratista cumple con el procedimiento de tala y traslado incluido en el Plan de manejo ambiental y aprobado por la autoridad ambiental competente.			X	
Señalización					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA	Se implementa la demarcación de zanjas, pozos y excavaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental y SGSST	X			
	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso de los peatones o la circulación requerida.	X			

INTERVENTORÍA:
Elaboró

Nombre

Firma

CONTRATISTA

Nombre

Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*17 de noviembre al 18 de diciembre del 2022*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Actividades Constructivas.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondientes	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			
	Se encuentran los recursos en el campamento para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.			X	
	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			
	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental			X	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	El Contratista cuenta con los recursos para la disposición de residuos en los frentes de obra de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Durante su permanencia en obra, los escombros son protegidos y demarcados, de acuerdo con lo aprobado en el Plan de manejo ambiental			X	
	El Contratista limpia las vías de acceso a los frentes de trabajo para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			
	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platón.			X	
	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos señalado en el Plan de manejo ambiental	X			
	El Contratista cuenta con un sistema de limpieza de llantas de tal forma que se evite el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	
	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tiene debidamente adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido.			X	

INTERVENTORIA:
Elaboró

Nombre

Firma

CONTRATISTA

Nombre

Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022	
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*
PERIODO EVALUADO	*17 de noviembre al 16 de diciembre del 2022*

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Seguridad y Salud en el Trabajo					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	Cumple	No cumple	N/A	OBSERVACIONES
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE SST	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso y se encuentran al día en los pagos.	X			
	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política de salud ocupacional se encuentran publicados en un lugar visible de las instalaciones temporales y puntos de Atención al Ciudadano, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			
	El COPASST o VIGÍA se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión a la interventoría en el informe.	X			
	Se da cumplimiento y cobertura al Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento, incluido en el SGSST	X			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	El contratista mantiene actualizado el Matriz de Riesgos, por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al Diagnóstico inicial (PFR) cumpliendo los planes de acción derivados.	X			
	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			
	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y se realiza por médico especialista en SST. Se le notifica a todo el personal que se retira de la empresa, sobre su derecho al examen médico de egreso.	X			
	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal de acuerdo con la matriz de EPP. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El recambio es oportuno y se lleva un registro formal de entrega	X			
	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal -EPP-.	X			
	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes / incidentes laborales incluido en el SGSST	X			
	Se cumple el programa de inspecciones incluido en el SGSST y se da	X			
	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X			
	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			
	Las sustancias químicas estén inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, cuentan con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas,	X			
PLAN DE EMERGENCIAS	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST	X			
	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			
	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST	X			
	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo así como de terceros.	X			
	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes (Resolución 1401 de 2007). Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.	X			
	Se cumple el cronograma de actividades del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
	Antes del ingreso de maquinaria , vehículos y equipos a la obra el Contratista presenta a la Interventoría la documentación requerida contractualmente dependiendo de la maquina es propia, arrendada o en leasing.			X	
	El contratista realiza diariamente el pre operacional a la maquinaria, equipos y vehículos y reporta las observaciones encontradas			X	
	Se realiza la verificación permanente de normativas para SOAT, equipo de carretera y de seguridad y emergencia de los vehículos de la obra	X			
	Los vehículos cumplen con las normas de seguridad y ambientales legales vigentes.	X			
	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo			X	
	El contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollas las actividades			X	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*18 al 28 de diciembre del 2022*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PERSONAL Y EQUIPOS	El asesor SST cumple con la dedicación establecida en el pliego de condiciones.	X			
	El Contratista entrega a la Interventoría las correcciones resultantes de las observaciones a los informes emitidas por la interventoría y/o IMDER tres días hábiles después de que le sean radicadas.	X			
Manejo de Vegetación y Paisaje					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN ZONAS VERDES E INDIVIDUOS ARBOREOS.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales presentes en los frentes de obra a intervenir.			X	
	Las zonas verdes del área de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			
	El Contratista cumple con el procedimiento de tala y traslado incluido en el Plan de manejo ambiental y aprobado por la autoridad ambiental competente.			X	
Señalización					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA	Se implementa la demarcación de zanjas, pozos y excavaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental y SGSST	X			
	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso de los peatones o la circulación requerida.	X			

INTERVENTORIA:
Elaboró

Nombre

Firma

CONTRATISTA

Nombre

Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*18 al 28 de diciembre del 2022*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Actividades Constructivas.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondientes	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			
	Se encuentran los recursos en el campamento para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.			X	
	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			
	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental			X	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	El Contratista cuenta con los recursos para la disposición de residuos en los frentes de obra de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Durante su permanencia en obra, los escombros son protegidos y demarcados, de acuerdo con lo aprobado en el Plan de manejo ambiental			X	
	El Contratista limpia las vías de acceso a los frentes de trabajo para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			
	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platón.			X	
	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos señalado en el Plan de manejo ambiental	X			
	El Contratista cuenta con un sistema de limpieza de llantas de tal forma que se evite el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	
	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tiene debidamente adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido.			X	

INTERVENTORIA:
Elaboró

Nombre

Firma

CONTRATISTA

Nombre

Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*16 al 28 de diciembre del 2022*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Seguridad y Salud en el Trabajo

REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	Cumple	No cumple	NA	OBSERVACIONES
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE SST	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso y se encuentran al día en los pagos.	X			
	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política de salud ocupacional se encuentran publicados en un lugar visible de las instalaciones temporales y puntos de Atención al Ciudadano, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			
	El COPASST o VIGÍA se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión a la interventoria en el informe	X			
	Se da cumplimiento y cobertura al Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento, incluido en el SGSST	X			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	El contratista mantiene actualizado el Matriz de Riesgos, por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al Diagnóstico Inicial (PFR) cumpliendo los planes de acción derivados.	X			
	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			
	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y se realiza por médico especialista en SST. Se le notifica a todo el personal que se retira de la empresa, sobre su derecho al examen médico de egreso.	X			
	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal de acuerdo con la matriz de EPP. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El recambio es oportuno y se lleva un registro formal de entrega	X			
	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal -EPP .	X			
	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes / incidentes laborales incluido en el SGSST	X			
	Se cumple el programa de inspecciones incluido en el SGSST y se da	X			
	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido	X			
	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			
	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, cuentan con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			
PLAN DE EMERGENCIAS	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST	X			
	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			
	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos	X			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento o impacto, de acuerdo con el SGSST	X			
	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo así como de terceros.	X			
	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes (Resolución 1401 de 2007). Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.	X			
	Se cumple el cronograma de actividades del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
	Antes del ingreso de maquinaria , vehículos y equipos a la obra el Contratista presenta a la Interventoría la documentación requerida contractualmente dependiendo de la maquina es propia, arrendada o en leasing.			X	
	El contratista realiza diariamente el pre operacional a la maquinaria, equipos y vehículos y reporta las observaciones encontradas			X	
	Se realiza la verificación permanente de normativas para SOAT, equipo de carretera y de seguridad y emergencia de los vehículos de la obra	X			
	Los vehículos cumplen con las normas de seguridad y ambientales legales vigentes.	X			
	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo			X	
	El contratista implementa mecanismos de control que permiten establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollar las actividades			X	

INTERVENTORIA
Firma
Nombre

CONTRATISTA
Nombre
Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*1 al 28 de febrero del 2023*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PERSONAL Y EQUIPOS	El asesor SST cumple con la dedicación establecida en el pliego de condiciones.	X			
	El Contratista entrega a la Interventoría las correcciones resultantes de las observaciones a los informes emitidas por la interventoría y/o IMDER tres días hábiles después de que le sean radicadas.	X			

Manejo de Vegetación y Paisaje					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
PROTECCIÓN ZONAS VERDES E INDIVIDUOS ARBOREOS.	El Contratista cumple con la protección de los individuos vegetales presentes en los frentes de obra a intervenir.			X	
	Las zonas verdes del área de influencia de la obra se encuentran protegidas y en buenas condiciones.	X			
	El Contratista cumple con el procedimiento de tala y traslado incluido en el Plan de manejo ambiental y aprobado por la autoridad ambiental competente.			X	

Señalización					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
SEÑALIZACIÓN IMPLEMENTADA	Se implementa la demarcación de zanjas, pozos y excavaciones de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental y SGSST	X			
	Se cumple con la señalización del plan de emergencia de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Las áreas destinadas para la movilidad, se encuentran libres de obstáculos de tal manera que no se impida o dificulte el paso de los peatones o la circulación requerida.	X			

INTERVENTORÍA: Elaboró — Nombre — Firma

CONTRATISTA — Nombre — Firma

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 414 de 2022		INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S
OBJETO	*"INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*	
CONTRATO DE OBRA	*MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .*	
PERIODO EVALUADO	*1 al 28 de febrero del 2023*	

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Actividades Constructivas.					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	OBSERVACIONES
MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondientes	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El campamento de la obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado.	X			
	Se encuentran los recursos en el campamento para la recolección de residuos sólidos generados en el mismo, de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	La mezcla de concreto se hace en una batea metálica y/o sobre plástico y no se contamina el suelo.			X	
	Las zonas verdes se encuentran libres de almacenamiento de materiales de construcción, escombros o de residuos generados por los tratamientos a la vegetación.	X			
	Los materiales de construcción ubicados en el frente de obra, se encuentran protegidos y demarcados de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental			X	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	El Contratista cuenta con los recursos para la disposición de residuos en los frentes de obra de acuerdo con lo establecido en el Plan de manejo ambiental	X			
	Durante su permanencia en obra, los escombros son protegidos y demarcados, de acuerdo con lo aprobado en el Plan de manejo ambiental			X	
	El Contratista limpia las vías de acceso a los frentes de trabajo para que estas permanezcan libres de escombros y/o de cualquier tipo de residuo generado por la obra.	X			
	Las volquetas destinadas al transporte de escombros cumplen con la Resolución 541 de 1994 (Estado del platón y cubrimiento de la carga) y no excede la capacidad de la volqueta en volumen o peso ni el borde superior mas bajo del platón.			X	
	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y se cumple con el programa integral de residuos señalado en el Plan de manejo ambiental	X			
	El Contratista cuenta con un sistema de limpieza de llantas de tal forma que se evite el arrastre de material adherido a las mismas desde la zona del proyecto hacia las vías aledañas.			X	
	Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines, se tiene debidamente adecuados sistemas para evitar emisiones y ruido.			X	

INTERVENTORIA: Elaboró — Nombre: Jeiker Lun — Firma

CONTRATISTA — Nombre — Firma

CONTRATO DE OBRA	MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREODEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO .
PERIODO EVALUADO	1 al 28 de febrero del 2023

LISTAS DE CHEQUEO DE LABORES AMBIENTALES, SST Y DE MAQUINARÍA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

Seguridad y Salud en el Trabajo					
REQUERIMIENTO	PARÁMETRO A EVALUAR	Cumple	No cumple	N/A	OBSERVACIONES
ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE SST	Todo el personal que labora en la obra (administrativo y operativo) se encuentra afiliado a una ARP, EPS Y AFP desde antes de su ingreso y se encuentran al día en los pagos.	X			
	El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y la Política de salud ocupacional se encuentran publicados en un lugar visible de las instalaciones temporales y puntos de Atención al Ciudadano, están socializados y se cuenta con los soportes respectivos.	X			
	El COPASST o VIGÍA se reúne en forma mensual, cuenta con el cronograma de reuniones, Plan de Trabajo General de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión a la interventoría en el informe.	X			
	Se da cumplimiento y cobertura al Programa de Inducción, Capacitación y Entrenamiento, incluido en el SGSST	X			
ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS	El contratista mantiene actualizado el Matriz de Riesgos, por cada proceso constructivo e interviene mensualmente los riesgos priorizados de acuerdo al Diagnóstico Inicial (PFR) cumpliendo los planes de acción derivados.	X			
	Todos los trabajadores son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar, esta notificación se hace antes de iniciar las labores propias del cargo y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	X			
	El contratista implementa los permisos de trabajo para las labores de alto riesgo y cumple los estándares de seguridad definidos en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO	Se efectúa examen médico de ingreso y egreso por cargo, de acuerdo con el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y se realiza por médico especialista en SST. Se le notifica a todo el personal que se retira de la empresa, sobre su derecho al examen médico de egreso.	X			
	Se realizan las actividades de promoción y prevención establecidas en el SGSST	X			
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Todo el personal cuenta con los Elementos de Protección Personal de acuerdo con la matriz de EPP. Los EPP son los adecuados para la actividad y están normalizados. El recambio es oportuno y se lleva un registro formal de entrega	X			
	Las instalaciones provisionales cuentan con vestieres, donde los espacios cumplen con lo establecido en la Resolución 2400/79 para el manejo de ropas, implementos personales y Elementos de Protección Personal -EPP-.	X			
	Se implementa el procedimiento de reporte e investigación de los accidentes / incidentes laborales incluido en el SGSST	X			
	Se cumple el programa de inspecciones incluido en el SGSST y se da	X			
	Se posee un baño por cada 15 trabajadores y el baño recibe mantenimiento y limpieza periódica	X			CR 31 45 61 OF 301 Barrio el triunfo – Villavicencio
	El contratista tiene documentados los procedimientos y estándares de trabajo seguro por cada proceso constructivo los socializa, actualiza y se ejecutan según lo establecido.	X			
	Se cuenta con un sistema de hidratación para el personal que labora en cada uno de los frentes de obra	X			
	Las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con prácticas seguras de manipulación, almacenamiento y transporte, cuentan con las hojas de seguridad en español y se cumplen las medidas incluidas en ellas.	X			
PLAN DE EMERGENCIAS	Se cuenta con todos los recursos definidos en el plan de emergencias y contingencias incluido en el SGSST	X			
	Se han conformado las Brigadas de emergencia, están activas, entrenadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento según lo ofertado, se ejecuta y existen los soportes.	X			
	Se realizan simulacros de emergencias, se revisa su resultado, se establecen planes de acción y se cumplen las acciones derivadas y se cuenta con los soportes respectivos.	X			
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Se cuenta con indicadores de gestión: cobertura, cumplimiento e impacto, de acuerdo con el SGSST	X			
	Se tiene registro estadístico, caracterización e investigación de incidentes y accidentes de trabajo así como de terceros.	X			
	Se cumplen los planes de acción derivados de las investigaciones de accidentes e incidentes (Resolución 1401 de 2007). Se mide su efectividad y se realizan los ajustes necesario.	X			
	Se cumple el cronograma de actividades del Programa de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
	Antes del ingreso de maquinaria , vehículos y equipos a la obra el Contratista presenta a la Interventoría la documentación requerida contractualmente dependiendo de la maquina es propia, arrendada o en leasing.			X	
	El contratista realiza diariamente el pre operacional a la maquinaria, equipos y vehículos y reporta las observaciones encontradas			X	
	Se realiza la verificación permanente de normativas para SOAT, equipo de carretera y de seguridad y emergencia de los vehículos de la obra	X			
	Los vehículos cumplen con las normas de seguridad y ambientales legales vigentes.	X			
	Toda la maquinaria de la obra cuenta con su horómetro en perfecto funcionamiento y se lleva un control diario de horas trabajadas para realizar el mantenimiento preventivo			X	
	El contratista implementa mecanismos de control que permitan establecer la idoneidad de los operadores de la maquinaria para desarrollas las actividades			X	

INTERVENTORIA:
Elaboro

Nombre

Firma

CONTRATISTA

Nombre

Firma

ANEXO 5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

INTERCONDI OBRAS CIVILES S.A.S




CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SST

INTERCONDI S.A.S


1/01/2020

PLAN / PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	POBLACIÓN OBJETO	TIPO DE ACTIVIDAD	MES Y SEMANAS	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES A DESARROLLAR							
ADMINISTRATIVO/ ENTREGA DE PRODUCTOS	1.1	Manejo de documentos contractuales	ESPECIALISTA SST		PROGRAMADO		
					EJECUTADO	1 1 1



ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO

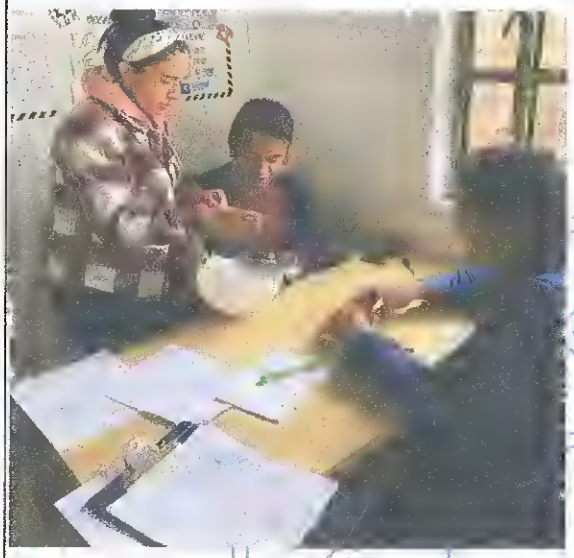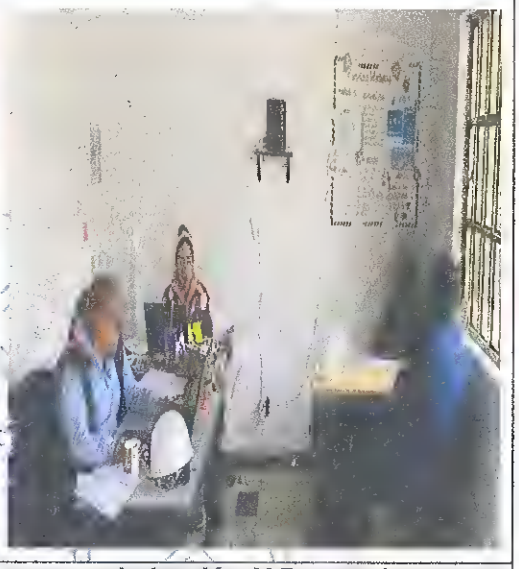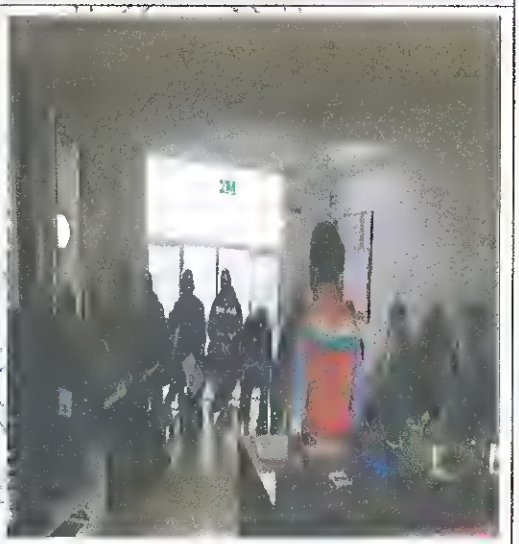REGISTRO ACTIVIDADES SST	
Entrega De Elementos De Protección Personal	**Comités Intégrale-S SST**
	
Capacitación Del Personal	**Inducción Al Personal**
	

REGISTRÓ ACTIVIDADES SST

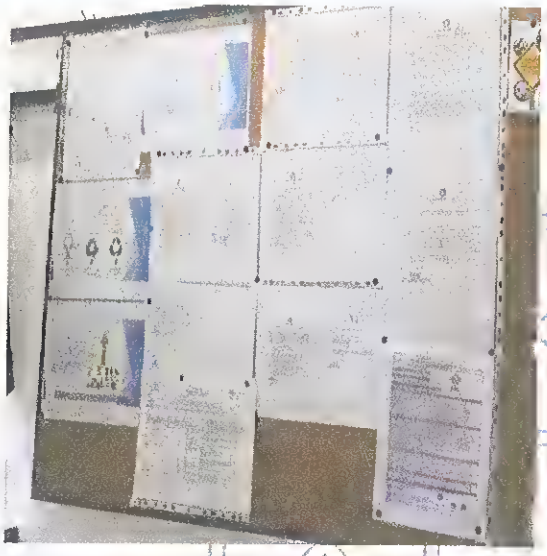Cartelera Informativa SST	Ubicación De Elementos De Primeros Auxilios
	
Ubicación Del Punto Ecológico	**Punto de hidratación del personal**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19

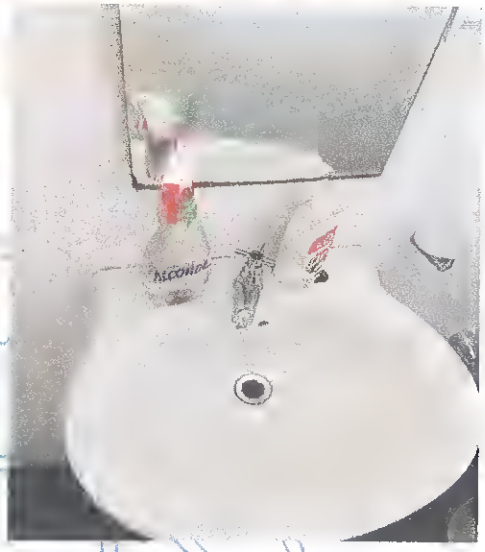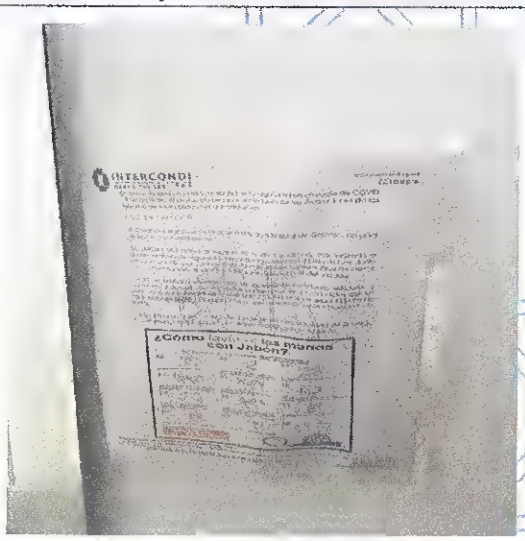Capacitacion al personal	Lavamanos con elementos necesario
	
Señalizacion prevencion covid -19	**Señalización baño sanitario**
	

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19

Inspección de obra – uso adecuados de EPP	Inspección de obra – uso adecuados de EPP
	
Inspección de obra – uso adecuados de EPP	Inspección de obra – uso adecuados de EPP
	


REGISTRO FOTOGRÁFICO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19

Foto de inspección obra



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID- 19

Señalizacion de obra

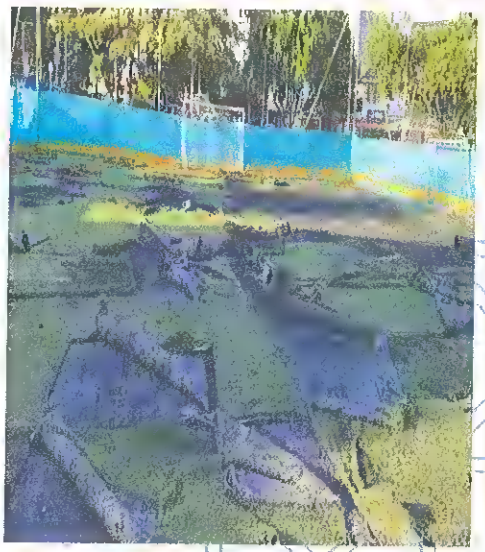







INFORME DE TOPOGRAFIA CANCHA SINTETICA VILLA BOLIVAR

INFORME DE TOPOGRAFIA

CANCHA SINTETICA VILLA BOLIVAR

IMDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 414 de 2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

INTERVENTORIA: INTERCONDI OBRAS CIVILES SAS

FEBRERO 2023

VILLAVICENCIO

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 3
1.1 OBJETO 3
1.2 AMBITO DE APLICACIÓN 3
1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
1.4 ESPECÍFICA 4
1.5 DETALLADA 5
2. INFORME TOPOGRÁFICO 6
2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 6
2.1.1 Actividades Preliminares 6
2.1.2 Trabajo de campo 6
2.1.3 Cálculos y procesamiento de la información de campo 7
2.1.4 Coordenadas detalles 8
2.1.5 Elaboración dibujo topográfico 9
2.1.6 Área de cancha sintetica 11
3. RECURSOS 11
3.1 EQUIPO HUMANO 11
3.2 EQUIPOS 12
3.2.1 CERTIFICACIONDE EQUIPOS 13
3.2.2 TARJETA PROFESIONAL 15

1. ASPECTOS GENERALES

El presente Informe rige para el proyecto otorgado al **INTERCONDI OBRAS CIVILES SAS**, localizada en la ciudad de Villavicencio, tiene como finalidad entregar el levantamiento de la cancha Vizcaya, incluyendo la información de la cancha en concreto.

1.1 OBJETO

Informar las actividades topográficas realizadas para el proyecto, el procedimiento seguido por parte del componente topográfico en las labores realizadas.

1.2 AMBITO DE APLICACIÓN

Determinar la posición, dimensiones, vías, andenes, pozos, topografía del terreno mediante 2 vértices arbitrarios localizados cerca al área a intervenir, con el cual se hace el amarre de la poligonal para desarrollar a su vez levantamientos, replanteos y de más labores a realizar en los diseños espacio público. Los puntos o placas Geo Referenciadas ya citadas son base fundamental para la entrega de planos finales a entidades públicas.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

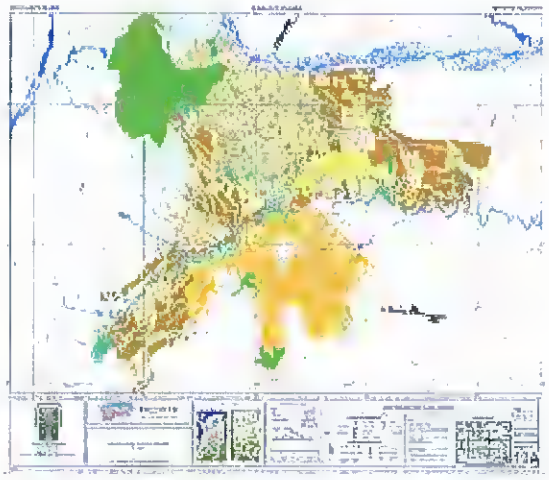


Ilustración Villavicencio, Meta

1.4 ESPECÍFICA

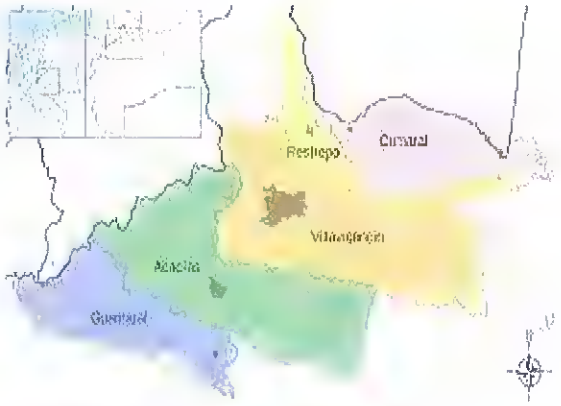


IMAGEN VILLAVICENCIO, META



FOTO GOOGLE EARTH

1.5 DETALLADA

El levantamiento topográfico ejecutado a los componentes en la carrera 41 con calle 5c en la ciudad de Villavicencio.

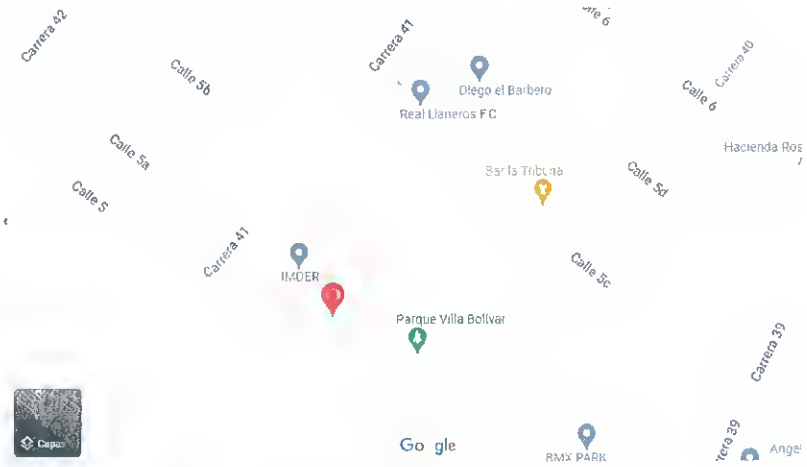


IMAGEN GOOGLE MAPS.

2. INFORME TOPOGRÁFICO

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

2.1.1 Actividades Preliminares

- Reconocimiento en campo del área de estudio.
- Identificación en campo de los vértices geodésicos existentes o materializados en la zona del proyecto.
- Observación de la zona a fin de determinar los equipos necesarios y el plan de trabajo para cumplir con lo exigido.

2.1.2 Trabajo de campo

Para la etapa del Levantamiento Topográfico se inicia determinando la ubicación de los deltas o auxiliares a materializar en el levantamiento, ubicándolos en partes estratégicas con visual a los componentes a levantar, así mismo, que no vayan a deteriorarse por agentes que transitan por la zona.

Se realiza la poligonal de amarre para darle coordenadas reales a los Deltas partiendo desde el D1, dando visual de amarre al D2 .

Como se muestra en la fotografía a continuación.



Imagen propia Levantamiento en campo

Una vez ubicados los deltas en campo se inicia la captura de información de los elementos urbanísticos que componen la vía y el espacio público.

2.1.3 Cálculos y procesamiento de la información de campo

La información tomada en campo se procesa mediante el software Topcon Link, en él se descargan los datos guardados en la estación Total utilizada (Topcon) y se procesa la información ingresando las coordenadas de los deltas respectivos.

Deltas y auxiliares

A continuación, se evidencia el cuadro con las coordenadas y alturas de los GPS utilizados en el levantamiento, además de los deltas auxiliares empleados.

CUADRO COORDENADAS DELTAS DE AMARRE			
PUNTO	NORTE	ESTE	ALTURA
D1	2500.00	1000.00	2500
D2	2484.373	1046.076	2498.674

Tabla 3 Coordenadas de amarre

2.1.4 Coordenadas detalles

A continuación, las coordenadas de todos los detalles tomados en campo.

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DETALLE
10	2484.373	1046.076	2498.31	POSTE
11	2512.358	1058.279	2498.674	POSTE
12	2522.779	1035.053	2498.743	POSTE
13	2532.87	1011.315	2499.114	POSTE
14	2504.955	999.109	2498.817	POSTE
15	2494.404	1022.409	2498.828	POSTE
16	2512.334	1057.611	2498.291	G
17	2511.983	1056.67	2498.309	G
18	2501.488	1051.95	2498.332	G
19	2496.402	1049.711	2498.323	G
20	2498.297	1051.432	2498.323	G
21	2485.853	1045.186	2498.316	G

22	2484.948	1045.639	2498.956	G
23	2489.797	1036.199	2498.948	G
24	2490.972	1033.483	2498.952	G
25	2494.875	1022.782	2498.957	G
26	2508.609	1028.68	2498.96	G
27	2499.895	1012.937	2498.934	G
28	2501.065	1010.306	2498.944	G
29	2505.332	1000.668	2498.946	G
30	2504.928	999.814	2498.937	G
31	2515.788	1005.258	2498.922	G
32	2518.389	1005.723	2498.972	G
33	2520.947	1007.49	2498.982	G
34	2532.362	1011.812	2498.949	G
35	2531.448	1012.076	2498.948	G
36	2527.358	1021.503	2498.955	G
37	2526.179	1024.232	2498.96	G
38	2522.135	1035.291	2498.957	G
39	2522.388	1036.043	2498.521	PUERTA
40	2500.931	997.686	2499.916	GRADA
41	2501.476	997.91	2499.662	GRADA
42	2502.049	998.092	2499.303	GRADA
43	2502.624	998.375	2499.035	GRADA
44	2503.124	998.643	2498.961	GRADA
45	2483.622	1043.281	2498.92	GRADA
46	2481.507	1042.257	2498.522	GRADA

Tabla 5 Coordenadas detalles campo

2.1.5 Elaboración dibujo topográfico

En el programa AutoCAD Civil 3D se realiza el plano topográfico con los puntos capturados en campo y procesados en el programa TopconLink con coordenadas reales.

En AutoCAD Civil 3D se cargan los puntos, se realiza la unión de ellos, se interpola, se realiza el modelo de superficie, generación de curvas de nivel, perfiles longitudinales a la vía y los andenes y secciones transversales para facilitar el diseño del proyecto.

A continuación, se muestra el resultado final del plano topográfico en planta y el resultado de la generación de perfiles longitudinales, así mismo, se resalta el detalle

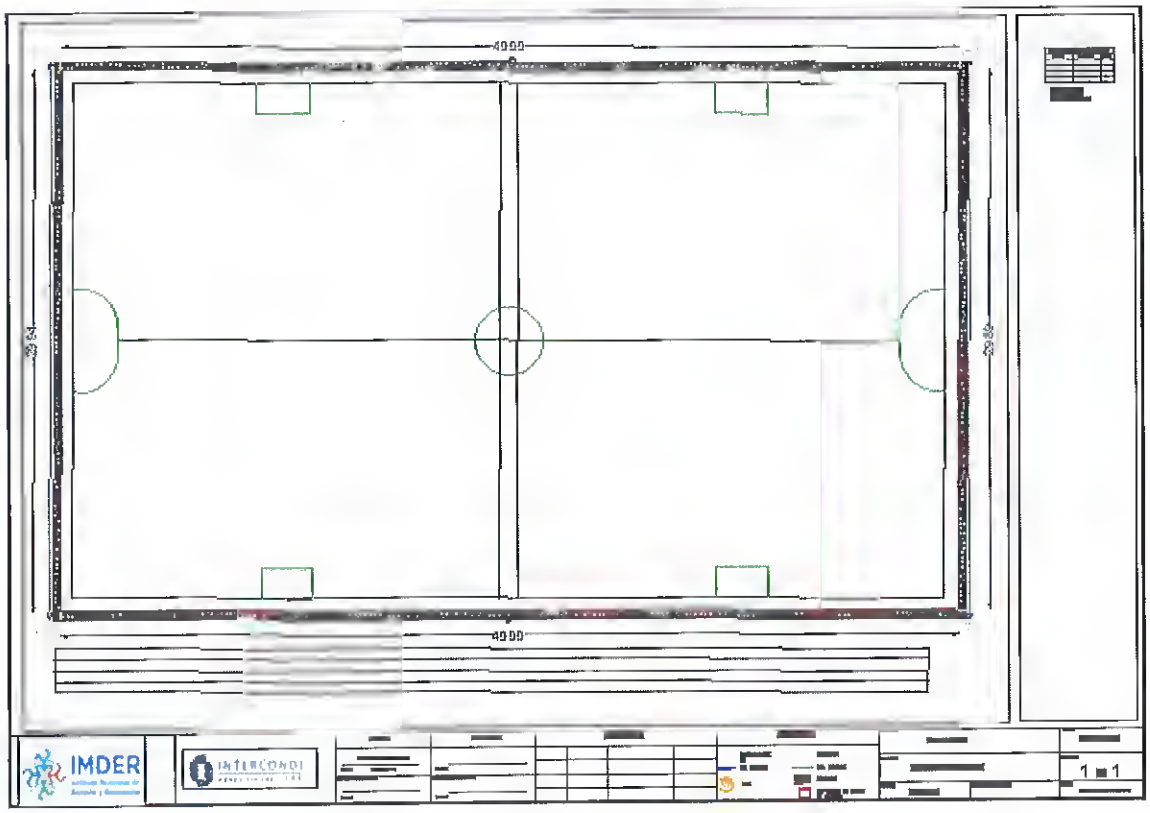


Imagen propia Plano en Planta

2.1.6 Área de cancha sintetica

CUADRO DE COORDENADAS		
ESTE	NORTE	PTO
1011.812	2532.362	P1
999.814	2504.928	P2
1045.639	2484.948	P3
1057.611	2512.334	P4

Area: 1495.45 m²
Area: 0.14955 ha
Perimetro: 159.81 ml

3. RECURSOS

3.1 EQUIPO HUMANO

A continuación, se presenta el equipo de trabajo de ejecución del proyecto.

ÍTEM	CANTIDAD	CARGO
1	1	Topógrafo
2	2	Auxiliares
3	1	Personal seguridad

Tabla 6 Área de Topografía

3.2 EQUIPOS

 Para la ejecución de los trabajos de levantamiento topográfico se utilizaron los siguientes equipos:

1. Estación total TOPCON modelo GTS 233W, con trípode, prisma y bastón porta prisma.
2. Computador portátil con programas Topcon link y civil cad.
3. Herramienta menor.

3.2.1 CERTIFICACIONDE EQUIPOS



MAQUITOP B.A.B.
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Calle 45 A No. 50 - 27 ° B. la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

CERTIFICADO
Nº 0431

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS 233 W
NÚMERO DE SERIE: 272744
PROPIETARIO: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	
TELESCOPIO	
Aumentos	30X
Apertura	45 mm
Campo de Vision a 100 mts	1PX6
Impermeabilización	
Peso con baterias y estuche	5Kg

MEDIDA DEL ÁNGULO	
PRECISIÓN	
(Desviación Estándar basada en norma DIN 18723)	3"
Lectura de ángulos (apreciación)	3"
Compensador Automático de nivel	+/-3

MEDIDAS DE DISTANCIA	
PRECISIÓN	
Medición Estándar	mm+2ppm
Seguimiento	
Mínima distancia posible	
Tiempo de medición	3 segundos

ALCANCE			
Con 1 prisma	Con 2 prismas	Grey Card	No prisma

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL
Presión en mm de nivelación por Km doble
Aumento del Telescopio
Mínima Distancia Focal
Factor Multiplicados de la Estadia
Rango del Compensador
Campo de Visión a 30 Mts.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR
Equipo Calibrado y ajustado

PATRÓN UTILIZADO
COLIMADOR TAYLOR HOBSON 240426

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD



MAQUITOP B.A.E.
NIT. 800.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Calle 45 A No. 50 - 27 ° B. la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

Nº C 0431

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS 233 W

NÚMERO DE SERIE: 272744

PROPIETARIO: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

AJUSTES REALIZADOS

CÓDIGO 1: CORRECTO
CÓDIGO 2: FALLA CORREGIDA
CÓDIGO 3: FALLA NO CORREGIDA
CÓDIGO 4: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Limpieza general y engrase	1	
Ajuste de niveles	1	
Ajuste del sistema de colimación	2	
Ajuste del compensador automático	1	
Ajuste del nivel tubular	1	
Ajuste del sistema de enfoque	1	
Ajuste de nivel ojo de pollo	1	
Ajuste plomada óptica	1	
Exactitud ángulo horizontal y vertical	1	
Exactitud de distanciometro	1	
Verticalidad, horizontalidad de la retícula y limpieza	1	
Foco mínimo (1.5 mts o menos)	1	
Suavidad de enfoque repetitivamente	1	
Prensa horizontal y tornillo de movimiento lento	2	
Chequeo del display	1	
Fuente de poder extrema	1	
Data input - output	1	
Lentes de objetivo	1	
Resolución	1	
Tornillo base nivelante	1	
Miradas de puntería	1	
Chequeo del teclado	1	
Apariencia exterior	1	

Este documento se expide a solicitud de: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

En la ciudad de BOGOTA a los 10 días del mes AGOSTO de 20 21


Además certificamos que el anterior equipo cumple con los parámetro técnicos establecidos por el fabricante.


ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA POR 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA

JORGE ELIECER CABRA
GERENTE

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

3.2.2 TARJETA PROFESIONAL






ELABORADO POR

LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ

CPNT 01-17299

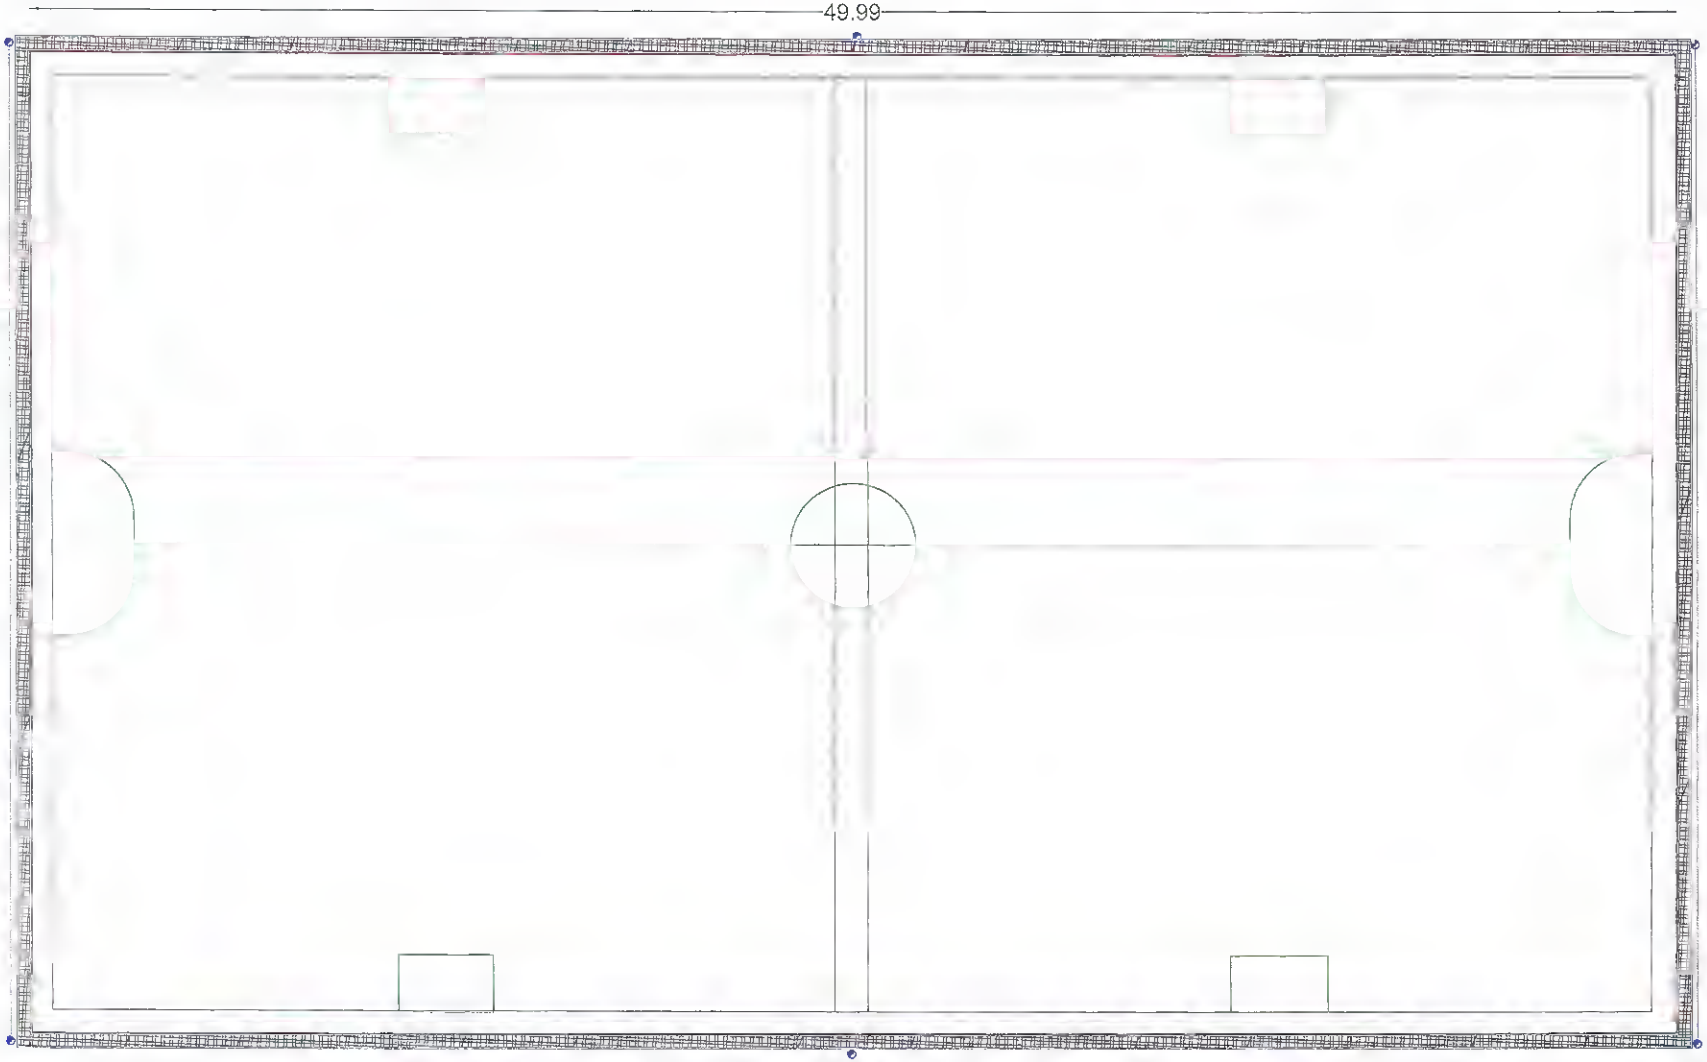

CUADRO DE COORDENADAS		
ESTE	NORTE	PTO

Area: 1495.45 m²
Area: 0.14955 ha
Perimetro: 159.81 ml

LEVANTO	APROBACIÓN	MODIFICACIONES
TOP. LUIS FERNANDO CASTRO	TOP. LUIS FERNANDO CASTRO	

CONVENCIONES

PROYECCION DE VIA
RED SANITARIA
Pozo
PARAMENTO
RED EXISTENTE
SUMIDERO
PROYECCION DE CAMARA DE CONEXION

VILLA BOLIVAR

PLANTA-CUADRO DE AREA

INDICADAS

FEBRERO 2023

1 DE 1

TOP. LUIS FERNANDO CASTRO

INFORME DE TOPOGRAFIA PLACA DEPORTIVA VIZCAYA 6

INFORME DE TOPOGRAFIA

CANCHA SINTETICA VIZCAYA

IMDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 414 de 2022

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

INTERVENTORIA: INTERCONDI OBRAS CIVILES SAS

DICIEMBRE 2022

VILLAVICENCIO, META

CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES 3
   1.1 OBJETO 3
   1.2 AMBITO DE APLICACIÓN 3
   1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
   1.4 ESPECÍFICA 4
   1.5 DETALLADA 5
2. INFORME TOPOGRÁFICO 6
   2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 6
      2.1.1 Actividades Preliminares 6
      2.1.2 Trabajo de campo 6
      2.1.3 Cálculos y procesamiento de la información de campo 7
      2.1.4 Coordenadas detalles 8
      2.1.5 Elaboración dibujo topográfico 11
      2.1.6 Área de cancha de concreto 12
3. RECURSOS 12
   3.1 EQUIPO HUMANO 12
   3.2 EQUIPOS 13
      3.2.1 CERTIFICACIONDE EQUIPOS 14
      3.2.2 TARJETA PROFESIONAL 16

1. ASPECTOS GENERALES

El presente Informe rige para el proyecto otorgado al **INTERCONDI OBRAS CIVILES SAS**, localizada en la ciudad de Villavicencio, tiene como finalidad entregar el levantamiento de la cancha Vizcaya, incluyendo la información de la cancha en concreto.

1.1 OBJETO

Informar las actividades topográficas realizadas para el proyecto, el procedimiento seguido por parte del componente topográfico en las labores realizadas.

1.2 AMBITO DE APLICACIÓN

Determinar la posición, dimensiones, vías, andenes, pozos, topografía del terreno mediante 2 vértices arbitrarios localizados cerca al área a intervenir, con el cual se hace el amarre de la poligonal para desarrollar a su vez levantamientos, replanteos y de más labores a realizar en los diseños espacio público. Los puntos o placas Geo Referenciadas ya citadas son base fundamental para la entrega de planos finales a entidades públicas.

1.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

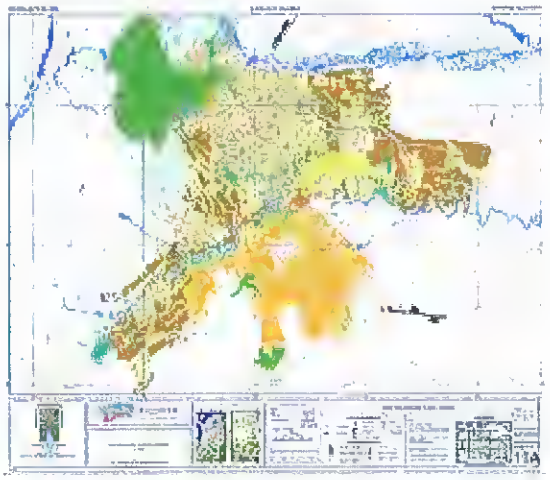


Ilustración Villavicencio, Meta

1.4 ESPECÍFICA

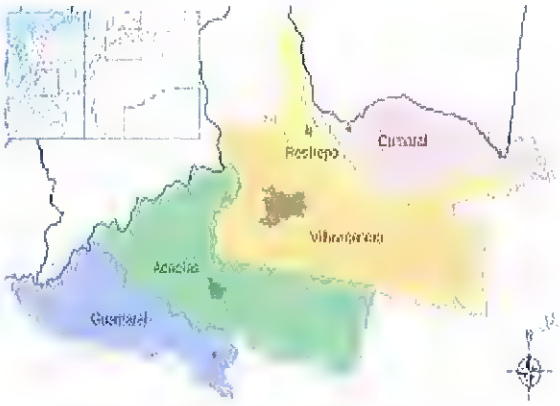


IMAGEN VILLAVICENCIO, META



FOTO GOOGLE EARTH

1.5 DETALLADA

El levantamiento topográfico ejecutado a los componentes ubicados sobre la diagonal 5 bis y 5b con carrera 20b en la ciudad de Villavicencio.

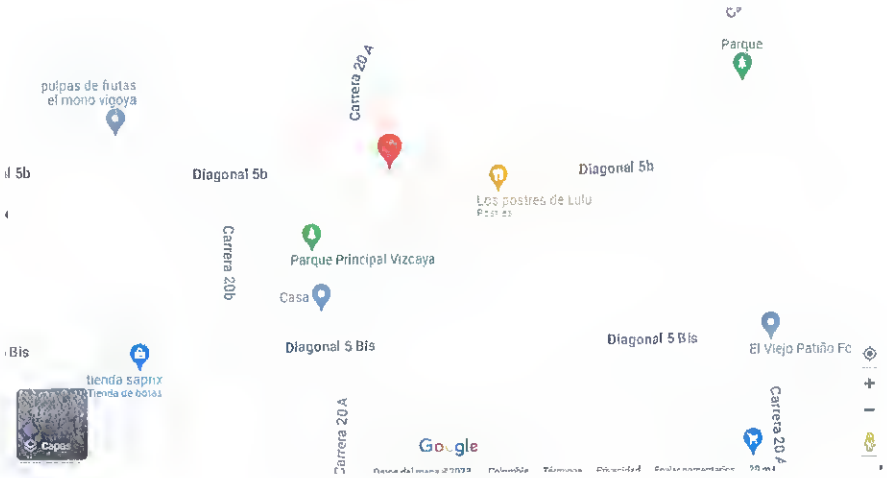


IMAGEN GOOGLE MAPS.

2. INFORME TOPOGRÁFICO

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

2.1.1 Actividades Preliminares

- Reconocimiento en campo del área de estudio.
- Identificación en campo de los vértices geodésicos existentes o materializados en la zona del proyecto.
- Observación de la zona a fin de determinar los equipos necesarios y el plan de trabajo para cumplir con lo exigido.

2.1.2 Trabajo de campo

Para la etapa del Levantamiento Topográfico se inicia determinando la ubicación de los deltas o auxiliares a materializar en el levantamiento, ubicándolos en partes estratégicas con visual a los componentes a levantar, así mismo, que no vayan a deteriorarse por agentes que transitan por la zona.

Se realiza la poligonal de amarre para darle coordenadas reales a los Deltas partiendo desde el D1, dando visual de amarre al D2 .

Como se muestra en la fotografía a continuación.



Imagen propia Levantamiento en campo

Una vez ubicados los deltas en campo se inicia la captura de información de los elementos urbanísticos que componen la vía y el espacio público.

2.1.3 Cálculos y procesamiento de la información de campo

La información tomada en campo se procesa mediante el software Topcon Link, en él se descargan los datos guardados en la estación Total utilizada (Topcon) y se procesa la información ingresando las coordenadas de los deltas respectivos.

Deltas y auxiliares

A continuación, se evidencia el cuadro con las coordenadas y alturas de los GPS utilizados en el levantamiento, además de los deltas auxiliares empleados.

CUADRO COORDENADAS DELTAS DE AMARRE			
PUNTO	NORTE	ESTE	ALTURA
D1	10000.00	5000.00	50.00
D2	10004.425	5011.303	49.821

Tabla 3 Coordenadas de amarre

2.1.4 Coordenadas detalles

A continuación, las coordenadas de todos los detalles tomados en campo.

PUNTO	NORTE	ESTE	COTA	DETALLE
47	9987.404	5004.848	49.818	CAN
48	9989.363	4999.793	49.888	CAN
49	9989.859	4996.926	49.879	CAN
50	9989.494	4991.518	49.812	CAN
51	9988.856	4998.166	49.93	CAN
52	10012.725	4995.183	49.781	CAN
53	10010.726	5000.231	49.864	CAN
54	10011.249	5001.803	49.887	CAN
55	10010.298	5003.078	49.858	CAN
56	10010.591	5008.544	49.826	CAN
57	10009.427	5008.648	49.772	ZD
58	10008.605	5013.129	48.294	ZD

59	9997.298	5008.012	49.958	ZD
60	10000.247	5008.585	49.973	ZD
61	10000.732	5007.323	49.758	ZD
62	9999.17	5011.38	49.979	ZD
63	9997.209	5010.941	49.967	ZD
64	9995.013	5008.675	49.742	ARBOL
65	9990.888	5007.748	49.784	ARBOL
66	10009.22	5012.704	49.027	ARBOL
67	9992.468	4985.058	49.239	ARBOL
68	9989.53	4991.076	49.664	MALLA
69	9987.2	5005.383	49.64	MALLA
70	10010.599	5009.273	49.526	MALLA
71	10012.881	4994.914	49.447	MALLA
72	10014.449	4991.297	49.353	POSTE
73	10010.71	5013.777	49.051	POSTE
74	9985.632	5009.774	49.734	POSTE
75	9988.498	4991.268	49.527	POSTE
76	9998.873	4992.162	50.144	SILLA
77	9998.788	4992.685	50.144	SILLA
78	10000.609	4992.445	50.167	SILLA
79	10000.552	4993.016	50.161	SILLA
80	10001.743	4992.619	50.121	SILLA
81	10001.654	4993.138	50.142	SILLA
82	10003.393	4993.423	50.154	SILLA
83	10003.484	4992.894	50.165	SILLA
84	9999.519	4989.507	49.576	J
85	9999.603	4984.83	49.55	J
86	10011.094	4985.321	49.511	J
87	10010.242	4991.317	49.47	J
88	9994.344	5007.845	49.274	BASURA
89	9986.12	5009.599	49.748	PARAMENTO
90	9998.813	5011.601	49.691	PARAMENTO
91	10010.622	5013.41	48.455	PARAMENTO
92	10014.07	4988.277	49.351	PARAMENTO
93	10015.201	4980.963	51.441	PARAMENTO

94	10005.26	4979.286	50.245	PARAMENTO
95	9991.551	4977.08	50.361	PARAMENTO
96	9990.333	4984.693	50.11	PARAMENTO
97	9993.172	4982.051	49.859	ARBOL
98	10003.339	4980.591	49.754	ARBOL
99	10006.381	4981.315	49.853	ARBOL
100	10009.542	4981.807	49.908	ARBOL
101	10013.862	4998.62	50.202	VIA
102	10019.706	5000.222	50.279	VIA
103	10016.692	5015.709	50.453	VIA
104	10010.946	5014.224	51.158	VIA
105	10010.427	5018.907	50.496	VIA
106	10009.4	5018.343	50.526	VIA
107	9997.803	5016.366	50.628	VIA
108	9998.512	5012.58	50.561	VIA
109	9985.254	5014.498	50.701	VIA
110	9985.857	5010.469	50.651	VIA
111	9984.995	5008.551	50.504	VIA
112	9979.125	5007.751	50.661	VIA
113	9981.847	4990.508	50.427	VIA
114	9983.424	4980.691	50.272	VIA
115	9984.41	4974.6	50.178	VIA
116	9991.794	4971.985	50.887	VIA
117	9992.356	4976.156	50.747	VIA
118	10005.432	4974.188	49.415	VIA
119	10004.759	4978.088	49.407	VIA
120	10016.503	4980.143	50.944	VIA
121	10017.061	4975.902	47.569	VIA

Tabla 5 Coordenadas detalles campo

2.1.5 Elaboración dibujo topográfico

En el programa AutoCAD Civil 3D se realiza el plano topográfico con los puntos capturados en campo y procesados en el programa TopconLink con coordenadas reales.

En AutoCAD Civil 3D se cargan los puntos, se realiza la unión de ellos, se interpola, se realiza el modelo de superficie, generación de curvas de nivel, perfiles longitudinales a la vía y los andenes y secciones transversales para facilitar el diseño del proyecto.

A continuación, se muestra el resultado final del plano topográfico en planta y el resultado de la generación de perfiles longitudinales, así mismo, se resalta el detalle

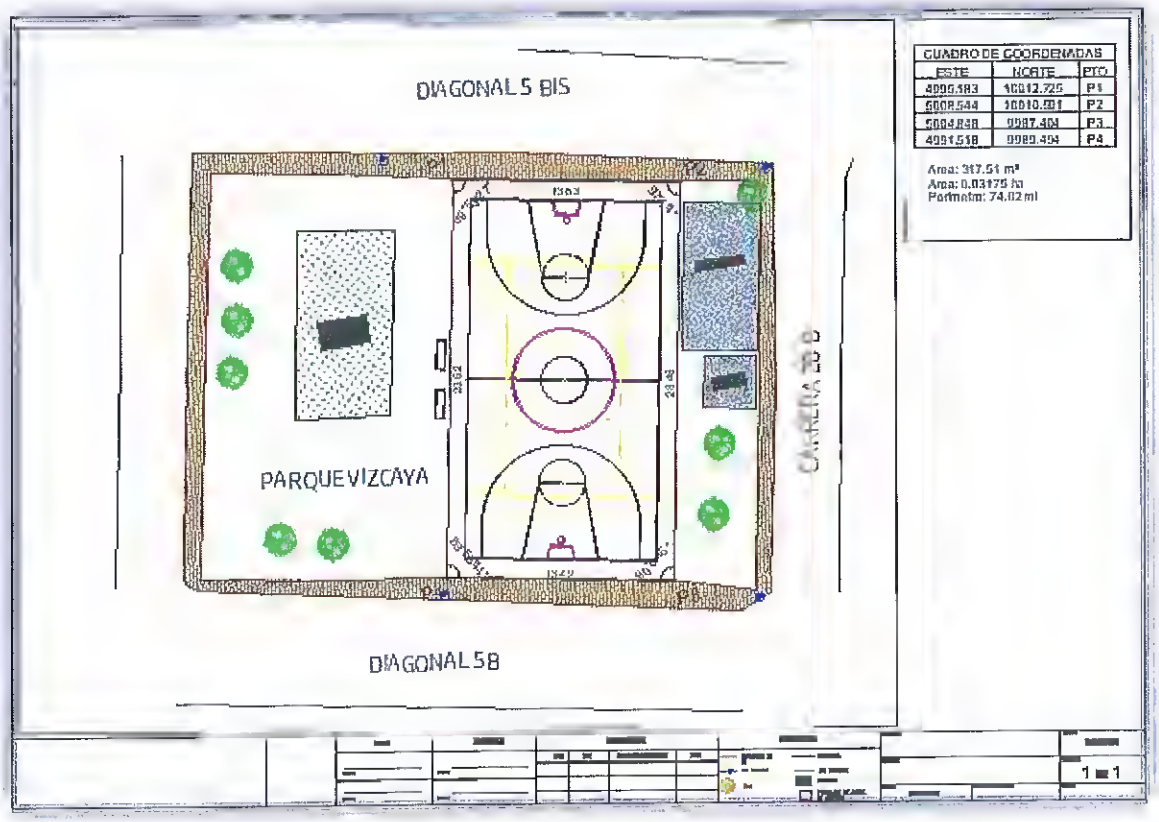


Imagen propia Plano en Planta

2.1.6 Área de cancha de concreto

CUADRO DE COORDENADAS		
ESTE	NORTE	PTO
4995.183	10012.725	P1
5008.544	10010.591	P2
5004.848	9987.404	P3
4991.518	9989.494	P4

Area: 317.51 m²
Area: 0.03175 ha
Perimetro: 74.02 ml

3. RECURSOS

3.1 EQUIPO HUMANO

A continuación, se presenta el equipo de trabajo de ejecución del proyecto.

ÍTEM	CANTIDAD	CARGO
1	1	Topógrafo
2	2	Auxiliares
3	1	Personal seguridad

Tabla 6 Área de Topografía

3.2 EQUIPOS

 Para la ejecución de los trabajos de levantamiento topográfico se utilizaron los siguientes equipos:

1. Estación total TOPCON modelo GTS 233W, con trípode, prisma y bastón porta prisma.
2. Computador portátil con programas Topcon link y civil cad.
3. Herramienta menor.

3.2.1 CERTIFICACIONDE EQUIPOS



MAQUITOP S.A.S.
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Calle 45 A No. 50 - 27 " B. la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

CERTIFICADO
Nº C 0431

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS 233 W
NÚMERO DE SERIE: 272744
PROPIETARIO: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	
TELESCOPIO	
Aumentos	30X
Apertura	45 mm
Campo de Vision a 100 mts	1PX6
Impermeabilización	
Peso con baterías y estuche	5Kg

MEDIDA DEL ÁNGULO	
PRECISIÓN	
(Desviación Estándar basada en norma DIN 18723)	3"
Lectura de ángulos (apreciación)	3"
Compensador Automático de nivel	+/-3

MEDIDAS DE DISTANCIA	
PRECISIÓN	
Medición Estándar	1mm+2ppm
Seguimiento	
Mínima distancia posible	
Tiempo de medición	3 segundos

ALCANCE			
Con 1 prisma	Con 2 prismas	Grey Card	No prisma

ESPECIFICACIONES DEL NIVEL
Presión en mm de nivelación por Km doble
Aumento del Telescopio
Mínima Distancia Focal
Factor Multiplicados de la Estadía
Rango del Compensador
Campo de Visión a 30 Mtrs.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR

Equipo Calibrado y ajustado

PATRÓN UTILIZADO

COLIMADOR TAYLOR HOBSON 240420

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD



MAQUITOP E.A.S.
NIT. 900.131.105-1
COMPRA, VENTA, ALQUILER, REPARACION DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPOS DE TOPOGRAFIA

Calle 45 A No. 50 - 27 * B. la Esmeralda
Tels.: (571) 324 2334 - 702 3008
Cels.: 311 219 8471 - 313 293 2884
Bogotá, D.C. - Colombia
e-mail: makrotop@hotmail.com
www.maquitopsa.com

Nº C 0431

EL EQUIPO: ESTACION TOPCON GTS 233 W

NÚMERO DE SERIE: 272744

PROPIETARIO: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

AJUSTES REALIZADOS

CÓDIGO 1: CORRECTO
CÓDIGO 2: FALLA CORREGIDA
CÓDIGO 3: FALLA NO CORREGIDA
CÓDIGO 4: NO APLICA

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	OBSERVACIONES
Limpieza general y engrase	1	
Ajuste de niveles	1	
Ajuste del sistema de colimación	2	
Ajuste del compensador automático	1	
Ajuste del nivel tubular	1	
Ajuste del sistema de enfoque	1	
Ajuste de nivel ojo de pollo	1	
Ajuste plomada óptica	1	
Exactitud ángulo horizontal y vertical	1	
Exactitud de distanciometro	1	
Verticalidad, horizontalidad de la retícula y limpieza	1	
Foco mínimo (1,5 mts o menos)	1	
Suavidad de enfoque repetitivamente	1	
Prensa horizontal y tornillo de movimiento lento	2	
Chequeo del display	1	
Fuente de poder extrema	1	
Data input - output	1	
Lentes de objetivo	1	
Resolución	1	
Tornillo base nivelante	1	
Miradas de puntería	1	
Chequeo del teclado	1	
Apariencia exterior	1	

Este documento se expide a solicitud de: WILSON EDUARDO ZUÑIGA

En la ciudad de BOGOTA a los 10 días del mes AGOSTO de 20 21

Además certificamos que el anterior equipo cumple con los parámetro técnicos establecidos por el fabricante.


ESTE CERTIFICADO TIENE VIGENCIA POR 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA

JORGE ELIECER CABRA
GERENTE

ESTE CERTIFICADO NO TIENE VALIDEZ SIN SELLO DE SEGURIDAD

3.2.2 TARJETA PROFESIONAL






ELABORADO POR

LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ
CPNT 01-17299

DIAGONAL 5 BIS

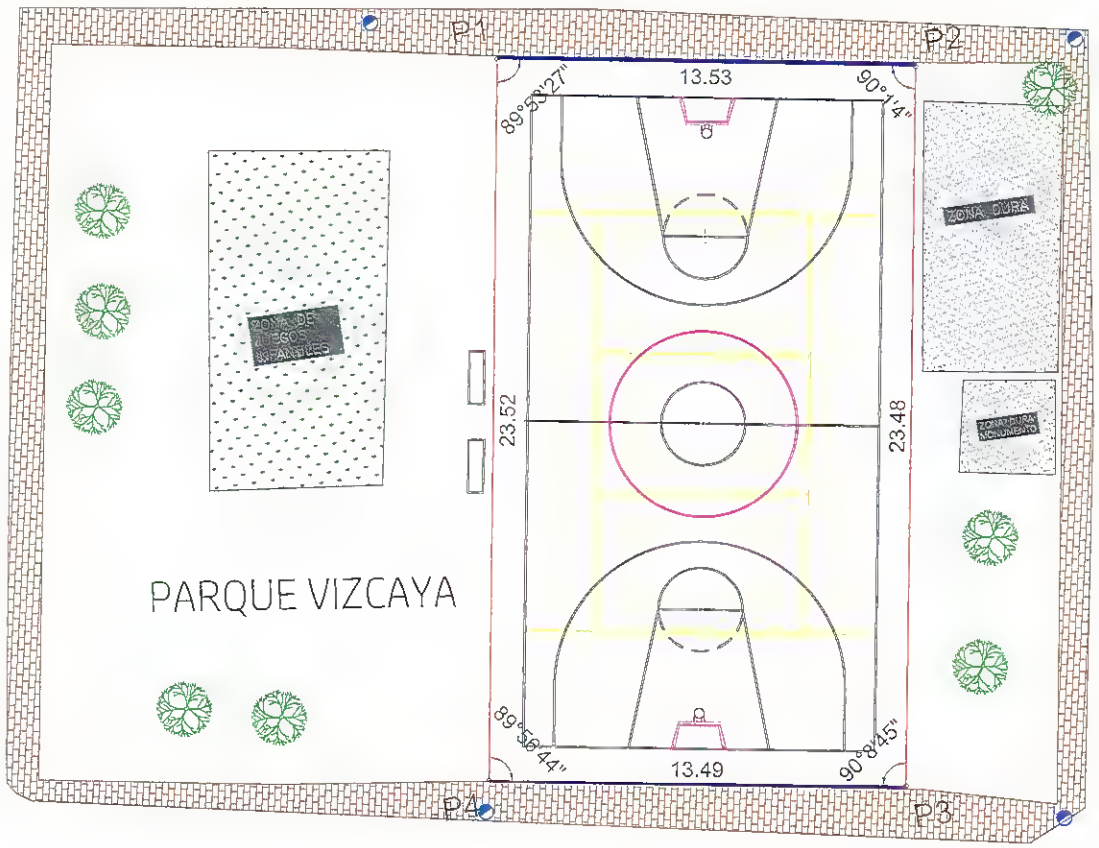

DIAGONAL 5B

CUADRO DE COORDENADAS		
ESTE	NORTE	PTO
4995.183	10012.725	P1
5008.544	10010.591	P2
5004.848	9987.404	P3
4991.518	9989.494	P4

Area: 317.51 m²
Area: 0.03175 ha
Perimetro: 74.02 ml

LEVANTO	APROBACIÓN	MODIFICACIONES	CONVENCIONES		
			PROYECCION DE VIA	PARAMENTO	PARQUE VIZCAYA
			RED SANITARIA	RED EXISTENTE	PLANTA-CUADRO DE AREA
			Poste	SUMIDERO	INDICADAS
				PROYECCION DE CAMARA DE CONEXION	

DICIEMBRE 2022

1 DE 1

RESULTADOS DE LABORATORIO
INTERVENTORIA

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 21 de diciembre de 2022

OFICIO: 10131

SEÑORES:
INTERCONDI SAS
INGRID GAMBOA
CEL. 3134897528
intercondisas@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: 017/12/2022.
PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - BARRIO VISCAYA 6.
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- CUATRO (04) Ensayos de densidades por el método cono de arena.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

DENSIDAD DE CAMPO METODO CONO DE ARENA

Versión: 008	I G - F - 009	Enero de 2020

NORMA INV E-161 - 13

Solicitud No.: 017/12/2022

CLIENTE : INTERCONDI SAS

E-MAIL: intercondisas@gmail.com CONTACTO: INGRID GAMBOA

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - BARRIO VISCAYA 6

LUGAR VILLAVICENCIO - META FECHA: 15/12/2022

ENSAYO		1	2	3	4	
LOCALIZACION		CANCHA	CANCHA	CANCHA	CANCHA	
FUENTE		RIO GUATIQUIA	RIO GUATIQUIA	RIO GUATIQUIA	RIO GUATIQUIA	
MATERIAL		SUB BASE GRANULAR	SUB BASE GRANULAR	SUB BASE GRANULAR	SUB BASE GRANULAR	
Peso frasco + arena inicial	gr	7.545	7.440	7.345	7.218	
Peso frasco + arena restante	gr	2.875	2.505	2.210	2.294	
Peso arena total usada	gr	4.670	4.935	5.135	4.924	
Constante del cono	gr	1.644	1.644	1.644	1.644	
Peso de arena en el hueco	gr	3.026	3.291	3.491	3.280	
Densidad de la arena	gr/cm3	1,38	1,38	1,38	1,38	
Volumen del hueco	cm3	2.193	2.385	2.530	2.377	
Peso suelo hum + recipiente	gr	5.685	5.890	6.035	5.924	
Peso del recipiente	gr	170	170	170	170	
Peso suelo humedo	gr	5.515	5.720	5.865	5.754	
Densidad max de laboratorio	gr/cm3	2,220	2,220	2,220	2,220	
Gravedad especifica agregado grueso	gr/cm3	2,630	2,630	2,630	2,630	
Peso material retenido 3/4	gr	1.995	2.037	2.106	1.978	
% Material retenido 3/4	gr	36,17	35,61	35,91	34,38	
% Material que pasa 3/4	gr	63,83	64,39	64,09	65,62	
Humedad Speddy	%	6,6	5,6	6,2	6,4	
Peso suelo extraido seco	gr	5174	5417	5523	5408	
Densidad maxima en el terreno	gr/cm3	2,359	2,271	2,183	2,275	
Densidad maxima corregida CyD	gr/cm3	2,353	2,350	2,352	2,346	
Humedad optima	%	-	-	-	-	
Compactacion especifica	%	95	95	95	95	
Grado de compactacion	%	100,29	96,63	96,83	97,00	

OBSERVACIONES: LA DENSIDAD MÁXIMA DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADA POR EL CLIENTE PERO SIN HUMEDAD ÓPTIMA

CARGO RESPONSABLE: AUXILIAR DE LABORATORIO [ ] ANALISTA DE LABORATORIO I [X]

FIRMA FIRMA

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 17 de enero de 2023

OFICIO: C-5700

SEÑORES:
INTERCONDI SAS
DAVID RODRIGUEZ
CEL. 3134897528
intercondisas@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: C-034/12/2022.
PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- TRES (03) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: C-034/12/2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CLIENTE: INTERCONDI SAS

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 3000 PSI. CONCRETO PREMEZCLADO

FECHA DE ENTREGA: ENERO DE 2023

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (dias)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
PLACA	3407	16-dic-22	30-dic-22	14	15,2	181,46	295,16	30088	2.369	79,0					X		3000
	3408		13-ene-23	28	15,4	186,26	392,84	40045	3.071	102,4					X		
PLACA	3409	19-dic-22	16-ene-23	28	15,1	179,08	376,93	38423	3.065	102,2					X		3000

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA. ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE COSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 58 – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos


CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia

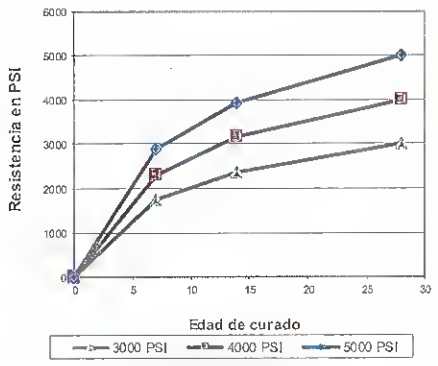

OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Villavicencio, 06 de marzo de 2023

OFICIO: C-5798

SEÑORES:
INTERCONDI SAS
DAVID RODRIGUEZ
CEL. 3134897528
intercondisas@gmail.com
Ciudad.

SOLICITUD: C-034/12/2022.
PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ASUNTO: ENTREGA RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO.

Respetados Señores:

Cumpliendo al compromiso adquirido con Uds., en el plan de calidad de la obra en referencia, les estamos adjuntando resultados de:

- DOS (02) Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros.

Los resultados de los ensayos realizados corresponden a las características presentadas por las muestras objeto del ensayo.

En espera de sus comentarios, y dispuestos en aclarar cualquier duda se suscribe de Uds.,

Atentamente,

HÉCTOR FERNANDO GARCÍA SARAY
Ingeniero Civil.
Especialista en ingeniería de fundaciones E.C.I.

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com

INGEGAR INGENIERIA S.A.S

Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO Y DEL MORTERO

Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

Solicitud No.: C-036/02/2023

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CLIENTE: INTERCONDI SAS

DESCRIPCION: DISEÑO DE CONCRETO DE 2500 PSI, CONCRETO PREMEZCLADO

FECHA DE ENTREGA: MARZO DE 2023

NORMA: INV-E-410

Tipo de Elemento Estructural	No. De Registro de Curado	Fecha de Toma Muestra	Fecha de Rotura	Edad de curado (días)	Diametro (cms.)	Area del Cilindro (cms2)	Carga aplicada (KN)	Carga aplicada (Kgs)	Resistencia PSI del Cilindro	Porcentaje de Resistencia (%)	Tipo de falla						Diseño Concreto PSI
PLACA	3446	04-FEB-23	18-feb-23	14	15,1	179,08	295,12	30086	2.278	76,0					X		2500
	3447		04-mar-23	28	15,2	181,46	392,80	40040	3.065	102,2					X		

NOTA: LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
ESTAS MUESTRAS SON TOMADAS Y SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

Carrera 32 Nº 5B – 03 Barrio La Vega – Villavicencio – Meta
Teléfono: 660 15 64 - Celular 315 894 61 63 – 321 238 74 13
E-mail: ingegar_ingenieria@yahoo.com com


CUADRO PROYECCIÓN RESISTENCIA DEL CONCRETO		
Versión: 007	I G - F - 034	Enero de 2020

INGEGAR INGENIERIA S.A.S
Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos

PROYECCION DEL CEMENTO RESISTENCIA NORMAL

RESITENCIA DEL CONCRETO	EDAD DE CURADO	% DE RESISTENCIA		VALOR DE RESISTENCIA	
		MIN	MAX	MIN	MAX
3000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	1740	2160
	14	79	86	2370	2580
	28	100		3000	
4000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2320	2880
	14	79	86	3160	3440
	28	100		4000	
5000 PSI	0	0		0	
	7	58	72	2900	3600
	14	79	86	3950	4300
	28	100		5000	

Curva de resistencia

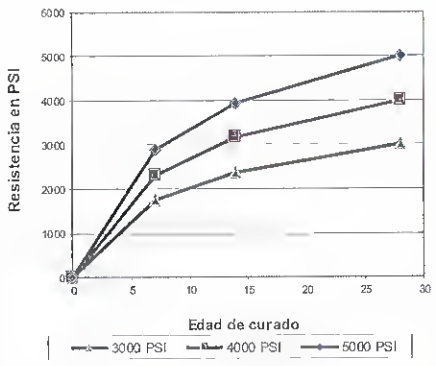

OBSERVACION: De acuerdo a lo solicitado por ustedes nos permitimos enviar la tabla de proyección de resistencia normal del concreto, el cual nos indica la edad de curado y porcentaje de acuerdo al diseño de mezcla. Teniendo en cuenta las consideraciones relativas a la durabilidad consignadas en la norma colombiana para Construcciones sismo resistentes NSR – 10 y prácticas recomendadas por el American concrete Institute ACI. El resultado de las muestras de concreto recibidas cumple y están dentro de las tolerancias permitidas según la normas de calidad del concreto.

YEISON HERNANDEZ MORENO
Laboratorista

NICOLAS ANDRADE OSTOS
Analista de Laboratorio I

ACTAS DE SOCIALIZACION

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del contrato - Escenario Deportivo barrio El Paraiso

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	26-11-22	8:40 am	9:40 am

TIPO DE REUNIÓN					
	Directivos		Coordinadores de proyecto		
	Comités		Comunidad		
	Otro	X	¿Cual?	Socialización	

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario deportivo del barrio Paraiso.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion del equipo de trabajo.
Socialización del contrato.
Respuesta a inquietudes.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

Actividades a ejecutar
solucion de inquietudes de la comunidad.
Solicitudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Jonathan Javier Zambrano Amaya	Jonathan Zambrano
Edgar Beltrán Ramírez	
María Gloria Posada	María Gloria
Leidy Dayan Chavarro Melo	
Cristian Rojas Cejón	
Anny's Esther Quintero.	
Claudia Marcela Chavarro	claudia chavarro

Emilce Rojas
Marcela Alexandra Castro Gómez
Francy Sogamoso
Juan de Dios Novoa
ANDRÉS VILLA BUITRAGO
Smith chavarro.
INGRID GAMBOA
Nelson Peña
LUIS FERNANDO DUQUE
Camilo Vivas R.L. Coinca
L. PATRICIA JIMENEZ

Francy Sogamoso
Juan de Dios N.
Smith Chavarro.
Ingrid G

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del contrato - Escenario Deportivo del barrio Playa Rica

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	26-11-22	12:00 m	1:30 pm.

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socializacion

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo del barrio Playa Rica

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo trabajo.
socializacion del contrato
Respuesta a inquietudes

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

Actividades a ejecutar
Solucion de inquietudes
Solicitudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

PR

PARTICIPANTES	FIRMAS
Elizabeth Montenegro	
María Cepeda Vedas Ruiz	
Jonathan Javier Zambrano Amaya	
John Freddy Toro Guzmán	
Lucero Parada R.	
Jaime Guzman	
Jaime Fernando T.	

Ingrid Carolina Gamboa Ingrid G.
Luis Fernando Duque
Nelson Peña
Camilo Andrés Niño Morales
Daniela Jimenez Daniela Jimenez

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socialización Escenario Santa Helena

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN		HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	26-NOV-22		7:30 am	8:30 am
TIPO DE REUNIÓN	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socialización

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario del barrio Santa Helena

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion del equipo trabajo.
Socialización.
Respuesta a inquietudes.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Actividades a ejecutar.
- Solucion de inquietudes de la comunidad.
- Solicitudes de la comunidad

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

S.I.T.

PARTICIPANTES	FIRMAS
Rafael Vega	
Walter Ramos	
Felix Amorocho	
Luis Eduardo Sanchez Pomario	
INGRID CAROLINA GAMBOA	
Dominico Pedraza. S	Maestro de obra
Humberto Peduary P.	
Camilo Niño Morales	
Fernanda Gonzalez.	Fernanda G.
LUIS FERNANDO DUQUE	
JONATHAN JAVIER ZAMBRANO AMAYA	Jonathan Jambrano
Maria Camila Rojas Sochica	Mia Camila Rojas Sochica
Nelson Andrey Peña Quemba	
DARCA JIMENEZ URBE	

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Acta de socializacion del proyecto Escenario Barno Vizcaya

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	26-11-22	10:00 am	11:00 am

TIPO DE REUNIÓN					
	Directivos		Coordinadores de proyecto		
	Comités		Comunidad		
	Otro	X	¿Cual?	Socializacion	

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad en general del barno Vizcaya, las actividades que se van a ejecutar en el escenario deportivo a intervenir.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion del equipo de trabajo.
Socializacion del proyecto
Propuesta inquietudes de la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Descripcion de las actividades a ejecutar
- Solucion de inquietudes de la comunidad.
- Solicitudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Alvaro Franco	
Cura Padre Pedro Pavon	
Rudel Mabel Estupiñan	
Ana Rosa Tellez Osorio	
Martina Esperanza Erazo	
Dinio Yaer Bernal	
Martha Martinez Cortes	
Diego Camacho	
Rosa Gonzalez	
Elias Velasquez Guevara	
Nohemy Rey Mateus	
Jinny Johanna Espitia	
Rosa Montoya	
INGRID CAROLINA GAMBOA	INGRID G
JONATHAN JAVIER ZAMBRANO ARAYA	Jonathan Zambrano
Camilo Andres Vivas Horta R.L Coimar	
DANIELA JIMENEZ URIBE	
Luis Fernando Duque	

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del proyecto escenario deportivo Alborada

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
		11:40 am	12:30 m.

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	x	¿Cual?	Socializacion

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario deportivo.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo de trabajo.
Socializacion del proyecto.
Respuesta a inquietudes de la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

-Socializacion de las actividades a ejecutar en el escenario deportivo.

-Se resolvieron las inquietudes de la comunidad.

-Solicitudes de la comunidad

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

No IV	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Camilo Andres Niño Morales RI. Coinal	
INGRID CAROLINA GAMBOA	INGRID G
JONATHAN JAVIER ZAMBRANO AMAYA	Jonathan Zambrano
Johanna Hotta Hernadez	Johanna Hotta
Maritza Ticora Quique	Maritza Ticora
Jessy Maiely Rodriguez Ticara	Jessy Ticara.
Yorman C. Zea	
Yury Fernanda Gonzalez Amaya	Fernanda G.
Daniela Jimenez Cure	



ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del contrato de obra, Escenario deportivo las Palmas

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
		10:40 am	11:30 am

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socializacion

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario deportivo.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo de trabajo.
Socializacion del proyecto.
Respuesta a inquietudes de la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del dia)

- Se socializaron las actividades a ejecutar en el escenario deportivo.
- Se resolvieron las inquietudes de la comunidad.
- Solicitudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Provista
1	N. A.			
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Camilo Andres Niño Morales R.L Coinan	
INGRID GAMBOA	INGRID G.
Maria Esther	
Morales Sanchez Fernanda	Morales Sanch F.
Amador Rey	
Jorge Garay 91.717.835	
Fabian Daniel Cruz	
Jonathan Javier Zambrano Amaya	Jonathan Zambrano
Jonathan Javier Zambrano Amaya	
Yury Fernanda Gonzalez Amaya	Fernanda G.
Daniela Jimenez Cruz	Daniela Jimenez

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del proyecto Escenario Deportivo las Gaviotas.

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	09-Dic-2022	8:00 am	9:10 am.

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socializacion.

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario Deportivo las Gaviotas

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo de trabajo
Socializacion a la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Socializacion del proyecto a la comunidad en General.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N. A.			
2				
3				
4				

6.

PARTICIPANTES	FIRMAS
[illegible] Jimenez	Coinar Ltda.
Inerio Gamboa	Inerio G.
Ana Cecilia Robayo	Ana Cecilia Robayo
Marta Cecilia	
Orlando Timoteo.	
Jonathan Javier Zambrano Amaya	Jonathan Zambrano
Camilo Andres Niño Morales R.L. Coinar	
Yury Fernanda Gonzalez Amaya	Fernanda G.

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socializacion del proyecto Escenario deportivo Septima de la Esperanta

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	09-Dic-2022	9:30 am	10:30 am

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socialización

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar a la comunidad las actividades a ejecutar en el escenario deportivo septima de la Esperanta

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo Trabajo.
Socializacion del proyecto.
Respuesta a inquietudes de la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Actividades a ejecutar en el escenario deportivo
- solucion de inquietudes de la comunidad.
- Solicitudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

S.E.

PARTICIPANTES	FIRMAS
INGRID CAROLINA GAMBOA	INGRID G.
DANIELA JIMENEZ URIBE	
Camilo Andres Viña Morales R.L Coinas	
Oswaldo Perez	Oswaldo P.
Alvaro Rivera	
Luis Fdo Vargas V.	
Andrea Alexandra Cruz Alvis	Andrea Cruz
Nelson Garcia Arizca	
Yury Fernanda Gonzalez Amaya	Fernanda G.
JONATHAN JAVIER ZAMBRANO AMAYA	Jonathan Jambrano

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socialización Escenario Deportivo Villa Bolivar

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	02-Febrero-23	6:00 PM	7:00 PM

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socialización

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Dar a conocer a la comunidad del barrio Villa Bolivar el objeto del contato y socializar las actividades que se van a ejecutar en el escenario deportivo.

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo de trabajo
Socialización del proyecto.
Respuesta inquietudes de la comunidad.
Observaciones y solicitudes de la comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del dia)

- Se presento el equipo de trabajo tanto de obra como de interventoria.
- Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo.
- Se resolvieron las inquietudes de la comunidad.
- Se tomo nota de las observaciones y solicitudes de la comunidad frente a la ejecucion del contrato.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS				
Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1				
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Jaime Bahepo R.	
Blanco González	
Maria Oliva Trigueros	
GIOVANNY ACUDELO	
Rafael Elio Beltran ...	
Juan Camilo Beltran Trigueros	
Carmen Barrero	
Osmar Herrera Pro	
Pedro Andres Tarazona Cortes	
Eva Medina Camargo	
Mateo Rodriguez Paez.	
Jhon Hannderson Garzón Becerra	
David Santiago Acero Herrera	
Oscar Fabian Reina Gonzalez	

ACTA DE REUNIÓN

NOMBRE DEL ACTA: Socialización Escenario Deportivo Santa Martha

ACTA NUMERO	FECHA DE REUNIÓN	HORA INICIO	HORA TERMINACIÓN
	11 Febrero - 23	10:00 am	11:00 am

TIPO DE REUNIÓN				
	Directivos		Coordinadores de proyecto	
	Comités		Comunidad	
	Otro	X	¿Cual?	Socialización

PARTICIPANTES (Se adjunta listado de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNION

Socializar con la comunidad del barrio Santa Martha las actividades a ejecutar en el escenario deportivo

TEMAS PROGRAMADOS (ORDEN DEL DIA)

Presentacion equipo de trabajo.
Socialización del proyecto.
Respuesta a inquietudes comunidad.

TEMAS TRATADOS (Desarrollo del orden del día)

- Se presento el equipo de trabajo tanto de obra como de interventoria
- Se socializo con la comunidad las actividades a realizar en el escenario deportivo.
- Se resolvieron las dudas e inquietudes de la comunidad.

ACCIONES – TAREAS – COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Prioridad (A, M, B)	Fecha Prevista
1	N.A.			
2				
3				
4				

PARTICIPANTES	FIRMAS
Luis Carlos Gonzalez Bonilla	
Samuel Fernando Olaya	
Gracieca Neira	
Leonardo Cely	
Jhon Bermudez	
Janeth Moreno	
Myriam Colorado	
Ana Poveda	
Camilo Mirio Morales	Rep. Legal Canal
INGRID GAMBOA	INGRID G
Lara Carolina Carrillo	Carolina Camillo
Angelica Gonzalez	

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO

En cumplimiento con las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER del municipio de Villavicencio. respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato de interventoría N° 414 de 2022 , que, **INTERCONDI SAS,** identificado con NIT N° 901.199.491-6, cumplió a satisfacción las actividades del contrato cuyo objeto es " **INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"** y todas las demás obligaciones pactadas de acuerdo con el seguimiento al contrato tal como se soporta con los respectivos informes del contratista y supervisión.

Esta certificación forma parte integral del acta parcial N° 01 del periodo comprendido entre el 18 de noviembre de 2022 al 15 de marzo de 2023, presentado al Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Villavicencio – Meta, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide a los 02 días del mes de Mayo del año 2023, con destino a la carpeta contractual.

ALVARO PATIÑO MONTOYA
cargo
SUPERVISOR

Elaboró:	Reviso:	Aprobó:
Cargo:	Cargo:	Cargo:

EL SUSCRITO SUPERVISOR DESIGNADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 414 DE 2022. PAGO DE APORTES OBLIGATORIOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007) (Decreto 1703 de 2002) (Ley 797 de 2003)

HACE CONSTAR:

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR del contrato No. 414 de 2022 de interventoria, que INTERCONDI SAS , identificado con NIT 901.199.491-6, cumplió en el periodo de noviembre de 2022, diciembre de 2022 y febrero de 2023, realizo el pago conforme a los documentos soportes del pago de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato No. 414 de 2022 suscrito con el Instituto Municipal de Deporte y Recreación IMDER de Villavicencio Meta, materia del presente pago.

Cuyo objeto es: " **INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** "

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a las planillas.

NOVIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Pagadas EL 05 de diciembre de 2022, con pago a EPS ($940.500), AFP ($1.312.600), ARL (286.700) CCF, ($40.000) correspondiente al mes de Noviembre de 2022.

DICIEMBRE 2022

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Pagadas EL 10 de enero de 2022, con pago a EPS ($1.201.300), AFP ($ 1.694.400), ARL ($517.500), CCF ($40.000) correspondiente al mes de Diciembre de 2022.

FEBRERO 2023

PERSONAL PROFESIONAL CONTRATO DE OBRA No. 414 DEL 2022 ""INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO "						
	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	No. C EDULA	ARL	EPS	AFP
1	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	Director de Interventoría	7.172.871	SURA	SANITAS	PORVENIR
2	MATEO AGUDELO VALERA	Ingeniero Residente de interventoría	86.076.792	SURA	SANITAS	COLPENSIONES
3	HERNAN MAURICO VILLALOBOS RAMIREZ	Inspector	1.01.8410.252	SURA	SURA	PORVENIR
4	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	Profesional en Salud Ocupacional	1.121.876.693	SURA	SANITAS	PORVENIR
5	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	Topógrafo	79.065.320	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR
6	DANIEL FERNANDO ZAPATA ROJAS	Cadenero	1.121.902.636	SURA	SANITAS	PROTECCION

Pagadas EL 07 de marzo de 2023, con pago a EPS ($ 936.400), AFP ($1.590.400), ARL ($ 602.600, CCF ($126.400) correspondiente al mes de Febrero de 2023.

Esta certificación forma parte integral del Acta Parcial No. 1 del mes de marzo de 2023, presentada al INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO - IMDER, para su correspondiente pago según lo pactado contractualmente.

Se expide el día 21 de abril de 2023, con destino a la carpeta contractual.

ALVARO PATIÑO MONTOYA
SUPERVISOR

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
NOVIEMBRE 2022

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1794232881	9443703536	I	2022/12/19	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$638,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES							X											230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$638,300
Total	Afiliados(1)																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$638,300

2022/12/05 10:25 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1794232881	9443703536	I	2022/12/19	2022/12/05	BANCOLOMBIA	0	$638,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODI	NIT	DV	AFILIA O	LOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$0	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$638,300	$0	$0	$638,300

2022/12/05 10:25 AM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 9443879951

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9443879951

Identificación del contribuyente: 191.107.161.67

Concepto: CC

Razón Social: 7172871

Fecha y hora de la transacción: Lunes 12 de Diciembre de 2022 09:18:00 AM

Nro. de comprobante: 0000015703

Valor pagado: $ 1,111,800.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	1	17/11/2022	63345714	TOTAL A PAGAR	
					$877,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	371.300	0		0		0	0	0	0	371.300	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	475.200	0	0	0	0	0	0		475.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.100				31.100	0	0	31.100			311	31.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	371.300	371.300
Pensión	1	475.200	475.200
Riesgos Laborales	1	31.100	31.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	877.600	877.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO


DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	17/11/2022	63345714	TOTAL A PAGAR	
					$877,600	


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Dualidad	Extranjero	Cotiz. exterior	Reconocido	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	59	0			X																	25-14	2,970,000	475,200	0	0	0	0	EPS005	2,970,000	371,300	14-11	2,970,000	2	31,100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

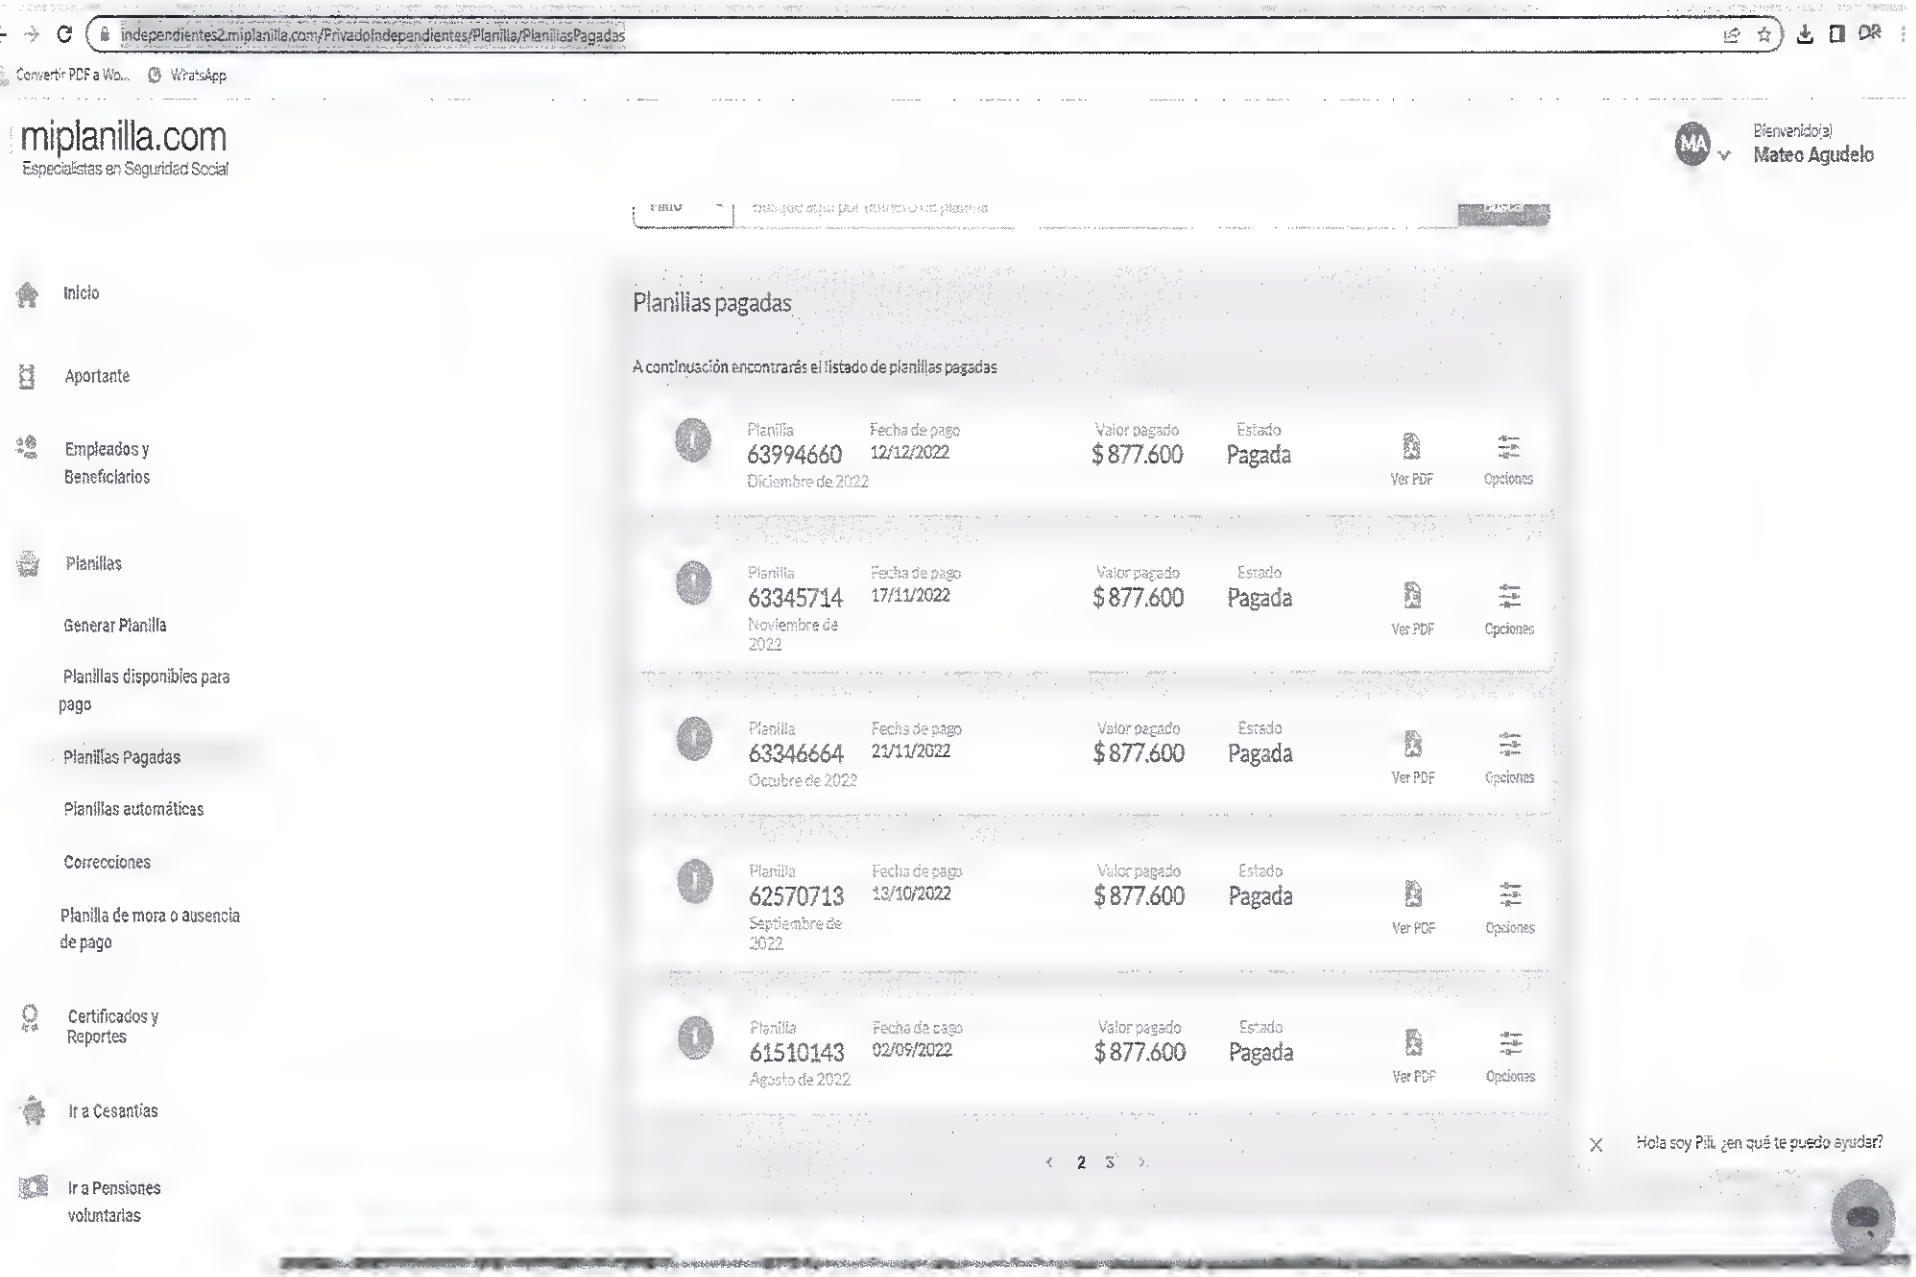
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
MA
Bienvenido(a)
Mateo Agudelo
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63994660 Diciembre de 2022
Fecha de pago 12/12/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63345714 Noviembre de 2022
Fecha de pago 17/11/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63346664 Octubre de 2022
Fecha de pago 21/11/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62570713 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61510143 Agosto de 2022
Fecha de pago 02/09/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
2
3
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

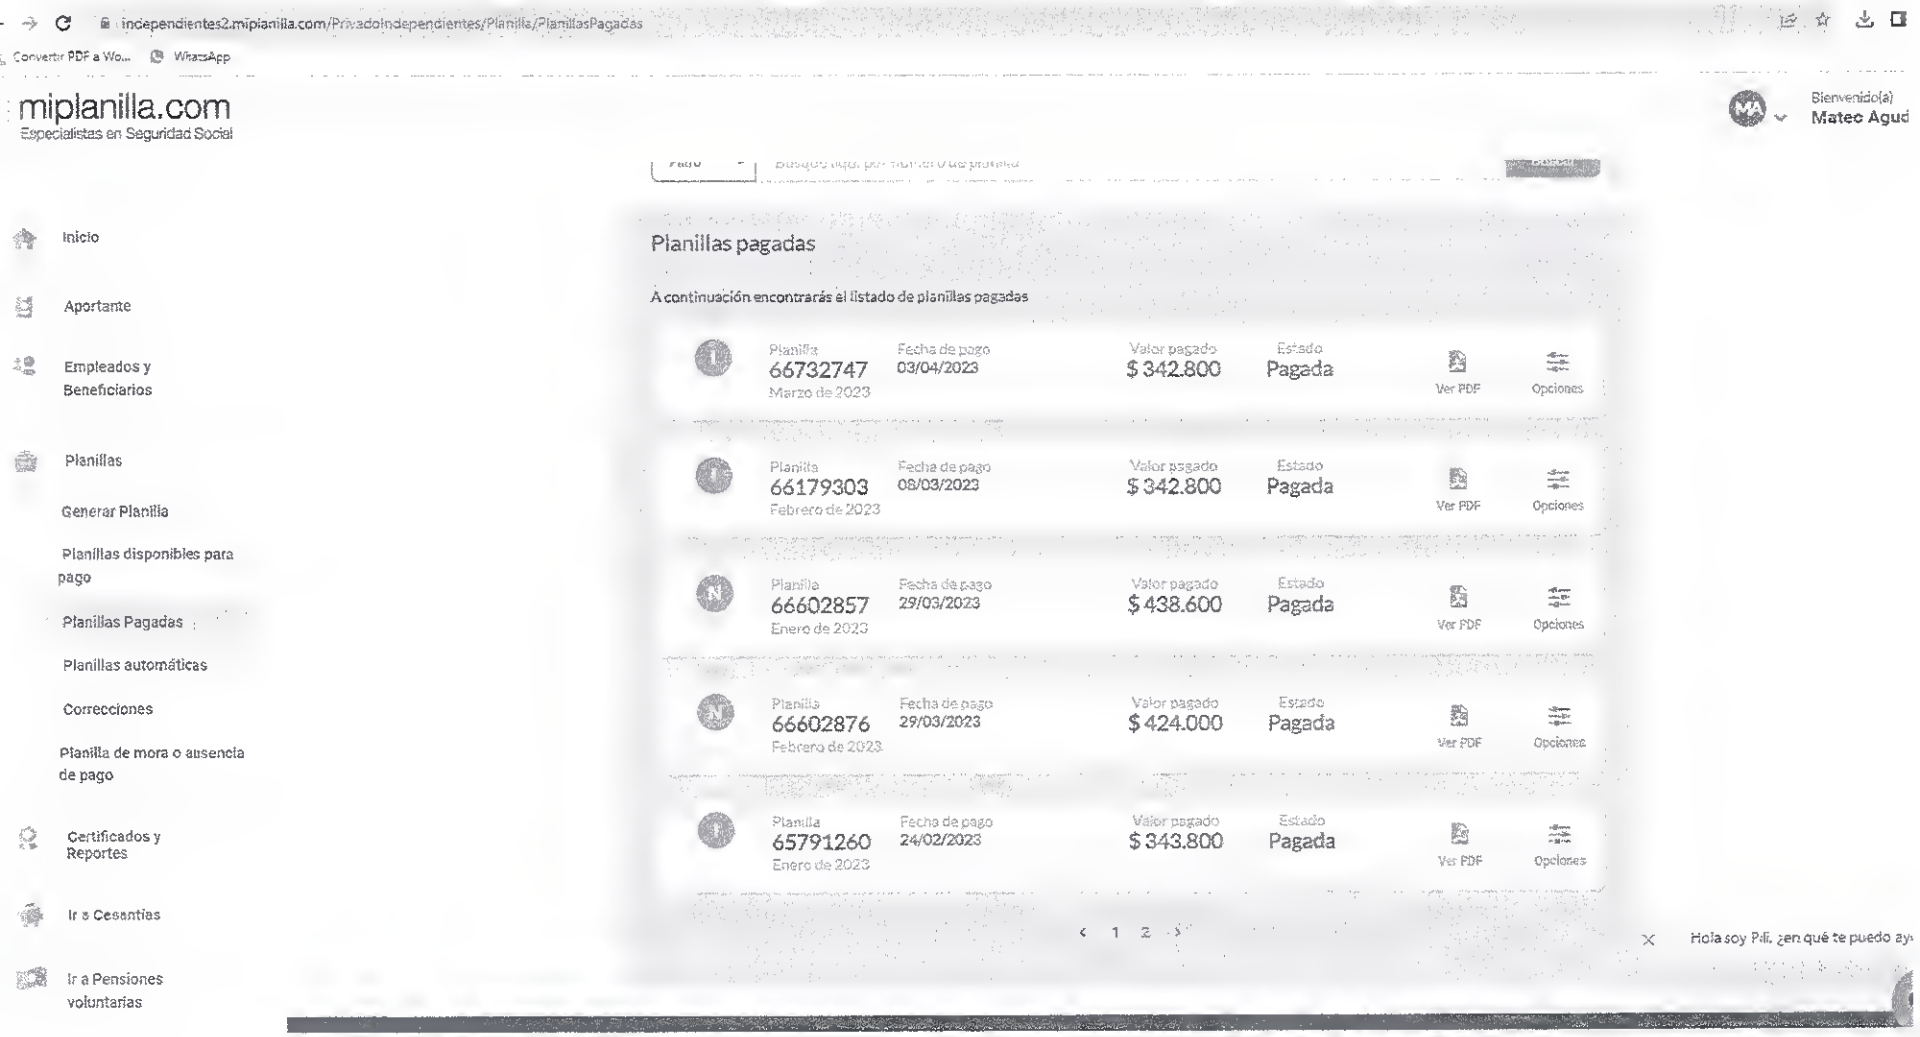
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Mateo Agud
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 66732747 Marzo de 2023
Fecha de pago 03/04/2023
Valor pagado $ 342.800
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 66179303 Febrero de 2023
Fecha de pago 08/03/2023
Valor pagado $ 342.800
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 66602857 Enero de 2023
Fecha de pago 29/03/2023
Valor pagado $ 438.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 66602876 Febrero de 2023
Fecha de pago 29/03/2023
Valor pagado $ 424.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 65791260 Enero de 2023
Fecha de pago 24/02/2023
Valor pagado $ 343.800
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
1 2
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ay

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1820908277	9444362942	I	2022/12/14	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	5	$286.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	X																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total Afiliados(1)																							$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$285,000

2022/12/19 03:38 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-11	1820908277	9444362942	I	2022/12/14	2022/12/19	BANCO DAVIVIENDA	5	$286.600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$900	$0	$160,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$900	$0	$160,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$700	$0	$125,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$125,000	$700	$0	$125,700
TOTAL				1	$285,000	$1,600	$0	$286,600

2022/12/19 03:38 PM

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS
No. Identificación: CC1121876693
Dirección: CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA
Telefono: 3167531478
Correo: jovaniruiz1121@gmail.com
Ciudad: VILLAVICENCIO
Número de Planilla: 8363784249

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS
Tipo y número de identificación	CC1121876693
Número de planilla	8363784249
Fecha pago	2022-12-09
Número de autorización pago	45489850
Banco	1023


Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2022
Número de Administradoras	2
Total Pagado	285000
Total Intereses de Mora	0


CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
230301	Porvenir	160000	1
EPS005	Sanitas EPS	125000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1121876693
APELLIDOS Y NOMBRES: JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	230301	1000000	1000000	0	0	125000	0	160000	0	0	0
EPS005	230301	1000000	1000000	0	0	125000	0	160000	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

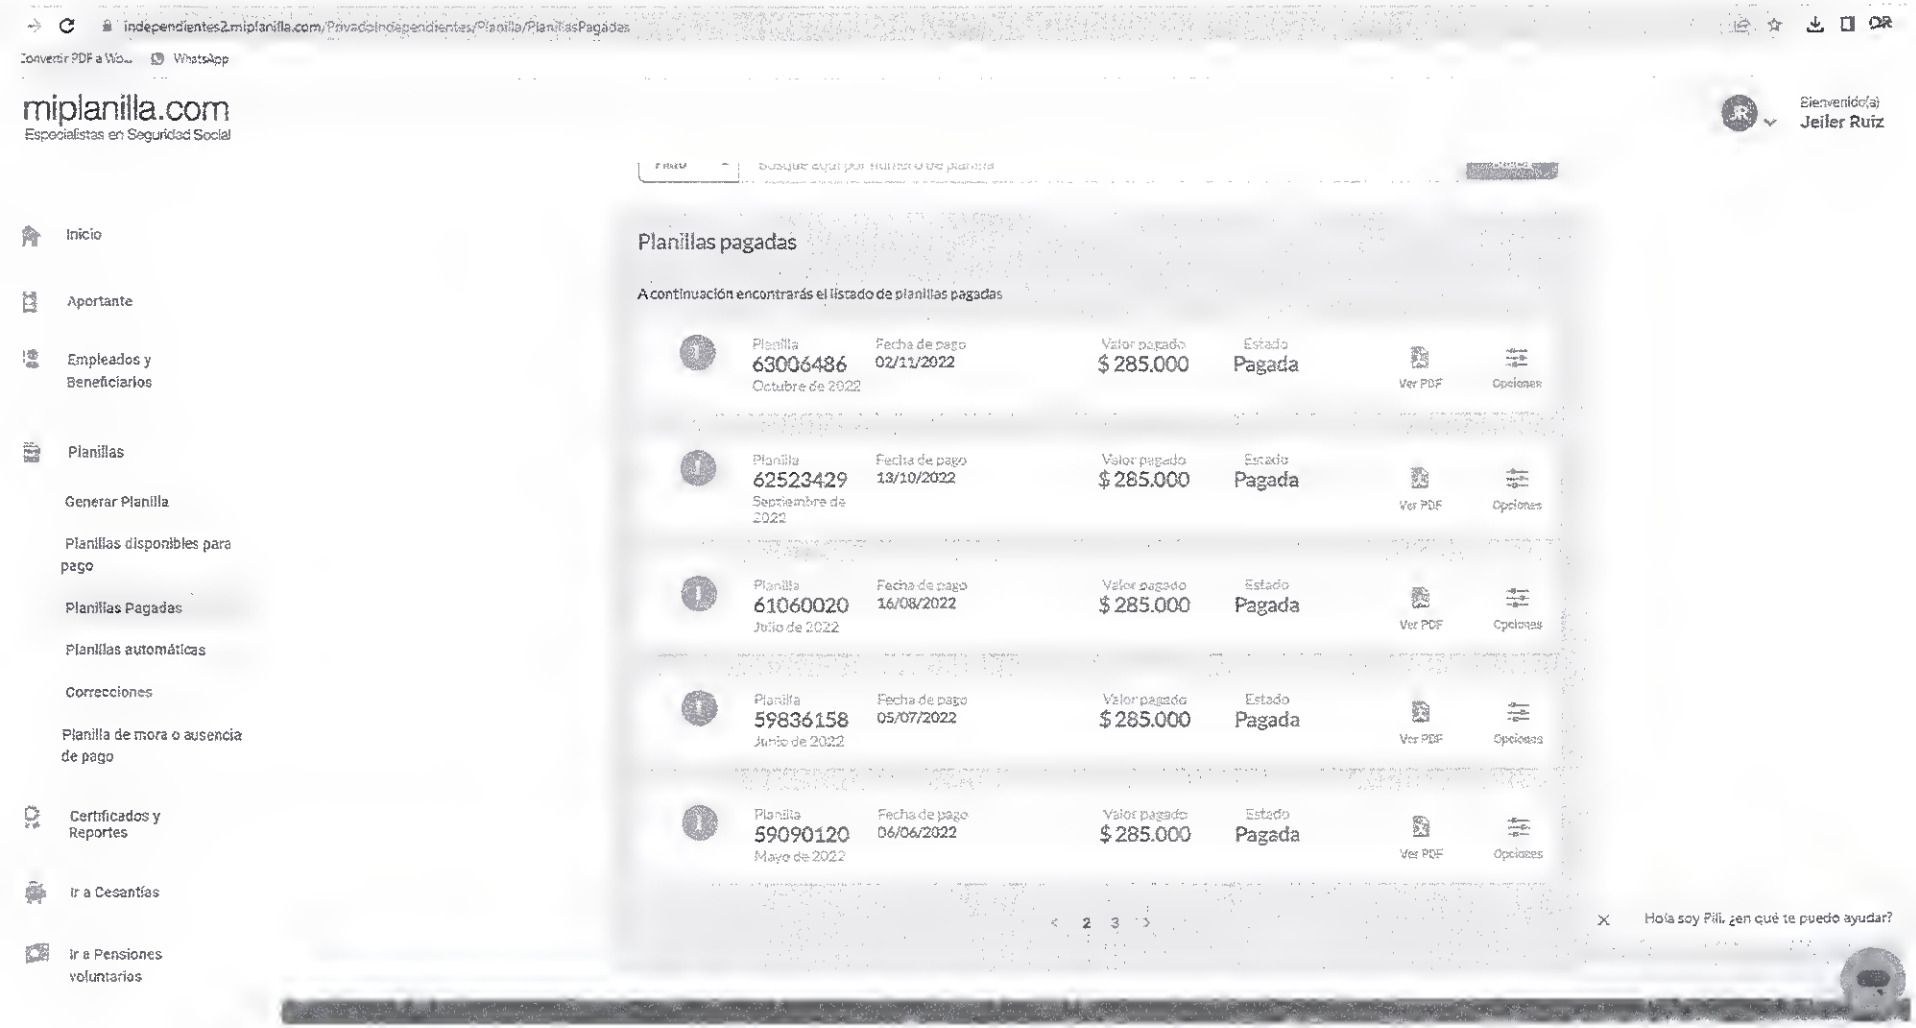
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63006486 Octubre de 2022
Fecha de pago 02/11/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62523429 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61060020 Julio de 2022
Fecha de pago 16/08/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59836158 Junio de 2022
Fecha de pago 05/07/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59090120 Mayo de 2022
Fecha de pago 06/06/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
< 2 3 >
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

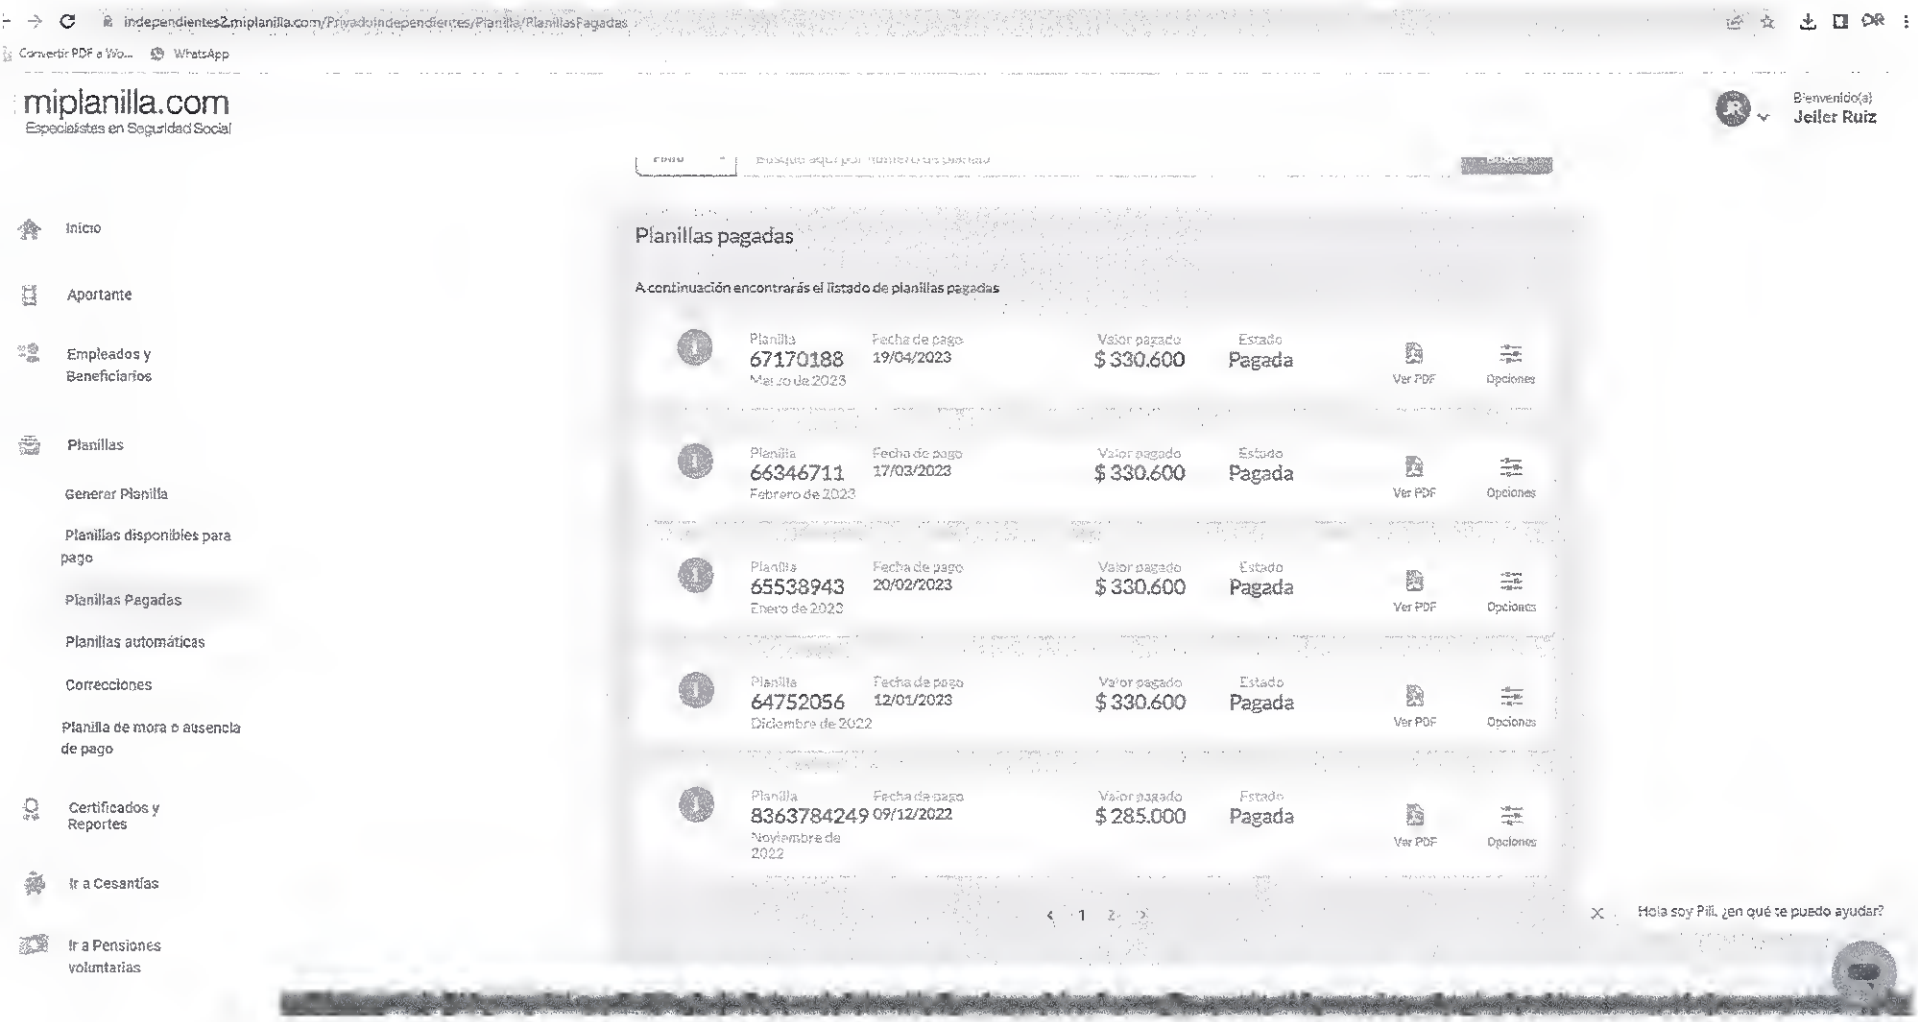
independientes2.miplanilla.com/Privado/Independientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 67170188 Marzo de 2023 | Fecha de pago 19/04/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 66346711 Febrero de 2023 | Fecha de pago 17/03/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 65538943 Enero de 2023 | Fecha de pago 20/02/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 64752056 Diciembre de 2022 | Fecha de pago 12/01/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 8363784249 Noviembre de 2022 | Fecha de pago 09/12/2022 | Valor pagado $ 285.000 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
1 2
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172871-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ	CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
2022-12	2022-11	E		63744270	TOTAL A PAGAR	
					$1.856.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	4

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160.000	0	0	0	0	0	0		160.000	1
230301	Porvenir	800224808-3	648.000	0	0	0	0	0	0		648.000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	354.800				354.800	0	0	354.800			3.548	354.800	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	252.000	0	0	252.000	6

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	252.000	252.000
Pensión	2	1.008.000	1.008.000
Riesgos Laborales	1	354.800	354.800
CCF	1	252.000	252.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1.866.800	1.866.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172871-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ	CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
2022-12	2022-11	E		63744270	TOTAL A PAGAR	
					$1,865,800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121876893	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121902219	PRIETO ALMANZA HENRY JEYSSON	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121908352	REY HERNANDEZ LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121932790	MOLINA VELASQUEZ LAURA VANESA	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	30083309	GAMBOA ALCANTARA INGRID CAROLINA	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	52368533	ABRIL RIAÑO LUZ NERY	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,680	CCF34	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1820296709

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
19/12/2022

Número de aprobación
00296709

Dirección IP
191.107.185.82

Valor transacción
$ 2.101.300,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.107.185.82	NIT	901199491

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	23/12/2022	64287234	$60.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	60.400				60.400	1	100	60.500			604	60.500	2

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	60.400	60.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	60.400	60.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 2 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-11	2022-11	Y	23/12/2022	64287234	$60,500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Residente	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10184**0252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	58	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	433,334	5	30,200		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121875693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	433,334	5	30,200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 64287234

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 191.107.226.6

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Viernes 23 de Diciembre de 2022 12:53:01 PM

Nro. de comprobante: 0000051106

Valor pagado: $ 60,500.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	I	28/12/2022	64373020	TOTAL A PAGAR	
					$126.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	54.200	0		0		0	22	1.300	0	55.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	69.400	0	0	0	0	22	1.700	0	71.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	54.200	55.500
Pensión	1	69.400	71.100
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	123.600	126.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ		cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	I	28/12/2022	64373020	$126.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colegiado	Activo	Pensionado	Cobro Asistido	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79065320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	3	0			N	X	X														230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS002	433.334	54.200		0		0		0	0	0	0	0	0

PAGADA

NO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 64373020

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 186.119.209.45

Concepto: CC

Razón Social: 79065320

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 28 de Diciembre de 2022 09:11:02 AM

Nro. de comprobante: 0000020512

Valor pagado: $ 126,600.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901189491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-11	2022-11	Y	28/12/2022	64374015	TOTAL A PAGAR	
					$30.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	30.200				30.200	6	200	30.400			302	30.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	30.200	30.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	30.200	30.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6835729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-11	2022-11	Y	28/12/2022	64374015	$30.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Extranjero	Cotiza Exterior	Exonerado	IRO	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79060320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	SI	0			N	X	X																0	0	0	0	0			0	0	14-1	433.334	V	30.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: OSCAR FELIPE RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 67307566

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.253

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Martes 25 de Abril de 2023 04:02:09 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 263,300.00

Cuenta: *******2938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
DICIEMBRE 2022

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1856550629	9444699766	E	2023/01/18	2023/01/10	BANCOLOMBIA	0	$638,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	fng	ret	tde	tve	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$638,300
Total	Afiliados(1)																					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$638,300

2023/01/10 02:25 PM

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1856550629	9444699766	I	2023/01/18	2023/01/10	BANCOLOMBIA	0	$638,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODI	NIT	DV	AFILIADOS	ALOR LIQUIDADO	ERESES MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,300	$0	$0	$125,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$0	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$638,300	$0	$0	$638,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1863780490	9445476910	N	2023/01/18	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$1,111,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES								A										230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS005	30	($1,800,000)	($225,000)		0	$0	$0	14-11	30	($1,800,000)	($125,300)	0	$0	$0	No	($638,300)
2	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES								C	X									230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0	No	$1,750,100
Total	Afiliados(1)																					$3,000,000	$528,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,111,800

2023/01/14 12:54 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1863780490	944547691O	N	2023/01/18	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	$1,111,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	ALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$528,000	$0	$0	$528,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$0	$0	$208,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$208,800	$0	$0	$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$1,111,800	$0	$0	$1,111,800

2023/01/14 12:54 PM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 9445476910

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9445476910

Identificación del contribuyente: 191.107.170.236

Concepto: CC

Razón Social: 7172871

Fecha y hora de la transacción: Sábado 14 de Enero de 2023 12:52:04 PM

Nro. de comprobante: 0000024286

Valor pagado: $ 1,111,800.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107868552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-12	2022-12	I	12/12/2022	63994660	TOTAL A PAGAR	
					$877.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	371.300	0		0		0	0	0	0	371.300	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	475.200	0	0	0	0	0	0		475.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.100				31.100	0	0	31.100			311	31.100	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	371.300	371.300
Pensión	1	475.200	475.200
Riesgos Laborales	1	31.100	31.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	877.600	877.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO


DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	12/12/2022	63994660	$877,600	


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE											INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Salario	Integral	Extranjero	Cotizante Exterior	Residente	IRP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRL	DIAS COTIZADOS	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	59	0					X														30	25-14	2,970,000	475,200	0	0	0	0	EPS005	2,970,000	371,300	14-11	2,970,000	2	31,100			0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

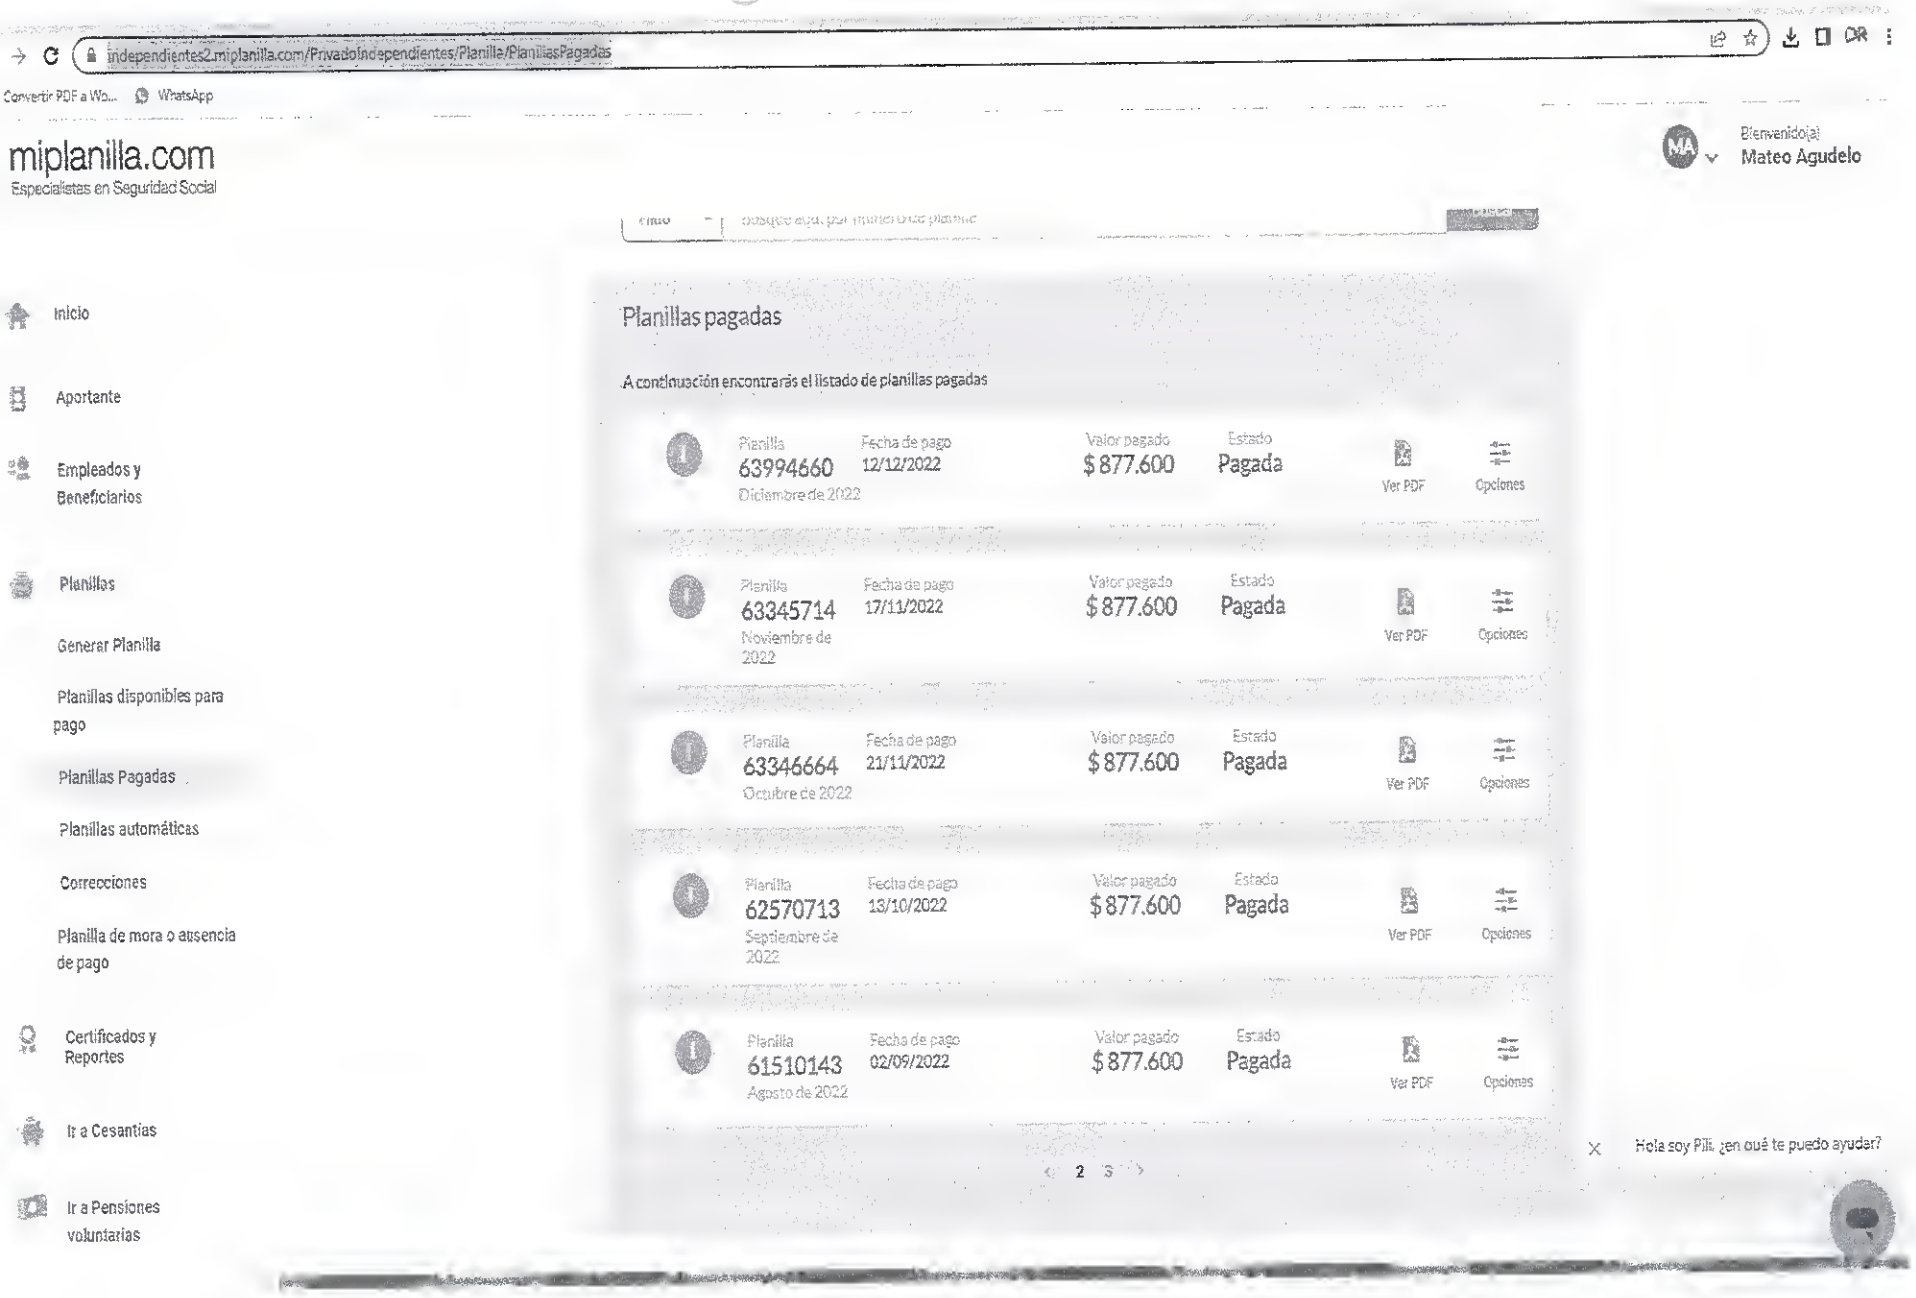
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planille/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)!
Mateo Agudelo
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63994660 Diciembre de 2022
Fecha de pago 12/12/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63345714 Noviembre de 2022
Fecha de pago 17/11/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63346664 Octubre de 2022
Fecha de pago 21/11/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62570713 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61510143 Agosto de 2022
Fecha de pago 02/09/2022
Valor pagado $ 877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
2 3
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

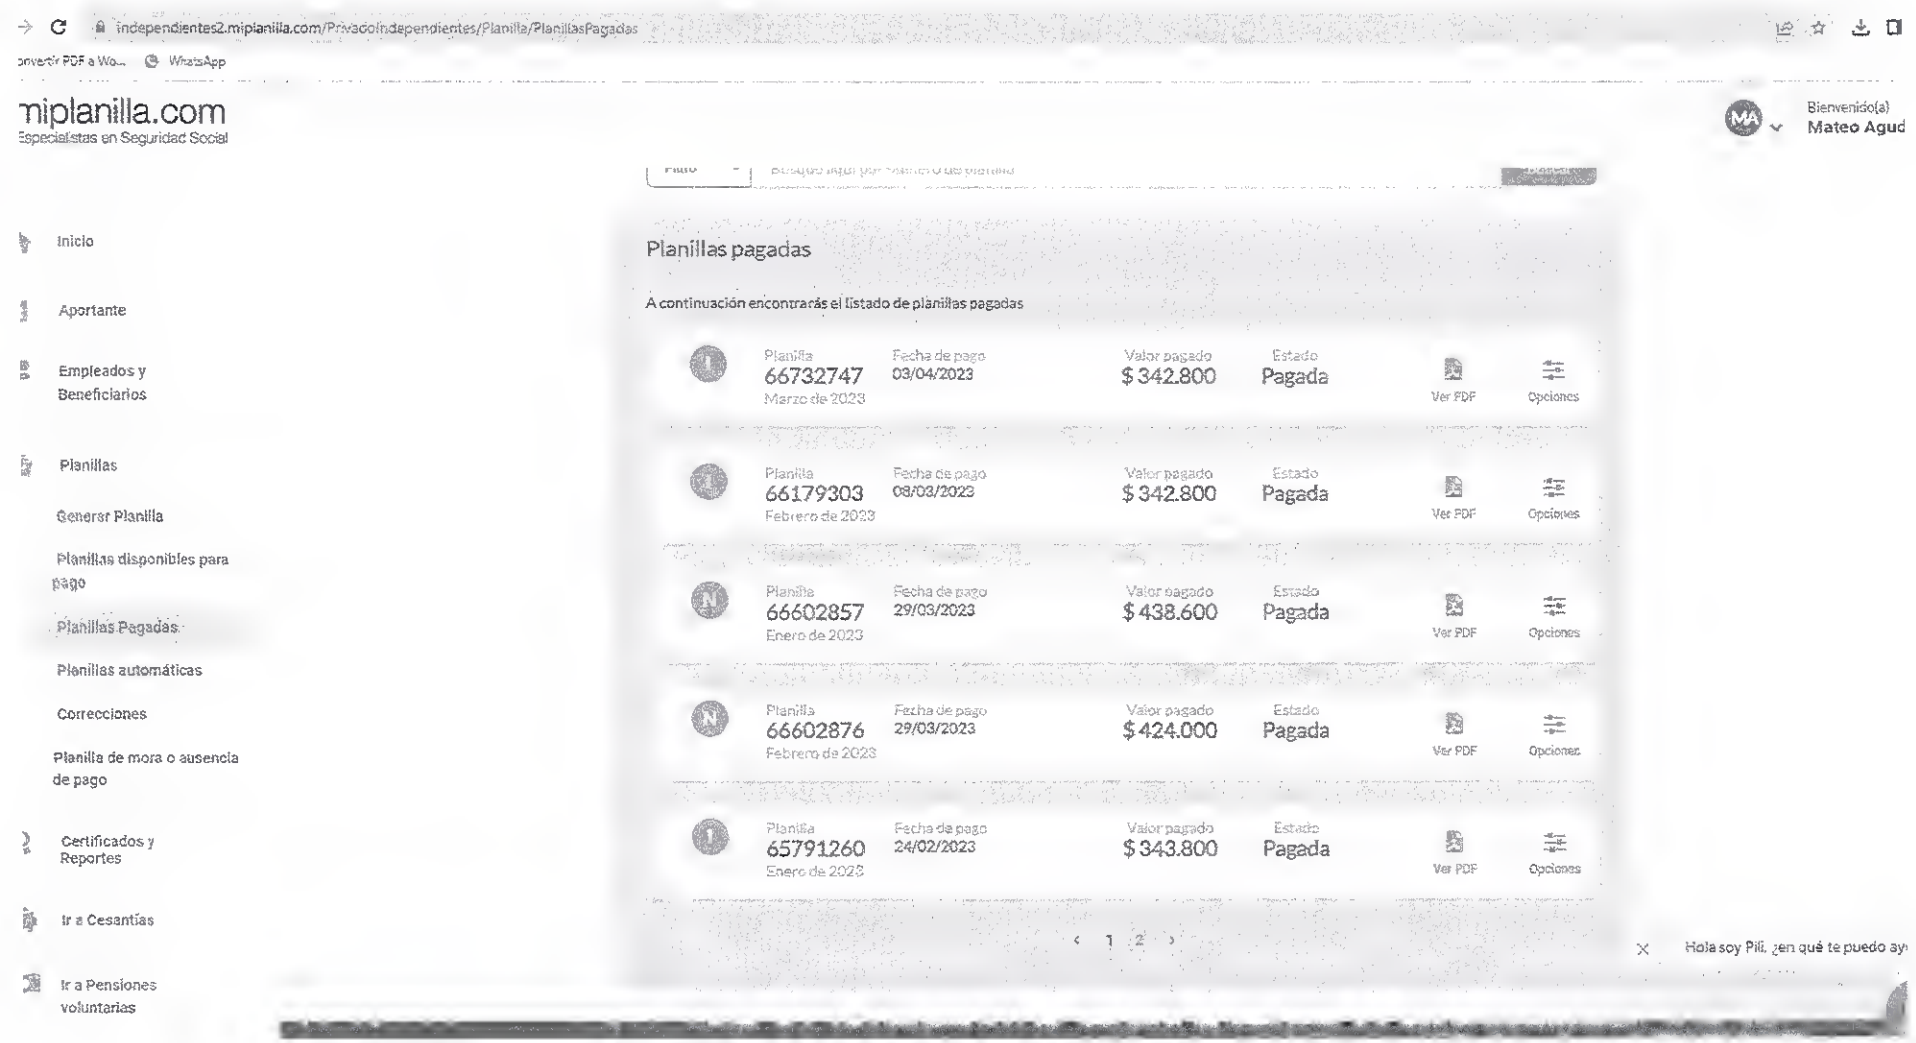
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Mateo Agud
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 66732747 Marzo de 2023 | Fecha de pago 03/04/2023 | Valor pagado $ 342.800 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 66179303 Febrero de 2023 | Fecha de pago 08/03/2023 | Valor pagado $ 342.800 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 66602857 Enero de 2023 | Fecha de pago 29/03/2023 | Valor pagado $ 438.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 66602876 Febrero de 2023 | Fecha de pago 29/03/2023 | Valor pagado $ 424.000 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 65791260 Enero de 2023 | Fecha de pago 24/02/2023 | Valor pagado $ 343.800 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
1 2
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ay

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1877162554	9444757506	I	2023/01/13	2023/01/23	BANCOLOMBIA	10	$288,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1018410252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO		X																230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$285,000
Total			Afiliados(1)																				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$285,000

2023/01/23 09:08 AM

aportes en línea

Pla a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018410252		VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 17 No 17-32	VILLAVICENCIO-META	6825287	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1877162554	9444757506	I	2023/01/13	2023/01/23	BANCOLOMBIA	10	$288.400

RESUMEN DE PAGO

RIES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	ALOR IQUIDADO	INTE ES MORA	SA DOS E INCAPACIDADES	VALOR A A AR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$1,900	$0	$161,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$1,900	$0	$161,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$1,500	$0	$126,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$125,000	$1,500	$0	$126,500
TOTAL				1	$285,000	$3,400	$0	$288,400

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 9444757506

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9444757506

Identificación del contribuyente: 186.119.214.1

Concepto: CC

Razón Social: 1018410252

Fecha y hora de la transacción: Lunes 23 de Enero de 2023 09:08:08 AM

Nro. de comprobante: 0000037474

Valor pagado: $ 288,400.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	3167531478	jovaniruiz1121@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	12/01/2023	84752056	$330.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de FGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANDRA	3167531478	jovaniruiz1121@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	1	12/01/2023	64752056	$330,600	


DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Extranjero	Residente	Colombiano en el Exterior	Primera vez	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	INS	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	3	0			N	X	X																230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	145,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 67170188 Marzo de 2023 | Fecha de pago 19/04/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 66346711 Febrero de 2023 | Fecha de pago 17/03/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 65538943 Enero de 2023 | Fecha de pago 20/02/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 64752056 Diciembre de 2022 | Fecha de pago 12/01/2023 | Valor pagado $ 330.600 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
Planilla 8363784249 Noviembre de 2022 | Fecha de pago 09/12/2022 | Valor pagado $ 285.000 | Estado Pagada | Ver PDF | Opciones
1 2
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

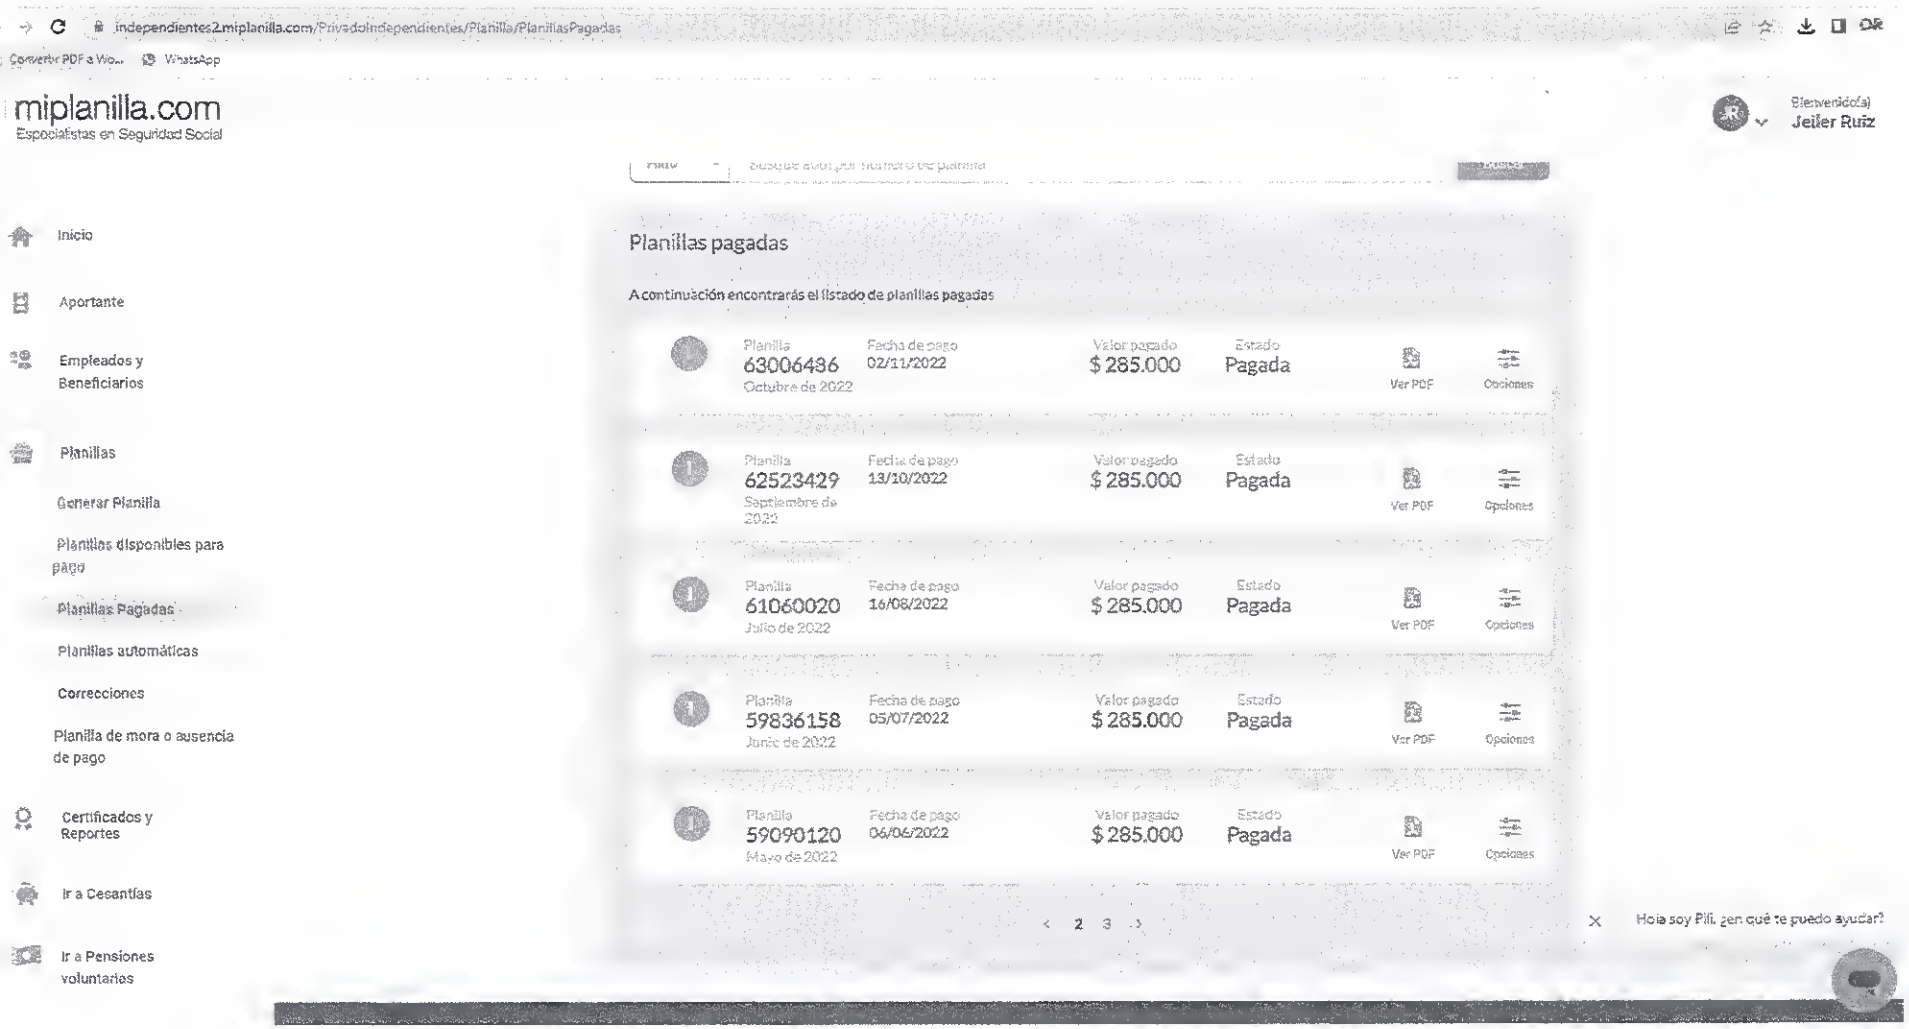
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63006436 Octubre de 2022
Fecha de pago 02/11/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62523429 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61060020 Julio de 2022
Fecha de pago 16/08/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59836158 Junio de 2022
Fecha de pago 05/07/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59090120 Mayo de 2022
Fecha de pago 06/06/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
2 3
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172671-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ		CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	16/01/2023	64355505	$1,866,800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	80,000	0		0		0	0	0	0	80,000	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	172,000	0		0		0	0	0	0	172,000	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	160,000	0	0	0	0	0	0		160,000	1
230301	Porvenir	800224808-6	848,000	0	0	0	0	0	0		848,000	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	354,800				354,800	0	0	354,800			3,548	354,800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	252,000	0	0	252,000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	252,000	252,000
Pensión	2	1,008,000	1,008,000
Riesgos Laborales	1	354,800	354,800
CCF	1	252,000	252,000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	1,866,800	1,866,800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172871-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ		CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	16/01/2023	64355505	$1,868,800	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Residente	IGE	IRP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Tipo de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121878893	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121902219	PRIETO ALMANZA HENRY JEYSSON	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121906362	REY HERNANDEZ LUIS ANTONIO	1	0			S																	230201	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	1121952750	MOLINA VELASQUEZ LAURA VANESA	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS005	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	30083309	GAMBOA ALCANTARA INGRID CAROLINA	1	0			S																	230301	1,000,000	160,000	0	0	0	0	EPS002	1,000,000	40,000	14-11	1,000,000	5	69,600	CCF34	1,000,000	40,000	0	0	0	0	0
CC	52358633	ABRIL RIAÑO LUZ MERY	1	0			S																	230301	1,300,000	208,000	0	0	0	0	EPS005	1,300,000	52,000	14-11	1,300,000	1	6,800	CCF34	1,300,000	52,000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	I	08/02/2023	65234850	$343,500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	34	5.700	0	150.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	34	7.200	0	192.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	150.700
Pensión	1	185.600	192.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	343.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-12	2022-12	I	08/02/2023	65234850	TOTAL A PAGAR	
					$343,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Exterior	Extranjero	Cotizante exterior	Extranjero	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Aporte	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79065320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	X																					230301	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS002	1,160,000	145,000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	Y		64379026	$208.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	208.800				208.800	0	0	208.800			2.088	208.800	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	208.800	208.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	208.800	208.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				3	0
2022-12	2022-12	Y		64379026	TOTAL A PAGAR	
					$208,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Sueldo	Pensionado	Estudiante	Extranjero no obligado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10184*0252	VILLALOBOS RAMIREZ HERNAN MAURICIO		59	0			X																0	0	0	0	0			0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI		59	0			X																0	0	0	0	0			0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	79065320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO		59	0			X	X															0	0	0	0	0			0	0	14-11	1,000,000	5	69,600		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 64379026

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 191.107.214.56

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Lunes 16 de Enero de 2023 10:47:06 AM

Nro. de comprobante: 0000053031

Valor pagado: $ 208,800.00

Cuenta: *******0950

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
2023-01	2022-12	E	26/01/2023	64712317	TOTAL A PAGAR	
					$1.694.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	3	700	0	200.700	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	72.000	0		0		0	3	300	0	72.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	608.000	0	0	0	0	3	2.100	0	610.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	160.000	0	0	0	0	3	600	0	160.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	160.000	0	0	0	0	3	600	0	160.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	216.100				216.100	3	800	216.900			2.161	216.900	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	272.000	3	1.000	273.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	272.000	273.000
Pensión	3	928.000	931.300
Riesgos Laborales	1	216.100	216.900
CCF	1	272.000	273.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.688.100	1.694.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-01	2022-12	E	26/01/2023	64712817	$1.694.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en Exterior	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Corrección	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022344858	BARRERO GOMEZ DIANA MILENA	1	0			S	X															230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS017	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF34	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1121902636	ZAPATA ROJAS DANIEL FERNANDO	1	0			S	X															230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	5	69.500	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
3	CC	1123059421	BERNAL ESCOBAR JAXFELDER MEYLIN	1	0			S																230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
4	CC	40215785	JIMENEZ LUZ STELLA	1	0			S	X															25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
5	CC	7777094	RUIZ PABLO ENRIQUE	1	3			S	X																0	0	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
6	CC	86082697	REYES PARRA JUAN FERNANDO	1	0			S	X															230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	40.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF34	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1882880705

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
26/01/2023

Número de aprobación
00880705

Dirección IP
186.119.214.1

Valor transacción
$ 1.694.200,00

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
186.119.214.1	NIT	901199491

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-12	2022-12	Y	25/04/2023	87307639	TOTAL A PAGAR	
					$255.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	229,700				229,700	92	25,400	255,100			2,297	255,100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	229,700	255,100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	229,700	255,100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	8635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2022-12	2022-12	Y	25/04/2023	57307639	$255.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3.300.000	5	229.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: OSCAR FELIPE RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 67307639

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.253

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Martes 25 de Abril de 2023 04:05:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 255,100.00

Cuenta: *******2938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 879 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
FEBRERO 2023

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1956629372	9447628659	I	2023/03/16	2023/03/07	BANCOLOMBIA	0	$638,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$638,300
Total	Afiliados(1)																						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$125,300		$0	$0		$638,300

2023/03/07 08:36 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1956629372	9447628659	I	2023/03/16	2023/03/07	BANCOLOMBIA	0	$638.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
				1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$125,300	$0	$0	$125,300
				1	$125,300	$0	$0	$125,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
				1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$638,300	$0	$0	$638,300

2023/03/07 08:36 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1971131383	9448109564	N	2023/03/16	2023/03/15	BANCOLOMBIA	0	$1,111,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES								A										230301	30	($1,800,000)	($288,000)	EPS005	30	($1,800,000)	($225,000)		0	$0	$0	14-11	30	($1,800,000)	($125,300)	0	$0	$0	No	($638,300)
2	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES								C	X									230301	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0	No	$1,750,100
Total	Afiliados(1)																						$3,000,000	$528,000			$3,000,000	$375,000			$0	$0			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,111,800

2023/03/15 03:24 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1971131383	9448109564	N	2023/03/16	2023/03/15	BANCOLOMBIA	0	$1,111,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$528,000	$0	$0	$528,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$528,000	$0	$0	$528,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$0	$0	$208,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$208,800	$0	$0	$208,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				**1**	**$1,111,800**	**$0**	**$0**	**$1,111,800**

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: OSCAR FELIPE RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 9448109564

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9448109564

Identificación del contribuyente: 191.107.164.144

Concepto: CC

Razón Social: 7172871

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 15 de Marzo de 2023 11:39:53 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,111,800.00

Cuenta: *******2938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	1	08/03/2023	66179303	$342.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	12.200				12.200	0	0	12.200			122	12.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	12.200	12.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	342.800	342.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	1	08/03/2023	66179303	$342.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Subtipo	Estampilla	Cotiza exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COMISIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86076792	AGUDELO VARELA MATEO	59	0			N																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	2	12.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86076792	MATEO AGUDELO VARELA	Cra. 39 N.14-04 Etapa 7 Barrio Esperanza	3107888552	ingcivilmateo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
66179303	08/03/2023				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	N	29/03/2023	66502876	$424.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	177.800	0		0		0	7	1.600	0	179.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.600	0	0	0	0	7	2.000	0	229.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	14.800				14.800	7	200	15.000			148	15.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES


Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				


TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	177.800	179.400
Pensión	1	227.600	229.600
Riesgos Laborales	1	14.800	15.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	420.200	424.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

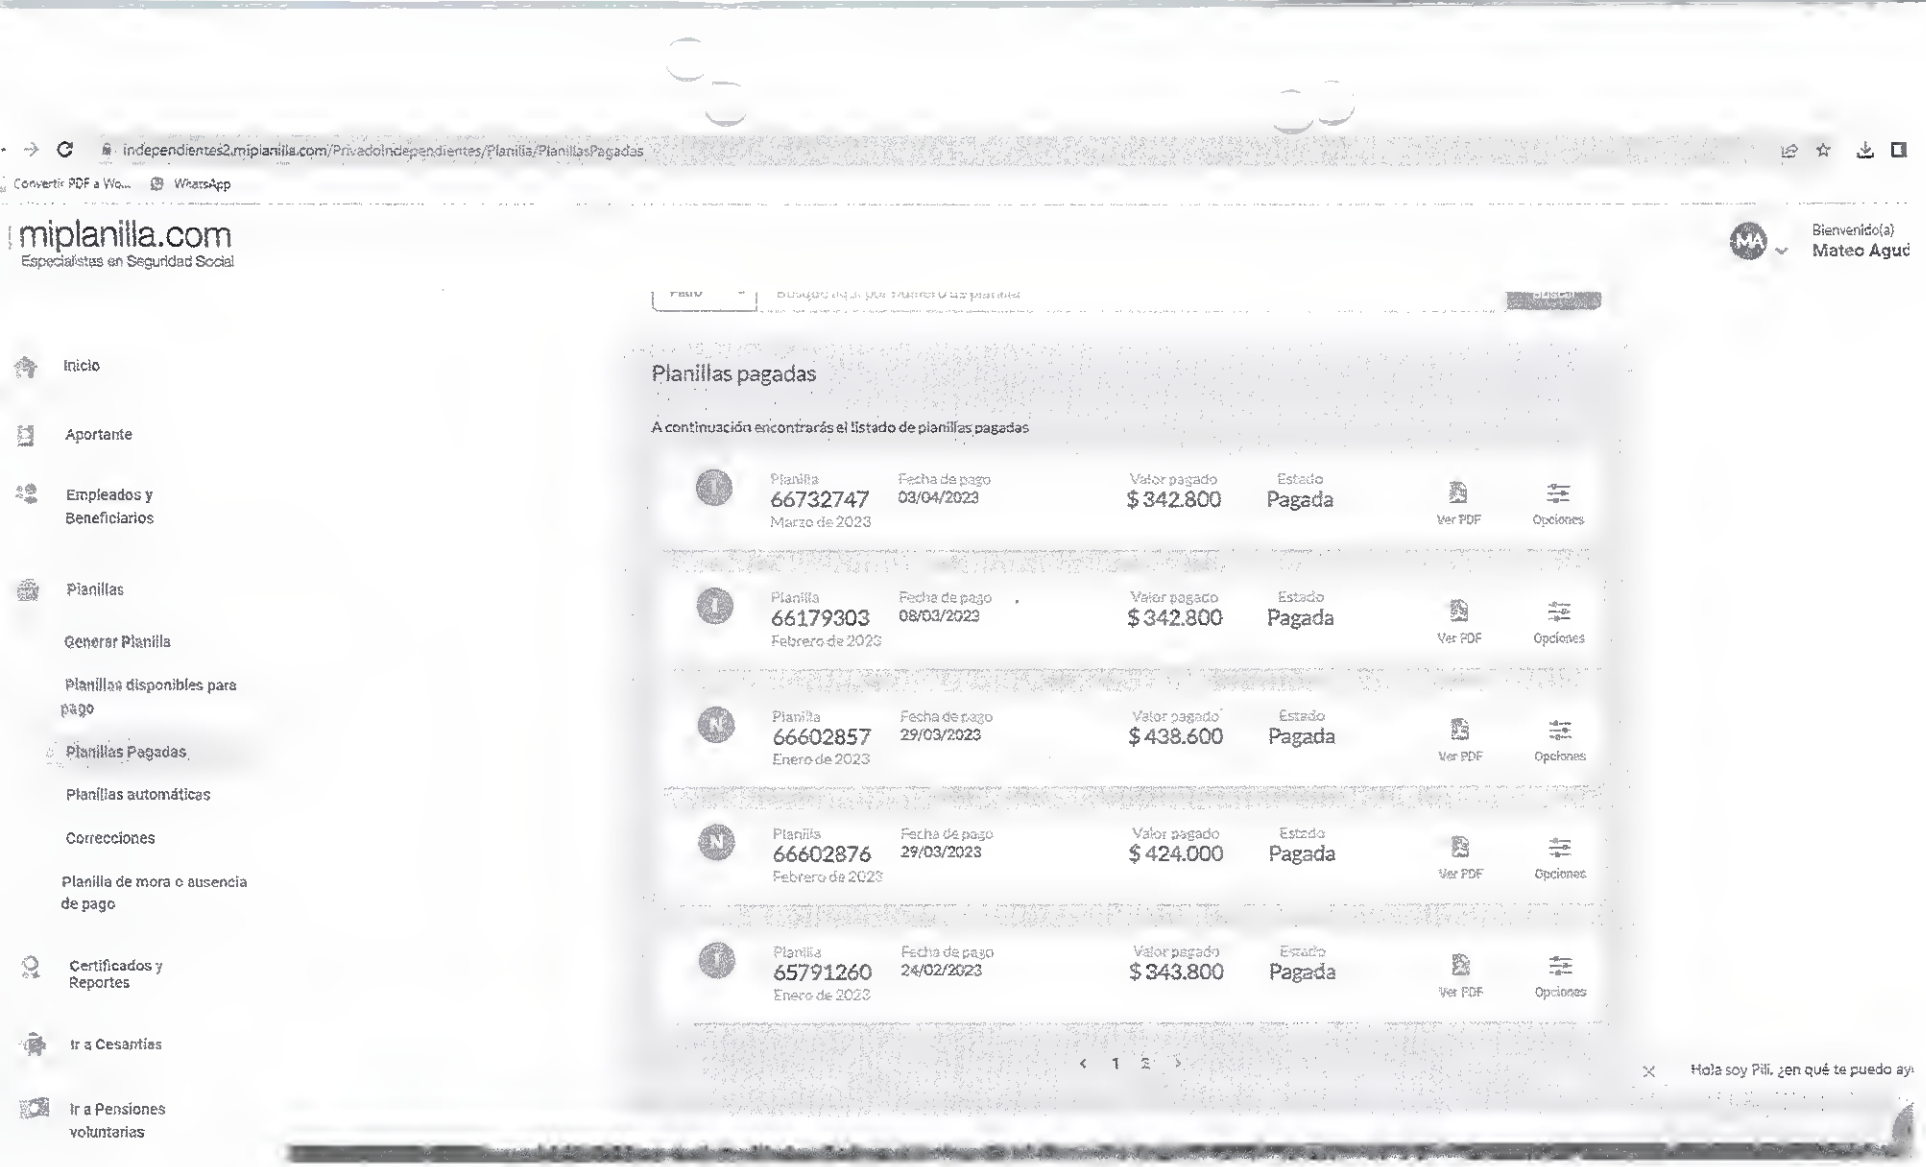
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Mateo Agud
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 66732747 Marzo de 2023 Fecha de pago 03/04/2023 Valor pagado $ 342.800 Estado Pagada Ver PDF Opciones
Planilla 66179303 Febrero de 2023 Fecha de pago 08/03/2023 Valor pagado $ 342.800 Estado Pagada Ver PDF Opciones
Planilla 66602857 Enero de 2023 Fecha de pago 29/03/2023 Valor pagado $ 438.600 Estado Pagada Ver PDF Opciones
Planilla 66602876 Febrero de 2023 Fecha de pago 29/03/2023 Valor pagado $ 424.000 Estado Pagada Ver PDF Opciones
Planilla 65791260 Enero de 2023 Fecha de pago 24/02/2023 Valor pagado $ 343.800 Estado Pagada Ver PDF Opciones
1
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ay

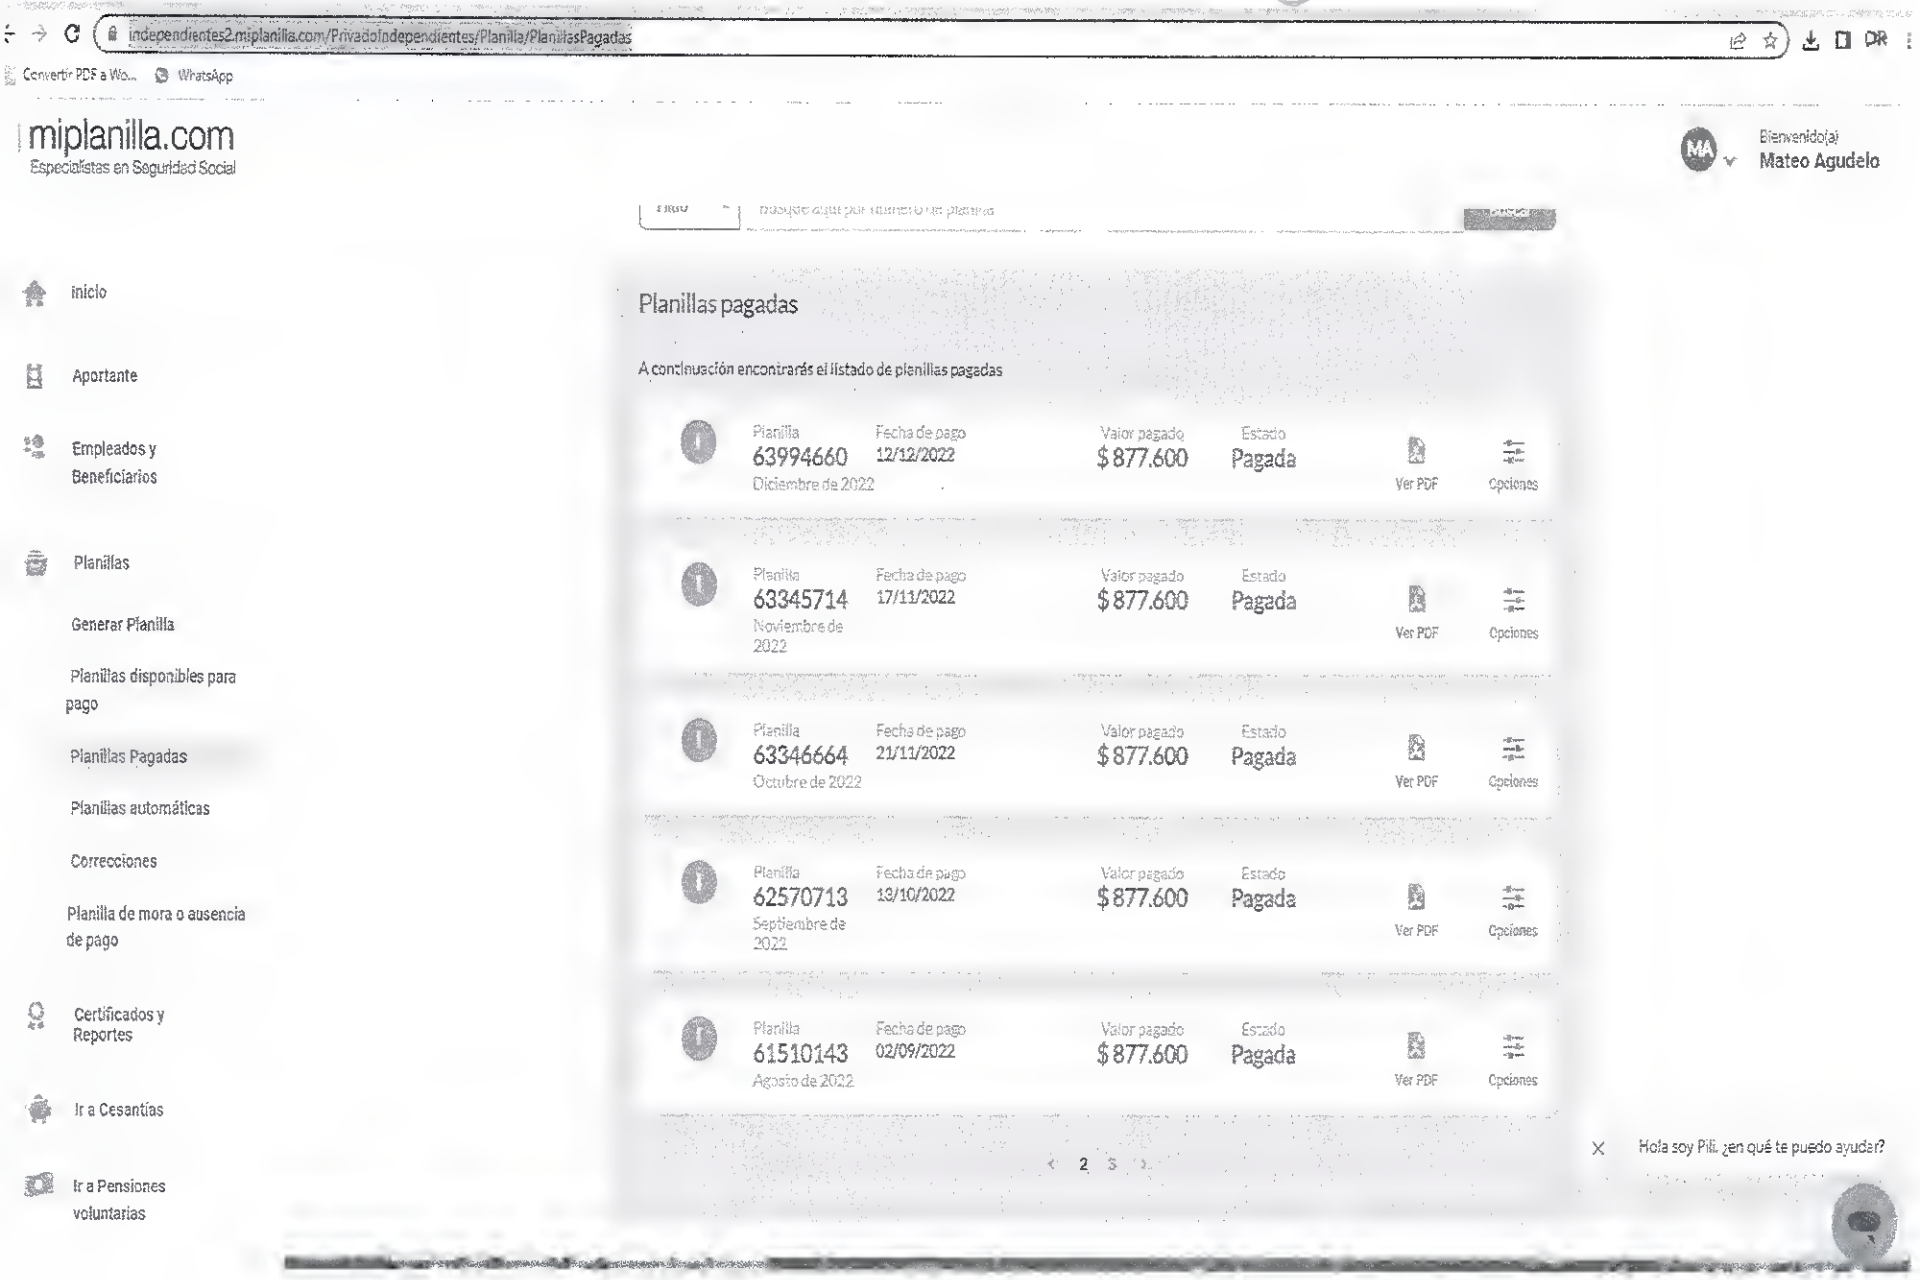
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Mateo Agudelo
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63994660 Diciembre de 2022
Fecha de pago 12/12/2022
Valor pagado $877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63345714 Noviembre de 2022
Fecha de pago 17/11/2022
Valor pagado $877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 63346664 Octubre de 2022
Fecha de pago 21/11/2022
Valor pagado $877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62570713 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61510143 Agosto de 2022
Fecha de pago 02/09/2022
Valor pagado $877.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
2 3
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **INTERCONDI SAS**, identificada con **NI** número **901199491**, aportó por el empleado **HERNAN MAURICIO VILLALOBOS RAMIREZ** identificado(a) con **CC** número **1018410252** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 02 - 2023 y 03 - 2023 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	INGRESO	RETIRO	TRASLADO DESDE OTRA EPS	TRASLADO A OTRA EPS	TRASLADO DESDE OTRA AFP	TRASLADO A OTRA AFP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC LR	VAC LP	VCT	IRP	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
14-11	ARL SURA	1														0		30	$2,000,000	0.06960	$139,200	$0	$0	Febrero - 2023	65957444	15/03/2023	Si
CCF34	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	1														0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Febrero - 2023	65957444	15/03/2023	Si
230301	Porvenir	1														0		30	$2,000,000	0.16000	$320,000	$0	$0	Febrero - 2023	65957444	15/03/2023	Si
EPS005	Sanitas EPS	1														0		30	$2,000,000	0.04000	$80,000	$0	$0	Marzo - 2023	65957444	15/03/2023	Si

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Marzode 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y		66351886	$242.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	242.400				242.400	0	0	242.400			2.424	242.400	3

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	242.400	242.400
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	242.400	242.400

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y		66351886	$242,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121876093	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,160,000	5	80,800		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	79065320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	59	0			N	X	X																0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,160,000	5	80,800		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	86081630	CASTRO SILVA ALVARO AUGUSTO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	1,160,000	5	80,800		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: OSCAR FELIPE RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 66351886

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.253

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Jueves 16 de Marzo de 2023 08:16:29 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 242,400.00

Cuenta: *******2938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS		CARRERA 10A NO 7A MILLANURA	3167531478	jovaniruiz1121@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	17/03/2023	66346711	$330,600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	145.000
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	330.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1121876693	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	CARRERA 10A NO 7A MI LLANURA	3167531478	jovaniruiz1121@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	17/03/2023	68346711	$330.600	


ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Extranjero	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121876693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	1	0			N	X	X															230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información


independientes2.miplanilla.com/Privado/Independientes/Planilla/PlanillasPagadas
Convertir PDF a Wo...
WhatsApp
miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 67170188 Marzo de 2023
Fecha de pago 19/04/2023
Valor pagado $ 330.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 66346711 Febrero de 2023
Fecha de pago 17/03/2023
Valor pagado $ 330.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 65538943 Enero de 2023
Fecha de pago 20/02/2023
Valor pagado $ 330.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 64752056 Diciembre de 2022
Fecha de pago 12/01/2023
Valor pagado $ 330.600
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 8363784249 Noviembre de 2022
Fecha de pago 09/12/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
1 2
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

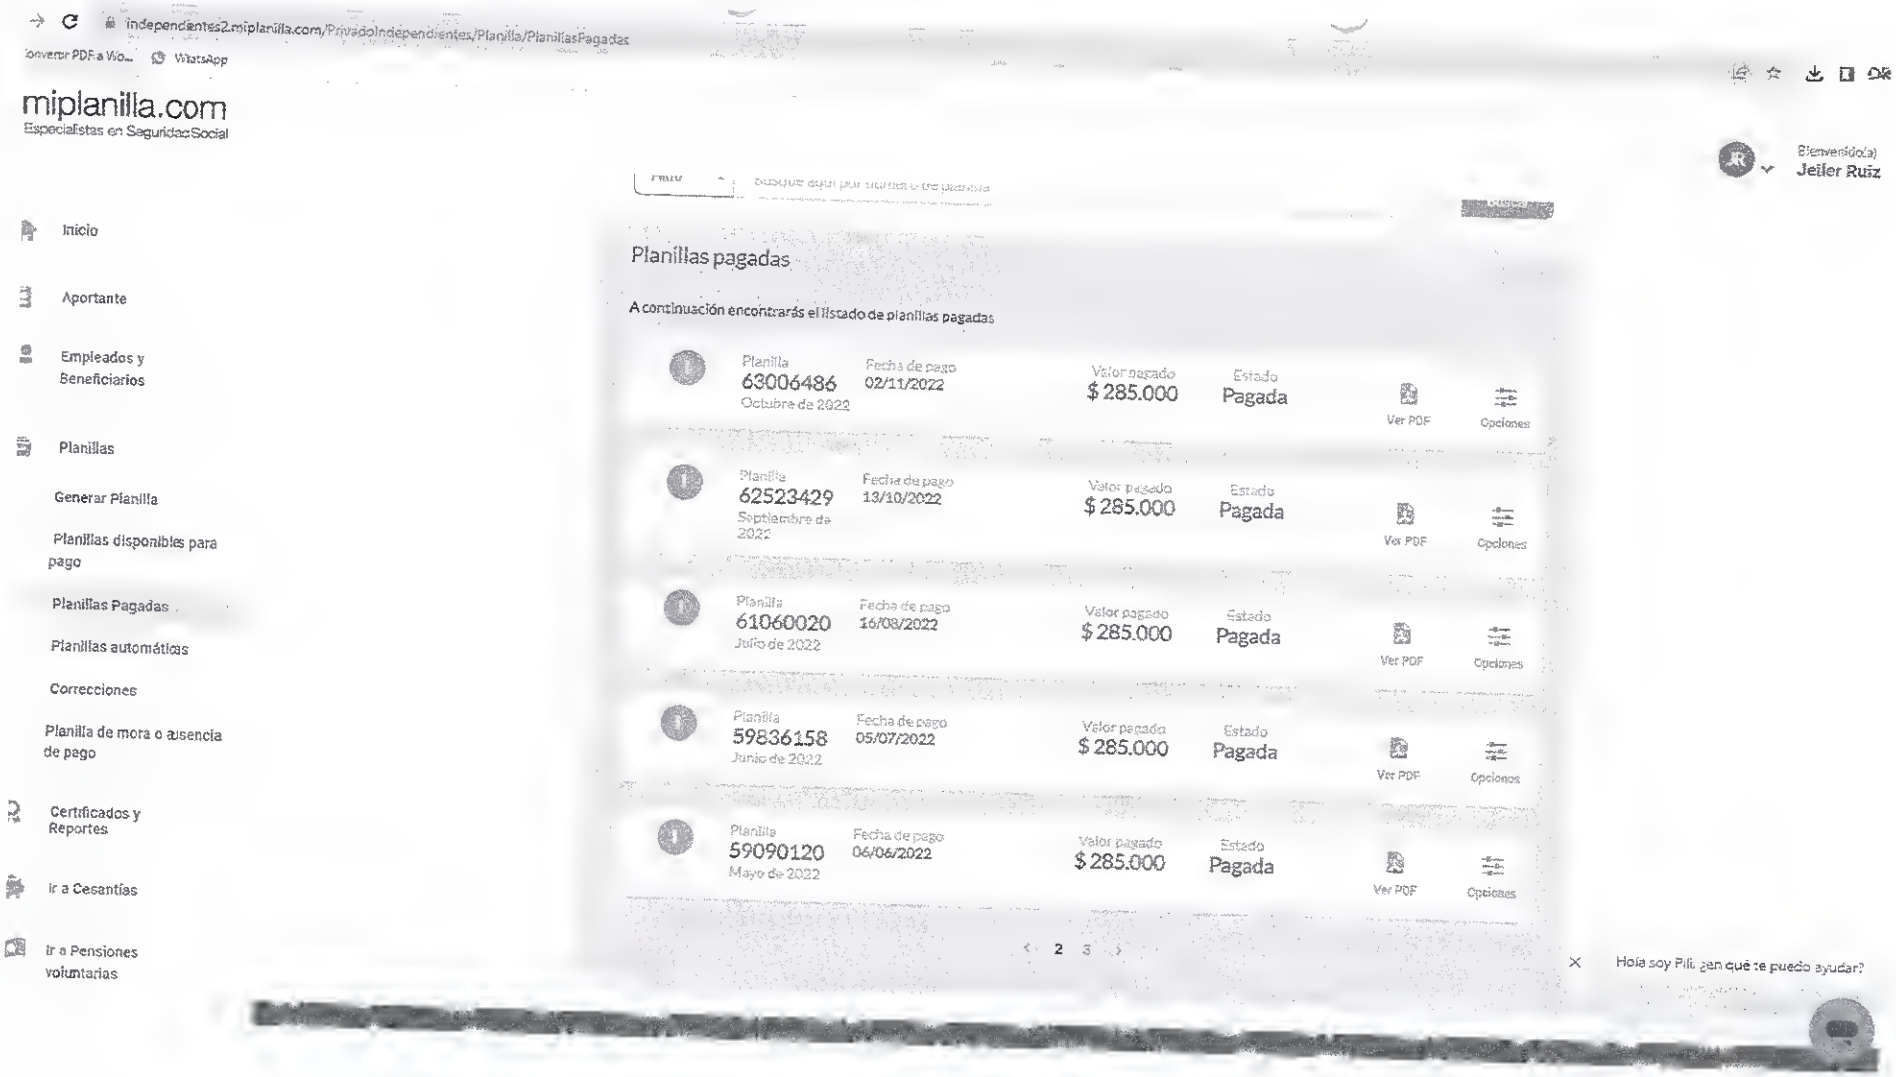
independientes2.miplanilla.com/PrivadoIndependientes/Planilla/PlanillasPagadas
miplanilla.com
EspecialEstas en SeguridadSocial
Bienvenido(a)
Jeiler Ruiz
Inicio
Aportante
Empleados y Beneficiarios
Planillas
Generar Planilla
Planillas disponibles para pago
Planillas Pagadas
Planillas automáticas
Correcciones
Planilla de mora o ausencia de pago
Certificados y Reportes
Ir a Cesantías
Ir a Pensiones voluntarias
Planillas pagadas
A continuación encontrarás el listado de planillas pagadas
Planilla 63006486 Octubre de 2022
Fecha de pago 02/11/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 62523429 Septiembre de 2022
Fecha de pago 13/10/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 61060020 Julio de 2022
Fecha de pago 16/08/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59836158 Junio de 2022
Fecha de pago 05/07/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
Planilla 59090120 Mayo de 2022
Fecha de pago 06/06/2022
Valor pagado $ 285.000
Estado Pagada
Ver PDF
Opciones
2 3
Hola soy Pili, ¿en qué te puedo ayudar?

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172871-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ		CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		65953604	$2.114.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	191.200	0		0		0	0	0	0	191.200	4

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
230301	Porvenir	800224808-6	950.400	0	0	0	0	0	0		950.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	830903790-5	410.800				410.800	0	0	410.800			4.108	410.800	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000145-3	284.000	0	0	284.000	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	284.000	284.000
Pensión	2	1.136.000	1.136.000
Riesgos Laborales	1	410.800	410.800
CCF	1	284.000	284.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	2.114.800	2.114.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	7172871-1	DAVID LEONARDO ANDRES RODRIGUEZ BERMUDEZ	CALLE 39 30A 05	3132439332	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
2023-03	2023-02	E		65953604	TOTAL A PAGAR	
					$2,114,800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el exterior	Estudiante	Aprendiz	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Clase cotizante	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1121879693	RUIZ CARDENAS JEILER JOVANI	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	69.600	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1121900219	PRIETO ALMANZA HENRY JEYSSON	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	69.600	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1121952750	MOLINA VELASQUEZ LAURA VANESA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	69.600	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	30083309	GAMBOA ALCANTARA INGRID CAROLINA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	69.600	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	1121908382	REY HERNANDEZ LUIS ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	69.600	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
CC	52366933	ABRIL RIAÑO LUZ MERY	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	8.600	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	1	15/03/2023	85956214	$334.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	145.000	0		0		0	9	1.600	0	146.600	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	9	2.100	0	187.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.600
Pensión	1	185.600	187.700
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	330.600	334.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79065320	LUIS FERNANDO CASTRO RODRIGUEZ	cl 151 c 51 27	30026341	cycingenieriayproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	15/03/2023	65956214	$334.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Excepción	LNG	PRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COTIZACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79065320	CASTRO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	3	0			N																230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	145.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66351155	$359.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	0	0	80.800			808	80.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	46.400	0	0	46.400	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.400
Pensión	1	185.600	185.600
Riesgos Laborales	1	80.800	80.800
CCF	1	46.400	46.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	359.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E		66351155	$359.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombia residente	Exonerado	ING	SET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVT	VCT	IRL	COR	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1121902636	ZAPATA ROJAS DANIEL FERNANDO	1	0			S	X	X															230201	1,160,000	185,600	0	0	0	0	EPS005	1,160,000	46,400	14-11	1,160,000	5	80,800	CCF34	1,160,000	46,400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLAN__A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION__E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS	CR54D 183 50 IN 25	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	25/04/2023	67307724	$239,300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	800362790-5	229,700				229,700	34	9,600	239,300			2,297	239,300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	229,700	239,300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	229,700	239,300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLAN_.A INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION_E APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901199491-6	INTERCONDI SAS		CR54D 183 50 IN 26	6635729	INTERCONDISAS@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	Y	25/04/2023	67307724	$239.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																	PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Pensionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntaria Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	86075792	AGUDELO VARELA MATEO	59	0			N	X																	0	0	0	0	0	0		0	0	14-11	3.300.000	5	229.700		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Comprobante

de pago en línea



COMPENSAR-OI

Pago realizado por: OSCAR FELIPE RODRIGUEZ BERMUDEZ

Nro. de recibo: 67307724

Descripción del pago: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Identificación del contribuyente: 10.0.66.253

Concepto: NIT

Razón Social: 901199491

Fecha y hora de la transacción: Martes 25 de Abril de 2023 04:07:38 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 239,300.00

Cuenta: *******2938

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

El representante legal de INTERCONDI SAS **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con C.C: 1.020.797.397 de Bogotá

y

El suscrito contador público **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.082.697 de Villavicencio y tarjeta profesional No. 250210-T de la junta central de contadores.

CERTIFICAN

Que la persona jurídica **INTERCONDI SAS** identificada con Nit. 901.199.491-6, a la fecha ha cancelado el pago de los aportes a parafiscales del periodo correspondiente al mes de Noviembre de 2022, Diciembre de 2022 y Febrero de 2023; dando de esta manera cabal cumplimiento a lo establecido en el articulo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide con destino al INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER VILLAVICENCIO, a los quince (15) días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,

David R

ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
R/L INTERCONDI SAS

JUAN FERNANDO REYES PARRA
Contador Público T.P. No. 250210-T

El representante legal de INTERCONDI SAS **DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO** identificado con C.C: 1.020.797.397 de Bogotá

y

El suscrito contador público **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.082.697 de Villavicencio y tarjeta profesional No. 250210-T de la junta central de contadores.

CERTIFICAN

Que la persona jurídica **INTERCONDI SAS** identificada con Nit. 901.199.491-6, a la fecha ha cancelado el pago de seguridad social (EPS, AFP, ARL) del periodo correspondiente al mes de Noviembre de 2022, Diciembre de 2022 y Febrero de 2023; dando de esta manera cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide con destino al INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER VILLAVICENCIO, a los quince (15) días del mes de Marzo de 2023.

Cordialmente,

ING. DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
R/L INTERCONDI SAS

JUAN FERNANDO REYES PARRA
Contador Público T.P. No. 250210-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

H 9 9 8 8 0 2 4 6 0 5 8 8 1 2 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN FERNANDO REYES PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86082697 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 250210-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250210-T



JUAN FERNANDO
REYES PARRA
C.C. 86082697
RES. INSCRIPCION 1011 DEL 16/11/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258050 277096

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA


Valido solo para interesado si sa

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86082697**

REYES PARRA
APELLIDOS

JUAN FERNANDO
NOMBRES

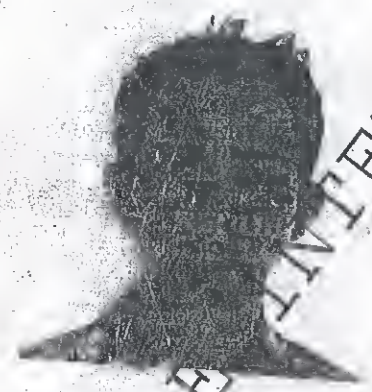

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-AGO-1984**
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-AGO-2002 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-5200100-69112622-M-0086082697-20030717 **01808** 03198O 01 122799224

VALIDO PARA CERTIFICACION DE INTERCONDI SAS

IMDER Instituto Municipal de Deporte y Recreación	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO GESTION DE CONTRATACIÓN			
	FORMATO ACTA DE PAGO CONTRATO INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-82	Vigencia: 27/04/2022	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA PARA PAGO

CONTRATO No:	414 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR INICIAL :	$ 55.778.257,79
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00
VALOR ACTUAL CONTRATO :	$ 55.778.257,79
VALOR TOTAL CONTRATO EN LETRAS:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
CONTRATISTA:	INTERCONDI SAS
CONTRATANTE:	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN IMDER DE VILLAVICENCIO META
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES Y CINCO (5) DIAS O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022 CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN:	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2022 (35 DIAS)
FECHA REINICIO No. 1:	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE PRORROGA No. 1:	03 DE FEBRERO DE 2023 (23 DIAS)
FECHA DE PRORROGA No. 2:	24 DE FEBRERO DE 2023 (15 DIAS)
FECHA DE PRORROGA No. 3:	13 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	21 DE MARZO DE 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	02 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR:	ALVARO PATIÑO MONTOYA

RESUMEN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.778.257.79
VALOR ANTICIPO RECIBIDO 50%	$ 0.00
VALOR ADICION	$ 0.00
VALOR ACTA MODIFICATORIA N°. 01	N.A
VALOR PAGADO ACTA PARCIALES	$ 0.00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 44.578.243.01
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 0.00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 44.578.243.01
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0.00
PORCENTAJE DE EJECUCION	79.92%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 11.200.014.78

El valor a pagar en la presente **Acta** es la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO M/CTE. **($ 44.578.243.01).**

Con la firma de la presente **Acta**, el contratista recibe el 79.92% del pago total del contrato de obra contratada, se firma en villavicencio a los **dos (02) días del mes de Mayo de 2023.**

DAVID RICARDO RODRIGUEZ B.
REPRESENTANTE LEGAL
INTERCONDI SAS

ALVARO PATIÑO MONTOYA
SUPERVISOR IMDER

ANGELICA GONZALEZ
APOYO A SUPERVISION
IMDER

IMDER	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE VILLAVICENCIO IMDER			
	PROCESO DE GESTION DE CONTRATACIÓN			
	ACTA DE PAGO PARCIAL Y/O FINAL DE INTERVENTORIA			
	Codigo: FR-GCO-85	Vigencia:27/04/2022	Versión: 1	Página: 1 de 1

ACTA PARCIAL No. 1 X FINAL DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREO DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATO INTERVENTORIA No.	414 de 2022	FECHA DE INICIO:	16 DE NOVIEMBRE 2022
CONTRATISTA:	INTERCONDI S.A.S	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE 2022
REPRESENTANTE LEGAL:	DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO	SUSPENSIÓN No. 1 (35 DIAS):	28 DE DICIEMBRE 2022
NIT:	901.199.491-6	REINICIO No. 1:	01 DE FEBRERO 2023
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	DOS (02) MESES Y CINCO DIAS O HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	PRORROGA No. 1 (23 DIAS):	03 DE FEBRERO 2023
SUPERVISOR:	ALVARO PATIÑO MONTOYA	PRORROGA No. 2 (15 DIAS):	24 DE FEBRERO 2023
VALOR INICIAL:	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($55.778.257,79) M/CTE	PRORROGA No. 3 (8 DIAS):	13 DE MARZO 2023
VALOR ADICION:	$ 0,00	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	21 DE MARZO 2023

VALOR PRESENTE ACTA	$ 44.578.243,01
FECHA PRESENTE ACTA	
2/05/2023	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DESDE: 16/11/2022
	HASTA: 15/03/2023

En Villavicencio- Meta a los dos (02) días del mes de Mayo de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO como representacion legal de INTERCONDI SAS y ALVARO PATIÑO MONTOYA, Director del Instituto de Deporte y Recreación de Villaviencio - IMDER, quien ejerce las actividades de supervisión del contrato,con el fin de dar aprobación al ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 01 en la ejecución del contrato en mención, como se detalla a continuación:

		CONDICIONES INICIALES						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	CATEGORIA	CARGO/OFICIO	DEDICACION (Hombre/mes)	NUMERO DE PERSONAS	TIEMPO EN MESES	SALARIOS	VALOR	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1. COSTOS DE PERSONAL													
A	PERSONAL PROFESIONAL												
1	INGENIERO CIVIL	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	10%	1	2.17	$ 4.100.000,00	$ 889.700,00	0,00	$ -	1,73	$ 709.300,00	1,73	$ 709.300,00
2	INGENIERO CIVIL	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	100%	1	2.17	$ 3.331.342,62	$ 7.229.013,49	0,00	$ -	1,73	$ 5.763.222,73	1,73	$ 5.763.222,73
3	INGENIERRO SISO O PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%	1	2.17	$ 2.200.000,00	$ 4.774.000,00	0,00	$ -	1,73	$ 3.806.000,00	1,73	$ 3.806.000,00
B	PERSONAL TECNICO												
1	INGENIERO JUNIOR	INSPECTOR DE INTERVENTORIA	100%	1	2.17	$ 1.245.876,00	$ 2.703.550,92	0,00	$ -	1,73	$ 2.155.365,48	1,73	$ 2.155.365,48
2	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO	25%	1	2.17	$ 1.539.775,00	$ 835.327,94	0,00	$ -	1,73	$ 665.952,69	1,73	$ 665.952,69
3	CADENERO	CADENERO	25%	1	2.17	$ 1.143.960,00	$ 620.598,30	0,00	$ -	1,73	$ 494.762,70	1,73	$ 494.762,70
A+B	SUBTOTAL PERSONAL						$ 17.052.190,64		$ -		$ 13.594.603,60		$ 13.594.603,60
	FACTOR MULTIPLICADOR						2,20		2,20		2,20		2,20
C	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*FM						$ 37.514.819,41		$ -		$ 29.908.127,92		$ 29.908.127,92
2. COSTOS DIRECTOS													
ITEM	TIPO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO MESES	VALOR	VALOR TOTAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL	TIEMPO (MES)	VALOR PARCIAL
1	Vehiculo campero pick-up,camioneta (incluye conductor y combustible)	ALQUILER DE CAMIONETA DE CILINDRAJE 1300 A 2000 CC	MES	1	2.17	$ 2.150.595,06	$ 4.666.791,28	0.00	$ -	1,69	$ 3.634.505,65	1,69	$ 3.634.505,65
2	Equipo de topografia	ALQUILER DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA (ESTACIONES, NIVELES DE PRECISION, GPS, ENTRE OTROS)	MES	1	0,54	$ 2.216.990,45	$ 1.197.174,84	0.00	$ -	0,54	$ 1.197.174,84	0,54	$ 1.197.174,84
3	Laboratorio	LABORATORIOS DE INTERVENTORIA (Incluye Equipo completo y Entrega de Informes de Ensayos y Resultados)	MES	1	2.17	$ 1.610.000,00	$ 3.493.700,00	0.00	$ -	1,69	$ 2.720.900,00	1,69	$ 2.720.900,00
D	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 9.357.666,12		$ -		$ 7.552.580,49		$ 7.552.580,49
E	TOTAL COSTOS DE CONSULTORIA (D+E)						$ 46.872.485,54		$ -		$ 37.460.708,41		$ 37.460.708,41
F	IVA 19% SOBRE(F)						$ 8.905.772,25	0%	$ -	79,92%	$ 7.117.534,60	79,92%	$ 7.117.534,60
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA(E+F)						$ 55.778.257,79		$ -		$ 44.578.243,01		$ 44.578.243,01
	VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA (E+F) REDONDEADO						$ 55.778.257,79		$ -		$ 44.578.243,01		$ 44.578.243,01

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	55.778.257,79
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	44.578.243,01
% EJECUTADO CONTRATO		79,92%

VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 44.578.243,01
PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$ -
VALOR ADICION:	$ -
VALOR A PAGAR:	$ 44.578.243,01

SON: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO M/CTE.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2023.

ALVARO PATIÑO MONTOYA
DIRECTOR IMDER
SUPERVISOR

ANGELICA GONZALEZ CASTAÑO
PROFESIONAL DE APOYO
IMDER

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
INTERCONDI S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL

DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
INTERCONDI SAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
