
Continuación

- **INFORME DE GERENCIA N°4 DICIEMBRE 2022**

Anexo: seguimiento programación

2.DICIEMBE 2022.mpp


Id	Nombre de tarea	%Compl	%Plan	% Atraso
105	Fin estructuras hidraulicas y drenajes superficiales	0%	0%	0%
106	JUEGOS INFANTILES	0%	0%	0%
107	Fin juegos infantiles	0%	0%	0%
108	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	0%	0%	0%
109	Gimnasio al aire libre	0%	0%	0%
110	**SISTEMA DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS Y RIEGO DE ZONAS VERDES**	**0%**		
111	SISTEMA DE DRENAJE DE CUBIERTAS	0%	0%	0%
112	TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, SUMIDEROS Y CÁRCAMOS	0%	0%	0%
113	SISTEMA DE BOMBEO	0%	0%	0%

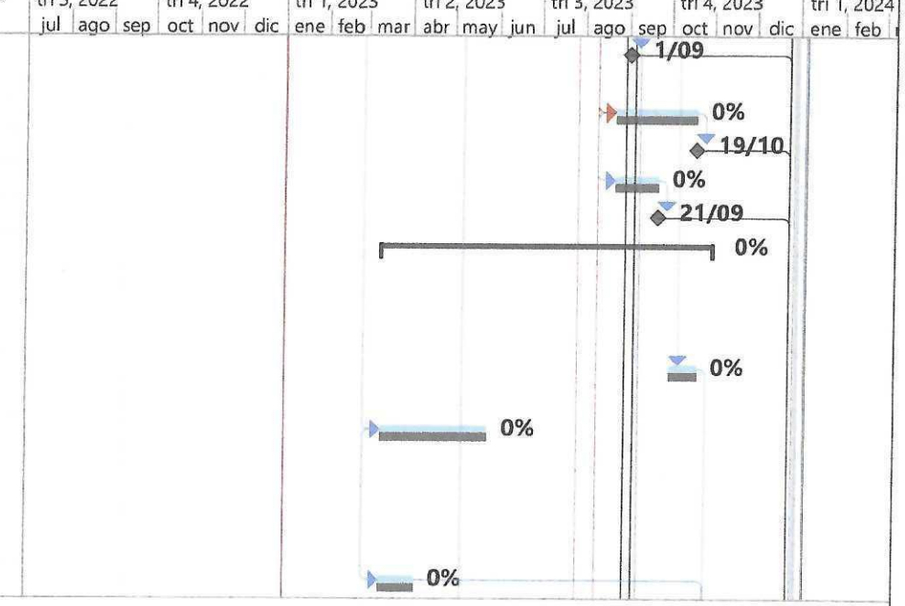

Progreso de tarea crítica	Tareas críticas	Resumen manual
Tarea	División crítica	Resumen del proyecto
División	Línea base	Tareas externas
Progreso de tarea	División de la línea base	Hito externo
Tarea manual	Hito de línea base	Tarea inactiva
solo el comienzo	Hito	Hito inactivo
solo fin	Progreso del resumen	Resumen inactivo
solo duración	Resumen	Fecha límite

2.DICIEMBE 2022.mpp

Id	Nombre de tarea	%Compl	%Plan	% Atraso
114	SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO SUBTERRANEO	0%	0%	0%
115	Fin sistema de aprovechamiento de aguas lluvias	0%	0%	0%
116	**DISEÑO ELECTRICO**	**0%**		
117	SUBESTACION ELECTRICA	0%	0%	0%
118	SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMAS	0%	0%	0%
119	ILUMINACION EXTERIOR CANCHAS	0%	0%	0%
120	Fin Diseño eléctrico	0%	0%	0%
121	CERTIFICACIÓN RETIE DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y USO FINAI	0%	0%	0%
122	CERTIFICACIÓN RETILAP	0%	0%	0%
123	FIN	0%	0%	0%

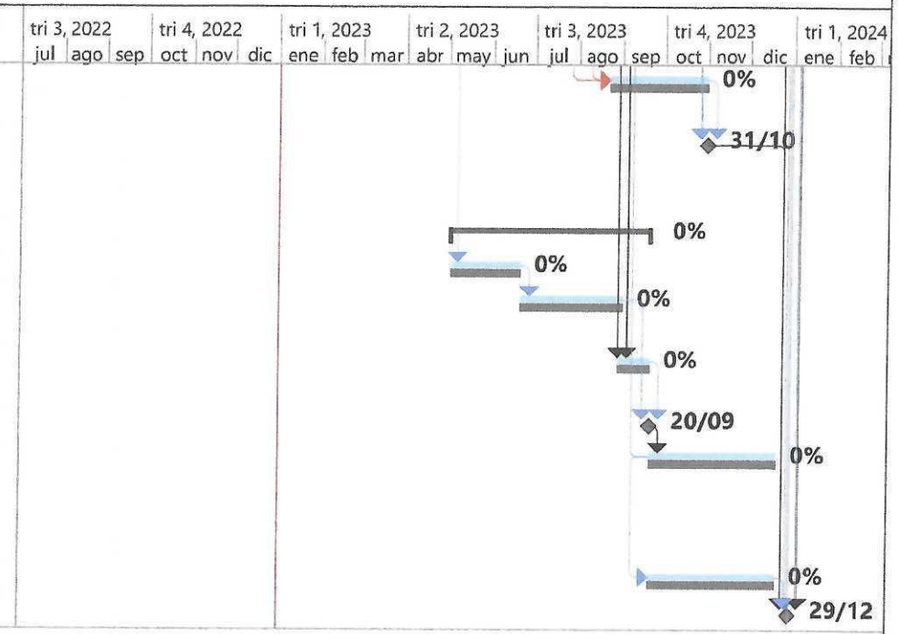

Progreso de tarea crítica	Tareas críticas	Resumen manual	
Tarea	División crítica	Resumen del proyecto	
División	Línea base	Tareas externas	
Progreso de tarea	División de la línea base	Hito externo	
Tarea manual	Hito de línea base	Tarea inactiva	
solo el comienzo	Hito	Hito inactivo	
solo fin	Progreso del resumen	Resumen inactivo	
solo duración	Resumen	Fecha límite	

4602
4828

ANEXO N° 2: DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENAI.N.V. E – 161 – 13.

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

4603
4829

ROBINSON MARTÍNEZ SANDOVAL INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA MAGÍSTER EN INGENIERÍA	*ESTUDIO DE SUELOS* *DISEÑO DE PAVIMENTOS* *CARACTERIZACION DE MATERIALES* *DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETOS* *ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD*	

DENSIDAD O MASA UNITARIA DEL SUELO EN EL TERRENO - MÉTODO DEL CONO DE ARENA
I.N.V. E – 161 – 13

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA: CONSORCIO CIS 56	**MATERIAL:** RELLENO	**FECHA:** 06/12/2022
CANTERA: LOMA GRANDE - COLOR HABANO CLARO	**LOCALIZACIÓN:** MONTERÍA, CÓRDOBA	

Prueba No.	1	2	3	4	5		
Abscisa, K	CALLE 5	CALLE 5	CALLE 6	CALLE 5	CALLE 6		
Carril	CAPA N°1	CAPA N°1	CAPA N°1	CAPA N°1	CAPA N°1		
Material de:	RELLENO						
Peso frasco + Arena inicial, grs.	6300,00	6182,00	6096,00	5873,00	5761,00		
Peso frasco + Arena restante, grs.	2632,00	2402,00	2499,00	2350,00	1860,00		
Peso Arena total usada, grs.	3668,00	3780,00	3597,00	3523,00	3901,00		
Constante del cono, grs.	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00	1860,00		
Peso de la arena en el hueco, grs.	1808,00	1920,00	1737,00	1663,00	2041,00		
Densidad de la arena, grs/cm³	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46		
Volumen del hueco, cm³	1238,36	1315,07	1189,73	1139,04	1397,95		
Peso del material extraído húmedo, grs.	2695,00	2855,00	2536,00	2436,00	2930,00		
% de humedad	12,40	12,60	10,40	11,50	12,40		
Peso del material extraído seco, grs.	2397,69	2535,52	2297,10	2184,75	2606,76		
Densidad del material en grs./cm³	1,94	1,93	1,93	1,92	1,86		
Densidad del material en ton./m³	1,94	1,93	1,93	1,92	1,86		
Densidad del material en Lb/ft³	120,82	120,31	120,48	119,69	116,36		
Densidad máxima de laboratorio, ton/m³	1,947	1,947	1,947	1,947	1,947		
Densidad máxima de laboratorio, Lb/ft³	121,49	121,49	121,49	121,49	121,49		
% humedad óptima laboratorio	11,36	11,36	11,36	11,36	11,36		
% de compactación del terreno	99,44	99,03	99,17	98,51	95,77		
% de compactación especificado	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00		
CONFORMIDAD (SI/NO)							

OBSERVACIONES:

ROBINSON MARTÍNEZ SANDOVAL
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
MAGÍSTER EN INGENIERÍA

Cra 14C N° 39 - 38 . B/ La Floresta. Tel (604)7891152 - 3137836397. Montería - Córdoba.
laboratoriorams@gmail.com

ANEXO N° 3: ENSAYOS DE CONCRETO PILOTES.

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

4604
4830

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-08NOV22A	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 169 - 192 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 28-Nov-22 05:12PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 21.60	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	29-Nov-22	285	4060	28.0	80	4
3	01-Dec-22	402	5720	39.5	113	4
3	01-Dec-22	407	5800	40.0	114	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-08NOV22B	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 169 - 192 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 28-Nov-22 05:34PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 21.60	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	29-Nov-22	306	4360	30.0	86	4
3	01-Dec-22	419	5970	41.1	118	3
3	01-Dec-22	424	6030	41.6	119	4

~~1605~~
4831

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-08NOV22C	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 169 - 192 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 28-Nov-22 06:15PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 21.60	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	29-Nov-22	308	4380	30.2	86	4
3	01-Dec-22	405	5760	39.7	113	4
3	01-Dec-22	406	5770	39.8	114	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-09NOV22A	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 193 - 216 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 30-Nov-22 03:40PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 203.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	01-Dec-22	303	4310	29.7	85	4
3	03-Dec-22	419	5960	41.1	118	3
3	03-Dec-22	422	6000	41.4	118	3

~~4606~~
4832

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-09NOV22B	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 193 - 216 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 30-Nov-22 04:25PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 216.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	01-Dec-22	312	4430	30.6	87	4
3	03-Dec-22	394	5600	38.6	110	4
3	03-Dec-22	395	5620	38.8	111	3

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-09NOV22C	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 193 - 216 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 30-Nov-22 05:00PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 229.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	01-Dec-22	285	4060	28.0	80	4
3	03-Dec-22	420	5980	41.2	118	4
3	03-Dec-22	431	6130	42.3	121	4

4607
4833

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-10DIC22A	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 217 - 228 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 02-Dec-22 03:20PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 203.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
3	05-Dec-22	435	6190	42.7	122	4
3	05-Dec-22	442	6290	43.4	124	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-10DIC22B	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 217 - 228 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 02-Dec-22 04:00PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 202.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
3	05-Dec-22	434	6180	42.6	122	3
3	05-Dec-22	437	6210	42.8	122	4

4608
4834

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-10DIC22C	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 217 - 228 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 02-Dec-22 04:40PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 210.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
3	05-Dec-22	428	6080	41.9	120	4
3	05-Dec-22	433	6160	42.5	121	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-11DIC22A	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 229 - 240 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 06-Dec-22 10:50AM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 0.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	07-Dec-22	286	4070	28.1	80	4
3	09-Dec-22	377	5370	37.0	106	4

4609
4835

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-11DIC22B	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 229 - 240 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 06-Dec-22 11:35PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 216.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	07-Dec-22	286	4070	28.1	80	4
3	09-Dec-22	439	6250	43.1	123	4
3	09-Dec-22	444	6310	43.5	124	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-11DIC22C	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 229 - 240 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 06-Dec-22 12:20PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 216.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	07-Dec-22	333	4730	32.6	93	4
3	09-Dec-22	479	6810	47.0	134	3
3	09-Dec-22	479	6820	47.0	134	4

4610
4836

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-12DIC22A	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 241 - 264 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 09-Dec-22 05:00PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 22.90	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	10-Dec-22	298	4230	29.2	83	3
3	12-Dec-22	433	6160	42.5	121	4
3	12-Dec-22	448	6370	43.9	126	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-12DIC22B	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 241 - 264 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 09-Dec-22 04:20PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 22.90	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	10-Dec-22	283	4020	27.7	79	4
3	12-Dec-22	449	6380	44.0	126	4
3	12-Dec-22	468	6660	45.9	131	4

4644
4837

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-12DIC22C	L 8 MODULOS 40 X 40 CONS: 241 - 264 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 09-Dec-22 03:45PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC22A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 21.60	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	10-Dec-22	340	4840	33.4	95	4
3	12-Dec-22	519	7380	50.9	145	4
3	12-Dec-22	523	7440	51.3	147	3

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-13DIC22A	L 8 MODULOS 35 X 35 CONS: 265 - 288 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 12-Dec-22 03:22PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 228.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (días)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	13-Dec-22	319	4540	31.3	89	4
2	14-Dec-22	372	5290	36.5	104	4
2	14-Dec-22	376	5350	36.9	105	4

4612
4636

ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO / MORTERO
NTC 673:2010 / INV E410:13 / NTC 3546:2021
Consulta General de Muestras

* El presente informe afecta únicamente a las muestras referenciadas en el mismo y está sujeto a verificación.
** Este informe no deberá reproducirse parcial o totalmente sin la aprobación por escrito de SGS COLOMBIA S.A.S.

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-13DIC22B	L 8 MODULOS 35 X 35 CONS: 265 - 288 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 12-Dec-22 02:30PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 216.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	13-Dec-22	319	4540	31.3	89	4
2	14-Dec-22	387	5510	38.0	108	4
2	14-Dec-22	390	5550	38.3	109	4

Cliente : SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS

Proyecto : B-1848 PLANTA DE PREFABRICADOS

Concretera : MO (MEZCLA EN OBRA)

Muestra : 1CISM-13DIC22C	L 8 MODULOS 35 X 35 CONS: 265 - 288 PLANTA 2	**Fecha Muestreo :** 12-Dec-22 01:25PM
Dimensión (cm) : 10x20	**Código Mezcla :** 04-SBC21A-02	**Resistencia Nominal (MPa) :** 35.0
Asentamiento (mm): 216.00	**Peso unitario (kg) :**	**Contenido aire (%) :**
Remision: 0	**Planta :**	
Frente :	**Mixer :**	

Edad (dias)	Fecha Ensayo	kgf/cm²	psi	MPa	%	Falla
1	13-Dec-22	322	4580	31.6	90	4
2	14-Dec-22	362	5160	35.5	102	4
2	14-Dec-22	371	5280	36.4	104	4

Semanales mes de: Diciembre

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 14** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 06 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — **CONTRATANTE** MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 14 del 1/12/2022 al 3/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00


4839


MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 015	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%

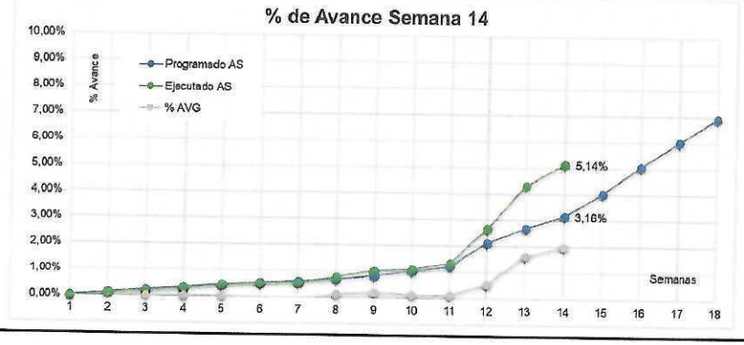

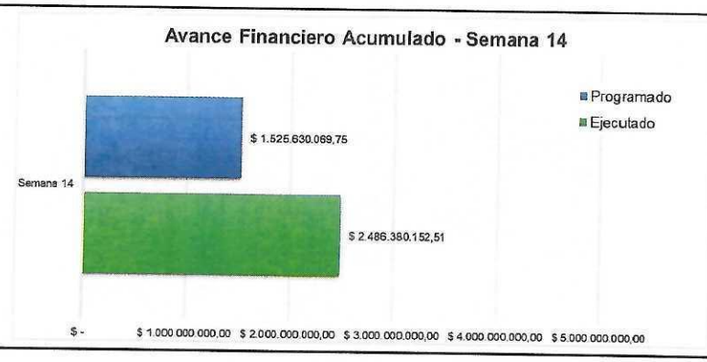

4840

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 14** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR GRIS.

NOTA: QUEDA PENDIENTE LA REVISIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DEL MAT. SELECCIONADO COLOR MARRÓN CLARO, PIEDRA RAJON, DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE 2200 PSI, 3000PSI Y 4000PSI Y ENSAYOS DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO DE LOS PILOTES, LOS CUALES NO HAN SIDO ENVIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ITEM	ACTIVIDAD
1.03	DESMONTE DE VENTANAS, MARCO EN ALUMINIO Y/O MADERA, INCLUYE RETIRO
1.04	DESMONTE DE PROTECTOR DE VENTANAS
1.05	DESMONTE DE PUERTA Y MARCO
1.06	DESMONTE DE PUERTA PORTON DOBLE DE ACCESO INCLUYE MARCO CONCRETO
1.07	DESMONTE DE CIELO RASO EN MADERA INCLUYE RETIRO
1.08	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ENTRAMADO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS
1.09	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS
1.18	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES TALA DE ÁRBOLES ALTURA MENOR O IGUAL H= 5 M (INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS)
1.19	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 51M A 10M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
1.20	REMOCION DE ESPECIES VEGETALES (TALA DE ÁRBOLES ALTURAS ENTRE H= 101M A 15M INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS, INCLUYE EXTRACCIÓN DE RAÍZ)
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION


4841


MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 14 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4


IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

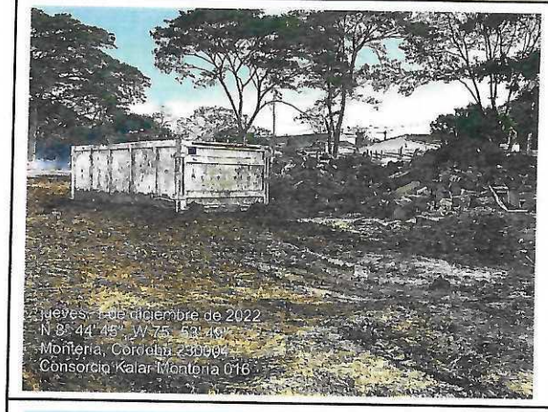


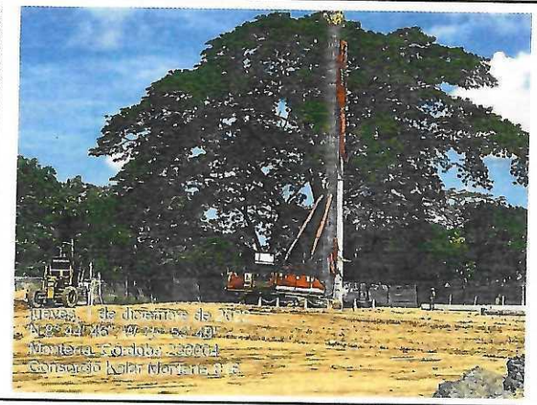

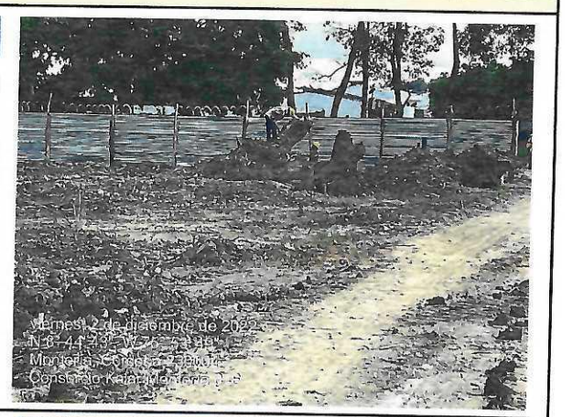

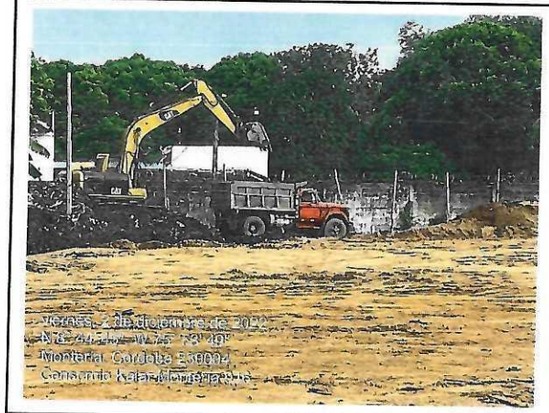

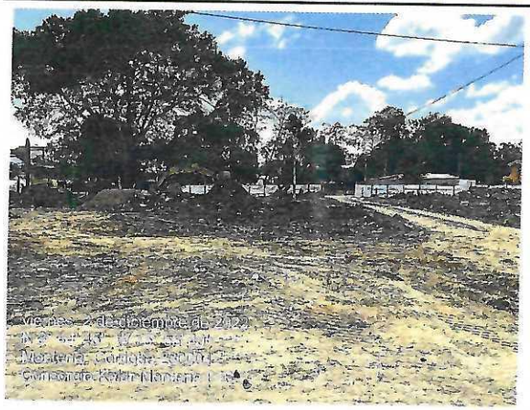

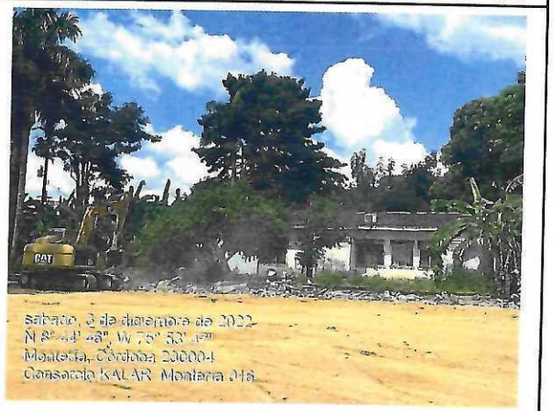

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **ALFREDO CABARCAS BUELVAS**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

4842

ALCALDÍA DE MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 15** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 13 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL **CONTRATANTE** MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 15 del 4/12/2022 al 10/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00


4843


MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 15 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%

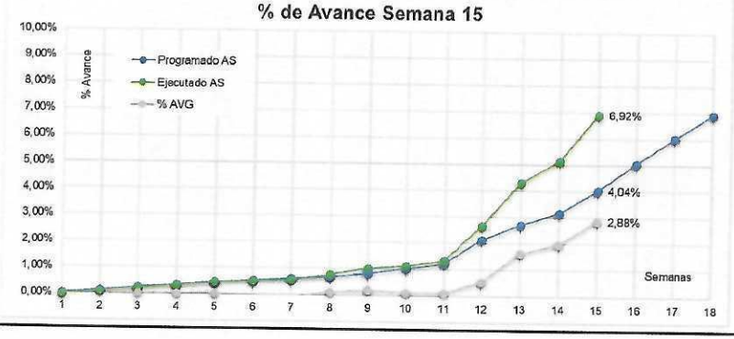

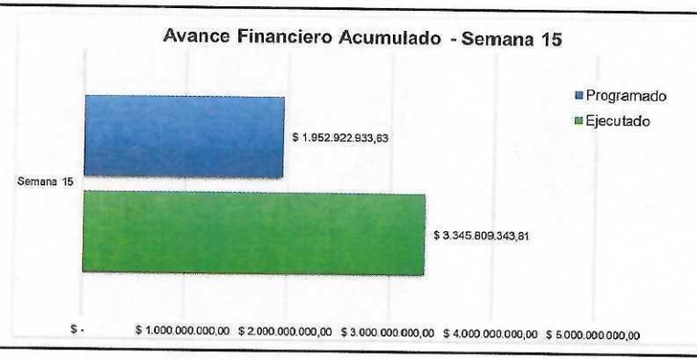

4844

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 5 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ENVIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LOS DISEÑOS DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRAÚLICO DE 2200 PSI, 3000PSI Y 4000PSI
- TOMA DE MUESTRAS DE MATERIAL DE CANTERA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ITEM	ACTIVIDAD
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

4845


Alcaldía de MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 15 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO

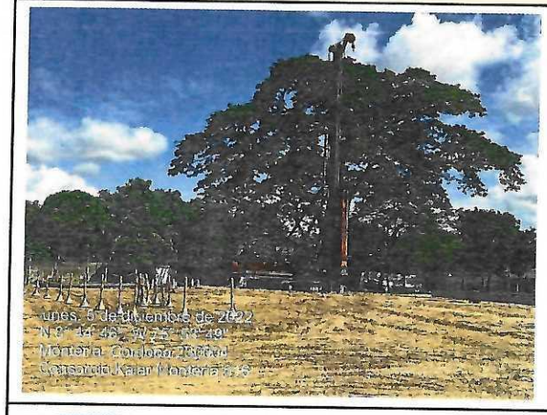


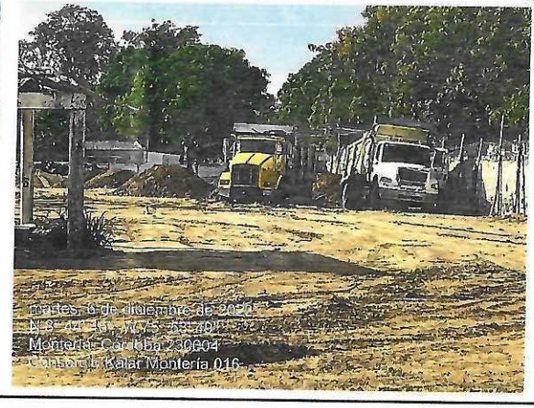



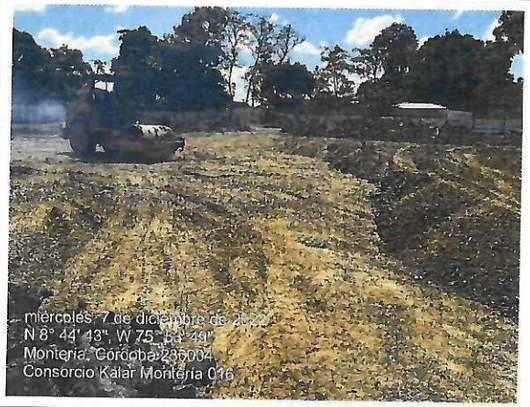



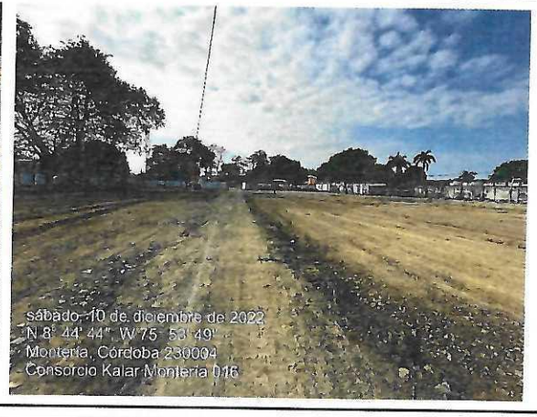

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE. ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

4846

Alcaldía de MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 16** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 19 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL **CONTRATANTE** MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 16 del 11/12/2022 al 17/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00


4847

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 16 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 015	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.76%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%

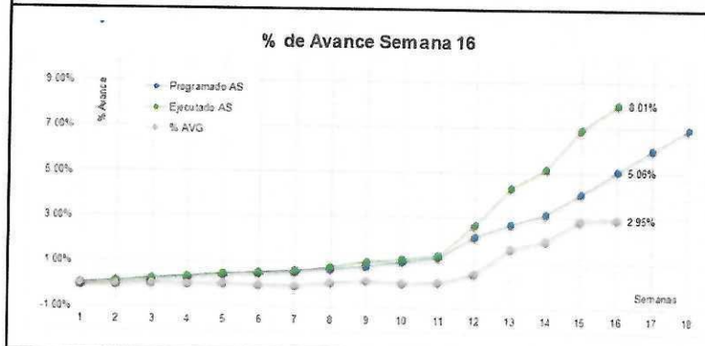



4848

MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 16** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR AMARILLO Y LA PIEDRA RAJON

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A.	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	84	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	42	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 112

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 5 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.6 POR VALOR DE $603.568.001 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.7 POR VALOR DE $5.779.546 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.8 POR VALOR DE $2.137.835 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.9 POR VALOR DE $192.029.717 PESOS MCTE
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ENVIADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE EL PROCTOR DEL MAT SELECCIONADO COLOR AMARILLO, DENSIDADES DEL TERRENO Y ENSAYO A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO DE LOS PILOTES

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ITEM	ACTIVIDAD
2.01	EXCAVACIONES MECANICAS CON RETROCARGADOR
2.02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO
2.03	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.20.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION


4229


Alcaldía de MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 16 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4


IX. REGISTRO FOTOGRÁFICO




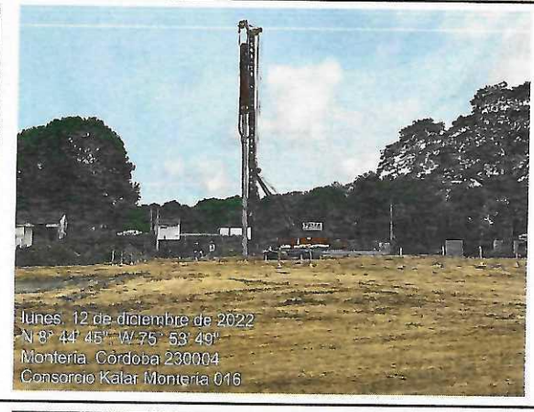

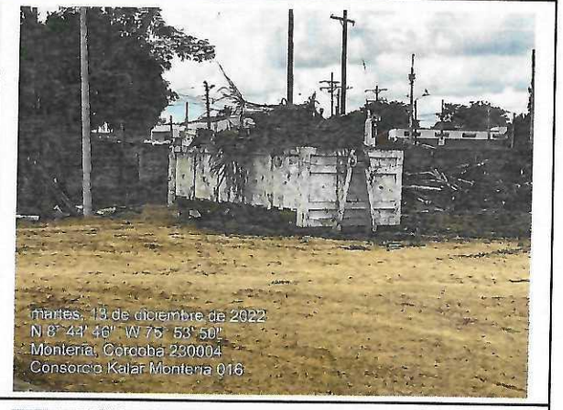

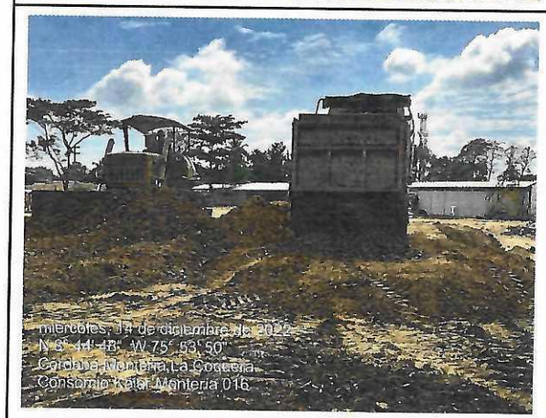

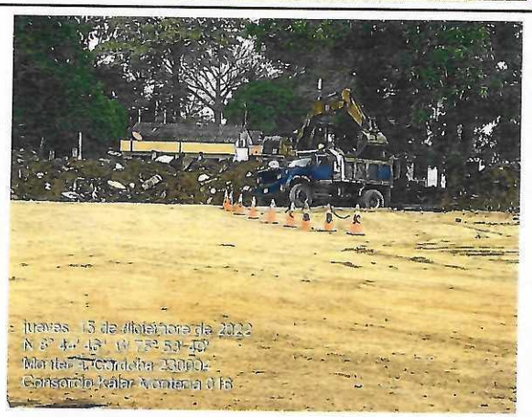

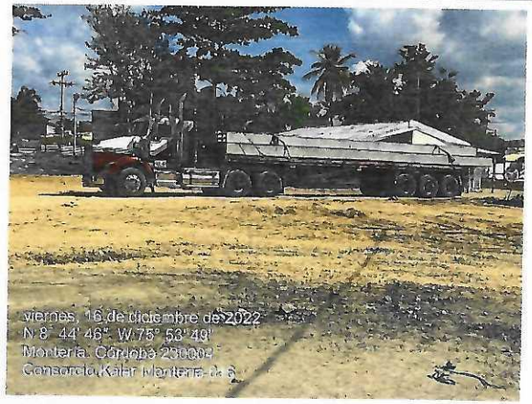

X. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **ALFREDO CABARCAS BUELVAS**

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

4850

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 27 de diciembre de 2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL CONTRATANTE MUNICIPIO DE MONTERÍA **SEMANA No.:** 17 del 18/12/2022 al 24/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR 2022	SGR 2023	MUNICIPIO 2022	MUNICIPIO 2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,626,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				


ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00


1584

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%

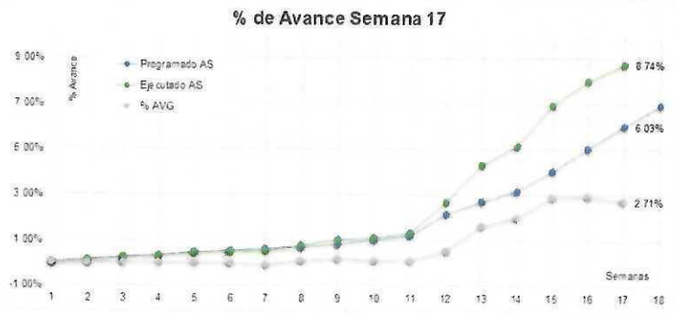

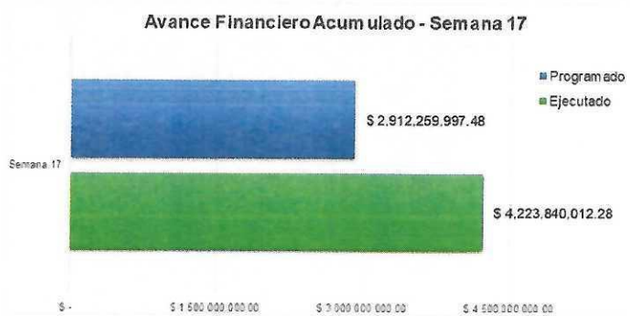

4852

Alcaldía de MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 17** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN: CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: SE CONTINÚA CON EL ACOPIO Y USO DE MATERIAL DE CANTERA PARA NIVELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL TERRENO.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA SOBRE LA CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR AMARILLO Y LA PIEDRA RAJON

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	93	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	51	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 121

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 7 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.10 POR VALOR DE $660.344.663 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.11 POR VALOR DE $186.880.124 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.12 POR VALOR DE $3.614.436,66 PESOS MCTE
- APROBACIÓN DE ORDEN DE DESEMBOLSO No.13 POR VALOR DE $19.670.320 PESOS MCTE
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y CERTIFICADOS DE CALIDAD ENVIADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL ACERO DE REFUERZO
- COMITÉ DE OBRA No. 14

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL
	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)

4853


	INFORME SEMANAL No. 17 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4


X. REGISTRO FOTOGRÁFICO







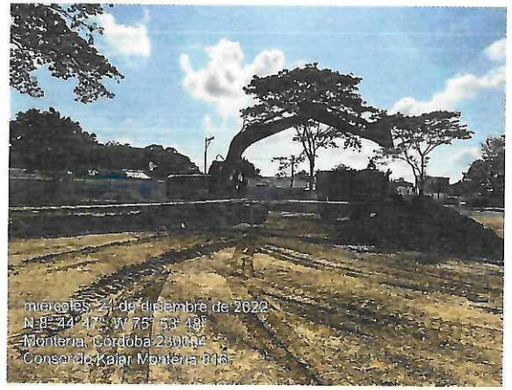

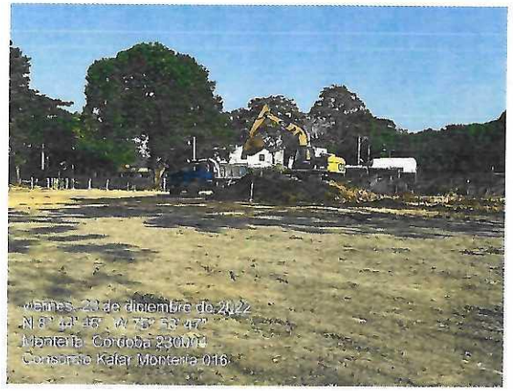



XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	FIRMA NOMBRE: ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

42754

Alcaldía de MONTERÍA	**INFORME SEMANAL No. 18** **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022** **CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

FECHA 03 de enero de 2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

DEPENDENCIA: SEC. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL — **CONTRATANTE** MUNICIPIO DE MONTERÍA — **SEMANA No.:** 18 del 25/12/2022 al 31/12/2022 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA SEVERICHE NUÑEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO CIS 56		
CONTRATO No.	LP-SPM-017-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	$ -
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 48,329,918,941.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		$ -
		VALOR ANTICIPO	$ 9,665,983,788.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016		
CONTRATO No.	CMA-SPM-016-2022	**VALOR INICIAL:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE INICIO:	9/09/2022	**VALOR ADICIONES:**	
MODIFICATORIO No.1	9/09/2022		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	29/12/2023	**VALOR ACUMULADO:**	$ 3,022,628,594.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	29/12/2023		

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	SGR		MUNICIPIO	
		2022	2023	2022	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41	$ 9,503,523,875.00	$ 10,713,075,250.12	$ 6,961,720,544.00
		CDP (422 Y 722)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022	CDP (22001084 Y 22000909)	Decreto No. 0274 del 16 de mayo de 2022
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 22,861,839,140.41		$ 10,713,075,249	
		CRP (822 Y 722)		CRP (22002125 Y 22002126)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,826,826.59	
				CDP (22000908 Y 22001534)	
	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 3,022,628,594.00	
				CDP (22002127 Y 22002130)	
	EJECUTADO ACUM. DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA				

ANTICIPOS	
Otorgado 20% $	9,665,983,788.00
Amortizado $	-
Saldo $	9,665,983,788.00


4855


MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 18 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

III. AVANCE FÍSICO

CRONOGRAMA DE MEDICIÓN VIGENTE: PROGRAMACIÓN INICIAL APROBADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MES	SEMANA	PERIODO		SEMANAL				SEMANA ACUMULADA				% AV o RET
				PROGRAMADO	% PR	EJECUTADO	% EJ	PROGRAMADO ACUM	%PR ACUM	EJECUTADO ACUM	%EJE ACUM	
1	Semana 1	9/09/2022	10/09/2022	$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		$ 11,839,911.93	0.02%	$ -		-0.02%
	Semana 2	11/09/2022	17/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 50,154,384.17	0.10%	$ 61,009,284.36	0.13%	$ 50,154,384.17	0.10%	-0.02%
	Semana 3	18/09/2022	24/09/2022	$ 49,169,372.43	0.10%	$ 70,469,712.25	0.15%	$ 110,178,656.78	0.23%	$ 120,624,096.43	0.25%	0.02%
	Semana 4	25/09/2022	30/09/2022	$ 43,341,442.80	0.09%	$ 37,632,899.41	0.08%	$ 153,520,099.59	0.32%	$ 158,256,995.84	0.33%	0.01%
2	Semana 5	1/10/2022	8/10/2022	$ 54,997,302.05	0.11%	$ 62,736,922.95	0.13%	$ 208,517,401.64	0.43%	$ 220,993,918.79	0.46%	0.03%
	Semana 6	9/10/2022	16/10/2022	$ 48,023,055.14	0.10%	$ 22,137,900.13	0.05%	$ 256,540,456.77	0.53%	$ 243,131,818.92	0.50%	-0.03%
	Semana 7	17/10/2022	24/10/2022	$ 37,897,455.14	0.08%	$ 18,788,373.95	0.04%	$ 294,437,911.91	0.61%	$ 261,920,192.86	0.54%	-0.07%
	Semana 8	25/10/2022	31/10/2022	$ 33,664,547.43	0.07%	$ 117,016,517.23	0.24%	$ 328,102,459.33	0.68%	$ 378,936,710.09	0.78%	0.11%
3	Semana 9	1/11/2022	5/11/2022	$ 65,815,394.97	0.14%	$ 111,136,719.05	0.23%	$ 393,917,854.31	0.82%	$ 490,073,429.14	1.01%	0.20%
	Semana 10	6/11/2022	12/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 52,972,579.65	0.11%	$ 491,175,529.85	1.02%	$ 543,046,008.79	1.12%	0.11%
	Semana 11	13/11/2022	19/11/2022	$ 97,257,675.54	0.20%	$ 100,986,216.08	0.21%	$ 588,433,205.40	1.22%	$ 644,032,224.87	1.33%	0.12%
	Semana 12	20/11/2022	26/11/2022	$ 445,688,940.48	0.92%	$ 646,251,588.06	1.34%	$ 1,034,122,145.88	2.14%	$ 1,290,283,812.93	2.67%	0.53%
	Semana 13	27/11/2022	30/11/2022	$ 273,726,664.12	0.57%	$ 801,586,961.81	1.66%	$ 1,307,848,810.00	2.71%	$ 2,091,870,774.73	4.33%	1.62%
4	Semana 14	1/12/2022	3/12/2022	$ 217,781,259.75	0.45%	$ 394,509,377.78	0.82%	$ 1,525,630,069.75	3.16%	$ 2,486,380,152.51	5.14%	1.99%
	Semana 15	4/12/2022	10/12/2022	$ 427,292,863.88	0.88%	$ 859,429,191.30	1.78%	$ 1,952,922,933.63	4.04%	$ 3,345,809,343.81	6.92%	2.88%
	Semana 16	11/12/2022	17/12/2022	$ 491,507,923.87	1.02%	$ 523,380,279.20	1.08%	$ 2,444,430,857.49	5.06%	$ 3,869,189,623.01	8.01%	2.95%
	Semana 17	18/12/2022	24/12/2022	$ 467,829,139.99	0.97%	$ 354,650,389.27	0.73%	$ 2,912,259,997.48	6.03%	$ 4,223,840,012.28	8.74%	2.71%
	Semana 18	25/12/2022	31/12/2022	$ 443,579,783.00	0.92%	$ 11,483,238.09	0.02%	$ 3,355,839,780.48	6.94%	$ 4,235,323,250.37	8.76%	1.82%

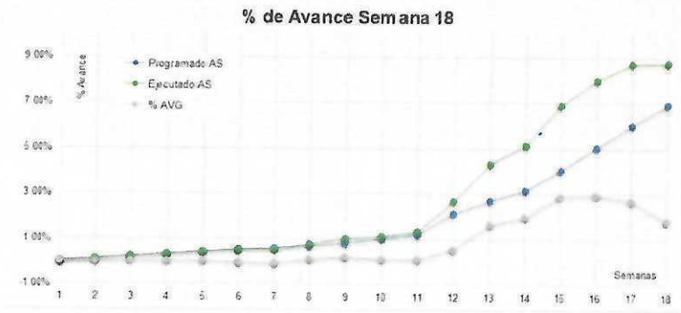

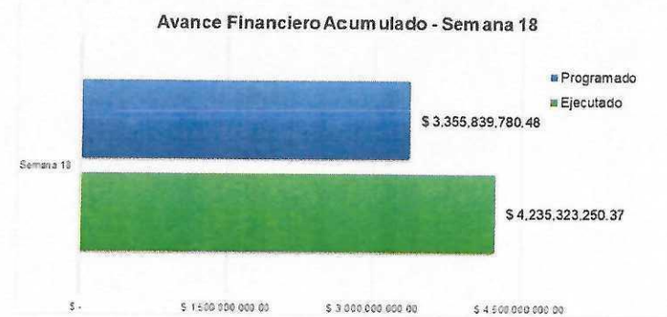

4856

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 18 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA LOMA GRANDE	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO X

OBSERVACIONES: POR MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS, LAS CANTERAS PRESTARON SUS SERVICIOS HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2022 Y RETOMARÁN LABORES A MEDIADOS DE ENERO 2023.
SE TIENE PENDIENTE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA ENTREGA DE LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA CANTERA VILLA CARMEN.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	105	28
PERSONAL PROFESIONAL:	25	19
PERSONAL TÉCNICO	17	9
SUBCONTRATISTAS	63	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 133

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: EN EL CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: NO ES NECESARIO LA ADQUISICIÓN PREDIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

VII. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA SEMANA

*** ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA**
- SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
- REVISIÓN DE ÓRDENES DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO DE OBRA
- INSPECCIÓN No. 8 DEL PGIO DEL CONTRATISTA DE OBRA
- REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO ENVIADOS POR EL CONTRATISTA SOBRE LA CARACTERIZACION DEL MATERIAL SELECCIONADO COLOR HABANO CLARO, PIEDRA RAJÓN Y CERTIFICADO DE CALIDAD DEL ACERO DE REFUERZO

VIII. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA EN LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD
3.01.01	EXCAVACION MANUAL
3.01.03	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


ITEM	ACTIVIDAD
	EXCAVACION MANUAL
	S/I DE ENTIBADO (APUNTALAMIENTO EN LAMINA METALICA)
	SOLADO CONCRETO DE 152 MPA (2200 PSI)
3.01.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.14.03	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION
3.18.04	PILOTE PREFABRICADO EN CONCRETO DE 3500PSI SECCION 04X04M INCLUYE ACERO, HINCADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION

4854

MONTERÍA	INFORME SEMANAL No. 18 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA-SPM-016-2022 CONSORCIO KALAR MONTERÍA 016	CÓDIGO	MEPHMN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINAS	4

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

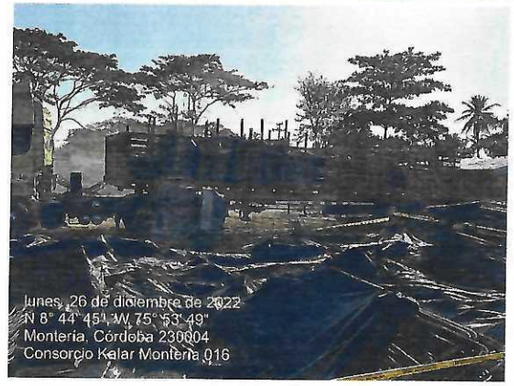


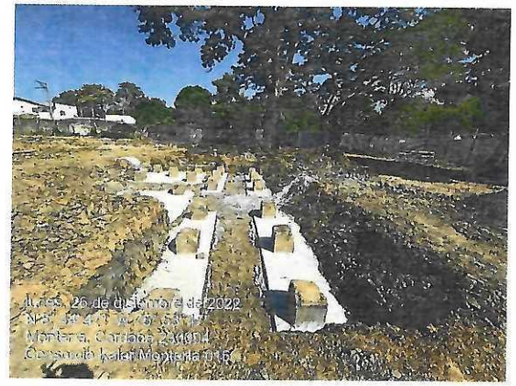







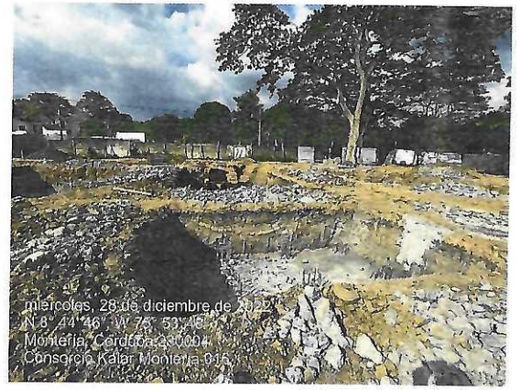

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE ALFREDO CABARCAS BUELVAS

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista y Entidad ejecutora

4858

CONSORCIO CIS 56

INFORME GESTIÓN SOCIAL No. 4

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"



MONTERIA - DICIEMBRE- 2022

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

INTRODUCCION 3
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 4
1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD. 4
1.2 BUZÓN: 5
1.3 TICS: 6
2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 6
2.1. APOYO A LA COMUNIDAD: 6
3. PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 8
4. PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 10
5. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A TRABAJADORES Y COMUNIDAD 11

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

INTRODUCCION

El Plan de Gestión Social (PGS), pretenden como primera medida hacer que la población participe directamente en los procesos que se llevarán a cabo por las empresas contratistas haciendo uso del recurso legal de participación ciudadana; el proceso de comunicación entre diversos actores sociales que buscan transformar mediante acciones concretas una relación socio-ambiental para el mejoramiento de la calidad de vida de la población; asimismo el desarrollo de proyectos de **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.** Mejoran el entorno social y físico, facilita las condiciones de vida, que están mediadas por los recursos económicos, para obtener un mejor nivel de vida y alcanzar un desarrollo sostenible. Por último los contratistas de obras civiles deben tener en cuenta que el Plan de Gestión Social de Obras es un instrumento de planificación que busca garantizar la participación activa y el compromiso de la comunidad, y de los trabajadores para el empoderamiento de la infraestructura del proyecto.

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
No. CONTRATO	CONTRATO LP-SPM-017-2022
PERIODO	DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS

Gestión Social en coordinación con el equipo interdisciplinario: Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio CIS 56; Para el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre desarrolló los siguientes programas para llevar a cabo las actividades contempladas en el del Plan de Gestión Social (PGS):

1. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LA COMUNIDAD.

OBJETIVO: Mantener un canal de comunicación asertivo con la comunidad a través participación Institucional y comunitaria en los programas a desarrollar.

ACTIVIDADES:

Con el acompañamiento de Trabajo social de la Interventoria Consorcio KALAR Montería 016, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre se continuó con la atención al ciudadano en la oficina ubicada dentro del campamento de la obra en la Calle 6 No. 1E-94 del barrio la Coquera.

Para el periodo comprendido del 01 al l 30 de diciembre de 2022, se recibieron 21 hojas de vida, mano de obra no calificada y calificada de la Región.

VER ANEXO No. 1 (FORMATO DE RECEPCIÓN HOJAS DE VIDA)

REALACIÓN DE HOJAS DE VIDA RECEPCIONADAS FISICAMENTE.

NOMBRES Y APELLIDOS	OCUPACION Y/O CARGO QUE ASPIRA	No. CELULAR	MEDIO DE RECEPCIÓN
LUIS CARLOS ROJAS MARTINEZ	OFICIOS VARIOS	3228975110	FISICO
ADNER DAVID ROJAS MALLUK	AYUDANTE OBRA	3246274177	FISICO
CARLOS ALBERTO ESPITIA ESPITIA	OFICIOS VARIOS	3042900307	FISICO
JESUS MANUEL VEGA BURGOS	OFICIOS VARIOS	3117723782	FISICO
FREDY ANONIO CANO	OFICIOS VARIOS	3205398571	FISICO
TIRSA ELENA MORENO GONZALZ	OFICIOS VARIOS	3013968520	FISICO
JAIRIANA VENESSA ARTEAGA CUADRADO	OPERARIA SERVICIOS GENERALES	3013681561	FISICO
MARIO JOSE HERNANDEZ TIRADO	OPERARIO SERVICIOS GNERALES	3145827194	FISICO
MARLON ANTONIO RIVEROS PEREIRA	MAESTRO OFICIAL DE CONSTRUCCION	3226799943 3113533928	FISICO

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

ALCIDES SEGUNDO RIVAS CONTRERAS	MAESTRO DE OBRA	3003704426- 3127753138	FISICO
KELLY JOHANA HEREDIA AVILEZ	OFICIOS VARIOS	3135930298	FISICO
JOSE RODRIGO VASQUEZ CHAVZ	OPERADOR MAQUINARIA LIVIANA	3005642044	FISICO
FARID LEONARDO CARO ALEMAN	AYUDANTE D OBRA	3136034069	FISICO
MANUEL JOSE MACIAS VILORIA	PLOMERIA Y OFICIOS VARIOS	3003292532	FISICO
LEONARDO JOSE RIVERA SARMIENO	AYUDANTE DE OBRA	3216757532	FISICO



RECEPCIÓN DE HOJA DE VIDA (2-12-2022)



RECEPCIÓN DE HOJA DE VIDA (27-12-2022)

1.2 BUZÓN: durante el periodo del 01 al 30 de diciembre permaneció el Buzón de sugerencia en la portería de la obra, para recepcionar la (PQRS), de los ciudadanos que se dirigen a la oficina en horario diferente al de la atención al ciudadano.

Como se puede evidenciar en acta de apertura del Buzón realizado los días 15 y 30 de diciembre de 2022, se realizó apertura del buzón de sugerencia bajo supervisión de la trabajadora social de la interventoría, Consorcio KALAR montería 016, y como testigos:

Para acta del 15 de diciembre la ingeniera ambiental y auxiliar de talento humano consocio Cis 56.

Para el acta del 30 de diciembre como testigos los Ingenios: José David López y José Otero.

(VER ANEXO No. 2 ACTAS DE APERTURA DE BUZÓN)

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social



APERTURA BUZÓN DE SUGERENCIA (15-12-2022)



APERTURA BUZÓN DE SUGERENCIA (30-21-2022)

1.3 TICS: dentro del plan de Gestión Social para dar cumplimiento a las tecnologías de la información y comunicación que se utilizarán con la comunidad por medio del correo electrónico establecido en el pendón informativo: atencion.usuarioscis56@mail.com. El cual la comunidad podrá utilizar para enviar las hojas de vida y/o cualquier solicitud, queja, reclamo o sugerencia.

Durante el periodo ges 01 al 30 de diciembre se recibieron seis (6) hojas de vida por este medio.

RELACIÓN DE HOJAS DE VIDA RECEPCIONADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO.

NOMBRES Y APELLIDOS	OCUPACION Y/O CARGO QUE ASPIRA	No. CELULAR	MEDIO DE RECEPCIÓN
LUZ CHARINE RODRIGUEZ LOZANO	ARQUITECTA	321 748 63 98.	VIRTUAL
MARTIN ALONSO MAUSSA VEGA	ARQUITECTO	3015410840	VIRTUAL
MANUEL ANTONIO VILLAREAL	LICENCIADO. EN GESTIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL	3105133648-3105147148	VIRTUAL
GUSTAVO ADOLFO MERCADO MORALES	ALBAÑIL	314 596 3790	VIRTUAL
OMAR YESID MESTRA FLOREZ	AYUDANTE DE OBA	3024495063	VIRTUAL
JORGE DAVID AGUILAR MESTRA	AUXILIAR SISO- ADMINISTRATIVO	3113095866	VIRTUAL

2. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

OBJETIVO: Brindar acompañamiento a las actividades realizadas por las comunidades aledañas al proyecto.

ACTIVIDADES

2.1. APOYO A LA COMUNIDAD: Para el día 16 de diciembre el Consorcio CIS 56, a través del equipo interdisciplinario realizo un compartir (Buñuelos y Natilla), con los niños del sector de ZARABANDA, acompañados con líder del sector de Santafé el señor Elkin Espitia y la señora Ledis Morelo Primera.

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social



COMPARTIR SECTOR ZARABANDA (16 12-2022)

Para contribuir al mejoramiento de las calles aledañas al proyecto, el Consorcio CIS56, se vinculó a la iniciativa del lider de la comunidad de Santafé. El señor Elkin Espitia con la adecuacion de la carrera 2B, vía principal entrada al sector. Con el perfilado de calle con el Vibro-compactador y la Pajarita. . Buscando con esta iniciativa que los residentes de la zona y comunidad en general, cuiden y eviten arrojar escombros en el sector.



MEJORAMIENTO CARRERA 2B SECTOR SANTAFE

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

3. PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

OBJETIVO

Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del proyecto.

Durante el periodo se ha realizado acompañamiento social a las actividades de la obra con los valores agregados que se generan la coordinación, participación comunitaria control, dirección; Permite señalar los factores que han influenciado, positiva o negativamente.

Durante este periodo Trabajo Social, recibió una solicitud y una queja, como se describe a continuación:

3.1 QUEJA: OLGA LOZANO: La señora Olga Lozana, interpone queja, manifestando que hace pocos meses estuco las paredes de un local comercial, el cual utiliza como Iglesia, según ciudadana el estuco ha presentado grietas a raíz de las vibraciones que se están generando en la obra.

- Esta queja se encuentra abierta, porque no se ha podido concertar visita al local, se ha visitado tres veces y el local se encuentra cerrado, se llamó vía telefónica a la señora Olga Lozano, estando en el local y se encontraba ocupada, se han realizado varias llamadas las que no han sido contestadas. (es de resaltar que la señora no reside en el predio)

(VER ANEXO No. 3)

3.2 SOLICITUD: REGIS AURELIO NERIO ROSARIO: el ciudadano realiza solicitud de colaboración económica a través de un comunicado, por encontrarse desempleado y presentar quebrantos de salud.

- En respuesta a la solicitud interpuesta por el señor REGIS AURELIO NERIO ROSARIO, se le informa que en primer acercamiento que el solicitante realizo al proyecto, muy amablemente se le entrego un mercado y prendas de vestir a través de los empleados.

Así mismo se le manifestó verbalmente que el proyecto no cuenta con rubros en el presupuesto para este tipo de peticion.

Se le informa que esta clase de solicitud la puede interponer ante l secretaria de gobierno municipal, por medio de esta dependencia podria sr favorecido con un subsidio si cumple con los requisitos de la ley.

(VER ANEXO No. 4)

3.3 RECLAMO: GLORIA LAGUNA: la ciudadana en mención interpone reclamación ante el CONSORCIO CIS 56, manifestando que por causa de las vibraciones del Hincado de los pilotes, el da 21 de diciembre más o menos a las 2:15 de la tarde se produjo desprendimiento de las gabinetes de la cocina. También ha presentado pronunciamiento a grietas existente en pared lado d la ventana de la sala en parte interna.

(VER ANEXO No. 5)

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

3.4 QUEJA: YOLANDA LARA BONILLA: la ciudadana manifiesta que en las paredes externa de la vivienda han presentado grietas, las cuales no existían.

(VER ANEXO No. 6)

3.5 PETICIÓN: YUDIS PEÑA AVILA: ciudadana realiza una petición se tome registro fílmico y fotográfico de la vivienda, ubicada en la manzana K lote 2 del barrio Simón Bolivar; porque en su predio no se realizó acta de inicio. Y se están presentando grietas a causa de las vibraciones surgidas en la obra.

(VER ANEXO NO. 7)

RECEPCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SOLICITUDES:

56 CONSORCIO CIS	SEGUIMIENTO A PQRS	Código: COSTPR60 Versión: 01 EDITADO: 30-10-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

RESPONSABLE: DELIA CARRILLO GONZALEZ **CARGO:** TRABAJADORA SOCIAL

ITEM	FECHA	NOMBRE PERSONAL ATENDIDO	DIRECCIÓN DEL CIUDADANO	CANAL DE RECEPCIÓN				DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	CLASIFICACION DE LA PETICION - SOLICITUD- QUEJA- RECLAMO-				ESTADO DE LA SOLICITUD		DESCRIPCIÓN DE ESTADO
				CORREO FLECT	FISICO	BUZON SAT	TEL/ WHATSAPP		P	Q	R	S	ABIERTO	CERRADO	
1	7/10/2022	MANUELA CAROLINA BRUNO	CARRERA 2 No. 6-30 LA COQUERA		X			REUBICACIÓN CANASTA DE LA BASURA				X		X	CERRADO 20-10-2022
2	27/10/2022	LUIS CARLOS MANGONES	PARCELAS SIERRA CHIQUITA		X			DEPOSITO MATERIAL SOBRANTE (TALA Y PODA) DEPOSITADA EN LA VIA PUBLICA		X				X	CERRADO 28-10-2022
3	2/11/2022	JOSE MARIA GARCIA	CALLE 6 No. 1-49 LACOQUERA		X			VOLCO ENCARGADO RETIRO MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION, PARTIC ACOMETIDA DE ACOMETIDA DE ACUEDUCTO		X				X	CERRADA 04/11/2022
4	11/11/2022	CESAR AUGUSTO CAMELO PEREZ	CALLE 6 No. 1-21 LA COQUERA		X			CAIDA DE CUADRO SEGUN CIUDADANO PRODUCTO DE LAS VIBRACIONES			X			X	CERRADA 02/12/2022
5	11/11/2022	ROY HAYLOCK	CALLE 6 No. 1-49 LA COQUERA		X			CAIDA DE TELEVISOR SEGUN CIUDADANO PRODUCTO DE LAS VIBRACIONES			X			X	CERRADA 02/12/2022
6	23/11/2022	ALBERT ALEXANDER ROMAN CASTAÑO	MANZANA H LOTE 9 SIMON BOLIVAR		X			REALIZAR ACTA DE VECINDAD EN PRESENCIA DEL CIUDADANO				X		X	CERRADA 23/11/2022
7	1/12/2022	OLGA LOZANO	CARRERA 1 No. 1-64 LA COQUERA		X			PAREDES CON GRIETAS		X			X		NO SE HA PODIDO CONCETAR VISITA PARA VERIFICACIÓN TÉCNICA
8	15/12/2022	REGIS AURELIO NERIO ROSARIO	ZARABANDA		X			COLABORACIÓN ECONÓMICA				X		X	CERRADA 04/01/2023
9	21/12/2022	GLORIA LAGUNA	CALLE No. 1-39 LA COQUERA		X			CAIDA DE GABINETES D LA COCINA			X		X		PENDIENTE REVISIÓN TÉCNICA
10	22/12/2022	YOLANDA LARA BORJA	MANZANA H LOTE 9 SIMON BOLIVAR		X			PAREDES AGRIETADAS		X			X		PENDIENTE REVISIÓN TÉCNICA
11	22/12/2022	YUDIS PEÑA AVILA	MANZANA K LOTE 2 SIMON BOLIVAR		X			PAREDES AGRIETADAS	X				X		PENDIENTE REVISIÓN TÉCNICA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

4. PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL

Durante el periodo del mes de diciembre el Consocio CIS 56, no realizo contratación de personal directamente; la vinculación se realizó a través de subcontratista.

La contratación se realizó a través de un subcontratista; Contratación de mano de obra calificada un total de 11 empleados, contratación mano de obra no calificada 18 empleados para un total de 29 empleados contratados durante el mes de diciembre., como se detalla en tabla anexa.

4.1 PERSONAL CONTRATADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE EMPLEADO	EMPRESA SUBCONRATISTA	CARGO
JUAN DARIO ESCOBAR AGUADO	JOSE DAVID PEREZ	INSPECTOR SST
	EMPRESA SUBCONRATISTA	
ANDY FABIAN SIERRA GARCIA	MEGAEQUIPOS	OPERADOR DE TALADRO
JAIME JOSE TORRES		OPERADOR DE TALADRO
NEMESIO PEREIRA		CONDUCTOR
NOMBRE EMPLEADO	**EMPRESA SUBCONRATISTA**	**CARGO**
LUIS JARAMILLO LOPEZ	ROBER REVUELTA	AYUDANTE
LUIS CONTRERAS DE HOYOS		AYUDANTE
ROBER REVUELTA ECHEVERRIA		MAESTRO
OSCAR GALARCIO GONZALEZ		AYUDANTE
ROBER LUIS VELEZ BALLESTA		AYUDANTE
SAMUEL LOPEZ GARCIA		AYUDANTE
YADER CORDERO HOYOS		AYUDANTE
ELIECER GALARCIO GONZALEZ		AYUDANTE
EDUER GOMEZ ANDRADE		OFICIAL
JESUS LARA BUELVAS		MAESTRO
DEIMER CORDERO		AYUDANTE
OSVALDO GALARCIO		AYUDANTE
NOMBRE EMPLEADO	**EMPRESA SUBCONRATISTA**	**CARGO**
JORGE ELIECER LOPEZ GONZALES	WILFRIDO LOPEZ	MAESTRO
WILLIAN VILLERA SAENZ		AYUDANTE
JAVIER ENRIQUE YORENTE MORALES		AYUDANTE
JAVIER MARTINEZ MENDOZA		AYUDANTE
FEDERICO LOPEZ MENDOZA		AYUDANTE
DANILO JOSE RIVERO BOHORQUEZ		AYUDANTE
CARLOS MARIO RIVERO CASTRO		AYUDANTE
MAURICIO QUINTANA		OFICIAL
MARTIN HERNANDEZ TUBERQUIAS		AYUDANTE
SAMIR AYAZO AGUIRRE		AYUDANTE
JUAN CARLOS MARZOLA LEON		AYUDANTE
NOMBRE EMPLEADO	**EMPRESA SUBCONRATISTA**	**CARGO**

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

ALEXIS VARGAS FLOREZ	EQUIPOS CORDOBA	OPERADOR MINI CARGADOR
NOMBRE EMPLEADO	EMPRESA SUBCONRATISTA	CARGO
JOAQUIN EDUARDO ARTEAGA SEPULVEDA	MAQUICIVIL	OPERADOR DE MAQUINA

5. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A TRABAJADORES Y COMUNIDAD

OBJETIVO

El profesional social hará parte de la agenda de capacitaciones a trabajadores, instalada en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental con temas relacionados con la convivencia laboral y el relacionamiento con la comunidad, y otros que se consideren pertinentes.

Durante el periodo del mes de diciembre el área de Gestión Social realizó dos charlas sociales dando cumplimento a lo establecido en el cronograma de

ACTIVIDAD	FECHA
MIRAR ANTES DE ACTUAR	15 DICIEMBRE DE 2022
RESOLUCIÓN DE CONFLICTO	29 DE DICIEMBRE DE 2022

5.1 MIRAR ANTES DE ACTUAR: se enfoca la charla desde el punto de vista social, done los comportamientos de nuestros padres, durante nuestra niñez siempre nos decían; ten cuidado para cruzar la calle, mirar para ambos lados, ten cuidado al subir a un árbol, te vayas a caer; o al entrar a la cocina ten cuidado con las ollas calientes.

De una u otra manera siempre estaban Cuidando, Alertando, Nos prevenían; para mantener nuestra integridad física estable.

Es así como en nuestro trabajo, o en toda actividad humana que realizamos debemos considerar el hecho de MIRAR SIEMPRE ANTES DE ACTUAR.

Cada trabajador debe ser precavido y previsto. Ya que un trabajador imprevisto es un peligro para él y para su entono. Un trabajador previsto o precavido es muy valioso para le empresa, por que brinda confianza, seguridad ante muchas cosas.

5.2 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Es importante para los trabajadores identificar que es un conflicto: Es una situación donde las partes involucradas perciben, con razón o sin ella que no les es posible alcanzar sus intereses, expresar sus puntos de vista, defender sus valores sin perjudicar en algún sentido los interese, puntos de vista o valores de otras personas.

Los conflictos son situaciones comunes en la vida de todas las personas y pueden estar presentes en cualquier ámbito: en la escuela, la universidad, en el trabajo y la familia.

Sin embargo no por ser comunes resultan agradables.

Los conflictos suelen despertar en nosotros una gama de emociones indeseadas como:

Ansiedad – Incertidumbre – Preocupación – Ira – Tristeza, hasta llegar a la depresión.

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

(VER ANEXO No. 4 LISTADO ASISTENCIA A CHARLAS)

	
CHARLA MIRAR SIEMPRE ANTES DE ACTUAR (15-12 2022)	CHARLA RESOLUCION DE CONFLICTTO (29-12-2022)

DELIA CARRILLO GONZALEZ

TP.205885015

Trabajadora Social consorcio CIS56

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

ANEXOS.

Anexo No. 1 (Formato de Recepción de Hojas de Vida)

Anexo No 2. (Acta apertura Buzón de sugerencia)

Anexo No. 3 (queja Olga Lozano)

Anexo No. 4 (Solicitud Nerio Regis)

Anexo No. 5 (Reclamo Gloria Laguna)

Anexo No. 6 (Queja Yolanda Lara)

Anexo No. 7 (petición Yidis Peña)

Anexo No. 8 (listado asistencia a charlas)

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

ANEXO No. 1.

FORMATO DE RECEPCIÓN DE HOJAS DE VIDA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

56

CONSTRUCCIÓN

CONTRATO MARCO LP-SPM-017-2022 "CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FORMATO DE RECEPCION Y RELACION DE HOJAS DE VIDA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MUNICIPIO: MONTERIA FECHA: 21 al 30 de Diciembre 2022

DATOS BASICOS DEL ASPIRANTE			TELS. CONTACTO	INFORMACION DEL CARGO	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA HOJA DE VIDA (ARL, PENSIÓN , SALUD, DIPLOMAS, ETC)	OBSERVACIONES ADICIONALES
ITEM	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN		CARGO AL QUE ASPIRA		
1	Luis Carlos Reyes Martinez	Mz 1 Lot 13 Simon Bolivar	3228945110	Ayudant Obra	Fot Cedula Cert Estudio Cert laboral	
2	Dener David Reyes Mallouk	Tv 29 # policarpa	3246274177	Ayudant Obra	Fot Cedula Cert Estudio	
3	Carlos Alberto Espitia Espitia	San Isidro Via T/Alta	3044[illegible]3017	Ayudant obra	Fot Cedula	
4	Jesus Manuel Vega Burgos	San Isidro Via T/Alta	3117723782	Ayudant obra	Fot Cedula Cert Estudios Experiencia Prof.	
5	Fredy Antonio Cano	El Primitivo Calle 1	3205398571	Ayudant obra	Fot. Cedula Antecedentes	
6	Luz Charine Rodriguez Lozano	Cra 1B # G-45	3217486398	Arquitecta	Tarjeta Profesional Cert Estudio	VIRTUAL
7	Martin Alonso Mussu Vega	Cl 22 # 2-19 Centro	3015410840	Arquitecto	- o -	VIRTUAL
8	Omar Yesid Acosta Ibarra	TV 1B Sur # G-30 B. Bolivar	3024895063	Ayudant obra	Fotocopia Cedula	VIRTUAL

4696
4842

CONSORCIO CIS 56

CONTRATO MARCO LP-SPM-017-2022 "CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FORMATO DE RECEPCION Y RELACION DE HOJAS DE VIDA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MUNICIPIO: MONTERIA FECHA: 12 AL 17 de Diciembre 2022

DATOS BASICOS DEL ASPIRANTE			TELS. CONTACTO	INFORMACION DEL CARGO	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA HOJA DE VIDA (ARL, PENSION, SALUD, DIPLOMAS, ETC)	OBSERVACIONES ADICIONALES
ITEM	NOMBRE COMPLETO	DIRECCION		CARGO AL QUE ASPIRA		
9	Lisa Elena Moreno Gonzalez	Mz 13 Cl 15 Santa Fe	3139649520	Oficios Varios Paletera	Fot Cedula	
10	Mario Jose Hernandez Tirado	Cll 4 # 1-19 Brisas del Sinu	3145827194	Oficial de obra	Fot Cedula	
11	Jairima Vanessa Arteaga Coutado	Mz 24 22 Santa Fe	3012681561 3135692006	Operario Servicios Generales	Fot. Cedula	
12	Marlon Antonio Rivadios Pacheco	Mz 23 Cl 9 Brisas del Sinu	3227699443 3113533928	Maestro Oficial Construccion	Fot cedula	
		Semana del 19 - al 24 de Diciembre de 2022				
13	Manuel Villareal	Mz Nuevo 26-25 El bosque	3105133648 3105147148	Gestion Evaluacion Ambiental	-o-	Manzanillo - Virtual
14	Jorge David Aguilar Mestra	Mz 18 Cl 11 Santa Fe	3113095866	Dex Salmon Dex 5150	Fot. Cedula Cert. Estudios Ref. personal	Virtual
15	Gilberto Adolfo Mercado Tovar	Mz 20 Cl 8 Santa Fe	3145963790	Ayudante obra	Fot Cedula	Virtual
16	Acidas Segundo Ruiz Contreras	Terapalta	3003901426 3127153138	Maestro de obra	Fot cedula Cert laboral	
17	Kelly Johana Hernandez Avilez	Mz E Cl 3, Brisas Sinu	3135930298	Oficios Varios	Fot. Cedula Cert. laboral	

4794
4893

CONSORCIO CIS 56

CONTRATO MARCO LP-SPM-017-2022 "CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA"

FORMATO DE RECEPCION Y RELACION DE HOJAS DE VIDA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA

MUNICIPIO: MONTERIA FECHA: 26 al 31 de Diciembre/2022

DATOS BÁSICOS DEL ASPIRANTE			TELS. CONTACTO	INFORMACIÓN DEL CARGO	DOCUMENTOS SOPORTE DE LA HOJA DE VIDA (ARL, PENSION, SALUD, DIPLOMAS, ETC)	OBSERVACIONES ADICIONALES
ITEM	NOMBRE COMPLETO	DIRECCIÓN		CARGO AL QUE ASPIRA		
18	Jose Pablo Hierro Chavez	Cll 2 #12 27 Mz 28 Sinu Fé	3005542044	Operador Maquinaria	Fotocopia Cedula Certificados	
19	Yarel Leonardo Cano Alvarez	Cerete	3135071051	Auxiliar obra	Fotocopia Certificados	
20	Manuel José Mucius Villarreal	Minuto de Dios	3003292532	Ayudante de plomeria	Fotocopia Cedula Certificados	
21	Leonardo José Rivera Bermudez	Casita Nueva	3216757532 3216151532	Ayudante obra	Fotocopia Cedula Certificados	

4698
4274

ANEXO No 2.

ACTAS APERTURA BUZÓN DE SUGERENCIA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

4624
4875

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

CONSORCIO CIS 56

ACTA DE APERTURA REVISIÓN BUZÓN DE SUGERENCIA
No. 2

Ciudad: Montería	Fecha: 15-12 -2022	Lugar: Campamento de la Obra
Dirección: Calle 6 No 1E-94 la Coquera		

ASISTENTES		
Nombre	**Apellido**	**Cargo**
CINDY KERENA	PORRAS PEREZ	INGENIERA AMBIENTALA CONSORCIO CIS 56
MARIA CAMILA	PAJARO VEGA	AUX. TALENTO HUMANO CONSOCIO CIS 56
DELIA	CARRILLO GONZALEZ	PROFESIONAL SOCIAL CONSORCIO CIS 56
ELIANA	PEREZ ECHENIQUE	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

OBJETIVO:

Revisar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS) entregadas por el ciudadano a través del buzón de sugerencias en la unidad de Información antes relacionada, para proceder con su trámite, dando una oportuna respuesta en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Siendo las 15 horas del 15 diciembre de 2022, se procede con la apertura del buzon de sugerencias, para hacer el registro de las PQRSF recibidas por este medio, en el transcurso de las semana comprendidas entre el 28 de noviembre al 15 de diciembre , en presencia del (los) testigo(s)que suscribirán la presente Acta.

1. Se verifica el contenido del buzón, y se procede a clasificar, contar, foliar y registrarlas PQRSF depositadas en el, incluyendo las que tengan datos completos e incompletos.

REGISTRO DE FORMATOS PQRS			
Tipo de Solicitud	**CON datos**	**SIN datos**	**Total**
Petición	0	0	0
Queja	0	0	0
Reclamo	0	0	0
Solicitud	0	0	0
Otra	0	0	0
Totales			0

4630
4876

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

CONSORCIO CIS 56

2. Una vez identificadas las PQRS que tienen datos completos o por lo menos la información mínima para dar respuesta al ciudadano, se registran en esta acta y se enviandigitalizadas el mismo dia al correo electrónico atencion.usuarios56@gmail.com para ser radicadas y distribuidas a la dependencia competente de su respuesta, en relación a su naturaleza.

DATOS DEL USUARIO					
No.	**Nombre Completo**	**Cédula**	**Dirección**	**Teléfono**	**e-mail**
1					
2					
3					
4					
5					

3. Esta acta de apertura de buzón, se archivará en el Archivo Documental, en la carpeta deActas de Apertura de Buzon de Sugerencias, a la cual le quedan adjuntas las PQRS, que no contengan informacion para responderselle al ciudadano, por lo cual no se les da ningun trámite; pero si se tendrá en cuenta las sugerencias recibidas a fin de mejorar el servicio.

4. Las PQRS, después de haber sido atendidas iran a una carpeta fisica que a su vez hace parte del archivo documental, denominada "Sugerencias Atendidas". Asi mismo hace la recepción y radicación de la respuesta por parte del área competente, y la entrega de respuesta al ciudadano. Una vez finalice el trámite se archiva en el expediente respectivo la solicitud con su respuesta en Gestión documental.

Siendo las 15:00 horas, firmando quienes intervenimos en el presente Acto:
Firman:

Responsable Apertura del Buzon

Testigo 1 Cindy Kerena Porras.

Testigo. 2 Maria Camila Pajaro Vega

Aprobó: Eliana Paez Echenique
TRABAJADORA SOCIAL INTERVENORIA

4634
4877

MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

CONSORCIO CIS 56

ACTA DE APERTURA REVISIÓN BUZÓN DE SUGERENCIA
No. 3

CIUDAD: Montería	FECHA: 30-12 -2022	LUGAR: Campamento de la Obra
Dirección: Calle 6 No 1E-94 la Coquera		

ASISTENTES		
Nombre	**Apellido**	**Cargo**
JOSE DAVID	LOPEZ ÁLVAREZ	INSPECTOR DE OBRA 2
JOSE DAVID	OTERO RESTREPO	ALMACENISTA
DELIA	CARRILLO GONZALEZ	TRABAJADORA SOCIAL CONSORCIO CIS56
ELIANA	PEREZ ECHENIQUE	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA CONSORCIO KALAR MONTERIA 016

OBJETIVO:

Revisar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias (PQRS) entregadas por el ciudadano a través del buzón de sugerencias en la unidad de información antes relacionada, para proceder con su trámite, dando una oportuna respuesta en los términos establecidos en la normatividad vigente.

Siendo las 16 horas del 30 diciembre de 2022, se procede con la apertura del buzón de sugerencias, para hacer el registro de las PQRSF recibidas por este medio, en el transcurso de las semana comprendidas entre el 15 al 30 de diciembre, en presencia del (los) testigos No. 1. JOSE DAVID LÓPEZ ÁLVAREZ, testigo No. 2. JOSE DAVID OTERO RESTREPO; que suscribirán la presente Acta.

1. Se verifica el contenido del buzón, y se procede a clasificar, contar, foliar y registrarlas PQRSF depositadas en él, incluyendo las que tengan datos completos e incompletos.

REGISTRO DE FORMATOS PQRS			
Tipo de Solicitud	**CON datos**	**SIN datos**	**Total**
Petición	0	0	0
Queja	0	0	0
Reclamo	0	0	0
Solicitud	0	0	0
Otra	0	0	0
Totales	0	0	0

2. Una vez identificadas las PQRS que tienen datos completos o por lo menos la información mínima para dar respuesta al ciudadano, se registran en esta acta y se enviandigitalizadas el mismo dia al correo electrónico atencion.usuario56@gmail.com para ser radicadas y distribuidas a la dependencia competente de su respuesta, en relación a su naturaleza.

DATOS DEL USUARIO					
No.	Nombre Completo	Cédula	Dirección	Teléfono	e-mail
1					
2					
3					
4					
5					

3. Esta acta de apertura de buzón, se archivará en el Archivo Documental, en la carpeta deActas de Apertura de Buzón de Sugerencias, a la cual le quedan adjuntas las PQRS, que no contengan información para respondérsele al ciudadano, por lo cual no se les da ningún trámite; pero si se tendrá en cuenta las sugerencias recibidas a fin de mejorar el servicio.

4. Las PQRS, después de haber sido atendidas irán a una carpeta física que a su vez hace parte del archivo documental, denominada "Sugerencias Atendidas". Así mismo hace la recepción y radicación de la respuesta por parte del área competente, y la entrega de respuesta al ciudadano. Una vez finalice el trámite se archiva en el expediente respectivo la solicitud con su respuesta en Gestión documental.

Siendo las 16:00 horas, firmando quienes intervenimos en el presente Acto:
Firman:

Responsable Apertura del Buzón

José David Lopez A.

Testigo. 1

Testigo. 2

Aprobó: Gloria Pérez Enriquez

TRABAJADORA SOCIAL INTERVENTORIA

ANEXO No. 3

QUEJA OLGA LOZANO

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

~~4633~~
4879

56 CONJUNTO CIS	FORMATO DE PETICIONES – QUEJAS RECLAMOS- SOLICITUDES- FELICITACIONES	

DATOS PERSONALES

FECHA (Dia/mes/año)	Dic 1/ 2022	TIPO IDENTIFICACIÓN	CC	X	CE	
NOMBRE COMPLETO	Olga Lozano	N° IDENTIFICACIÓN	68.289.981			
CARGO		E-MAIL				
TELÉFONO/CELULAR	317370 2416	FIRMA				

Kr. 1 # 6-64 Cogua.

INFORMACIÓN DE LA PQRSF

(MARQUE CON UNA X)

* **Petición**: Pedir algo con un interes general o particular * **Queja**: Manifestacion de protesta descontento o inconformidad en relacion a algo que considera irregular * **Reclamo**: Declaración formal para reclamar un derecho negado o retardado *Solicitud: Consultar información de procesos * **Felicitaciones**: Expresar su satisfacción por los procesos o actuaciones especificas de la empresa

PETICIÓN		QUEJA	X	RECLAMO		SOLICITUD		FELICITACIÓN	
		OTRO		¿CUAL?					

DESCRIPCION DE LA PQRSF

Según Usuario realizo estucado del local hace más ó menos 5 meses y por causa de las Vibraciones de los pilotes se han agrietado las paredes.
el dia domingo evidenciaron las grietas. (domingo 27 de noviembre).
Se transkito queja al cerca Civil.

CONDOMINIO CIS 56, se compromete a dar tratamiento adecuado a la información consignada, garantizando el cumplimiento de la ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, y el derecho a la confidencialidad

ANEXO No. 4

SOLICITUD NERIO REGIS

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

~~4634~~
4880

MONTERIA DICIEMBRE 15 DEL 2022

Sr(es) INGENIEROS E INGENIERAS.

E.....S.....D.

A S U N T O: **COLABORACION ECONOMICA.**

L.C.

CORDIAL SALUDO.

POR MEDIO LA PRESENTE ME PERMITO DIRIGIRME ANTE USTEDES PARA SOLICITARLES LO SIGUIENTE: SIRVANSE ORDENAR A QUIEN CORRESPONDA EN GESTSIONARME LO CONCERNIENTE A UNA **COLABORACION ECONOMICA**; DEVIDO A MI QUEBRANTOS DE SALUD YA QUE ACTUALMENTE NO ESTOY LABORANDO Y ADEMAS SOY DESPLAZADO DE PUERTO LOLPEZ ANTIOQUIA.

DE ANTEMANO AGRADECIENDOLES EL INTERES DADO A LA MISIVA Y DESEANDOLES QUE DIOS LES MULTIPLIQUE ESA PEQUEÑA COLABORACION.

ANEXO: FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

Recibí Folios 6.
T. Social
Dic. 15/2022.
Hora. 9:50 am.

ATENTAMENTE:

REGIS AURELIO NERIO ROSARIO

C.C. Nº 6.877.946 Monteria Córdoba.

Celular 3128643830

Montería, 4 de enero de 2023.

C-CIS56-049-2023

Señor
Regis Aurelio Nerio Rosario
C.C N° 6.877.946 de Montería
La Ciudad.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° LP-SPM-017-2022 Cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA."

Asunto: **Respuesta a Petición de Colaboración Económica**

Respetado Señor Nerio,

El día 21 de octubre del 2022 el consorcio CIS 56 atendiendo al primer acercamiento que usted realizo a nuestro proyecto, muy amablemente le entrego un pequeño mercado y prendas para vestir a través de sus empleados.

Así mismo se le manifestó verbalmente que el proyecto no cuenta con rubros en el presupuesto para este tipo de petición, por lo cual no es procedente realizarla

Por todo lo anterior le informo que puede presentar su solicitud ante la secretaria de gobierno municipal, pues en esta dependencia podría ser favorecido con un subsidio si cumple con los requisitos de ley.

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ NORIEGA
Representante Legal
CONSORCIO CIS 56

ANEXO No.5

RECLAMO GLORIA LAGUNA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

4636
4882

CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE
Montería - Córdoba

FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD Y/O SUGERENCIAS

FECHA DE RECEPCIÓN	21 de diciembre de 2021
NOMBRES Y APELLIDOS	Gloria Laguna
No. CELULAR	3188518864
CORREO ELECTRÓNICO	jcaruachun1968@hotmail.com
BARRIO	Cll 6 # 5-39 La Coquera

SEÑALE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

PETICIÓN		**QUEJA**	
RECLAMO	X	**DENUNCIA**	
SUGERENCIA		**SOLICITUD**	

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS, A CONTINUACIÓN, DESCRIBA SU OBSERVACIÓN:

Señora Gloria Laguna hace reclamo porque se le cayo Gabinetes de la cocina, más o menos a las 2:15 pm por las Vibraciones que se sentian al momento del Hincado de los pilotes.
Igual forma se han pronunciado Vecinos en general del Barrio, para notificar lo sucedido de la Vereda de la Casa en igual Punto Posterior.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL SOCIAL:

Helen Revollo Gonzalez
C.C. 50 896 873

NOMBRE Y FIRMA DEL CIUDADANO:

x Gloria Laguna
50892861

ANEXO No.6

QUEJA YOLANDA LARA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

~~4687~~
4882

CONSORCIO CIS 56

CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE
Montería - Córdoba

FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD Y/O SUGERENCIAS

FECHA DE RECEPCIÓN	22 Diciembre
NOMBRES Y APELLIDOS	Yolanda Sara Borja
No. CELULAR	3205178604
CORREO ELECTRÓNICO	— —
BARRIO	Manzana 41 Lot 9. Simon Bolivar

SEÑALE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

PETICIÓN		**QUEJA**	X
RECLAMO		**DENUNCIA**	
SUGERENCIA		**SOLICITUD**	

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS, A CONTINUACIÓN, DESCRIBA SU OBSERVACIÓN:

La Señora Yolanda manifiesta que en parcelas externas se han abierto unas grietas en la pared, la cual no existian, en predios de la Vivienda.

Se revisara Video de acta inicial para dar respuesta

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL SOCIAL:

Efolia Camilo C.

NOMBRE Y FIRMA DEL CIUDADANO:

Yolanda

34.965423

ANEXO No.7

PETICIÓN YUDIS PEÑA

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

~~4638~~
4883

CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIOS (CIS) AHORA LA GENTE
Monteria - Cordoba

FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUD Y/O SUGERENCIAS

FECHA DE RECEPCIÓN	22 de diciembre / 2022
NOMBRES Y APELLIDOS	Yudis Peña Avila
No. CELULAR	3135364787
CORREO ELECTRÓNICO	
BARRIO	Manzana K 6k 2 Simon Bolivar

SEÑALE CON UNA X SEGÚN CORRESPONDA

PETICIÓN	X	**QUEJA**	
RECLAMO		**DENUNCIA**	
SUGERENCIA		**SOLICITUD**	

SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA EL MEJORAMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS, A CONTINUACIÓN, DESCRIBA SU OBSERVACIÓN:

Usuaria solicita se tome registro fotografico de las viviendas, porque ella manifiesta que las grietas que tenia la vivienda se estan pronunciando mas por las vibraciones que se estan generando en la obra.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROFESIONAL SOCIAL:

NOMBRE Y FIRMA DEL CIUDADANO:

Yudy Peña
1003026467

ANEXO No.8

LISTADO ASISTENCIA A CHARLAS SOCIALES

Elaboro. Delia Carrillo. Profesional Social

4639
4884

FORMATO CAPACITACION

Versión	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	CONSORCIO CIS 56
1		Nit: 901622733-8.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Charla MIRAR SIEMPRE ANTES DE ACTUAR		
EMPRESA RESPONSABLE:	CONSORCIO CIS 56	FECHA:	15 de DIC 2022
NOMBRE DE QUIEN LA LIDERA:	Delia Carrillo G	CARGO:	Trabajadora Social
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	10 MIN	LUGAR:	OBRA - CAMPAMENTO
OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	Socializar con los trabajadores del Consorcio CIS 56 normas de prevención de accidentes.		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	José David Otero R	Almacen	1069481937	
2	Grey Kelly Melendres Luna	Auxiliar de trafico	30688002	
3	Juan Carlos Lopez Montalvo	Aux Almacen	10767704	
4	Juan Jose Fuentes Vanegas	Auxiliar	1068650840	Juan Fuentes.
5	José D Pérez L	Resp. sisoma	3003261976	
6	José Miguel Fuentes Vanegas	Operador de Motoniveladora	1068656848	
7	Marcos Pinto	operadora	1.003.007.72	
8	Dario Pinto P	Aux. Topico	78029364	
9	Jose Sierra	Operador Maquina	6863510	
10	Dominguez PAEZ	Operador Maquina	70-537032	
11	Raul Daniel Arrieta Vega	Topografo	7383573	
12	LAURA CATALINA CHOCARLES ACOSTA	INSPECTOR SISOMA	1067454840	LAURA CCH
13	Luis Miguel Arroyo Toloza.	Auxiliar de Bulldozer	1042424413	
14	Dionicio Acosta.	Operador.	6864069	Dionicio A
15	Juan Darin Escobar A.	SISO	1067844424	
16	Eliana Pérez Echeniques	T. Social. Celular	50909243	
17				
18				
19				
20				

FIRMA DEL RESPONSABLE

4640
4885

FORMATO CAPACITACION

Versión		
1	"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"	CONSORCIO CIS 56 Nit: 901622733-8.

DATOS DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:	Resolucion de conflictos		
EMPRESA RESPONSABLE:	CONSORCIO CIS 56	FECHA:	29-12-2022
NOMBRE DE QUIEN LA LIDERA:	Dalia Carrillo G	CARGO:	Trabajadora Social
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:	10 MIN	LUGAR:	OBRA - CAMPAMENTO
OBJETO DE LA ACTIVIDAD:	Identificar las causas que originan los conflictos para asi tener una sana convivencia laboral		

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	CÉDULA	FIRMA
1	Javier Martinez Mendoza	Ayudant obra	1094296[illegible]	
2	Carlos Rivero Castro	" "	1.003393848	Carlos Rivero
3	Federico López Mendoza	" "	10 930 944	Federico L.
4	Yoarico Quintana	Oficial Obra	78.753 312	Quintana
5	Martin Hernandez Tubarquia	Ayudante	1.003594910	Martin H
6	Samir Ayuzo Aguirre	Ayudant	1.003002062	Samir Ayuzo
7	Juan Marcelo Leon	Ayudant	11.000324	
8	Robert Vele Ballesta	"	1.070821212	Robert vele
9	Eliecer Galarcio Gonzalez	"	15.646630	Eliecer Galar
10	Luis Jaramillo López	"	78.690.256	
11	Edwin Garcia	oficial	78706[illegible]	
12	YADER CARMONA FLOYDS	AYUDANTE	16.782653	
13	Luis Contreras	AY	11003283	Luis Contreras
14	Oscar A. Galarcio Gonzalez	AYUDANTE	1.064986.332	Oscar Galarcio
15	SAMUEL [illegible]	AYUDANTE	8173728	SAMUEL
16	JESUS LARA	MAESTRO	1.067.883941	
17	Robert Tarallas	Maestro	10.768.398	
18	Javier Enrique Florent	Ayudante	1.769962751	Javier
19	William villera.	ayudante.	1003407767	William V.
20	Eliana Perez Echenique	T social intervencion hab	50 909 243	

Dalia Carrillo G.b.

FIRMA DEL RESPONSABLE

INFORME AMBIENTAL No 4

Calle 48b # 9a – 82
Barrio Villa del Rio
Montería - Córdoba

Tel. (4) 795 3616
Cel. 320 267 0511

contactocis56@gmail.com

4886 4641

INFORME MENSUAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

DICIEMBRE

CONSORCIO CIS 56

PROYECTO:

"CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA"

MONTERÍA

DICIEMBRE DE 2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **4**

1. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL **5**

1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 5

1.1.1 Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables 5

1.1.2 Residuos peligrosos. 8

1.1.3 Residuos de la construcción y demolición. 9

1.2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 11

1.2.1 Emisión fugitiva de material particulado. 11

1.2.2 Emisión de gases de combustión. 12

FIGURA 1 Tabla relación de volquetas mes de diciembre **12**

1.2.3 Generación de ruido. 12

1.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 13

1.3.1 Materiales de relleno y arrastre. 13

1.3.2 Almacenamiento de sustancias peligrosas. 13

1.4 PROTECCIÓN DEL SUELO. 14

1.4.1 Atención de derrames y limpieza de herramientas. 14

1.5 PROTECCIÓN DE CURSOS DE AGUA. 15

1.5.1 Vertimientos. 15

1.6 PROTECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 15

1.7 CONSUMO DE AGUA. 15

1.7.1 Baños. 17

1.8 APROVECHAMIENTO FORESTAL. 17

FIGURA 2 Tabla cantidad de árboles talados en el mes de Diciembre **19**

1.9 MANEJO DE FAUNA. 20

1.10 CAPACITACIONES AMBIENTALES 20

INDICE DE TABLAS

FIGURA 1 Tabla relación de volquetas mes de diciembre 12
FIGURA 2 Tabla cantidad de árboles talados en el mes de Diciembre 19

INDICE DE IMÁGENES

Imagen 1 Punto Ecológico 6
Imagen 2 Residuos sólidos en presentación para recolección 6
Imagen 3 Barrido de áreas comunes por la BOAL 7
Imagen 4 Limpieza de algunas áreas 7
Imagen 5 Humectación de terreno 8
Imagen 6 Zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 9
Imagen 7 Residuos Producto de demoliciones 10
Imagen 8 Cargue de residuos de demolición 10
Imagen 9 Disposición final de RCD en el barrio sierra chiquita 11
Imagen 10 Material de relleno cubierto con plástico negro 12
Imagen 11 Cubrimiento de material 13
Imagen 12 Sustancias peligrosas sobre estibas 14
Imagen 13 Mantenimiento de maquinaria 14
Imagen 14 Kit control derrames 15
Imagen 15 lavamanos en obra 16
Imagen 16 Zona lavado de herramientas 16
Imagen 17 Baños en obra 17
Imagen 18 Tala de árboles 18
Imagen 19 Residuos tala de árboles 18
Imagen 20 Cargue de material producto de talas por la empresa URBASER 19
Imagen 21 Capacitaciones ambientales 20
Imagen 22 Instalaciones de contenedores en puntos estratégicos para recolecta de tapas plásticas 21
Imagen 23 Inducciones ambientales 21

INTRODUCCIÓN

El presente Informe mensual de gestión ambiental, explica las actividades ejecutadas desde el 01 al 31 de Diciembre del presente año, en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO (CIS) "AHORA LA GENTE" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA" el objetivo principal es presentar las medidas, recomendaciones y acciones a ejecutadas dentro del Plan de Gestión Ambiental. Se desarrolla a continuación el monitoreo y control de las actividades ejecutadas de cada uno de los programas aplicables hasta la fecha en la ejecución del proyecto.

INFORME AMBIENTAL N°4 CONSORCIO CIS 56: 01-31 DICIEMBRE DE 2022

En el presente informe se describirán las actividades realizadas en cada componente ambiental, cuya área de influencia directa comprende la Calle 6 # 1 E -94 Barrio la coquera.

Durante el periodo informado se llevaron a cabo los trabajos nombrados a continuación:

- Cargue y retiro de material sobrante de descapote
- Cargue y retiro de material sobrante de vegetación

Adecuación de terreno:

- Vibrado de terreno
- Relleno de terreno
- Extendida de material
- Nivelación y compactación
- Pilotaje
- Fallos
- Excavaciones para dados de cimentación
- Descabece de pilotes
- Fundición de solado

1. MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

1.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En el mes de Diciembre se sigue dando continuidad a todas las medidas ambientales para el manejo adecuado de los residuos generados en el proyecto, realizando seguimiento y control a todas las actividades.

Para el periodo de este informe se generaron residuos sólidos aprovechables y no aprovechables en el área de oficina administrativa, y dentro del área del proyecto producto de actividades ejecutadas, de las cuales se les dio el manejo según su clasificación.

1.1.1 Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables.

Mediante la instalación de un punto ecológico con canecas para residuos aprovechables (caneca blanca), no aprovechables (caneca negra) y aprovechables

orgánicos (caneca verde) en el área del frente de obra se separaron de acuerdo el tipo de residuos para su disposición final, cumpliendo así Resolución 2184 de 2019.



Imagen 1 Punto Ecológico

Durante el mes de diciembre los residuos no aprovechables fueron presentados en bolsas negras y agrupadas en el frente de obra cerca donde transita la ruta de recolección de la empresa de aseo municipal Urbaser. Por otro lado se realizó la clasificación y almacenamiento temporal de los residuos aprovechables pero no fueron dispuestos en este periodo debido a que no hubo una cantidad considerable para su respectiva entrega.

La ruta de recolección tiene frecuencia los días lunes, miércoles y viernes. La actividad de presentación de los residuos sólidos es realizada por el personal de vigilancia de turno para evitar que las bolsas fueran manipuladas o averiadas por animales callejeros o personal externo no autorizado.



Imagen 2 Residuos sólidos en presentación para recolección

En este periodo se ejecutaron actividades de orden, aseo y limpieza liderados por la brigada de orden, aseo y limpieza (BOAL) conformada por los auxiliares de obra Javier Riaño Padilla y Grey Melendres Luna, y mediante la colaboración del personal operativo de auxiliares e ingenieros se realizó organización de áreas comunes, barrido, cambio de bolsas de colores, recolecta de residuos y limpieza en general.

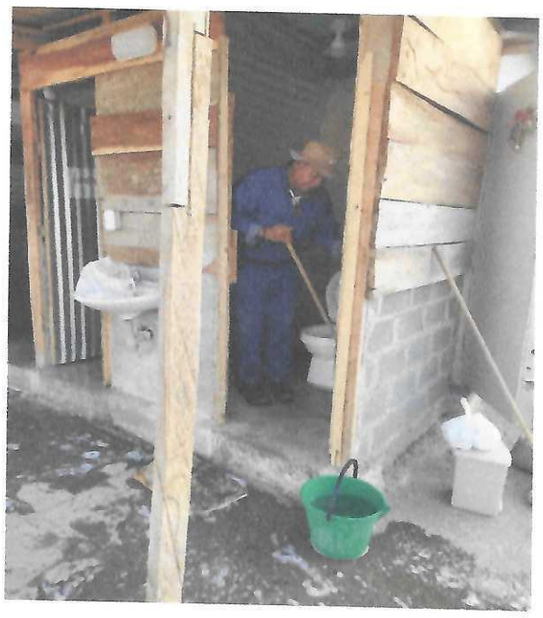


Imagen 3 Barrido de áreas comunes por la BOAL



Imagen 4 Limpieza de algunas áreas



Imagen 5 Humectación de terreno

Durante este periodo se realizó humectación de terreno por medio manual y carro tanques, Cabe aclarar que el agua utilizada para esta actividad se verá reflejada en el pago de la factura de servicio público de agua.

1.1.2 Residuos peligrosos.

Para el periodo de este informe, se generaron residuos peligrosos, los cuales fueron almacenados temporalmente en tanques de color rojo. Para su disposición final se sigue contando con el gestor de residuos peligrosos Bioresiduos SAS.

Así mismo, se realizará una acumulación temporal con el fin de obtener un peso relevante para que la empresa gestora de residuos peligrosos programe una ruta de recolección, y así realizar una disposición final adecuada.

Ver anexo 1. Convenio de Prestación de servicios Bioresiduos y Consorcio Cis 56



Imagen 6 Zona de almacenamiento temporal de residuos peligrosos

1.1.3 Residuos de la construcción y demolición.

Para el periodo de este informe, el Consorcio CIS 56 generó residuos de la construcción y demolición, producto de actividades de descapote de terreno, demolición de edificaciones existentes. Los residuos RCD fueron dispuestos en lotes privados del barrio sierra chiquita de la ciudad de Montería, por petición escrita de la junta de acción comunal y su presidente y mediante autorización de la secretaria de infraestructura de la ciudad, los cuales fueron usados como material de relleno para combatir zonas de inundación en patios y frentes de los lotes y viviendas de este barrio.





Imagen 7 Residuos Producto de demoliciones



Imagen 8 Cargue de residuos de demolición



Imagen 9 Disposición final de RCD en el barrio sierra chiquita

Ver anexo 2. La relación de las cantidades de RCD dispuestos en el barrio sierra chiquita, certificada por la Alcaldía de Montería.

Anexo 3. Formato receptor de RCD

1.2 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

1.2.1 Emisión fugitiva de material particulado.

Para el periodo de este informe, Consorcio CIS 56 generó ingresos de materiales de construcción transportados mediante vehículos pesados para su almacenamiento en sus frentes de obra los cuales eran cubiertos con material plástico negro para evitar su contaminación y esparcimiento. Igualmente, en el periodo de tiempo se presentaron varios eventos de lluvia que mitigaron el levantamiento de material sobre las vías cercana al proyecto.

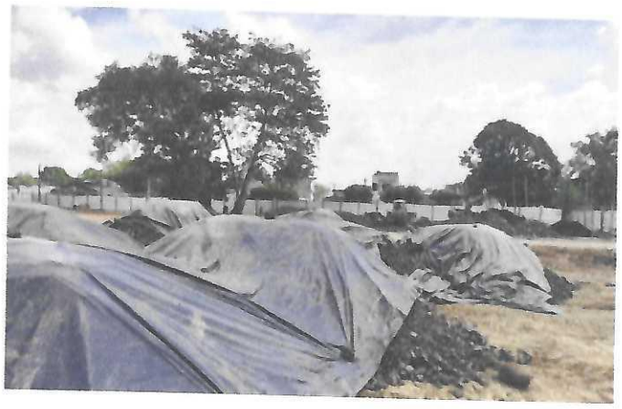


Imagen 10 Material de relleno cubierto con plástico negro

1.2.2 Emisión de gases de combustión.

En el periodo correspondiente a este informe, ingresaron 8 volquetas las cuales se relacionan a continuación y cuentan con el certificado técnico mecánico y emisiones de gases contaminantes vigentes:

FIGURA 1 Tabla relación de volquetas mes de diciembre

ITEM	EQUIPO TIPO	Placa	Marca	Clase / Línea	Capacidad	Tecno-mecánica		
						No. Certificado	Desde	Hasta
1	Volqueta	ACJ-378	Dodge	Sencilla	7000	157793606	29/01/2022	29/01/2023
2	Volqueta	TMA-176	Dodge	Sencilla	7000	158798984	24/03/2022	24/03/2023
3	Volqueta	UIJ-991	International	Sencilla	6000	17309351	4/01/2022	4/01/2023
4	Volqueta	PAE-379	Dodge	Sencilla	7000	161019924	22/08/2022	22/08/2023
5	Volqueta	EQX735	FREIGHTLINER	Doble	15350	158331323	1/03/2022	1/03/2023
6	Volqueta	SNN-330	International	Doble	18000	161337742	8/09/2022	8/09/2023
7	Volqueta	SNZ-607	FREIGHTLINER	Doble	17000	157612382	21/01/2022	21/01/2023
8	Volqueta	SXE-469	FREIGHTLINER	Doble	19000	157711731	25/01/2022	25/01/2023

Fuente: informe sst

Ver en el informe SST Anexo 3. Documentación maquinaria.

1.2.3 Generación de ruido.

Durante este periodo ejecutado los trabajos y actividades se realizaron en horario diurno, donde tuvo lugar las actividades de instalación de pilotes, para esta actividad

se trabajó en periodos de tiempo y se hizo entrega de tapa oídos a todo el personal. Ver en informe sst, formato de entrega de EPP.

1.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

1.3.1 Materiales de relleno y arrastre.

Para el periodo de este informe, se almacenaron materiales de construcción como relleno de súbase, piedra rajón, los cuales son almacenados temporalmente dentro de los frentes de obra y cubiertos con material de plástico negro.

Anexo 4. Relación de ingreso de material de construcción de obra en el mes de Diciembre y RUCOM Arenacor.

Anexo 4.1 Licencia ambiental – cantera villa Carmen.

Anexo 4.2 Resolución 087 2021 Delimitación área de explotación Arenacor

Anexo 4.3 Estado licencia ambiental Arenacor

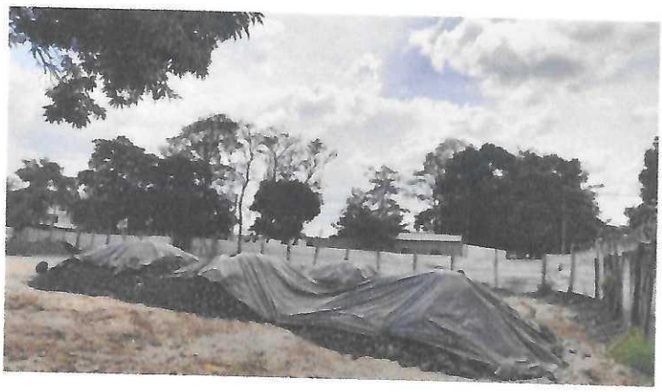


Imagen 11 Cubrimiento de material

1.3.2 Almacenamiento de sustancias peligrosas.

Para el periodo de este informe, se sigue almacenando en obra sustancias peligrosas como gasolina, acpm y aceite de motor 2t. Ya fueron presentadas a esta interventoría las fichas de seguridad de estas sustancias.



Imagen 12 Sustancias peligrosas sobre estibas

1.4 PROTECCIÓN DEL SUELO.

1.4.1 Atención de derrames y limpieza de herramientas.

En el periodo correspondiente a este informe, no se presentaron derrames de sustancias químicas, de igual manera se utiliza en obra plástico negro para evitar algún tipo de derrame que pueda llegar a contaminar el suelo; y así mismo se cuenta en obra con el Kit Ambiental en caso de presentarse una emergencia. Durante este periodo se realizaron mantenimientos a la maquinaria los días 7 y 29 de diciembre.

Ver anexo 5. Certificado de mantenimiento de maquinaria.



Imagen 13 Mantenimiento de maquinaria



Imagen 14 Kit control derrames

1.5 PROTECCIÓN DE CURSOS DE AGUA.

1.5.1 Vertimientos.

En el periodo de este informe, no se generaron vertimientos de residuos líquidos de aguas residuales o industriales.

1.6 PROTECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Para el periodo de este informe, las actividades ejecutadas dentro del área intervenida no interrumpieron los servicios públicos de energía, agua potable, servicios de aseo, internet, y alumbrado público de las comunidades aledañas del proyecto,

1.7 CONSUMO DE AGUA.

Para el periodo de este informe, se generó consumo de agua referente al uso del baño y lavamanos para obreros y administrativos.

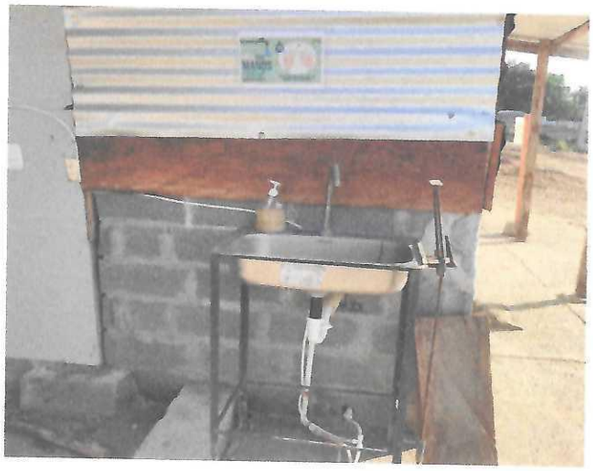


Imagen 15 lavamanos en obra

Por otra parte, se cuenta en obra con un punto o zona para el lavado de herramientas, el cual consta de un tanque para esta actividad y plástico de color negro para el secado de los residuos y/o sedimentos que se almacenen en el fondo del tanque. Estos residuos, posterior al secado son dispuestos como escombros y el agua se utiliza para riego en la obra, así de esta manera se disminuye o controla un poco el polvo que se genera.



Imagen 16 Zona lavado de herramientas

1.7.1 Baños.

Para el periodo de este informe, se cuenta en obra con dos baños (mujer y hombres). De igual manera también se contó en este periodo con baños portátiles al servicio de la empresa Soletanche Bachy encargada de la instalación de pilotes.



Imagen 17 Baños en obra

Ver anexo 6. Pago del servicio público de agua potable.

Anexo 7. Certificado de mantenimiento de baños portátiles.

Anexo 8. Cámara de comercio y Rut de Septiclean

1.8 APROVECHAMIENTO FORESTAL.

Durante este periodo correspondiente a este informe, se realizaron tala de árboles, así mismo se continuaron las actividades con motosierra, almacenamiento temporal y disposición final de residuos vegetales generados en el periodo. La empresa encargada de la disposición final de estos residuos es URBASER.

Ver anexo 9. Certificado de la disposición final de residuos vegetales.

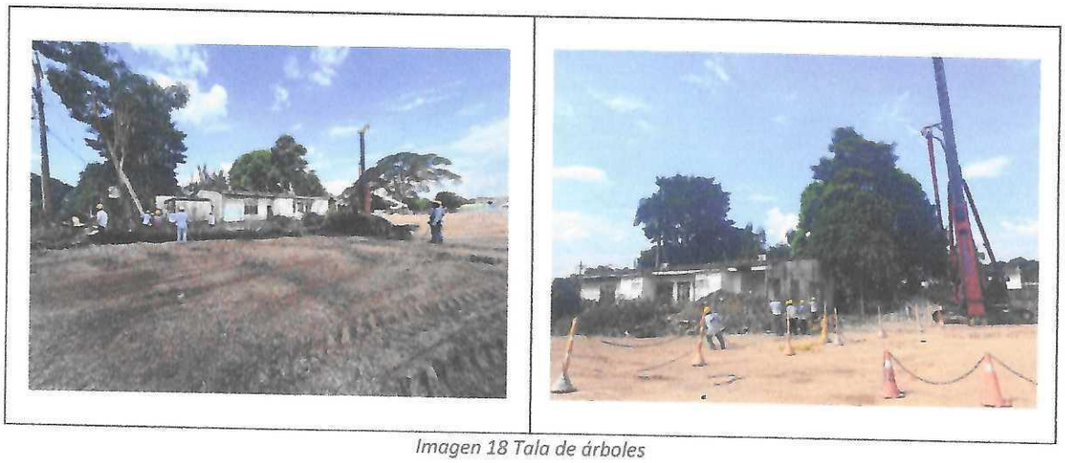


Imagen 18 Tala de árboles



Imagen 19 Residuos tala de árboles

FIGURA 2 Tabla cantidad de árboles talados en el mes de Diciembre

N°	ID	Nombre común	Familia	Nombre científico	CAP (m)	DAP (m)	HT (m) Altura Total Calculada	Vol (m3) Total	X	Y	ACTIVIDAD	ESTADO FITOSANITARIO	OBSERVACIÓN
1	172	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0,45	0,14	6	0,06	1129967,16	1459120,40	Tala	Pudrición en ramas	Inclinado
2	174	Abeto	Fabaceae	*Senna spectabilis*	0,70	0,22	7	0,18	1129980,75	1459178,06	Tala	Pudrición en ramas y fuste	Presenta epifitas
3	180	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	1,25	0,40	12	0,97	1129884,91	1459052,50	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
4	181	Espino	Fabaceae	*Pithecellobium dulce*	0,57	0,18	12	0,20	1129888,47	1459134,00	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
5	185	Lluvia de oro	Fabaceae	*Cassia fistula*	0,85	0,27	7	0,26	1129892,65	1459192,72	Tala	Pudricion en ramas	Presenta epifitas
6	186	Roble	Bignoniaceae	*Tabebuia rosea*	1,84	0,59	14	2,45	1129883,85	1459192,02	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
7	188	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0,95	0,30	7	0,33	1129880,14	1459194,74	Tala	Pudrición en ramas, inclinado	Presenta epifitas
8	190	Mango	Anacardiaceae	*Mangifera indica*	0,67	0,21	7	0,16	1129883,81	1459190,60	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
9	191	Palma real	Arecaceae	Roystonea regia	1,38	0,44	12	1,18	1129881,95	1459187,02	Tala	Raiz expuesta, riesgo de voclamiento	Presenta epifitas
10	192	Torombolo	Oxalidaceae	*Averrhoa carambola*	0,64	0,20	6	0,13	1129879,32	1459180,08	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
11	193	Palma real	Arecaceae	Roystonea regia	1,50	0,48	12	1,40	1129876,92	1459163,42	Tala	Raiz expuesta, riesgo de	Presenta epifitas
12	194	Roble	Bignoniaceae	*Tabebuia rosea*	1,17	0,37	9	0,64	1129878,76	1459166,51	Tala	Pudrición de la corteza	Presenta epifitas
13	196	Naranjo	Rutaceae	*Citrus X sinensis*	0,36	0,11	5	0,03	1129897,52	1459168,70	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
14	197	Naranjo	Rutaceae	*Citrus X sinensis*	0,50	0,16	5	0,06	1129897,47	1459164,83	Tala	Pudrición en ramas	Presenta epifitas
15	198	Guayabo	Myrtaceae	*Psidium guajava*	0,74	0,24	9	0,25	1129911,33	1459177,01	Tala	Buenas condciones	No presenta epifitas
16	199	Roble	Bignoniaceae	*Tabebuia rosea*	1,47	0,47	12	1,34	1129911,12	1459180,79	Tala	Pudrición de la corteza	Presenta epifitas

Fuente: Informe Forestal Diciembre



Imagen 20 Cargue de material producto de talas por la empresa URBASER

1.9 MANEJO DE FAUNA.

En este periodo correspondiente al mes de Diciembre no se dio ningún manejo a la fauna dentro de la zona directa del proyecto, debido a que fue reubicada en su mayoría en los periodos anteriores.

1.10 CAPACITACIONES AMBIENTALES.

El día 23 de Diciembre se llevó a cabo tres (03) capacitaciones en el área ambiental, los temas a tratar fueron: capacitación manejo de residuos peligrosos, trasvase de sustancias peligrosas y manejo de material reciclable (tapas de botellas plásticas), donde se le explicó al personal operativo, auxiliares de obra e ingenieros, trabajadora social e interventoría, el manejo adecuado de las sustancias químicas, y el proceso que se lleva a cabo en cuanto al material reciclable que se genera en obra.

Ver anexo 10. Asistencia a capacitaciones ambientales.

Anexo 11. Cronograma de Capacitaciones.



Imagen 21 Capacitaciones ambientales

Así mismo se dio a conocer la implementación de un nuevo sistema de recolecta de tapitas plásticas para una buena causa.



Imagen 22 Instalaciones de contenedores en puntos estratégicos para recolecta de tapas plásticas

Igualmente, al personal nuevo que ingresa al proyecto se le imparte una inducción ambiental sobre las medidas de control ambiental que se ejecutan en la obra, como el manejo de residuos sólidos, la protección de la fauna y flora, las mitigaciones de las emisiones atmosféricas y la sostenibilidad en el consumo de agua y energía.

Ver anexo 12. Inducciones mes de Diciembre.



Imagen 23 Inducciones ambientales

ANEXOS

Anexo 1. Convenio de Prestación de Servicios Bioresiduos y Consorcio Cis 56.

Anexo 2. Relación de las cantidades de RCD dispuestos en el barrio sierra chiquita, certificada por la Alcaldía de Montería.

Anexo 3. Formato receptor de RCD

Anexo 4. Relación de ingreso de material de construcción de obra en el mes de Diciembre Y RUCOM Arenacor.

Anexo 4.1 Licencia ambiental – cantera villa Carmen.

Anexo 4.2 Resolución 087 2021 Delimitación área de explotación Arenacor

Anexo 4.3 Estado licencia ambiental Arenacor

Anexo 5. Certificación mantenimiento de maquinaria

Anexo 6. Pago del servicio público de agua potable.

Anexo 7. Certificado de mantenimiento de baños portátiles

Anexo 8. Cámara de comercio y Rut Septiclean

Anexo 9. Certificado disposición final de residuos vegetales, URBASER.

Anexo 10. Asistencia a capacitaciones ambientales.

Anexo 11. Cronograma de Capacitaciones.

Anexo 12. Inducciones mes de Diciembre.

ANEXOS

Alcaldía de MONTERÍA
Gobierno de la GENTE

CONSORCIO CIS 56

ANEXO 1. CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIORESIDUOS Y CONSORCIO CIS 56.

~~4663~~
4908

	DOCUMENTO		
	CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL		
Fecha de emisión: 15 de Abril de 2013	Versión: 01	Proceso: Mejora Continua	Página: 1:1

BIO-RESIDUOS S.A.S
NIT. 900.808.189-7

CERTIFICA

Que la entidad que lleva por razón social **CONSORCIO CIS 56** con **NIT 901622733-8** presenta servicios **VIGENTES** con nuestra empresa para: **RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS**. El alcance del mismo incluye la recolección de las siguientes direcciones:

- **MONTERÍA (CORDOBA):** CL 6 1E -94 BRR LA COQUERA

La presente solicitud se expide en Montería (Córdoba), a los 01 días del mes de diciembre de 2022.

NO CONTROLADA

AMPARO GUTIERREZ BONILLA
Representante legal
gerencia@bio-residuos.com.co
(604) 7815219

ANEXO 2. RELACIÓN DE LAS CANTIDADES DE RCD DISPUESTOS EN EL BARRIO SIERRA CHIQUITA, CERTIFICADA POR LA ALCALDÍA DE MONTERÍA.

~~4664~~
4909

ANEXO 3. FORMATO RECEPTOR DE RCD

ANEXO 4. RELACIÓN DE INGRESO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA EN EL MES DE DICIEMBRE Y RUCOM ARENACOR.

~~4666~~
4910

ARENACOR

NIT 900819082

Montería, 21 de diciembre de 2022

Señores
JOSE GERARDO CORTES CASTAÑEDA
Comprador
Montería – Córdoba

Asunto: Certificación de materiales Arena y China

Respetado Señores,

Por medio de la presente, certificamos que durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre y el 23 de diciembre de 2022, hemos suministrado materiales para el desarrollo de sus diferentes actividades.

Cabe mencionar que contamos con todos los permisos ambientales y mineros correspondientes de acuerdo a los establecido por la normatividad colombiana.

ENTIDAD	MATERIAL	PERIODO
ARENACOR	ARENA Y CHINA	DEL 1 AL 23 DE DICIEMBRE

Atentamente,

Doménico Ortega

DOMÉNICO ORTEGA GOMEZ
CC N° 1.067.884.387 Montería
Celular 314 5009207

4667
4911

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

Certificado

Registro Único de Comercializadores de Minerales
RUCOM

Registro **RUCOM-2021052919121**

En cumplimiento del Capítulo 6° del Decreto Único Reglamentario del Sector de Minas y Energía No. 1073 del 25 de mayo de 2015, la Agencia Nacional de Minería certifica que ARENACOR con NIT número 900819082 acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales.

La presente certificación permite al comercializador realizar de forma regular la actividad de comprar y vender minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos, intermediarlos, exportarlos o consumirlos y tiene una vigencia del 02-08-2022 hasta el 31-07-2023. Durante el mes de mayo de 2023 el interesado debe realizar los trámites de renovación indicada en el Decreto 1073 de 2015.

Se acredita al comercializador de minerales luego de verificar y validar la información suministrada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y consultar en la Base de datos de Confecámaras.

EL PRESENTE CERTIFICADO NO AUTORIZA AL COMERCIALIZADOR A REALIZAR ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN DE MINERALES.

Dado en Bogotá D.C., a los 2 dias del mes de agosto del año 2022.

MAURICIO BARON GRANADOS
Gerente de Proyecto - Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

EDWIN ALFONSO COY GONZALEZ
02-08-2022 04:04

Este documento ha sido firmado digitalmente con un certificado provisto por una entidad autorizada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la ley 527 de 1999, y 15 del Decreto 1747 de 2000. La firma digital aquí impuesta es el equivalente electrónico de la firma manuscrita.
La autenticidad del presente certificado podrá ser validada ingresando a www.anm.gov.co, con el número Registro RUCOM disponible en este certificado.

ANEXO 4.1 LICENCIA AMBIENTAL – CANTERA VILLA CARMEN.

REPUBLICA DE COLOMBIA

4668
4912

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN Nº

De Fecha: 24 Sep. 18

"POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA UNA LICENCIA AMBIENTAL"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y. .

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución No. 00.035 del 15 de Febrero de 1996, modificada por la Resolución No. 1-3502 del 20 de Agosto de 2009 y la Resolución No. 1-6590 del 29 de Octubre de 2012, esta corporación otorgó Licencia Ambiental a la señora: CARMEN ELISA MARTINEZ GARCES, identificada con la Cedula de Ciudadanía 34.970.319, expedida en Montería, para el proyecto de explotación de materiales pétreos en la Cantera Villa Carmen, localizada en la vía Montería – Planeta Rica, kilómetro 8 al costado derecho a 1.5 kilómetro de la vía en mención.

Que a través del Auto No. 8440 de Marzo 09 de 2017, se inició el trámite de la modificación solicitada y se ordenó remitir el expediente al Área de Licencias y Permisos de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación para evaluar la conveniencia y viabilidad de la solicitud.

Que funcionarios de la CVS se trasladaron al mencionado predio para constatar los datos contenidos en la solicitud de modificación presentada y determinar la viabilidad de la misma.

Que como consecuencia de la visita, se emitió el Concepto Técnico ALP 2018-426 del 28 de Mayo de 2018, en el cual se recomendó dar viabilidad a la modificación de la Licencia Ambiental solicitada, el cual hace parte integral del presente acto administrativo y se incorpora en su integridad en esta providencia.

ASPECTOS GENERALES

El presente estudio consiste en presentar el complemento al Estudio de Impacto Ambiental, por medio del cual la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS otorgó licencia ambiental mediante Resolución Nº 00.035 del 15 de febrero de 1996 (Mod Res. 1.3502 del 20 de agosto de 2009, mod. por la Res. Nº 1.6590 del 29 de octubre de 2012) para la explotación de un yacimiento de materiales de construcción otorgado mediante el contrato de concesión Nº EJF – 091 integrado del 11 de febrero de 2016 de la Agencia Nacional de Minería, con un área total de 40,52 hectáreas ubicado en jurisdicción del municipio de Montería.

VALIDO SOLAMENTE PARA LA EMPRESA LICITACIÓN, EJECUCIÓN, GESTIÓN GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PRESTAMO Y 420 MATERIAL BALASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN N°

De Fecha:

El presente documento contiene el complemento del estudio de impacto ambiental para solicitar ante la CAR CVS, modificación de licencia ambiental otorgada mediante Resolución N° 00.035 del 15 de febrero de 1996 (Mod. Res 1.3502 del 20 de agosto de 2009, mod. Res: N° 1.6590 del 29 de octubre de 2012) solicitando las siguientes modificaciones:

Adicionar las actividades mineras a desarrollar en el área autorizada por la Agencia Nacional de Minería mediante el contrato de concesión EJF – 091 integrado y establecer sus impactos ambientales.

Incluir la actividad de perforación y voladura empleando explosivos donde no sea posible realizar el arranque del material por medios mecánicos dada la dureza del material rocoso.

Presentar los impactos ocasionados por la actividad de perforación y voladura y las respectivas medidas de manejo ambiental, actualizando el Plan de Manejo Ambiental aprobado en la licencia ambiental. Del mismo modo, se presentará la actualización del Plan de Contingencias que contenga las medidas preventivas y control del riesgo de las actividades incluidas.

Mediante Resolución N° 000991 del 18 de marzo de 2014 la Agencia Nacional de Minería ANM, "Por medio de la cual se aprueba la integración de las áreas de los títulos N° EJF – 091 y GLS – 112 y se ordena la integración de ambos títulos en el contrato de concesión N° EJF – 091". *(Anexo Resolución)*.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El área del Contrato de Concesión EJF – 091 (integrado) se localiza a unos nueve (9) km al suroeste del casco urbano del municipio de Montería, en jurisdicción del corregimiento Las Pulgas. El acceso al área se realiza desde la ciudad de Montería, por la carretera pavimentada que conduce al municipio de Planeta Rica, en el kilómetro 8 al costado derecho, se desvía por un carreteable destapado en regular, pasando por el sitio Bar Balay o El Caim del Chórizo, se ingresa y a unos 3 kilómetros de la vía pavimentada se ubica el área concesionada.

VÁLIDO SOLAMENTE PARA LA EMPRESA ACTUACIÓN, EJECUCIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y OPERACIONES DE PROYECTOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 420 MATERIAL DE RECEBO Y 420 MATERIAL BALASTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN Nº

De Fecha:

- El horario estipulado por la corporación para la operación y ejecución del proyecto es el horario diurno, según lo establece la Resolución No. 627 del 2006 emanada del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En cuanto a la explotación del material, se estipula también el horario diurno de la mencionada normativa, siendo prudente y recomendable de 7 am – 5:00 pm.

ARTÍCULO CUARTO: Los demás términos, condiciones y obligaciones establecidos en la Resolución No. 00.035 del 15 de Febrero de 1996, modificada por la Resolución No. 1-3502 del 28 de Agosto de 2009, a su vez modificada por la Resolución No. 1-6599 del 29 de Octubre de 2012 emanadas de esta corporación, continúan vigentes.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar la presente Resolución a la señora: **CARMEN ELISA MARTINEZ GARCES** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 34.970.319 de Montería o a su apoderado debidamente constituido de conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes del C.P.A.C.A.

ARTICULO SEXTO: Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Director General de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, por escrito, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, según lo establecido en el artículo 76 del C.P.A.C.A.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSÉ FERNANDO TIRADO HERNANDEZ
Director General CVS

Proyecto: Roxana E.

Revisó: E. Flores.

P. Sehtana.

VÁLIDO SOLAMENTE PARA LA EMPRESA ADJUDICATARIA EJECUCIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE PIEDRA MONTAJE MATERIAL BALASTO

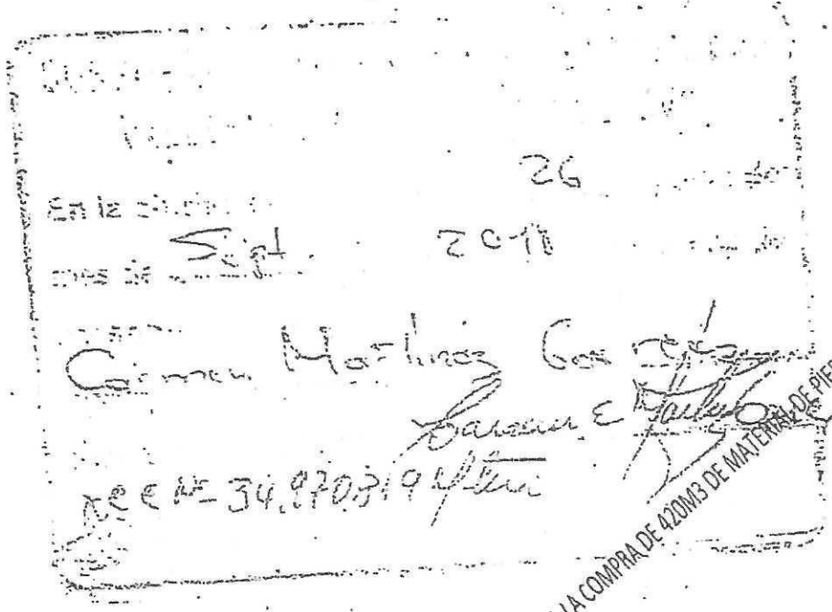

VÁLIDO SOLAMENTE PARA LA EMPRESA LICITACIÓN, EJECUCIÓN, GESTIÓN, GERENCIA Y OPERACIÓN DE PROYECTOS SAS PARA LA COMPRA DE 420M3 DE MATERIAL DE PIEDRA RAJON Y 420 MATERIAL BALASTO

ANEXO 4.2 RESOLUCIÓN 087 2021 DELIMITACIÓN ÁREA DE EXPLOTACIÓN ARENACOR

4672
4916

República de Colombia

Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

RESOLUCIÓN VPPF NÚMERO 087

(04 de junio del 2021)

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2, ubicada en jurisdicción del municipio de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

EL VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, en ejercicio de sus facultades legales conferidas por el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, modificado por el artículo 147 del Decreto – Ley 019 del 10 de enero de 2012 y, en especial, las establecidas en el Decreto 4134 del 3 de noviembre de 2011, la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, la Resolución 577 del 11 de diciembre de 2020 y **la Resolución 223 del 29 de abril de 2021** que modifica la Resolución No. 206 de 22 de marzo de 2013, todas de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO

La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería profirió la **Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018**, por medio de la cual declaró y se delimitó un Área de Reserva Especial ubicada en los municipios de Montería, departamento de Córdoba, presentada con el radicado No. 20164100204491 del 28 de marzo de 2016, para la extracción de materiales de arrastre (arenas y gravas), con el objeto de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos estratégicos para el país, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 31 y 248 de la Ley 685 de 2001, con una extensión de **66,1478 hectáreas**, según certificado de área libre ANM-CAL-0090-17 y reporte gráfico ANM-RG-1508-17 de 31 de mayo de 2017.

De acuerdo con el artículo cuarto, se estableció como miembros de la comunidad minera tradicional a las personas que se a continuación:

No.	Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía
1.	Jorge Enrique Sotelo Iglesia	6.882.061
2.	César Augusto Rojas Fajardo	78.690.836
3.	Santander Hernández Romero	10.899.491
4.	José Dionicio Villabolos	6.875.231
5.	Francisco Antonio Patrón Martínez	6.880.234
6.	Raúl Antonio Gómez Jiménez	6.873.388
7.	Andrés Miguel Pastrana Araujo	15.613.452
8.	Robinson Antonio Celestino Berrocal	6.893.843
9.	Fernando Segundo García Morales	78.697.093

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

Mediante constancia CE-VCT-GIAM-02321 el Grupo de Información y Atención al Minero GIAM de la Agencia Nacional de Minería, hace constar que la Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018, quedó ejecutoriada y en firme el 10 de septiembre de 2018.

Posterior a ello, la Agencia Nacional de Minería, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 Ley 1955 de 2019, profirió la Resolución No. 505 de 2 de agosto de 2019, a través de la cual estableció los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás capas cartográficas al sistema de cuadrícula, así como la metodología para la evaluación de los trámites y solicitudes mineras en cuadrícula y la puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera ANNA Minería.

La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería profirió **Resolución No. 231 de 19 de septiembre de 2019** *"Por medio de la cual se corrige un error formal en la Resolución No. 086 de 27 de abril de 2018"*. Dicho acto administrativo fue remitido a la comunidad beneficiaria del ARE a través del oficio con radicado ANM No. 20194110308911 del 13 de diciembre de 2019.

Posteriormente, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, "*Por la cual se modifica el trámite administrativo para la declaración y delimitación de las Áreas de Reserva Especial con el fin de adelantar estudios geológico-mineros y desarrollar proyectos de minería mediante el otorgamiento del contrato especial de concesión minera, de que tratan los artículos 31 y 248 de la Ley 685 de 2001*", normativa que empezó a regir a partir de su publicación y derogó la Resolución No. 546 del 20 de septiembre de 2017.

Atendiendo a lo dispuesto en la Resolución 505 de 02 de agosto de 2019 y 266 de 10 de julio de 2020, el Grupo de Fomento realizó **Informe Técnico de Estudio Geológico Minero No. 403 de 28 de septiembre de 2020**, concluyó y recomendó lo siguiente:

(...)

"10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES GEOLÓGICAS

- *El ARE Arenacor-2ubicada en el río Sinú, en el corregimiento en el municipio de Montería, se encuentra enmarcada por unidades geológicas del cuaternario reciente, siendo la explotación efectiva la que se realiza en los materiales clásticos que se transportan como carga de fondo constituidos principalmente por arenas, aunque se extraen también gravas.*
- *Las condiciones hidrológicas, climáticas y geológicas de las partes altas dela cuenca del río Sinú y sus afluentes, permiten la desintegración de las unidades litológicas aflorantes en estas áreas, en donde se generan los materiales que, mediante mecanismos de erosión, transporte y sedimentación, aportan cantidades constantes de materiales que son explotados en el ARE. La disponibilidad del recurso a explotar es de esta manera persistente en el tiempo*
- *Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, en cuanto a la disponibilidad de recursos a explotar en el ARE Arenacor_2, se puede inferir que es factible desarrollar un proyecto minero de largo plazo para los mineros tradicionales de la zona, sin que se afecten las condiciones del rio, continuando con la metodología de explotación tradicional.*
- *Las arenas principalmente de granulometrías finas y medias, son una fuente importante de material para la construcción, no requieren proceso alguno de transformación, salvo procesos que contribuyan a generar valor agregado del producto, tales como la separación por granulometría.*
- *En el área que se delimito para el ARE Arenacor_2, se encuentran recursos mineros consistentes en material de arrastre que se recargan de manera continua como carga de*

fondo del río Sinú, mediante este mecanismo se tienen cantidades persistentes de arenas y gravas con diferentes granulometrías que permiten adelantar un proyecto minero de largo plazo.

- *El área del ARE sufre una modificación derivada de la aplicación de la cuadricula minera, según Resolución 505 de 2019 quedando el polígono 1 de 46,2668hectáreas y el polígono 2 de 53,5693 hectáreas, para un área total de 99,8361hectáreas, información soportada en CAL-0506-20y RG-1909-20.*
- *De acuerdo a la información del modelo geológico el yacimiento se encuentra en los materiales que se transportan como carga de fondo en el río Sinú, directamente en el cauce activo. Esta condición se encuentra en el polígono delimitado en este EGM (que no modifico el inicialmente delimitado en la Resolución 086) y que se ajustó a la cuadricula minera atendiendo a lo establecido en la Resolución 505. No se afectan las condiciones del yacimiento, siendo en consecuencia viable el proyecto minero.*

10.2 RECOMENDACIONES GEOLÓGICAS

- *Se recomienda realizar un estudio de detalle, para establecer la composición mineralógica de las arenas, con el fin de determinar condiciones de resistencia y desgaste, diferenciando el material y perfilándolo, buscando con ello mejorar las condiciones de mercado*
- *Realizar análisis de laboratorio para establecer características físicas y mineralógicas, distribución textural y propiedades físicas de los materiales de arrastre en el ARE*
- *Las explotaciones de materiales de arrastre pueden continuar en los sectores en los que los depósitos han permitido la ejecución de las labores extractivas. La disponibilidad y volúmenes de materiales a extraer dependerá de las condiciones del cauce, en el área puntual, así como aguas arriba*

10.3 CONCLUSIONES MINERAS

- *La naturaleza y geometría del yacimiento que se encuentra en el ARE Arenacor_2, permite la ejecución de un proyecto minero para explotación de materiales de construcción asociados a material de arrastre.*
- *En el Área de ARE ARENACOR_2se puede implementar método deexplotación "Minería a tajo abierto dentro del espejo del agua", teniendo en cuenta las características y geometría del yacimiento*
- *El arranque y cargue del material al bote es manual (baldes), y del bote al patio de acopio al igual es manual (palas), seguido de esto es transportado en volquetas sencillas y/o doble troques hasta el lugar final de disposición por los compradores del mismo*
- *El personal no cuenta con los elementos de protección personal requeridos para el desarrollo de las actividades*

10.4 RECOMENDACIONES MINERAS

- *Se recomienda la utilización de los elementos de protección personal por parte de los integrantes que operan la explotación en el ARE indispensables para el óptimo desarrollo del proyecto en cumplimiento del decreto 2222 de 1993.*
- *Realizar una evaluación detallada del yacimiento para establecer áreas con mayores potencialidades para acumulación de arenas y gravascon diferentes granulometrías.*
- *De acuerdo a los recursos calculados, es importante tener en cuenta los valores máximos permisibles explotables mensuales de material, ya que dentro de la dinámica fluvial del rio existen unas recargas máximas anuales y estas no deben ser superadas debido a que se verá afectado el cauce del rio.*
- *Se recomienda tener en cuenta el decreto 2222 de noviembre 5 de 1993, reglamento de higiene y seguridad en labores mineras a cielo abierto, para todas las labores dentro del ARE ARENACOR_2.*
- *Después de la entrega del presente informe cumplir con los requerimientos de presentación del Programa de Trabajos y Obras dentro de las fechas estipuladas.*

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

- *Se recomienda la no utilización de maquinaria y equipos hasta tanto se obtenga la licencia ambiental.*

Mediante **memorando con radicado No. 20202200392093 del 24 de diciembre de 2020**, de la Gerencia de Catastro Minero, establece los lineamientos generales a considerar en los actos administrativos sujetos a afectar el registro y la base de datos geográfica del Sistema Integral de Gestión Minera – SIGM Anna Minería.

En cumplimiento de lo anterior, el Grupo de Fomento elaboró alcance al Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2, ubicada en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, cuyos resultados fueron consignados en el **Informe No. 013 del 5 de mayo de 2021**, en el cual se indicó lo siguiente:

"(...)

2. OBJETIVO DEL ALCANCE.

Analizar el Informe Técnico del Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial Arenacor2– Departamento de Córdoba No. 403 del 28/09/2020, a partir de lo establecido por la Gerencia de Catastro y Registro Minero mediante el MEMORANDO con radicado ANM No. 20202200392093 del 24 de diciembre de 2020 "Lineamientos generales a considerar en los actos administrativos sujetos a afectar el registro y la base de datos geográfica del Sistema Integral de Gestión Minera –SIGM AnnA Minería".

(...)

5. RECOMENDACIONES.

Proceder a la respectiva delimitación definitiva del Área de Reserva Especial Arenacor 2 - Montería, en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que ***el PROYECTO MINERO DEL ARE ARENACOR 2 ES VIABLE UNA VEZ APLICADO EL SISTEMA DE CUADRÍCULA MINERA Resolución N° 505 del 02 de agosto de 2019 y EL MEMORANDO con radicado ANM N° 20202200392093 del 24 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Catastro y Registro Minero*** *dentro de un área total de* ***99,8962 hectáreas,*** *la cual está conformada por* ***dos (2) polígonos,*** *denominados* ***ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 1 (ARE-RCS-08001X)*** *con un área de 46,2954 hectáreas y* ***ARENACOR2 – MONTERÍA POLIGONO 2 (ARE-RCS-08021X)*** *con un área de* ***53,6008 hectáreas,*** *con base al* ***Certificado de Área Libre ANM-CAL-0118-21*** *y en el* ***Reporte Gráfico ANM RG-0813-21*** *con fecha del 20 de abril de 2021".*

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Las Áreas de Reserva Especial tiene su fundamento en el artículo 31 del Código de Minas, modificado por el artículo 147 del Decreto 019 de 2012, el cual dispone que, *"La Autoridad Minera o quien haga sus veces, por motivos de orden social o económico, determinados en cada caso, de oficio o por solicitud expresa de la comunidad minera, en aquellas áreas en donde exista explotaciones tradicionales de minería informal, delimitará zonas en las cuales temporalmente no se admitirán nuevas propuestas, sobre todos o algunos minerales. Su objeto será adelantar estudios geológicos-mineros y desarrollar proyectos mineros estratégicos para el país y su puesta en marcha. En todo caso, estos estudios geológicos-mineros y la iniciación de los respectivos proyectos no podrán tardar más de dos (2) años. La concesión solo se otorgará a las mismas comunidades que hayan ejercido las explotaciones mineras tradicionales, así hubiere solicitud de terceros. Todo lo anterior, sin perjuicio de los títulos mineros vigentes".*

El Código de Minas sobre la puesta en marcha de los proyectos mineros especiales, dispone en el artículo 248 que *"(...), con base en los resultados de los estudios geológico-mineros de que trata el artículo 31 de este Código, a través de las entidades estatales adscritas o vinculadas al sector de Minas y Energía,*

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

organizará dentro de las zonas que hubieren sido declaradas reservas especiales, proyectos mineros orientados al aprovechamiento racional de los recursos mineros allí existentes, los cuales podrán ser de dos clases: (...) Proyectos de minería especial. Son proyectos mineros comunitarios que por sus características geológico-mineras posibilitan un aprovechamiento de corto, mediano y largo plazo. En estos casos, el Estado intervendrá, a través de la entidad estatal competente, en la capacitación, fomento, transferencia de tecnología, manejo ambiental, estructuración, desarrollo del proyecto minero y desarrollo empresarial de los mineros informales ya legalizados, de las empresas de economía solidaria y de las asociaciones comunitarias de mineros que allí laboren; en la asesoría de alianzas estratégicas, consorcios o compañías con el sector privado para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, transformación y comercialización de los minerales existentes.(...)".

Aclarado el panorama normativo, es importante señalar que el Área de Reserva Especial se declaró mediante **Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018,** en los términos y condiciones establecidas en la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, la cual señala que las solicitudes que se encuentren en trámite, incluso las ya declaradas, como es el caso que nos ocupa, se deben ajustar a lo dispuesto en dicha norma, así:

> ***"Artículo 2. Ámbito de Aplicación.*** *La presente resolución se aplicará a todas las solicitudes de declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial que se encuentren en trámite y a las que se presenten con posterioridad a la entrada en vigencia de esta resolución;* ***así como a las zonas declaradas y delimitadas como Áreas de Reserva Especial a la entrada en vigencia de la presente resolución****. (...) (Negrilla fuera de texto)*

Conforme a lo anterior, el trámite de la presente Área de Reserva Especial continuará conforme a las disposiciones contenidas en la **Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020.**

I. Delimitación Definitiva del Área de Reserva Especial.

La Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, en relación con el resultado de los Estudios Geológico Mineros, señala en su artículo 19, lo siguiente:


> ***"ARTÍCULO 19. DELIMITACIÓN DEFINITIVA DE ÁREAS DE RESERVA ESPECIAL DECLARADAS Y DELIMITADAS. Atendiendo al resultado del estudio geológico minero*** *se procederá a delimitar en forma definitiva el Área de Reserva Especial dentro del área inicialmente declarada,* ***bajo el Sistema de Cuadrícula Minera*** *mediante acto administrativo motivado, el cual será comunicado a las autoridades municipales y ambientales de la jurisdicción.* ***En el mencionado acto administrativo se ordenará la entrega de los estudios geológico-mineros mediante acta suscrita por las partes."*** *(Negrilla fuera de texto)*

Así las cosas, la Agencia Nacional de Minería en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001, elaboró los Estudios Geológico Mineros, cuyos resultados fueron consignados en el **informe No. 403 del 28 de septiembre de 2020** y su alcance **No. 013 del 05 de mayo de 2021**, en este último se recomendó lo siguiente:

> ***"5. RECOMENDACIONES.***
>
> *Proceder a la respectiva delimitación definitiva del Área de Reserva Especial Arenacor 2 - Montería, en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, teniendo en cuenta que el PROYECTO MINERO DEL ARE ARENACOR 2 ES VIABLE UNA VEZ APLICADO EL SISTEMA DE CUADRÍCULA MINERA Resolución N° 505 del 02 de agosto de 2019 y EL MEMORANDO con radicado ANM N° 20202200392093 del 24 de diciembre de 2020 de la Gerencia de Catastro y Registro Minero dentro de un área total de 99,8962 hectáreas, la cual está conformada por dos (2) poligonos, denominados ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 1 (ARE-RCS-08001X) con un área de 46,2954 hectáreas y ARENACOR2 – MONTERÍA POLIGONO 2 (ARE-RCS-08021X) con un área de 53,6008 hectareas, con base al Certificado de Área Libre ANM-CAL-0118-21 y en el Reporte Gráfico ANM RG-0813-21 con fecha del 20 de abril de 2021".*

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

Lo anterior, conforme al **Certificado de Área Libre ANM-CAL-0118-21** y en el **Reporte Gráfico ANM RG-0813-21** con fecha del 20 de abril de 2021, cuyo polígono se representa en el siguiente gráfico:

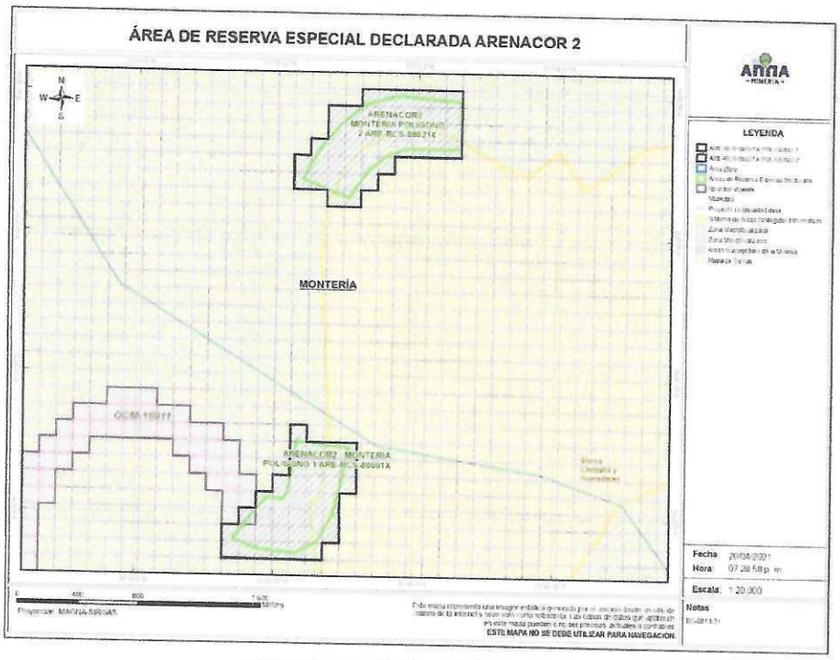

Fuente: Reporte Gráfico ANM RG 0813-21.

Adicional a lo anterior, y atendiendo a la solidaridad de las obligaciones de las cuales son sujetos los mineros miembros de la comunidad minera, debe indicarse que, una vez cumplidos los requisitos técnicos y ambientales, así como las obligaciones económicas y de seguridad e higiene minera derivadas de la explotación y comercialización de los minerales, la comunidad podrá desarrollar un proyecto minero especial a través del respectivo contrato especial de concesión que se otorgue.

Ahora bien, es importante resaltar que el Gobierno Nacional a través de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022- dispuso en el artículo 24, que todos los trámites mineros se evaluarían con base en el sistema de cuadrícula minera implementado por la Autoridad Minera Nacional. Para tal efecto, la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución No. 505 de 2 de agosto de 2019 *"Por medio de la cual se fijan los lineamientos para la migración de los títulos mineros y demás capas cartográficas al sistema de cuadricula, se establece la metodología para la evaluación de los tramites y solicitudes mineras en cuadricula y se implementa el periodo de transición para la puesta en producción del Sistema Integral de Gestión Minera"*.

En tal sentido y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, es procedente la transformación del área de reserva especial que fuera declarada y delimitada mediante la **Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018**, conforme a los resultados obtenidos en los estudios geológicos mineros y a los lineamientos del sistema de cuadrícula minera de que trata la Resolución 505 de 2 de agosto de 2019, es decir en cuadrículas o celdas, entendida como la unidad de medida, respecto del área susceptible de otorgar en contrato especial de concesión minero, cuyos resultados fueron recogidos en el **Informe Técnico**

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

del Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 – Departamento de Córdoba No. 013 del 05 de mayo de 2021.

Para ello, se deberá tener en cuenta los lineamientos generales señalados por la Gerencia de Catastro y Registro Minero con el Memorando No. 20202200392093 del 24 de diciembre de 2020, para lo cual, en el presente acto administrativo se deberá incluir el *"Cálculo del valor del área medida a partir de la sumatoria del área de las celdas completamente contenidas en el polígono"* y *"...el valor del área individual ..."* para cada una de las celdas.

En suma, atendiendo a los resultados obtenidos en el estudio geológico-mineros, se evidencia que se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 y en el artículo 19 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, por lo que esta Vicepresidencia procederá a **DELIMITAR DEFINITIVAMENTE** el Área de Reserva Especial que fuera declarada y delimitada mediante la Resolución No. 086 del 27 de abril de 2018, conforme a lo indicado en Certificado de Área Libre ANM-CAL-0118-21 y en el Reporte Gráfico ANM RG-0813-21 con fecha del 20 de abril de 2021 y a la información contenida en el Sistema Integral de Gestión Minera Anna Minería.

II. Del Programa de Trabajos y Obras (PTO).

Además de la delimitación definitiva, conforme lo señala el artículo 19 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, esta Vicepresidencia **ORDENARÁ** al Grupo de Fomento la entrega de los estudios geológicos a los beneficiarios del área de reserva especial, para que dentro del término de cuatro (4) meses, contados a partir de su entrega, alleguen el Programa de Trabajos y Obras (PTO), como lo establece el artículo 20 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, que al respecto dispone:

> *"**ARTÍCULO 20. PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS – PTO.** La comunidad minera beneficiaria de un Área de Reserva Especial **contará con el término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de entrega de los estudios geológico –mineros, para presentar el Programa de Trabajos y Obras** de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Minas." (Negrilla fuera de texto)*

Lo anterior, por cuanto la presentación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) constituye una obligación por parte de la comunidad minera beneficiaria, cuyo incumplimiento constituye una causal de terminación del área de reserva especial, contemplada en el numeral 2° del artículo 24 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020, disposición que a la letra señala:

> *"**ARTÍCULO 24. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL ÁREA DE RESERVA ESPECIAL.** La Autoridad Minera, mediante acto administrativo motivado dará por terminada el Área de Reserva Especial declarada y delimitada por las siguientes causas: (...)*
>
> *2. Por la no presentación del Programa de Trabajos y Obras – PTO en el plazo establecido dentro de la presente resolución o del término otorgado para presentar los ajustes o complementos, o por el incumplimiento de los requerimientos que efectúe la Agencia Nacional de Minería frente su complementación. (...)"*

De otra parte, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas en el estudio geológico minero, depositadas en los **Informes Técnicos del Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 – Departamento de Córdoba No. 403 de 28 de septiembre de 2020** y su alcance **No. de 013 del 05 de mayo de 2021**, se recuerda a los beneficiarios del Área de Reserva Especial, que solo podrán desarrollar actividades de explotación minera dentro del polígono que fue declarado y delimitado mediante Acto Administrativo, lo anterior, so pena de configurarse la

causal de terminación contemplada en el numeral 8 del artículo 24 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020.

Así mismo, en la parte resolutiva de la presente decisión se ordenará la entrega a la comunidad beneficiaria del área de reserva especial declarada y delimitada mediante la Resolución VPF No. 086 del 27 de abril de 2018 copia de los **Informes Técnicos del Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 – Departamento de Córdoba No. 403 de 28 de septiembre de 2020** y su alcance **No. de 013 del 05 de mayo de 2021,** en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Resolución No. 266 de 2020.

III. De la modificación del censo de los beneficiarios del ARE.

El parágrafo primero del artículo 17 de la Resolución No. 266 de 2020, establece:

> *"**ARTÍCULO 17. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS GEOLÓGICOS – MINEROS.** Una vez en firme el acto administrativo por el cual se declara y delimita un Área de Reserva Especial, la Autoridad Minera adelantará las gestiones pertinentes para elaborar los estudios geológico-mineros a que se refiere el artículo 31 de la Ley 685 de 2001 dentro del área declarada.*
>
> ***Parágrafo 1.**Cuando del resultado de la visita técnica para la elaboración de los estudios geológico–mineros, se verifique la existencia de otras explotaciones tradicionales no relacionadas durante el trámite de declaración y delimitación del Área de Reserva Especial, deberá incluirse en el informe de visita la relación de los explotadores tradicionales junto con los medios probatorios a que haya lugar **para proceder a la modificación del censo de los beneficiarios del área declarada y delimitada. De igual forma, se procederá cuando se registre el abandono de los trabajos mineros por parte de los beneficiarios del Área de Reserva Especial o muerte de alguno de los beneficiarios.***
>
> *(...)" (Negrilla fuera de texto)*

Conforme lo reporta el **Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 – Municipio de Montería, Departamento de Córdoba Informe No. 403 del 28 de septiembre de 2020**, durante el trámite se estableció el **fallecimiento** del beneficiario, **FRANCISCO ANTONIO PATRÓN MARTÍNEZ**, identificado con cédula No. 6.880.234 conforme lo evidencia la consulta en la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde la cédula No 6.880.234 figura **como cancelada por muerte**.

Dicho lo anterior, es preciso señalar que el objetivo de la delimitación de las Áreas de Reserva Especial es adelantar estudios geológicos–mineros que permitan determinar el potencial minero del área eventualmente declarada y desarrollar en estas zonas proyectos mineros especiales, que por sus características geológico– mineras posibilitan un aprovechamiento a corto, mediano y largo plazo, a través de un **Contrato Especial de Concesión**.

Bajo este contexto surge para la Autoridad Minera concedente, en aquellos eventos dirigidos a la celebración de los contratos especiales de concesión, la obligación de verificación de la capacidad legal de los miembros que conforman la comunidad minera, es decir de los futuros concesionarios. En tal sentido, el Artículo 17 de la Ley 685 de 2001 relacionado con la capacidad legal para celebrar contratos de concesión minera con el Estado, advierte:

> *"**Artículo 17. Capacidad Legal. La capacidad legal** para formular propuesta de concesión minera y para **celebrar el correspondiente contrato, se regula por las disposiciones***

> ***generales sobre contratación estatal.*** *Dicha capacidad, si se refiere a personas jurídicas, públicas o privadas, requiere que en su objeto se hallen incluidas, expresa y específicamente, la exploración y explotación mineras (...)".* (Subrayado y Negrilla fuera del texto)

En concordancia con lo anterior, el Artículo 53 del mismo Código señala:

> *"**Artículo 53. Leyes de Contratación Estatal.** Las disposiciones generales sobre contratos estatales y las relativas a procedimientos precontractuales, no serán aplicables a la formulación y trámite de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación de ésta, **salvo las referentes a la capacidad legal a que se refiere el artículo 17 del presente Código.** En todas estas materias se estará a las disposiciones de este Código y a las de otros cuerpos de normas a las que el mismo haga remisión directa y expresa".* (Negrilla fuera del texto)

Así las cosas y por expresa remisión de los Artículos 17 y 53 del Código de Minas, para efectos de determinar la capacidad legal de las personas se debe acudir a la Ley 80 de 1993 *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"* normativa que en su Artículo 6° indica que pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces por las disposiciones vigentes.

En relación con el perfeccionamiento del contrato estatal, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, dispone:

> *"**ARTÍCULO 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.*
> *(...)*
> *Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. (...)"*

Por consiguiente, para el caso puntual, no podrán celebrar el contrato especial de concesión las personas que están imposibilitadas en manifestar su voluntad para lograr el acuerdo y la contraprestación sobre el mismo y, particularmente no puede hacerlo el beneficiario **FRANCISCO ANTONIO PATRÓN MARTÍNEZ, identificado con cédula No. 6.880.234,** por el hecho sobreviniente de su **fallecimiento**, tal cual se verificó en el **Estudio Geológico Minero del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 – Municipio de Montería, Departamento de Córdoba Informe No. 403 del 28 de septiembre de 2020**.

En virtud de lo anteriormente señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 17 de la Resolución No. 266 de 2020, se deberá **proceder a la modificación del censo de los beneficiarios del área declarada y delimitada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018,** el cual quedará conformado por las siguientes personas:

No.	Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía
1.	Jorge Enrique Sotelo Iglesia	6.882.061
2.	César Augusto Rojas Fajardo	78.690.836
3.	Santander Hernández Romero	10.899.491
4.	José Dionicio Villabolos	6.875.231
5.	Raúl Antonio Gómez Jiménez	6.873.388
6.	Andrés Miguel Pastrana Araujo	15.613.452
7.	Robinson Antonio Celestino Berrocal	6.893.843
8.	Fernando Segundo García Morales	78.697.093

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

Para finalizar, se deberá comunicar la decisión aquí tomada al alcalde de municipio de Montería – departamento de Córdoba y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS, para su conocimiento y fines pertinentes, según lo señalado en el artículo 19 de la Resolución No. 266 del 10 de julio de 2020.

En atención a que el Gobierno Nacional profirió el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la notificación o comunicación que se ordene en el presente acto administrativo deberá adelantarse de manera electrónica de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 4[1]. En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

El Vicepresidente de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, toma la presente decisión basada en los estudios y análisis efectuados por el Grupo de Fomento.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. - Delimitar Definitivamente como Área de Reserva Especial declarada y delimitada mediante la **Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018**, corregida por medio de la Resolución No. 231 de 19 de septiembre de 2019, según lo recomendado en el **Informe Técnico del Estudio Geológico Minero No. 013 del 05 de mayo de 2021**, en el certificado de área libre ANM-CAL-0118-21 y en el Reporte Gráfico ANM RG-0813-21 con fecha del 20 de abril de 2021 y a la información contenida en el Sistema Integral de Gestión Minera Anna Minería, en dos (2) polígonos, denominados **ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 1 (ARE-RCS-08001X) con un área de 46,2954 hectáreas y ARENACOR2 – MONTERÍA POLIGONO 2 (ARE-RCS-08021X) con un área de 53,6008 hectáreas**, delimitada dentro de las siguientes coordenadas, conforme a la parte motiva del presente acto administrativo:

Tabla 9. ESTUDIO DE ÁREA ARENACOR2 - MONTERIA POLÍGONO 1

DESCRIPCIÓN DEL P.A.	PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL P.A.	61
CÓDIGO ARE	ARE-RCS-08001X
NOMBRE ARE	ARENACOR2 – MONTERÍA POLÍGONO 1
DATUM	MAGNA SIRGAS
MUNICIPIOS - DEPARTAMENTO	MONTERÍA - CÓRDOBA
AREA TOTAL	46.2954 hectáreas

Fuente: *Certificado Área Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

---

[1] ***Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos.*** *Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.*
En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.
El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración.
En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica para notificación de los actos de inscripción o registro regulada en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

Tabla 10. ALINDERACIÓN DE ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 1

PUNTO	LONGITUD	LATITUD
1	-75,92400	8,72200
2	-75,92400	8,72100
3	-75,92400	8,72000
4	-75,92400	8,71900
5	-75,92500	8,71900
6	-75,92500	8,71800
7	-75,92600	8,71800
8	-75,92600	8,71700
9	-75,92700	8,71700
10	-75,92700	8,71600
11	-75,92800	8,71600
12	-75,92800	8,71500
13	-75,92800	8,71400
14	-75,92700	8,71400
15	-75,92600	8,71400
16	-75,92500	8,71400
17	-75,92400	8,71400
18	-75,92300	8,71400
19	-75,92200	8,71400
20	-75,92200	8,71500
21	-75,92100	8,71500
22	-75,92100	8,71600
23	-75,92100	8,71700
24	-75,92100	8,71800
25	-75,92000	8,71800
26	-75,92000	8,71900
27	-75,92000	8,72000
28	-75,92000	8,72100
29	-75,92100	8,72100
30	-75,92200	8,72100
31	-75,92300	8,72100
32	-75,92300	8,72200

Fuente: *Certificado Área Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

Tabla 11. CELDAS DE LA CUADRICULA MINERA CONTENIDAS EN ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 1

NÚMERO	CÓDIGO CELDA	ÁREA (Hectáreas)
1	18P11I11P10P	1,2183
2	18P11I11P10T	1,2183
3	18P11I11P10U	1,2183
4	18P11I11P10X	1,2183
5	18P11I11P10Y	1,2183
6	18P11I11P10Z	1,2183
7	18P11I11P15C	1,2183
8	18P11I11P15D	1,2183
9	18P11I11P15E	1,2183
10	18P11I11Q01R	1,2183
11	18P11I11Q01W	1,2183
12	18P11I11Q01X	1,2183
13	18P11I11Q01Y	1,2183
14	18P11I11Q01Z	1,2183
15	18P11I11Q06B	1,2183
16	18P11I11Q06C	1,2183
17	18P11I11Q06D	1,2183
18	18P11I11Q06E	1,2183
19	18P11I11Q06F	1,2183
20	18P11I11Q06G	1,2183
21	18P11I11Q06H	1,2183
22	18P11I11Q06I	1,2183
23	18P11I11Q06J	1,2183
24	18P11I11Q06K	1,2183
25	18P11I11Q06L	1,2183
26	18P11I11Q06M	1,2183
27	18P11I11Q06N	1,2183
28	18P11I11Q06Q	1,2183
29	18P11I11Q06R	1,2183
30	18P11I11Q06S	1,2183
31	18P11I11Q06T	1,2183
32	18P11I11Q06V	1,2183
33	18P11I11Q06W	1,2183
34	18P11I11Q06X	1,2183
35	18P11I11Q06Y	1,2183
36	18P11I11Q11A	1,2183
37	18P11I11Q11B	1,2183
38	18P11I11Q11C	1,2183

Fuente: *Certificado Área Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

Tabla 13. ESTUDIO DE ÁREA ARENACOR2 - MONTERIA POLÍGONO 2

DESCRIPCION DEL P.A.	PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL
PLANCHA IGAC DEL P.A.	61
CÓDIGO ARE	ARE-RCS-08021X
NOMBRE ARE	ARENACOR2 - MONTERÍA POLÍGONO 2
DATUM	MAGNA SIRGAS
MUNICIPIOS - DEPARTAMENTO	MONTERÍA - CÓRDOBA
AREA TOTAL	53,6008 hectáreas

Fuente: *Certificado Área Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

Tabla 14. ALINDERACIÓN DE ARENACOR2 - MONTERIA POLÍGONO 2

PUNTO	LONGITUD	LATITUD
1	-75,91400	8,74200
2	-75,91500	8,74200
3	-75,91600	8,74200
4	-75,91700	8,74200
5	-75,91800	8,74200
6	-75,91900	8,74200
7	-75,92000	8,74200
8	-75,92000	8,74100
9	-75,92100	8,74100
10	-75,92200	8,74100
11	-75,92200	8,74000
12	-75,92200	8,73900
13	-75,92300	8,73900
14	-75,92300	8,73800
15	-75,92400	8,73800
16	-75,92400	8,73700
17	-75,92400	8,73600

PUNTO	LONGITUD	LATITUD
18	-75,92300	8,73600
19	-75,92200	8,73600
20	-75,92200	8,73500
21	-75,92100	8,73500
22	-75,92000	8,73500
23	-75,92000	8,73600
24	-75,91900	8,73600
25	-75,91900	8,73700
26	-75,91800	8,73700
27	-75,91800	8,73800
28	-75,91700	8,73800
29	-75,91600	8,73800
30	-75,91500	8,73800
31	-75,91400	8,73800
32	-75,91400	8,73900
33	-75,91400	8,74000
34	-75,91400	8,74100

Fuente: *Certificado Área Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

Tabla 15. CELDAS DE LA CUADRICULA MINERA CONTENIDAS EN ARENACOR2 - MONTERIA POLÍGONO 2

NÚMERO	CÓDIGO CELDA	ÁREA (Hectáreas)
1	18P1111L06Y	1,2182
2	18P1111L06Z	1,2182

NÚMERO	CÓDIGO CELDA	ÁREA (Hectáreas)
3	18P1111L07Q	1,2182
4	18P1111L07R	1,2182

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

NÚMERO	CÓDIGO CELDA	ÁREA (Hectáreas)
5	18P11I11L07S	1,2182
6	18P11I11L07T	1,2182
7	18P11I11L07U	1,2182
8	18P11I11L07V	1,2182
9	18P11I11L07W	1,2182
10	18P11I11L07X	1,2182
11	18P11I11L07Y	1,2182
12	18P11I11L07Z	1,2182
13	18P11I11L08Q	1,2182
14	18P11I11L08V	1,2182
15	18P11I11L11D	1,2182
16	18P11I11L11E	1,2182
17	18P11I11L11H	1,2182
18	18P11I11L11I	1,2182
19	18P11I11L11J	1,2182
20	18P11I11L11L	1,2182
21	18P11I11L11M	1,2182
22	18P11I11L11N	1,2182
23	18P11I11L11P	1,2182
24	18P11I11L11R	1,2182

NÚMERO	CÓDIGO CELDA	ÁREA (Hectáreas)
25	18P11I11L11S	1,2182
26	18P11I11L11T	1,2182
27	18P11I11L11U	1,2182
28	18P11I11L11Y	1,2182
29	18P11I11L11Z	1,2182
30	18P11I11L12A	1,2182
31	18P11I11L12B	1,2182
32	18P11I11L12C	1,2182
33	18P11I11L12D	1,2182
34	18P11I11L12E	1,2182
35	18P11I11L12F	1,2182
36	18P11I11L12G	1,2182
37	18P11I11L12H	1,2182
38	18P11I11L12I	1,2182
39	18P11I11L12J	1,2182
40	18P11I11L12K	1,2182
41	18P11I11L12L	1,2182
42	18P11I11L12Q	1,2182
43	18P11I11L13A	1,2182
44	18P11I11L13F	1,2182

Fuente: *Certificado Area Libre ANM-CAL-0118 del 20 de abril de 2021*

PARÁGRAFO. - Se entienden excluidas del área delimitada definitivamente a través del artículo primero de la presente resolución, las áreas que pertenezcan a títulos mineros debidamente otorgados e inscritos en el Registro Minero Nacional.

ARTÍCULO SEGUNDO. - EXCLUIR al señor **FRANCISCO ANTONIO PATRÓN MARTÍNEZ, identificado con cédula No. 6.880.234**, como beneficiario del área de reserva especial declarada y delimitada mediante **Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018,** ubicada en el municipio de Montería – Departamento de Córdoba, **quien se reporta como FALLECIDO** en la base de datos de la Registraduría Nacional del estado Civil donde ese documento de identidad figura cancelado, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. – MODIFICAR el censo de los beneficiarios integrantes de la comunidad minera tradicional del área de reserva especial declarada y delimitada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018**,** el cual quedará conformado por las siguientes personas:

No.	Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía
1.	Jorge Enrique Sotelo Iglesia	6.882.061
2.	César Augusto Rojas Fajardo	78.690.836
3.	Santander Hernández Romero	10.899.491
4.	José Dionicio Villabolos	6.875.231
5.	Raúl Antonio Gómez Jiménez	6.873.388
6.	Andrés Miguel Pastrana Araujo	15.613.452
7.	Robinson Antonio Celestino Berrocal	6.893.843
8.	Fernando Segundo García Morales	78.697.093

ARTÍCULO CUARTO. – NOTIFICAR la presente Resolución a las personas relacionadas a continuación, a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, según lo establecido el artículo 4 del Decreto 491 de 28 de marzo de 2020, o en su defecto, procédase de conformidad con el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011:

"Por medio de la cual se ordena la delimitación definitiva del Área de Reserva Especial ARENACOR 2 ubicada en jurisdicción de los municipios de Montería, departamento de Córdoba, delimitada y declarada mediante Resolución VPPF No. 086 del 27 de abril de 2018 y se toman otras determinaciones"

No.	Nombre y Apellidos	Cédula de Ciudadanía
1.	Jorge Enrique Sotelo Iglesia	6.882.061
2.	César Augusto Rojas Fajardo	78.690.836
3.	Santander Hernández Romero	10.899.491
4.	José Dionicio Villabolos	6.875.231
5.	Raúl Antonio Gómez Jiménez	6.873.388
6.	Andrés Miguel Pastrana Araujo	15.613.452
7.	Robinson Antonio Celestino Berrocal	6.893.843
8.	Fernando Segundo García Morales	78.697.093

ARTÍCULO QUINTO. – PUBLICAR la presente resolución en la página web de la Agencia Nacional de Minería, de conformidad a lo dispuesto a lo en el artículo 73 de la ley 1437 de 2011 en atención al fallecimiento del señor **FRANCISCO ANTONIO PATRÓN MARTÍNEZ, identificado con cédula No. 6.880.234,** QPD el cual estuvo **identificado con cédula No. 6.880.234**

ARTÍCULO SEXTO. – En firme el presente acto administrativo, **ORDENAR** al Grupo de Fomento la entrega de los estudios geológicos mineros del Área de Reserva Especial del municipio de Montería, departamento de Córdoba, elaborado por la Agencia Nacional de Minería, a la comunidad minera beneficiaria del área de reserva especial, conforme lo establece el artículo 19 de la Resolución No. 266 de 2020.

ARTÍCULO SÉPTIMO. – En firme el presente acto administrativo, **COMUNICAR** la decisión aquí tomada, a través del Grupo de Información y Atención al Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación, al alcalde de municipio de Montería – departamento de Córdoba y a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge -CVS, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO OCTAVO. – Una vez ejecutoriada la presente decisión, remitir copia de la misma, al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la ANM, para que se tomen las medidas pertinentes frente a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 685 de 2001.

ARTÍCULO NOVENO. – Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 76 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y atendiendo lo expuesto en la parte motiva.

Dada en Bogotá, D.C.,

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GERMÁN BARCO LÓPEZ
VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO

Proyectó: Fanny Ricaurte P. / Abogada Grupo de Fomento FRP.
Revisó: Talia Salcedo Morales – Abogada Contratista GF
Revisó: Carlos Ariel Guerrero – Abogado Asesor VPPF cagg
Aprobó: José Martín Pimiento Martínez – Gerente de Fomento
Expediente: ARE-RCS-08001X, ARE-RCS-08021X

ANEXO 4.3 ESTADO LICENCIA AMBIENTAL ARENACOR

4686
4930

CVS
Por el desarrollo sostenible del departamento de Córdoba
Córdoba Hídrica Biodiversa

Montería,

CVS 18/01/2023 18:50
Al Contestar cite este No.: **20232100667**
Origen: Subdirección de Gestión Ambienta
Destino:JORGE ENRIQUE SOTELO IGLESIA
Anexos: Fol: 1

Señor
JORGE ENRIQUE SOTELO IGLESIA
REPRESENTANTE LEGAL
Tel: 3215109397, Cel: 3209277766
Carrera 1 manzana 5 lote 4 barrio Brisas del sinu
arenacor01@gmail.com
Montería (Cordoba)

ASUNTO: Respuesta al radicado 20221100166: Pronunciamiento y Resultado del estado impacto ambiental solicitud de licencia

Cordial saludo,

En atención a su solicitud según el asunto, le informamos que una vez revisada la base de datos de Licencias y Permisos que reposa en la Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS y archivos y correspondencia, se pudo constatar que el trámite de solicitud de licencia ambiental temporal para el proyecto minero "Arenacor", se encuentra en evaluación técnica y jurídica.

Reiteramos nuestro compromiso de trabajo por Córdoba Territorio Sostenible.

Atentamente,

ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Subdirector de Gestión Ambiental

Respuesta a: 20221100166 del 12/01/2022

Elaboró: Rosa Ali Pastrana Argumedo / SGA

ANEXO 5. CERTIFICACIÓN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

56	REGISTRO MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS	EDITADO: 29-10-2022
	Código: CCIS F R 53 VERSIÓN: 01	

Clase de Vehículo o maquinaria Retro Excavadora Marca CAT

FECHA	TIPO MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	PERSONA O EMPRESA	REPUESTOS	FIRMA
	Correctivo	Preventivo				
29/11/22	✓		Reparación de motor de arranque, y arreglo hidraulico	Julio Taller		* Andres V.
7/12/2022	✓		sistema de engrase en la parte inferior del valde de la retro excavadora	Julio Taller		Andres V.

Powered by CamS

ANEXO 6. PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE.

4688
4932

VEOLIA

Suscriptor: ALCALDIA DE MONTERIA
Ruta: 873 LA COQUERA Orden: 20 Ciclo: 3015
Dirección: LA COQUERA CRA 3 # 0005 - 034 MONTERIA
No. DE CONTRATO: 27026
Número para cualquier consulta
Uso / Estrato: Oficial / Fecha de Ultimo Pago: 17-11-2022
Factura de Servicio Público No.: 10682225 Valor Ultimo Pago: $57,450
Fecha de Vencimiento: 22-12-2022 Fecha de Suspensión: 23/12/2022
Fecha de Expedición: 12-12-2022 Período: 04/11/2022 - 06/12/2022
Código Predial Catastral: 230010103000022300010000000000

1419

VEOLIA
Veolia Aguas de Monteria S.A.E.S.P


TOTAL A PAGAR
$ 40,530

Escanea este código y paga tu factura desde el celular

Datos del Medidor

Marca: Aquadis Número: 14005333 Diámetro: 15

Datos del Consumo en m³



Lect. Act.: 22
Lect. Ant.: 232
Fecha de Lect. Act.: 06/12/2022
Fecha de Lect. Ant.: 04/11/2022
Incidencia de Lectura: No aplica
Diferencia de Lecturas:
Consumo (M³ Facturados): 7
Promedio (M³ Usuario): 7

Factura de Acueducto y Alcantarillado

Descripción de Conceptos Facturados	Valor
SERVICIO ACUEDUCTO	
[0-16] Cons.basico 7.00 Mts3 * 2,145.00 = 15,015	15,015
Consumo Acueducto 7 M3	7,354
Cargo Fijo Acueducto	
Total Acueducto	**22,369**
SERVICIO ALCANTARILLADO	
[0-16] Cons.basico 7.00 Mts3 * 2,151.00 = 15,057	15,057
Consumo Alcantarillado 7 M3	3,100
Cargo Fijo Alcantarillado	4
Ajuste Por Redondeo	
Total Alcantarillado	**18,161**
Total Veolia Aguas de Monteria S.A.E.S.P.	**$ 40,530**

AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN 0547 DE ENERO 25 DE 2002

Costo Suspension y Reinstalacion	Costo de Corte y Reconexión	Vigilado Superservicios	REPRESENTANTE LEGAL
28.000	46.000		

Total a pagar mes
$ 40,530

SOLO BANCOS

(415)7709998002876(8020)0000027026(3900)0000040530(96)20221222

14404828

No. de Contrato: 27026
Fecha de Vencimiento: 22-12-2022
Factura No. 10682225
Periodo: 04/11/2022 - 06/12/2022

Total a pagar
$ 40,530

(415)7709998002876(8020)0000027026(3900)0000040530(96)20221222

27026

4689
4933

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

PAGOS ELECTRONICOS SCOTIABANK COLPATRIA

Pago realizado por: ANA GREYS BERROCAL SIERRA

Nro. de factura: 30848621

Descripción del pago: VEOLIA AGUAS DE MONTERIA

Nro. de referencia: 27026

Nro. de referencia 2:

Nro. de referencia 3: 190.28.121.126

Fecha y hora de la transacción: Sábado 17 de Diciembre de 2022 07:56:30 AM

Nro. de comprobante: 0000006141

Valor pagado: $ 40,530.00

Cuenta: *******0596

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

ANEXO 7. CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO DE BAÑOS PORTÁTILES

SepticClean by VEOLIA	CERTIFICADO DE DISPOSICIÓN	FORMATO VIS-IPA-F-16 Versión: 04

FECHA:	**DIA**	6	**MES**	1	**AÑO**	2023	**CIUDAD:**	**MONTERIA**	**CERTIFICADO N°:**	**USP-8139-23**
CLIENTE:	**SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS**			**DIRECCIÓN CLIENTE:**		**Proyecto: CIS**			**NIT CLIENTE:**	**830007691**
GENERADOR:	**SOLETANCHE BACHY COLOMBIA SAS**			**DIRECCIÓN/PROYECTO GENERADOR:**		**Proyecto: CIS**			**NIT GENERADOR:**	**830007691**

CERTIFICADO DE SERVICIOS

Por medio de la presente me permito certificar que SEPTICLEAN SAS E.S.P presta en la actualidad los servicios públicos de aseo en las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos generados en USP el fin de resolver las necesidades sanitarias y ambientales en las instalaciones del cliente.

No de baños:			2
Modelo de Baño:			ASPEN
No. de aseos:	Semanal:	2	
	Mensual:	8	
Periodo de servicio:			DICIEMBRE 2022
Consumo de agua:			36 Gal
Volumen de residuos retirados:			144 Gal

La dispocion final de los residuos líquidos se realizó en la Estación de Aguas de Cartagena, SA E.S.P. Estación de aguas Residuales paraísen la ciudad de Cartagena. Segun la resolucion Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique N° 1286 del 31 de Julio de 2017, y los permisos de vertimiento expedidos por el Establecimiento Público Ambiental resolución N° 0165 .

Cordialmente,

Juan C Jaramillo Rodríguez
Lider Regional Costa Norte
Septiclean S.A. E.S.P.
Tel. Móvil: (+57) 310 267 7167
Parque Ambiental Tecnológico del Caribe Tecniamsa - Km 11 vía Juan Mina

4934

ANEXO 8. CÁMARA DE COMERCIO Y RUT SEPTICLEAN

4691
4935

CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.
Fecha expedición: 2021/12/28 - 16:49:44

*** SOLO CONSULTA SIN VALIDEZ JURÍDICA ***
CODIGO DE VERIFICACIÓN ndMPWuWzKe

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900222512-7
ADMINISTRACIÓN DIAN : MANIZALES
DOMICILIO : MANIZALES

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 129060
FECHA DE MATRÍCULA : JUNIO 09 DE 2008
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 31 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 22,320,728,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO I - NIIF PLENAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 62 23-61 L 203 ED PLAZA 62
BARRIO : PALOGRANDE
MUNICIPIO / DOMICILIO: 17001 - MANIZALES
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8845868
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 8735555
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 8814060
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : ximena.salamanca@veolia.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 62 23-61 L 203 ED PLAZA 62
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
BARRIO : PALOGRANDE
TELÉFONO 1 : 8845868
TELÉFONO 2 : 8735555
TELÉFONO 3 : 8814060
CORREO ELECTRÓNICO : ximena.salamanca@veolia.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : E3900 - ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL Y OTROS SERVICIOS DE GESTION DE DESECHOS

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

Decreto 0019 de 2012. Para uso exclusivo de las entidades del Estado

4692
4936

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ABRIL DE 2008 DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 53611 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE JUNIO DE 2008, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA SEPTICLEAN S.A..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) SEPTICLEAN S.A.
2) SEPTICLEAN S.A.S
Actual.) SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JULIO DE 2013 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 65417 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2013, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SEPTICLEAN S.A. POR SEPTICLEAN S.A.S

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 2 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72051 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE ENERO DE 2016, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE SEPTICLEAN S.A.S POR SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.

CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 16 DE JULIO DE 2013 SUSCRITA POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 65417 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 13 DE AGOSTO DE 2013, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : TRANSFORMACION A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-5	20090414	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-55323	20090427
AC-5	20120331	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-62801	20120601
AC-7	20130716	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-65417	20130813
2	20151228	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-72051	20160125
10	20210325	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	MANIZALES	RM09-89726	20210721

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. - EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD LO CONSTITUYEN TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O CIVILES LÍCITAS, ADEMÁS DE LAS SIGUIENTES: 1) DISEÑO, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN GENERAL Y ESPECIALMENTE DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SUS COMPONENTES DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, TRANSFORMACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEMISÓLIDOS, LÍQUIDOS, SEMILIQUIDOS, ORDINARIOS, NO ORDINARIOS, BIOMÉDICOS, LODOS, PELIGROSOS O ESPECIALES, Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL MISMO, INCLUYENDO EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE RELLENOS SANITARIOS, DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LIXIVIADOS, DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LIXIVIADOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS O CONEXAS; 2) COMPRAVENTA, ALQUILER, INSTALACIÓN Y PRÉSTAMO DE BAÑOS PORTÁTILES; 3) DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE BAÑOS PORTÁTILES; 4) DISEÑO, ASESORÍA, EVALUACIÓN, MONTAJE, CONSTRUCCIÓN,

El presente documento tiene plena validez jurídica conforme a lo establecido en el artículo 15 del Decreto Ley 019 de 2012 y se expide en virtud de las facultades otorgadas por el Estado

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE POZOS SÉPTICOS, TRAMPAS DE GRASAS, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y, EN GENERAL, DE TODOS LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SEMILÍQUIDOS; 5) TRATAMIENTO, RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES O SERVIDAS Y DE RESIDUOS LÍQUIDOS Y SEMILÍQUIDOS; 6) ASESORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS; 7) ESTUDIO DE PÉRDIDAS, MONITORIO DE CANTIDAD Y CONSUMO DE AGUA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE O RESIDUAL; 8) SUCCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LODOS PROVENIENTES DEL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; 9) LAVADO DE TANQUES, LAVADO DE FACHADAS, SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURA EXTERNA E INTERNA, SONDEO Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS Y SISTEMAS DE DESAGUE; 10) DISEÑO, ASESORÍA, EVALUACIÓN, MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y LIMPIEZA DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA; 11) MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, ALCANTARILLADOS, CANALES, COLECTORES DE AGUAS. 12) COMERCIALIZACIÓN DE ACEITES USADOS, TIPO HIDROCARBUROS, VEGETALES Y ANIMALES; 13) MANEJO, PROCESAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE RESIDUOS, LODOS Y GRASAS PARA SU APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN. 14) DISEÑO, DESARROLLO, CULTIVO Y COMERCIALIZACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y RESIDUOS, Y ESTABILIZACIÓN Y DIGESTIÓN DE LODOS; 15) CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS; 16) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DRAGADO Y SUCCIÓN Y EN GENERAL LIMPIEZA DE CUERPOS DE AGUA; 17) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y/O SISTEMAS DE MANEJO O DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS; 18) CARGUE, DESCARGUE, PORTE, TRANSPORTE, RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, Y EN GENERAL, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS O SEMISÓLIDOS, ORDINARIOS, ESPECIALES O PELIGROSOS EN PUERTOS, ZONAS FRANCAS, BASES NAVALES, ETC.; 19) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORIA O EDUCACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON SERVICIOS PÚBLICOS, MEDIO AMBIENTE, Y ECOLOGÍA.; 20) DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN CIENTÍFICA E INGENIERÍA RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE, ECOLOGÍA, IMPACTO AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL; Y SERVICIOS DE CONSULTORIA RELATIVOS A ÉSTOS; 21) COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO INSTALACIÓN, OPERACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS, SISTEMAS, PLANTAS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTÍCULOS PARA LOS SECTORES DE SERVICIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DE SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL, ESPECIALMENTE SANEAMIENTO BÁSICO, SERVICIO DE ASEO ESPECIAL Y RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL); 22) SOLICITUD, TRAMITE Y RECEPCIÓN DE LICENCIAS DE MARCA, PATENTES Y TECNOLOGÍA EN LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN LOS NUMERALES ANTERIORES. PARÁGRAFO PRIMERO. – PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA EMPRESA PODRÁ: A. ADQUIRIR, USUFRUCTUAR, GRAVAR, LIMITAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO O A CUALQUIER OTRO TÍTULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TÍTULO, PARCELARIOS, CONSTRUIRLOS, ENAJENARLOS O DE CUALQUIERA OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS, GRAVARLOS CON PRENDA E HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS EN GARANTÍA A TERCEROS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O CONVENIENCIA ASÍ SE LO REQUIERA. B. PARTICIPAR COMO SOCIA O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCIÓN DE OTRAS SOCIEDADES QUE PRESTEN SERVICIOS PÚBLICOS, REALIZAR INVERSIÓN EN ACCIONES, BONOS, PARTICIPACIONES O CUOTAS DE INTERÉS EN CUALQUIER TIPO DE PERSONAS JURÍDICAS, INCLUSIVE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES EN CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS, Y VALORES EN COLOMBIA Y EN EL EXTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO LO AUTORICE LA JUNTA DIRECTIVA C. TOMAR INTERÉS COMO ACCIONISTA, FUNDADOR O NO, EN OTRAS COMPAÑÍAS QUE TENGAN FINES SIMILARES, FUSIONARSE CON ELLAS O INCORPORARSE EN ELLAS O ABSORBERLAS, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPAÑÍA. D. TOMAR O DAR DINERO EN MUTUO, CON GARANTÍAS REALES O PERSONALES. E ADQUIRIR U OTORGAR CONCESIONES PARA SU EXPLOTACIÓN SIEMPRE Y CUANDO SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL. F. PARTICIPAR Y PRESENTAR OFERTAS EN LICITACIONES, CONVOCATORIAS O CONCURSOS PÚBLICOS O PRIVADOS, DIRECTAMENTE O A TRAVÉS CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES, EN MECANISMOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CELEBRAR CONTRATOS DE MUTUO, LEASING, SEGUROS, TRANSPORTES, CUENTAS EN PARTICIPACIÓN. G CONSTITUIRSE EN GARANTE DE OBLIGACIONES AJENAS O GARANTIZAR O CAUCIONAR CON SUS PROPIOS BIENES O PATRIMONIO OBLIGACIONES DE TERCEROS, SI LA JUNTA DIRECTIVA ASÍ LO AUTORIZA. H. RECIBIR EN CONCESIÓN O USUFRUCTO O COMODATO EL DERECHO AL USO Y GOCE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. I. IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR Y VENDER BIENES O SERVICIOS QUE SE REQUIERAN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL; J. CELEBRAR, EN GENERAL, TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CONTEMPLAN Y AUTORIZAN LAS LEYES 142 DE 1994 Y 689 DE 2001 Y LAS QUE LAS MODIFIQUEN O ADICIONEN PARA LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

DOMICILIARIOS, Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODO ACTO O CONTRATO QUE SE RELACIONE DIRECTAMENTE CON EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA. PARÁGRAFO SEGUNDO.- EN CONSIDERACIÓN A SU OBJETO LA SOCIEDAD QUEDA SOMETIDA A CUMPLIR EL MISMO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, LEYES Y REGLAMENTOS QUE REGULEN LAS ACTIVIDADES CONSAGRADAS EN EL OBJETO SOCIAL. PARÁGRAFO TERCERO.- LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE LA SOCIEDAD REALICE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ESTÁN SUJETOS A LAS REGLAS DEL DERECHO PRIVADO Y A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, CONFORME A LAS NORMAS DE COMPETENCIA SOBRE LA MATERIA. LOS CONTRATOS QUE CELEBRE LA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES NO ESTÁN SUJETOS, SALVO DISPOSICIÓN LEGAL EN CONTRARIO, A LAS FORMALIDADES QUE LA LEY EXIGE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LAS CLÁUSULAS QUE EN ELLOS SE INCLUYAN DEBEN SER LAS USUALES PARA LOS CONTRATOS ENTRE PARTICULARES.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	2.000.000,00	1.000,00
CAPITAL SUSCRITO	400.000.000,00	400.000,00	1.000,00
CAPITAL PAGADO	400.000.000,00	400.000,00	1.000,00

CERTIFICA - SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 21 DE AGOSTO DE 2014 SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67902 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 26 DE AGOSTO DE 2014, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL ENTRE EMPRESA MTROPOLITANA DE ASEO S.A E.S.P (MAT RIZ) Y SEPTICLEAN S.A.S (SUBORDINADA).

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. -EMAS-
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : 8002491745
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
DIRECCIÓN : KM 2 VIA A NEIRA RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA
PAIS : Colombia
CIIU : E3811 - Recoleccion de desechos no peligrosos
CIIU : E3821 - Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos
CIIU : E3700 - Evacuacion y tratamiento de aguas residuales
CIIU : M7020 - Actividades de consultoria de gestion

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE FEBRERO DE 2018 SUSCRITO POR REPRESENTANTE LEGAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 78304 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE FEBRERO DE 2018, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL:

SITUACION DE CONTROL ENTRE SEPTICLEAN S.A.S (MATRIZ) Y STAP ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P.(SUBORDINADA).

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : SEPTICLEAN S.A.S E.S.P.
MUNICIPIO : MANIZALES
PAIS : Colombia

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : STAP ANTIOQUIA S.A.S. E.S.P.
SUBORDINADA EN SITUACION DE CONTROL
IDENTIFICACION : 9005345197

MUNICIPIO : 05631 - SABANETA
DIRECCIÓN : CR 47D CL 79 SUR 81
PAIS : Colombia
CIIU : E3700 - Evacuacion y tratamiento de aguas residuales
CIIU : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
CIIU : H4923 - Transporte de carga por carretera
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2017-01-31

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO VC.DE.314-0618 DEL 21 DE JUNIO DE 2018 SUSCRITO POR APODERADO ESPECIAL REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 79582 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 05 DE JULIO DE 2018, SE COMUNICÓ QUE SE HA CONFIGURADO UN GRUPO EMPRESARIAL :

EL APODERADO ESPECIAL DE LA SOCIEDAD VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA S.A SOCIEDAD IDENTIFICADA CON CIF A81560120 DE NACIONALIDAD ESPA[10]OLA, INFORMA LA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL ENTRE ESTA COMO MATRIZ Y LAS SOCIEDADES: EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE S.A. E.S.P, SEPTICLEAN S.A.S E.S.P Y MANOS AMIGAS S.A EN LIQUIDACION COMO SUBORDINADAS, A TRAVES DE LA EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A E.S.P, Y ASEO URBANO S.A.S E.S.P.

**** EMPRESA MATRIZ / CONTROLANTE** : VEOLIA HOLDING AMERICA LATINA S.A.
MATRIZ O CONTROLANTE
IDENTIFICACION : A81560120
MUNICIPIO : FUERA DEL PAIS
DIRECCIÓN : MADRID, CALLE TORRELAGUNA, 60.
PAIS : España
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2018-05-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : ASEO URBANO S.A.S. E.S.P.
SUBORDINADA DIRECTA
IDENTIFICACION : 8070050208
MUNICIPIO : 54001 - CUCUTA
DIRECCIÓN : AV 0 2N-21
PAIS : Colombia
CIIU : E3811 - Recoleccion de desechos no peligrosos
CIIU : E3821 - Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos
CIIU : E3812 - Recoleccion de desechos peligrosos
CIIU : F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2018-05-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A. E.S.P. -EMAS-
SUBORDINADA INDIRECTA
IDENTIFICACION : 8002491745
MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES
DIRECCIÓN : KM 2 VIA A NEIRA RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA
PAIS : Colombia
CIIU : E3811 - Recoleccion de desechos no peligrosos
CIIU : E3821 - Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos
CIIU : E3700 - Evacuacion y tratamiento de aguas residuales
CIIU : M7020 - Actividades de consultoria de gestion
FECHA DE CONFIGURACION DE LA SITUACIÓN : 2018-05-15

**** EMPRESA SUBORDINADA / CONTROLADA** : EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE OCCIDENTE S.A.S. E S P
SUBORDINADA INDIRECTA
IDENTIFICACION : 8100026465
MUNICIPIO : 17042 - ANSERMA
