BOGOTÁ	**ALCALDIA DE BOGOTA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANGATIVA** **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022**	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO VERSION FECHA 26 1 23 PAGINA: 1 DE: 3

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 6 DEL jueves, 19 de enero de 2023 AL miércoles, 25 de enero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 42 DIAS PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 200 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ _____ PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO _____

A la fecha de corte del presente informe, el consultor debería llevar un 6%, pero a la fecha lleva un 5% de ejecución.

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	1	6
Porcentaje de avance financiero programado		
Valor de avance financiero programado		

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	1	5
Porcentaje de avance financiero ejecutado		
Valor de avance financiero ejecutado		

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO

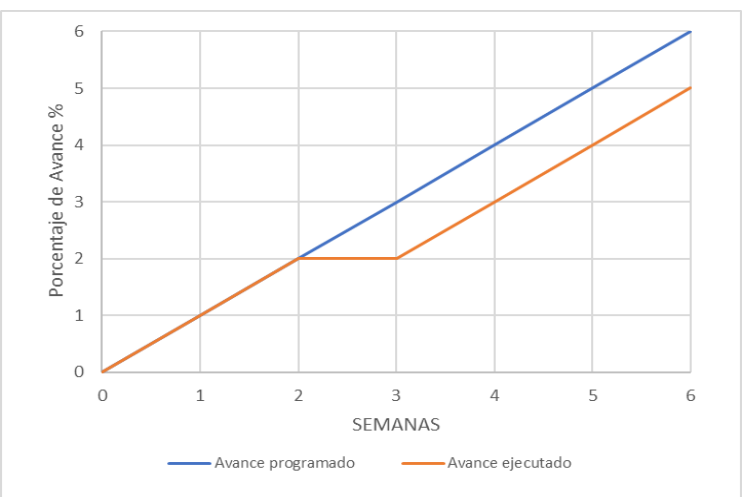

Semana	Avance programado (%)	Avance ejecutado (%)
0	0	0
1	1	1
2	2	2
3	3	2
4	4	3
5	5	4
6	6	5

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Por medio del oficio CIA-E-DT-0036-23, se recibió de parte de la Consutoría un archivo con los oficios a entidades faltantes.
2. A través del comunicado 21-22-GDING-PROY187, la Interventoría envió a la Consultoría, las observaciones a los informes semanales 1 a 5 .
3. Por medio del oficio CIA-E-DT-0039-23, se recibió de parte del Consultor, una matriz en excel con los oficios y sus radicados a diferentes entidades
4. A través de correo electrónico del 19 de enero de 2023, se recibió de parte de la Supervisión un modelo de presentación, un modelo de volantes y la información del personal de las juntas de acción comunal de Engativá.
5. Por medio del comunicado CIA-E-DT-0045-23 se recibió de parte de la Consultoría un formato de ficha técnica para visita a CIVs
6. A través del oficio CIA-E-DT-0043-23 se recibió de parte del Consultor, una "Metodología de socialización de actividades sociales"
7. La Consultoría inició la materialización de los primeros puntos de GPS.
8. Mediante correo del 26 de enero de 2023, Geodinámica Ingeniería S.A. envió a la Supervisión, los informes semanales de Interventoría 5 y 6.
9. El lunes 23 de enero de 2023, la interventoría hizo presencia en el sitio de incio de materialización de GPS
10. Por medio del oficio 19-22-GDING-PROY187, la Interventoría remitió al Consultor las observaciones a la ficha técnica de visita a CIVs.
11. A través del comunicado 19-22-GDING-PROY187, la interventoría envió a la Consultoría, las observaciones a la "Metodología de socialización de actividades sociales"
12. Mediante correo electrónico del 23 de enero de 2023, la Interventoría envió el acta del comité N° 4.
13. A través del comunicado CIA-E-DT-0050-23, se recibió de parte del Consultor los informes semanales corregidos.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. Continuar con la materialización de puntos de GPS, por parte del Consultor
2. Realizar el post-proceso y el cálculo de coordenas GPS, por parte del Consultor
3. Inciar los recorridos a los 114 CIVs inicales

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe el Consultor inició los trabajos de campo con la materialización de los primeros puntos de GPS.

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Comité de obra del 19 de enero de 2023



Comité de obra del 19 de enero de 2023



Materialización de GPS



Materialización de GPS

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
