OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 7 DEL jueves, 26 de enero de 2023 AL miércoles, 1 de febrero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 49 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 193 DIAS

PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	7	9
Porcentaje de avance financiero programado	0	0
Valor de avance financiero programado	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	4	7
Porcentaje de avance financiero ejecutado	0	0
Valor de avance financiero ejecutado	0	0

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO


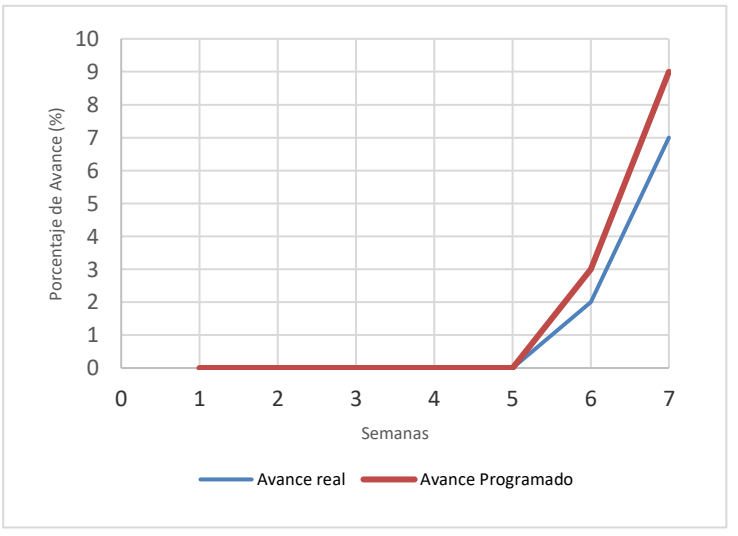


GRAFICO DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO vs EJECUTADO

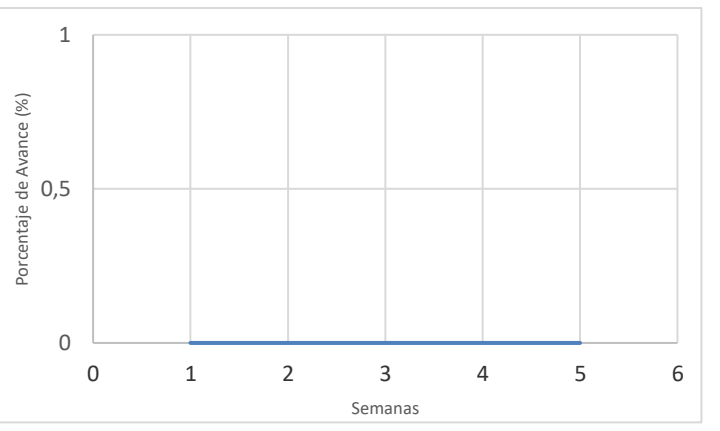

PORCENTAJES DE INCIDENCIA				PAQUETE 1 (42 CIVs)	AVANCE				AVANCE DEL PROYECTO	AVANCE TOTAL DEL PAQUETE 1
COMPONENTE	RECURSO	TOTAL	% PROYECTO	30%	10%	60%	15%	15%		
1	TOPOGRAFIA	$ 299.440.286	15,7%	4,7%	100%	52%	0%	0%	1,9%	41,2%
2	TRANSITO	$ 164.480.366	8,6%	2,6%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
3	DISEÑO GEOMETRICO	$ 183.042.926	9,6%	2,9%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
4	ARQUITECTURA Y PAISAJISMO	$ 183.042.926	9,6%	2,9%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
5	REDES	$ 265.502.766	13,9%	4,2%	100%	20%	0%	0%	0,9%	22,0%
6	GEOTECNIA, PAVIMENTOS Y ESTRUCTURAL	$ 327.408.266	17,1%	5,1%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
7	PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	$ 150.533.623	7,9%	2,4%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
8	ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 66.679.058	3,5%	1,0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
9	SOCIAL, AMBIENTAL Y SST	$ 269.342.281	14,1%	4,2%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%
	TOTAL	**$ 1.909.472.497**	**100,0%**	**30,0%**					**2,9%**	**7,0%**

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. El consultor finalizó los recorridos de visitas a los 112 CIVs iniciales.
2. El consultor continuó con la localización de pozos.
3. Por medio de correo electrónico del 26 de enero de 2023, la Interventoría envió a la Supervisión los informes semanales 1 a 4 corregidos
4. A traves de correo electrónico se recibió nuevamente de parte de la Supervisión el modelo para corregir los informes semanales.
5. Por medio del comunicado CIA-E-DT-0054-23 la Consultoría envió el certificado de calibración de un nivel marca RUIDE
6. El Consultor inició el levantamiento topográfico del CIV 10002609
7. El 31 de enero, la Interventoría atendió una reunión virtual convocada por la Supervisión.
8. Mediante el oficio CIA-E-DT-0056-23 se recibió de parte de la Consultoría, un presupuesto de exploración de campo (perforaciones y apiques) y ensayos de laboratorios necesarios para realizar los diseños geotécnicos y de pavimentos necesarios en cada tramo vial.
9. A través de correo electrónico del 30 de enero de 2023, la Interventoría envió a la supervisión el informe semanal N° 6 corregido.
10. Por medio de correo electrónico de 30 de enero de 2023, la Interventoría remitió a la Supervisión el acta del comité N° 5.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. El Consultor continuará con el levantamiento topográfico de CIVs
2. El Consultor enviará a la Interventoría las fichas técnicas de los CIVs a diseñar
3. La Interventoría presentará el Informe mensual


5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe el Consultor en compañía de la Interventoría finalizó las visitas a los 112 CIVs iniciales y continuó la localización de pozos e inició el levantamiento topográfico de los segmentos viales que se va a diseñar.

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

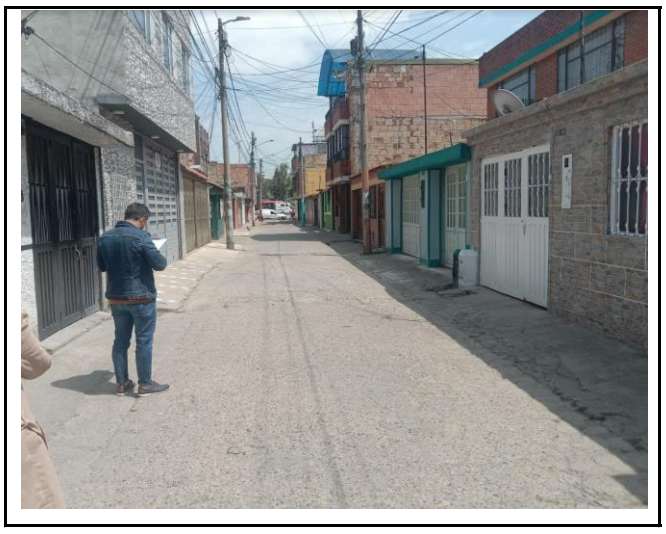

Recorrido por CIVs



Recorrido por CIVs



Localización de pozos



Levantamiento topográfico de CIVs

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO

Apoyo a la Supervisión CIRISTIAN ENCISO
