BOGOTÁ	**ALCALDIA DE BOGOTA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANGATIVA** **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022**	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO VERSION FECHA 9 2 23 PAGINA: 1 DE: 3

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 7 DEL jueves, 2 de febrero de 2023 AL miércoles, 8 de febrero de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 56 DIAS — PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 186 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SI — PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SI CONTRATO

De acuerdo con el cronograma preliminar presentado por el Consultor, a la fecha de corte del presente informe se tiene un porcentaje de avance del 9%, pero el Consultor debería tener ejecutado un 12%.

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	3	12
Porcentaje de avance financiero programado	0	0
Valor de avance financiero programado	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	2	9
Porcentaje de avance financiero ejecutado	0	0
Valor de avance financiero ejecutado	0	0

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO

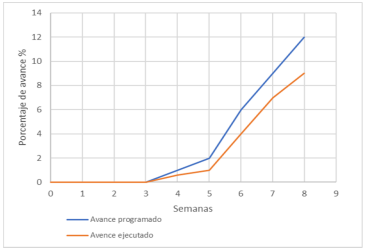

Los segmentos viales que constituyen el paquete N°1 que corresponden al 30% del total de los 140 contractuales, son los que se muestran en el siguiente cuadro.

No	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	UPZ	AREA CALZADA (M2)	KM/CARRIL
1	10000499	CALLE 66	CARRERA 126	CARRERA 127	EL GACO	74 - ENGATIVA	274,98	0,09
2	10000541	CALLE 67	CARRERA 124A	CARRERA 125	EL GACO	74 - ENGATIVA	201,2	0,07
3	10000583	CALLE 67	CARRERA 124	CARRERA 124A	EL GACO	74 - ENGATIVA	132,63	0,04
4	10000609	CALLE 66	CARRERA 125	CARRERA 126	EL GACO	74 - ENGATIVA	471,02	0,16
5	10000623	CALLE 67	CARRERA 123B	CARRERA 124	EL GACO	74 - ENGATIVA	114,92	0,04
6	10000676	CALLE 67	CARRERA 123A	CARRERA 123B	EL GACO	74 - ENGATIVA	113,61	0,04
7	10000725	CALLE 67	CARRERA 123	CARRERA 123A	EL GACO	74 - ENGATIVA	112,13	0,04
8	10000792	CALLE 67	CARRERA 122ABIS	CARRERA 123	EL GACO	74 - ENGATIVA	111,55	0,04
9	10001981	CALLE 63K	CARRERA 119A	CARRERA 119B	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	143	0,05
10	10002047	CALLE 63K	CARRERA 119	CARRERA 119A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	131,21	0,04
11	10002068	CARRERA 120B	CALLE 63B	CALLE 63C	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	237,52	0,08
12	10002252	CALLE 63K	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	290,22	0,10
13	10002294	CARRERA 119	CALLE 63G	CALLE 63H	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	146,8	0,05
14	10002344	CALLE 63K	CARRERA 117A	CARRERA 118A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	154,49	0,05
15	10002403	CALLE 63D	CARRERA 119	CARRERA 119A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	100,1	0,03
16	10002432	CALLE 63K	CARRERA 117	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	157,05	0,05
17	10002476	CALLE 63G	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	228,8	0,08
18	10002480	CARRERA 119A	CALLE 63B	CALLE 63D	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	411,78	0,14
19	10002547	CALLE 63F	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	314,6	0,10
20	10002591	CALLE 64A	TRANSVERSAL 113	CARRERA 116C	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	413,68	0,14
21	10002609	CALLE 63D	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	235,3	0,08
22	10002679	CALLE 63D	CARRERA 118A	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	91,53	0,03
23	10002751	CALLE 63D	CARRERA 117	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	87,02	0,03
24	10002764	CALLE 63F	CARRERA 115	CARRERA 117	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	184,64	0,06
25	10002858	CALLE 63F	CARRERA 114	CARRERA 115	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	145,86	0,05
26	10002938	CALLE 63F	CARRERA 114	CARRERA 113F	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	161,35	0,05
27	10003009	CALLE 63F	CARRERA 113D	CARRERA 113F	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	175,61	0,06
28	10003094	CALLE 63F	CARRERA 113C	CARRERA 113D	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	183,46	0,06
29	10003258	CALLE 63F	CARRERA 113B	CARRERA 113C	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	406,51	0,14
30	10010476	CARRERA 120BIS	CALLE 64B	S.E	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	37,77	0,01
31	10010477	CARRERA 120BIS	CALLE 64B	CALLE 64C	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	62,22	0,02
32	10001359	CL 76	KR 110CBIS	KR 111	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	147,58	0,05
33	10001437	CL 76	KR 110C	KR 110CBIS	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	144,91	0,05
34	10001502	CL 76	KR 110B	KR 110C	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	132,22	0,04
35	10001639	CL 76	KR 110	KR 110B	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	204,68	0,07
36	10001843	CARRERA 109	CALLE 75F	CALLE 76	GARCES NAVAS	73 - GARCES NAVAS	165,44	0,06
37	10002222	CALLE 73	CARRERA 109A	CARRERA 110	VILLA AMALIA	73 - GARCES NAVAS	219,89	0,07
38	10002483	CALLE 73	CARRERA 108	CARRERA 108A	VILLA AMALIA	73 - GARCES NAVAS	225,31	0,08
39	10003636	CALLE 70C	CARRERA 110	CARRERA 110A	BOLIVIA	73 - GARCES NAVAS	277,27	0,09
40	10004479	CARRERA 99	CALLE 73	CALLE 74A	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	552,04	0,18
41	10004687	CARRERA 100	AVENIDA CALLE 72	CALLE 73	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	749,45	0,25
42	10005043	CARRERA 99C	DIAGONAL 72	AVENIDA CALLE 72	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	868,08	0,29

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

Las actividades de Topografía al 8 de febrero de 2023 se resumen en el siguiente cuadro:

Contrato de consultoría 402-2022: "ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL LOCAL Y SU ESPACIO PUBLICO ASOCIADO ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA"

Avance actividades topografia al 8 de febrero de 2023

N°	CIV	GPS	POLIGONAL		AJUSTE		AJUSTE NIVELACION		INSPECCION POZOS		LEVANTAMIENTO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	10002480	X	X			X		X	X		X	
2	10002609	X	X			X		X	X		X	
3	10002432	X	X			X		X	X		X	
4	10002344	X	X			X		X	X		X	
5	10002252	X	X			X		X	X		X	
6	10002764	X	X			X		X	X		X	
7	10002858	X	X			X		X	X		X	
8	10002938	X	X			X		X	X		X	
9	10003009	X	X			X		X	X		X	
10	10003094	X	X			X		X	X		X	
11	10003258	X	X			X		X	X		X	
12	10010477	X	X			X		X	X			X
13	10002591	X	X			X		X	X			X

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. El consultor envió los informes generados por los equipos de topografia.
2. El consultor envió para revisión la metodología de Tránsito.
3. El consultor envió para revisión el Plan de Exploración Geotécnica
4. El consultor inició la poligonal y el levantamiento del CIV 10002679, 10002591 y 10010477
5. El consultor realizó la inspección de pozos en los CIVs 10002547
6. El Consultor inició el levantamiento topográfico del CIV 10002609
7. La Interventoría envió para revisión el informe mensual N°1.
8. La Interventoría asistió al comité semanal N°6
9. Mediante oficio 03-23-GDING-PROY187 la Interventoría solicitó a la Consultoría los parafiscales del personal que labora para el contrato 402 de 2022.
10. A través del oficio 04-23-GDING-PROY187, la Interventoría solicitó a la Consultoría la relación del personal que labora para el contrato 402 de 2022
11. Con el oficio 05-23-GDING-PROY187 la Interventoría emitió el concepto para la definición del lineamiento para la exploración geotécnica dentro del contrato 402 de 2022.
12. Mediante el oficio 07-23-GDING-PROY187 se envió la Declaratoria de Posible incumplimiento al contrato 402 de 2022, por parte del Consultor.
13. A través del oficio 08-23-GDING-PROY187 la Interventoría envió al Consultor una versión de cuadro de seguimiento, para poder realizar el control de avance del contrato 402 de 2022.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. El Consultor continuará con el levantamiento topográfico de CIVs
2. El Consultor continuará con la identificación de pozos.

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe el Consultor en compañía de la Interventoría finalizó las visitas a los 112 CIVs iniciales y continuó la localización de pozos e inició el levantamiento topográfico de los segmentos viales que se va a diseñar.

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Levantamiento CIV 10002591



Levantamiento CIV 10010476



Levantamiento CIV 10010477



Levantamiento CIV 10010477



Materialización de GPS-005



Levantamiento CIV 10002591

Coordinador de Interventoría EFRAIN ARAUJO
