ANEXO INFORME MENSUAL No. 1 DEL CONTRATISTA DE OBRA

INFORME DETALLADO No. 01

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META."

CONTRATO DE OBRA 1179 DE 2022



INTERVENTOR

EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1188 DE 2022

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

INFORME MENSUAL No. 01

PERIODO DE 25 DE ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 24/02/2023

CONTRATO DE OBRA Nº 1179 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META

ELABORO	REVISO
HERNAN ANACONA ROA.	
Residente de Obra	Director de Obra
HERNAN ANACONA ROA	**LUIS CRUZ ROMERO**

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 5
3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO 6
3.1 GENERALIDADES 6
3.2 ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME. 7
3.2.1 ACTA DE SUSPENSION: 7
3.2.2 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION 7
3.2.3 ACTA DE REINICIO 7
3.2.4 ACTA DE PRORROGA Y ADICIÓN 7
4. ESTADO FINANCIERO Y AVANCE FISICO 7
4.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 7
4.1.1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO 11
4.2 AVANCE FISICO 12
4.2.1 GRAFICA DE AVANCE FISCO VS AVANCE PROGRAMADO 16
6. COMPONENTE LOGISTICO 19
6.1 PERSONAL 19
6.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS 20
7. PRESUPUESTO 21
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS 25
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 25
10. SEGURIDAD SOCIAL 38
11. CONCLUSION 38
12. ANEXOS 39

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

1. INTRODUCCIÓN

Para la **Corporación para el desarrollo sostenible del area de manejo especial la macarena (Cormacarena)**,es importante determinar proyectos que se encaminen en fomentar el saneamiento básico; por lo tanto en sus metas determinó el **Contrato de obra 1179 de 2022** cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META"** consiste en la construcción de 627.24 Metros en tubería de 30" PVC y la construcción de 17 pozos de inspección desde el pozo 1 hasta el pozo 8 A necesarios para evacuar las aguas residuales y los escurrimientos superficiales producidos por las lluvias, a través de la cual se disponen adecuadamente las excreciones o aguas negras, reduce la probabilidad de contagio de enfermedades, preserva la salud de la familia, pues elimina las infecciones causadas por las aguas residuales de las cunetas que contaminan las calles.


Es la segunda fase del interceptor de alcantarillado sanitario, desde la intercepción del vertimiento que existía del barrio el porvenir con la fase del interceptor hasta el punto de vertimiento existente del casco urbano del municipio, con el fin de trasladar el punto de vertimiento al punto donde se ubicara la planta de tratamiento de aguas residuales y de esta forma dejar un único punto de vertimiento sobre caño arenas blancas.

En el presente informe tiene como característica principal realizar una descripción detallada sobre los avances del proyecto tanto físicos como financieros durante el periodo comprendido entre el 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Cubarral en el Barrio Porvenir, situado en el departamento del meta, Se encuentra a 60 km de la capital del departamento el meta, Villavicencio

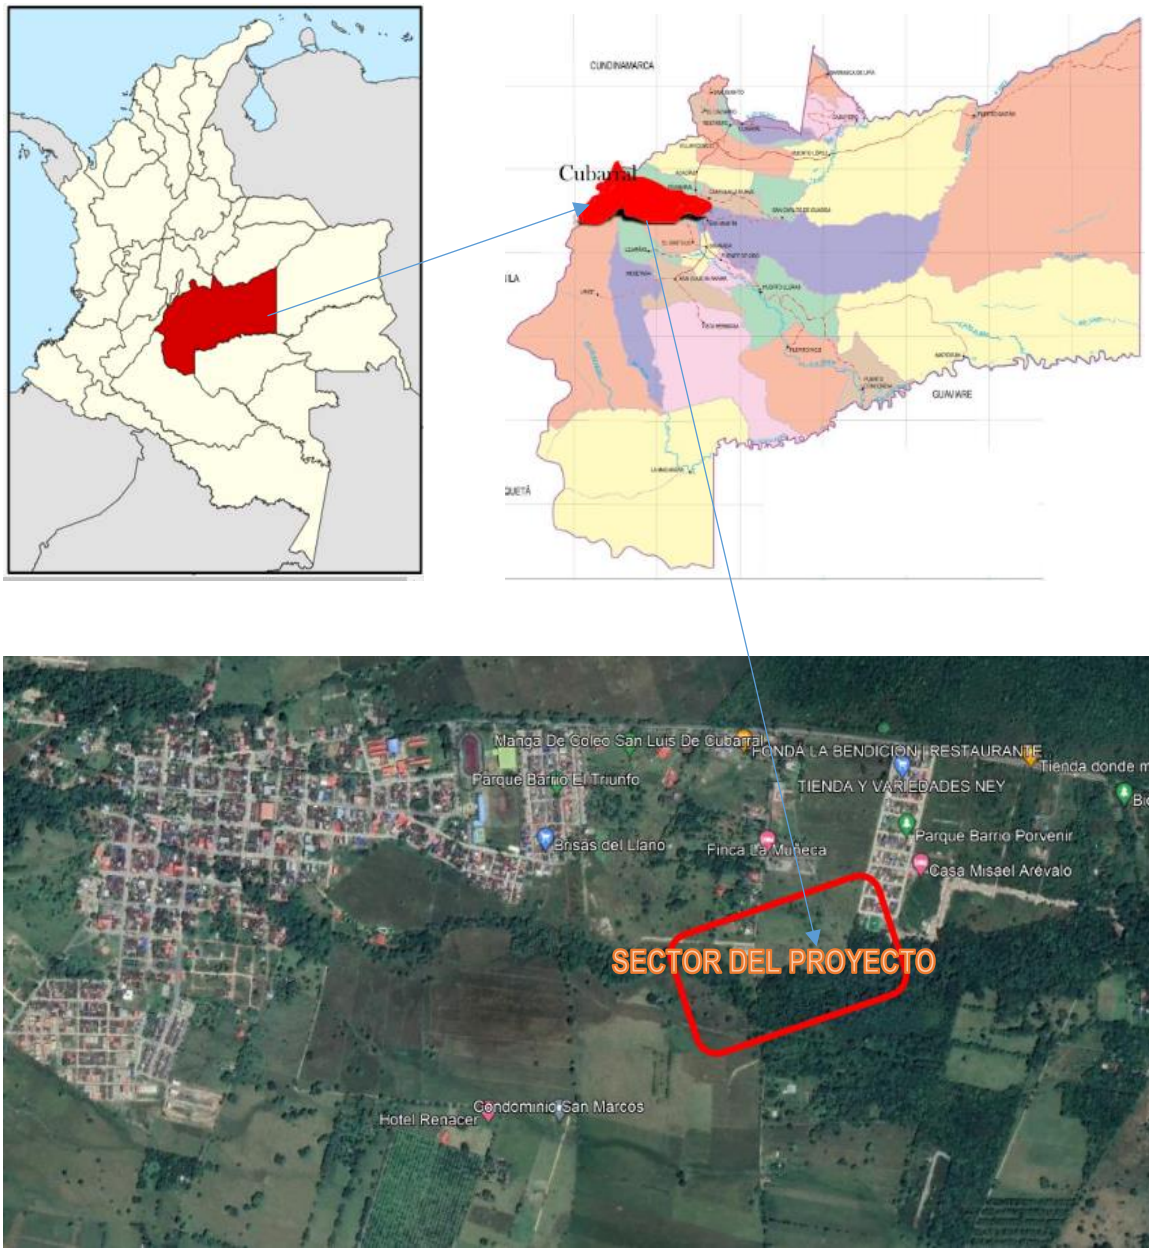

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

3. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

3.1 GENERALIDADES

Se presenta a continuación el INFORME MENSUAL DETALLADO DE OBRA No. 01 del desarrollo de la obra del Contrato No. 1179-2022, **"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META**", con el **CONSORCIO CUBARRAL FASE II."** correspondiente al período comprendido entre el 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023.

CONTRATO No.	1179 DE 2022
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"
CONTRATISTA	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2; R/L Ing. Christian Segura
LOCALIZACIÓN	CUBARRAL-META
VALOR	$ 4.091.799.463,00
PLAZO	8 (OCHO) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	25 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	24 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA SUSPENSION No 1	N/A
FECHA ACTA DE REINICIO No 1	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	N/A
%EJECUCION FISICA A LA FECHA	0,20%

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

3.2 ACTAS SUSCRITAS DURANTE EL PERIODO DEL INFORME.

3.2.1 ACTA DE SUSPENSION:

En este periodo no se realizó suspensión en el proyecto.

3.2.2 ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION

En este periodo no se realizó ampliación de la suspensión en el proyecto.

3.2.3 ACTA DE REINICIO

En este periodo no se realizó reinicio en el proyecto.

3.2.4 ACTA DE PRORROGA Y ADICIÓN

En este periodo no se realizó prorroga y adición en el proyecto.

4. ESTADO FINANCIERO Y AVANCE FISICO.

4.1 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	
CONTRATO No. :	1179 DEL 2022
OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META"
VALOR CONTRATO:	$ 4.091.799.463,00
ANTICIPO	20%
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
NIT:	901.629.216-3
INTERVENTOR	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
PLAZO CONTRATO:	8 MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 818.359.892,60

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

PRESUPUESTO OFICIAL	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PAGO ANTICIPO			
	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**TOTAL PAGO ANTICIPO**
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**				
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	5.976,00	$ 3.748.386				$ 0,00
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	364.034,00	$ 68.074.358				$ 0,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	2.732,60	4.167,00	$ 11.386.744				$ 0,00
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	2.602,81	27.409,00	$ 71.340.419				$ 0,00
		SUBTOTAL			**$ 154.549.908**	$ 0,00 -			$ 0,00
	2 EXCAVACIONES								
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	9.202,44	42.053,00	$ 386.990.209				$ 0,00
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	1.754,15	48.553,00	$ 85.169.245				$ 0,00
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	268,58	70.222,00	$ 18.860.225				$ 0,00
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	4.097,03	80.622,00	$ 330.310.753	$ 40.917.995,00			$ 40.917.995,00
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	292,90	87.908,00	$ 25.748.253				$ 0,00
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	15.322,20	34.962,00	$ 535.694.756	$ 26.374.000,00			$ 26.374.000,00
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	19034162,00	$ 76.136.648				$ 0,00
		SUBTOTAL			**$ 1.458.910.089**	**$ 67.291.995,00**			**$ 67.291.995,00**
	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA								
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	627,24	1.429.312,00	$ 896.521.659	$ 315.000.000,00			$ 315.000.000,00
		SUBTOTAL			**$ 896.521.659**	**$ 315.000.000,00**			**$ 315.000.000,00**

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PAGO ANTICIPO			
	4 RELLENOS								
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	1.612,44	145.519,00	$ 234.640.656	$ 88.660.000,00			$ 88.660.000,00
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	12.633,79	74.850,00	$ 945.639.182	$ 347.407.897,60			$ 347.407.897,60
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	134.035,00	$ 73.687.082				$ 0,00
		SUBTOTAL			**$ 1.253.966.919**	**$ 436.067.897,60**			**$ 436.067.897,60**
	5 POZOS DE INSPECCION								
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	17,00	2.964.847,00	$ 50.402.399				$ 0,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	1.482.656,00	$ 115.454.423				$ 0,00
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	17,00	1.487.065,00	$ 25.280.105				$ 0,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	529.206,00	$ 8.996.502				$ 0,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	4.168.668,00	$ 4.293.728				$ 0,00
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	229.642,00	$ 236.531				$ 0,00
		SUBTOTAL			**$ 204.663.688**				-
	6 PASO SUBFLUVIAL								
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	1.336.498,68	$ 31.928.953				$ 0,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	PAGO ANTICIPO			
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1.231,49	13.747,00	$ 16.929.293				$ 0,00
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	1.864.104,00	$ 55.923.120				$ 0,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	62,00	296.868,27	$ 18.405.833				$ 0,00
		SUBTOTAL			**$ 123.187.199**				-
									-
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 4.091.799.463**	**$ 818.359.892,60**			**$ 818.359.892,60**
	VALOR TOTAL				**$ 4.091.799.463**	**$ 818.359.892,60**			

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

4.1.1 PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo a lo indicado en la CLAUSULA SEXTA VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato 1179 de 2022 la entidad entregará al contratista a título de anticipo un valor equivalente al (20%) del valor básico del contrato, en este proyecto el valor del anticipo es de OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 818.359.892,60) M/CTE. a la fecha se encuentra en proceso la solicitud y desembolso del anticipo.

NOTA: (VER ANEXO 9. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

VALOR PROYECTO INICIAL	$ 4.091.799.463,00

ACTA	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS	
				$	%
ANTICIPO	$ 818.359.892,60		$ 818.359.892,60	N/A	N/A

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

4.2 AVANCE FISICO

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01		OBRA POR EJECUTAR	
N.º	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1,1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	$ 5.976,00	$ 3.748.386	94,086	$ 562.258,00	627,24	$ 3.748.386	0,00	$ 0,00
1,2	Control de ríos mediante conformación mecánica de Jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	$ 364.034,00	$ 68.074.358	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	187,00	$ 68.074.358,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	2.732,60	$ 4.167,00	$ 11.386.744	0,00	$ 0,00	1088,61	$ 4.536.238	1643,99	$ 6.850.506,00
1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	M2	2.602,81	$ 27.409,00	$ 71.340.419	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2602,81	$ 71.340.419,00
				SUBTOTAL	**$ 154.549.907**		**$ 562.258**		**$ 8.284.624**		**$146.265.283,000**
2	**EXCAVACIONES**										
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	9.202,44	$ 42.053,00	$ 386.990.209	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9202,44	$ 386.990.209,00
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	1.754,15	$ 48.553,00	$ 85.169.245	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1754,15	$ 85.169.245,00
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	268,58	$ 70.222,00	$ 18.860.225	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,58	$ 18.860.225,00
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	4.097,03	$ 80.622,00	$ 330.310.753	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4097,03	$ 330.310.753,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01		OBRA POR EJECUTAR	
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	292,90	$ 87.908,00	$ 25.748.253	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	292,90	$ 25.748.253,00
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	15.322,20	$ 34.962,00	$ 535.694.756	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15322,20	$ 535.694.756,00
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	$ 19.034.162,00	$ 76.136.648	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	4,00	$ 76.136.648,00
				SUBTOTAL	**$ 1.458.910.089**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.458.910.089,000**
3	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA**										
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	627,24	$ 1.429.312,00	$ 896.521.659	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	627,24	$ 896.521.659,00
				SUBTOTAL	**$ 896.521.659**		**$0,00**		**$ 0,00**		**$ 896.521.659,000**
4	**RELLENOS**										
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	1.612,44	$ 145.519,00	$ 234.640.656	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1612,44	$ 234.640.656,00
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	12.633,79	$ 74.850,00	$ 945.639.182	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12633,79	$ 945.639.182,00
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	$ 134.035,00	$ 73.687.082	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	549,76	$ 73.687.082,00
				SUBTOTAL	**$ 1.253.966.920**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 1.253.966.920**
5	**POZOS DE INSPECCION**										
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz.	UN	17,00	$ 2.964.847,00	$ 50.402.399	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 50.402.399,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01		OBRA POR EJECUTAR	
	elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)										
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	$ 1.482.656,00	$ 115.454.423	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	77,87	$ 115.454.423,00
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	17,00	$ 1.487.065,00	$ 25.280.105	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 25.280.105,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	$ 529.206,00	$ 8.996.502	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	17,00	$ 8.996.502,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	$ 4.168.668,00	$ 4.293.728	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,03	$ 4.293.728,00
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	$ 229.642,00	$ 236.531	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,03	$ 236.531,00
				SUBTOTAL	**$ 204.663.688**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 204.663.688**
6	**PASO SUBFLUVIAL**										
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	$ 1.336.498,68	$ 31.928.953	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	23,89	$31.928.953,00
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1.231,49	$ 13.747,00	$ 16.929.293	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	1231,49	$16.929.293,00
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	$1.864.104,00	$ 55.923.120	0,00	$ 0,00	0,00	$0,00	30,00	$55.923.120,00


Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01		OBRA POR EJECUTAR	
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	62,00	$ 296.868,27	$ 18.405.833	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	62,00	$ 18.405.833,00
				SUBTOTAL	**$ 123.187.199**		**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 123.187.199**
				AJUSTE AL PESO	**$ 1,00**		**$ 1,00**		**$ 1,00**		**$ 1,00**
SUBTOTAL OBRAS					**$ 4.091.799.463,00**		**$ 562.259,00**		**$ 8.284.625,00**		**$4.083.514.839,00**
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 4.091.799.463,00**						
	VALOR TOTAL				**$ 4.091.799.463,00**		**$ 562.259,00**		**$ 8.284.625,00**		**$4.083.514.839,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**	**PORCENTAJE TOTAL DE OBRA PROGRAMADA - AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**PORCENTAJE TOTAL DE OBRA EJECUTADA - AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**VALOR AVANCE DE OBRA PROGRAMADO MES N° 1**	**$ 562.259,00**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	16%	0,01%	0,20%	**% EJECUTADO PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**0,20%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	10%				
	UTILIDAD	**U=**	5%			**VALOR PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**$8.284.625,00**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	31%				

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

4.2.1 GRAFICA DE AVANCE FISICO VS AVANCE PROGRAMADO

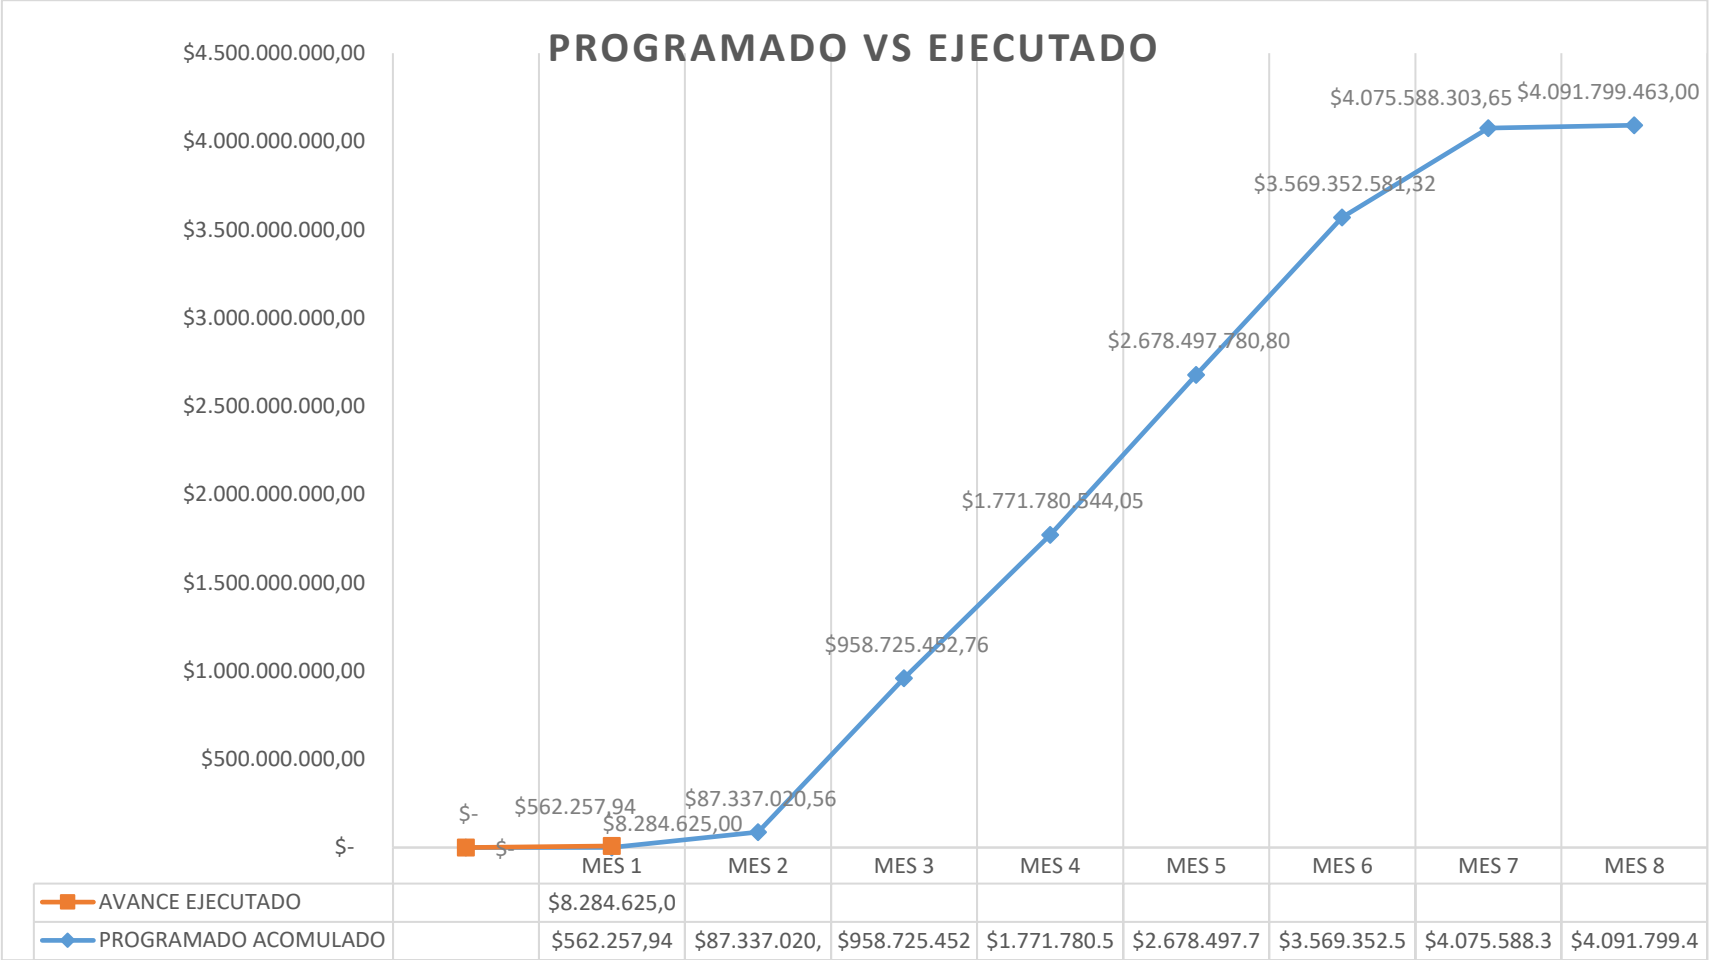

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

MES	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
1	0,01%	$ 562.259,00	0,01%	$ 562.259,00	0,20%	$8.284.625,00	0,20%	$8.284.625,00

NOTA: (VER ANEXO 10. ACTA DE AVANCE DEL CONTRATO)

5. GARANTIAS DEL CONTRATO

POLIZAS SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**30-44-101050856**
ANEXO N°	**0**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	27/12/2022	27/12/2023	409.179.946,30	SI
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	27/12/2022	27/12/2023	818.359.892,60	SI
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/12/2022	27/08/2026	818.359.892,60	SI
Estabilidad y calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS		1.227.539.838,90	SI

NOTA: (VER ANEXO 6. POLIZAS)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**30-40-101018270**
ANEXO N°	**0**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Predios Labores y operaciones	27/12/2022	27/08/2023	400.000.000,00	SI
Daño emergente y lucro cesante	27/12/2022	27/08/2023	120.000.000,00	SI

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Perjuicios extrapatrimoniales	27/12/2022	27/08/2023	120.000.000,00	SI
Contratistas y subcontratistas	27/12/2022	27/08/2023	120.000.000,00	SI
Responsabilidad civil patronal	27/12/2022	27/08/2023	120.000.000,00	SI
Vehículos propios y no propios	27/12/2022	27/08/2023	120.000.000,00	SI

NOTA: (VER ANEXO 6. POLIZAS)

POLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	**30-44-101050856**
ANEXO N°	**2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Cumplimiento del Contrato	25/01/2023	25/01/2024	409.179.946,30	SI
Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	25/01/2023	25/01/2024	818.359.892,60	SI
Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	25/01/2023	25/09/2026	818.359.892,60	SI
Estabilidad y calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DIAS		1.227.539.838,90	SI

NOTA: (VER ANEXO 6. POLIZAS)

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°	**30-40-101018270**
ANEXO N°	**2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Predio Labores y operaciones	25/01/2023	25/09/2023	400.000.000,00	SI

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	VIGENTE
	DESDE	HASTA		
Daño emergente y lucro cesante	25/01/2023	25/09/2023	120.000.000,00	SI
Perjuicios extrapatrimoniales	25/01/2023	25/09/2023	120.000.000,00	SI
Contratistas y subcontratistas	25/01/2023	25/09/2023	120.000.000,00	SI
Responsabilidad civil patronal	25/01/2023	25/09/2023	120.000.000,00	SI
Vehículos propios y no propios	25/01/2023	25/09/2023	120.000.000,00	SI

NOTA: (VER ANEXO 6. POLIZAS)

6. COMPONENTE LOGISTICO

6.1 PERSONAL

CARGO	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	AFP	EPS	ARL
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CRUZ ROMERO	30083437	185.600	145.000	16.200
			COLPESIONES	SANITAS	SURA
RESIDENTE DE OBRA	HILBER HERNAN ANACONA	86059532	253.900	63.500	110.500
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
INSPECTOR DE OBRA	ERIKA TRIANA BOBADILLA	1121883802	128.000	32.000	55.700
			PORVENIR	SANITAS	SURA
PROFESIONAL SST	CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ	1121900390	106.700	26.700	46.500
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
PROFESIONAL AMBIENTAL	YHOJANN ARDILA ESCOBAR	86056774	185.600	145.000	16.200
			PROTECCION	CAJA COOPI	SEGURO BOLIVAR

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CARGO	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	AFP	EPS	ARL
INGENIERO ADMINISTRATIVO	CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO	1121926457	148.500	37.200	37.200
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
CADENERO PRIMERO	RUPERTO VARGAS HERRERA	3140510	N/A	N/A	N/A
			PROTECCION	SALUDTOTAL	SURA
OFICIAL DE OBRA	ALEX GUALTEROS	86011617	N/A	N/A	N/A
			PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA
OFICIAL DE OBRA	JORGE MAURICIO MORENO	74281436	N/A	N/A	N/A
			PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA

Nota: La Ingeniera **Useche Wanda** identificada con el **CC 1121943244** reviso y verifico la documentación entregada del área de SST, fue reemplazada por el Ingeniero SST Cristyan Hernández, cabe resaltar que las ultimas 3 personas en el listado del personal anteriormente mencionado, ingresaron en el periodo de 04 de febrero de 2023 al 24 de febrero de 2023, por tanto, no tiene a la fecha el pago de seguridad social y se debe realizar al mes vencido. (En el siguiente informe se anexará)

6.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS

Equipo que se utilizara para la construcción de los alcantarillados pluvial y sanitario, para el contrato de obra No 1179-2022:

- Una (1) Retro excavadora de oruga
- Dos (02) Volquetas mínimo de 5m3
- Equipo topográfico
- Herramienta menor
- Una (1) Mezclador

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

7. PRESUPUESTO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	$ 5.976,00	$ 3.748.386,00
1,2	Control de ríos mediante conformación mecánica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	$ 364.034,00	$ 68.074.358,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	2.732,60	$ 4.167,00	$ 11.386.744,00
1,4	Descapote mecánico (incluye retiro d=5km)	M2	2.602,81	$ 27.409,00	$ 71.340.419,00
					$ 154.549.907,00
2.EXCAVACIONES					
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	9.202,44	$ 42.053,00	$ 386.990.209,00
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	1.754,15	$ 48.553,00	$ 85.169.245,00
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	268,58	$ 70.222,00	$ 18.860.225,00
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	4.097,03	$ 80.622,00	$ 330.310.753,00
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	292,90	$ 87.908,00	$ 25.748.253,00
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	15.322,20	$ 34.962,00	$ 535.694.756,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	$ 19.034.162,00	$ 76.136.648,00
					$ 1.458.910.089,00
3. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA					
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	627,24	$ 1.429.312,00	$ 896.521.659,00
					$ 896.521.659,00
4.RELLENOS					
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	1.612,44	$ 145.519,00	$ 234.640.656,00
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	12.633,79	$ 74.850,00	$ 945.639.182,00
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	$ 134.035,00	$ 73.687.082,00
					$ 1.253.966.920,00
5.POZOS DE INSPECCION					
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	17,00	$ 2.964.847,00	$ 50.402.399,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	$ 1.482.656,00	$ 115.454.423,00
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	17,00	$ 1.487.065,00	$ 25.280.105,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	$ 529.206,00	$ 8.996.502,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	$ 4.168.668,00	$ 4.293.728,00
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	$ 229.642,00	$ 236.531,00
					$ 204.663.688,00
6.PASO SUBFLUVIAL					
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	$ 1.336.498,68	$ 31.928.953,00
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1.231,49	$ 13.747,00	$ 16.929.293,00

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	$ 1.864.104,00	$ 55.923.120,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	62,00	$ 296.868,27	$ 18.405.833,00
					$ 123.187.199,00

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$4.091.799.463,00**
VALOR TOTAL	**$4.091.799.463,00**

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	**A=**	16%
IMPREVISTO	**I=**	10%
UTILIDAD	**U=**	5%
TOTAL A.I. U	**A.I.U.=**	31%

VALOR PROYECTO	$ 4.091.799.463,00
VALOR EJECUTADO	$ 8.284.625,00
AVANCE DE OBRA	0,20%
RETRASO	0.00%

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades administrativas y ejecución de obra realizadas en el periodo de 25 de enero de 2023 al 24 de febrero del 2023 fueron las siguientes:

✓ LOCALIZACION Y REPLANTEO

Se realizaron las actividades de localización y replanteo para la red de alcantarillado sanitario en el barrio Porvenir Ubicando el eje de los pozos, las cotas, pendientes, y la longitud de la tubería.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
1.1	Localización y replanteo para redes de alcantarillado.	M	627,24	627,24

✓ DESMONTE Y LIMPIEZA DE RASTROJO

Se realizaron las actividades de desmonte y limpieza de rastrojo en los tramos de la instalación de la tubería 30” PVC para eliminar la vegetación existente en el barrio mencionado anteriormente con el fin de dejar la superficie apta para la ejecución de las actividades que se desarrollaran posteriormente.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT CONTRACTUAL	CANT EJECUTADA
1.3	Desmonte y limpieza de rastrojo.	M2	2.732,60	1088.61

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en documento adicional aplicable al Proceso de Contratación, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del Contrato.

- Hasta la fecha se están recopilando las hojas de vida para contratar mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%),

2. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra,

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de los sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberán mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en esta numeral so pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante el Interventor dentro de los [2 de días] días hábiles siguientes contados a partir de [acta de inicio].

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- Hasta la fecha se están adjuntando las hojas de vida para contratar población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera, en un porcentaje no inferior al cinco por ciento (05%),

Opción 1:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
    - Se ha cumplido con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
    - Se ha cumplido con las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
    - Se ha cumplido con garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
    - No se ha tenido alguna reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
    - Se solicitó la colaboración a la alcaldía y secretaria de planeación la colaboración para tala de 6 (seis) arboles.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
    - Se ha cumplido con el factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
    - Se continúa adjuntando hojas de vida para dar empleo local.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
    - Se Implementa las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
    - Se ha dado cumplimiento a la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
    - No se ha realizado ninguna modificación; cuando se presente se informará a la entidad.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
    - Se solicitó la colaboración a la alcaldía y secretaria de planeación la colaboración para tala de 6 (seis) arboles.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
    - Por parte del contratista de obra se ha realizado todo lo solicitado en este numeral.
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

- Cuando se presente la necesidad se informará a las personas idóneas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
    - Hasta la fecha se ha cumplido con las obligaciones mencionadas en este numeral.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
    - Cuando se presente la necesidad se informará a la entidad.
16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [diez (10) días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato.
    - El contratista de obra presentó el plan de calidad y fue aprobado el día 30 de enero de 2023.
17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la entidad.
    - Una vez firmado el contrato de obra 1179 de 2022 se solicita a la entidad contratante y a la interventoría los diseños iniciales del proyecto donde se evidencia que falta documentación e información del paso subfluvial a lo cual el contratista hace el debido procedimiento de informarle a la entidad e interventoría mediante oficio CE-001-1179-2023 con radicado 970 de 13 de enero de 2023 en cormacarena y con recibido el día 14 de enero de 2023 de la representante legal de interventoría Lina salgado
18. El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- El contratista de obra hasta la fecha tiene Dos (2) bienes, EL (1) primero de ellos es el acopiado de la arena de rio para cama base para la tubería de 30" PVC para el alcantarillado sanitario, esta arena es proveniente de la región, y el (2) segundo bien es el acero que se está utilizando para las tapas de los pozos de inspección.

19. Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.
    - El contratista de obra ha informado al interventor de los Dos (2) bienes que se han suministrado en obra para le ejecución de las actividades.
20. Incorporar como mínimo el cuarenta (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
    - Hasta la fecha se están adjuntando las hojas de vida para incorpar el cuarenta (40%) del personal expuesto en este párrafo.
21. Incorporar como mínimo el noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.
    - Hasta la fecha se están adjuntando las hojas de vida para incorporar el noventa por ciento (90%) del personal expuesto en este párrafo.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

1. Cumplir con todas las especificaciones técnicas para el buen desarrollo del proyecto aportadas en este estudio previo, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo al cronograma de ejecución establecido.
    - Las actividades ejecutadas hasta la fecha se han realizado de acuerdo a las especificaciones, estudio previo, plazos y cronograma de ejecución.
2. Mantener los precios unitarios y totales de la propuesta fijos durante la ejecución y liquidación del contrato.
    - Se ha mantenido los precios de la propuesta para la ejecución del proyecto.
3. El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de la obra objeto del contrato, en término de quince (15) días calendario.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- La entidad Cormacarena ha entregado los diseños para la construcción de alcantarillado sanitario y el diseño del paso subfluvial se encuentra en proceso de aprobación.

4. Al momento de la consecución de la mano de obra no calificada, se dará prioridad a personas del área de jurisdicción del proyecto.

- Hasta la fecha se están adjuntando las hojas de vida para incorporar mano de obra no calificada del área de jurisdicción del proyecto.

5. Vincular el personal, en forma previa a la iniciación de labores, al sistema integral de seguridad social en salud, y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo, al igual que los parafiscales.

- Se ha vinculado todo el personal a parafiscales y los pagos oportunos de aportes.

6. Remitir a Cormacarena la totalidad de la documentación técnica y financiera suscrita para el desarrollo y ejecución de la obra en informes mensuales.

- Hasta el día de hoy 24 de febrero de 2023 se va radicar el primer informe mensual que comprende el periodo desde el 25 de enero de 2023 hasta la fecha.

7. Presentar dentro de la oportunidad requerida toda la información solicitada por Cormacarena.

- Se ha presentado la información solicitada por la entidad.

8. Ejecutar los recursos girados por la Corporación en cumplimiento el objeto contractual; y adelantar las actividades que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto, alcances y obligaciones del contrato, en un todo de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia.

- El proyecto está avanzando para dar cumplimiento a todas las obligaciones del contrato.

9. Velar por el buen manejo de los recursos, la correcta y pronta ejecución de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances y responsabilidades del contrato.

- Se ha velado por dar cumplimiento a esta obligación.

10. Cumplir con todas las especificaciones técnicas para el buen desarrollo del proyecto aportadas en el pliego de condiciones.

- Se ha cumplido con las especificaciones técnicas para cada una de las actividades ejecutadas.

11. Crear condiciones necesarias para garantizar la máxima operatividad de la obra.

- Se ha creado las condiciones para garantizar la máxima operatividad de la obra.

12. Presentar un informe final para proceder al recibo final de la obra ejecutada.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- Se presentará un informe final el último mes de ejecución del proyecto.

13. Realizar mensualmente (como mínimo) comités de obra con la interventoría y la supervisión delegada por CORMACARENA, en el cual participe obligatoriamente el residente de obra, para revisar los avances, analizar las situaciones presentadas, verificar y ajustar el cronograma de actividades, entre otro.

- Se han realizado comités de obra por parte de contratista de interventoría junto al contratista de obra.

14. Presentar a la interventoría al momento de la elaboración del acta de inicio, plan Operativo que contenga el cronograma de obra y cronograma de actividades y la relación del presupuesto.

- Se presentó a la interventoría al momento de la elaboración del acta de inicio, plan Operativo que contenía el cronograma de obra y cronograma de actividades y la relación del presupuesto.

15. Presentar informes técnicos y financieros a la interventoría con una periodicidad mensual, los cuales deberán ser presentados dentro de los 5 días hábiles después de cumplido el mes (según fecha de suscripción acta de inicio), de acuerdo con el Plan Operativo. Se deberá reportar avance físico e inversión financiera.

- Hasta el día de hoy 24 de febrero de 2023 se va radicar el primer informe mensual que comprende el periodo desde el 25 de enero de 2023 hasta la fecha.

16. Deberá socializar el proyecto con la Administración Municipal y comunidad antes del inicio de obra y deberá presentar como producto un acta de socialización; por parte del contratista de obra junto al contratista de interventoría y la Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena.

- Se realizó la socialización el día 15 de febrero de 2023, en la cual se dio a conocer claramente el alcance del proyecto y se despejaron dudas a la comunidad.

17. Ejecutar todas las obligaciones derivadas del contrato dentro de los plazos establecidos.

- Se ha cumplido con las obligaciones necesarias hasta la fecha.

18. El contratista debe dar estricto y oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Parágrafo 2 de la Ley 828 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social (salud, pensión y

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ARL) y aportes parafiscales, según el caso. Igualmente se obliga a constituir póliza que ampare el cumplimiento del contrato, el pago de multas, indemnizaciones y demás sanciones, la calidad de los servicios prestados, pago de salarios, prestaciones, sueldos e indemnizaciones.

- Se ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones necesarias mencionadas en este ítem.

19. Liquidar el contrato dentro de los plazos establecidos.

- Aun no se ha liquidado el contrato ya que no se ha terminado la ejecución de las actividades del proyecto.

20. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al ambiente, seguridad industrial e higiene.

- Se ha cumplido con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al ambiente, seguridad industrial e higiene que ha requerido la obra durante la ejecución.

21. Diseñar y aplicar planes de acción inmediata que adopten medidas correctivas y den solución a las observaciones de los grupos de auditores visibles, contenidas en las actas de compromisos que resultan de los foros.

- No se ha implementado, cuando se genere la necesidad se implementará.

22. Como parte integrante de las especificaciones de la obra se incluyen las de manejo ambiental, en consecuencia, el contratista deberá elaborar un acta y registro fotográfico antes, durante y después de terminar la obra, donde se establecerá el estado del entorno, el desarrollo de la obra y todo el proceso de la misma. Dicho registro servirá de base para comparar y evaluar el estado al final de los trabajos, el que deberá presentar condiciones ambientales adecuadas.

- En el informe ambiental que se presenta por parte del contratista de obra tendrá los registros fotográficos y todo lo demás relacionados en este ítem.

23. Cumplir con lo establecido en las Resoluciones No. 472 de 2017 y 1257 de 2021 expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, referente al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción y de demolición. Para ello deberá presentar a la interventoría, certificados que constaten el buen manejo y disposición de los materiales y escombros que resulten de las actividades de la obra.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- Los certificados de calidad de los materiales de obra se solicitaron a los proveedores y los allegaran en 15 días, por lo tanto, se adjuntaran en el próximo informe.

24. En caso de que los elementos de obra construidos y/o instalados, antes de la entrega final de la obra, así estén recibidos a satisfacción por el interventor, sufran daños por falta de protección, estos daños serán consultados y revisados con la persona encargada de ejercer la vigilancia y control y en caso de necesidad de reparaciones, reconstrucciones o cambios de los elementos, estos serán a cuenta del Contratista, sin costo alguno para el Contratante.

- Se tendrá encuentra en el momento que la obra recibida a satisfacción por parte de interventoría y sufran daños por falta de protección.

25. Cumplir por su cuenta y riesgo con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a la obra, ya sea de forma permanente o temporal.

- Si se ha cumplido con las normas de higiene y seguridad industrial de todo el personal de obra.

26. Instalar una valla informativa de la obra objeto en el sitio a intervenir, la dimensión es de 2x3=6 metros cuadrados (m^2) antes del inicio de la obra. El formato de la valla será entregado por CORMACARENA al momento de la suscripción del acta de inicio del contrato.

- La valla informativa se instaló conforme a las dimensiones y formato en la fecha establecida con toda la información requerida del proyecto.

27. Mantener al día una relación de los trabajadores de la obra, realizando el seguimiento y control de los pagos al Sistema de Seguridad Social y el uso de equipos de seguridad industrial. En los mismos términos, realizará el seguimiento y control de los subcontratos por actividades especializadas que deban suscribirse para el desarrollo de la obra, en caso de ser necesarios. En todo caso empleará el personal técnico capacitado e idóneo para la ejecución de la obra.

- El contratista de obra tiene una relación al día de los trabajadores con sus respectivos aportes y parafiscales y se realiza el seguimiento según lo menciona este ítem.

28. Informar por escrito, en el menor tiempo posible, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al interventor de la obra, recomendando las acciones que se deben tomar para solucionar el problema, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del contrato.

- Se informará al interventor de la situación cuando se necesite.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

29. Elaborar, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que la información financiera acumulada, las modificaciones a las cantidades de obra, el valor de la obra ejecutada y la información adicional estén correctas, para lo cual anexará un balance general de lo ejecutado hasta el momento.

- Hasta la fecha se ha realizado un acta de avance del mes 01 donde se refleja el avance ejecutado física y financieramente vs el programado.

30. Elaborar planes de contingencia para atender eventos o imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de la obra, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.

- Cuando sea necesario se realizará planes de contingencia.

31. Abrir un libro desde el día que se inicien las actividades de obra, en el cual quedarán consignadas todas las observaciones o sugerencias con registros de medidas, cantidades de obra ejecutadas, ensayos de laboratorio, control de calidad de materiales, accidentes laborales y en general, las indicaciones e instrucciones que el interventor de la obra considere necesarias para el normal funcionamiento de las operaciones. Todo aquel que escriba algo en el libro, deberá firmar y colocar la fecha tanto de la anotación como de lo ocurrido. El responsable de llevar al día esta bitácora será el residente de obra o en su defecto la persona que el contratista designe para tal fin, quien está en la obligación de presentarlo al interventor del contrato. Una vez terminada la obra éste se debe entregar a Cormacarena.

- EL libro de obra tuvo apertura el día 25 de enero de 2023 por parte del contratista de obra junto con el contratista de interventoría en el cual se describe cada día detalladamente las actividades realizadas, estado de tiempo, personal de obra, herramientas y equipos utilizados, se adjuntará a cada informe mensual la copia de la botadora del periodo correspondiente.

32. Informar oportunamente a la Corporación sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de obra y que afecte el normal desarrollo de ésta.

- Se Informará oportunamente a la Corporación sobre cualquier situación que pueda presentarse en la ejecución del contrato de obra y que afecte el normal desarrollo de ésta.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

33. Apoyar en la proyección de respuestas de las P.Q.R.S (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes) a las entidades involucradas y comunidad en general que se generen durante el desarrollo de la obra.

- Se apoyará en la proyección de respuestas de las P.Q.R.S (Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes) a las entidades involucradas y comunidad en general que se generen durante el desarrollo de la obra

34. En caso de requerir en desarrollo del contrato suspensión, adición y/ prórroga del mismo, el contratista deberá radicar la respectiva solicitud debidamente justificada a la entidad contratante, con diez (10) días de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para su estudio y considerar la aprobación.

- El contratista de obra en caso de requerir en desarrollo del contrato suspensión, adición y/ prórroga del mismo, radicará la respectiva solicitud debidamente justificada a la entidad contratante, con diez (10) días de anticipación a la fecha de terminación del contrato, para su estudio y considerar la aprobación.

35. El contratista deberá entregar el soporte del suministro a los trabajadores de obra de los elementos de protección personal y demás gestión relacionada con seguridad industrial y salud ocupacional.

- Por parte del contratista de obra se le entrego a los trabajadores de los elementos de protección personal y demás implementos necesarios para la ejecución de sus actividades, se anexará registro fotográfico y formatos en el informe SST.

36. El contratista deberá presentar los planos récord de construcción, informes de obra y los documentos que lo conforman, con la totalidad de las firmas, esto es: contratista, residente de obra e interventoría.

- Al finalizar la ejecución del contrato por parte del contratista de obra se presentará los planos récord de construcción, y cada mes se presentará informes de obra y los documentos que lo conforman, con la totalidad de las firmas.

37. Los planos entregados deben estar amarrados al sistema de coordenadas y cotas oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y certificados, cumpliendo con la Resolución 068 de 2005-MAGNA- SIRGAS, "por la cual se adopta como único datum oficial de Colombia, el Marco

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Geocéntrico Nacional de Referencia, MAGNA - SIRGAS y Resolución 471 de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial en Colombia".

- La entidad contratante Cormacarena realizó un contrato con Edesa SA para los diseños necesarios para la ejecución del proyecto alcantarillado sanitario fase II y el diseño del paso subfluvial, dichos planos están amarrados a las coordenadas y cotas oficiales del IGAC debidamente georreferenciados y certificados.

38. Realizar dentro del término previo a la liquidación del contrato la entrega de la obra al municipio de Cubarral, para su respectiva operación y mantenimiento.

- Se realizará dentro del término previo a la liquidación del contrato la entrega de la obra al municipio de Cubarral, para su respectiva operación y mantenimiento

10. SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista de Obra Afilió a todo el personal de obra a la seguridad social, cabe aclarar que las personas que entraron en el mes de febrero la planilla se pagan un mes vencido por lo tanto se pagará en el mes de marzo.

Se entrego todos los elementos de protección al personal: Casco, botas, guantes, gafas.

NOTA: (VER ANEXO 4. SOPORTE DE ENTREGA DE EPP).

11. CONCLUSION

- Durante el primer periodo de ejecución del Contrato de Obra Pública No. 1179 de 2022, llevado a cabo del 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023, el consorcio Cubarral fase II con Nit 901665237-0 realizó actividades preliminares, como Localización y replanteo para redes de alcantarillado y Desmonte y limpieza en rastrojo en el barrio porvenir en el municipio Cubarral – Meta; con un avance del **0.20%** en la ejecución de las actividades durante el periodo antes mencionado, no obstante, el contratista, debió ejecutar el **0.01%,** presentando un avance de acuerdo a la relación *Programado Vs. Ejecutado*.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

- Los trabajos objeto del presente contrato se realizan con buena calidad de mano de obra y equipos en óptimas condiciones, permitiendo una correcta ejecución en el proceso constructivo de las actividades. Así mismo, durante este periodo de ejecución han cumplido con las especificaciones técnicas contractuales, de acuerdo a los requerimientos realizados por la interventoría y con el acompañamiento de la supervisión de la Corporación para el Desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena (Cormacarena).

- Las actividades estipuladas en el contrato de obra se realizan con todos los elementos de protección, con el fin de no generar ningún tipo de accidente al personal de obra y garantizar la seguridad del personal durante su ejecución.

- Por otra parte, financieramente no se ha realizado ningún pago parcial en el primer periodo ejecutado, a la fecha se encuentra en proceso la solicitud y desembolso del anticipo; y en ejecución el **0.20%** que equivale a **$ 8.284.626,87**.

12. ANEXOS

Anexo 1 Actas de vecindad

Anexo 2 Copia de bitácora de obra

Anexo 3 Pagos de planilla de seguridad social

Anexo 4 Soporte de entrega de EPP

Anexo 5 Registro fotográfico.

Anexo 6 Pólizas

Anexo 7 Control de lluvias

Anexo 8 Personal de Obra

Anexo 9 Plan de inversión del anticipo

Anexo 10 Acta de avance del contrato

Anexo 11 Actas de comité.

Anexo 12 Informe Digital - CD

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ANEXO 1

ACTAS DE VECINDAD

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
17	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO BOX COULVERT (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque

	☐ Madera		☐ Otro?	Cuál?					
Tipo de predio	☐ Residencial		☐ Comercial	☐ Institucional		☐ Industrial		☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional		☐ Bien Cultural	☐ En Construcción		☐ Lote Baldío		☐ Otro:	
Longitud de frente		Mts.		Numero de niveles (pisos)					

3. DATOS PROPIETARIO				3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR			
Nombre				Nombre			
Cedula				Cedula			
Dirección				Dirección			
Celular / Tel. fijo				Celular / Tel. fijo			
C. Electrónico				C. Electrónico			
Notificación E-mail	☐ Si	☒ No		Notificación E-mail	☐ Si	☒ No	

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☒ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☐ Si	☒ No		En uso	☐ Si	☒ No

Acueducto	☐ Si	☒ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Se realizo el recorrido del predio de la alcaldía con el ING YEISON HURTADO PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS y el ING HERNAN ANACONA RESIDENTE DE OBRA, con el fin de solicitarles la autorización del retiro cerramiento tipo cerca en la cual se construirán los tramos de tubería sanitaria del (PZ 4A hasta PZ 4) (PZ 4 hasta PZ 3) (PZ 3 hasta PZ 2) (PZ 2 hasta PZ 1A) (PZ 1A hasta PZ 1) (PZ 1 hasta PZ EXISTENTE) y la construcción del PASO SUBFLUVIAL. Se anexará plano de los tramos a intervenir y el registro fotográfico del estado actual como se encuentra el cerramiento tipo cerca. Al entregar la obra o darla por terminada la CERCA se restaurará en su totalidad o de ser necesario será reemplazada.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO













CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta














Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta


CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta


HERNAN ANACONA		
Firma del Residente de Obra hernan Anacona	Firma del Residente de Interventoría	Firma del INGENIERO PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Nombre: HILBER HERNAN ANACONA ROA	Nombre Jesus Diaz Cortes	Nombre: YEISON HURTADO
C.C 86059532	C.C. 7'179.331	C.C .

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit. 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

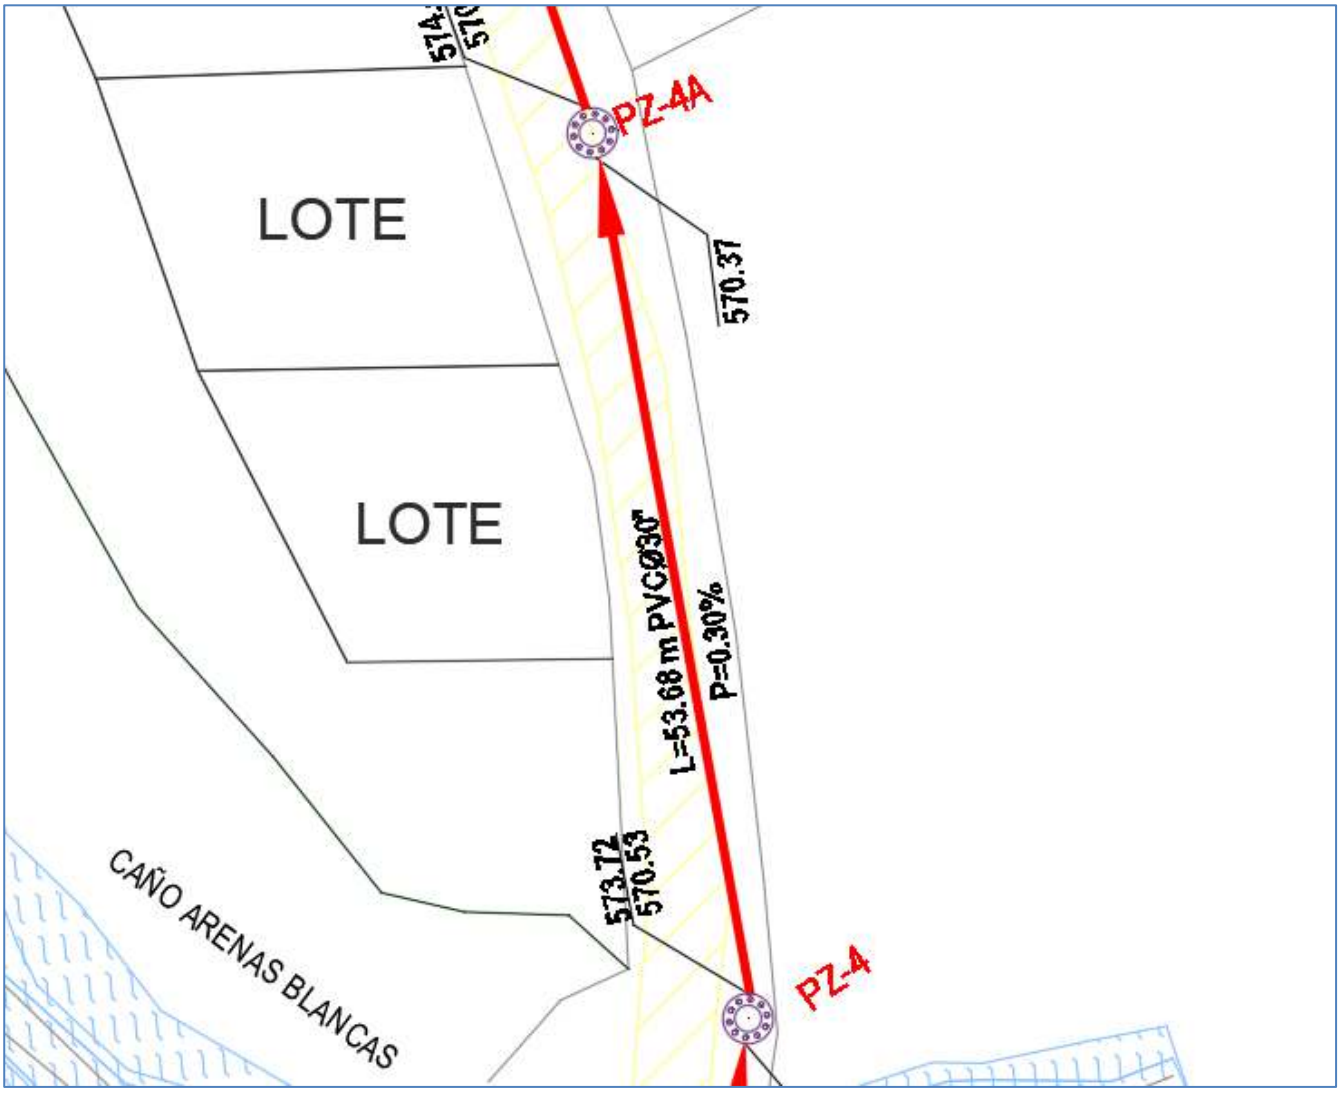
PZ-4A
LOTE
570.37
LOTE
L=53.68 m PVCØ30"
P=0.30%
573.72
570.53
CAÑO ARENAS BLANCAS
PZ-4

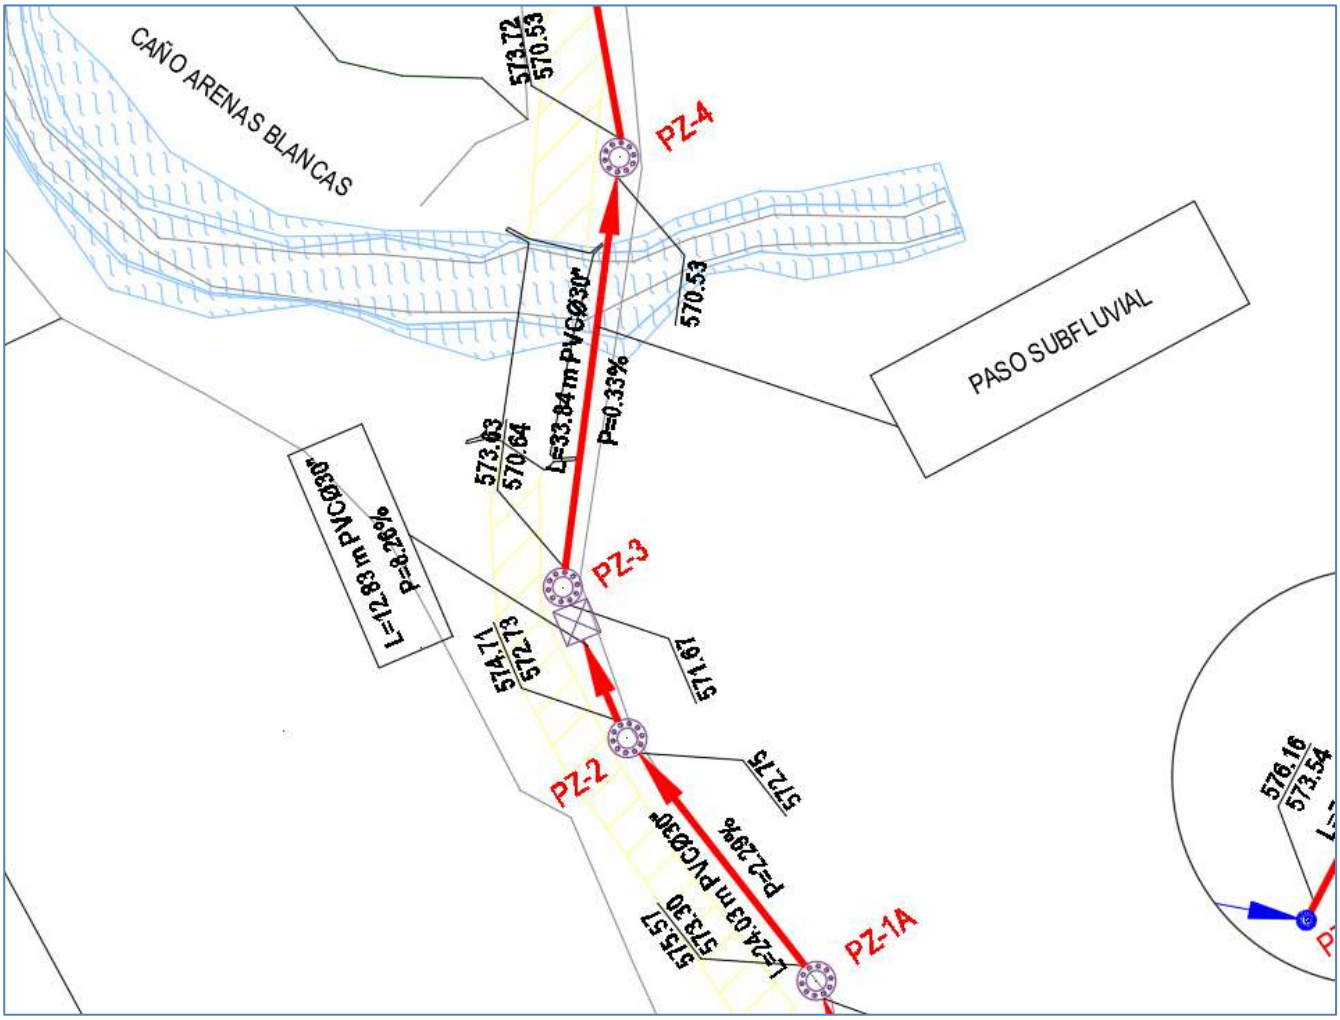
CAÑO ARENAS BLANCAS
PASO SUBFLUVIAL
PZ-4
PZ-3
PZ-2
PZ-1A
573.72
570.53
570.53
L=33.84 m PVC Ø30"
P=0.33%
573.63
570.64
L=12.83 m PVC Ø30"
P=8.28%
574.71
572.73
571.67
572.75
L=24.03 m PVC Ø30"
P=2.29%
575.57
573.30
576.16
573.54

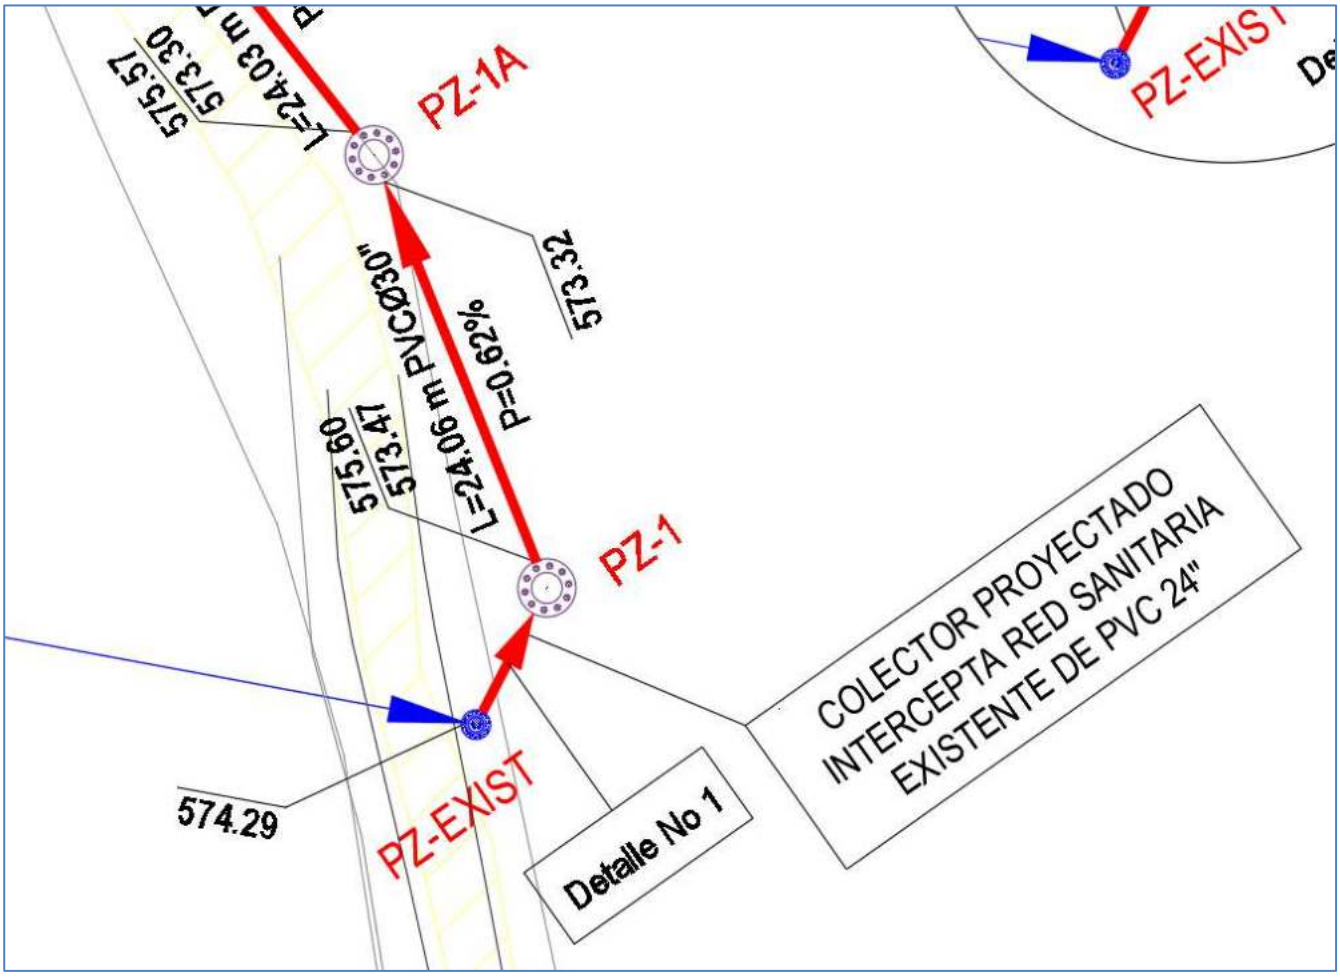
PZ-1A
PZ-EXIST
575.57
573.30
L=24.03 m
573.32
P=0.62%
L=24.06 m PVCØ30"
575.60
573.47
PZ-1
COLECTOR PROYECTADO
INTERCEPTA RED SANITARIA
EXISTENTE DE PVC 24"
574.29
PZ-EXIST
Detalle No 1

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento	
Dirección	Vereda Marayal			
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☒ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	12	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Yeimi carolina Martínez Osorio	Nombre	
Cedula	53125463	Cedula	
Dirección	Calle 52f Sur N° 24c 20 Multifamiliar Quindío - Tunal – Ciudad Bogotá.	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3197216010	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	Yeyecaro21@hotmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra negra, por lo tanto, no tiene puertas, rejas y pintura.

Firma el presidente de la junta ya que la propietaria no se encuentra en el municipio de Cubarral – Meta.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: hernan Anacona	Nombre: Jesus Diaz Cortes	Nombre: Luis Orlando Velosco
C.C. 86059532	C.C. 7'179.331	C.C. 91 016 296
T.P. 25202-276596	T.P. 15202-198752	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis Orlando Velosco P.
C.C. 91'016.296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

2. INFORMACION DEL PREDIO					
Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección	Vereda Marayal				
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☒ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	5	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Olga lucia usuga	Nombre	
Cedula	31037202	Cedula	
Dirección	Vereda Marayal	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3197216010	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	Ortizmichel619@gmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS			
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No	
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No					
Televisión cable	☐ Si	☒ No					
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:				

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra madera, por lo tanto, no tiene estructura, puertas, rejas, pisos, pintura, viga canal y anden.

Firma el presidente de la junta ya que la propietaria no se encuentra en el municipio de Cubarral – Meta.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		olga ortiz
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: hernan Anacona	Nombre: Jow Diaz Cortes	Nombre: olga lucia c.o.
C.C. 86059532	C.C. 7'179.331	C.C. 31037202.
T.P. 25202-276596	T.P. 15202-185752	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis orlando velasco
C.C. 91.016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección	Vereda Marayal				
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☒ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	6	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Olga lucia usuga	Nombre	
Cedula	31037202	Cedula	
Dirección	Vereda Marayal	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3197216010	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	Ortizmichel619@gmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☒ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☒ No
En uso	☐ Si	☒ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra madera, por lo tanto, no tiene estructura, puertas, rejas, pintura, viga canal y anden.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		olga ortiz
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: hernan Anacona	Nombre: Jesus Diaz Cortes	Nombre: olga lucia U.O.
C.C. 86059532	C.C. 7.179.331	C.C. 31037202.
T.P. 25202-276596	T.P. 15202-185752.	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis orlando Velasco
C.C. 91'016.296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento	
Dirección	Vereda Marayal			
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☒ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	6	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Olga lucia usuga	Nombre	
Cedula	31037202	Cedula	
Dirección	Vereda Marayal	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3197216010	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	Ortizmichel619@gmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra negra, por lo tanto, no tiene rejas, pintura y anden.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		olga ortiz.
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: hernan Anacona	Nombre: Jaw Diaz Cortz	Nombre: olga lucia u.o.
C.C. 86059532	C.C. 7'179.331	C.C. 31037202.
T.P. 25202-276596	T.P 15202-185752.	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis orlando velasco P
C.C. 91.016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento	
Dirección	Vereda Marayal			
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☒ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	22	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Nancy Tenorio Rodríguez	Nombre	
Cedula	31964075	Cedula	
Dirección	Vereda Marayal	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3125466798	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	No tiene	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☒ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso ☐ Garaje	☐ Comercial	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra blanca, está en buenas condiciones.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		Nancy Tenorio
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoria	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: Hernan Anacona	Nombre: Jesús Diaz Cortes	Nombre: Nancy Tenorio
C.C. 86059532	C.C. 7'179.331	C.C. 51.964075
T.P. 25202-276596	T.P. 15 202-185752.	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis Orlando Velasco
C.C. 91.016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
18	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección	Vereda Marayal				
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☒ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	22	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Gentil Tenorio Sanchez	Nombre	
Cedula	7842269	Cedula	
Dirección	Vereda Marayal	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3204948649	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	No tiene	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☒ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐X Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El predio se encuentra en obra blanca, está en buenas condiciones.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA		Gentil Fonseca S
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: hernan Anacona	Nombre: Jose Diaz Cortes	Nombre: Gentil Fonseca
C.C. 86059532	C.C. 7'179.331	C.C. 18412969
T.P. 25202-276596	T.P. 5202-185752.	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis Orlando Velasco.
C.C. 91016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
21	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento	
Dirección	Vereda Marayal			
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene

Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☒ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:

Longitud de frente	PZ 4 A – PZ 4	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Gabriel Fernández	Nombre	
Cedula	17422241	Cedula	

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Dirección	Finca las acacias		Dirección		
Celular / Tel. fijo	3142454325		Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico	No tiene		C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☒ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Yo Gabriel Fernández autorizo al Consorcio Cubarral fase II en retirar la cerca que queda al frente de la mata de monte desde el PZ 4 A -PZ 4, se deja el registro fotográfico como se encuentra actualmente, al terminar la intervención de la instalación de la tubería PVC 30" la cerca se restaura en su totalidad.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA R		Gabriel Fernández
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: Hernan Anacona R	Nombre: Jesus Dian Cortes.	Nombre: Gabriel Fernandez
C.C. 86059532 V/C10	C.C. 7'179.331	C.C. 17422241
T.P. 25202-276596	T.P. 15202-185752	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis Orlando Velosco P
C.C. 91'016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

DIA	**MES**	**AÑO**	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
23	02	2023	
ACTA DE VECINDAD			No. CONTRATO DE OBRA:1179-2022

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☒ Rural	Barrio/ Corregimiento	
Dirección	Vereda Marayal			
Matricula inmobiliaria	No tiene		Cedula catastral	No tiene

Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		

Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☒ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:

Longitud de frente	PZ 5 – PZ 4	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Guillermo Rondon	Nombre	

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

Cedula	7842881		Cedula		
Dirección	Vereda Marayal		Dirección		
Celular / Tel. fijo	3209137840		Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico	No tiene		C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☒ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐x No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	X☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


Yo Guillermo Rondón identificado con CC 7842881 de Cubarral – Meta, autorizo al consorcio Cubarral fase II que retiren la cerca de mi predio para realizar la construcción de la tubería de PVC 30" para alcantarillado sanitario. También autorizo para que el consorcio Cubarral fase II realicen la conformación de la vía para que tengan el acceso de los carros de la Vereda Marayal; al entregar la obra la cerca se entregará restaurada en su totalidad como se encontraba al inicio.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO





CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		
CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

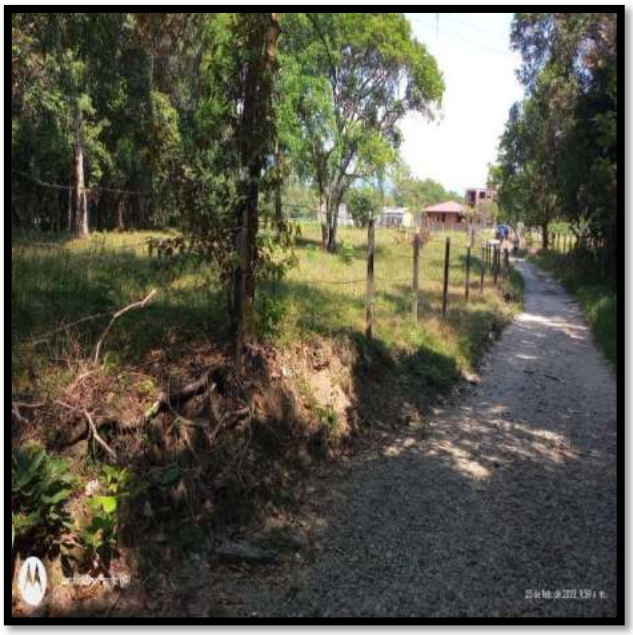







Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

CONTRATO OBRA N°1179-2022	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META"	CONTRATO INTERVENTORIA N°: 1188-2022
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	ACTA DE VECINDAD	Cormacarena Somos vida, somos Meta

HERNAN ANACONA ROA		
Firma del Residente de Obra	Firma del Residente de Interventoría	Firma del Propietario o Arrendador / Poseedor
Nombre: Hernan Anacona Roa	Nombre: Jesus Diaz	Nombre: Guillermo Bondon
C.C. 86059532	C.C. 7'179331	C.C. 7842881
T.P.	T.P. 15202-185752	

Presidente Junta de Acción Comunal
Nombre: Luis Orlando Velasco P
C.C. 91016296

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Corsorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

ANEXO 2

COPIA DE BITÁCORA DE OBRA

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CONTRATO DE OBRA N° 1179 DE 2022

CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1188 DE 2022.

INTERVENTORIA TECNICA ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, OPERATIVA, AMBIENTAL PARA UNA CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

EMPRESA INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S.

25 DE ENERO DE 2023.

Powered by CamScanner

El día 25 de Enero de 2023, se da apertura a la bitacora de Obra N° 1179 de 2022 que tiene como objeto "CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META", por un valor de Cuatro mil noventa y un millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres pesos mcte ($ 4.091.799.463) y un tiempo de ejecución de ocho (8) meses, es decir el 25 de Enero de 2023 al 24 de Septiembre de 2023.

Para constancia firman los presentes el dia 25 de Enero de 2023

HERNAN ANACONA ROA
HERNAN ANACONA ROA.
RESIDENTE DE OBRA.

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS CRUZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA.

FELIX JAVIER MORAGA GARZON
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FECHA: 25 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
- Director
- Residente
- Inspector.
- Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
- Director
- Residente
- Tercio Interventor.
- Tecnologo.
- Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se realiza recorrido de obra, por parte de los profesionales de Obra e interventoria.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada y dos (2) volquetas.
Una (1) mezcladora.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA
HERNAN ANACONA
RESIDENTE DE OBRA

Carlos Valencia
CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LUIS CRUZ ROMERO
DIRECTOR DE OBRA.

FELIX JAVIER MURAGA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

FECHA: 26 de Enero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se hace entrega por parte de la entidad los diseños iniciales del proyecto, para adelantar la respectiva revisión por parte del contratista de obra e interventoria.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) cargadora y dos (2) volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA.
HERNAN ANACONA
RESIDENTE DE OBRA

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

FECHA: 27 de Enero de 2023.

OBRA: Sokodu.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Continuan laborer por parte del personal de obra e interventoria con. relacion a la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amgada, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POPA
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra.

CARLOS. VALENCIA MARQUEZ
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA
Director de Interventoria

FECHA: 28 de Enero de 2023.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revisión de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora Orugado, una (1) mezcladora y dos (2) Volqueter.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA ROA.	Carlos Valencia
HERNAN ANACONA.	CARLOS VALENCIA MARQUEZ
Residente de Obra.	Residente de Interventoria

FECHA: 29 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Continuan labores por parte del personal de obra e interventoria con relacion a la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA PUA.
HERNAN ANACONA
Residente de Obra.

CARLOS VALENCIA MARQUEZ
Residente de Interventoria.

Luis CRUZ ROMERO.
Director de Obra.

FELIX JAVIER MURIAGA
Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

FECHA: 30 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continuo con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) mezcladora y dos (2) volquetas

FIRMAS:

HERNAN ARANGNA ROA.
HERNAN ARANGNA
Residente de Obra

Carlos Valencia
CARLOS VALENCIA MARQUEZ.
Residente de Interventoria

FECHA: 31 de Enero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continuo con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga (1), una (1) motoniveladora y dos (2) Vibrocompactadores.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA BOA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

Carlos Valencia
CARLOS VALENCIA MARQUEZ
Residente de Interventoria.

FECHA: 01 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo
	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del Personal de Obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarillo, una (1) mezcladora y dos (2) Volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA ROA,
HERNAN ANAGONA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ CORTES
Residente de Interventoria.

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra.

FELIX JAVIER MURIAGA
Director de Interventoria

FECHA: 02 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector
Profesional SST

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del personal de obra relacionado con la revision de los diseños suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora y dos (2) Volquetas.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA ROA
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 03 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA.
Director.	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se continua con el desarrollo de actividades por parte del Personal de Obra relacionados con la revision de los diseños Suministrados por la entidad contratante

EQUIPOS:
Retroexcavadora arrastrado, una (1) mezcladora y dos (2) Vibrocompactadores

FIRMAS:

HERNAN ANACONA ROA.
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ CORTES
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra.

FELIX JAVIER MURUAGA.
Director de Interventoria.

FECHA: 04 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor
Tecnologo.

ACTIVIDAD:
Se inicia actividades preliminares de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga, una (1) mezcladora, dos (2) Vibrador y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ANAYA ROA
HERNAN ANAYA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

FECHA: 06 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
Director.	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se inicia actividades preliminares de demarte y limpieza de rastrojo para remover el material de la vegetación situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) vibradores y herramienta menor

FIRMAS:

HERNAN AVACONA PEÑA.
HERNAN AVACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROTERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA.
Director de Interventoria

FECHA: 07 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA ROA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 08 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento.
	Tecnologo

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de delmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetacion situado en el alineamiento de la red, con el fin de acondicionar la superficie, para el desarrollo de las actividades

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas y herramienta menor.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA POA
HERNAN ANACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURIAGA
Director de Interventoria

FECHA: 09 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se inicia actividades preliminares de localización y replanteo del trazado inicial.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUNA POR
HERNAN ARANGUNA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 10 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Director.
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director.
Residente
Tecnico Interventor.
Especialista Geotecnia

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de localizacion y replanteo, del tratado inicial de Trama y estructura a construir. correspondiente a los planos suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga (1), una (1) mezcladora, dos (2) volqueteo y herramienta menor. y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARANGUA POA
HERNAN ARANGUA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ PONEDO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS.
Director de Interventoria.

Powered by CamScanner

FECHA: 11 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleada

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Tecnologo

ACTIVIDAD:
Se continua con las actividades preliminares de localizacion y replanteo, del trazado inicial de tramos y estructuras a construir correspondiente a los planos suministrados por la entidad contratante.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) motoniveladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

FECHA: 13 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se inicia con el corte y figuracion de acero de refuerzo, para la estructura (Base circular de pozo de inspeccion) Inspección y se inicia acopio de arena de rio, para cama y atraque de tuberia

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugado, una (1) mezcladora, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARACENA POA.
HERNAN ARACENA
Residente de Obra

Jesus David Diaz.
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA.
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 14 de Febrero de 2023

CLIMA: Lluvioso

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el corte, figurado y amarre de acero N°4 y acopio de material afirm de rio.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) vibradores, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA ROA
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoría.

FECHA: 15 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA
Director,	Director,
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor
Profesional SST.	Tecnologo.
	Especialista Saneamiento
	Supervisión.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se realizo socializacion del contrato de obra, en el salón comunal del barrio Porvenir, donde se dio a conocer el alcance, infoimación general, plazo y demás pormenores, se suscribe la respectiva acta, en la intervención por parte de la supervisión, se informo que el proyecto se desarrolla en cumplimiento al plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado en el año 2021, para dejar un unico punto de vertimiento sobre caño arenas blancas.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA.		JESUS DAVID DIAZ.
HERNAN ARAGONA		Residente de Interventoría.
Residente de Obra		
LUIS CRUZ ROMERO	INGRID SUAREZ.	FELIX JAVIER MURIAGA
Director de Obra	Supervisora	Director de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 16 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:.
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el acopio de arena de rio, para cama base en la instalacion de Tuberia de 30" PVC, y se continua con el armado del acero y figuracion para las placas de pozo de inspección.

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) motoniveladora, dos (2) volquetas y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA RUA
HERNAN ARAGONA
Residente de Obra.

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS
Director de Interventoria

FECHA: 17 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA
Director	Director.
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se continua con el acopio de arena de rio, para coma base en la instalacion de tuberia de 30" PVC, y se continua con el corte, figurado y amarre de acero de refuerzo N° 4. para las placas. de pozo de inspeccion

EQUIPOS:
Retroexcavadora orugada, una (1) mezcladora, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ANACONA RUA
HERNAN ANACONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS OROZ RAMIREZ.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA.
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 18 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.
Tecnologo.

ACTIVIDAD:
El dia de hoy se realiza el recorrido a los predios aledaños al frente de obra a intervenir. donde se inicia el levantamiento de las respectivas actas de vecindad, se continua con apoyo de material de rio, requerido para la instalacion de la red de 30" PVC.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga de, una (1) mezcladora y dos (2) Volqetas. y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA POA
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria.

Powered by CamScanner

FECHA: 20 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORÍA:
Director.	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor.
Profional SST.	Especialista Soreamiento.

ACTIVIDAD:
Se continua realizando actas de veandad que requiere el Proyecto y se continua con apoio de drenaje de rio y para, Como base requerido para la instalación de la red de 30" PVC

EQUIPOS:
Retroexcavadora ongado, una(1) motoniveladora, dos (2) Volquetas y equipo Topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA PUA.
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGAS.
Director de Interventoria

FECHA: 21 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado.

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con el acopio de arena de rio, para comenzar con la instalacion de tuberia de 30" PVC, y se continua con el armare del acero y figuracion para las placas de pozo de inspeccion.

EQUIPO:
Retroexcavadora amarillo, una (1) mezcladora, dos (2) vibrador y equipo topografico.

FIRMAN:

HERNAN ARANGUA POR
HERNAN ARANGUA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ.
Residente de Interventoria

FECHA: 22 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado

PERSONAL DE OBRA:	PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector	Tecnico Interventor
Profesional SST	Tecnologa
	Especialista Saneamiento.

ACTIVIDAD:
Se inicio la excavación manual para la ubicación de la tubería existente de acueducto de 4 1/2", para trasladarla provisionalmente, ya que la construccion de alcantarillado sanitario tiene ese alineamiento, es importante que la tubería trasladada de manera provisional, la cual posteriormente sera reubicada.

EQUIPOS:
Retroexcavadora oruga de, una (1) cuadrilla, dos (2) Volquetas, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARRACONA PEÑA.
HERNAN ARRACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ PINERO.
Director de Obra

FELIX JAVIER MURGUIA.
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

FECHA: 23 de Febrero de 2023.

CLIMA: Soleada

PERSONAL DE OBRA:
Residente
Inspector.
Profesional SST.

PERSONAL DE INTERVENTORIA:
Residente
Tecnico Interventor.

ACTIVIDAD:
Se continua con la excavacion manual para la ubicacion de la tuberia existente de acueducto de 1" 1/2, para trasladarla provisionalmente ya que la construccion de alcantarillado sanitario tiene este alineamiento, es importante que la tuberia trasladada de manera provisional, la cual posteriormente sera reubicada

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) mezcladora, dos (2) vibradores, herramienta menor y equipo topografico

FIRMAS:

HERNAN ARACONA ROA
HERNAN ARACONA
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

FECHA: 24 de Febrero de 2023

CLIMA: Soleado,

Personal de Obra:	Personal de Interventoria:
Director	Director
Residente	Residente
Inspector.	Tecnico Interventor.
Profesional SST.	Especialista Saneamiento

ACTIVIDAD:
Se continua con la excavación manual para la ubicación de la tuberia existente de acueducto de 4 "2, para trasladarla provisionalmente ya que la construcción de alcantarillado Sanitario tiene ese alineamiento, es importante que la tuberia sea trasladada de manera provisional, la cual posteriormente sea reubicada.

EQUIPOS:
Retroexcavadora amarilla, una (1) motobomba, dos (2) volquetas, herramienta menor y equipo topografico.

FIRMAS:

HERNAN ARAGONA RUA.
HERNAN ARAGONA.
Residente de Obra

JESUS DAVID DIAZ
Residente de Interventoria

LUIS CRUZ ROMERO
Director de Obra

FELIX JAVIER MURUAGA
Director de Interventoria

Powered by CamScanner

ANEXO 3

PAGOS DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

CONTRATO DE OBRA No. 1179/2022

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

CERTIFICACION PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.121.926.457 de Villavicencio** en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CUBARRAL FASE 2** identificado con **NIT 901.665.237-0**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante el **mes de enero de 2023**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ALBA LUCIA ROMERO TAUTIVA identificada con cedula de ciudadanía **No. 40.400.310 de Villavicencio**, y con Tarjeta Profesional **No. 97579-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO CUBARRAL FASE 2** identificado con **NIT 901.665.237-0**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983)*, pagados por la compañía durante el **mes de enero de 2023**. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los sistemas de seguridad social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24, Decreto 2236 de 1999, artículo 135 de 2ª Ley 1753 de 2015 y decretos 1273 de 2018.

La presente certificación se expide en Villavicencio, para ser presentada a **CORMACARENA** a los diecisiete(17) días del mes de febrero de 2023.

ING. CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
C.C. No. 1.121.926.457 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

ALBA LUCIA ROMERO TAUTIVA
C.C. No. 40.400.310 de Villavicencio
Contador Público T.P. 97579-T
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

Dirección: Calle 46 No. 32– 17 Barrio El Triunfo
Teléfono: (8) 6814991 Celular: 316 691 48 74
Correo: consorciocubarralfase2@gmail.com
Ciudad: Villavicencio - Meta

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 5 1 7 Z Z 7 5 B C 3 B 4 4 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBA LUCIA ROMERO TAUTIVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40400310 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 97579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PARA USO EXCLUSIVO DE CONSORCIO CUBARRAL FASE 2



CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

Powered by CamScanner

HENRY DUARTE HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. 25202093644CND

Yo **HENRY DUARTE HERNANDEZ** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 17.355.828, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que he cumplido durante el mes de enero de 2023 con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo declaro que me encuentro a Paz y Salvo con todas las entidades promotoras de Salud EPS, los Fondos De Pensiones, Las Administradoras De Riesgos Profesionales ARP, Las Cajas De Compensación Familiar, El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Y El Servicio Nacional De Aprendizajes SENA Y El Contrato De Aprendizaje.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veinticuatro (24) días de febrero de 2023.

HENRY DUARTE HERNANDEZ
INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. 25202093644CND

YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA
INGENIERA CIVIL
MATRICULA No. 25202089864CND

Yo **YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA** identificada con Cedula de Ciudadanía No. 30.083.308, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que he cumplido durante el mes de enero de 2023 con el pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo declaro que me encuentro a Paz y Salvo con todas las entidades promotoras de Salud EPS, los Fondos De Pensiones, Las Administradoras De Riesgos Profesionales ARP, Las Cajas De Compensación Familiar, El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Y El Servicio Nacional De Aprendizajes SENA Y El Contrato De Aprendizaje.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los veinticuatro (24) días de febrero de 2023.

YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA
INGENIERA CIVIL
MATRICULA No. 25202089864CND

Calle 46 N°32-17 Barrio Triunfo Villavicencio

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17304920	LUIS CRUZ ROMERO	CALLE 14A # 54A-14	6726377	lucrurom@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/03/2023	64970530	$1.536.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	625.000	0		0		0	35	26.100	0	651.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	25.000	25.000	35	33.400	2.200	885.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	651.100
Pensión	1	850.000	885.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.475.000	1.536.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17304920	LUIS CRUZ ROMERO		CALLE 14A # 54A-14	6726377	lucrurom@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/03/2023	64970530	$1.536.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	17304920	CRUZ ROMERO LUIS	3	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	625.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1923487081	9446633919	Y	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$32,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86056744	ARDILA YHOJANN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$16,200
2	CC	17304920	CRUZ LUIS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	6	$232,000	$16,200	0	$0	$0	No	$16,200
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$464,000	$32,400		$0	$0		$32,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	1923487081	9446633919	Y	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$32,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$32,400	$400	$0	$32,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$32,400	$400	$0	$32,800
TOTAL				**2**	**$32,400**	**$400**	**$0**	**$32,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1923501509	9446940698	E	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$1,371,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86059532	ANACONA HILBER	X																	230301	14	$1,586,667	$253,900	EPS037	14	$1,586,667	$63,500	CCF34	14	$1,586,667	$63,500	14-11	14	$1,586,667	$110,500	14	$0	$0	Si	$491,400
2	CC	1121900390	HERNANDEZ CRISTYAN	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF34	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
3	CC	1121926457	SEGURA CRISTHIAN	X																	230301	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF34	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
4	CC	1121883802	TRIANA ERIKA	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS005	12	$800,000	$32,000	CCF34	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
5	CC	1121943244	USECHE WANDA	X	X															X	25-14	6	$400,000	$64,000	EPS041	6	$400,000	$16,000	CCF34	6	$416,667	$16,700	14-11	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	Si	$124,600
Total	**Afiliados(5)**																						$4,381,334	$701,100			$4,381,334	$175,400			$4,398,001	$176,100			$4,381,334	$305,200		$0	$0		$1,357,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1923501509	9446940698	E	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$1,371,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$701,100	$6,800	$0	$707,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$64,000	$700	$0	$64,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$637,100	$6,100	$0	$643,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$305,200	$2,900	$0	$308,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$305,200	$2,900	$0	$308,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$176,100	$1,700	$0	$177,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$176,100	$1,700	$0	$177,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$175,400	$1,900	$0	$177,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$127,400	$1,300	$0	$128,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$16,000	$200	$0	$16,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$400	$0	$32,400
TOTAL				5	$1,357,800	$13,300	$0	$1,371,100

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86056744		ARDILA ESCOBAR YHOJANN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	APTO.301.CL.39.B.No.25-11.	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1915466447	9446845729	I	2023/03/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: SURA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 86056744	ARDILA ESCOBAR YHOJANN	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86056744		ARDILA ESCOBAR YHOJANN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	APTO.301.CL.39.B.No.25-11.	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1915466447	9446845729	I	2023/03/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

ANEXO 4

SOPORTE DE ENTREGA DE EPP

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	VERSIÓN: 1

FECHA: 5·02·2023. ORGANIZACIÓN: CCubarral Fase #.2. HSE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Cristyan Hender

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CÉDULA | FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN | | |

ANEXO 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

INFORME MENSUAL DETALLADO DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA 1179 DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CUBARRAL – META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE II
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 DE ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
ACTIVIDAD	1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO PARA REDES DE LCANTARILLADO.

FOTOGRAFÍA – ANTES DE LA ACTIVIDAD









FOTOGRAFÍA – DURANTE LA ACTIVIDAD









INFORME MENSUAL DETALLADO DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA 1179 DE 2022

FOTOGRAFÍA – DESPUES DE LA ACTIVIDAD









DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El contratista de obra realizo la localización y replanteo de toda la línea de acueducto sanitario PVC 30", Desde el Pozo Existente 1 Hasta el Pozo Existente 9.

INFORME MENSUAL DETALLADO DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA 1179 DE 2022

NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	CUBARRAL – META.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE II
PERIODO DEL REGISTRO FOTOGRÁFICO:	25 DE ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
ACTIVIDAD	1.3 DESMONTE Y LIMPIEZA DE RASTROJO.

FOTOGRAFÍA – ANTES DE LA ACTIVIDAD









FOTOGRAFÍA – DURANTE LA ACTIVIDAD









INFORME MENSUAL DETALLADO DE OBRA N°1
CONTRATO DE OBRA 1179 DE 2022

FOTOGRAFÍA – DESPUES DE LA ACTIVIDAD









DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: El contratista de obra realizo el desmonte y limpieza de rastrojo, desde el Pozo Existente 9 hasta el Pozo 8.

ANEXO 6

POLIZAS.

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	NIT: 901.665.237-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	VILLAVICENCIO, META	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA	NIT: 822.000.091-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 35 N. 25-57	VILLAVICENCIO, META	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES HASTA EL IMPORTE ASEGURADO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA CADA COBERTURA, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

ASEGURADO ADICIONAL: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA - NIT: 822.000.091-2 . ES ASEGURADO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SU RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS Y CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA - NIT: 822.000.091-2. ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$120,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$120,000,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUARTE HERNANDEZ HENRY	17355828	50.00
CUESTA BOTIVA YOLANDA JEANETH	30083308	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****665,753.00	$ ******20,000.00	$ *****130,293.00	$ **********816,046.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		NIT: 901.665.237-0
DIRECCION: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		NIT: 822.000.091-2
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$120,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$120,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	27/12/2022	27/08/2023	$120,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		NIT: 901.665.237-0
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		NIT: 822.000.091-2
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6730420
BENEFICIARIO:	822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		

OBJETO DE LA POLIZA

ACLARACION: LOS VALORES ASEGURADOS (SUBLIMITES) ESTABLECIDOS PARA LAS COBERTURAS ADICIONALES OTORGADAS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LAS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2023	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		NIT: 901.665.237-0
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		NIT: 822.000.091-2
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO	6730420
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · coopnacional

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****665,753.00	$ ******20,000.00	$ *****130,293.00	$ **********816,046.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11006103231013 (3900) 000000816046 (96) 20231227

REFERENCIA PAGO: 1100610323101-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050856	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	NIT: 901.665.237-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	VILLAVICENCIO, META	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA	NIT: 822.000.091-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 35 N. 25-57	VILLAVICENCIO, META	6730420

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2022	27/12/2023	$409,179,946.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	27/12/2022	27/12/2023	$818,359,892.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2022	27/08/2026	$818,359,892.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$1,227,539,838.90

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUARTE HERNANDEZ HENRY	17355828	50.00
CUESTA BOTIVA YOLANDA JEANETH	30083308	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **22,823,048.00	$ ******25,000.00	$ ***4,341,129.00	$ ********27,189,177.00	$ ****3,273,439,570.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050856

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050856	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	12	2022	27	12	2022	00:00	27	08	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		NIT: 901.665.237-0
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO:	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		NIT: 822.000.091-2
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	CIUDAD: VILLAVICENCIO, META	TELÉFONO	6730420
ADICIONAL:			

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **22,823,048.00	$ ******25,000.00	$ ***4,341,129.00	$ ********27,189,177.00	$ ****3,273,439,570.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11006103230394 (3900) 000027189177 (96) 20231227

REFERENCIA PAGO: 1100610323039-4

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050856	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	NIT: 901.665.237-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	VILLAVICENCIO, META	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA	NIT: 822.000.091-2

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRA. 35 N. 25-57	VILLAVICENCIO, META	6730420

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/01/2023	25/01/2024	$409,179,946.30	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	25/01/2023	25/01/2024	$818,359,892.60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/01/2023	25/09/2026	$818,359,892.60	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$1,227,539,838.90	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 25/01/2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **22,823,048.00	$ ******25,000.00	$ ***4,341,129.00	$ ********27,189,177.00	$ ****3,273,439,570.40	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050856

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-44-101050856	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	**NIT: 901.665.237-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	VILLAVICENCIO, META	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA	**NIT: 822.000.091-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CRA. 35 N. 25-57	VILLAVICENCIO, META	6730420

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUARTE HERNANDEZ HENRY	17355828	50.00
CUESTA BOTIVA YOLANDA JEANETH	30083308	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-44-101050856

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	NIT: 901.665.237-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	VILLAVICENCIO, META	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA	NIT: 822.000.091-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA. 35 N. 25-57	VILLAVICENCIO, META	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES HASTA EL IMPORTE ASEGURADO SEÑALADO EN LA CARATULA DE LA POLIZA PARA CADA COBERTURA, QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1179 DE 2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL - META.

ASEGURADO ADICIONAL: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA - NIT: 822.000.091-2 . ES ASEGURADO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE SU RESPONSABILIDAD CIVIL PROPIA E INDEPENDIENTE.

BENEFICIARIOS ADICIONALES: TERCEROS AFECTADOS Y CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA - NIT: 822.000.091-2. ES BENEFICIARIO ADICIONAL DE LA PRESENTE POLIZA, SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$400,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$120,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$120,000,000.00	

ACLARACIONES

DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE FECHA 25/01/2023 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****665,753.00	$ ******20,000.00	$ *****130,293.00	$ **********816,046.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
D & C SEGUROS Y FINANZAS LTDA.	153921	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		**NIT: 901.665.237-0**
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		**NIT: 822.000.091-2**
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$120,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$120,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/01/2023	25/09/2023	$120,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		**NIT: 901.665.237-0**
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		**NIT: 822.000.091-2**
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

OBJETO DE LA POLIZA

ACLARACION: LOS VALORES ASEGURADOS (SUBLIMITES) ESTABLECIDOS PARA LAS COBERTURAS ADICIONALES OTORGADAS EN LA PRESENTE POLIZA (SI LAS HUBIERE) FORMAN PARTE DEL VALOR ASEGURADO TOTAL ESTABLECIDO PARA EL AMPARO BASICO (PREDIOS LABORES Y OPERACIONES) QUE SE CONSIDERA EL LIMITE MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA Y POR ESTO NO SON VALORES ASEGURADOS ADICIONALES.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VILLAVICENCIO	VILLAVICENCIO	30	30-40-101018270	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
30	01	2023	25	01	2023	00:00	25	09	2023	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		**NIT: 901.665.237-0**
DIRECCIÓN: CL 46 32 17 BRR EL TRIUNFO	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	386814991

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA		**NIT: 822.000.091-2**
DIRECCIÓN: CRA. 35 N. 25-57	**CIUDAD:** VILLAVICENCIO, META	**TELÉFONO:**	6730420

BENEFICIARIO: 822000091 - CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA CORMACARENA

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
DUARTE HERNANDEZ HENRY	17355828	50.00
CUESTA BOTIVA YOLANDA JEANETH	30083308	50.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 38 NO. 33 - 45/49 - TELEFONO: 6623707 - VILLAVICENCIO

30-40-101018270

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANXO 7

CONTROL DE LLUVIAS

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES: FEBRERO - 2023 | CONTRATO No.: 1179 DE 2022 | SECTOR: CUBARRAL - META

CONTRATISTA: CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA / Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Seco	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9		9		9	9	9	9		9	9	9	9	9				
Lluvias moderadas														5														
Lluvias intensas														4														
7:00-8:00AM														1														
8:00-9:00AM														1														
9:00-10:00AM														1														
10:00-11:00AM														1														
11:00-12:00PM														1														
12:00-01:00PM														1														
01:00-02:00PM														1														
02:00-03:00PM														1														
03:00-04:00PM														1														
04:00-05:00PM														1														

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO; CON UNA X SE INDICARA LA HORA DONDE SE PRESENTO LLUVIAS.

Firma: HERNAN ANACONA R

Nombre: HERNAN ANACONA
Residente de Obra

Powered by CamScanner

ANEXO ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES: ENERO - 2023 CONTRATO No. 1179 DE 2022 SECTOR: CUBARRAL - META

CONTRATISTA: CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

DIA / Clase de tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Seco																									9	9	9	9		9	9
Lluvias moderadas																															
Lluvias intensas																															
7:00-8:00AM																															
8:00-9:00AM																															
9:00-10:00AM																															
10:00-11:00AM																															
11:00-12:00PM																															
12:00-01:00PM																															
01:00-02:00PM																															
02:00-03:00PM																															
03:00-04:00PM																															
04:00-05:00PM																															

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO; CON UNA X SE INDICARA LA HORA DONDE SE PRESENTO LLUVIAS.

Firma HERNAN ANACONA R.

Nombre: HERNAN ANACONA
Residente de Obra

Powered by CamScanner

ANEXO 8

PERSONAL DE OBRA

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ANEXO CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES ENERO - 2023 **CONTRATO No.** 1179 DE 2022 **SECTOR** CUBARRAL - META

CONTRATISTA CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

PERSONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA																									1	1	1	1		1	1
RESIDENTE DE OBRA																									1	1	1	1		1	1
INSPECTOR DE OBRA																									1	1	1	1		1	1
PROFESIONAL SST																									1	1	1	1		1	1
INGENIERO AMBIENTAL																									1	1	1	1		1	1

OBSERVACIÓN: 5 personas trabajando en campo

Firma HERNAN ANACONA

Nombre: HERNAN ANACONA
Residente de Obra

Powered by CamScanner

ANEXO CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

MES FEBRERO - 2023 **CONTRATO No.** 1179 DE 2022 **SECTOR** CUBARRAL - META

CONTRATISTA CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

PERSONAL \ DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
DIRECTOR DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
RESIDENTE DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
INSPECTOR DE OBRA	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
PROFESIONAL SST	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
INGENIERO AMBIENTAL	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
CADENERO	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1						
OFICIAL	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2						

OBSERVACION: El personal ingresado en el periodo de 01 de febrero de 2023 al 24 de febrero de 2023; no tiene soporte de pago EPS a la fecha; debido que se paga mes vencido; por lo tanto se anexará en el siguiente informe.

Firma HERNAN ANACONA

Nombre: HERNAN ANACONA
Residente de Obra

Powered by CamScanner

ANEXO 9

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO No. :	1179 DEL 2022
OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META"
VALOR CONTRATO:	$ 4.091.799.463,00
ANTICIPO	20%
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
NIT:	901.629.216-3
INTERVENTOR	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
PLAZO CONTRATO:	8 MESES
VALOR ANTICIPO:	$ 818.359.892,60

PRESUPUESTO OFICIAL						PAGO ANTICIPO			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	MES 1	MES 2	MES 3	TOTAL PAGO ANTICIPO
	1 ACTIVIDADES PRELIMINARES								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL				
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	5.976,00	$ 3.748.386				$ -
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	364.034,00	$ 68.074.358				$ -
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	2.732,60	4.167,00	$ 11.386.744				$ -
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	2.602,81	27.409,00	$ 71.340.419				$ -
		SUBTOTAL			**$ 154.549.908**	$ -			$ -
	2 EXCAVACIONES								
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	9.202,44	42.053,00	$ 386.990.209				$ -
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	1.754,15	48.553,00	$ 85.169.245				$ -
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	268,58	70.222,00	$ 18.860.225				$ -
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	4.097,03	80.622,00	$ 330.310.753	$ 40.917.995,00			$ 40.917.995,00
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	292,90	87.908,00	$ 25.748.253				$ -
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	15.322,20	34.962,00	$ 535.694.756	$ 26.374.000,00			$ 26.374.000,00
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	19034162,00	$ 76.136.648				$ -
		SUBTOTAL			**$ 1.458.910.089**	**$ 67.291.995,00**			**$ 67.291.995,00**
	3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA								
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	627,24	1.429.312,00	$ 896.521.659	$ 315.000.000,00			$ 315.000.000,00
		SUBTOTAL			**$ 896.521.659**	**$ 315.000.000,00**			**$ 315.000.000,00**
	4 RELLENOS								

4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	1.612,44	145.519,00	$ 234.640.656	$ 88.660.000,00			$ 88.660.000,00
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	12.633,79	74.850,00	$ 945.639.182	$ 347.407.897,60			$ 347.407.897,60
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	134.035,00	$ 73.687.082				$ -
		SUBTOTAL			**$ 1.253.966.919**	**$ 436.067.897,60**			**$ 436.067.897,60**
	5 POZOS DE INSPECCION								
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	17,00	2.964.847,00	$ 50.402.399				$ -
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	1.482.656,00	$ 115.454.423				$ -
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0.20m)	UN	17,00	1.487.065,00	$ 25.280.105				$ -
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	529.206,00	$ 8.996.502				$ -
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	4.168.668,00	$ 4.293.728				$ -
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	229.642,00	$ 236.531				$ -
		SUBTOTAL			**$ 204.663.688**				-
	6 PASO SUBFLUVIAL								
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	1.336.498,68	$ 31.928.953				$ -
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1.231,49	13.747,00	$ 16.929.293				$ -
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	1.864.104,00	$ 55.923.120				$ -
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	62,00	296.868,27	$ 18.405.833				$ -
		SUBTOTAL			**$ 123.187.199**				-
									-
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 4.091.799.463**	**$ 818.359.892,60**			**$ 818.359.892,60**
	VALOR TOTAL				**$ 4.091.799.463**	**$ 818.359.892,60**			

Aprobó:

LINA LORENA SALGADO GARCÍA
EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S
INTERVENTORIA

Presento:

CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
CONTRATISTA

ANEXO 10

ACTA DE AVANCE DEL CONTRATO

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

ACTA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1179 DE 2022

		VALOR CEL CONTRATO	$4.091.799.463,00
		DURACION DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		**FECHA DE INICIO**	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023
CONTRATISTA DE OBRA			
NIT . 901665237-0		**FECHA PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA:**	VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2023
EMRESA DE INSFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	**MES N° 01: 25/ENER/2023 AL 24/FEB/2023**	**FECHA DE TERMINACION**	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		**VALOR PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA:**	$8.284.626,87
NIT . 901629216-3			

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01		OBRA POR EJECUTAR	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1,1	Localizacion y replanteo para redes de alcantarillado	M	627,24	5.976,00	$ 3.748.386	94,086	$ 562.257,94	627,24	$ 3.748.386,00	0,00	$ 0,00
1,2	Control de rios mediante conformacion mecanica de jarillón (inc. Retroexcavadora orugada)	HR	187,00	364.034,00	$ 68.074.358	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	187,00	$ 68.074.358,00
1,3	Desmonte y limpieza en rastrojo	M2	2.732,60	4.167,00	$ 11.386.744	0,00	$ 0,00	1088,61	$ 4.536.237,87	1643,99	$ 6.850.506,33
1,4	Descapote mecanico (incluye retiro d=5km)	M2	2.602,81	27.409,00	$ 71.340.419	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	2602,81	$ 71.340.419,29
Subtotal					**$ 154.549.907**						
2											
2,1	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	9.202,44	42.053,00	$ 386.990.209	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	9202,44	$ 386.990.209,32
2,2	Excavación mecánica en conglomerado h > 3.0m	M3	1.754,15	48.553,00	$ 85.169.245	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1754,15	$ 85.169.244,95
2,3	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h<3.0m	M3	268,58	70.222,00	$ 18.860.225	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	268,58	$ 18.860.224,76
2,4	Excavación mecánica en conglomerado húmedo h>3.0m	M3	4.097,03	80.622,00	$ 330.310.753	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4097,03	$ 330.310.752,66
2,5	Entibado tipo 1 (formaleta madera 1/7 utilizaciones)	M2	292,90	87.908,00	$ 25.748.253	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	292,90	$ 25.748.253,20
2,6	Retiro sobrantes de excavación	M3	15.322,20	34.962,00	$ 535.694.756	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	15322,20	$ 535.694.756,40
2,7	Manejo de aguas en excavaciones, (incluye 2 motobombas 3", y 2 motobombas 4")	MES	4,00	19034162,00	$ 76.136.648	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 76.136.648,00
Subtotal					**$ 1.458.910.089**						
3											
3,1	Suministro e Instalación de tubería PVC para alcantarillados d=30" (inc. nivelación de precisión)	M	627,24	1.429.312,00	$ 896.521.659	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	627,24	$ 896.521.658,88
Subtotal					**$ 896.521.659**			0,00	$ 0,00		
4											
4,1	Arena para base de tubería (incluye cargue, acarreo y compactación)	M3	1.612,44	145.519,00	$ 234.640.656	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1612,44	$ 234.640.656,36
4,2	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0,20m)	M3	12.633,79	74.850,00	$ 945.639.182	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	12633,79	$ 945.639.181,50
4,3	Afirmado en material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye explote, cargue, acarreo y conformación)	M3	549,76	134.035,00	$ 73.687.082	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	549,76	$ 73.687.081,60
Subtotal					**$ 1.253.966.920**			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
5											
5,1	Placa cubierta - pozo inspección D=1.50m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0,20m, inc. tapa HD sist. seguridad)	UN	17,00	2.964.847,00	$ 50.402.399	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 50.402.399,00
5,2	Cilindro pozo inspección D=1.50m (concreto impermeab. f'c =28MPa elab. en obra, e=0,20m, incluye escalera gato var.#6)	M	77,87	1.482.656,00	$ 115.454.423	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	77,87	$ 115.454.422,72

ACTA DE AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 1179 DE 2022

		VALOR CEL CONTRATO	$4.091.799.463,00
		DURACION DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2		**FECHA DE INICIO**	VEINTICINCO (25) DE ENERO DE 2023
CONTRATISTA DE OBRA			
NIT . 901665237-0		**FECHA PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA:**	VEINTICUATRO (24) DE FEBRERO DE 2023
EMRESA DE INSFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S	**MES N° 01: 25/ENER/2023 AL 24/FEB/2023**	**FECHA DE TERMINACION**	VEINTICUATRO (24) DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			
NIT . 901629216-3		**VALOR PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA:**	$8.284.626,87

CONDICIONES ORIGINALES						**ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES 01**		**ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 01**		**OBRA POR EJECUTAR**	
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
5,3	Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.50m (concreto f'c = 28MPa reforz. elab. en obra, e=0,20m)	UN	17,00	1.487.065,00	$ 25.280.105	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 25.280.105,00
5,4	Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 27" y 33" (concreto f'c = 28MPa elab. en obra)	UN	17,00	529.206,00	$ 8.996.502	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	17,00	$ 8.996.502,00
5,5	Cámara de caída para colectores de 20" a 30" (bajante 16", concreto simple f'c = 21MPa elab. obra)	M	1,03	4.168.668,00	$ 4.293.728	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,03	$ 4.293.728,04
5,6	Perforación de cámara de inspección existente, abocada para nueva tubería ø igual o mayor de 400 mm y resane	M	1,03	229.642,00	$ 236.531	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1,03	$ 236.531,26
Subtotal					**$ 204.663.688**			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
6											
6,1	Concreto impermeab. 3000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,89	1.336.498,68	$ 31.928.953	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	23,89	$ 31.928.953,47
6,2	Acero de refuerzo 60.000 PSI, elevaciones 3.0<h<6.0m (incluye amarre y figuración)	KG	1.231,49	13.747,00	$ 16.929.293	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	1231,49	$ 16.929.293,03
6,3	Manejo de aguas con tractobomba (nivel freático alto)	DIA	30,00	1.864.104,00	$ 55.923.120	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	30,00	$ 55.923.120,00
6,4	Gavión en malla triple torsión cal. 12, incluye llenado	M3	62,00	296.868,27	$ 18.405.833	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	62,00	$ 18.405.832,74
Subtotal					**$ 123.187.199**			0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
	Ajuste al peso				**$ 1**						
				SUBTOTAL OBRAS	$ 4.091.799.463						
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				**$ 4.091.799.463,00**						
	VALOR TOTAL				$ 4.091.799.463,00		$ 562.257,94		$ 8.284.626,87		$ 4.083.514.841,51

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCIÓN**		**PORCENTAJE**	**PORCENTAJE TOTAL DE OBRA PROGRAMADA - AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**PORCENTAJE TOTAL DE OBRA EJECUTADA - AVANCE DE OBRA MES N° 1**	**VALOR AVANCE DE OBRA PROGRAMADO MES N° 1** $ **562.257,94**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	16%	0,01%	0,20%	**% EJECUTADO PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA MES N° 1** **0,20%**
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	10%			
	UTILIDAD	**U=**	5%			**VALOR PRESENTE ACTA DE AVANCE DE OBRA MES N° 1** $ **8.284.626,87**
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	31%			

ANEXO 11

ACTAS DE COMITÉ

Dirección: CONDOMINIO SANTA MARIA 2 MULTIFAMILIAR 7 CASA 2
E-MAIL: Consorciocubarralfase2@gmail.com
Teléfono: 3102751761 – VILLAVICENCIO
Nit: 901665237
Ciudad: Villavicencio - Meta

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 1

FECHA DE REUNIÓN:	15-02-2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	Caseta Comunal barrio Porvenir Cubarral - Meta		
HORA DE INICIO:		**HORA FINAL:**	
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Consorcio Cubarral fase 2 - Cormacarena		
CARGO:	Contratista Obra - contratante Cormacarena.		
DEPENDENCIA:	—		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Socialización obra Interceptor Cubarral Fase II con la comunidad municipio de Cubarral - Barrio Porvenir

ORDEN DEL DÍA:

- Socialización proyecto
  - Alcance
  - Permisos
  - Plazo - valor, información general y cronológica.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- En el salón comunal barrio El porvenir siendo las 10:00 a.m. se dio inicio a la socialización de la obra adoptando alcance, información general, cronograma, plazo.
- se comunicó por parte de Cormacarena que la obra se desarrollará en cumplimiento al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV aprobado en el año 2021, para dejar

un único punto de vertimiento sobre caño Arenas Blancas.

- Se informa por parte del ingeniero Hernan Anacona – residente de obra, que se estarán recibiendo hojas de vida para contratación de mano de obra del municipio, a partir del 15 de Febrero de 2023, para realizar las respectiva vinculación previo inicio ejecución físico de obra.

- Algunos participantes manifiestan su preocupación respecto al no tratamiento de las aguas residuales y solicitan se informe respecto a los avances en el el diseño de la PTAR.

-

compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	—	—	—	—
2	—			
3				
4				
5				
6				
7				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	HERNAN ANACONA ROA	ING Residente	ing.hernan.anacona@gmail	Hernan Anacona
2	INGRID JOHANNA SUAREZ UMAÑA	Cormacarena Supervisora-Interventoria	ingrid.suarez@cormacarena.gov.co	
3	Gilberto Antonio Cubrera	Cormacarena Apoyo Supervisor	gilberto.cubrera@cormacarena.gov.co	
4	CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO	Representante La Macarena fase 2	ingcristhiansegura@gmail.com	
5	FELIX JAVIER MURUAGA GARZON.	DIRECTOR OBRA INTERVENTORIA	murugafélix@yahoo.es.	

Nota: Si se supera los 10 integrantes en la reunión, se debe eliminar el cuadro integrantes de la reunión y se anexa como soporte el F-GC-09 Listado de asistencia a reuniones y eventos

internos.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-10
	Versión: 11
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 20/Oct/2022

REUNIÓN O EVENTO:	Socialización Proyecto Cubarral Fase 2 – Construcción Interceptor Fase II.		
LUGAR:	Cubarral Fase 2 – Municipio Cubarral.		
RESPONSABLE:	Consorcio Cubarral Fase II		
FECHA:	15 de febrero de 2023.	HORA INICIO:	HORA FINAL:

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CICLO DE VIDA				GRUPO ÉTNICO							IDENTIDAD DE GÉNERO							GRUPOS EN CONDICIÓN ESPECIAL								ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Pueblos Indígenas	Gitano(as) Rrom	Raizal	Palenquero(a)	Negro(a)	Afrodescendiente	Ninguno	L	G	B	T	I	OTRO	Persona con discapacidad	Habitante de calle	Migrante y refugiado	Victima del conflicto armado	Comunidades campesinas y rurales	Personas en proceso de reincorporación	Ninguno					
1	Nancy Tenorio R																														nancyTe1969@Hotmail.com	3125466798	
2	Eliseo Romero																															1125136	
3	Eudoro Villarraga																														Eudoro Villarraga	3122415	
4	Cesar Julio Ortiz																															1769816 S	
5	María Corzo																															20795	
6	Ilsen Goodiana Bonilla	X																			X										RedesGoat@Hotmail.com	3133195333	
7	Luis orlando Velosco																															3114702682	
8	Victor Rodriguez	X																													rodriguezcarlos@gmail.com	3159255340	
9	Nubia Melo		X																										X			3232362	Nubia
10	Acereth Figueroa S.																												X	Concejo		313893 3656	
11	Héctor Elías MAZO	X																												Concejo		3186880839	
12	Almalora.																													Concejo		3123077601	
13	Rodrigo Serna	X																														3214257705	
14	Amarias Bastos																															3127980792	
15	Jose Perafan V																															3125083613	Jose

Identidad de género: (L: lesbiana, G: gay, B: bisexual, T: transgénero, I: intersexual)

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-10
	Versión: 11
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 20/Oct/2022

REUNIÓN O EVENTO:	(Construcción) Socialización Proyecto Construcción Interceptor Fase II		
LUGAR:	Municipio de Cubarral.		
RESPONSABLE:	Consorcio Cubarral Fase II		
FECHA:	15 FEBRERO 2023	HORA INICIO:	HORA FINAL:

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CICLO DE VIDA				GRUPO ÉTNICO						IDENTIDAD DE GÉNERO						GRUPOS EN CONDICIÓN ESPECIAL							ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Pueblos Indígenas	Gitano(as) Rrom	Raizal	Palenquero(a)	Negro(a)	Afrodescendiente	Ninguno	L	G	B	T	I	OTRO	Persona con discapacidad	Habitante de calle	Migrante y refugiado	Víctima del conflicto armado	Comunidades campesinas y rurales	Personas en proceso de reincorporación	Ninguno				
1	Rosalba Rojas		X				X							X														+			2·204533	
2	Juan Pinilla	X					X							X						X								X			3103014	
3	Nohra Perdomo.		X																												3142243123	
4	Horacio Africano G	X					X																								3147044466	
5	Carmen Solano		X				X																								3147044466	
6	Raúl Alfonso Arroyo	X				X																									314 244 2989	Raúl Arroyo
7	Anderson castellanos	X				X																									3219400825	
8	Michel ortiz.		X		X																							+			323 821 80 71	Michel ortiz.
9	Blanca Herrera																														3192065025	Blanca H
10	JOSE CHAPARRO																															JOSE
11	Luis Piñeros																														3214185584	
12	Giociomo Jorge																															Giociomo
13	Ernesto Mora																														3203528725	Ernesto
14	Olga Sanid zapata y.		X																												3123083847.	
15	EUKARIS TENORIO																														323-3230815	EUKARIS.

Identidad de género: (L: lesbiana, G: gay, B: bisexual, T: transgénero, I: intersexual)

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-10
	Versión: 11
REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES Y EVENTOS EXTERNOS	Fecha: 20/Oct/2022

REUNIÓN O EVENTO:	Socialización Proyecto Construcción Interceptor Fase II		
LUGAR:	Cubarral		
RESPONSABLE:	Consorcio Cubarral Fase II		
FECHA:	15 Febrero 2023	HORA INICIO:	HORA FINAL:

N.	NOMBRES Y APELLIDOS	GÉNERO		CICLO DE VIDA				GRUPO ÉTNICO							IDENTIDAD DE GÉNERO							GRUPOS EN CONDICIÓN ESPECIAL							ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO TELEFÓNICO	FIRMA
		Masculino	Femenino	Menores de 18 años	18 a 27 años	28 a 59 años	de 60 años en adelante	Pueblos indígenas	Gitano(as) Rrom	Raizal	Palenquero(a)	Negro(a)	Afrodescendiente	Ninguno	L	G	B	T	I	OTRO	Persona con discapacidad	Habitante de calle	Migrante y refugiado	Victima del conflicto armado	Comunidades campesinas y rurales	Personas en proceso de reincorporación	Ninguno				
1	Yohednny Alvarez																											Interventoría	yohednny Alvarez.	3115928910	
2	Gilberto A. Cubrera	X																										Cormacarena		3203037	
3	Ingrid J Suarez C		X																									Cormacarena	ingrid.suarez@cormacarena.gov.co	3708048126	
4	Ariel Santos Gonzá	X				X																					X	Consejo	luisarielsantos@gmail.com	3733072	
5	Erika Brigitte Triana		X			X																					X	Obra.	Erikatriana33@hotmail.com	3108900171	
6	HERNAN ANACONA	X				X																						CC Fase	ing.hernan.anacona@hotmail.com	320326 7889	HERNAN ANACONA
7	FELIX J. MURILLO	X				X																						Interventoría	murillofelix@yahoo.es.	315260 6338	
8																															
9																															
10																															
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

Identidad de género: (L: lesbiana, G: gay, B: bisexual, T: transgénero, I: intersexual)

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 2

FECHA DE REUNIÓN:	23-Febrero-2023		
LUGAR DE REUNIÓN:			
HORA DE INICIO:	9:30 am	HORA FINAL:	
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Ingrid Suarez		
CARGO:	Supervisora interventoria		
DEPENDENCIA:			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Comite de seguimiento técnico.

ORDEN DEL DÍA:

- Avance actividades en obra
- Presentación de informes mensuales
- Inicio de actividades del Paso Subfluvial.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se da inicio al comite de seguimiento técnico, en el cual la interventoria le manifiesta al contratista dar inicio en el menor tiempo posible a la construcción del Paso Subfluvial.

El contratista de obra indica que daran inicio al Paso Subfluvial aproximadamente el dia 6 de marzo 2023.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Así mismo, la interventoria y el contratista manifiestan que se realizara un balance detallado del Contrato, debido que se ve necesario realizar el Carcamo de Pozo a Pozo por una longitud de 33,84 mts.

Adicionalmente el contratista manifiesta que, a la fecha no ha llegado el suministro de tuberia, Para lo cual la interventoria amablemente solicita una certificación del Proveedor en el Cual indique el retraso de dicho suministro.

Por otra Parte, la supervisión indica que en el informe mensual de obra el interventoria, se deben describir cada una de las obligaciones descritas en la minuta de cada contrato.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Certificacion suministro tuberia		Consorcio Cubarral fase 2	2-marzo-2023
2	inicio actividades Paso subfluvial		Consorcio Cubarral fase 2.	6 marzo 2023
3				
4				
5				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	FELIX JAVIER MIRANDA GARZON.	DIRECTOR IUTEN.	infraestructuracolombiacasas@gmail.com	
2	Luis Cruz Romero	Director obra	Lucroom@yahoo.com	
3	JONATHAN DAVID SEGURA CASTRO	R.L CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	INGJONATHANSEGURA@gmail.com	
4	Ingrid Johanna Suarez Canaria	Cormacarena	ingrid.suarez@cormacarena.gov.co	
5	Jesús David Díaz Cortés	Residente Interventoría Infracol	ing.daviddiaz@hotmail.com	
6				

Nota: Si se supera los 10 integrantes en la reunión, se debe eliminar el cuadro integrantes de la reunión y se anexa como soporte el F-GC-09 Listado de asistencia a reuniones y eventos internos.

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

ACTA No. 2

FECHA DE REUNIÓN:	23 de febrero de 2023		
LUGAR DE REUNIÓN:	Cormacarena		
HORA DE INICIO:	9:15 am	**HORA FINAL:**	10:15 a.m.
DATOS DE QUIEN CONVOCA			
NOMBRE:	Ingrid Johanna Suárez Canaria - Supervisora Cto 27.22.1188		
CARGO:	Supervisora contrato interventoria Cto 2.7.22.1188		
DEPENDENCIA:	Subdirección Gestión Ambiental		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

Cómite técnico Avance Obra interceptor Fase II municipio de Cubarral.

ORDEN DEL DÍA:

- Revisión avance de obra y actividades realizadas.
- Revisión entrega de informes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- Siendo las 9:15 am se reunieron Director de Interventoría Felix Muruaga, residente de interventoría Jesus David Díaz Cortés, R.L. obra ingeniero Cristian Segura, ingeniero Luis Cruz director de obra, supervisora de Interventoria Ingrid Suárez, y se procede a realizar la revisión de planos del cárcamo del pozo sobrefluvial concluyendose que se contruirá de pozo a pozo 33.84m.
- R.L. de obra informa que no se ha dado inicio a

Powered by CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

las excavaciones debido a que no se cuente aun con la tubería en sitio de obra, se encuentren a la espera del despacho de la misma por parte de Gestor.

- Se informa por parte de P.I.L y director de obra que se llevó a cabo la colocación y replanteo durante el primer mes del contrato (a corte 22 de feb 2023)
- P.L. Cinsaurico Cubaral Fase II informa que se realizó la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal de 5 árboles que se encuentran dentro de la línea de trazado de la tubería, el día 20 de febrero 2023.

Powered by CamScanner

Cormacarena Somos vida, somos Meta	Código: F-GC-04
	Versión: 02
ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 04/Mar/2021

COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA DE LA REUNIÓN: (La acción de mejora es un compromiso que fortalece las actividades del proceso, respecto a requisitos de los clientes y entes de control.)


No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Cumplimiento de dora nord entrega de justificación de cortar por los retrasos en entrega de interventoría	Avance del contrato	R.L. Consorcio cubanal-fase II	a 12 de marzo de 2023
2				
3	Inicio construcción corcomo	Segun contrato.	R. consorcio cubanal-fase II.	el 6 de marzo de 2023
4				
5				
6				
7				

INTEGRANTES DE LA REUNIÓN				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	INGRID JOHANNA SUAREZ CANARIA	Supervisora	ingrid.suarez@cormacarena.gov.co	
2	Cristhian David Segura Castro	R.L. consorcio cubanal fase 2	ingcristhiansegura@gmail.com	
3	Luis Cruz R.	Director obra.	Lucruzm@yahoo.com	
4	FELIX MURCIA	DIRECTOR INTERVENTORIA	infraestructuracolombianasas@gmail.com	
5	Jesus David Diaz Cortes	Residente Interv	ing.daviddiaz@hotmail.com	

Powered by CamScanner

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL

PERIODO DE INFORME:	25 ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN MUNICIPIO CUBARRAL
CONTRATO DE OBRA:	1179 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
INTERVENTORIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S

ELABORÓ:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Ing,Ambiental Yhojann Ardila	

Powered by CamScanner

FECHA: 25 de enero al 24 febrero de 2023 **PERIODO:**25 de enero al 24 febrero de 2023


1. INTRODUCCIÓN

Las acciones del consorcio se han establecido con criterios de preservación de los componentes físicos, bióticos y social del área de influencia directa, instaurando los mecanismos de seguimiento a las medidas ambientales conforme a la normatividad aplicable con el fin de poder atender las contingencias que puedan surgir en el desarrollo del proyecto. Con el objetivo de dar cumplimiento a las medidas ambientales se realiza el presente documento Informe de Gestión Ambiental.

2. ALCANCE

El proyecto cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL – META el sector forma parte del departamento del Meta y la construcción de este proyecto está orientado a mejorar la red de alcantarillado sanitario La localización del proyecto general se puede observar en la Ilustración 1.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

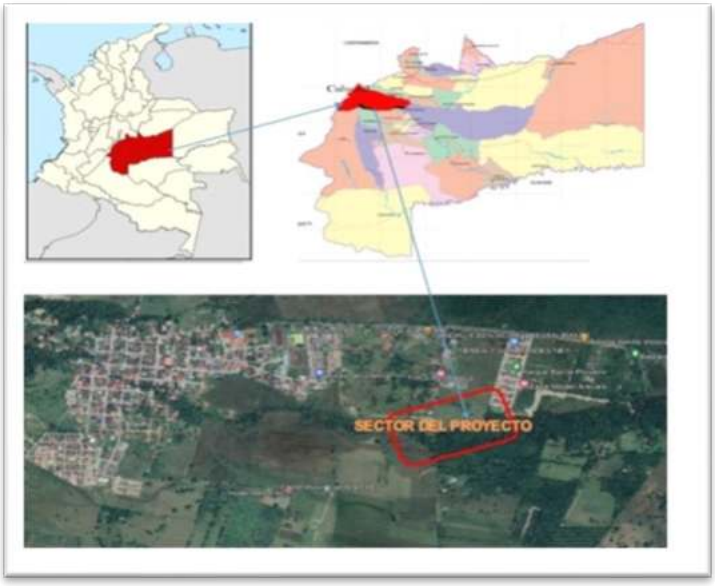

4. GESTION AMBIENTAL

En el periodo del 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023 se desarrollaron actividades de localización y replanteo. Esta actividad contempla la medición de distancias, cotas, alineamiento y localización de pozos como lo indican los planos de diseño con el uso de un equipo de topografía que incluye estación electrónica y mira (regla).

En esta actividad no se generaron efectos que repercuten en la generación de impactos o alteraciones frente al uso del suelo, cambios en el paisaje, ahuyentamiento o afectación a la fauna, intervención forestal o manejo de agua superficial. Por tanto, no se requirió de implementar medidas de prevención o control de impactos ambientales. por parte del consorcio Cubarral fase 2 contamos con la licencia ambiental aprobada para el proyecto



5. LICENCIA AMBIENTAL

esm logistica S.A.S

ESM LOG•STICA Certifica que ha realizado el servicio de env•o de la notificaci•n electr•nica, a trav•s de su sistema de registro de ciclo de comunicaci•n Emisor-Receptor. Seg•n lo consignado los registros el mensaje de datos presenta la siguiente informaci•n:

Id del mensaje	1oZKGD-00037Z-62
Mensaje enviado con estampa de tiempo	1663368993 - (2022-09-16 17:56:33)
Fecha de gestión	16/09/22 17:56:34
Remitente	Notificaciones Cormacarena
Correo remite	notificaciones@cormacarena.gov.co
Destinatario	MUNICIPIO DE CUBARRAL
Enviado a	contactenos@cubarral-meta.gov.co
Entregado a	contactenos@cubarral-meta.gov.co
Ip Remite	104.225.217.156
Tamaño	4.596.430
Asunto	Notificación Resolución N° PS-GJ. 1.2.6.22.1355 del 15/09/2022 Expediente N° 3.37.3.022.090
Achivos adjuntos	["RESOLUCION 1355 EXP 3.37.3.022.090.pdf"]
transport is remote	0
Servidor que recibe	aspmx.l.google.com
Ip de destino	172.253.117.27
router	archive_outgoing_email
Estado actual	Ha sido leido el correo
Fecha de evento	16/09/22 17:56:33
Mensaje	Archivado
sender	notificaciones@cormacarena.gov.co
transport	archiver_outgoing
Enviado desde	esmlogistica.com
Fecha de leido Hora GMT (5 horas por delante de Colombia)	19/09/22 10:44:27

Elaborado por:

ING. YOHJANN ARDILA ESCOBAR
Profesional Ambiental

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DE INFORME:	25 ENERO DE 2023 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 2 EN MUNICIPIO CUBARRAL
CONTRATO DE OBRA:	1179 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
INTERVENTORIA:	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S

ELABORÓ:		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA**
Cristyan Hernández	Profesional en Salud Ocupacional	

1. INTRODUCCION

El CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 evidencia bajo controles administrativos y operativos que permitan registrar las acciones de control, prevención, intervención y mejora continua contratadas ya que se tiene como principio la prevención y control de peligros en materia de seguridad y salud en el trabajo que se puedan generar en dichas actividades, con el propósito de salvaguardar el bienestar y salud de sus trabajadores y la calidad del proyecto a través de dinamismos en función de los lineamientos legales y del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que disminuyan la probabilidad de materialización de peligros y el riesgo de accidentalidad y enfermedad laboral.

El presente informe da a conocer la gestión en seguridad y salud en el trabajo desarrollada durante el periodo de enero 25 de al 24 de febrero del 2023. Dicha gestión es documentada para evidenciar las acciones de control, prevención y de mejora ejecutadas de acuerdo con las actividades de obra desarrolladas durante el mes, las cuales consisten en actividades desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetación situado en el alineamiento de localización y replanteo y elaboración de actas de vecindad.

2. OBJETIVO GENERAL

Definir la metodología para la ejecución de actividades de formación y capacitación al personal brindando los conocimientos necesarios los cuales sean aplicados y evidenciados en el desarrollo de las actividades asignadas, logrando así la disminución de ocurrencia de un accidente y/o incidente de trabajo el cual incremente la tasa de accidentalidad que hasta el momento se mantiene en 0% en el Consorcio Cubarral fase 2

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Dar cumplimiento a los lineamientos del contrato de obra No. 1179 de 2022.
- Inspeccionar y controlar el personal profesional, técnico y operativo, equipos, maquinaria, herramientas y elementos de seguridad industrial usados para el desarrollo de actividades de obra.
- Implementar y supervisar recursos y procedimientos de trabajo seguro para actividades de alto riesgo.
- Presentar los soportes de cumplimiento de parámetros SST.

3. RELACIÓN DE PERSONAL VINCULADO AL CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

El siguiente listado corresponde a las personas vinculadas al consorcio durante el mes de enero y febrero:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CÉDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				FECHA INGRESO	No. PILA
				ARL	EPS	AFP	CCF		
1	LUIS CRUZ ROMERO	30083437	DIRECTORA DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR	NA	.1-02-2023	9446633919
2	HILBER HERNAN ANACONA	86059532	RESIDENTE DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	9446940698
3	ERIKA TRIANA BOBADILLA	1121883802	INSPECTOR DE OBRA	SURA	SANITAS	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	9446940698
4	CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ	1121900390	PROFESIONAL SST	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	9446940698
5	YHOJANN ARDILA ESCOBAR	86056774	PROFESIONAL AMBIENTAL	SURA	CAJACOPI	PROTECCIÓN	NA	.1-02-2023	9446633919
7	CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO	1121926457	INGENIERÍA ADMINISTRATIVO	SURA	NUEVA EPS	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	9446940698
8	RUPERTO VARGAS HERRERA	3140510	CADENERO	SURA	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	COFREM	.1-02-2023	N/A
9	ALEX EDILSON GUALTEROS	86011617	OFICIAL DE OBRA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	N/A
10	JORGE MAURICIO MORENO	74281436	OFICIAL DE OBRA	SURA	SALUD TOTAL	PORVENIR	COFREM	.1-02-2023	N/A

Ver Anexo 1. Copia de documentos de identificación.

OBSERVACIÓN: La Ingeniera **Useche Wanda** identificada con el **CC 1121943244** reviso y verifico la documentación entregada del área de SST, fue reemplazada por el Ingeniero SST Cristyan Hernández, cabe resaltar que las ultimas 3 personas en el listado del personal anteriormente mencionado, ingresaron en el periodo de 04 de febrero de 2023 al 24 de febrero de 2023, por tanto, no tiene a la fecha el pago de seguridad social y se debe realizar al mes vencido. (En el siguiente informe se anexará).

4. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA USADA EN OBRA

La siguiente tabla corresponde a la relación de equipos usados para actividades de obra:

TIPO	MODELO	CANTIDAD
Equipo de topografía (estación electrónica, mira)	N/A	1

5. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS

Durante este periodo (enero y febrero 2023) se continuaron actividades de localización y replanteo y levantamiento de actas de vecindad.





Actividades de obra: Actividad de localización y replanteo y levantamiento de actas de vecindad.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST REALIZADAS

Durante el periodo de (enero 25 al 24 de febrero de 2023 se realizaron las siguientes actividades:

➢ EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso se realizaron de acuerdo al cargo y/o funciones a desarrollar en el proyecto.

Ver Anexo 2. Resultado de exámenes médicos ocupacionales.

➢ AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Previo al inicio de actividades el personal vinculado al **Consorcio Cubarral fase 2** fue afiliado al sistema de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP y CCF) y se realizaron los pagos correspondientes para el periodo comprendido entre 24 de enero de 2023 al 25 de febrero de 2023

Ver Anexo 3. Planillas de liquidación de aportes.

➢ INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST-A

El personal contratado fue capacitado a través de inducción SST-A, en los siguientes temas:

- Presentación general del consorcio.
- Políticas en SST, prevención de consumo de alcohol y drogas, seguridad vial y ambiental.
- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Protocolo de Bioseguridad COVID-19.

- Plan de emergencia y procedimientos de respuesta ante emergencias y AT.
- COPASST y Comité de convivencia laboral.
- Responsabilidades SST.
- EPP.
- Peligros y riesgo en el puesto de trabajo.
- Prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Normas de saneamiento básico y Manejo ambiental.

Ver Anexo 4. Registro de Inducción SST-A













Inducción SST-A: Capacitación en inducción en SST y Ambiental.

- **ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES SST**

Se divulgó las responsabilidades específicas y de acuerdo al cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el SG-SST a través del proceso de inducción.

Ver Anexo 4. Registro de Compromiso de SST.

- **ENTREGA E INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Al personal contratado se les suministró durante el periodo de enero y febrero de 2023 el vestuario idóneo y los elementos de protección personal conforme al cargo y las funciones asignadas, como se evidenció en el informe SST de ese periodo. Debido a las actividades de obra desarrolladas durante este periodo (enero y febrero -2023) no se requirió de reposición o recambio de EPP.

- **PROTOCOLO COVID-19**

Entre las medidas de bioseguridad y autocuidado recomendadas por la OMS y el gobierno nacional, está la vacunación contra el COVID-19; por lo cual durante la inducción SST se recalcó la importancia de vacunarse y cumplir con las normas de bioseguridad a fin de disminuir la transmisión del virus y el impacto de la sintomatología relacionada con la enfermedad.

- **CHARLAS PREOPERACIONALES**

El objetivo es brindar a los trabajadores herramientas adecuadas para ser aplicadas en el desarrollo de sus actividades cotidianas y así lograr disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente/incidente o el desarrollo de una enfermedad laboral Obtener conocimientos sobre los impactos ambientales y riesgos específicos a los que están expuestos los trabajadores y la forma de minimizarlos y/o controlarlos.


Ver Anexo 4. Registro de Inducción SST-A

- **REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENDE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES**

Durante el periodo de enero y febrero de 2023 no hubo ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. De igual forma no hubo reportes de personas con sintomatología relacionada al COVID-19.


- **FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD**

FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD											
*(No. Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/No. Trabajadores en el mes)*100*											
Frecuencia de accidentalidad	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
No. Accidentes	0	0									
No. Trabajadores	9	9									
Porcentaje de accidentalidad	0%	0%									
Interpretación											

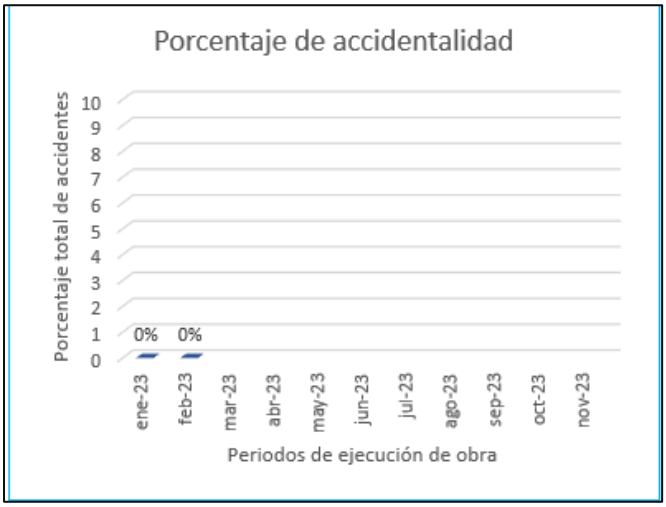

➢ ESTADISTICAS DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

FORMULA AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA											
ías de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/No. Días de trabajo programadas en el mes											
Frecuencia de ausentismo	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
No. Ausencias	0	0									
No. Días de trabajo	0	28									
Porcentaje de Ausentismo	0%	0%									
Interpretación mensual											

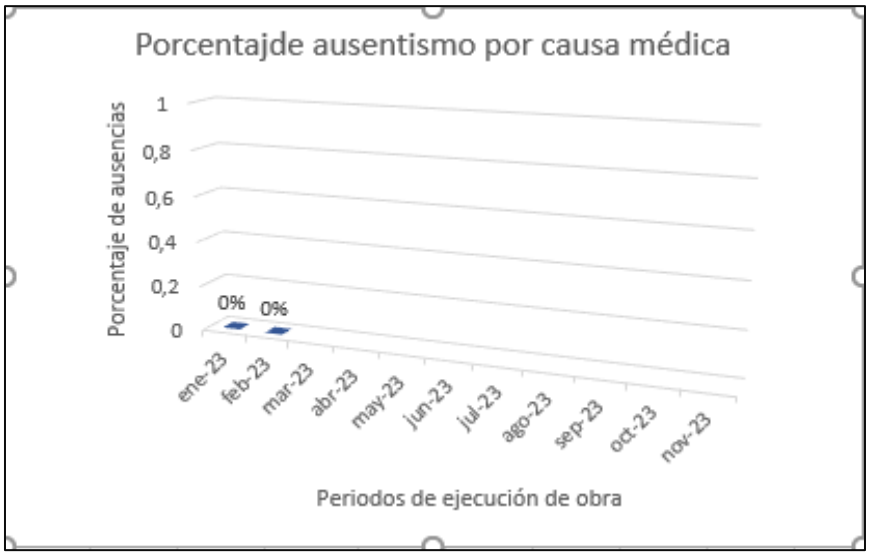

7. ANEXOS

Anexo 1. Copia de documentos de identificación.

Anexo 2. Resultado de exámenes médicos ocupacionales.

Anexo 3. Planillas de liquidación de aportes.

Anexo 4. Registro de Inducción SST-A.

Anexo 5. Registro de Compromiso de SST.

Anexo 6. Registro de asistencia

Anexo 7. Registro de ATS (análisis de trabajo seguro)

Anexo 8. Registro de relación de personal

Anexo 9. Hojas de vida del personal

4. RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA USADA EN OBRA

La siguiente tabla corresponde a la relación de equipos usados para actividades de obra:

TIPO	MODELO	CANTIDAD
Equipo de topografía (estación electrónica, mira)	N/A	1

5. ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS

Durante este periodo 31 enero de 2023 al 24 de febrero de 2023, se da inicio a las actividades de desmonte y limpieza de rastrojo para remover el material de vegetación situado en el alineamiento, localización y replanteo y levantamiento de actas de vecindad.



Actividad de localización y replanteo
Fuente: Propia



Levantamiento de actas de vecindad.
Fuente: Propia

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST REALIZADAS

Durante el periodo de enero 25 al 24 de febrero de 2023 se realizaron las siguientes actividades dándole cumplimiento a los reglamentos del área de seguridad y salud en el trabajo por parte del consorcio **Cubarral fase 2:**

➢ EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES

Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso se realizaron de acuerdo al cargo y/o funciones a desarrollar en el proyecto.

Ver Anexo 2. Resultado de exámenes médicos ocupacionales.

➢ AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Previo al inicio de actividades el personal vinculado al **Consorcio Cubarral fase 2** fue afiliado al sistema de seguridad social integral (ARL, EPS, AFP y CCF) y se realizaron los pagos correspondientes para el periodo del mes de enero de 2023

Ver Anexo 3. Planillas de liquidación de aportes.

➢ INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SST-A

El personal contratado fue capacitado a través de inducción SST-A, en los siguientes temas:

- Presentación general del consorcio.
- Políticas en SST, prevención de consumo de alcohol y drogas, seguridad vial y ambiental.

- Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- Protocolo de Bioseguridad COVID-19.
- Plan de emergencia y procedimientos de respuesta ante emergencias y AT.
- COPASST y Comité de convivencia laboral.
- Responsabilidades SST.
- EPP.
- Peligros y riesgo en el puesto de trabajo.
- Prevención de accidentes y enfermedades laborales.
- Normas de saneamiento básico y Manejo ambiental.

Ver Anexo 4. Registro de Inducción SST-A



Capacitación e inducción en SST
Fuente: Propia



Capacitacion y socializacion en SST
Fuente: Propia









Entrega de dotacion y charlas preoperacionales
Fuente: propia

- **ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES SST**

Se divulgó las responsabilidades específicas y de acuerdo al cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo establecidas en el SG-SST a través del proceso de inducción.

Ver Anexo 4. Registro de Compromiso de SST.

- **ENTREGA E INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Al personal contratado se les suministró durante el periodo de 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023 el vestuario idóneo y los elementos de protección personal conforme al cargo y las funciones asignadas, como se evidenció en el informe SST de ese periodo. Debido a las actividades de obra desarrolladas durante este periodo de 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023 no se requirió de reposición o recambio de EPP.

- **PROTOCOLO COVID-19**

Entre las medidas de bioseguridad y autocuidado recomendadas por la OMS y el gobierno nacional, está la vacunación contra el COVID-19; por lo cual durante la inducción SST se recalcó la importancia de vacunarse y cumplir con las normas de bioseguridad a fin de disminuir la transmisión del virus y el impacto de la sintomatología relacionada con la enfermedad.

- **CHARLAS PREOPERACIONALES**

  - Brindar a los trabajadores herramientas adecuadas para ser aplicadas en el desarrollo de sus actividades cotidianas y así lograr disminuir la probabilidad de ocurrencia de un accidente/incidente o el desarrollo de una enfermedad laboral Obtener conocimientos sobre los impactos ambientales y riesgos específicos a los que están expuestos los trabajadores y la forma de minimizarlos y/o controlarlos.


Ver Anexo 4. Registro de Inducción SST-A

- **REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENDE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES**

Durante el periodo de 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023 no hubo ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo ni enfermedades laborales. De igual forma no hubo reportes de personas con sintomatología relacionada al COVID-19.

➢ FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD


FORMULA FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD											
*(No. Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes/No. Trabajadores en el mes)*100*											
Frecuencia de accidentalidad	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
No. Accidentes	0	0									
No. Trabajadores	9	9									
Porcentaje de accidentalidad	0%	0%									
Interpretación											

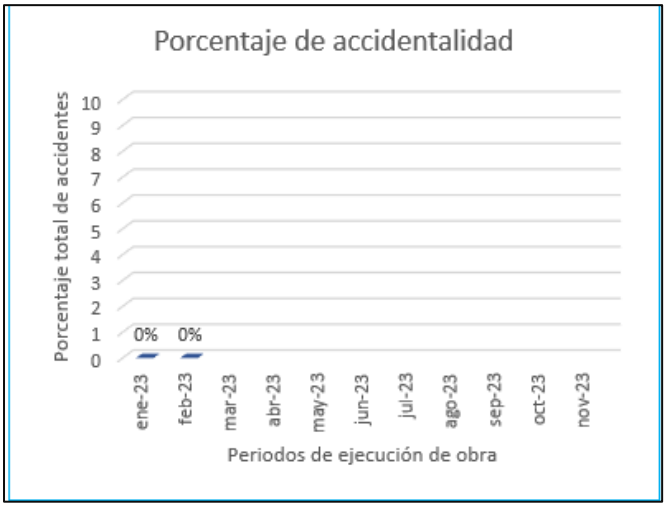

El porcentaje de accidentalidad es del 0% en el periodo de enero 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023.

➢ ESTADISTICAS DE AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

FORMULA AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA											
ías de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes/No. Días de trabajo programadas en el mes											
Frecuencia de ausentismo	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23
No. Ausencias	0	0									
No. Días de trabajo	0	28									
Porcentaje de Ausentismo	0%	0%									
Interpretación mensual											

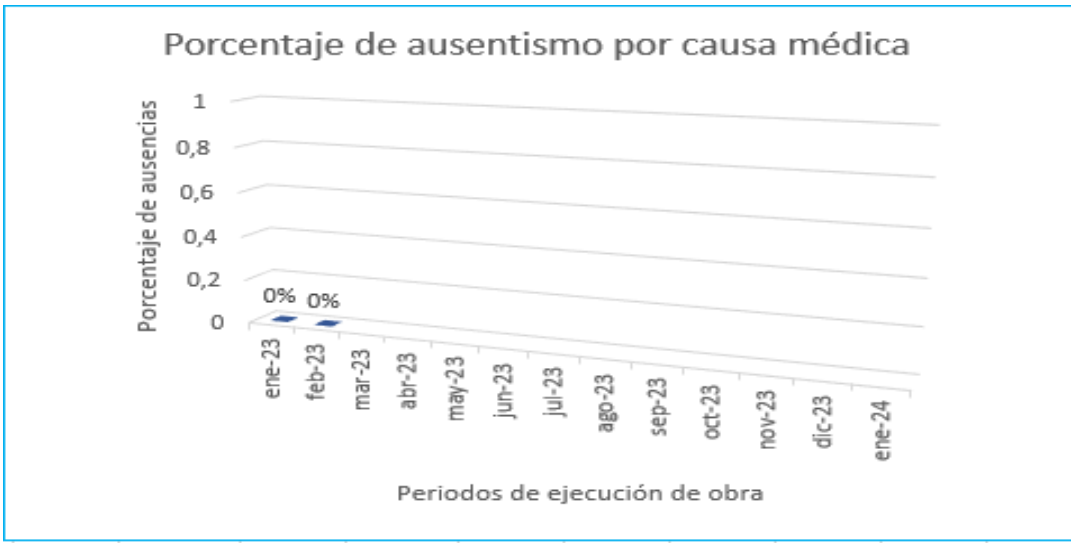

El porcentaje de ausentismo por causa medica es del 0% en el periodo de 25 de enero de 2023 al 24 de febrero de 2023

7. ANEXOS

Anexo 1. Copia de documentos de identificación.

Anexo 2. Resultado de exámenes médicos ocupacionales.

Anexo 3. Planillas de liquidación de aportes.

Anexo 4. Registro de Inducción SST-A.

Anexo 5. Registro de Compromiso de SST.

Anexo 6. Registro de asistencia

Anexo 7. Registro de ATS (análisis de trabajo seguro)

Anexo 8. Registro de relación de personal

Anexo 9. Hojas de vida del personal



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.304.920
CRUZ ROMERO

APELLIDOS
LUIS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1951
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

03-SEP-1973 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-5200100-00441549-M-0017304920-20130619 0033501099A 1 38581893

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **86.059.532**

ANACONA ROA

APELLIDOS

HILBER HERNAN

NOMBRES

HERNAN ANACONA ROA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1978**

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

04-ABR-1997 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-5200100-00172661-M-0086059532-20090825 0015946944A 1 6760028696

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.883.802

TRIANA BOBADILLA

APELLIDOS

ERIKA BRIGITTE

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 03-ENE-1992

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

07-ENE-2010 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200100-00825181-F-1121883802-20160512 0049741285A 2 6723910817

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.121.900.390**

HERNANDEZ MENDEZ

APELLIDOS

CRISTYAN DEYFER

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAY-1993**

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

03-JUN-2011 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5200100-01118151-M-1121900390-20191210 **0069**203048A 2 6735741099


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
86.056.744
NUMERO
ARDILA ESCOBAR
APELLIDOS
YHOJANN
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 18-OCT-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
31-JUL-1996 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-5200100-69137281-M-0086056744-20051003
00666 05276N 02 188733311

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.926.457
SEGURA CASTRO

APELLIDOS
CRISTHIAN DAVID

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1995
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-SEP-2013 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



P-5200100-00480539-M-1121926457-20131009 0035370560A 1 40408524

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 3.140.510
VARGAS HERRERA
APELLIDOS
RUPERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-MAR-1967
QUETAME
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

30-MAY-1987 QUETAME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-5200500-00967643-M-0003140510-20180105 0059094151A 2 7214714355

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **86.011.617**

GUALTEROS PEÑA

APELLIDOS

ALEX EDILSON

NOMBRES

Alex Gualteros

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1978**

VISTA HERMOSA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-JUN-1998 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5206000-01265638-M-0086011617-20211112 0076367054A 1 8503367413

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 74.281.436

MORENO

APELLIDOS

JORGE MAURICIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-JUL-1971

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

27-JUL-1991 GUATEQUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-0013060-M-0074281436-20081122 0006679147A 2 6730012919

INTEGRAR
salud y seguridad

No. Identificación	901200839-9
Dirección:	CALLE 15 N° 37L 10 ET 8 B. ESPERANZA
Telefono:	6668018-3176678051
Email:	gerencia@integrarips.com

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en ANEXO OSTEOMUSCULAR

Información General



Fecha impresión:	VILLAVICENCIO - 2023/01/25	Nro Ingreso:	20230125020113
Paciente:	LUIS CRUZ ROMERO	CC:	17304920
Edad:	71 años	Nombre Cliente:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	Ingreso
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Convenio:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Origen:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	Destino:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Fecha Atención:	2023-01-25 07:43:00		

Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS **LABORATORIO CLINICO** **COMPLEMENTARIOS** **VACUNAS**

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	SIN OBSERVACIÓN
ENFASIS - ANEXO OSTEOMUSCULAR:	Definicion de caso para el SVE desordenes Osteomusculares **CASO DESCARTADO**

Recomendaciones Generales

- [x] Examen Periodico Ocupacional
- [x] Pausas Activas
- [x] Higiene Postural
- [ ] Realizacion Pruebas Complementarias
- [x] Uso de E.P.I.
- [ ] Remitir a EPS
- [ ] Continuar Manejo Medico

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Recomendaciones Específicas

HABITOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA MINIMO 1 HORA DIARIA TRES VECES POR SEMANA. USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL.

Autorizo la realización de exámenes ocupacionales según consentimiento informado y política de protección de datos diligenciadas en el autoreporte de condiciones de salud que previamente firme. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraida del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S..

Profesional Ocupacional: RUBEN IVAN MARTINEZ LOBO 0
Registro M.D: 688591999
Licencia S.O: 2407-21

Firma del Paciente: LUIS CRUZ ROMERO
Identificacion: CC - 17304920

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO ANEXO CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

Fecha de impresión: 2023/02/04 06:39:40 am

TIPO DE EXAMEN : INGRESO
FECHA DE EXAMEN : 2023-01-20 07:20:20
CIUDAD : VILLAVICENCIO



DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 - LCR	**CARGO**	RESIDENTE DE OBRA
CONTRATISTA	LCR		

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres	HILBER HERNAN							
Apellidos	ANACONA ROA							
Identificación	CC	86059532	**Telefonos**	3203267889	**Genero**	M	**Edad**	44 Años
Correo Electronico:	ING.HERNAN.ANACONA@HOTMAIL.COM							

1. EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN AUDIOMETRIA	EXAMEN VISIOMETRIA	EXAMEN ESPIROMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	ANEXOS	GLUCOSA

2. CONCEPTO DE APTITUD

CUMPLE REQUISITOS NECESARIOS PARA OCUPAR EL CARGO	

3. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

SE SUGIERE ACATAR RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA DISMINUCION DE PROPAGACION DE COVID-19;EN EL MOMENTO NIEGA SINTOMATOLOGIA COVID 19.BAJAR DE PESO, VALORACION NUTRICION IMC 30, USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA

4. IDONEIDAD

PARA EL PRESENTE CONCEPTO DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO SOLO SE CALIFICAN LAS SIGUIENTES IDONEIDADES:

IDONEO PARA TRABAJO EN ALTURAS	APTO PARA ESTE CARGO
IDONEO PARA MANIPULACION CARGAS	SI

5. RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

RECOMENDACIONES	Higiene postural
RECOMENDACIONES	Induccion al cargo
RECOMENDACIONES	Utilizacion EPP
SEGUN IMC	Ejercicio regular
SEGUN IMC	habitos de vida saludables
SEGUN IMC	Bajar de Peso
SEGUN IMC	Valoracion EPS / Nutricion
RECOMENDACIONES	Remisión a EPS
INCLUSION A SVE	SVE (Auditivo)

"El examinado certifica que no omitió dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Dr. Giovanni L. Sanguino
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic 5.0 4783

HERNAN ANACONA

Dr. GIOVANNI LEONARDO SANGUINO DELGADO
MEDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 4783

HILBER HERNAN
CC 86059532
Firma del trabajador evaluado



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO ANEXO CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

Fecha de impresión: 2023/02/04 06:37:36 am

TIPO DE EXAMEN : INGRESO
FECHA DE EXAMEN : 2023-01-20 08:39:44
CIUDAD : VILLAVICENCIO



DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 - LCR	**CARGO**	INSPECTOR DE OBRA
CONTRATISTA	LCR		

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres	ERIKA BRIGITTE							
Apellidos	TRIANA BOBADILLA							
Identificación	CC	1121883802	**Telefonos**	3108830079	**Genero**	F	**Edad**	31 Años
Correo Electronico:	ERIKATRIANA33@HOTMAIL.COM							

1. EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN ESPIROMETRIA	EXAMEN VISIOMETRIA	EXAMEN AUDIOMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	ANEXOS	GLUCOSA

2. CONCEPTO DE APTITUD

CUMPLE REQUISITOS NECESARIOS PARA OCUPAR EL CARGO	

3. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

SE SUGIERE ACATAR RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA DISMINUCION DE PROPAGACION DE COVID-19;EN EL MOMENTO NIEGA SINTOMATOLOGIA COVID 19. USO DE CORRECION VISUAL , BAJAR DE PESO

4. IDONEIDAD

PARA EL PRESENTE CONCEPTO DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO SOLO SE CALIFICAN LAS SIGUIENTES IDONEIDADES:

IDONEO PARA MANIPULACION CARGAS	SI

5. RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

RECOMENDACIONES	Higiene postural
RECOMENDACIONES	Induccion al cargo
RECOMENDACIONES	Utilizacion EPP
SEGUN IMC	Ejercicio regular
SEGUN IMC	habitos de vida saludables
SEGUN IMC	Bajar de Peso
VACUNAS COVID 19	2da Dosis

"El examinado certifica que no omitió dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Dr. Giovanni L. Sanguino
Medico Especialista en Salud Ocupacional
Lic SO 4783

Dr. GIOVANNI LEONARDO SANGUINO DELGADO
MEDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 4783

ERIKA BRIGITTE
CC 1121883802
Firma del trabajador evaluado

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO ANEXO CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

Fecha de impresión: 2023/02/04 06:38:16 am

TIPO DE EXAMEN : INGRESO
FECHA DE EXAMEN : 2023-01-19 08:37:42
CIUDAD : VILLAVICENCIO



DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 - LCR	**CARGO**	PROFESION SST
CONTRATISTA	LCR		

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres	CRISTYAN DEYFER							
Apellidos	HERNANDEZ MENDEZ							
Identificación	CC	1121900390	**Telefonos**	3156486666	**Genero**	M	**Edad**	29 Años
Correo Electronico:	CRISTIANHERNANDEZ3105@GMAIL.COM							

1. EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN ESPIROMETRIA	EXAMEN VISIOMETRIA	EXAMEN AUDIOMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	ANEXOS	GLUCOSA

2. CONCEPTO DE APTITUD

APTO CON RECOMENDACIÓN MÉDICO LABORAL	

3. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

SE SUGIERE ACATAR RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA DISMINUCION DE PROPAGACION DE COVID-19;EN EL MOMENTO NIEGA SINTOMATOLOGIA COVID 19. USO DE CORRECION VISUAL, MANEJO DE CARGAS DENTRO DE LIMITES PERMISIBLES, CONTROL POR PROGRMA DE CRONICOS DE EPS

4. IDONEIDAD

PARA EL PRESENTE CONCEPTO DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO SOLO SE CALIFICAN LAS SIGUIENTES IDONEIDADES:

IDONEO PARA TRABAJO EN ALTURAS	APTO PARA ESTE CARGO
IDONEO PARA MANIPULACION CARGAS	SI

5. RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

RECOMENDACIONES	Higiene postural
RECOMENDACIONES	Induccion al cargo
RECOMENDACIONES	Utilizacion EPP
SEGUN IMC	Ejercicio regular
SEGUN IMC	habitos de vida saludables
VACUNAS COVID 19	2da Dosis

"El examinado certifica que no omitió dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Dr. Giovanni L. Sanguino
Medico Especialista en Salud Ocupacional
Lic SO 4783

Dr. GIOVANNI LEONARDO SANGUINO DELGADO
MEDICO ESP. SALUD OCUPACIONAL
LIC SO 4783

CRISTYAN DEYFER
CC 1121900390
Firma del trabajador evaluado

INTEGRAR
salud y seguridad

No. Identificación	901200839-9
Dirección:	CALLE 15 Nº 37L 10 ET 8 B. ESPERANZA
Telefono:	6668018-3176678051
Email:	gerencia@integrarips.com

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en ANEXO OSTEOMUSCULAR

Información General

Fecha impresión:	VILLAVICENCIO - 2023/01/25	Nro Ingreso:	20230125020111
Paciente:	YHOJANN ARDILA ESCOBAR	CC:	86056744
Edad:	45 años	Nombre Cliente:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	Ingreso
Cargo:	INGENIERO AMBIENTAL	Convenio:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Origen:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	Destino:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Fecha Atención:	2023-01-25 07:46:19		



Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS **LABORATORIO CLINICO** **COMPLEMENTARIOS** **VACUNAS**

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	SIN OBSERVACIÓN
ENFASIS - ANEXO OSTEOMUSCULAR:	Definicion de caso para el SVE desordenes Osteomusculares **CASO DESCARTADO**

Recomendaciones Generales

- [x] Examen Periodico Ocupacional
- [x] Pausas Activas
- [x] Higiene Postural
- [ ] Realizacion Pruebas Complementarias
- [x] Uso de E.P.I.
- [ ] Remitir a EPS
- [ ] Continuar Manejo Medico

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Recomendaciones Específicas

HABITOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA MINIMO 1 HORA DIARIA TRES VECES POR SEMANA. USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL.

Autorizo la realización de exámenes ocupacionales según consentimiento informado y política de protección de datos diligenciadas en el autoreporte de condiciones de salud que previamente firme. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S..

Profesional Ocupacional: RUBEN IVAN MARTINEZ LOBO 0
Registro M.D: 688591999
Licencia S.O: 2407-21

Firma del Paciente: YHOJANN ARDILA ESCOBAR
Identificacion: CC. - 86056744

Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

Powered by CamScanner

INTEGRAR
salud y seguridad

No. Identificación	901200839-9
Dirección:	CALLE 15 N° 37L 10 ET 8 B. ESPERANZA
Telefono:	6668018-3176678051
Email:	gerencia@integrarips.com

CERTIFICADO MÉDICO DE APTITUD LABORAL con enfasis en ANEXO OSTEOMUSCULAR

Información General

Fecha impresión:	VILLAVICENCIO - 2023/01/25	Nro Ingreso:	20230125020117
Paciente:	CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO	CC:	1121926457
Edad:	27 años	Nombre Cliente.	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Género:	Masculino	Tipo Evaluación:	Ingreso
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL	Convenio:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Origen:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	Destino:	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2
Fecha Atención:	2023-01-25 08:27:36		



Pruebas de Apoyo Diagnóstico

PARACLINICOS **LABORATORIO CLINICO** **COMPLEMENTARIOS** **VACUNAS**

Certificacion de Aptitud

CONCEPTO - EXAMEN INGRESO:	APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO
OBSERVACIONES AL CONCEPTO:	SIN OBSERVACIÓN
ENFASIS - ANEXO OSTEOMUSCULAR:	Definicion de caso para el SVE desordenes Osteomusculares **CASO DESCARTADO**

Recomendaciones Generales

- [x] Examen Periodico Ocupacional
- [x] Pausas Activas
- [x] Higiene Postural
- [ ] Realizacion Pruebas Complementarias
- [x] Uso de E.P.I.
- [ ] Remitir a EPS
- [ ] Continuar Manejo Medico

Recomendaciones Ocupacionales Preventivas

Recomendaciones Específicas

HABITOS DE VIDA SALUDABLE, ALIMENTACION BALANCEADA. REALIZAR ACTIVIDAD FISICA MINIMO 1 HORA DIARIA TRES VECES POR SEMANA. USO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y DE PROTECCION PERSONAL.

Autorizo la realización de exámenes ocupacionales según consentimiento informado y política de protección de datos diligenciadas en el autoreporte de condiciones de salud que previamente firme. La firma del paciente referida en este documento es imagen extraída del consentimiento informado y política de protección de datos diligenciada y firmada por cada paciente antes de ingresar a la atención donde nos autoriza a practicarle los exámenes médicos y paraclínicos correspondientes. La imagen de firma del paciente certifica que se presento y diligencio el documento de consentimiento informado el cual reposa en los archivos de INTEGRAR SALUD Y SEGURIDAD S.A.S..

Profesional Ocupacional: RUBEN IVAN MARTINEZ LOBO 0
Registro M.D: 688591999
Licencia S.O: 2407-21

Firma del Paciente: CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
Identificacion: CC. - 1121926457


Todos los derechos reservados - www.innovasoftcol.com

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD FORMATO ANEXO CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

Fecha de Impresión: 2023/03/11 09:29:56 am

TIPO DE EXAMEN : INGRESO
FECHA DE EXAMEN : 2023-02-27 09:53:22
CIUDAD : VILLAVICENCIO



DATOS EMPRESA

RAZON SOCIAL	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2 - LCR	CARGO	TOPOGRAFO
CONTRATISTA	LCR		

IDENTIFICACION DEL PACIENTE

Nombres	RUPERTO							
Apellidos	VARGAS HERRERA							
Identificación	CC	3140510	Telefonos	3209107003	Genero	M	Edad	56 Años

1. EXAMENES REALIZADOS

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	EXAMEN ESPIROMETRIA	EXAMEN VISIOMETRIA
EXAMEN AUDIOMETRIA	ANEXOS	

2. CONCEPTO DE APTITUD

CUMPLE REQUISITOS NECESARIOS PARA OCUPAR EL CARGO	

3. RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

RECOMENDACIONES OCUPACIONALES

SE SUGIERE ACATAR RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL PARA LA DISMINUCION DE PROPAGACION DE COVID-19,EN EL MOMENTO NIEGA SINTOMATOLOGIA COVID 19. USO DE CORRECION VISUAL Y DOBLE PROTECCION AUDITIVA

4. IDONEIDAD

PARA EL PRESENTE CONCEPTO DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO SOLO SE CALIFICAN LAS SIGUIENTES IDONEIDADES:

IDONEO PARA MANIPULACION CARGAS	SI

5. RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

RECOMENDACIONES	Higiene postural
RECOMENDACIONES	Induccion al cargo
RECOMENDACIONES	Utilizacion EPP
SEGUN IMC	Ejercicio regular
SEGUN IMC	habitos de vida saludables
SEGUN IMC	Bajar de Peso
SEGUN IMC	Valoraciun EPS / Nutricion
RECOMENDACIONES	Remisión a EPS
INCLUSION A SVE	SVE (Auditivo)
VACUNAS COVID 19	2da Dosis

"El examinado certifica que no omitió dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud y que toda la información expresada en este documento es cierta"

Dr. Giovanni L. Sanguino
Médico Especialista en Salud Ocupacional
Lic. S.O. 4783

Powered by CamScanner

H.S&E

Nit. 900.758.801-1

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

CLL 15 No. 15- 81 Tel. 650 1313 Cel. 313 875 6668
hsesaludocupacional1@gmail.com - Granada - Meta.

SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL

De acuerdo al decreto 2346 de 2007, se certifica por parte del trabajador, que todos los datos consignados en la historia ocupacional y medica, son veridicos. Se autoriza informar a la empresa, las conclusiones generales del estado de salud de la población examinada, información que sera consignada en el diagnostico de salud de la empresa a la cual pertenezca, y se utilizara para el cumplimiento de los subprogramas (Art. 18) de medicina preventiva y del trabajo según el Art. 10 de la resolución 1016 de 1989, o la norma que la modifique, adicione o sustituya

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No. Identificación
Gualtero	Peña	Alex Edilson	86011617

Edad	Cargo		Día	Mes	Año
45	Oficial de obra	Consorcio Cubarral	23	01	2023

Tipo de Examen: Ingreso [X] Periódico [ ] Cambio de Labor [ ] Retiro [ ] Reingreso [ ] Otro _____

EXÁMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Optometria	X	Laboratorio Clinico		Frotis / Cultivo garganta		Colesterol	X	Pinaso trabajo en alturas	X
Visiometria	X	Hemoclasificacion		SGPT		Trigliceridos	X	Espacios confinados	
Audiometria	X	C. Hematico - Plaquetas	X	SGOT		HDL		Tunnel del Carpo	
Espirometria	X	Glicemia	X	Baciloscopia		LDL	X	Osteomuscular	X
EKG		P. de Orina		Creatinina		Alcohol		Actividades alto riesgo	
Rx Columna		Coprologico		Colinesterasa		Psicoactivos		Dermatológico	
EMO		KOH uñas		Serologia		Otros		Psicotécnico	

CONCEPTO

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIÓDICO		EXAMEN MEDICO DE RETIRO	
Cumple con los requisitos necesarios para el perfil del cargo	X	Satisfactorio		Satisfactorio	
Presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral		Signos y síntomas de enfermedad general que deben ser valorados por su EPS		Con limitaciones de origen común que deben ser valorados por su EPS	
Presenta condiciones de salud que pueden comprometer su productividad		Se debe reasignar funciones, reubicar, analizar puesto de trabajo		Secuela de accidente de trabajo	
Presenta condiciones de salud que deben ser tratadas antes de ingresar		Secuela de accidente de trabajo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS	
No cumple con los requisitos del perfil del cargo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS		Valoración medicina laboral para evaluación y calificación	

	SI	NO		SI	NO
Idóneo para manipular alimentos		X	Requiere nueva valoración medica ocupacional		X
Idóneo para trabajar en alturas	X		Debe ser reubicado		X
Idóneo para trabajar en espacios confinados		X	Requiere manejo por rehabilitación		X
Requiere nueva valoración medica laboral		X			

RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGÚN IMC		MANEJO POR EPS/ARP		RECOMENDACIONES		SVE (INCLUIR EN)	
Dieta		Control Periódico PP por EPS		Control Periódico Ocupacional	X	Visual	X
Ejercicio Regular	X	Se prescribe Tratamiento		Higiene Postural	X	Auditivo	X
Dieta y Ejercicio Regular		Remisión a EPS para Manejo		Utilización de EPP	X	Respiratorio	X
Valoración por nutrición EPS		Continuar manejo Medico		Utilización de ayudas Ergonómicas	X	Ergonómico	X
Descartar Alteración Metabólica		Remisión para Control Medico		Medidas anticstasis venosa		Cardiovascular	
Dieta, Ejercicio y medicamento		Remisión ARP para manejo del caso		Evaluación Puesto de Trabajo		Psicolaboral	
Otro		Otro		Otro		Químico	
						Biológico	

Dr. Juval Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 LEO 00097

Firma Medico Evaluador
Sello

ALEX EDILSON GUALTEROS
C.C. 86011617

Firma Trabajador Evaluado

...Experiencia en Salud!

Casa Editorial Alemana 314 482 9907 - Vicio.

CERTIFICADO MEDICO DE VALORACION OSTEOMUSCULAR

Resoluciòn. 2346 de 2007 / Resoluciòn. 1995 de 1990
Calle 15 nº 15-81/ Tel: 650 13 13- Cel:313 875 66 68
hsesaludocupacional1@gmail.com
GRANADA-META-COLOMBIA

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No.. Identificacion
Guallero	Peña	Alex Edilson	86011617

Edad	Cargo	Empresa	Dia	Mes	Año
45	Oficial de obra	Consorcio Cubaral	23	01	2013

Tipo de Examen: Ingreso [X] Periodico [ ] Cambio de labor [ ] Retiro [ ] Reingreso [ ] Otro _____

VALORACION OSTEOMUSCULAR

CABEZA Y CUELLO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
INCLINACION LATERAL	✓	
ROTACION	✓	

MANOS Y MUÑECAS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
DESVIACION CUBITAL	✓	
DESVIACION RADIAL	✓	
PBA TINEL	✓	
PBA PHALEN	✓	

CODOS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
PRONACION	✓	
SUPINAION	✓	
MBA MILLS	✓	
PBA COZEN	✓	
EPICONDILITIS	✓	
EPITROCLEITIS	✓	

RODILLAS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
MBA CAJON	✓	
PBA MCMURAY	✓	
PBA APLEY	✓	
SIGNO STEINMAN	✓	

HOMBRO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
PALM UP TEST		
IMPINGEMENT	✓	
ABDUCCION	✓	
ADDUCCION	✓	
PBA APLEY	✓	
PBA GERBER	✓	
MBA PATTE	✓	
TEST JOBE	✓	

COLUBNA DORSOLUMBAR	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
ROTACION	✓	
INCLINACION	✓	
MBA BRAGARD	✓	
MBA NERI	✓	
PBA SCHOBER	✓	
MBA GOLDTHWAIT	✓	
LASSEGE	✓	
PBA THOMAS	✓	
PBA ADAMS	✓	
PBA TRENDELENBUNG	✓	

TOBILLO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
EVERSION	✓	
INVERSION	✓	
ROTACION	✓	

APTO	X	NO APTO		APLASADO	

OBSERVACIONES: NINGUNA

Dr. Juval Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 LSO 00097

FIRMA MEDICO EVALUADOR
SELLO

FIRMA DEL TRABAJADOR

CONCEPTO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Resoluciòn. 2346 de 2007 / Resoluciòn. 1995 de 1990
Calle 15 nº 15-81/ Tel: 650 13 13- Cel:313 875 66 68
hsesaludocupacional1@gmail.com
GRANADA-META-COLOMBIA

HS&E
Salud Ocupacional
Epidemiologia Ambiental
NIT 900.758.801-1

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No.. Identificacion
Gualteros	Peña	Alex Edilson	86011617

Edad	Cargo	Empresa	Dia	Mes	Año
45	Oficial de obra	Consorcio Obaural	23	01	2023

Tipo de Examen: Ingreso ☐ Periodico ☐ Cambio de labor ☐ Retiro ☐ Reingreso ☐ Otro _____

ANTECEDENTES VESTIBULO-CEREBELOSOS Y METABOLICOS

PATOLOGIA	NO	SI	PATOLOGIA	NO	SI
HIPERTENCION	X		CONVULCIONES/EPILEPSIA	X	
HIPOTENCION	X		TRASTORNOS MENTALES	X	
SINDROME ORTOSTATICO	X		FOBIAS	X	
CARDIOPATIAS	X		ENFERMEDADES CEREBRALES	X	
DIABETES	X		ENFERMEDADES CEREBELOSAS	X	
HIPOGLICEMIA	X		SINDROME CERVICAL	X	
VERTIGO/MAREO	X		ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES	X	
DISLIPIDEMIA	X		ALTERACIONES EQUILIBRIO	X	
ENFERMEDAD MENIERE	X		ASMA	X	
SORDERA/TINNITUS	X		ALCOHOLISMO	X	

DESCRIPCION:

PRUEBAS Y MANIOBRAS VESTIBULO-CEREBELOSAS

PRUEBA	NEGATIVA	POSITIVA	PRUEBA	NEGATIVA	POSITIVA
ROMBERG	X		MANIOBRA BARRET	X	
BARANY	X		MANIOBRA MINGAZZINI	X	
BABINSKY-WEIL	X		DIADOCOCINECIA	X	
UNTEMBERGER	X		PRUEBA DEDO-NARIS	X	
DIX-HALLPIKE	X		NISTAGMO	X	

DESCRIPCION:

EXAMENES DE LABORATORIOS

LABORATORIO/EXAMEN	NORMAL	ANORMAL
GLICEMIA	X	
COLESTEROL	X	
TRIGLICERIDOS	X	
AUDIOMETRIA	X	
VISIOMETRIA	X	

CONCEPTO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

APTO	X
NO APTO	
APLAZADO	

Dr. Juval Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 LSO 00097

FIRMA MEDICO ESPECIALISTA

X ALEX Gualteros.

TRABAJADOR

H.S&E

Nit. 900.758.801-1

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

CLL. 15 No. 15- 81 Tel. 650 1313 Cel. 313 875 6668
hsesaludocupacional1@gmail.com - Granada - Meta.

SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL

De acuerdo al decreto 2346 de 2007, se certifica por parte del trabajador, que todos los datos consignados en la historia ocupacional y medica, son verídicos. Se autoriza informar a la empresa, las conclusiones generales del estado de salud de la población examinada, información que sera consignada en el diagnostico de salud de la empresa a la cual pertenezca, y se utilizara para el cumplimiento de los subprogramas (Art. 18) de medicina preventiva y del trabajo según el Art. 10 de la resolución 1016 de 1989, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No. Identificación
Moreno		Jorge Mauricio	74281436

Edad	Cargo		Día	Mes	Año
50	Oficial de obra	Conductor Cubana / Faire 2	23	01	2023

Tipo de Examen: Ingreso [X] Periódico [ ] Cambio de Labor [ ] Retiro [ ] Reingreso [ ] Otro_____

EXÁMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Optometria	X
Visiometria	X
Audiometria	X
Espirometria	
EKG	
Rx Columna	
IMG	

Laboratorio Clinico	
Hemoclasificacion	
C. Hematico - Plaquetas	X
Glicemia	X
P. de Orina	
Coprologico	
ROH UNAS	

Frotis / Cultivo garganta	
SGPT	
SGOT	
Baciloscopia	
Creatinina	
Colinesterasa	
Serologia	

Colesterol	X
Triglicéridos	X
HDL	X
LDL	X
Alcohol	
Psicoactivos	
Otros	

Anexo trabajo en alturas	X
Espacios confinados	
Tamizaje tunel del Carpo	
Osteomuscular	X
Actividades alto riesgo	
Dermatológico	
Psicotécnico	

CONCEPTO

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIÓDICO		EXAMEN MEDICO DE RETIRO	
X	Cumple con los requisitos necesarios para el perfil del cargo		Satisfactorio		Satisfactorio
	Presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral		Signos y síntomas de enfermedad general que deben ser valorados por su EPS		Con limitaciones de origen común que deben ser valorados por su EPS
	Presenta condiciones de salud que pueden comprometer su productividad		Se debe reasignar funciones, reubicar, analizar puesto de trabajo		Secuela de accidente de trabajo
	Presenta condiciones de salud que deben ser tratados antes de ingresar		Secuela de accidente de trabajo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS
	No cumple con los requisitos del perfil del cargo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS		Valoración medicina laboral para evaluación y calificación.

	SI	NO		SI	NO
Idóneo para manipular alimentos		X	Requiere nueva valoración medica ocupacional		X
Idóneo para trabajar en alturas		X	Debe ser reubicado		X
Idóneo para trabajar en espacios confinados		X	Requiere manejo por rehabilitación		X
Requiere nueva valoración medica laboral		X			

RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGÚN IMC	
Dieta	
Ejercicio Regular	X
Dieta y Ejercicio Regular	
Valoración por nutrición EPS	
Descartar Alteración Metabólica	
Dieta, Ejercicio y medicamento	
Otro	

MANEJO POR EPS/ARP	
Control Periódico PP por EPS	
Se prescribe Tratamiento	
Remisión a EPS para Manejo	
Continuar manejo Medico	
Remisión para Control Medico	
Remisión ARP para manejo del caso	
Otro	

RECOMENDACIONES	
Control Periódico Ocupacional	X
Higiene Postural	X
Utilización de EPP	X
Utilización de ayudas Ergonómicas	X
Medidas antiestasis venosa	
Evaluación Puesto de Trabajo	
Otro	

SVE (INCLUIR EN)	
Visual	X
Auditivo	X
Respiratorio	X
Ergonómico	X
Cardiovascular	
Psicolaboral	
Química	
Biológico	

Dr. Juval Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 [illegible]

Firma Medico Evaluador
Sello

Firma Trabajador Evaluado
c.c 74281436

...Experiencia en Salud!

Casa Editorial Alemana 314 482 9907 - Vitalo.

CERTIFICADO MEDICO DE VALORACION OSTEOMUSCULAR

Resolución. 2346 de 2007 / Resolución. 1995 de 1990
Calle 15 nº 15-81/ Tel: 650 13 13- Cel:313 875 66 68
hsesaludocupacional1@gmail.com
GRANADA-META-COLOMBIA

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No.. Identificacion
Moreno		Jorge Mauricio	74181436

Edad	Cargo	Empresa	Dia	Mes	Año
50	Oficial de obra	Consorcio Cabarral Talud 2	23	01	2013

Tipo de Examen: Ingreso [X] Periodico [ ] Cambio de labor [ ] Retiro [ ] Reingreso [ ] Otro _____

VALORACION OSTEOMUSCULAR

CABEZA Y CUELLO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
INCLINACION LATERAL	✓	
ROTACION	✓	

MANOS Y MUÑECAS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
DESVIACION CUBITAL	✓	
DESVIACION RADIAL	✓	
PBA TINEL	✓	
PBA PHALEN	✓	

CODOS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
PRONACION	✓	
SUPINAION	✓	
MBA MILLS	✓	
PBA COZEN	✓	
EPICONDILITIS	✓	
EPITROCLEITIS	✓	

RODILLAS	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
MBA CAJON	✓	
PBA MCMURAY	✓	
PBA APLEY	✓	
SIGNO STEINMAN	✓	

HOMBRO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
PALM UP TEST	✓	
IMPINGEMENT	✓	
ABDUCCION	✓	
ADDUCCION	✓	
PBA APLEY	✓	
PBA GERBER	✓	
MBA PATTE	✓	
TEST JOBE	✓	

COLUBNA DORSOLUMBAR	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
ROTACION	✓	
INCLINACION	✓	
MBA BRAGARD	✓	
MBA NERI	✓	
PBA SCHOBER	✓	
MBA GOLDTHWAIT	✓	
LASSEGE	✓	
PBA THOMAS	✓	
PBA ADAMS	✓	
PBA TRENDELENBUNG	✓	

TOBILLO	NORMAL	ANORMAL
FLEXCION	✓	
EXTENCION	✓	
EVERSION	✓	
INVERSION	✓	
ROTACION	✓	

APTO		NO APTO		APLASADO	
	X				

OBSERVACIONES: Ninguna

Dr. Juval Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 LSO 00097

FIRMA MEDICO EVALUADOR
SELLO

FIRMA DEL TRABAJADOR

RESOLUCION 2346/07 LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL, LOS DOCUMENTOS EXAMENES O VALORACIONES CLINICAS O PARACLINICAS SON CONFIDENCIALES Y HACEN PARTE DE LA RESERVA PROFESIONAL POR LO TANTO NO PODRAN COMUNICARSE O DARSE A CONOCER, EN NINGUN CASO EL EMPLEADOR PODRA TENER ACCESO A LA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL

CONCEPTO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

Resoluciòn. 2346 de 2007 / Resoluciòn. 1995 de 1990
Calle 15 nº 15-81/ Tel: 650 13 13- Cel:313 875 66 68
hsesaludocupacional1@gmail.com
GRANADA-META-COLOMBIA

HS&E
Salud Ocupacional
Epidemiología Ambiental
NIT 900.756.891-1

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No.. Identificacion
Moreno		Jorge Mauricio	74281436

Edad	Cargo	Empresa	Dia	Mes	Año
50	Oficial de obra	Consorcio Cubarral Vial 2	23	01	2023

Tipo de Examen: Ingreso [X] Periodico [ ] Cambio de labor [ ] Retiro [ ] Reingreso [ ] Otro _____

ANTECEDENTES VESTIBULO-CEREBELOSOS Y METABOLICOS					
PATOLOGIA	NO	SI	PATOLOGIA	NO	SI
HIPERTENCION	/		CONVULCIONES/EPILEPSIA	/	
HIPOTENCION	/		TRASTORNOS MENTALES	/	
SINDROME ORTOSTATICO	/		FOBIAS	/	
CARDIOPATIAS	/		ENFERMEDADES CEREBRALES	/	
DIABETES	/		ENFERMEDADES CEREBELOSAS	/	
HIPOGLICEMIA	/		SINDROME CERVICAL	/	
VERTIGO/MAREO	/		ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES	/	
DISLIPIDEMIA	/		ALTERACIONES EQUILIBRIO	/	
ENFERMEDAD MENIERE	/		ASMA	/	
SORDERA/TINNITUS	/		ALCOHOLISMO	/	
DESCRIPCION:					

PRUEBAS Y MANIOBRAS VESTIBULO-CEREBELOSAS					
PRUEBA	NEGATIVA	POSITIVA	PRUEBA	NEGATIVA	POSITIVA
ROMBERG	/		MANIOBRA BARRET	/	
BARANY	/		MANIOBRA MINGAZZINI	/	
BABINSKY-WEIL	/		DIADOCOCINECIA	/	
UNTEMBERGER	/		PRUEBA DEDO-NARIS	/	
DIX-HALLPIKE	/		NISTAGMO	/	
DESCRIPCION:					

EXAMENES DE LABORATORIOS		
LABORATORIO/EXAMEN	NORMAL	ANORMAL
GLICEMIA	X	
COLESTEROL	X	
TRIGLICERIDOS	X	
AUDIOMETRIA	X	
VISIOMETRIA	X	

CONCEPTO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	
APTO	X
NO APTO	
APLAZADO	

Dr. Juvel Niño F.
MEDICO ESPECIALISTA
SALUD OCUPACIONAL
EPIDEMIOLOGIA
R.M. 14785-88 LSO 00097

FIRMA MEDICO ESPECIALISTA

TRABAJADOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17304920	LUIS CRUZ ROMERO	CALLE 14A # 54A-14	6726377	lucrurom@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/03/2023	64970530	$1.536.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	625.000	0		0		0	35	26.100	0	651.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	800.000	0	0	25.000	25.000	35	33.400	2.200	885.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	625.000	651.100
Pensión	1	850.000	885.600
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.475.000	1.536.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	17304920	LUIS CRUZ ROMERO		CALLE 14A # 54A-14	6726377	lucrurom@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	I	13/03/2023	64970530	$1.536.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	17304920	CRUZ ROMERO LUIS	3	0			N																	25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	625.000		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86056744		ARDILA ESCOBAR YHOJANN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	APTO.301.CL.39.B.No.25-11.	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1915466447	9446845729	I	2023/03/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: SURA (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 86056744	ARDILA ESCOBAR YHOJANN	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-7	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86056744		ARDILA ESCOBAR YHOJANN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	APTO.301.CL.39.B.No.25-11.	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1915466447	9446845729	I	2023/03/10	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1923501509	9446940698	E	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$1,371,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86059532	ANACONA HILBER	X																	230301	14	$1,586,667	$253,900	EPS037	14	$1,586,667	$63,500	CCF34	14	$1,586,667	$63,500	14-11	14	$1,586,667	$110,500	14	$0	$0	Si	$491,400
2	CC	1121900390	HERNANDEZ CRISTYAN	X																	230301	10	$666,667	$106,700	EPS037	10	$666,667	$26,700	CCF34	10	$666,667	$26,700	14-11	10	$666,667	$46,500	10	$0	$0	Si	$206,600
3	CC	1121926457	SEGURA CRISTHIAN	X																	230301	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF34	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$64,600	24	$0	$0	Si	$287,500
4	CC	1121883802	TRIANA ERIKA	X																	230301	12	$800,000	$128,000	EPS005	12	$800,000	$32,000	CCF34	12	$800,000	$32,000	14-11	12	$800,000	$55,700	12	$0	$0	Si	$247,700
5	CC	1121943244	USECHE WANDA	X	X															X	25-14	6	$400,000	$64,000	EPS041	6	$400,000	$16,000	CCF34	6	$416,667	$16,700	14-11	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	Si	$124,600
Total	**Afiliados(5)**																						$4,381,334	$701,100			$4,381,334	$175,400			$4,398,001	$176,100			$4,381,334	$305,200		$0	$0		$1,357,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901665237	0	CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	COND SANTA MARIA II MZ 7 CS 2	VILLAVICENCIO-META	3102751761	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1923501509	9446940698	E	2023/02/09	2023/02/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	8	$1,371,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$701,100	$6,800	$0	$707,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$64,000	$700	$0	$64,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$637,100	$6,100	$0	$643,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$305,200	$2,900	$0	$308,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$305,200	$2,900	$0	$308,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$176,100	$1,700	$0	$177,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$176,100	$1,700	$0	$177,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$175,400	$1,900	$0	$177,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$127,400	$1,300	$0	$128,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$16,000	$200	$0	$16,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$32,000	$400	$0	$32,400
TOTAL				5	$1,357,800	$13,300	$0	$1,371,100

Medellín, 06 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL META, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C86011617	GUALTEROS PEÑA ALEX EDILSON	04/02/2023		71306320	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C74281436	MORENO JORGE MAURICIO	04/02/2023		Y140148s	DEPENDIENTE	EN COBERTURA
C3140510	VARGAS HERRERA RUPERTO	04/02/2023		29v30129	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C300833082303755023

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/02/2023 15:17:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.159.181, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cofrem

FORMATO

"RADICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dependencia Generadora: Fecha de Vigencia:
DIV. Comercial y de Mercadeo 2023-09-25

2023/02/08 7:21 pm Radicado: 3013944

Recibe: YESICA VANESSA ROJAS ROJAS

Clasificación: Estado: R Asesor: 94
REACTIVAF

Información Empresa:

Nit: 900166237 Telefono:6814991

Razón Social: CONSORCIO CUEAR AL FASE 2

Tipo Aportante: 1 EMPLEADOR APORTE 4%

Información Solicitante:

Documento 3140510 Telefono: 6824603

Nombre: VARGAS HERRERA RUPERTO

Dependencia:
DIVISION DE SUBSIDIOS

Documentos Presentados:

- Copia cédula de ciudadania

  3140510 RUPERTO VARGAS HERRERA

- Formulario de Inscripción del trabajador

  3140510 RUPERTO VARGAS HERRERA

Observaciones:

02 FOLIOS
REACTIVACION
AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS

Recuerde actualizar antes del 10 de marzo, certificación de estudios de hijos mayores de 12 años y certificado de discapacidad de los beneficiarios menores de 18 años

Firma Quien Recibe

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM
CR 40 35 A-19 Villavicencio, Meta PBX 6818922 ext 3851
Línea Amiga 6818920 e-mail: radicacion@cofrem.com.co
Página Web: www.cofrem.com.co

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **86.011.617**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 06 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL META, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número	Nombre	Fecha inicio	Fecha fin	Código de	Tipo	Estado
C86011617	GUALTEROS PEÑA ALEX EDILSON	04/02/2023		71306320	DEPENDIENTE	EN

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C300833082303755344

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.159.181, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cofrem

FORMATO

"RADICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dependencia Generadora: Div. Comercial y de Mercadeo

Fecha de Vigencia: 2023-09-25

2023/02/08 7:18 pm Radicado: 3013943

Recibe: YESICA VANESSA ROJAS ROJAS

Clasificación: REACTIVAR

Estado: R

Asesor: 94

Información Empresa:

Nit: 900666237

Telefono:6814991

Razón Social: CONSORCIO CLEAR CAL FASE 2

Tipo Aportante: 1 EMPLEADOR AL NORTE 4%

Información Solicitante:

Documento 86011617

Telefono: 0

Nombre: GIRALTEROS PEÑA ALEX EDILSON

Dependencia:

DIVISION DE SUBSIDIOS

Documentos Presentados:

- Copia cédula de ciudadania

  86011617 ALEX EDILSON GIRALTEROS PEÑA

- Formulario de inscripción del trabajador

  86011617 ALEX EDILSON GIRALTEROS PEÑA

Observaciones:

02 FOLIOS

REACTIVACION

AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS

Recuerde actualizar antes del 10 de marzo, certificación de estudios de hijos mayores de 2 años y certificado de discapacidad de los beneficiarios menores de 18 años

Firma Quien Recibe

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT 890 35 A-19 villavicencio, Meta PBX 6818622 ext. 3361
Linea Amiga 6819320 e-mail: ordle@ccofrem.com.co
Página Web www.ccofrem.com.co
Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **86.011.617**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Medellín, 06 de Febrero de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a la SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO CUBARRAL FASE 2, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL META, clase de riesgo 5, porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número	Nombre		Fecha inicio	Fecha fin	Código de	Tipo	Estado
C74281436	MORENO	JORGE MAURICIO	04/02/2023		Y140148s	DEPENDIENTE	EN

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C300833082303755337

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.145.159.181, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cofrem

FORMATO

"RADICACIÓN DE DOCUMENTOS"

Dependencia: Gen radora — Fecha de Vigencia
Div. Comercial y de Mercadeo — 2019-09-25

2023/02/08 7:16 pm — Radicado: 3013941

Recibe: YETICA VANESSA ROJAS ROJAS

Clasificación: — Estado: R — Asesor: 94
REACTIVAR

Información Empresa:

NIT: 900166237 — Telefono: 6814991

Razón Social: CONSORCIO CUEARTAL FASE 2

Tipo Aportante: 1 EMPLEADOR APORTE 4%

Información Solicitante:

Documento: 74281436 — Telefono: 0

Nombre: MORENO JORGE MAURICIO

Dependencia:
DIVISION DE SUBSIDIOS

Documentos Presentados:

- Copia cédula de ciudadania
  74281436 JORGE MAURICIO MORENO
- Formulario de inscripción del trabajador
  74281436 JORGE MAURICIO MORENO

Observaciones:

02 FOLIOS
REACTIVACION
AUTORIZA TRATAMIENTO DE DATOS

Recuerde actualizar antes del 10 de marzo certificación de estudios de hijos mayores de 2 años y certificado de discapacidad de los beneficiarios menores de 18 años

Firma Quien Recibe

CAJA DE COMPENSACION FAM ... (CAFAM COFREM)
... 40 ... A 19 Villavicencio, Meta PBX 6818322 ext. 3861
Linea Amiga 6819820 e-mail: ... @cofrem.com.co
Página Web www.cofrem.com.co
Vigilado Superintendencia de Subsidio Familiar

Sysven ERP - (C) - www.diosalware.com.co

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JORGE MAURICIO MORENO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **74.281.436**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 23 de Febrero del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN	VERSIÓN: 1

FECHA: 5·02·2023. ORGANIZACIÓN: CCubarral Fase #.2. HSE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Cristyan Hender

Se debe colocar debajo de cada ítem la condición que tiene cada elemento al momento de la inspección usando las abreviaturas: B: Bueno; D: Deteriorado requiere cambio. MT: Requiere mantenimiento por trabajador. NA: No aplica.

| No. | NOMBRE DEL TRABAJADOR | CÉDULA | FIRMA DEL TRABAJADOR ACEPTANDO LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN | ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN | | |

CONSORCIO CIUDADELA FASE 2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DÍA	MES	AÑO
19.	2.	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	Castyan Hernandez
NÚMERO DE CÉDULA	1.124.000.310
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Es el Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACCIDENTE DE TRABAJO	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
NORMAS DE MANEJO AMBIETNAL	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo y este a su vez ante a la ARL
COPASST	Acciones para la protección del medio ambiente, mediante programas como manejo y disposición de residuos, manejo del agua y manejo de materiales de construcción.

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

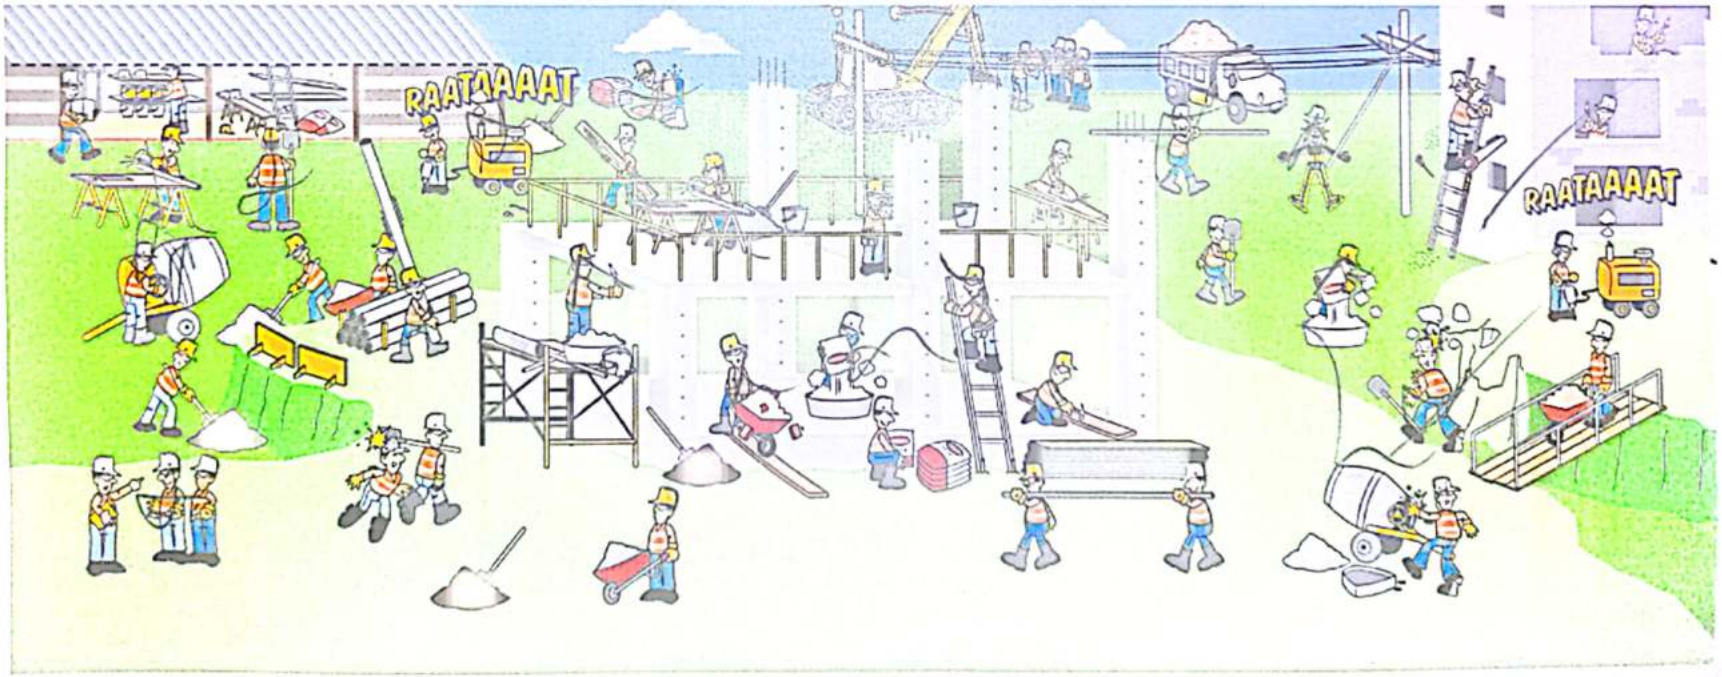

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN JUAN 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1


DIA	MES	AÑO
14	02	23.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	Yhojan Ardila.
NÚMERO DE CÉDULA	86056744.
FIRMA	

EVALUACIÓN

1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

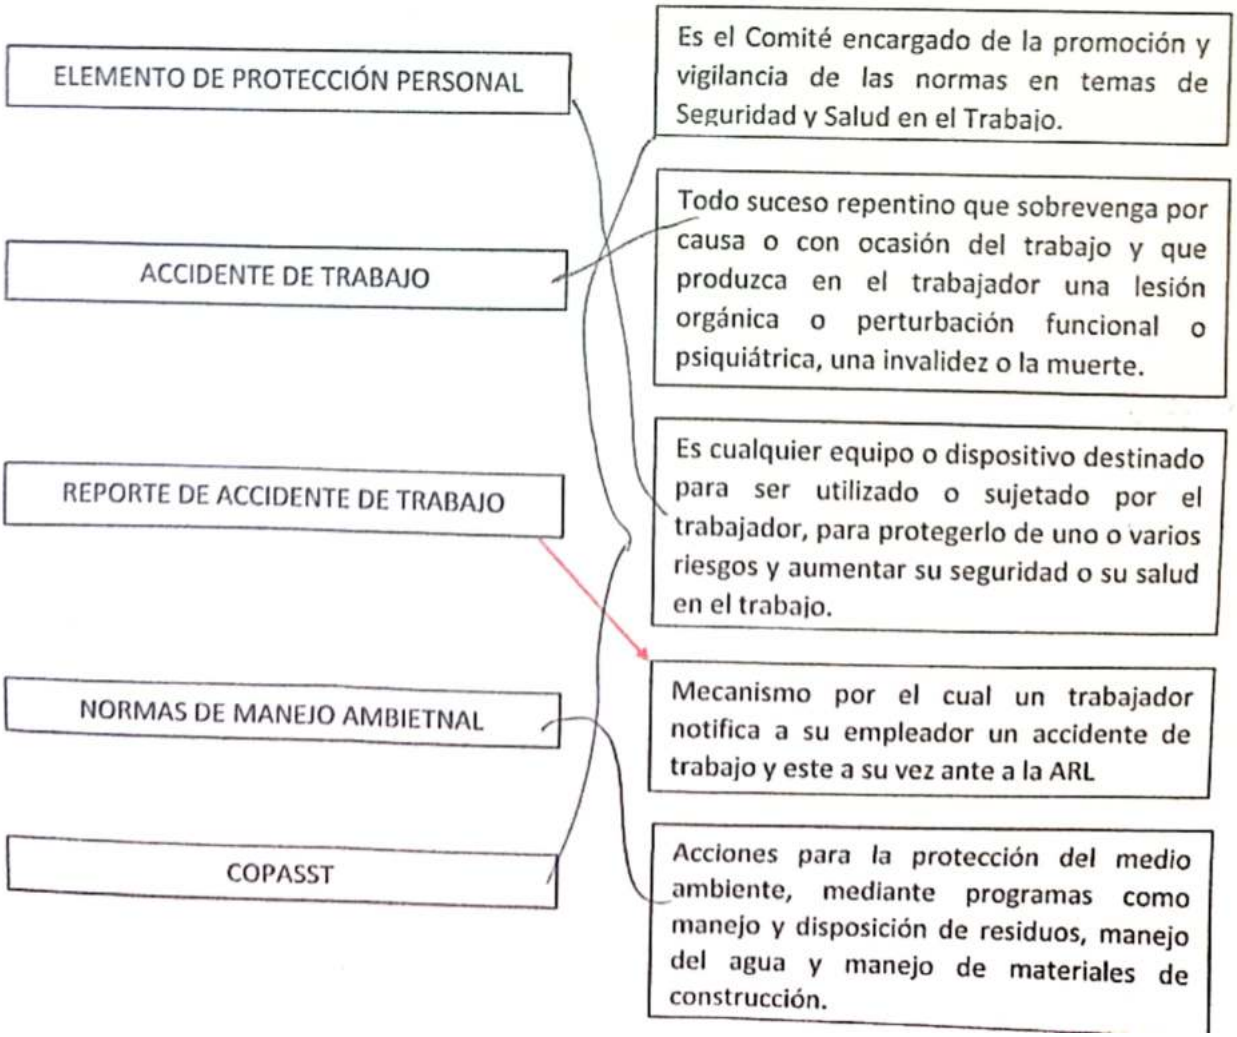

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.



Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN JUAN 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1


DÍA	MES	AÑO
19	2	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	Luis Cruz Pomero.
NÚMERO DE CÉDULA	17304920
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

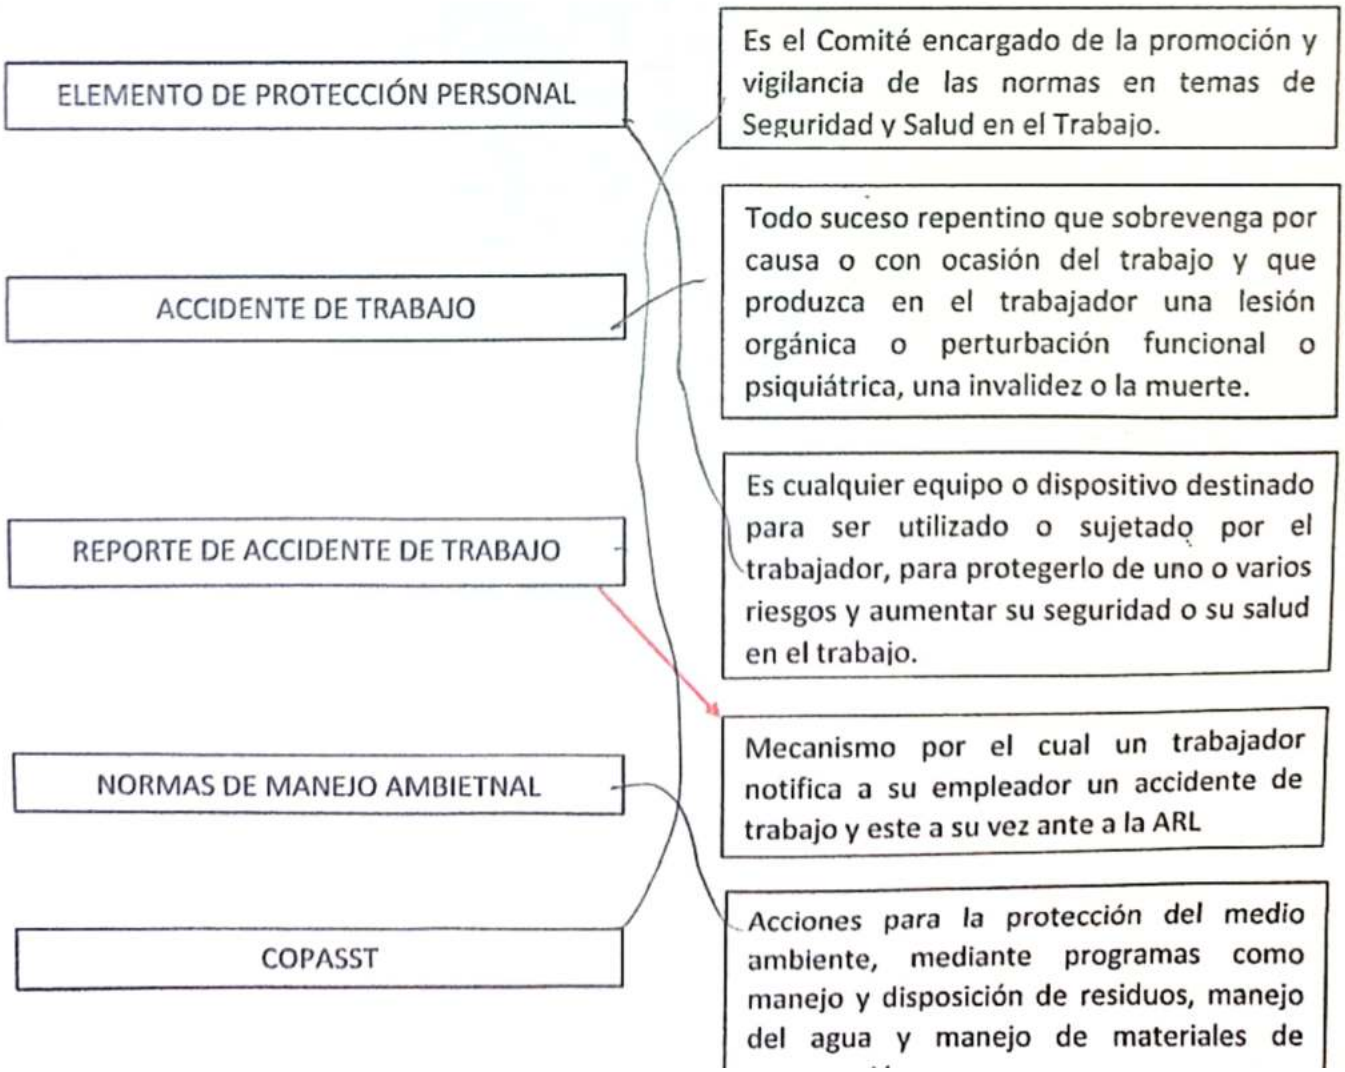

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

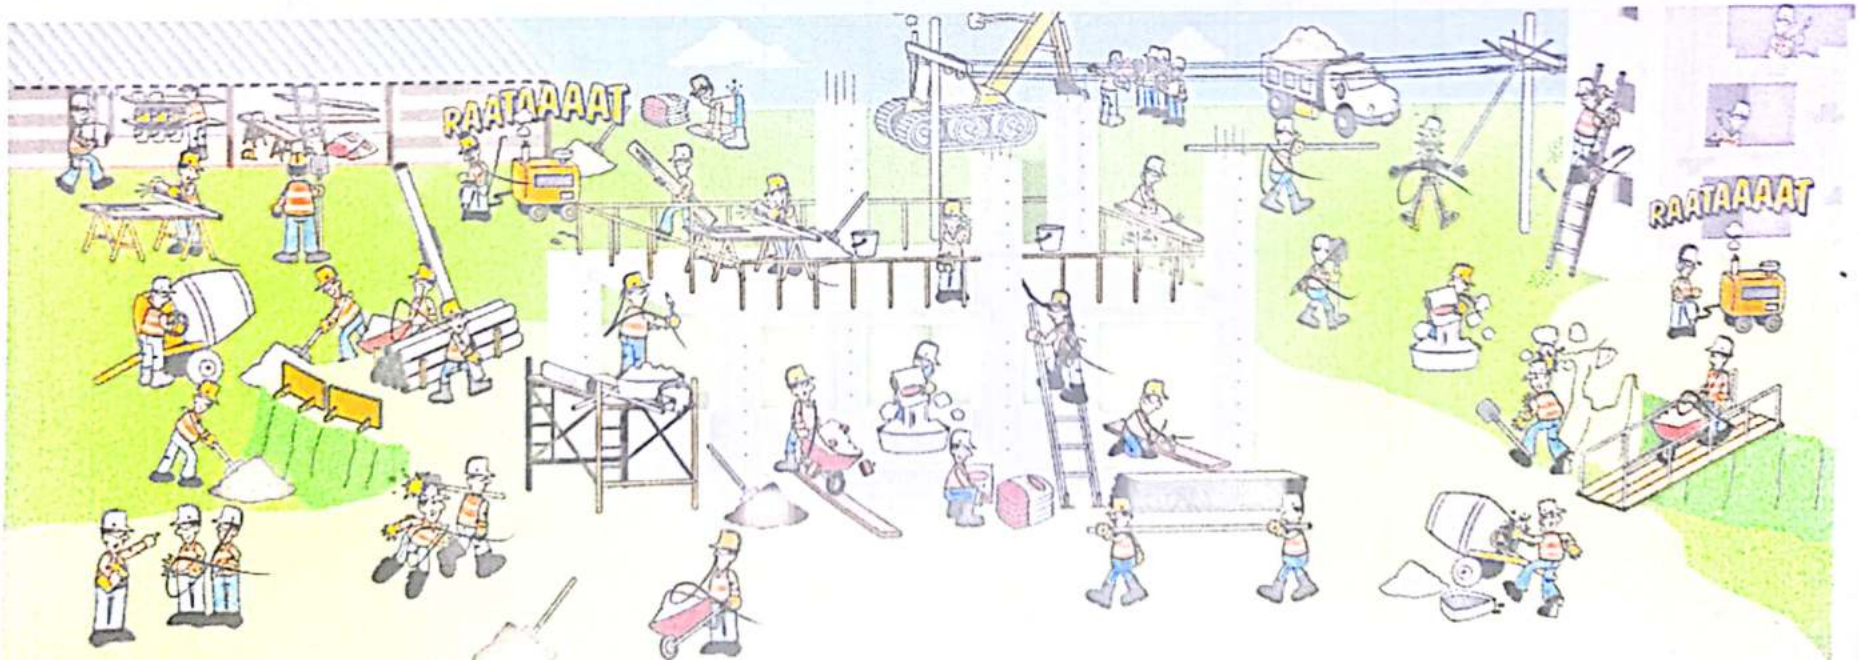

Powered by CamScanner


CONSORCIO SAN JUAN 2022	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DÍA	MES	AÑO
19	02	23

DATOS DEL TRABAJADOR	
NOMBRE Y APELLIDOS	Cristhian Segura.
NÚMERO DE CÉDULA	1121926957.
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

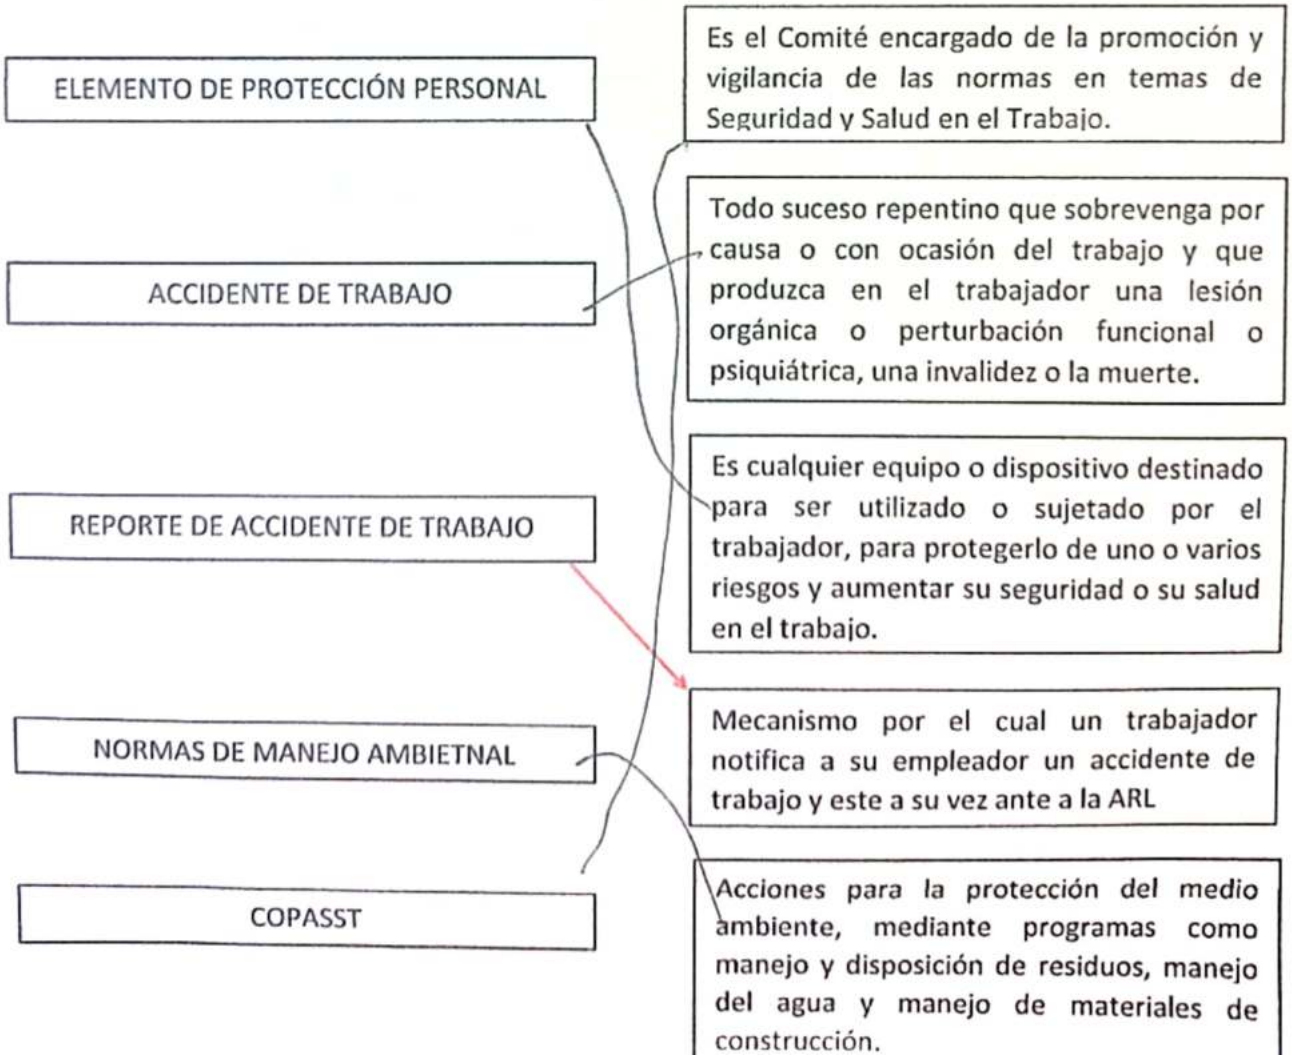

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

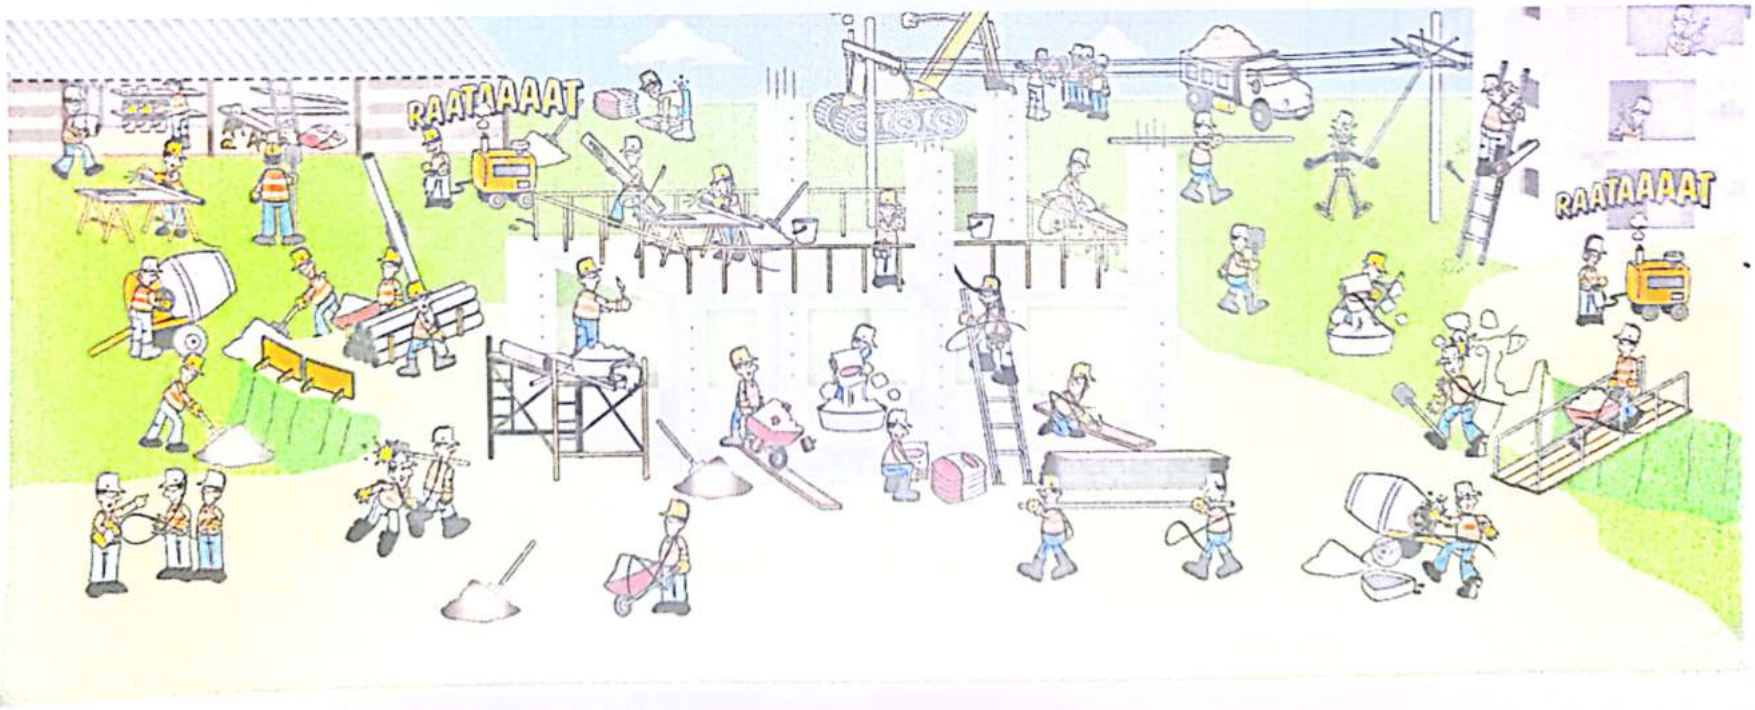

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DÍA	MES	AÑO
14	2	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	HERNAN ANACONA ROA
NÚMERO DE CÉDULA	86059532
FIRMA	HERNAN ANACONA ROA

EVALUACION


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Es el Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACCIDENTE DE TRABAJO	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
NORMAS DE MANEJO AMBIETNAL	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo y este a su vez ante a la ARL
COPASST	Acciones para la protección del medio ambiente, mediante programas como manejo y disposición de residuos, manejo del agua y manejo de materiales de construcción.

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

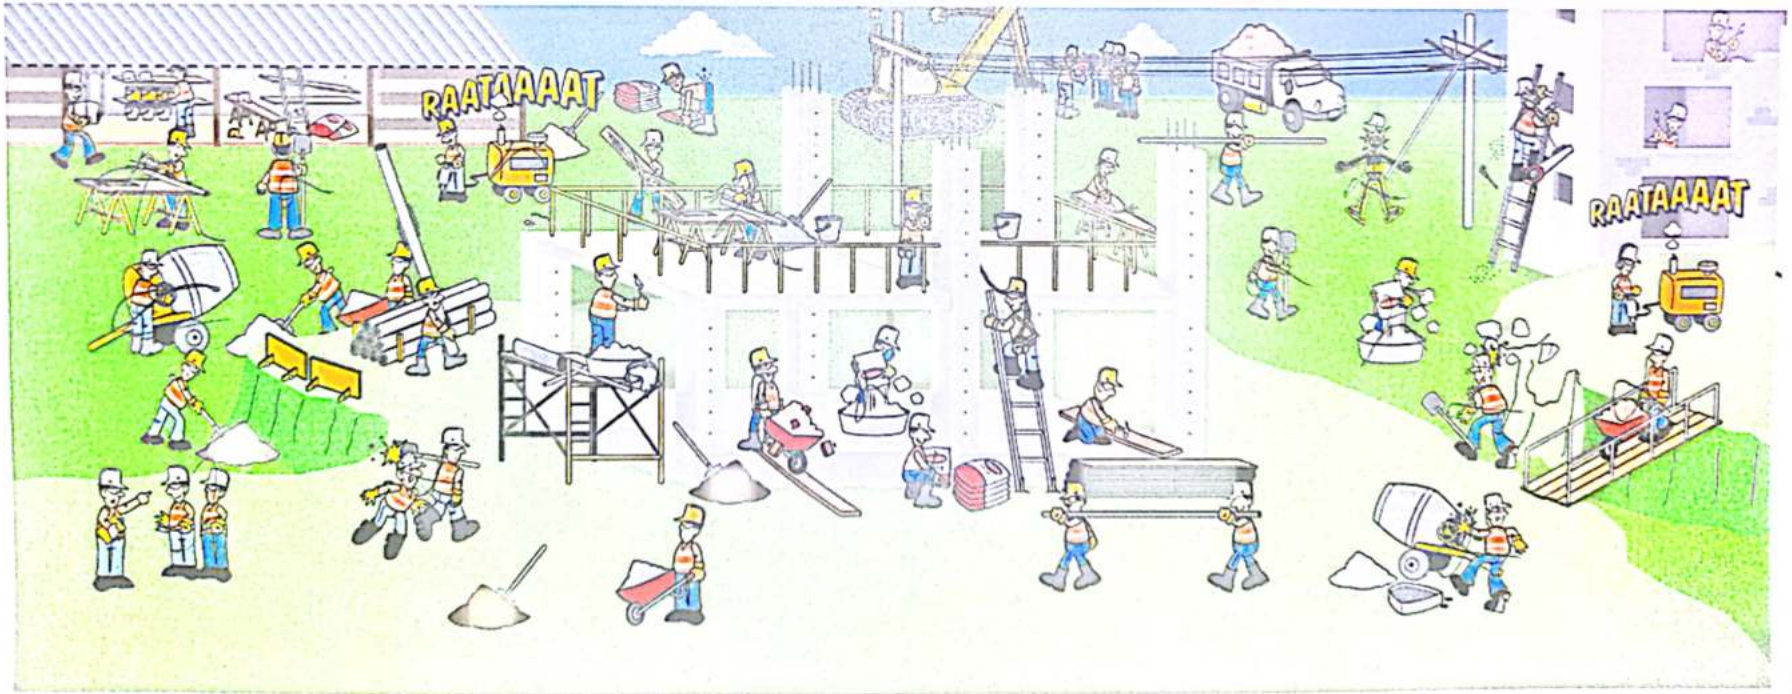

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUADRAL FASE 2	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1


DIA	MES	ANO
14	02.	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	Erika . Tuma .
NÚMERO DE CÉDULA	1121883.802.
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

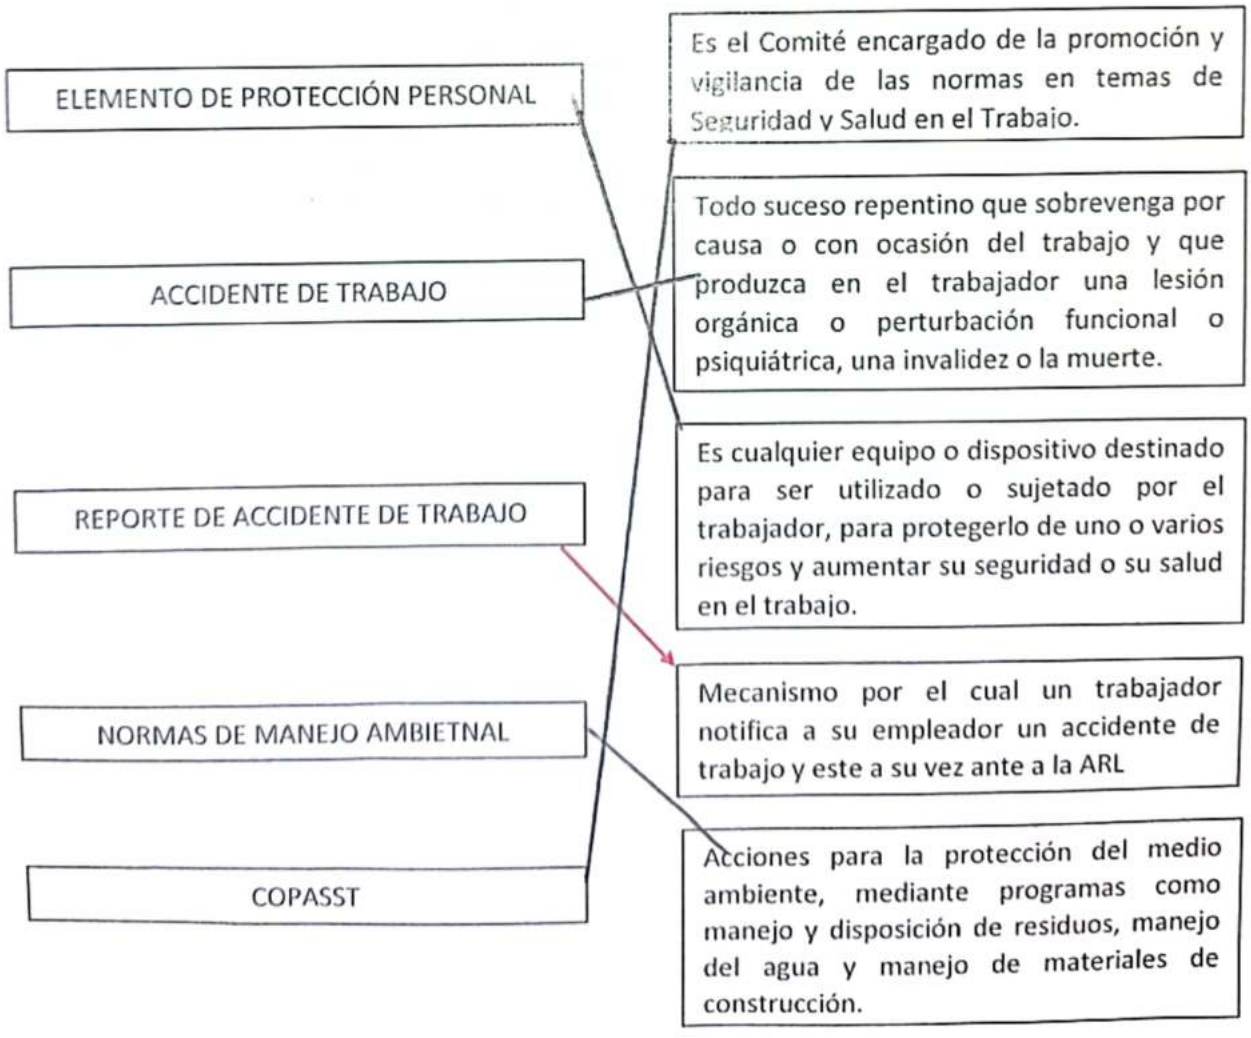

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con X los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

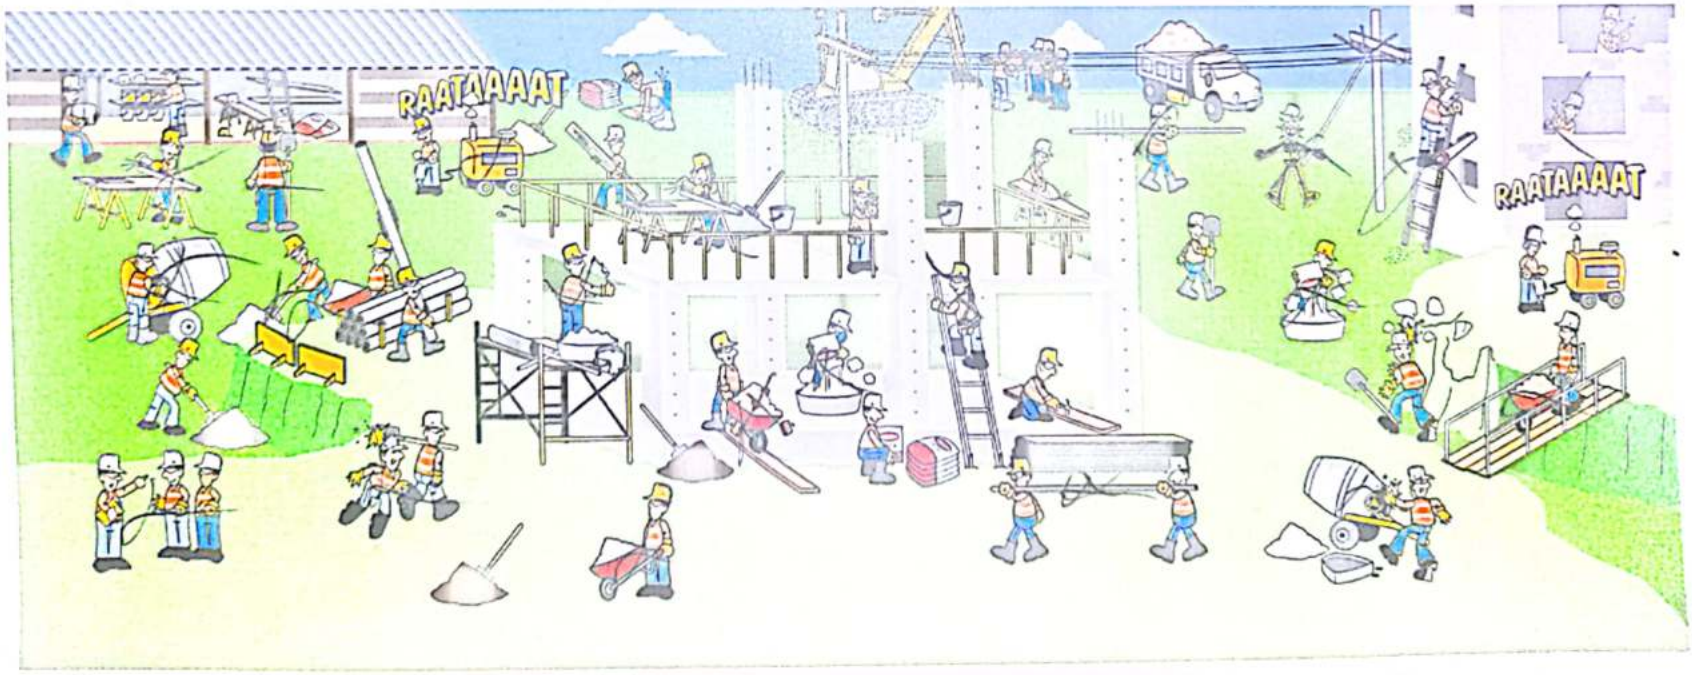

Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DÍA	MES	AÑO
14.	02	23.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	JORGE MORENO.
NÚMERO DE CÉDULA	79.781.936.
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Es el Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACCIDENTE DE TRABAJO	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
NORMAS DE MANEJO AMBIETNAL	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo y este a su vez ante a la ARL
COPASST	Acciones para la protección del medio ambiente, mediante programas como manejo y disposición de residuos, manejo del agua y manejo de materiales de construcción.

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

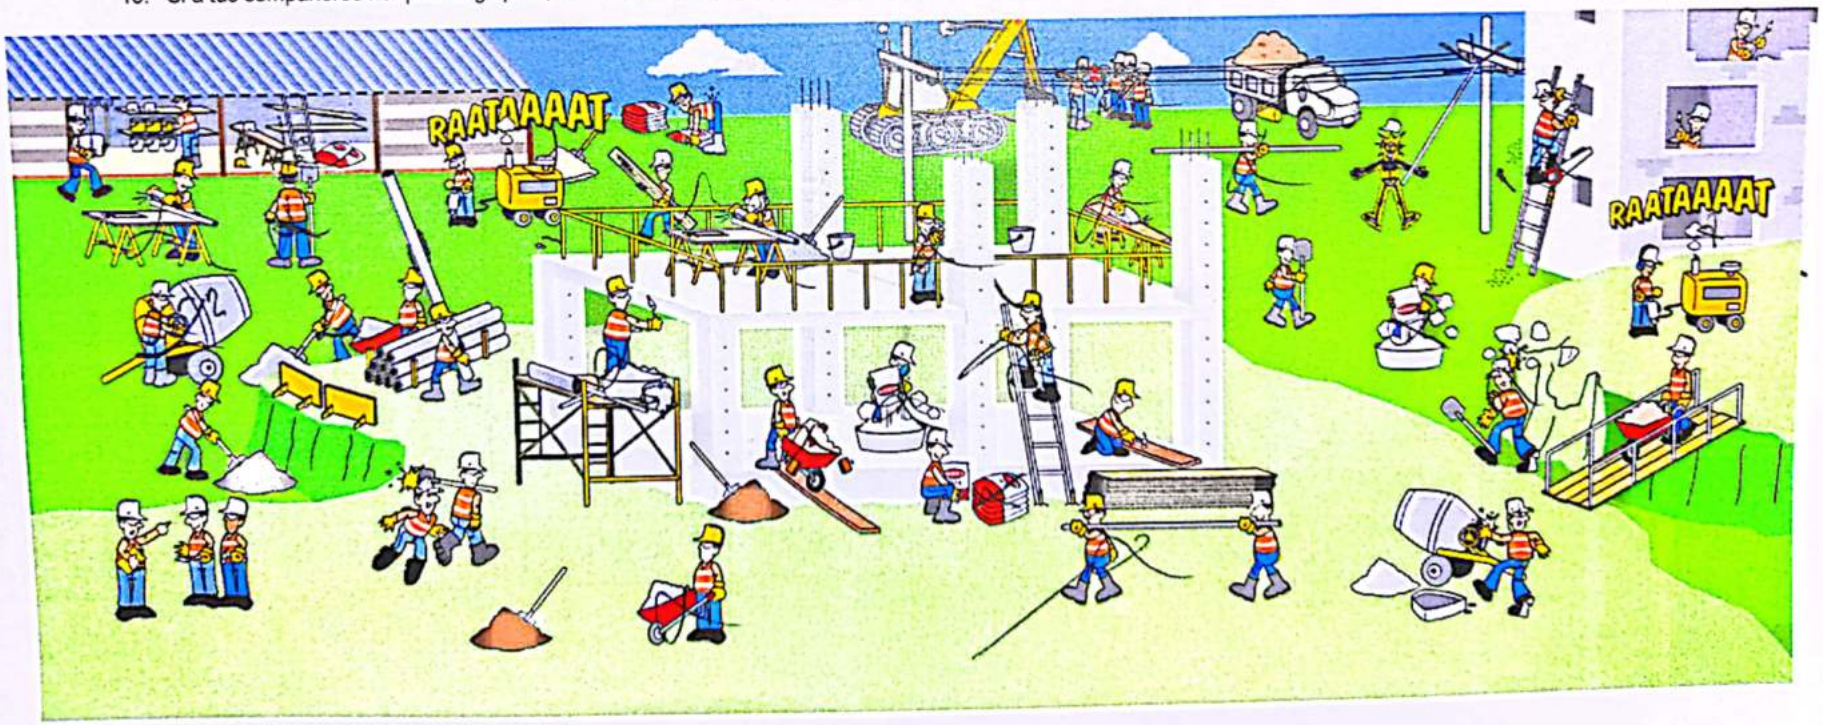

Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DÍA	MES	AÑO
14	02	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	OLIETTA VARGAS.
NÚMERO DE CÉDULA	31405510.
FIRMA	

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	Es el Comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
ACCIDENTE DE TRABAJO	Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
REPORTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO	Es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.
NORMAS DE MANEJO AMBIETNAL	Mecanismo por el cual un trabajador notifica a su empleador un accidente de trabajo y este a su vez ante a la ARL
COPASST	Acciones para la protección del medio ambiente, mediante programas como manejo y disposición de residuos, manejo del agua y manejo de materiales de construcción.

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

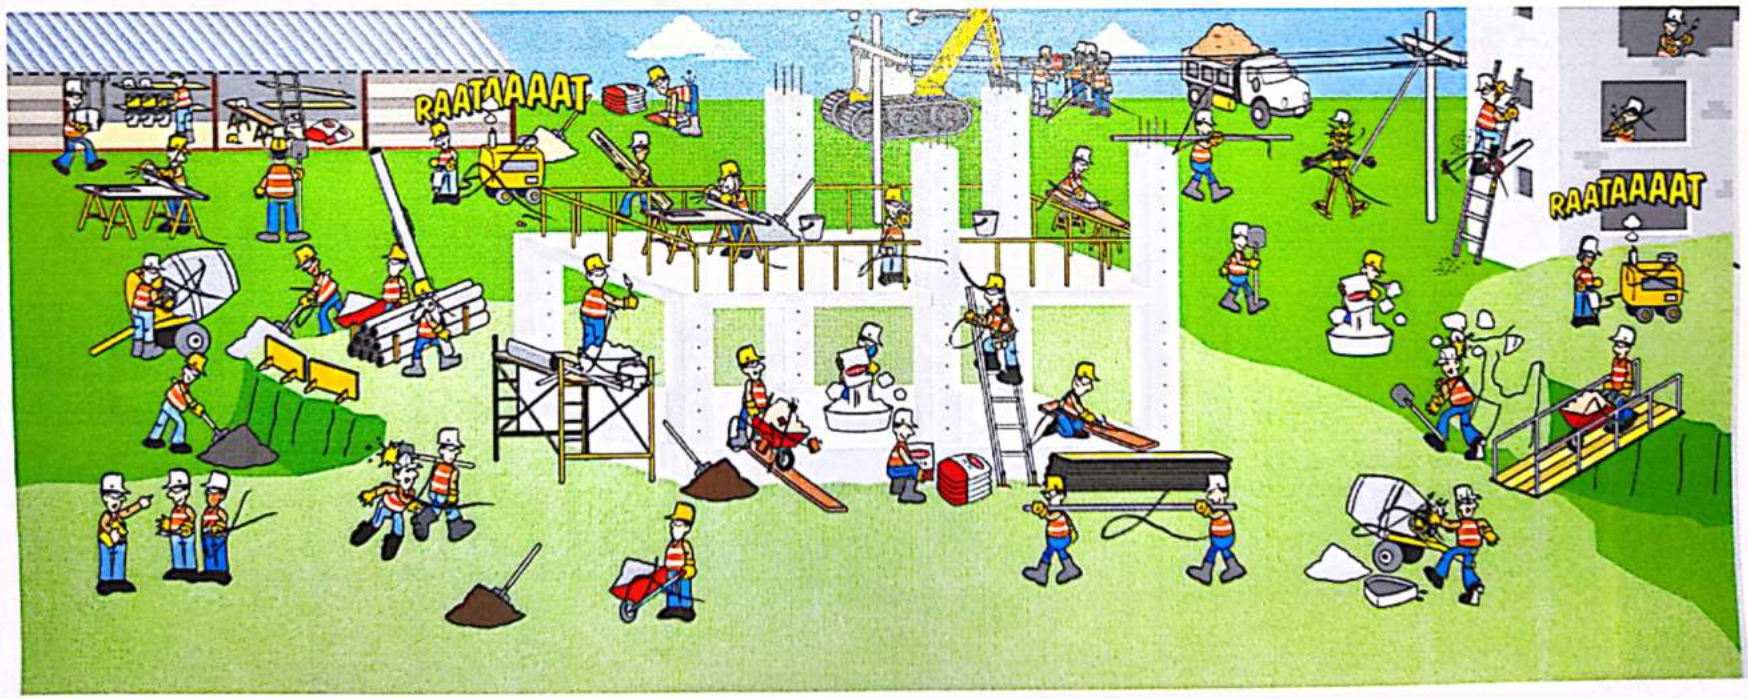

Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1


DÍA	MES	AÑO
14.	02	23

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	ALEX. Gonzales
NÚMERO DE CÉDULA	86011617.
FIRMA	ALEX G.

EVALUACIÓN


1. Relacione con una flecha el criterio con la definición adecuada:

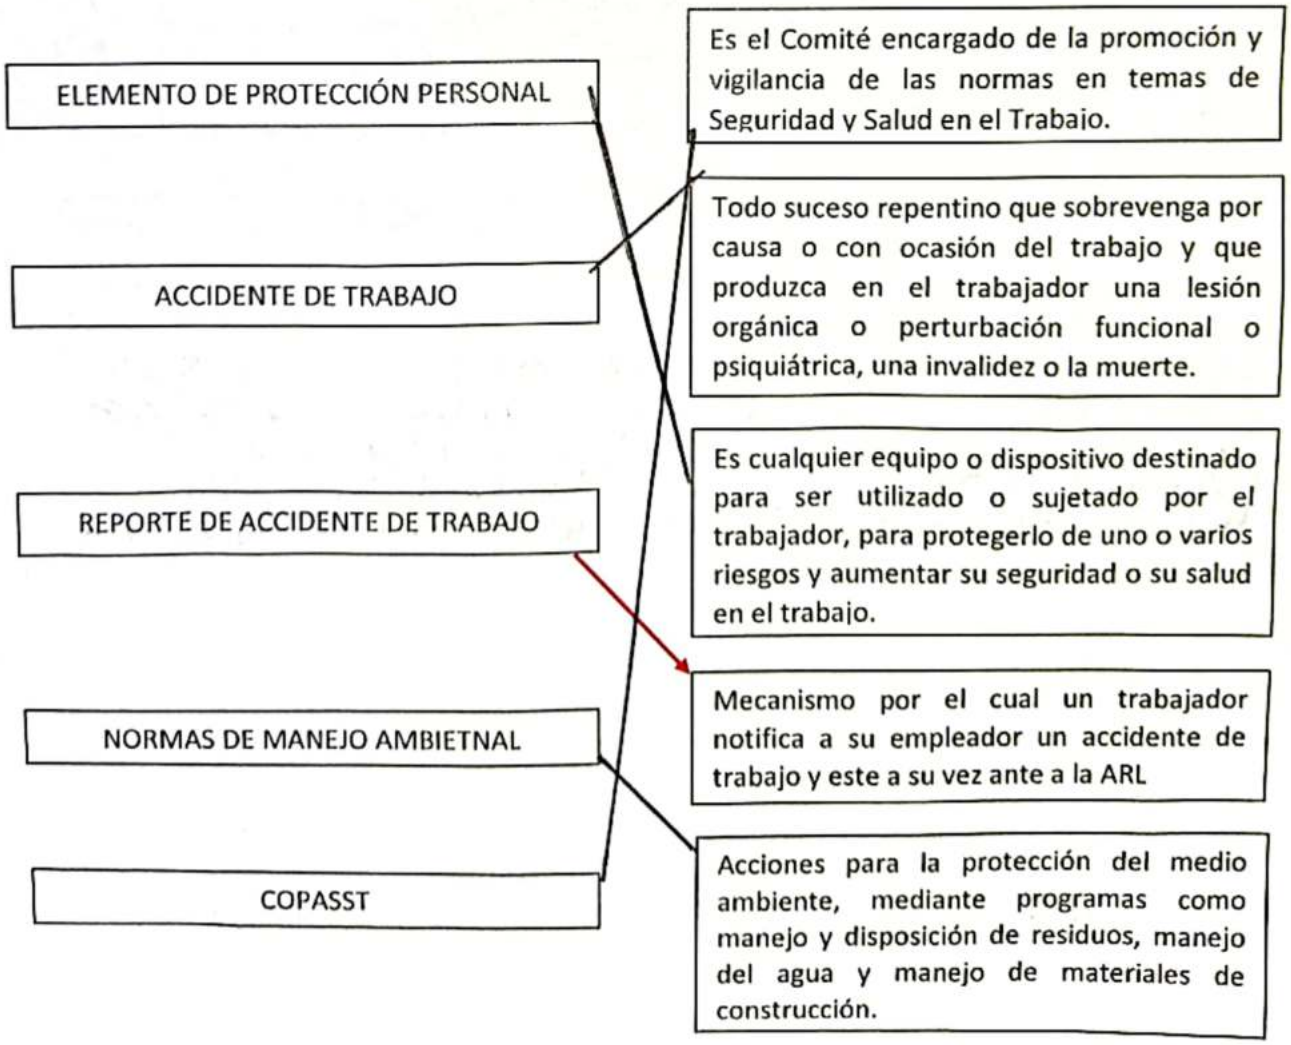

Powered by CamScanner

2. En el dibujo se encuentran muchos riesgos comunes en el sector de la construcción y frente a los cuales algunas personas no toman las debidas precauciones. Tu tarea consiste en "cazar" los comportamientos inseguros y encontrar los comportamientos seguros para cada una de las 14 situaciones. Marca con **X** los comportamientos incorrectos. Siguiendo estas pistas lograrás el objetivo.

1. La protección para oídos debes utilizar, si con tu audición no quieres acabar.
2. Cuando en alturas vayas a trabajar, los materiales y objetos debes asegurar.
3. Para operar maquinaria con tranquilidad, nunca debes hacerlo sin guardas de seguridad.
4. Al vaciar el cemento salta polvo por montones, por eso debes proteger bien tus pulmones.
5. Si varillas, tubos u objetos debes transportar, según su peso y tamaño ayuda debes solicitar.
6. En brechas o excavaciones protecciones debes colocar, de lo contrario la tierra o las piedras te pueden sepultar.
7. Varillas y tubos de metal en posición horizontal debes transportar, así accidentes eléctricos sin duda vas a evitar.
8. Cuando por ella vayas a subir o bajar, varios cuidados debes observar: revisarla, asegurarla y portaherramientas usar.
9. ¡Ojo! siempre debes emplear bien los elementos de protección, tenerlos solo de adorno te puede causar una gran lesión.
10. Al levantar un objeto de forma manual, la espalda recta debes conservar, doblar las rodillas y los músculos de las piernas utilizar.
11. El orden y el aseo muchas cosas pueden lograr: agilidad en el trabajo y mayor comodidad, además muchos accidentes se pueden evitar.
12. Para armar una rampa dos cosas debes hacer: colocar varios tablones y pasamanos también, usando solo una tabla esto puede suceder.
13. Si a tus compañeros no quieres golpear, esta herramienta en el hombro nunca debes cargar, mejor llévala en la mano en posición vertical.

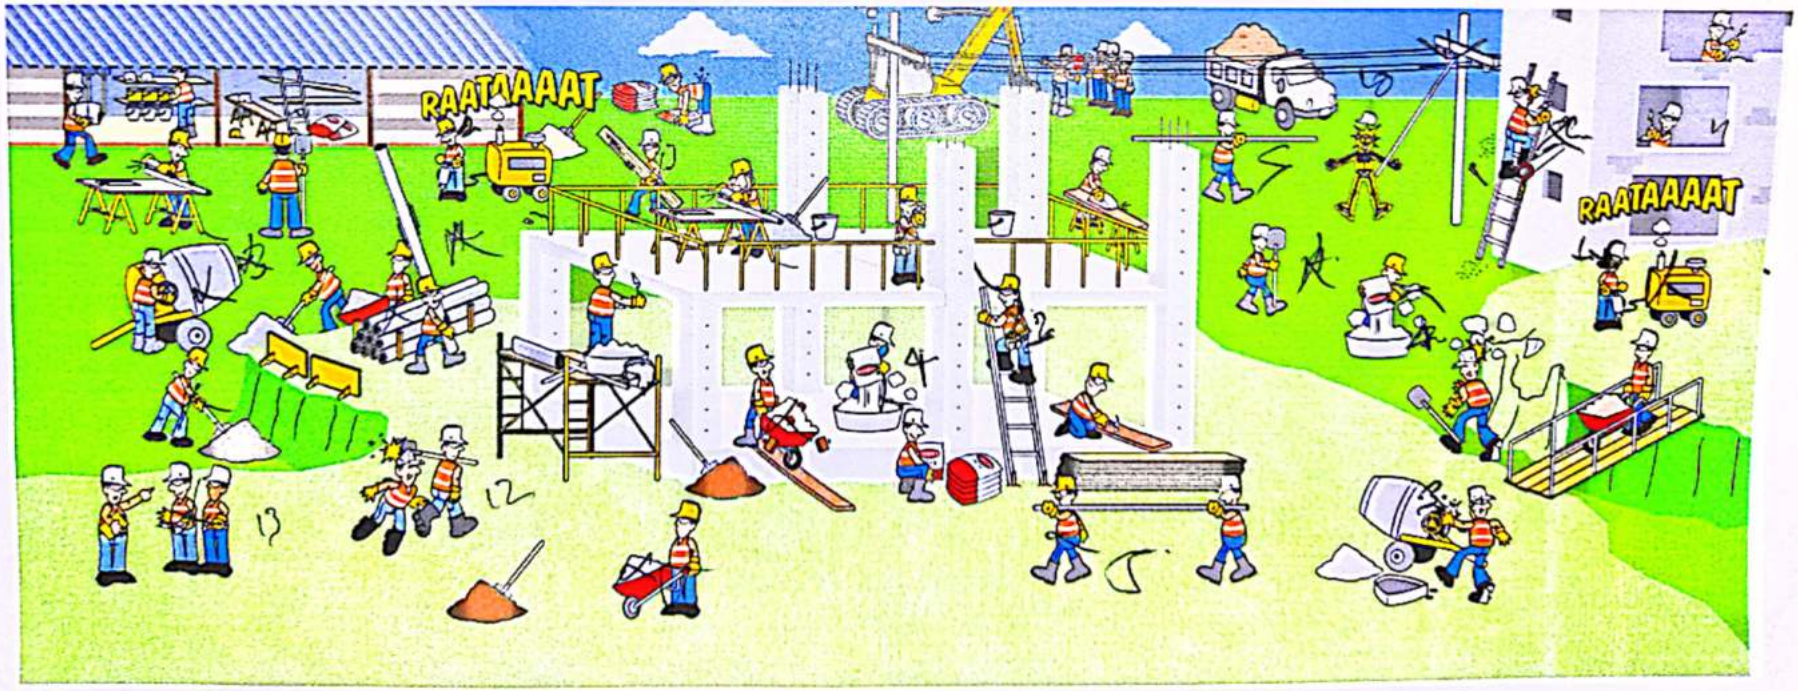

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBADRAL FASE 3	FORMATO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN AL PERSONAL	VERSIÓN: 1

DIA	MES	AÑO
14.	02.	23.

TEMAS

Marcar con X los temas tratados

Presentación de la empresa	X
Política de SST, Política de Prevención de consumo de alcohol y drogas	X
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	X
Protocolo de Bioseguridad COVID-19	X
Plan de emergencia	X
Procedimiento en caso de emergencia y en caso de accidente	X
COPASST y Comité de Convivencia Laboral	X
Funciones y Responsabilidades del Cargo	X
Roles y Responsabilidades SST	X
Uso de los Elementos de Protección Personal	X
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos en el puesto de trabajo	X
Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales	X
Política Ambiental	X
Normas de saneamiento y Gestión Ambiental	X

DATOS DEL EDUCADOR

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CÉDULA	CARGO	FIRMA
LUIS CARL. ROMERO.	17'304.970	DIRECTOR OBRA.	
CRISTHIAN SEGOVIA.	1'121916457	RESIDENTE. LEGAL.	
YHOJANN AVILA.	86056799.	ING. AMBIENTAL.	
ERIKA. TIVIANA.	1'111883802	INSPECTORA.	
HERNAN ARAGONA.	86'056 799.	ING. RESIDENTE.	HERNAN ARAGONA
JORGE MORENO.	79'781 936.	OFICIAL	
DUBERLY VARGAS	314.05'10	ALBAÑILERIA.	
ALEX GUTIERREZ.	86 011 617	OFICIAL	ALEX G.
CRISTIAN HERNANDEZ	1'118930390	ESST	

RESPONSABLE DE LA INDUCCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
CRISTIAN H	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Luis Cruz Romero, identificado con cédula de ciudadanía 17304920 de Villavicencio declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del **Consorcio Cubarral fase 2**

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del **Consorcio Cubarral fase 2.**
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y dirijase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No. 1179 de 2022 que tiene como objeto **CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARRILLADO SANITARIO FASE II – POZO EXISTENTE A POZO 9**

Firmado a los días 14 del mes de 02. de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 17304920.
CARGO: DIRECTOR OBRA.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Cristhian David Segura, identificado con cédula de ciudadanía 1121926457 de Villavicencio declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del **Consorcio Cubarral fase 2**

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del **Consorcio Cubarral fase 2.**
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No. 1179 de 2022 que tiene como objeto **CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARRILLADO SANITARIO FASE II – POZO EXISTENTE A POZO 9**

Firmado a los días 14 del mes de 02. de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 1'121926957.
CARGO: O. Legal.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Yhojann Andpla Escobar identificado con cédula de ciudadanía 86056744 de Villavicencio declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del **Consorcio Cubarral fase 2**

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del **Consorcio Cubarral fase 2.**
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No. 1179 de 2022 que tiene como objeto **CONSTRUCCION INTERCEPTOR ALCANTARRILLADO SANITARIO FASE II – POZO EXISTENTE A POZO 9**

Firmado a los días 14 del mes de 02 de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 86056744.
CARGO: Ing. Ambiental

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo HERNAN ANACONA ROA, identificado con cédula de ciudadanía 86059532 de V/CIO declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 19 del mes de 7 de año 2023

HERNAN ANACONA ROA

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 86059532
CARGO: ING Residente Obra

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Jose Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 742 01436 de Boyaca declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 24 del mes de Febrero de año 2023

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 742 01436
CARGO: Oficios

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA, identificado con cédula de ciudadanía 1121883802 de VILLAVICENCIO declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y dirijase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 14 del mes de FEBRERO. de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 1121883802.
CARGO: Inspectora de obra.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo ALEX Gualteros, identificado con cédula de ciudadanía 86071677 de Granada declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 17 del mes de Febrero de año 2023.

ALEX Gualteros
NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 86071677
CARGO: Oficial

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Rupto Mg, identificado con cédula de ciudadanía 3140510 de Cubarral declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 14 del mes de Febrero de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 3140510.
CARGO: Topografo

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Cristian Deivid Hernandez Mendez identificado con cédula de ciudadanía 1'121900390 de Villavicencio declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 14 del mes de Febrero de año 2023.

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 1' 121900 390
CARGO: Q. SST

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Jose Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 742.9/436 de Boyaca declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y dirijase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los dias 24 del mes de Febrero de año 2023

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 742 9C436
CARGO: Oficial

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo ALEX Gualteros, identificado con cédula de ciudadanía 86071677 de Granada declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los dias 14 del mes de Febrero. de año 2023.

ALEX Gualteros
NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 86071677
CARGO: Oficial

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	COMPROMISO DE SST	VERSIÓN: 1

COMPROMISO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Mediante el presente documento, Yo Rigoberto Mgr, identificado con cédula de ciudadanía 3140510 de Cubarral declaro lo siguiente:

1.Como trabajador me comprometo con el cuidado integral de mi salud y la de mis compañeros de trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales vigentes en, materia de seguridad y salud en el trabajo SST.
2.Conozco y entiendo la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio Cubarral fase 2.

Para ello me comprometo a:

- No trabajar bajo estado de embriaguez, alucinógenos y/o sustancias psicoactivas, ni consumirlas durante mi permanencia en las instalaciones del Consorcio Cubarral fase 2.
- Acatar y aplicar de manera oportuna los avisos y señalización de peligros y/o prevención.
- Acatar normas y procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor.
- Usar la dotación y elementos de protección personal asignados para el desarrollo de mis actividades.
- Diligenciar y cumplir con todos los documentos y requisitos exigidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones y/o frentes de trabajo.
- Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras que evidencie en el centro de trabajo.
- Hacer caso oportuno a las señales de alarma o emergencia y seguir las instrucciones de los brigadistas, así como las rutas de evacuación en completa calma y diríjase al punto de encuentro indicado.
- Reportar al prevencionista de SST cualquier accidente presentado en su frente de trabajo y realizar la investigación y ajustes necesarios para que no vuelva a ocurrir.

De acuerdo a lo anterior, certifico haber ido informado sobre las normas, procedimientos y recomendaciones de seguridad al ingresar a las labores en la obra del Contrato de Obra No.1179 de 2022 que tiene como objeto CONSTRUCCIÓN INTERCEPTOR ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL- META.

Firmado a los días 14 del mes de Febrero de año 2023

NOMBRE Y APELLIDO:
No. CÉDULA: 3140510.
CARGO: Topografo

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE CAPACITACIÓN	VERSIÓN: 1

Fecha: 6'02'2023. Lugar: P. Comunal. Fase 2.

Tipo de capacitación:

- [ ] Capacitación
- [x] Charla preoperacional
- [ ] Instrucción
- [ ] Capacitación a contratista

TEMAS TRATADOS	DURACIÓN
1. RIESGO BIOMECANICOS.	10 Minutos
2. RIESGO ELECTRICO	10 Minutos.
3.	

Declaro que recibido la capacitación o instrucción en el tema anotado. Asi mismo, declaro conocer, entender y aceptar plenamente el contenido de la formación e instrucciones dadas comprometiéndome a velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de buen servicio y seguridad respecto de las cuales se predica.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Cruz Romero.	17301970	CCF2.	
2	Yholann Ardila	86056744	CCF2.	
3	Cristhian Segura.	1'1249645?	CCF2.	
4	Erika Triana.	1'1718838?2	CCF2.	
5	Hernan Anacona	86059532.	CCF2.	Hernan Anacona R.
6	Jorge Nodeno.	79?.814.36.	CCF2.	
7	Alex. Gonzalez.	86011617	CCF2.	Alex. G.
8	Roberto Vargas.	3140510.	CCF2.	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

NOMBRE DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	FIRMA DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	EMPRESA
Cristian Hernandez		CCF2.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE CAPACITACIÓN	VERSIÓN: 1

Fecha: 8'02' 2023. Lugar: P. CUBARRAL FASE 2.

Tipo de capacitación:

- ☐ Capacitación
- ☒ Charla preoperacional
- ☐ Instrucción
- ☐ Capacitación a contratista

TEMAS TRATADOS	DURACIÓN
1. RIESGO QUIMICO.	10' Minutos
2.	
3.	

Declaro que recibido la capacitación o instrucción en el tema anotado. Así mismo, declaro conocer, entender y aceptar plenamente el contenido de la formación e instrucciones dadas comprometiéndome a velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de buen servicio y seguridad respecto de las cuales se predica.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	FIRMA
1	LUIS CRUZ ROMERO.	17'309 920.	CCF2.	
2	YHOJANN ARDILA.	86056 744.	CCF2	
3	CRISTHIAN SEGURA.	1'121926457	CC F2	
4	ERIKA TRIANA.	1121883802	CC F2.	
5	HERNAN ANACONA.	86059 531	CC F2.	HERNAN ANACONA R.
6	JORGE [illegible]	79'819.36.	CCF2.	
7	ALEX. [illegible]	86011617.	CC.F2	ALEX. C.
8	[illegible] . Vargas	314 0510.	CCF2	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

NOMBRE DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	FIRMA DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	EMPRESA
CRISTHIAN HERNANDEZ		CCF2.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE CAPACITACIÓN	VERSIÓN: 1

Fecha: 13'02'2023. Lugar: P. Cobaural Fase II

Tipo de capacitación:

- [ ] Capacitación
- [x] Charla preoperacional
- [ ] Instrucción
- [ ] Capacitación a contratista

	TEMAS TRATADOS	DURACIÓN
1.	Riesgo de autocuidado	10 minutos
2.		
3.		

Declaro que recibido la capacitación o instrucción en el tema anotado. Así mismo, declaro conocer, entender y aceptar plenamente el contenido de la formación e instrucciones dadas comprometiéndome a velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de buen servicio y seguridad respecto de las cuales se predica.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Cruz Romero.	17'309.920.	CCF2.	
2	Yhojann Abdita.	86'056.744.	CCF2.	
3	Cristhian Segura.	1'121926457	CCF2	
4	Erika Triana	1121883802	CCF2	
5	Hernan Arteaga.	86'059532.	CCF2	Hernan Arteaga R.
6	Jhon Nuñez	792.814.36	CCF2	
7	Alex. Gualteros	86011617	CCF2	Alex G.
8	Norberto Vargas.	314.0510	CCF2	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

NOMBRE DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	FIRMA DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	EMPRESA
Cristyan Heredia		CCF2

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE CAPACITACIÓN	VERSIÓN: 1

Fecha: 15' 02' 2023 Lugar: P. CORAGEN FASE II.

Tipo de capacitación:

- [ ] Capacitación
- [x] Charla preoperacional
- [ ] Instrucción
- [ ] Capacitación a contratista

	TEMAS TRATADOS	DURACIÓN
1.	Auto cuidado.	
2.	USO DE LOS EPPS.	15 minutos
3.	HIGIENE DE POSTURAS	

Declaro que recibido la capacitación o instrucción en el tema anotado. Así mismo, declaro conocer, entender y aceptar plenamente el contenido de la formación e instrucciones dadas comprometiéndome a velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de buen servicio y seguridad respecto de las cuales se predica.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	FIRMA
1	LUIS CRUZ POMEYO.	17' 304920.	CCF2.	
2	YHOJANN ARDILA.	86' 056 744.	CC F2	
3	CRISTHIAN SEGURA	1'121926157.	CC F 2.	
4	ERIKA TRIANA.	1121883802.	CC F 2.	
5	HERNAN ARACONA	86059532.	CCF2	HERNAN ARACONA R.
6	JORGE MORENO.	792.814.86.	CCF2	
7	ALEX CASTRO.	86 011 617.	CC F2	ALEX .C.
8	Daniela Vargas.	319.0510.	CCF2	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

NOMBRE DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	FIRMA DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	EMPRESA
Cristian Heredia		CCF2

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO DE CAPACITACIÓN	VERSIÓN: 1

Fecha: 16'02' 2023 Lugar: P. Cerrejon Faze 2.

Tipo de capacitación:

- ☐ Capacitación
- ☒ Charla preoperacional
- ☐ Instrucción
- ☐ Capacitación a contratista

TEMAS TRATADOS	DURACIÓN
1. RIESGO FISICO.	20 Minutos
2.	
3.	

Declaro que recibido la capacitación o instrucción en el tema anotado. Así mismo, declaro conocer, entender y aceptar plenamente el contenido de la formación e instrucciones dadas comprometiéndome a velar por el estricto cumplimiento de las condiciones de buen servicio y seguridad respecto de las cuales se predica.

DATOS DEL PERSONAL PARTICIPANTE				
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	EMPRESA	FIRMA
1	Luis Cruz Pomeru.	17304.920	CCF2.	
2	Yhojann Ardila.	86056 794	CCF2.	
3	Cristhian Segura.	1121926457.	CC F2.	
4	Erika Triana.	1121823802.	CC F 2.	
5	Hernan Anacona.	86059532.	CCF2	Hernan Anacona R.
6	Jose Nunez	7729.19.36.	CC F2	
7	Alex Cuentas	86'091 617	CCF 2	Alex. C.
8	Roberto Vargas.	314.051'0	CCF2	
9				
10				
11				
12				
13				
14				

NOMBRE DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	FIRMA DEL CAPACITADOR/RESPONSABLE	EMPRESA
Cristian H		CCF2.

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Empresa: Consorcio cubarral fase 2	Ciudad: Cubarral - Meta
Área/Proceso: Instalacion de sanitaria	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cubarral - Meta
Fecha de realización del Trabajo : 5-02-2023	fecha final del trabajo :11-02-2023
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas .inspeccion de maquinaria y engrase de maquinaria y encendido inspeccion de equipos para trabajo en alturas ,excavacion y toma de niveles con topografia - conformacion de banca o cama instalacion de tuberia sanitaria *delimitaciony señalizacion orden y aseo

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	palas ,picas, carretillas ,martillos .equipo de topografia / maseta
Eléctricas	X	planta electrica .- pulidoras -
Neumáticas		
Hidráulicas	X	retro excavadora de oruga , retro excavadora de llanatas
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP , ARNES ,CASCO , GUANTES ,GAFAS ,BOTAS DE SEGURIDAD ,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	MATERIAL DE EEXCAVACION , GRAVILLA ,MATERIAL DE RIO
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Powered by CamScanner

CONSORCIO CURARRAL PASE 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas	Físico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas, radiaciones Ionizantes, no Ionizantes	disminucion de la capacidad de concentracion ,somnolencia hipoacusia ,aumento de tension arterial ,lumbalgias ,lesiones de muñeca ,calambres ,hormiguillo .deshidratacion ,quemaduras enrojecimientos de la piel ,agotamiento ,golpes de calor	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) hidrtacion pausas activas
Localizacion de carcamo con equipos de topografia	Químico: Polvos, líquidos, gas/vapor, humo metálico, Material particulado, sustancia química.	alergias ,intoxicaciones ,irritaciones ,envenamientos lesiones cutaneas ,afectaciones en sistema nervioso y pulmones	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) disponer de cuarto alamacenamiento de químicos con sus fichas de seguridad y matriz de compatibilidad publicadas rotulacion de envases
localizacion de replanteo con equipos de topografia	Biológico: virus, bacterias, esporas, picaduras, fluidos virus Covid 19	infecciones respiratorias pulmonares ,contagiosas ,asfixia gripe fatiga fatalidad	desinfección de herramientas. Maquinaria, vestuario, zapatos y lavado De Manos. – uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección Gripe, fatiga, uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección y temperatura al personal, evitar aglomeración, entrega de kit de desinfección, charlas de seguridad, cumplimiento protocolo bioseguridad
	Biomecánico: posturas, esfuerzos Movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas	lumbalgias ,hernias fatiga muscular dolores osteomusculares lesiones en tendones neurovasculares de espalda trastornos musculo esqueleticos fatiga visual estrés laboral sobrecarga tunel carpiano	pausas activas, - verificar el levantamiento de cargas que no superen Lesiones en tendones, neurovasculares, de espalda, trastornos25kg, utilizar ayudas mecánicas como carreta de carga o ayuda de otro musculo esqueléticos. Compañero, acompañamiento inspector sst
	Condiciones de seguridad: 1.Mecánico, 2. locativo, 3. eléctrico 4. Tecnológico, 5. Públicos, 6. trabajo en alturas	atrapamientos ,aplastamientos ,arrastre proyeccion particulares ,friccion o abrasion -caida ,tropezones resbalones ,golpes ,heridas ,choques *electrocucion ,incendios ,quemaduras incendios ,escapes derrames intoxicaciones -robos ,extorsion ,accidentes transito secuestro caidas a diferente nivel fracturas invalidez fatalidad	diligenciamiento de permisos, ats, inspecciones de maquinaria y equipos Partículas, fricción o abrasión. entrenamiento para manipulación de maquinaria, verificar los resguardos 2. Caídas, tropezones, resbalones, golpes, heridas, choques orden y aseo en áreas de trabajo, uso de senderos peatonales, respeto de 3. Electrocución, incendios, quemaduras. Señalización, uso de epp, informar cambios de estado de áreas, De las maquinas, equipos, uso de epp, rotulación de sustancias toxicas o 4. Incendios, escapes, derrames, intoxicaciones. Químicas, uso de kit anti derrame, verificación licencias de conducción 5. robos, extorsión, accidentes tránsito, secuestro inspección de volquetas y vehículos, uso e inspección de equipos de 6. caídas a diferente nivel, fracturas, invalidez, fatalidad protección contra caídas, uso de sistemas de acceso, Acompañamiento inspector sst. Uso de epp Identificación, de punto de encuentro, charlas de seguridad. Adquirir enfermedades infecciosas, lesiones, golpes, caídas Suspender actividades en caso de que se presenten precipitaciones fatalidad Activar la alarma guiar al personal hacia las rutas de evacuación verificar las condiciones para reanudar actividades
	Fenómeno natural : Lluvias, vendavales, inundaciones, derrame, sismo, Terremotos.	adquirir enfermedades infecciosas , lesiones ,golpes caidas fatalidad	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la s
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor) Cristian Hernandez 1'124902300 **Firma**

Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL FASE 3	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

NOMBRE COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jorge Mauricio Moreno	74281436							
Alex Edilson Gualteros	86011617	ALEX G	ALEX G	ALEX G	ALEX G	ALEX G.	ALEX G.	
Ruperto Vargas Herrera	3140510							
Erika Triana	1121883802							
Rubén Sánchez porras	6650147							
Luis Cruz Romero	17304920							
Yhojann Ardila	86056744							
Cristhian Segura	1121926457							
FIRMA DEL P.SST Cristyan h	1121900390							
FIRMA DEL RESIDENTE Hernán Anacona	86059532	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Empresa: Consorcio cubarral fase 2	Ciudad: Cubarral - Meta
Área/Proceso: Instalacion de sanitaria	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cubarral - Meta
Fecha de realización del Trabajo : 13-02-2023	fecha final del trabajo :18-02-2023
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas .inspeccion de maquinaria y engrase de maquinaria y encendido inspeccion de equipos para trabajo en alturas ,excavacion y toma de niveles con topografia - conformacion de banca o cama instalacion de tuberia sanitaria *delimitaciony señalizacion orden y aseo

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	palas ,picas, carretillas ,martillos .equipo de topografia / maseta
Eléctricas	X	planta electrica .- pulidoras -
Neumáticas		
Hidráulicas	X	retro excavadora de oruga , retro excavadora de llanatas
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	N/A
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP , ARNES ,CASCO , GUANTES ,GAFAS ,BOTAS DE SEGURIDAD ,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	MATERIAL DE EEXCAVACION , GRAVILLA ,MATERIAL DE RIO
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBANAL FASE 2	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas	Fisico: Ruido, Iluminación, vibración, temperaturas, radiaciones Ionizantes, no ionizantes	disminucion de la capacidad de concentracion ,somnolencia hipoacusia ,aumento de tension arterial ,lumbalgias ,lesiones de muñeca ,calambres ,hormiguillo .deshidratacion ,quemaduras enrojecimientos de la piel ,agotamiento ,golpes de calor	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) hidrtacion pausas activas
Localizacion de carcamo con equipos de topografia	Químico: Polvos, líquidos, gas/vapor, humo metálico, Material particulado, sustancia química.	alergias ,intoxicaciones ,irritaciones ,envenamientos lesiones cutaneas ,afectaciones en sistema nervioso y pulmones	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) disponer de cuarto alamacenamiento de quimicos con sus fichas de seguridad y matriz de compatibilidad publicadas rotulacion de envases
localizacion de replanteo con equipos de topografia	Biológico: virus, bacterias, esporas, picaduras, fluidos virus Covid 19	infecciones respiratorias pulmonares ,contagiosas ,asfixia gripe fatiga fatalidad	desinfección de herramientas. Maquinaria, vestuario, zapatos y lavado De Manos. – uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección Gripe, fatiga, uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección y temperatura al personal, evitar aglomeración, entrega de kit de desinfección, charlas de seguridad, cumplimiento protocolo bioseguridad
	Biomecánico: posturas, esfuerzos Movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas	lumbalgias ,hernias fatiga muscular dolores osteomusculares lesiones en tendones neurovasculares de espalda trastornos musculo esqueleticos fatiga visual estrés laboral sobrecarga tunel carpiano	pausas activas, - verificar el levantamiento de cargas que no superen Lesiones en tendones, neurovasculares, de espalda, trastornos25kg, utilizar ayudas mecánicas como carreta de carga o ayuda de otro musculo esqueléticos. Compañero, acompañamiento inspector sst
	Condiciones de seguridad: 1.Mecánico, 2. locativo, 3. eléctrico 4. Tecnológico, 5. Públicos, 6. trabajo en alturas	atrapamientos ,aplastamientos ,arrastre proyeccion particulares ,friccion o abrasion -caida ,tropezones resbalones ,golpes ,heridas ,choques *electrocucion ,incendios ,quemaduras Incendios ,escapes derrames intoxicaciones -robos ,extorsion ,accidentes transito secuestro caidas a diferente nivel fracturas invalidez fatalidad	diligenciamiento de permisos, ats, inspecciones de maquinaria y equipos Particulas, fricción o abrasión. entrenamiento para manipulación de maquinaria, verificar los resguardos 2. Caídas, tropezones, resbalones, golpes, heridas, choques orden y aseo en áreas de trabajo, uso de senderos peatonales, respeto de 3. Electrocución, incendios, quemaduras. Señalización, uso de epp, informar cambios de estado de áreas, De las maquinas, equipos, uso de epp, rotulación de sustancias toxicas o 4. Incendios, escapes, derrames, intoxicaciones. Quimicas, uso de kit anti derrame, verificación licencias de conducción 5. robos, extorsión, accidentes tránsito, secuestro inspección de volquetas y vehiculos, uso e inspección de equipos de 6. caídas a diferente nivel, fracturas, invalidez, fatalidad protección contra caídas, uso de sistemas de acceso, Acompañamiento inspector sst. Uso de epp Identificación, de punto de encuentro, charlas de seguridad. Adquirir enfermedades infecciosas, lesiones, golpes, caídas Suspender actividades en caso de que se presenten precipitaciones fatalidad Activar la alarma guiar al personal hacia las rutas de evacuación verificar las condiciones para reanudar actividades
	Fenómeno natural : Lluvias, vendavales, inundaciones, derrame, sismo, Terremotos.	adquirir enfermedades infecciosas , lesiones ,golpes caidas fatalidad	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la s
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor) **Firma**

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 3	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

NOMBRE COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jorge Mauricio Moreno	74281436							
Alex Edilson Gualteros	86011617	ALEX.G	ALEX.G.	ALEX.G.	ALEX.G.	ALEX.G.	ALEX.G.	
Ruperto Vargas Herrera	3140510							
Erika Triana	1121883802							
Rubén Sánchez porras	6650147							
Luis Cruz Romero	17304920							
Yhojann Ardila	86056744							
Cristhian Segura	1121926457							
FIRMA DEL P.SST Cristyan h	1121900390							
FIRMA DEL RESIDENTE Hernán Anacona	86059532	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Empresa: Consorcio cubarral fase 2	Ciudad: Cubarral - Meta
Área/Proceso: Instalacion de sanitaria	Ubicación donde se realiza el trabajo: Cubarral - Meta
Fecha de realización del Trabajo : 20.02.2023.	fecha final del trabajo : 25'02'2023.
Hora de Inicio (a.m./p.m.): 7:00 am	Hora de Finalización (a.m./p.m.): 5:00 pm

Descripción de la tarea a realizar: Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas .inspeccion de maquinaria y engrase de maquinaria y encendido inspeccion de equipos para trabajo en alturas ,excavacion y toma de niveles con topografia - conformacion de banca o cama instalacion de tuberia sanitaria *delimitaciony señalizacion orden y aseo

PARA ESTE TRABAJO SE REQUIERE PERMISO DE:

TRABAJO EN ALTURA	ESPACIO CONFINADO	CALIENTE
ENERGIA PELIGROSAS	OTRO, CUAL?	

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR

EQUIPOS Y		*Indique cada una de las herramientas a utilizar.*
Manuales	X	palas ,picas, carretillas ,martillos .equipo de topografia
Eléctricas	X	planta electrica .- pulidoras -
Neumáticas		
Hidráulicas	X	retro excavadora de oruga , retro excavadora de llanatas
Mecánicas		
Otras		

ANALISIS DE LA TAREA

¿Qué tan alto se encuentra el lugar de trabajo?	N/A
¿Cuál es el sistema de acceso al lugar de trabajo?	N/A
¿Se han establecido los puntos de anclaje?	N/A
¿Se han realizado los cálculos de la distancia de caída?	N/A
¿Cuáles son los sistemas de prevención y protección requeridos?	ARNES ,ESLINGAS ,LINEAS DE VIDA EPP (CASCO ,GAFAS,GUANTES .BOTAS PUNTA DE ACERO
¿Cuáles son los elementos de protección requeridos?	EPP , ARNES ,CASCO , GUANTES ,GAFAS ,BOTAS DE SEGURIDAD ,
¿Cuántos trabajadores se requieren?	2.
¿Qué materiales y recursos van a utilizarse?	MATERIAL DE EEXCAVACION , GRAVILLA ,MATERIAL DE RIO
¿Existen hoyos o grietas debajo del área de trabajo?	N/A
¿Hay peligro de resbalar o tropezar alrededor del área de trabajo?	N/A.
¿Qué otros peligros hay en el lugar de trabajo? (chispas, electricidad, químicos, superficie resbaladiza, superficies calientes, objetos filosos, cargas pesadas, etc.)	

Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL PARTE 2	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

Pasos detallados de la tarea	Peligros existentes y	Consecuencias	Controles Requeridos
Desplazamiento area de trabajo - alistamiento de herramientas	Físico: Ruido, iluminación, vibración, temperaturas, radiaciones Ionizantes, no ionizantes	disminucion de la capacidad de concentracion ,somnolencia hipoacusia ,aumento de tension arterial ,lumbalgias ,lesiones de muñeca ,calambres ,hormiguillo .deshidratacion ,quemaduras enrojecimientos de la piel ,agotamiento ,golpes de calor	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) hidrtacion pausas activas
Localizacion de carcamo con equipos de topografia	Químico: Polvos, líquidos, gas/vapor, humo metálico, Material particulado, sustancia química.	alergias ,intoxicaciones ,Irritaciones ,envenamientos lesiones cutaneas ,afectaciones en sistema nervioso y pulmones	uso de epp (gafas ,tapabocas , guantes ,casco, botas punta de acero) disponer de cuarto alamacenamiento de químicos con sus fichas de seguridad y matriz de compatibilidad publicadas rotulacion de envases
localizacion de replanteo con equipos de topografia	Biológico: virus, bacterias, esporas, picaduras, fluidos virus Covid 19	infecciones respiratorias pulmonares ,contagiosas ,asfixia gripe fatiga fatalidad	desinfección de herramientas. Maquinaria, vestuario, zapatos y lavado De Manos. – uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección Gripe, fatiga, uso de epp, distanciamiento social, control de desinfección y temperatura al personal, evitar aglomeración, entrega de kit de desinfección, charlas de seguridad, cumplimiento protocolo bioseguridad
	Biomecánico: posturas, esfuerzos Movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas	lumbalgias ,hernias fatiga muscular dolores osteomusculares lesiones en tendones neurovasculares de espalda trastornos musculo esqueleticos fatiga visual estrés laboral sobrecarga tunel carpiano	pausas activas, - verificar el levantamiento de cargas que no superen Lesiones en tendones, neurovasculares, de espalda, trastornos25kg, utilizar ayudas mecánicas como carreta de carga o ayuda de otro musculo esqueléticos. Compañero, acompañamiento inspector sst
	Condiciones de seguridad: 1.Mecánico, 2. locativo, 3. eléctrico 4. Tecnológico, 5. Públicos, 6. trabajo en alturas	atrapamientos ,aplastamientos ,arrastre proyeccion particulares ,friccion o abrasion -caida ,tropezones resbalones ,golpes ,heridas ,choques *electrocucion ,incendios ,quemaduras incendios ,escapes derrames intoxicaciones -robos ,extorsion ,accidentes transito secuestro caidas a diferente nivel fracturas invalidez fatalidad	diligenciamiento de permisos, ats, inspecciones de maquinaria y equipos Particulas, fricción o abrasión. entrenamiento para manipulación de maquinaria, verificar los resguardos 2. Caídas, tropezones, resbalones, golpes, heridas, choques orden y aseo en áreas de trabajo, uso de senderos peatonales, respeto de 3. Electrocución, incendios, quemaduras. Señalización, uso de epp, informar cambios de estado de áreas, De las maquinas, equipos, uso de epp, rotulación de sustancias toxicas o 4. Incendios, escapes, derrames, intoxicaciones. Quimicas, uso de kit anti derrame, verificación licencias de conducción 5. robos, extorsión, accidentes tránsito, secuestro inspección de volquetas y vehículos, uso e inspección de equipos de 6. caídas a diferente nivel, fracturas, invalidez, fatalidad protección contra caidas, uso de sistemas de acceso, Acompañamiento inspector sst. Uso de epp Identificación, de punto de encuentro, charlas de seguridad. Adquirir enfermedades infecciosas, lesiones, golpes, caidas Suspender actividades en caso de que se presenten precipitaciones fatalidad Activar la alarma guiar al personal hacia las rutas de evacuación verificar las condiciones para reanudar actividades
	Fenómeno natural : Lluvias, vendavales, inundaciones, derrame, sismo, Terremotos.	adquirir enfermedades infecciosas , lesiones ,golpes caidas fatalidad	

EVALUACION DEL RIESGO

¿Es posible, probable o casi-seguro que ocurra un incidente?

- ☐ Si, deténgase y no proceda con la tarea. Analice con el supervisor encargado el paso a paso, revisen controles y responda la s
- ☐ No, continúe con la tarea con precaución, implemente los controles establecidos.

¿Es seguro proceder ahora en la tarea con los controles adicionales?

- ☐ Si, proceda con la tarea.
- ☐ No, consulte al supervisor antes de tomar cualquier decisión.

Nombre y Cedula de la persona (Emisor),

Firma

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FR-SST-
CONSORCIO CUBARRAL FASE 2	FORMATO ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO - ATS	VERSIÓN: 01

NOMBRE COLABORADORES	CEDULA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Jorge Mauricio Moreno	74281436							
Alex Edilson Gualteros	86011617	ALEX. G	ALEX G	ALEX G	ALEX G.	ALEX G.	ALEX G.	
Ruperto Vargas Herrera	3140510							
Erika Triana	1121883802							
Rubén Sánchez porras	6650147							
Luis Cruz Romero	17304920							
Yhojann Ardila	86056744							
Cristhian Segura	1121926457							
FIRMA DEL P.SST Cristyan h	1121900390							
FIRMA DEL RESIDENTE Hernán Anacona	86059532	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	HERNAN ANACONA	

OBSERVACIONES:


Powered by CamScanner

CONSORCIO CUBARRAL FASE 2

RELACION DEL PERSONAL PROYECTO CUBARRAL FASE 2

CARGO	NOMBRE APELLIDO	CEDULA	AFP	EPS	ARL
DIRECTOR DE OBRA	LUIS CRUZ ROMERO	30083437	185.600	145.000	16.200
			COLPESIONES	SANITAS	SURA
RESIDENTE DE OBRA	HILBER HERNAN ANACONA	86059532	253.900	63.500	110.500
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
INSPECTOR DE OBRA	ERIKA TRIANA BOBADILLA	1121883802	128.000	32.000	55.700
			PORVENIR	SANITAS	SURA
PROFESIONAL SST	CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MEDEZ	1121900390	106.700	26.700	46.500
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
PROFESIONAL AMBIENTAL	YHOJANN ARDILA ESCOBAR	86056774	185.600	145.000	16.200
			PROTECCION	CAJA COOPI	SEGURO BOLIVAR
INGENIERO ADMINISTRATIVO	CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO	1121926457	148.500	37.200	37.200
			PORVENIR	NUEVA EPS	SURA
CADENERO PRIMERO	RUPERTO VARGAS HERRERA	3140510	288.000	225.000	125.280
			PROTECCION	SALUDTOTAL	SURA
OFICIAL DE OBRA	ALEX GUALTEROS	86011617	288.000	225.000	125.280
			PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA
OFICIAL DE OBRA	JORGE MAURICIO MORENO	74281436	288.000	225.000	125.280
			PORVENIR	SALUDTOTAL	SURA

OBSERVACIÓN: El personal ingresado en el periodo de 01 de febrero de 2023 al 24 de febrero de 2023; no tiene pago de parafiscales a la fecha; el pago se debe realizar al mes vencido; por lo tanto, se anexará en el siguiente informe.



HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

NOMBRE	:	LUIS
APELLIDO	:	CRUZ ROMERO
FECHA NACIMIENTO	:	AGOSTO 8 DE 1951
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	:	No. 17.304.920 V/CIO
LIBRETA MILITAR	:	No. E 133468 Distrito – 3
MATRICULA PROFESIONAL	:	25202-03721 Cundínamarca
ESTADO CIVIL	:	CASADO
DIRECCIÓN	:	CALLE 14ª No 54ª -14 Casa I-17 TEL No. 6826584 Villavicencio.


ESTUDIOS REALIZADOS

PRIMARIA	:	CINCO (5) AÑOS ANEXA AL INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS (VILLAVICENCIO)
SECUNDARIA	:	SEIS (6) AÑOS INSTITUTO FRANCISCO JOSE DE CALDAS (VILLAVICENCIO)

Calle 38 N° 31-58 Edificio Centro Bancario Oficina 406
Telefax: 6624603
Celular: 315-3261951 - 3112873571
Villavicencio (Meta).
Correo electrónico: lucrurom@yahoo.com

UNIVERSITARIOS : INGENIERIA CIVIL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA BOGOTA.

Relación de Experiencia Laboral Adjunta:



ING. LUIS CRUZ ROMERO
C.C. No. 17.304.920 de Villavicencio
M.P. No. 25202-03721 CND

Calle 38 N° 31-58 Edificio Centro Bancario Oficina 406
Telefax: 6624603
Celular: 315-3261951 - 3112873571
Villavicencio (Meta).
Correo electrónico: lucrurom@yahoo.com

HOJA DE VIDA



Datos Personales

NOMBRE	HILBER HERNAN ANACONA ROA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	86.059.532 de VILLAVICENCIO
FECHA DE NACIMIENTO	04-NOV-1978
LUGAR DE NACIMIENTO	VILLAVICENCIO, META
ESTADO CIVIL	SOLTERO
CIUDAD	VILLAVICENCIO, META
DIRECCIÓN	CALLE 25 No 7ª – 93 MENEGUA
TELÉFONO	3203267889
E-MAIL	Ing.hernan.anacona@hotmail.com

Estudios

Estudios Primarios:	ESCUELA RURAL DE PUERTO PORFIA 5to DE PRIMARIA PUERTO PORFIA – META
Estudios Secundarios:	COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 11 BACHILLER ACADEMICO VILLAVICENCIO, META
Universitarios:	UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA INGENIERO CIVIL VILLAVICENCIO, META
Especialización:	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION TUNJA, BOYACA
Especialización:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA VIAS Y TRANSPORTE EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FINALIZO LA ESPECIALIZACION

Experiencia Laboral

Nombre de la empresa: COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES LTDA
Cargo: INGENIERO INSPECTOR
Funciones: INGENIERO INTERVENTOR
Jefe Inmediato: LUIS EDUARDO CUESTA GOMEZ
Telefono: 3127166648
Inicio de labores: 14 – OCT – 2013
Finalizaciòn: 30 – JUNIO – 2014

Nombre de la empresa: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA RECREATIVA UT
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Jefe Inmediato: WISTON ONESIMO HERNANDEZ CASALLAS
Telefono: 313 8401107
Inicio de labores: 04 – DIC – 2014
Finalizaciòn: 03 – JUNIO - 2015

Nombre de la empresa: SG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Jefe Inmediato: OSCAR EDUARDO HENAO ALVAREZ
Telefono: 321 6455210
Inicio de labores: 10 – AGOSTO – 2015
Finalizaciòn: 21 – NOV – 2015

Nombre de la empresa: UNION TEMPORAL LA JULIA 2014
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Jefe Inmediato: LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ
Telefono: 315 3261951
Inicio de labores: 04 – ENERO – 2016
Finalizaciòn: 07 – JUNIO – 2016

Nombre de la empresa: CONSORCIO PLUVIAL CASTILLO 2016
Cargo: RESIDENTE DE OBRA
Jefe Inmediato: MIGUEL CAMILO ORTIZ CESPEDES
Telefono: 314 3817285
Inicio de labores: 03 – AGOSTO – 2016
Finalizaciòn: 15 – JUNIO – 2017

Nombre de la empresa: CONSORCIO ORION 2017
Cargo: RESIDENTE AUXILIAR DE INGENIERIA
Jefe Inmediato: MIGUEL ALEJANDOR PINZON
Telefono: 310 5602708
Inicio de labores: 01 – JULIO – 2017
Finalizaciòn: 31 – DICIEMBRE – 2017

Nombre de la empresa: CONSORCIO BUENAVENTURA 2018
Cargo: INGENIERO RESIDENTE
Jefe Inmediato: DIEGO FERNANDO PERALTA CHAVEZ
Telefono: 315 2846847
Inicio de labores: 01 – SEPTIEMBRE – 2018
Finalizaciòn: 16 – DICIEMBRE – 2020

Nombre de la empresa: CONSORCIO ACACIAS 2020
Cargo: INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
Jefe Inmediato: JESUS FABIAN PINTO
Telefono: 3124017360
Inicio de labores: 15 – JULIO – 2021
Finalizaciòn: 16 – SEPTIEMBRE – 2022

Referencias Familiares


CARLOS RAMOS ROA: ARQUITECTO
Telefono: 320 8014068

DIANA MARIA ANACONA: ODONTOLOGA
Telefono: 313 8191297

Referencias Personales

MARCELA MOSQUERA: CONTADORA PUBLICA
Telefono: 313 3416656

RICARDO BRAVO TAMAYO: INGENIERO CIVIL
Telefono: 313 2687622



HILBER HERNAN ANACONA ROA
C.C.: 86059532 DE VILLAVICENCIO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.059.532

ANACONA ROA

APELLIDOS

HILBER HERNAN

NOMBRES

HERNAN ANACONA ROA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1978

VILLAVICENCIO
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

04-ABR-1997 VILLAVICENCIO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5200100-00172661-M-0086059532-20090825 0015394694A 1 6760028896

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:22:55 PM horas del 10/01/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **86059532**
Apellidos y Nombres: **ANACONA ROA HILBER HERNAN**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 10 de enero de 2023, a las 15:20:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	86059532
Código de Verificación	86059532230110152046

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 213038336

WEB
15:21:59

Bogotá DC, 10 de enero del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) HILBER HERNAN ANACONA ROA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 86059532:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Primera Clase

86059532

PERTENECE AL EJERCITO DE

1A. LINEA | 2A. LINEA | 3A. LINEA

31 - DIC 98 | 31 - DIC 13 | 31 - DIC 23

APELLIDOS Y NOMBRES

ANACONA ROA
HILBER HERNAN

LIM BA307 ESP. MIL FUSILERO

PROFESION BACHILLER


MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL

Este es un documento publico y es requisito presentarlo para los siguientes actos:

- Tomar posesión de los empleos públicos o privados
- Ingresar a la carrera administrativa
- Obtener o refrendar el pase o licencia para conducir vehículos
- Registrar título cortio profesional y ejercer la profesión
- Firmar contratos con cualquier entidad publica o privada
- Obtener el pasaporte e ingresar a la universidad

2. [illegible] convocatoria de reservas, de llamamiento especial o de movilización debe efectuar presentación inmediata en el cuerpo de tropa mas cercano al lugar de su residencia con el fin de recibir instrucciones.

86059532

[illegible] MEDINA RECUERO IVAN D. 26-OCT-98



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 86059532

NOMBRE

HILBER HERNAN ANACONA ROA

FECHA DE NACIMIENTO

04-11-1978

SANGRE-RH

B-

FECHA DE EXPEDICION

25-02-2014

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

INST DPTAL TTOyTTE META/RESTREPO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHÍCULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOCICLO DE [illegible]	10-01-2022	PARTICULAR
B1	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS	25-02-2024	PARTICULAR
C1	AUTOMOVIL MOTOCARRO CAMPERO CAMIONETA [illegible]	25-02-2017	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC05000323788




REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

MATRÍCULA PROFESIONAL No.
25202-276596 CND
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **16/05/2014**
HILBER HERNAN
ANACONA ROA
C.C. 86059532
UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA

PRESIDENTE DEL CONSEJO

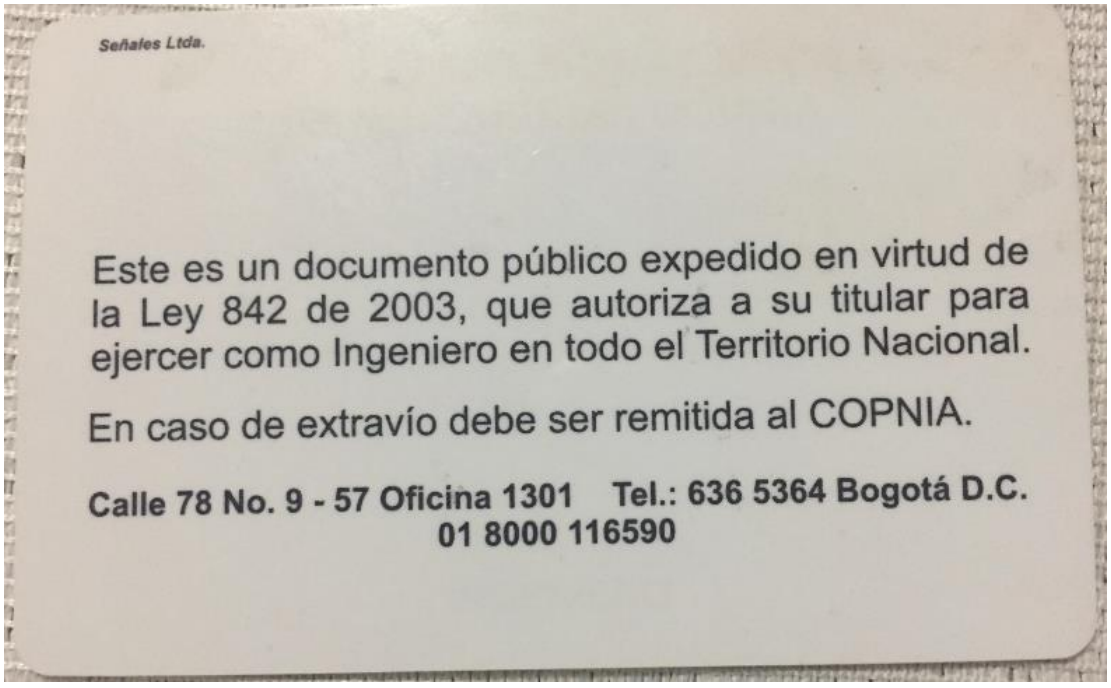

Señales Ltda.

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA.

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel.: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2023-1778551

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que HILBER HERNAN ANACONA ROA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 86059532, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-276596 desde el 16 de Mayo de 2014, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 713.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Enero del año dos mil veintitres (2023).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1960 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

HILBER HERNÁN ANACONA ROA

con cédula de ciudadanía No. 86.059.532 de Villavicencio
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERO CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma
y se firma en Villavicencio el día 13 de Diciembre de 2013

Director(a) Sede

Rector

Gloria Patricia Ramos
Secretario(a) General

Folio No. 52 Libro de Registros No. 4 Registro No. 467 Refrendado en Villavicencio el día 13 de Diciembre de 2013

Registros y Diplomas Nidey Yamile Cortés Rocha

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 29 de Diciembre de 1961 del Ministerio de Educación Nacional
Resolución No. 331 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

Acta Individual de Graduación No. 016

PROGRAMA: INGENIERÍA CIVIL

CÓDIGO SNIES: 9105

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

LUGAR: UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE VILLAVICENCIO

En atención a que HILBER HERNAN ANACONA ROA
con cédula de ciudadanía No 86.059.532 de Villavicencio
cumplió todos los requisitos exigidos por las normas legales y estatutarias, le expide
el título de INGENIERO CIVIL.

Lo anterior, atendiendo la aprobación del Consejo Académico de la Sede VILLAVICENCIO
mediante Acta No. 016 en sesión del día 13 de Noviembre de 2013.

Para constancia se autorizó este título por parte del Rector, Director Académico de la Sede,
Decano de la facultad y la Secretaria General de la Universidad, así:

Rector: CÉSAR AUGUSTO PÉREZ GONZÁLEZ

Director(a) Académico de la Sede CÉSAR AUGUSTO PÉREZ LONDOÑO

Decano(a) Facultad RAUL ALARCON BERMUDEZ

Secretaria General GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS

Se expide la presente Acta en la ciudad de VILLAVICENCIO el día 13 DE DICIEMBRE DE 2013.

Gloria Patricia Rave I

GLORIA PATRICIA RAVE IGLESIAS
Secretaria General


UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION
HILBER HERNAN
ANACONA ROA
EGRESADO


UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
Este carné es personal e intransferible.
Acredita al titular como
EGRESADO DE LA
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
En caso de encontrarlo hacerlo llegar a
cualquiera de las Sedes o Seccionales
de la Universidad.
86059532

República de Colombia

LA UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Teniendo en cuenta que

Hilber Hernán Anacona Roa

C.C. N°. 86.059.532 de Villavicencio

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción

En constancia se firma y sella en Tunja
a los 22 días del mes de junio de 2018

El Rector General

El Rector Seccional

El Decano de Facultad

El Secretario Seccional

Registro interno No. 439.323.22-06-2018

Libro 18 Folio 10

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA
T U N J A

ACTA DE GRADO 323.93

En la ciudad de Tunja, República de Colombia el día 22 de junio de 2018, la Universidad Santo Tomás en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1966, bajo la Presidencia del Padre JORGE FERDINANDO RODRIGUEZ RUIZ O.P., Rector Seccional y actuando como Secretario el Abogado HERMAN JOSE ARANDA CAMACHO, celebró sesión solemne y pública con el objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
Código SNIES:105365

A: HILBER HERNAN ANACONA ROA
C.C. 86.059.532 de Villavicencio

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución, las leyes de la República de Colombia, poner todo empeño en el desarrollo del País y de sus instituciones, brindar generoso apoyo a los programas de justicia social y dignificación de la persona humana y llevar siempre en alto el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás. Seguidamente el presidente de la ceremonia de graduación procedió a la entrega del Diploma que lo acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales correspondientes.

Fdo. Jorge Ferdinando Rodríguez Ruiz O.P. (Hay un sello)
Fdo. Herman Jose Aranda Camacho (Hay un sello)

Es fiel copia tomada del original, expedida en la ciudad de Tunja, el día 22 de junio del año 2018.

El Secretario General Seccional,

HERMAN JOSE ARANDA CAMACHO

Vigilada Min-educación.

Popayán, 03 de Julio 2014.

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES L.T.D.A.

HACE CONSTAR:

Que el Ingeniero HILBER HERNAN ANACONA ROA C.C. 86.059.532 de Villavicencio Meta y Matricula Profesional No. 25202-276596 CND, presto sus servicios profesionales como INGENIERO INSPECTOR DE OBRA en el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 1120 DEL 2013.**

OBJETO: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS - PROGRAMA CAMINOS DE LA PROSPERIDAD - DEPARTAMENTO DEL META (MODULO DOS (2)** que **ejecutará LA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA,** como adjudicataria del mismo, contando con un tiempo de dedicación para el mismo conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, la Propuesta Económica y sus respectivos anexos.

Fecha de iniciación: 14 de Octubre de 2013.

Fecha de terminación: 30 de Junio de 2014.

Dedicación: 100%

Que el Ingeniero HILBER HERNAN ANACONA ROA, ha cumplido a cabalidad con eficiente capacidad, tanto técnica como Humana demostrando un gran desempeño en sus labores.

Se expide la presente certificación a los tres (03) días del mes de Julio del año dos mil catorce 2014.

Atentamente,

ANA LUCIA MARTINEZ
Representante Legal
R.L. COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.
Calle 64 Bis No 9 – 69 Popayán Cauca
Cel: 3143354419.

CONTRATO 393 DE 2014 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y CONCHA ACUSTICA DE PARQUE UBICADO ENTRE LA CARRERA 6 TA CARRERA 7 Y CALLE 15, CALLE 16 BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE INIRIDA GUANIA.

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA RECREATIVA UT

NIT 900787425-9

CERTIFICA:

Yo, WINSTON ONESIMO HERNANDEZ CASALLAS en mi calidad de representante legal de la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA RECREATIVA UT hago constar que el señor HILBER HERNAN ANACONA ROA con cedula de ciudadanía No 86.059.532 se desempeñó como Residente de Obra en el CONTRATO 393 DE 2014 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO Y CONCHA ACUSTICA DE PARQUE UBICADO ENTRE LA CARRERA 6 TA CARRERA 7 Y CALLE 15, CALLE 16 BARRIO EL CENTRO MUNICIPIO DE INIRIDA GUANIA, durante el periodo comprendido del 4 de Diciembre de 2014 al 3 de junio de 2015.

Demostrando honestidad compromiso y responsabilidad en los procesos dirigidos.

Lo anterior se expide a solicitud del interesado a los 18 días del mes de junio de 2015

WINSTON ONESIMO HERNANDEZ CASALLAS.
RLP: UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA RECREATIVA UT
CEL 3138401107

ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.

Acacias Meta
25 de noviembre 2015

Asunto: CERTIFICADO LABORAL
ING. HILBER HERNAN ANACONA ROA.

La empresa SG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S. identificada con el Nit. 900662012-2 certifica que el señor HILBER HERNAN ANACONA ROA identificado con cc 86´059.532 laboro en el cargo de ingeniero residente desde el 10 de agosto hasta el 21 de noviembre, para la construcción de nueva sede de BCS Banco Caja Social sede Acacias Meta, en dicho cargo se encontraba a cargo de supervisar y dirigir las actividades de excavaciones, fundaciones, columnas vigas y toda la estructura en general, desempeñándose de manera favorable para el desarrollo óptimo de las actividades.

Este documento se expide por solicitud del interesado y para corroborar su veracidad contactar a:



Arq. Oscar Eduardo Henao Alvarez
Tel. 321 645 52 10.

SG ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A.S.
Cra 76 53-79 Int 218
E-mail: srgomez74@yahoo.es

SECTOR ESTADIO- MEDELLIN
Telefax: 2347087
Movil: 311 337 25 66

UNION TEMPORAL
LA JULIA 2014

CERTIFICADO DE TRABAJO

De conformidad con la obligación 7ª Del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo

CERTIFICAMOS

Que el señor **ANACONA ROA HILBER HERNAN**, identificado con **86.059.532** expedida en Villavicencio, laboro para esta empresa desde el Cuatro (04) de Enero de 2016 hasta 07 de Junio del mismo año, en la ejecución del contrato de obra No. **063 DE 2015**, cuyo objeto es: "**MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO VEREDA LA JULIA EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE – META Y CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL VEREDA LA JULIA EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE - META**", desempeñando el cargo y funciones de **INGENIERO RESIDENTE.**

Esta certificación se expide en Villavicencio (Meta), a los 07 días del mes de Junio de 2016.

Cordialmente,

LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ
C.C. 86.086.659 Villavicencio (Meta)
R.L NIT. 900.812.091-1

Calle 38 N° 31-58 Oficina 701 Edificio Banco Popular
Ingvicoltda@hotmail.com – lucrurom@yahoo.com
Cel.: 315-3261951 - 3112873571
Villavicencio - Meta

Villavicencio, 19 DE JULIO DEL 2017

CPC-2016-I-EC-038

CERTIFICACIÓN

Referencia: Contrato De Obra No. 099 De 2016.
Objeto: "Construcción Alcantarillado Pluvial Cl 7-7A Transv. 9A-CR 9A, CL 8 Transv 9-CR 9A, CL 9 CR 9-9A, CL 7-9, CR 3-5 CL 12-13, CL 13 CR 5-Desc Caño Agua Viva y Canal de Aguas Lluvias Barrios Alfonso Meneses, El Progreso, El Jardín, El Centro y Desc Caño Hondo en el Municipio de El Castillo, Meta".

Asunto: Certificación Laboral.

El Consorcio Pluvial Castillo 2019 hace constar que el Ingeniero Civil HILBER HERNAN ANACONA ROA, identificado con la cedula de ciudadanía N° 86.059.532 de Villavicencio Meta, con Matricula Profesional N° 25202-276596 CDN. Laboro en el proyecto del objeto a mención desde el 03 de agosto del 2016 hasta el 15 de junio del 2017, desempeñando el cargo como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**. Cumplió a cabalidad con eficiencia y capacidad, tanto técnica como humana demostrando un gran desempeño en sus labores.

Para constancia de lo anterior se firma en Villavicencio a los diecinueve (19) días del mes de julio del dos mil diecisiete (2017).

Atentamente,

ING. MIGUEL CAMILO ORTIZ CESPEDES
R/L CONSORCIO PLUVIAL CASTILLO 2016
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO ORIÓN 2017
NIT. NO. 901.085.251-5

EL SUSCRITO MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L CONSORCIO ORION 2017
Nit No: 901.085.251-5

CERTIFICA:

Que el Ingeniero **HILBER HERNAN ANACONA ROA** identificado con Cédula de Ciudadanía No 86.059.532 de Villavicencio y Matrícula Profesional No. 25202-276596 CND. Prestó sus servicios en Calidad de **RESIDENTE AUXILIAR DE INGENIERÍA**, para el desarrollo del Contrato descrito a continuación:

CONTRATO No	88-6-100022-17
CONTRATANTE	POLICIA NACIONAL-POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.
CONTRATISTA	CONSORCIO ORION 2017.
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES POLICIALES CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.**
FECHA DE INICIO	**1 DE JULIO DE 2017**
FECHA DE TERMINACIÓN	**31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Durante este periodo el profesional demostró idoneidad y responsabilidad acorde con sus funciones.

La anterior se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de enero de 2018.

Sin otro particular,

MIGUEL ALEJANDRO PINZÓN AGUILAR
R.L. CONSORCIO ORION 2017
Nit. No. 901.085.251-5

CONSORCIO BUENAVENTURA 2018

CERTIFICADO DE TRABAJO

De conformidad con la obligación 7ª Del Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo

CERTIFICAMOS

Que el(la) señor(a) **ANACONA ROA HILBER HERNAN**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **86,059,532** expedida en VILLAVICENCIO, laboró para **EL CONSORCIO BUENAVENTURA 2018,** identificado con Nit 901.196.596-7 desde el 10 de septiembre de 2018 hasta el 16 de diciembre de 2020, en la ejecución del CONTRATO DE OBRA No. 1.310.02-59.8-3633 cuyo objeto es "**REHABILITACIÓN DE LA VIA SIMON BOLIVAR TRAMO EL PAILON-AGUA CLARA, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA**", desempeñando el cargo y las funciones de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA.**

Se expide en Villavicencio (Meta), a los 16 días del mes de diciembre de 2020.

Cordialmente,

Ing. LUIS ALEJANDRO CRUZ RUIZ
C.C. 86.086.659 de Villavicencio
R.L. CONSORCIO BUENAVENTURA 2018
Nit. 901.196.596-7

Elaboró: Jenny C.

CONSORCIO ACACIAS 2020

Villavicencio 18 de septiembre de 2022

ASUNTO..... Certificación Laboral.

CERTIFICA QUE:

El señor, **HILBER HERNAN ANACONA ROA** identificado con cédula de ciudadanía No. 86.059 532 expedida en la ciudad Villavicencio, laboró desde el día 15 de Julio de 2021 hasta el 16 de septiembre de 2022, desempeñándose como RESIDENTE DE OBRA, con CONTRATO DE TRABAJO POR LA DURACION DE UNA OBRA O LABOR CONTRATADA, durante la ejecución del contrato de obra 097/2020, **"MEJORAMIENTO ALC SANT MZ D, E, F, DEL BARRJO VILLA MANUELA ALTOS DE COVICOM AIRES DE ACACIAS GAVIOTAS GUARATARA 2 COLECTOR PPAL SECTOR NOROCCIDENTAL CONSTR ALC PLUVIAL BARRIOS VILLA MANUELA ALTOS DE COVICOM AIRES DE ACACIAS Y GAVIOTAS EN EL MPIO DE ACACIAS"**.

La presente certificación se expide a los dieciocho días (18) días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de V1llavicencio, departamento del Meta a solicitud del interesado.

Quien escribe.

EDGAR ENRIQUE MUÑOZ CABRERA
NIT 901.442.165-1
Consorcio Acacias 2020
Representante Legal



INFORMACION PERSONAL.

Nombre: Erika Brigitte Triana Bobadilla.
Cedula de Ciudadanía: 1.121.883.802 de Villavicencio.
Fecha de Nacimiento: 03 de enero de 1992.
Dirección: Cll 5b 25 – 46 Casa 94
Correo electrónico: erikatriana33@hotmail.com
Celular: 310 883 0079.

PERFIL PROFESIONAL.

Ingeniera civil especialista en costos y presupuestos; con experiencia como residente de obra y en el departamento de costos y presupuestos para contrataciones de obra, con habilidades en el manejo de sistemas office, responsable, comprometida y dedicada en las funciones designadas tanto en grupo como en trabajo individuales.

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA.
INGENIERA CIVIL.

ESTUDIOS REALIZADOS.

POSTGRADO.

TITULO: Especialista en Gerencia Costos y Presupuestos.
Universidad la Gran Colombia.
Bogotá.
Septiembre, 2015.

PREGRADO.

TITULO: Ingeniera Civil.
Universidad Cooperativa de Colombia.
Villavicencio.
Marzo, 2012.

SECUNDARIOS.

TITULO: Bachiller Académico con Profundización en Educación y Formación Pedagógica.
Escuela Normal Superior de Villavicencio.
2007.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS.

CURSO: Básico trabajo en alturas
Institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano
40 horas
Octubre, 2019

DIPLOMADO: Docencia Universitaria con en habilidades pedagógicas.
Convenio Universidad autónoma de Colombia y corporación internacional líderes.
120 horas.
Noviembre, 2016.

PARTICIPACIÓN: Divulgación Tecnológica, Estructuración de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Sena.
12 horas.
Mayo, 2016.

CURSO: Excel Básico.
Sena.
32 horas.
Febrero 2013.

CURSO: Tecnologías de la Información y de la Comunicación TICS (INTERNET.)
Sena.
40 horas.
Diciembre, 2012

CURSO:
Sena: Básico en salud Ocupacional.
Sena
60 horas.
Noviembre, 2012.

CURSO: AutoCAD 3D.
Sena.
40 horas.
Octubre, 2012.

CURSO: AutoCAD 2D.
Sena.
40 horas.
Octubre, 2012.

CURSO: AutoCAD 2D y AutoCAD 3D.
System Chalx.
40 horas.
Marzo, 2012.

CURSO: Emprendimiento Innovador.
Sena:
40 horas.
Noviembre, 2010.

CURSO: Emprendimiento Social.
Sena.
20 horas.
Septiembre, 2010.

EXPERIENCIA LABORAL.

Empresa: M&H INGENIEROS
Jefe: Juan Camilo Campos
Teléfono: 3057122835.
Cargo: Residente de Obra.
Tiempo servido: 15 de Noviembre de 2020 – 15 de junio de 2021.
Ciudad: **Bogotá** .

Funciones:

- Elaboración de informes semanales, mensuales y de actas parciales
- Proyección de memorias de cantidades
- Bitácora del contrato de obra
- Elaboración de modificaciones

Empresa: Consorcio Vial ICL.
Jefe: Jorge Duvan Garcia.
Teléfono: 316 524 6342.
Cargo: Ingeniera auxiliar de interventoría.
Tiempo servido: 12 de junio de 2018 – 31 de octubre 2018.
Ciudad: Villavicencio.

Funciones:

- Elaboración de informes semanales, mensuales y de actas parciales
- Proyección de memorias de cantidades
- Bitácora del contrato de obra
- Elaboración de modificaciones
- Diligenciar formatos FIS del consorcio vial ICL
- Elaborar actas parciales de interventoría

Empresa: Consorcio Manantial.
Jefe: Mariluz Vargas González.
Teléfono: 0388-741735.
Cargo: Residente de Obra.
Tiempo servido: 12 de febrero de 2018 – 30 de marzo 2018.
Ciudad: Villavicencio.

Funciones:

- Conocer el objeto y alcance del contrato: (contrato de obra, especificaciones técnicas, pliego de condiciones, planos.
- Conocer programación de obra.
- Balance de obra
- Evaluar cantidades de materiales según presupuesto del contrato.
- Diligenciar libro de obra diario (reportar estado del tiempo, personal y maquinaria en obra, actividades ejecutadas, observaciones varias)
- Elaboración informe mensual.
- Realizar corte de obra a sub contratistas y pago proveedores.
- Realizar actas de cobro a la entidad contratante.
- Control del equipo y materiales a utilizar.
- Control de pagos
- supervisar y controlar la calidad de las obras
- control de personal (verificación diaria, reportes de afiliaciones y novedades de nómina).
- control de gastos, caja menor
- llevar a cabo registró fotográfico diarios de la obra.
- Trazabilidad de los ensayos
- llevar carpetas bien organizada con todos los documentos del proyecto.

Empresa: Grupo Empresarial la Roca.
Jefe: Jairo Emiliano Omaña García.
Teléfono: 6645594.
Cargo: Residente de Obra.
Tiempo servido: 17 de agosto de 2015-febrero de 2016.
Ciudad: Villavicencio.

Funciones:

- Elaboración de informes semanales, mensuales y de actas parciales
- Proyección de memorias de cantidades
- Bitácora del contrato de obra
- Elaboración de modificaciones

Empresa: Grupo Empresarial la Roca.
Jefe: Jairo Emiliano Omaña García.
Teléfono: 6645594.
Cargo: Auxiliar de Ingeniería de Costos y Presupuestos.
Tiempo servido: Julio de 2014 –16 agosto de 2015.
Ciudad: Villavicencio.

Funciones:

- Proyección de memorias de cantidades
- Elaboración de modificaciones
- Elaborar actas parciales
- Manejo de construcontrol

Empresa: Bercal ltda.
Jefe : Carolina Bernate.
Teléfono: 6162728.
Cargo: Residente de obra.
Tiempo servido: Septiembre de 2013 – Junio de 2014.
Ciudad: Bogotá.

Funciones:

- Conocer el objeto y alcance del contrato: (contrato de obra, especificaciones técnicas, pliego de condiciones, planos).
- Conocer programación de obra.
- Evaluar cantidades de materiales según presupuesto del contrato.
- Diligenciar libro de obra diario (reportar estado del tiempo, personal y maquinaria en obra, actividades ejecutadas, observaciones varias)
- Elaboración informe mensual.
- Realizar actas de cobro a la entidad contratante.
- Control del equipo y materiales a utilizar.
- Control de pagos

Empresa: Subsuelos.
Jefe : Paola Cortes.
Teléfono: 522 61 11 Ext 134.
Cargo: Residente de Pilotaje.
Tiempo servido: Marzo de 2013 - Septiembre de 2013.
Ciudad: Bogotá.

Funciones:

- Conocer el objeto y alcance del contrato: (contrato de obra, especificaciones técnicas, pliego de condiciones, planos).
- Conocer programación de obra.
- Evaluar cantidades de materiales según presupuesto del contrato.

- Diligenciar libro de obra diario (reportar estado del tiempo, personal y maquinaria en obra, actividades ejecutadas, observaciones varias)
- Elaboración informe mensual.
- Realizar actas de cobro a la entidad contratante

Empresa: IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi.)
Nombre: Clara Ruht Garnica Yate.
Teléfono: 6629213.
Cargo: Practica Profesional.
Tiempo servido: 336 H. del 2011.
Ciudad: Villavicencio.

Funciones:

- Apoyo a los ingenieros catastrales en la actualización de datos catastrales

REFERENCIA PERSONAL.

JUANA GUZMAN.
Ingeniera Civil.
320 464 8174.

JUAN VELASQUEZ.
Contador público.
301 216 6380.

YESLY TRIANA
psicóloga
301 512 1866

REFERENCIA PROFESIONAL.

Fabio Torres.
Ingeniero Civil.
320 800 5368

Jesús Tovar.
Ingeniero Civil.
316 530 8437.

Manrry navarro.
Administradora de Empresas.

316 471 5752

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA.
INGENIERA CIVIL.

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FACULTAD DE POSGRADOS Y FORMACIÓN CONTINUADA

RES. No. 8384 DEL 20-NOV-2008 REGISTRO CALIFICADO MEN

ACTA DE GRADO NÚMERO PGCP-2015017

EN BOGOTÁ D. C., EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SE REUNIERON EN EL AULA MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN, EL RECTOR O SU DELEGADO Y LOS DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD, CON EL OBJETO DE PRESIDIR LA CEREMONIA DE GRADO DE:

Erika Brigitte Triana Bobadilla

C. C. No. 1.121.883.802

QUIEN TERMINÓ LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN EL AÑO 2015 Y CUMPLIÓ TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY Y POR LOS REGLAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD PARA OPTAR EL TÍTULO DE:

Especialista en Gerencia de Costos y Presupuestos

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y DE LA UNIVERSIDAD, PREVIO EL JURAMENTO REGLAMENTARIO SE HIZO ENTREGA DEL CORRESPONDIENTE DIPLOMA, EL CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO BAJO EL NÚMERO 5.555 - FOLIO 490 – LIBRO 9.

Original Firmado

BLANCA HILDA PRIETO DE PINILLA
Vicerrectora Académica

Original Firmado

ANA CECILIA OSORIO CARDONA
Decana

Original Firmado

CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
Secretario General

Es fiel copia tomada de su original el 24 de septiembre de 2015.

CARLOS ALBERTO PULIDO BARRANTES
Secretario General



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24105 del 29 de Diciembre de 1965 del Ministerio de Educación Nacional.
Resolución No. 503 del 7 de Mayo de 1974 de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2003, emanada del Ministerio de Educación Nacional.

En atención a que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

con cédula de ciudadanía No. 1.121.883.802 de Villavicencio
Cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos
por la Universidad, le confiere el título de

INGENIERA CIVIL

En testimonio de ello le expide el presente diploma
y se firma en Villavicencio el día 1 de Marzo de 2013


Director(a) Sede

Rector

Gloria Patricia Ramos
Secretario(a) General

Folio No. 6 Libro de Registros No. 4 Registro No. 49 Refrendado en Villavicencio el día 1 de Marzo de 2013

Registros y Diplomas Nelsy García Rocha

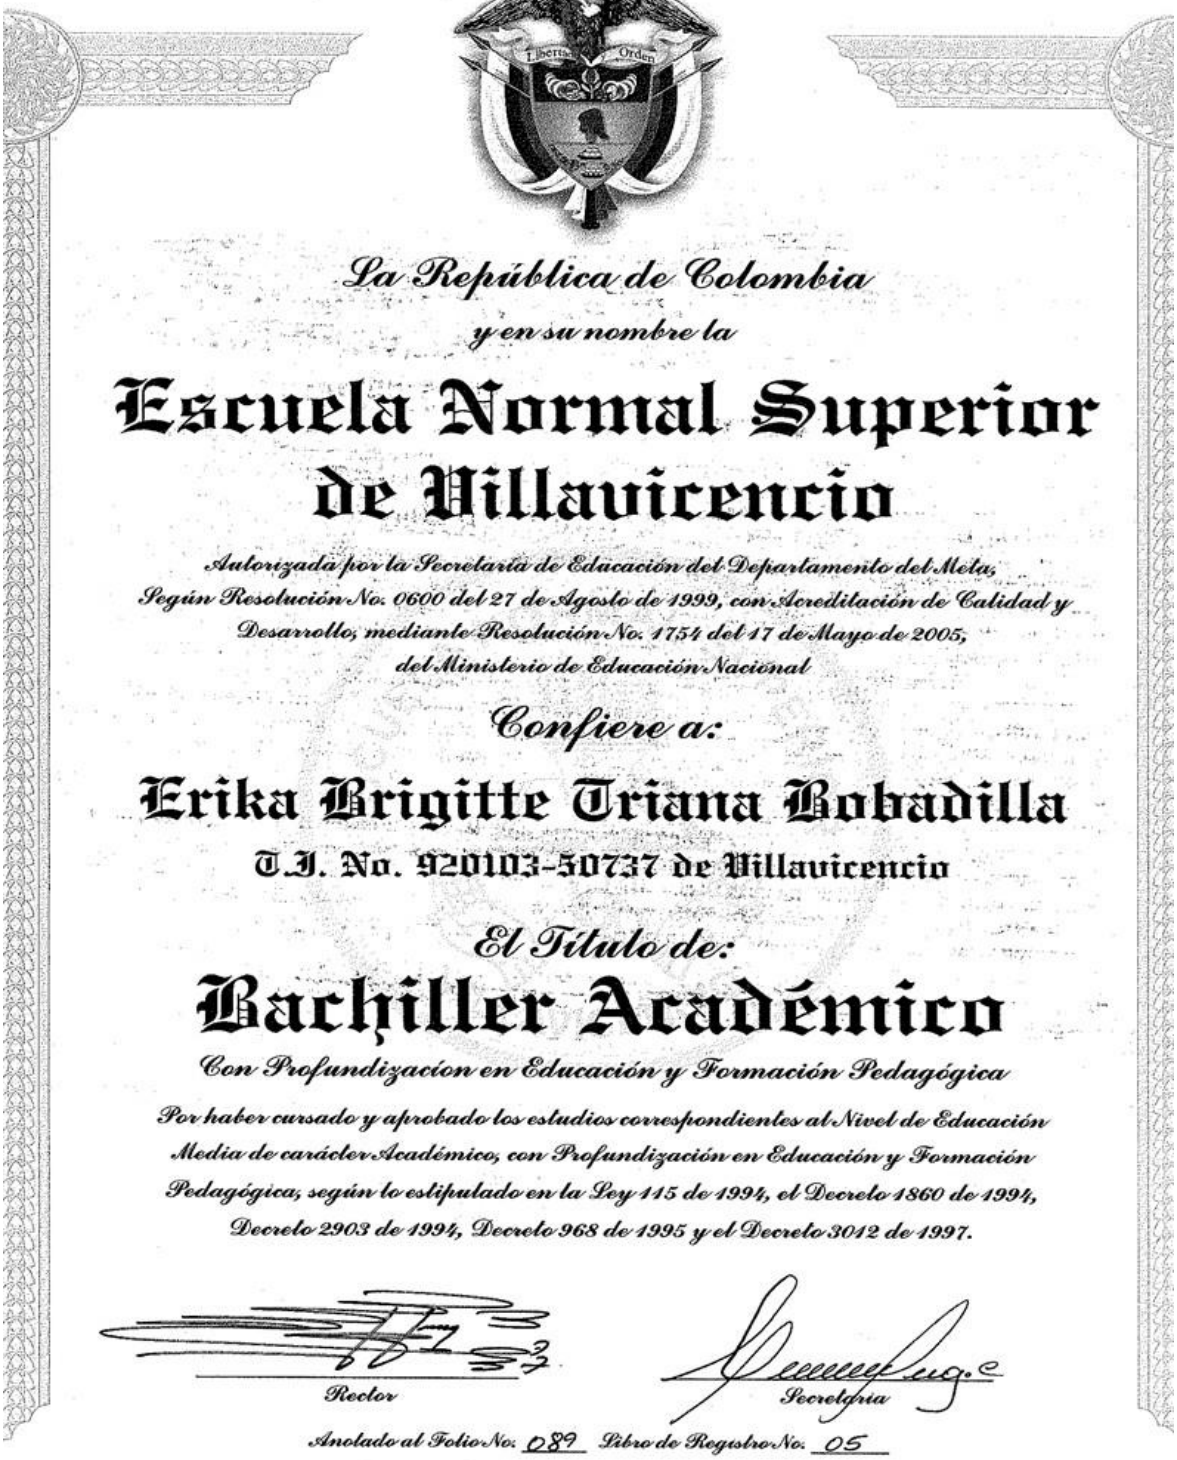

La República de Colombia

y en su nombre la

Escuela Normal Superior de Villavicencio

Autorizada por la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, Según Resolución No. 0600 del 27 de Agosto de 1999, con Acreditación de Calidad y Desarrollo, mediante Resolución No. 1754 del 17 de Mayo de 2005, del Ministerio de Educación Nacional

Confiere a:

Erika Brigitte Triana Bobadilla

T.I. No. 920103-50737 de Villavicencio

El Título de:

Bachiller Académico

Con Profundización en Educación y Formación Pedagógica

Por haber cursado y aprobado los estudios correspondientes al Nivel de Educación Media de carácter Académico, con Profundización en Educación y Formación Pedagógica, según lo estipulado en la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, Decreto 2903 de 1994, Decreto 968 de 1995 y el Decreto 3012 de 1997.

Rector *Secretaria*

Anotado al Folio No. 089 *Libro de Registro No.* 05

Dado en Villavicencio, a 4 de Diciembre de 2007

No requiere registro de la Secretaría de Educación, según Decreto No. 921 del 6 de Mayo de 1994, y 2150 del 5 de Diciembre de 1995, de la Presidencia de la República.



CONDUMETA SAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

Resolución No. 1500-56.03 / No. 4246 13 dic. 2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

Formamos en Conducción y Seguridad Vial

Certifica que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Identificado con Cédula de ciudadanía

C.C. N° 1121883802

Cursó y Aprobó

CURSO BASICO TRABAJO EN ALTURAS

Con una intensidad horaria de 40 Horas

Dictado el día 21-octubre-2019 - válido hasta 21-octubre-2020

COD. VERIFICACIÓN

8437

CARMELINA ARDILA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COORDINADORA ACADEMICA

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA.
INGENIERA CIVIL.



EN CONVENIO

HACE CONSTAR QUE

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

C.C 1.121.883.802

CURSÓ Y APROBÓ LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES AL

DIPLOMADO

DOCENCIA UNIVERSITARIA

Con Énfasis En Habilidades Pedagógicas

CON UNA INTENSIDAD DE CIENTO VEINTE (120) HORAS. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO A LOS SEIS (06) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.

PERSONERÍA JURÍDICA NO. 264 DE FEBRERO 04 DE 1972.

RECONOCIDA COMO UNIVERSIDAD SEGÚN RES. 3279 DE 25 JUNIO DE 1993 POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Ricardo Mosquera Mesa
Rector Universidad Autónoma de Colombia

Eduardo Enrique Hoyos Villamizar
Director Extensión y Proyección Social

Luis Carlos Prada Prada
Director Corporación Internacional Líderes ONG

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cedula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Participó en el evento de Divulgación Tecnológica

ESTRUCTURACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

con una duración de 12 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Bogotá, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil dieciseis (2016)

Firmado Digitalmente por
FABIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

FABIO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Subdirector de Centro CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL
REGIONAL DISTRITO CAPITAL

3415421 - 19/05/2016
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 921100852888CC1121883802C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cedula de Ciudadania No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

EXCEL BÁSICO

con una duración de 32 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los dieciseis (16) dias del mes de febrero de dos mil trece (2013)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

11401872 - 16/02/2013
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953200459045CC1121883802C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

BÁSICO DE SALUD OCUPACIONAL

con una duración de 60 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los veintiseis (26) días del mes de noviembre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

10835807 - 26/11/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953200433055CC1121883802C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

AUTOCAD 3D

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los treinta (30) días del mes de octubre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

10254079 - 30/10/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953200415056CC1121883802C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

DIBUJO ASISTIDO POR COMPUTADOR ¿ AUTOCAD BÁSICO 2 DIMENSIONES

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil doce (2012)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

10253087 - 31/10/2012
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953200415053CC1121883802C.

Instituto Tecnico del Meta
System Chalx
¡Porque debes salir adelante, capacítate!
Nit 79985841-1
Aprobado por la Secretaría de Educación
Resolución No. 132-2009 Decreto 2888-2007

Instituto Tecnico del Meta

EL SUSCRITO DIRECTOR

CERTIFICA QUE

La alumna **ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802 expedida en Villavicencio - Meta, realizó en esta Institución Educativa, el curso de **Diseño en CAD** los niveles **2D y 3D**, con una intensidad de 50 horas

Programas:
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D

La presente se expide a solicitud directa del (la) interesado(a) a los 26 días del mes de Marzo de 2012.

Atentamente,

Instituto Técnico del Meta
System Chalx

SYSTEM CHALX

ALEXANDER CHINCHILLA RODRIGUEZ
Director

Calle 33B No. 33-79 – Barrio Barzal - Cel: 311 5270723
E-mail: systemchalx@hotmail.com – website: www.systemchalx.com

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil diez (2010)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

2098889 - 2010/11/28
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953200105079CC1121883802C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802

Cursó y aprobó la acción de Formación

EMPRENDIMIENTO SOCIAL

con una duración de 20 horas

En testimonio de lo anterior, se firma el presente en Villavicencio, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010)

Firmado Digitalmente por
EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Autenticidad del Documento
Bogota - Colombia

EZEQUIEL TARAZONA MURILLO
SUBDIRECTOR
CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
REGIONAL META

1772126 - 2010/09/17
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 95320091688CC1121883802C.

INGENIEROS S.A.
NIT 830.040.335-3

CERTIFICACIÓN

El suscrito Representante legal de MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A, certifica que la ingeniera ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA identificado con la c.c. No. 1.121.883.802 de Villavicencio – Meta y con TP 25202-250035CND, se desempeñó como RESIDENTE DE OBRA para el centro penitenciario y carcelario de La Picota desde el 15 de noviembre de 2020 hasta el 15 de junio de 2021, en la ejecución del contrato de Obra # 2180725, para el GRUPO 5, con las siguientes características:

OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS GRUPO 5: LA PICOTA, LA MODELO, BUEN PASTOR Y CAQUEZA.
ÁREA INTERVENIDA	:	12371,2 M2 FRENTE LA PICOTA
VALOR FRENTE PICOTA	:	$ 4.380.364.113
VALOR TOTAL CONTRATO	:	$ 10.231.367.793

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO MAMPOSTERÍA, PISOS, ENCHAPES, ACABADOS DE PISOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, CARPINTERÍA METÁLICA Y DE ALUMINIO, CARPINTERÍA DE MADERA, PINTURA Y ESTUCO, ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, CUBIERTA, ACABADOS.

La presente se expide en Bogotá D.C. el 11 de Agosto de 2021.

Atentamente,

ING. JUAN GUILLERMO MUÑOZ GIRALDO
REPRESENTANTE LEGAL
MYH INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

CONSORCIO
VIAL ICL

CONSORCIO VIAL ICL
NIT: 901.182.818-6

CERTIFICA QUE:

La Ingeniera **ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.883.802 de Villavicencio (Meta), y M.P. 25202-250035 de CND, prestó su servicios profesionales a este consorcio, mediante contrato de Prestación de Servicios, desde el 12 de junio de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018, como Ingeniera Auxiliar de Interventoria, en el contrato N° 098-2018, el cual tiene como objeto **"CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DE LA VÍA JUAN PABLO SEGUNDO DESDE LA VÍA DEL AMOR HASTA LA VÍA PUERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META"**, donde desarrollo las siguientes actividades;

- Elaboración de Informes semanales, mensuales y de actas parciales
- Proyección de memorias de cantidades
- Bitácora del contrato de Obra
- Elaboración de Modificaciones
- Diligenciar formatos FIS del Consorcio Vial ICL
- Elaborar Actas Parciales de Interventoria

Se expide la presente a solicitud del interesado, a los Dieciséis (16) días del mes de Noviembre de 2018.

Atentamente,

Ing. JORGE DUVÁN GARCIA MARÍN
Representante Legal
Elaboró: Angie R.
Revisó: Ing. Valentina G.

INGENIERÍA ESTRUCTURAS – CONSTRUCCIÓN - CONSULTORÍA
Calle 7 No. 42 61 Oficina 105 Celular: 316 524 6342 - Teléfono: 674 01 16
e-mail: ingestruc@outlook.com
VILLAVICENCIO - META

	GRUPO EMPRESARIAL LA ROCA	código	GHT-CER-01
		versión	01
	"CERTIFICADO"	Vigencia	18/06/2015
	MACRO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		

SUSCRITO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA QUE:

Que la señora **ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA** identificada con cédula de ciudadanía número 1.121.883.802 de Villavicencio – Meta, labora para la empresa Ingenieros Contratistas de Colombia "Ingecol SAS" que tiene como Nit 822.004.453-3 como **INGENIERA RESIDENTE**, devengando un salario básico mensual de Dos Millones Pesos (2.000.000) m/cte., con contrato de trabajo a término indefinido desde el día Dieciocho (18) de Agosto de 2015 hasta la fecha.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los Nueve (09) días del mes de Febrero de 2016.

Dr. ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ
Director de Talento Humano

	GRUPO EMPRESARIAL LA ROCA	código	GHT-CER-01
		versión	01
	"CERTIFICADO"	Vigencia	16/09/2015
	MACRO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		

SUSCRITO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO

CERTIFICA QUE:

Que la señora **ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA** identificada con cédula de ciudadanía número 1.121.883.802 de Villavicencio – Meta, laboró para la empresa Consorcio Z Industrial con Nit 900.675.505-9 que tiene como objeto **"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PLA DE VIVIENDA, ZONA INDUSTRIAL Y COLECTOR SANITARIO BATEAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN – META"**, como **AUXILIAR DE INGENIERIA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS**, desde el día Primero (01) de Julio de 2014 hasta el día Diecisiete (17) de Agosto de 2015.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los Nueve (09) días del mes de Febrero de 2016.

Dr. ORLANDO RAMIREZ RAMIREZ
Director de Talento Humano

BERCAL LTDA. ARQUITECTURA E INGENIERÍA

CERTIFICACION LABORAL

La empresa Bercal Ltda. Con Nit 830.112.290-1, certifica que la ingeniera Erika Brigitte Triana Bobadilla identificada con cedula No 1121883802 de Villavicencio trabajo desde septiembre de 2013 a junio de 2014 como ingeniera residente del edifico SCALA 123 ubicado en la calle 123 No 45ª-29 de la constructora BERCAL LTDA dando fe de su honestidad, responsabilidad y cumplimiento en todas sus labores encomendadas.

Para constancia se firma a solicitud del interesado a los nueve dias (9) del mes de marzo de 2014

Atentamente.

Carolina Bernate C

Ing. Carolina Bernate
Directora de Proyectos

Calle 101 No. 16 - 47 • PBX: (571) 616 2728 • Fax: (571) 691 2762 • Nit. 830.112.290-1 • bbernate@bercal.com.co
Bogotá, D. C. - Colombia

SUBSUELOS S.A.
Ingenieros Civiles

SUB-RH-098/13

CERTIFICACION

EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

HACE CONSTAR

Que la Ingeniera **ERIKA BRIGITTE TRIANA BOBADILLA,** identificada con la cédula de ciudadanía número 1.121.883.802, laboró en nuestra empresa del 06 de marzo de 2013 hasta el 03 de septiembre 2013, con un contrato por obra o labor contratada.

Que desempeño el cargo de Residente de Obra y su retiro fue por renuncia.

Se expide la presente a solicitud del interesado, en Bogotá, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2013.

SUBSUELOS S. A.
BOGOTA COLOMBIA

Paola Andrea Cortés Bareño
Recursos Humanos

ISO 9001 icontec SC 1454-1

IQNet

CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ



***Cédula de Ciudadanía**: 1.121.900.390 de Villavicencio*
***Fecha de nacimiento:** 31 de mayo de 1993*
***Estado Civil**: Unión Libre*
***Dirección**: Conjunto San Gerardo Int 1 Apt 304 Villavicencio*
***Celular:** 3156846666*
***Correo Electrónico:** christyanhernandez3105@gmail.com*

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnólogo en salud ocupacional, egresado de la Universidad Autónoma de Nariño (Villavicencio) con licencia para ejercer en el área. Conocimiento en trabajo en alturas, Implementación de sistemas de gestión integrales, con capacidad de trabajo en equipo y el cumplimiento de órdenes. Soy una persona dinámica, puntual, responsable, emprendedora y con buenas relaciones interpersonales, con actitudes de logro y liderazgo.

Mi alto grado de compromiso garantiza gran desempeño en las funciones que me son asignadas. Adaptable al cambio organizacional de una empresa, con capacidad para asumir un proceso de certificación en el mundo del trabajo; responsable y respetuosa de las relaciones con mis colaboradores,

ESTUDIOS

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
2020

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño
Tecnólogo en Salud ocupacional
2014

Colegio Divino Salvador
Bachiller Académico
2007.

Cursos

COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
(Villavicencio, noviembre 30-2015)

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS NIVEL AVANZADO
(Villavicencio 12 de enero del 2021)

CURSO BASICO DE PRIMEROS AUXILIO
(12 FEBRERO 2020)

Curso actualización de 20 horas de SGSST
(02 de febrero de 2021)

Curso de las 50 horas de SGSST
(30 de diciembre del 2017)

Diplomados

- **Auditor Interno Integral Norma ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018**
  (31 enero 2020)

- **Diplomado en Sistemas de Gestión Integrado Enfoque Operativo (Norma ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018**
  (31 enero 2020)

Programas manejados: Word, Excel, power point, Publisher

IDIOMAS

Español: Natal
Inglés: Nivel 1

EXPERIENCIA LABORAL

CONSORCIO MILITAR APIAY
VILLAVICENCIO-META SECTOR: CONSTRUCCION
Cargo ocupado: Inspector SST

Tareas realizadas, charlas y capacitaciones SST, diligenciamiento documental de permisos etc., verificación de documentación de personal, entrega de informe siso ambientales, acompañamiento actividades de alto riesgo (trabajos en alturas, uso de equipos), entrega de EPP e inspección de áreas, implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

CONSTRUCCIONES ORLANDO MARTIN VILLAVICENCIO-META
SECTOR: CONSTRUCCION Teléfono: 3144150175
Cargo ocupado: Inspector SST

Tareas realizadas, charlas y capacitaciones sst, diligenciamiento documental de permisos etc., verificación de documentación de personal, entrega de informe siso ambientales, acompañamiento actividades de alto riesgo (trabajos en alturas, uso de equipos, mampostería), entrega de epp e inspección de áreas, implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

XTRONIC S.A.S
VILLAVICENCIO -META SECTOR: INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Teléfono: 3042166638
Cargo ocupado, coordinador HSE

Tareas realizadas, Implementación SGI (sistema de gestión Integral), charlas pre operacionales diligenciamiento de permisos de permisos verificación de documentos, entrega de informes, acompañamiento del personal a las ejecuciones de las actividades, inspección

SOLIDEC S.A.S
BOGOTÁ D.C SECTOR DE LA CONSTRUCCION
Teléfonos: 3188757726
Cargo ocupado, inspector SISOMA

Tareas realizadas, Implementación SGI (sistema de gestión Integral), charlas pre operacionales diligenciamiento de permisos verificación de documentación y acompañamiento del personal en las ejecuciones de las actividades entrega de informes requeridos por la empresa, entrega de elementos protección personal.

INELTEK S.A.S
BOGOTA D.C SECTOR DE DISEÑAR, DIRIGIR E IMPLEMENTAR SOLUCIONES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES SEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE NUESTROS CLIENTES
Teléfonos: 3118139792
Cargo ocupado, inspector SISOMA

Tareas realizadas, realizar charlas pres operacionales diligenciamiento de permisos verificación de documentación y acompañamiento del personal en las ejecuciones de las actividades entrega de informes requeridos por la empresa, entrega de elementos protección personal.

RISK AND RECUE GROUP SAS R&R GROUP
Cargo: Tareas HS
Teléfono: 3124599835
Acompañamiento, supervisión, documentación, ejecuciones de las actividades charlas.

REFERENCIAS PERSONALES

Sandra Patricia Castro
Docente
Cel. 3187182318

William Mendoza
Coordinador en Seguridad
Cel. 3154430380


REFERENCIAS FAMILIARES

Carlos Alberto Hernández Quintero
Comerciante
Cel. 3218277770

Nery Rosmira Méndez Martínez
Ama de casa
Cel. 3105016150



CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ
CC N°1121900390 Villavicencio

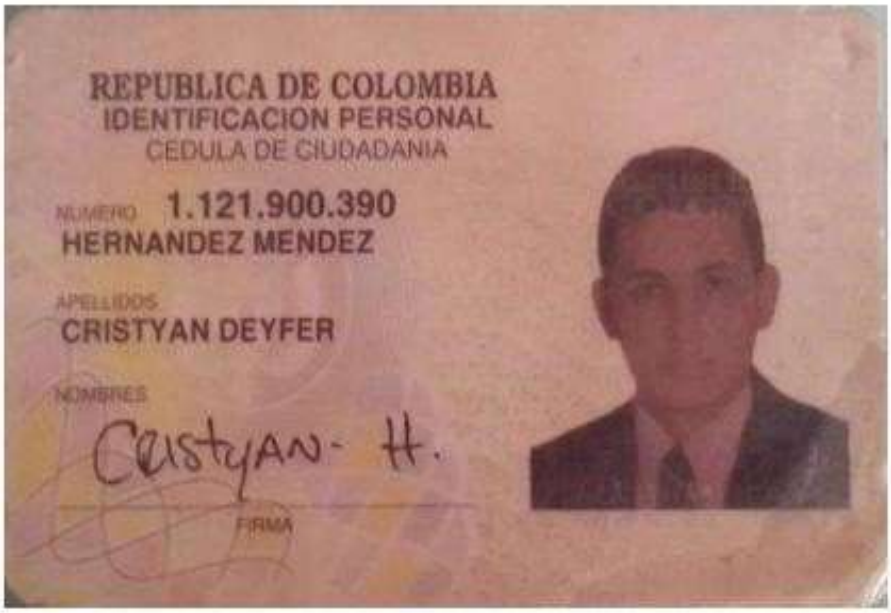
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.121.900.390
HERNANDEZ MENDEZ

APELLIDOS
CRISTYAN DEYFER

NOMBRES
Cristyan- H.

FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1993
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

03-JUN-2011 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

Ministerio de Educación Nacional

Corporación Universitaria Autónoma de Nariño ~ Aunar ~

ACTA DE GRADO No. 153

En ceremonia realizada el día veintisiete (27) de Junio de 2020, en la ciudad de San Juan de Pasto, presidida por la Especialista Ingrid Colunge Ordóñez, Rectora de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño - AUNAR, una vez tomado el juramento reglamentario, confirió el título de:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo

SNIES No. 104600

A:

Cristyan Deyfer Hernández Méndez

Cédula de Ciudadanía 1.121.900.390 de Villavicencio (Meta)

Quién cumplió satisfactoriamente con los requisitos exigidos en los reglamentos y normas legales de la Institución.

En fé de lo anterior se firma la presente Acta de Grado en San Juan de Pasto, el día Veintisiete (27) de Junio de 2020.

Secretaria General

Registrada al Folio No. **199** del Libro de Diplomas No. **Uno**

Corporación
UNIVERSITARIA
AUTONOMA DE NARIÑO

Código SNIES 3817. Resolución 6344 del 17 de Octubre de 2006 MEN.

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO

Extensión Villavicencio

CERTIFICA QUE:

Hernández Méndez Cristyan Deyfer

Documento de identidad No. 1.121.900.390 de Villavicencio, Meta

Aprobó el curso de

AUDITOR INTERNO INTEGRAL (NORMA ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018)

Con una intensidad de 40 horas teórico - prácticas

Para constancia, se firma en Villavicencio (Meta), a los 31 días del mes de enero de 2020

DIRECTOR
Extensión Villavicencio

20200131ASG10

XTRONIC
NIT: 900.577.556-4

XTRONIC S.A.S

CERTIFICA QUE:

El señor **CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ,** mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número **1.121.900.390** laboro para nuestra empresa desempeñando el cargo de Coordinador HSE desde el día 09/02/2017 hasta el 21/10/2019, mostrándose como una persona responsable y cumplidora de sus deberes.

La presente se firma en Villavicencio, a los veintitrés (23) días, del mes de octubre del año 2.019.

Cordialmente,

Yamile Galeano

YAMILE JOHANNA GALEANO OCHOA
Cédula de ciudadanía N° 40.993.756
Coordinadora de Talento Humano de XTRONIC S.A.S.

Calle 7 No. 46-60 Esperanza 4 etapa, Villavicencio-Meta
Teléfono: +57(8) 6814141 / Celular: +57 304 216 6638
Email: gerencia@xtronic.com.co; andres@xtronic.com.co

SOLIDEC S.A.S

NIT. 830.136.915-1

CERTIFICACIÓN

SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. Identificada con Nit. 830.136.915-1, certifica que el señor **CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ** identificado con C.C. **1.121.900.390** laboró para nuestra compañía desde el día trece (13) de Febrero de 2017, hasta el día treinta (30) de Julio de 2018, desempeñando el cargo de **INSPECTOR SISOMA** mediante contrato a término indefinido.

Se expide la presente certificación a los Treinta (30) días del mes de Julio de 2018, a solicitud del interesado.

Cordialmente,

DIANA QUINTERO VILLEGAS
Dpto. Recursos Humanos

INELTEK SAS
Ingeniería Eléctrica y Telecomunicaciones

Bogotá D.C. 24 de mayo 2017

INELTEK S.A.S
NIT. 900.552.172.1

Que el Señor **Cristyan Deyfer Hernández Méndez** identificado con Cedula de Ciudadanía Numero 1.121.900.390 de Bogotá, laboro con nosotros desde el día 03 de febrero del 2015 hasta el día 5 de febrero del 2017, en relación por prestación de servicios desempeñando el cargo de Inspector de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Damos constancia de su eficiente labor y cumpliendo de sus responsabilidades.

Se expide en Bogotá a los 24 días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017), a solicitud del interesado,

Cordialmente,

Ing Hermis Bocanegra
Gerente General
✆: +57 321-4229381

✉: Carrera 50A No.174B-67 INT 4 OF: 501 ☎+57 (321)-4229381
✉: inghermis@ineltek-sas.com www.ineltek-sas.com Bogotá

Scanned with CamScanner

CONSORCIO MILITAR DE APIAY
NIT: 901-144-900-0

A QUIEN INTERESE
CERTIFICO QUE:

Que el señor **CRISTYAN HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 1. 1.121.900.390 expedida en Villavicencio, trabajó con nosotros en el periodo de dos (02) de octubre del 2020 hasta el QUINCE (15) de marzo del 2021 en el contrato de obra 056 del 2018 con objeto **"AMPLIACION Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADOS SANITARIO Y PLUVIAL DEL CANTON MILITAR DE APIAY EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"** como **PROFESIONAL SST.**

Valor del Contrato: $6.226.517.454

La presente certificación se expide en la ciudad de Villavicencio el día veintiocho (28) de Marzo del 2021

EDUARDO ANDRES ROJAS PARDO
C.C. N° 17.347.950 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO MILITAR DE APIAY

Asegurarte

FORMANDO LIDERES EN SEGURIDAD & PROTECCIÓN PERSONAL

Y EN SU NOMBRE EL SR.

HÉCTOR SAMUEL ANDRADE BOCANEGRA

IDENTIFICADO CON C.C. 17.346.054 DE VILLAVICENCIO

Mediante Resolución No. 198 de 2013

expedida por el ***Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"***

Hace Constar que:

Cristyan Deyfer Hernandez Mendez

Identificado(a) con C.C. No. 1.121.900.390

Curso y Aprobó la Acción de Formación

Coordinador Trabajo Seguro en Alturas

Con una Duración de ***80*** *Horas*

Ing. Héctor Samuel Andrade Bocanegra
LICENCIA 1093 DE 2012
SALUD OCUPACIONAL

Expedido en la Ciudad de Villavicencio, Colombia
a los ***30*** *días del mes de* ***Noviembre de 2015***
Curso 301115CTSA004

CALLE 8 SUR NO. 24 - 04 BARRIO LA ROSITA, VILLAVICENCIO, META · CEL.: 310 200 0095
PARA VERIFICAR CERTIFICADO DE ESTUDIOS INGRESA A WWW.ASEGURATE.COM.CO

FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO -TECNAR
ACTA DE GRADO No 6469

Programa: **TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL**
Fecha: 19 de Junio de 2015

Los suscritos, la Secretaria General y Jurídica y el Decano, hacen constar que en el Libro de Actas de Grado No. 7 de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO - TECNAR, figura el ACTA DE GRADO NÚMERO 6469, Folio No 193 del Libro 7, que a la letra dice: En la ciudad de Cartagena de Indias, capital del Departamento de Bolívar, en la República de Colombia a las 2:00 p.m. del día diecinueve (19) del mes de Junio de 2015, en la sede de la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO, se reunieron el Rector de la FUNDACIÓN, doctor DIONISIO VÉLEZ WHITE, el Decano del programa TECNOLOGÍA EN SAUD OCUPACIONAL, Dr. ALEJANDRO JARAMILLO VÉLEZ y la Secretaria General y Jurídica, Doctora MARÍA MERCEDES VILLALBA PORTO, con el fin de determinar si el egresado (a)

CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ
C.C. 1121900390

ha cumplido con todos los requisitos legales y reglamentarios para optar el título de

TECNOLOGÍA EN SALUD OCUPACIONAL

que le otorga la Fundación mediante autorización concedida por la Resolución No. 3280 del 23 de Diciembre de 1988, emanada del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior – ICFES.

Una vez verificado que el egresado hubo cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas de la Profesión, se constató que aprobó satisfactoriamente el curso previo al grado en los distintos módulos establecidos y que realizó el trabajo de grado denominado:

DIPLOMADO GESTION DE RIESGOS EN ACTIVIDADES CRITICAS (CARTILLA PROCEDIMIENTO (SEGURO) TRABAJO SEGURO-CAIDA DE ALTURAS)

Presentado por el (la) graduando (a) con el lleno de las exigencias legales y reglamentarias que en conjunto mereciera la calificación de APROBADO. En consecuencia, la FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO otorga al egresado (a) el título de

TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

Y lo (a) declara, en nombre de la República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, idóneo (a) para el ejercicio de su profesión. En consecuencia, el Rector le hizo entrega del Diploma que lo acredita como tal, exigiéndole previamente la toma del juramento solemne, de cumplir bien y fielmente en nombre Dios y la Patria, los deberes y obligaciones inherentes a su profesión, juramento este que fue prestado por el (la) graduando (a), en la Ciudad de Villavicencio, Meta.

No siendo otro el objeto de esta diligencia, para constancia firmaron el Acta el Rector Dr. Dionisio Vélez White (Fdo.), la Secretaria General y Jurídica (Fdo.) MARÍA MERCEDES VILLALBA PORTO y el (la) Decano (a) del Programa (Fdo.) ALEJANDRO JARAMILLO VÉLEZ, cada uno con su respectivo sello. Es copia del original, tomada a los diecinueve (19) días del mes de Junio de 2015.

MARÍA MERCEDES VILLALBA PORTO
Secretaria General y Jurídica

ALEJANDRO JARAMILLO VÉLEZ
Decano

Corporación
UNIVERSITARIA
AUTONOMA
DE NARIÑO

Código Icfes 3817 Personería Jurídica Resolución 1054/83 M.E.N. / Res. 6344

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO

Extensión Villavicencio

CERTIFICA QUE:

Hernández Méndez Cristhyan Deyfer

Documento de identidad No. 1.121.900.390 Villavicencio

Curso y aprobó, el diplomado en

GESTIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES CRÍTICAS

con una intensidad de (120) horas Teórico - practicas.

Para constancia se firma en Villavicencio (Meta), a los 15 días del mes de Diciembre de 2014.

Coordinador de Programa

DIRECTOR
Extensión Villavicencio

LA FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO -TECNAR-

En nombre de la
República de Colombia
y por autorización del Ministerio de Educación Nacional, declara que

CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ
CC. 1121900390

terminó satisfactoriamente todos los estudios y prácticas requeridas según los estatutos,
para obtener el título de

TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL

en testimonio de lo cual se firma y sella el presente Diploma, en Cartagena a los 19 días del mes de Junio de 2015

El Rector

DIONISIO VÉLEZ WHITE

El Decano

ALEJANDRO JARAMILLO VÉLEZ

La Secretaria General y Jurídica

MARÍA MERCEDES VILLALBA PORTO

Registrado en el Libro de Grados Título No. 7, Folio No. 193, Personería Jurídica No. 322 de Enero de 1.985 de Mineducación

HSEQ INTERNATIONAL S.A.S.

"Calidad, investigación y seguridad al alcance de todos"

NIT. 900.601.478-0

Certificado de capacitacion y entrenamiento

CRISTYAN DEYFER HERNANDEZ MENDEZ

C.C. N° 1121900390

Asistió y aprobó el curso de:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO AVANZADO





Con una intensidad horaria de 20 horas, según

Resolución de Salud Ocupacional 1499 del 05 de Marzo 2013 de la Secretaria de Salud del Meta

y Resolución 08SE2018220000000030196, del Ministerio de Trabajo, y certificado CO18.01717 Expedido por Bureau veritas.

de acuerdo al titulo II, capitulo II Articulo 9 de la Resolución 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo

Se realizaron en Villavicencio del 11 enero 2021 a 12 enero 2021. Se expide en la ciudad de Villavicencio el dia 12 enero 2021.

ING. GABRIEL GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL

TSA: 41843

JOSE DAGOBERTO PRIETO GARZON

MinTrabajo
Ministerio del Trabajo



Calle 1 lote 2 Km. 1 Llano Lindo Centro de Entrenamiento Calle 34 No.41-64 Barzal Alto y
Calle 9 Sur No.23-34 La Rosita - Villavicencio, Bogotá D.C., Cali, Neiva, Puerto Asis, Ibagué,
Manizales, Pereira, Antioquia, Tunja, Bucaramanga Cel.: 3112241304-3125344944

PARA VERIFICACIÓN DE DIPLOMAS :

E-mail:hseqinternational@gmail.com Web: www.hseqinternational.com.co

BUREAU VERITAS ESTÁ CERTIFICADO POR LA ONAC CON EL CERTIFICADO ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-008

HSEQ INTERNATIONAL ESTÁ AVALADO Y CERTIFICADO POR BUREAU VERITAS CON EL CERTIFICADO N° CO18.01717 27/06/2018 NTC 6072/2014

RESOLUCION N° 08SE2018220000000030196 DE AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

ARL

La República de Colombia, el Ministerio de Trabajo y ARL SURA

CERTIFICA QUE

CRISTYAN HERNANDEZ

HA FINALIZADO CORRECTAMENTE LA FORMACIÓN

ACTUALIZACIÓN VIRTUAL SGSST (20 HORAS)

HORAS CERTIFICADAS

20

En testimonio de lo anterior, se firma el presente el
2 de febrero de 2021
Registro Certificado de Oferente de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. RCO-0003.

xrkBBrRgNh

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE RISK AND RESCUE GROUP SAS R&R GROUP

CERTIFICA:

Que el señor, **CRISTIAN DEYFER HERNÁNDEZ MENDEZ** identificado con la cédula de ciudadanía No. **1121900390,** expedida en el municipio de Villavicencio (Meta), prestó sus servicios profesionales para nuestra organización como **SUPERVISOR HSEQ,** bajo prestación de ordenes de servicio, desde el 04 de diciembre del 2021 hasta el 15 de noviembre de 2022, cumpliendo y demostrando compromiso y responsabilidad en las tareas asignadas.

La presente se expide a solicitud del interesado, a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2022.

Cordialmente,

DIDIER ALEXANDER RUIZ MOSCOSO
REPRESENTANTE LEGAL



Corporación
UNIVERSITARIA
AUTONOMA
DE NARIÑO

Código SNIES 3817. Resolución 6344 del 17 de Octubre de 2006 MEN

LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO

Extensión Villavicencio

CERTIFICA QUE:

Hernández Méndez Cristyan Deyfer

Documento de identidad No. 1121900390 de Villavicencio, Meta

Cursó y aprobó, el diplomado en

SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADO ENFOQUE OPERATIVO (NORMA ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ISO 45001:2018)

Con una intensidad de 150 horas teórico - prácticas

Para constancia, se firma en Villavicencio (Meta), a los 31 días del mes de enero de 2020

20200133SGI11

DIRECTOR
Extensión Villavicencio

Christyan Deyfer Hernández Méndez

HOJA DE VIDA

YHOJANN ARDILA ESCOBAR

CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)



Calle 39 B No. 25-11 B. Emporio Edf. Topacio Apto. 301
Cel. 3118467755
jonar12@hotmail.com / jonar7710@gmail.com
Villavicencio (Meta)

PERFIL PROFESIONAL

Habilidad para planear, organizar y dirigir, propositivo, integro y responsable, con destreza para la realización de trabajos en equipo orientado a los buenos resultados, que pretende con sus habilidades y conocimientos forjar un futuro más sólido, donde nuestra región se posicione como un eslabón de gran importancia en el desarrollo de la infraestructura nacional con responsabilidad ambiental.

HOJA DE VIDA

YHOJANN ARDILA ESCOBAR

CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)

INFORMACIÓN PERSONAL

Cedula de Ciudadanía	86.056.744
Libreta Militar 1ra.	86.056.744 DIM 05
Fecha de Nacimiento	18 de Octubre de 1977
Lugar de Nacimiento	Villavicencio (Meta).
Correo Electrónico	jonar12@hotmail.com
Estado civil	Casado

ESTUDIOS REALIZADOS

Universitario:	Ingeniero Civil Corporación Universitaria Del Meta "Unimeta" T.P 25202244398 CND
	Ingeniero Ambiental Corporación Universitaria Del Meta "Unimeta" T.P 25238244397 CND
Técnico:	Fundación ADN – Sociedad Bíblica Nacional Técnica en pastoral juvenil y desarrollo ciudadano II Semestre
Bachillerato	Academia Militar José Antonio Páez Bachiller académico
Postgrado:	Especialización en Administración en Salud Ocupacional. UNIMETA. Resolución No. 2842 del 19 de Mayo del 2015

HOJA DE VIDA

YHOJANN ARDILA ESCOBAR

CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)

Diplomado Especializado en Seguridad Integral
UNIMETA

Diplomado en Gerencia de Sistemas Integrados
HESQ. UNIMETA

Diplomado Proyectos de Desarrollo
ESAP, 2021

Cursos

Seminario sobre manejo de la Biblia Thompson
CLC - Colombia

Curso Fomento del trabajo seguro, limpio y Saludable en ECOPETROL - Fase I - II
ECOPETROL

Seminario Contratación Estatal
Escuela superior de administración publica
ESAP

Modelo Estándar de Control Interno (MECI)
Escuela superior de administración publica
ESAP

Seminario-Taller Amenaza Sísmica en el Piedemonte Llanero. (Organizador Ponente)

Seminario Nacional de biotecnología aplicada a la Estabilización de taludes de alta montaña.
(UPTC)

HOJA DE VIDA

YHOJANN ARDILA ESCOBAR

CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)

Gestión Presupuestal para entidades Públicas (Sena).

Políticas del medio ambiente. (Sena, Contraloría General de Antioquia).

Curso Avanzado Trabajo Seguro en Alturas (Sena)

Foro Cambio Climático (Pacific Rubiales)

Seminario de Impacto ambiental y alternativas de producción más limpia en los sectores productivos generadores de llantas y aceites usados en el Departamento del Meta.
(Cormacarena – Ecopetrol)

II Congreso Internacional en sostenibilidad ambiental con responsabilidad social.
(UNIMETA)

Curso de Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción. (ESAP)

Taller "Uso y manejo de los recursos naturales y del medio ambiente" CORMACARENA

Taller de Silvicultura Urbana
Secretaría de Medio Ambiente Villavicencio

Introducción al Cambio Climático
United Nations Institute for Training – ONU

HOJA DE VIDA

YHOJANN ARDILA ESCOBAR

CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)

Curso de 50 horas SG-SST
Seguros Bolívar

Reentrenamiento Trabajo Seguro en Alturas
Asegurarte, Octubre 2021

Publicaciones:

- German Chicangana Motón, Carlos Alberto Vargas Jiménez, Alexander Canevá Rincón, Claudia Mojica Sánchez, Tulio Aymerich Hernández Hernández, **Yhojann Ardila Escobar,** Alejandra Bernal Jiménez, "La sociedad frente a la gestión del riesgo: caso sobre la amenaza sísmica en la ciudad de Villavicencio". En: Colombia Boletín de geología *ISSN:* 0120-0283 *ed:* Ediciones Uis *v.*32 *fasc.*1 p.125 - 141 2010.

- German Chicangana Montón, Carlos Alberto Vargas Jiménez, Alexander canevá Rincón, Tulio Aymerich Hernández Hernández , Claudia Mojica Sánchez, **Yhojann Ardila Escobar**, Alejandra Bernal Jiménez, "La sociedad frente a la gestión del riesgo: caso sobre la amenaza sísmica en la ciudad de Villavicencio." en: Colombia. 2009. *Evento:* XII congreso colombiano de Geología *ponencia:* la sociedad frente a la gestión del riesgo: caso sobre la amenaza sísmica en la ciudad de Villavicencio.

- German Chicangana Montón, Carlos Alberto Vargas Jiménez, Alexander Canevá Rincón, Claudia Mojica Sánchez, Tulio Aymerich Hernández Hernández, Alejandra Bernal Jiménez, **Yhojann Ardila Escobar**, "About necessity of a local seismic network: the seismic hazard of the Villavicencio city, Colombia" en: Brasil. 2010. Evento: 2010 Meeting of the Americas *Ponencia:* About necessity of a local seismic network: the seismic hazard of the Villavicencio city, Colombia.

YHOJANN ARDILA ESCOBAR
CC. No. 86.056.744 Villavicencio (Meta)

- Art. The seismic hazard of the Villavicencio city, Colombia. Capitulo del libro: Earthquakes; triggers environmental impact and potential hazards nova science published New York, USA 2011.


REFERENCIAS LABORALES

Nombre	Jesús Antonio Garzón Vanegas
Profesión	Ingeniero Civil
Celular	310-2841638
Empresa	Contratista

Nombre	Guillermo Vega Alfonso
Profesión	Topógrafo
Celular	321-4544989
Empresa	Delta Q Ingeniería S.A.S

REFERENCIAS PERSONALES

Nombre	Omar Manuel Baquero Bonilla
Profesión	Ingeniero Civil
Cargo	R.L. DALSASE Group.
Celular	



YHOJANN ARDILA ESCOBAR
C.C. 86.056.744 de Villavicencio

Hoja de Vida



Datos Personales

Nombre	**Cristhian David**
Apellidos	**Segura Castro**
Fecha de nacimiento	14 de septiembre de 1995
Lugar de nacimiento	Villavicencio (Meta)
Identificación	1.121.926.457 Villavicencio(Meta)
Estado civil	Soltero
Edad	27 años
Dirección	Conjunto Pasollano 1 torre 8 apto 101
Celular	310-275-1761
E-mail	ingcristhianseguracastro95@gmail.com

Perfil Profesional

Soy una persona en constante aprendizaje, y con actitud proactiva, me caracterizo por ser honesto, responsable, ordenado, gentil, y cumplidor de las actividades que se me asignan, tengo buenas relaciones interpersonales, que me permiten adaptarme rápidamente en los ambientes de trabajo.

Mi mayor fortaleza es la creación de ideas para la solución de problemas en mi espacio laboral, fomentando un liderazgo por un bien común y con gran capacidad de aprendizaje.

Estudios Realizados

Estudios Superiores	Corporación Universitaria Minuto de Dios **Especialización en gerencia de proyectos (Actualmente estudiando)**
Estudios Superiores	Universidad Cooperativa de Colombia **Ingeniería Civil (2019)**
Curso	I Congreso de la Construcción "La Madera como Material Estructural"
Entidad	**Universidad Cooperativa de Colombia**
Secundaria	Colegio INEM "**LUIS LOPEZ DE MESA**" Bachiller Académico con Énfasis en Ciencias Humanas, Políticas y Económicas. (2013)
Primaria	Colegio INEM "**LUIS LOPEZ DE MESA**" Sede San Vicente De Paul

Experiencia Laboral

Empresa	**CONSORCIO CUBRRAL FASE 2**
Cargo	Representante legal
Desde	25 de Enero del 2023
Hasta	Actualmente
Empresa	**CONSORCIO SAN JUAN 2022**
Jefe Inmediato	Javier Mauricio Gómez
Cargo	Coordinador de obra
Desde	15 de noviembre del 2022
Hasta	Actualmente
Empresa	**CONSORCIO CASA DE LA MUJER**
Jefe Inmediato	Luis Cruz Romero
Cargo	Coordinador de obra
Desde	05 de abril de 2021
Hasta	Actualmente

Empresa	**CONSORCIO PUENTE JARDIN DE PEÑAS LCR.**
Jefe Inmediato	Luis Cruz Romero
Cargo	Coordinador de obra
Desde	05 de abril de 2021
Hasta	31 de octubre de 2021

Empresa	**CONSORCIO RIO CAFRE LCR**
Jefe Inmediato	Luis Cruz Romero
Cargo	Coordinador de obra
Desde	05 de abril de 2021
Hasta	31 de octubre de 2021

Empresa	**CONSORCIO MILITAR APIAY**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Residente de obra
Desde	26 de febrero de 2021
Hasta	15 de septiembre de 2020

Empresa	**CONSORCIO QUINTA ETAPA**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Residente de obra
Desde	26 de febrero de 2020
Hasta	27 de septiembre de 2020

Empresa	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2019**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Residente de obra
Desde	29 de octubre de 2019
Hasta	26 de diciembre de 2019

Empresa	**CONSTRUROJAS SAS**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Área Licitaciones.
Desde	27 de junio de 2019
Hasta	28 de octubre de 2019

Empresa	**CONSORCIO SAN JOSE**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Inspector de obra.
Desde	2 de mayo de 2019
Hasta	26 de junio de 2019

Empresa	**CONSTRUROJAS SAS**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Área Licitaciones

Desde	1 de agosto de 2018
Hasta	01 de mayo de 2019

Empresa	**CONSTRUROJAS SAS**
Jefe Inmediato	Eduardo Andrés Rojas Pardo
Cargo	Aux. De Proyectos
Desde	21 de noviembre de 2016
Hasta	31 de julio de 2018

Referencias Familiares

Nombre	**Deysee Segura Castro**
Teléfono	321-951-9127
Parentesco	Hermana

Nombre	**German Segura Castro**
Teléfono	322-387-7595
Parentesco	Hermano

Referencias Personales

Nombre	**Ing. Mauricio Buenaventura Castellanos**
Empresa	Buenaventura Studio SAS
Cargo	Gerente
Teléfono	314-267-7574

Nombre	**Ing. Sandra Milena Pacheco**
Empresa	Construrojas
Cargo	Ingeniera de vías y Transportes.
Teléfono	320-205-0665

Nombre	**Ing. Hector Andres torres**
Empresa	Construrojas
Cargo	Ingeniero Civil.
Teléfono	314-381-4736

CRISTHIAN DAVID SEGURA CASTRO
1.121.926.457 DE VILLAVICENCIO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.121.926.457
SEGURA CASTRO
APELLIDOS
CRISTHIAN DAVID
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1995
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-SEP-2013 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-5200100-00492533-M-1121926457-20131009 0035370560A 1 40408524



RUPERTO VARGAS HERRERA

DATOS PERSONALES

NOMBRE	RUPERTO VARGAS HERRERA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	3140510 Quetame -Cundinamarca
FECHA DE NACIMIENTO	01/marzo/1967
LUGAR DE NACIMIENTO	Quetame -Cundinamarca
ESTADO CIVIL	casado
DIRECCIÓN	mz i casa 12 charrascal
CELULAR	3209107003
E-MAIL	N/A

PERFIL PROFESIONAL

Soy cadenero primero , he trabajado en empresas relacionadas a la Industria de la Construcción, ejecutando proyectos Multifamiliares y vías desempeñándome como cadenero primero Soy persona honesta, responsable y cumplidora de sus deberes, colaborador y aprendo con facilidad; Con liderazgo y capacidad para trabajar en equipo, con deseos de superación, compromiso para garantizar el éxito de los proyectos en que participo,

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios primarios	primaria Académico Colegio santa teresita del colegio

Monte redondo - Cundinamarca

EXPERIENCIA LABORAL

LCR
CARGO: CADENERO PRIMERO
JEFE INMEDIATO LUIS CRUZ ROMERO
TELEFONO: 3153261951
TIEMPO LABORADO: 20 Aaños
FUNCIONES REALIZADAS: topografía en obras de alcantarillado, puentes, vías

REFERENCIAS PERSONALES

(JORGE MORENO)
Consorcio cubarral fase 2
Cel: 3212317658

(albeiro cortes)
Independiente
cel: 3154059677



_____

RUPERTO VARGAS HERRERA
3140510
24 FEBRERO 2023 (Fecha en que se diligencia)

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES:

NOMBRE:	ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	86.011.617 GRANADA (META)
FECHA DE NACIMIENTO:	07 DE NOVIEMBRE DE 1978
LUGAR DE NACIMIENTO:	VISTA HERMOSA (META)
ESTADO CIVIL:	UNION LIBRE
NACIONALIDAD:	COLOMBIANA
DIRECCIÓN:	CARRERA 5B N°21-46
BARRIO:	ONCE DE NOVIEMBRE SAN MARTIN - META
TELÉFONO:	3132576809

Powered by CamScanner

PERFIL LABORAL:

PERSONA HONESTA, RESPONSABLE, EDUCADA INTEGRAMENTE CON GRAN CAPACIDAD DE APRENDIZAJE Y PERSISTENCIA, DESEMPEÑO EFICIENTE.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA SERVIR, COLABORAR Y GUARDAR FIDELIDAD A LA EMPRESA O A QUIEN LE ESTE EJERCIENDO LA LABOR.

EXPERIENCIA LABORAL:

10 AÑOS DE EXPERIENCIA.
ULTIMAS EMPRESAS:

EMPRESA: U.T GRANADA 2021

CARGO: AYUDANTE

JEFE INMEDIATO: DARIO FUENTES MATIAS

TELÉFONO: 3014205472

TIEMPO: 1 AÑO

CIUDAD: GRANADA -META

Powered by CamScanner

EMPRESA: CONSORCIO GUARATARA 2022

CARGO: AYUDANTE

JEFE INMEDIATO: DARIO FUENTES

TELÉFONO: 3208192352

TIEMPO: 9 MESES

CIUDAD: ACACIAS -META

REFERENCIAS PERSONALES:

ING. JOSE INTERVENTORIA

OCUPACION: INGENIERO

TELEFONO: 3183705601

DARIO FUENTES

OCUPACION: MAESTRO DE OBRA

TELÉFONO: 3014205472

ANDRES TORRES

OCUPACION: INGENIERO DE OBRAS

TELÉFONO: 3143814736

Powered by CamScanner

REFERENCIAS FAMILIARES

HORACIO DUQUE

OCUPACIÓN: AGRICULTOR

TELÉFONO: 313 478 8843

EDGAR RAMIREZ

OCUPACIÓN: OPERADOR DE OBRA

TELÉFONO: 313482780

DARIO FUENTES

OCUPACION: MAESTRO DE OBRA

TELEFONO: 3014205472

ALEX GUALTEROS

ALEX EDILSON GUALTEROS

C.C. 86.011.617 GRANADA (META)

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **86.011.617**

GUALTEROS PEÑA

APELLIDOS

ALEX EDILSON

NOMBRES

ALEX GUALTEROS

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-NOV-1978**

VISTA HERMOSA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

24-JUN-1998 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-5206000-01265638-M-0086011617-20211112 0076367054A 1 8503367413

Powered by CamScanner

Código de validación: REE5770

GRUPO EMPRESARIAL
NIT. 901400371-2

Certificado de Capacitación y Entrenamiento

ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA
CC: 86.011.617

Asistió y Aprobó el Curso de:

TRABAJO SEGURO EN ALTURAS
REENTRENAMIENTO AVANZADO

Con una intensidad horaria de 20 horas, según
Resolución de Salud Ocupacional 6956 del 28 de Septiembre de 2020 de la Secretaria de Salud del Meta y aprobación al registro de proveedores 08SE2021220000000005725 del Ministerio del Trabajo, y Certificación No. 30.383-1 Expedido por CELAC. 18-CPR-002 de acuerdo al título II, capitulo II Articulo 9 de La Resolución 1409 de 2012 y 1178 del 2017 del Ministerio de Trabajo.

Realizado en Villavicencio, del 2 al 3 de enero de 2022
Se Expide en la ciudad de Villavicencio el día 3 de enero de 2022

Jorge Enrique Granados Vargas
Director Operativo

Fabian Andres Cabrera Gutierrez
Resolucion No. 1589 de 2013
Entrenador TSA. 10092015

CELAC
NTC 6072
30.383-1

Powered by CamScanner

ENFOR®
INSTITUTE Inc.

NIT No. 900443443-5
Licencia en SST. Resolución No. 0340-13 Secretaria de Salud departamental Casanare
Licencia Secretaria de Educación Municipal Resolución No. 0330 - 15

Especialización en HSEQ ENFOR INSTITUTE Inc.

ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA

IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 86.011.617

Participo de la acción de formación

TRABAJO SEGURO EN ESPACIOS CONFINADOS (AVANZADO)

Con una duración de cuarenta (40) horas

Este certificado es personal e intransferible. El portador alcanzo los niveles de competencia Teórico- practico exigidas y será responsable por su buen uso. En testimonio de lo anterior se firma en Acacias (Meta) a los 10 días del mes de octubre de dos mil veintiuno (2021)

GERENTE
IVAN DARIO PEÑA

CODIGO DE VERIFICACION 897

LAURA NATALIA SALAZAR
ENTRENADOR ESPACIOS CONFINADOS
PROFESIONAL EN SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJOR
RESOLUCION 2677 DE 2016 SG-SST
GESTION DEL RIESGO INTEGRAL

Para verificar la autenticidad de este documento ingrese a la pagina web ENFOR-EDU.CO ingresando el numero de cedula del estudiante, o comuníquese a los números 3153593492-3185217852, correo electrónico ENFOR.COORDINADOR@GMAIL.COM, calle 14 # 30-23 barrio nutivara (sede acacias)

Powered by CamScanner

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:31:42 AM horas del 01/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **86011617**

Apellidos y Nombres: **GUALTEROS PEÑA ALEX EDILSON**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25
barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes
8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700
ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Powered by CamScanner

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 204171212

WEB
09:33:18

Bogotá DC, 01 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ALEX EDILSON GUALTEROS PEÑA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 86011617:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento con el Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Powered by CamScanner

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de septiembre de 2022, a las 09:32:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	86011617
Código de Verificación	860116172209010932 28

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

Powered by CamScanner



JORGE MAURICIO MORENO

DATOS PERSONALES

NOMBRE	JORGE MAURICIO MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	74281436 Guateque -Cundinamarca
FECHA DE NACIMIENTO	04/JULIO/1971
LUGAR DE NACIMIENTO	Bogotá DC
ESTADO CIVIL	Unión libre
DIRECCIÓN	Casa 36 BARRIO PARAISO ALTO GRANADA META
CELULAR	3212317658
E-MAIL	N/A

PERFIL PROFESIONAL

Soy oficial de construcción, he trabajado en empresas relacionadas a la Industria de la Construcción, ejecutando proyectos Multifamiliares y Unifamiliares, desempeñándome como oficial de construcción Soy persona honesta, responsable y cumplidora de sus deberes, colaborador y aprendo con facilidad; Con liderazgo y capacidad para trabajar en equipo, con deseos de superación, compromiso para garantizar el éxito de los proyectos en que participo,

FORMACIÓN ACADÉMICA

Estudios primarios primaria Académico

Gaunza abajo
Guateque -Boyacá 1985

EXPERIENCIA LABORAL

MC CONSTRUCTORA
CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION
JEFE INMEDIATO ALBEIRO CORTES
TELEFONO: 3154059677
TIEMPO LABORADO: 2 Aaños
FUNCIONES REALIZADAS: Instalación de tubería sanitarias y fluviales en el barrio el Danubio camelias y estero en Villavicencio -meta


(NH CONSTRUCTORA).
CARGO OFICIAL DE CONSTRUCCION
JEFE INMEDIATO: ALBEIRO CORTES
TELEFONO: 3154059677
TIEMPO LABORADO: 8 MESES
FUNCIONES REALIZADAS: Instalación de tubería sanitarias y fluviales en El municipio de san Carlos de Guaroa

REFERENCIAS PERSONALES

(Ruperto vargas herrera)
Consorcio cubarral fase 2
Cel: 3209107003

(albeiro cortes)

Independiente
cel: 3154059677



_____

JORGE MAURICIO MORENO
86011617
24 FEBRERO 2023 (Fecha en que se diligencia)

ANEXO INFORME DIGITAL CD
