INFIbagué	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	Vigente desde: 2018/02/06

INFORME NÚMERO:	02	**FECHA DEL INFORME:** (dd/mm/aa)	10/12/2018

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO DE OBRA	**NÚMERO:**	80	**FECHA :** (dd/mm/aa)	19/09/2018
OBJETO CONTRACTUAL:	CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRATISTA: (Adicione filas si es necesario)	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA S.A.S. - R.L. DAIRO DUEÑAS MORALES				
DOCUMENTO DE IDENTIDAD O NIT:	NIT. 900,195,023-0			**REGIMEN:**	REGIMEN COMÚN
VALOR INICIAL:	$ 88.343.274	**PLAZO INICIAL:**	3 MESES		
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	No. 259 del 25 de julio de 2018	**RP(S) INICIAL / VIGENCIA:** (Adicione filas si es necesario)	No. 359 del 19 de septiembre de 2018		
NOMBRE DEL(os) SUPERVISOR(es) QUE SUSCRIBE(n) EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	ING. HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ - MAURICIO ROSO PLAZAS				
CARGO DEL(os) SUPERVISOR(es):	GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES - CONTRATISTA				
FECHA DE DEL ACTA DE INICIO: (dd/mm/aa)	25/09/2018	**FECHA TERMINACION:** (dd/mm/aa)	24/12/2018		

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	CDP Y RP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		$ -			

2.2 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BASICA PARA EL PAGO

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018		
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	0064	**FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE :** (dd/mm/aa)	7/12/2018

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	31170768	**VALOR PAGO SALUD:**	$ 301.100
VALOR TOTAL DEL APORTE:	$ 1.071.200	**VALOR PAGO PENSIÓN:**	$ 385.300

INFIbagué	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE *CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL* MUNICIPIO DE IBAGUE.	Vigente desde: 2018/02/06

PERIODO COTIZADO:	OCT - NOV	**VALOR PAGO ARL:**	$ 167.700

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL

(Adicionar filas, cuando en el pago concurran recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	$ 88.343.274,24	
ADICIONES O DISMINUCIONES		
PAGOS PARCIALES CANCELADOS		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO		$ 65.101.922,29
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL		$ 23.241.351,95
SUMAS IGUALES	**$ 88.343.274,24**	**$ 88.343.274,24**

5. RESUMEN TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES CONTRACTUALES *(Adicione tantas filas como obligaciones tenga el contratista)*	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	UND	CANTIDAD EJECUTADA	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
PRELIMINARES	1,1. Desmonte cubierta asbesto cemento ///// Una vez se traslado el material de archivo del GPAD que se encontraba en esta area se pudo continuar con la actividad. ejecutandola al 100%. Resulto mayor cantidad de obra (25,87 m2).	M2	129,5	
	1.2. Cargue manual retiro y disposición final de sobrantes hasta 16 kms///// Debido a que fue necesario demoler el muro en ladrillo existente resulto mayor cantidad de escombro (2,48 m3).	M3	14,48	
MUROS	2.1. Muro en superboard base 9 totalmente terminado ///// Se inicio con esta actividad, instalando la estructura base 9 y laminas de fibro cemento de 8 mm.	M2	83,2	 
PAÑETES	3.1. Pañete exterior 1:3 impermeable I ///// Esta actividad no se va a ejecutar, por ajustes estructurales.	M2	0	
	3.2. Pañete liso 1:4 //// Esta actividad no se va a ejecutar, por ajustes estructurales.	M2	0	

	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
INFIbagué	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	Vigente desde: 2018/02/06

CUBIERTA	4.1. Teja thermoacustica //// Se inicio con la ejecucion de esta actividad y se concluyo.	M2	135,98	
	4.2. Correa laminada cal 18 (10 x 4 cmt) sencilla /// Se instalaron las correas una vez pintadas.	ML	129,5	
	4.3. Canal en lámina galvanizada cal=18 con anticorrosivo. /// No se ha iniciado esta actividad	M2	0	
PINTURA	7,1. Anticorrosivo para cerchas. /// Se ejecuto dicha actividad. Se verifico mayor cantidad de metros lineales.	ML	67	
	7.2. Anticorrosivo para correas. /// Se ejecuto dicha actividad, siendo la cantidad final menor a la proyectada.	ML	129,5	
	7.3. Pintura para cerchas //// Se ejecuto dicha actividad. Se verifico mayor cantidad de metros lineales.	ML	67	
	7.4. Pintura para correas //// Se ejecuto dicha actividad, siendo la cantidad final menor a la proyectada.	ML	129,5	
	7.7. Vinilo tipo I en interior sobre pañete dos manos /// Se pintaron los muros sobre los bloques. Menor cantidad ejecutada.	M2	55,5	
	7.8. Vinilo tipo I en exterior sobre pañete dos manos /// Se pinto el muro sobre bloque sin pañetar frente sala de juntas. Se pinto hasta nivel de piso generando mayor cantidad.	M2	73,96	
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS	8.1. Tubería sanitaria SPVC de 4" /// Se procedio a realizar el replanteo de los sifones y desagues y se instalo la tuberia sanitaria de 4" y de 2" con los respectivos	ML	18,34	

	8.2. Tubería de presión de ½" /// Se realizo el replanteo y se procedio a realizar la instalacion de la tuberia de presion.	ML	42	 
	8.3. Punto de agua fría pvc /// Se instalaron lo puntos de acuerdo al diseño sumando el punto para la poseta de aseo que se construyo.	UND	9	
	8.4. Llave de paso ½" corriente /// Se istalo la llave de paso dentro de una caja tipo medidor a nivel de piso.	UND	1	
	8.5. Tapa plástica para registro 15x15 /// Esta tapa se cambio por la caja tipo medidor de agua	UND	1	
	8.6. Suministro e instalación grifería 8" tipo fénix /// Esta actividad no se ha iniciado.	UND	0	
	8.7. Ducha sencilla /// Esta actividad no se ha iniciado.	UND	0	
	8.8. Orinal pared /// Esta actividad no ejecuto.	UND	0	
	8.9. Aparato sanitarios /// Esta actividad no se ha iniciado.	UND	0	
	8.10. Lavamanos acuacer blanco /// Esta actividad no se ha iniciado.	UND	0	
ALCANTARILLADO	9.1. Corte de pavimento rígido con cortadora /// Esta actividad se ejecuto evidenciando mayor cantidad.	ML	115,2	

	9.2. Rotura concreto rígido /// Se ejecuto dicha actividad, incluye las placas de concreto que fueron demolidas debido a que se evidencio que estaba sin una base o material que la soportara.	M3	5,04	
	9.3. Excavación a mano de 0 a 2 m en seco en material común /// Se realizo dicha actividad. Las excavaciones se amplio debido a la profundidad, y una vez se evidencia la existencia de material suelto y contaminado debajo de las placas de concreto.	M3	54,48	
	9.4. Cargue y retiro de sobrantes hasta 8 km a mano /// Se retiro todo el material de excavacion	M3/COMP	30,87	
	9.5. Suministro e instalación lecho en grava para cama tubería d=1/2 a ¾ /// Actividad ejecutada mayor cantidad debido a que la excavacion se amplio.	M3	3,47	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3722-1 NORMA TECNICA COLOMBIANA 4764 (100% DE HERMETICIDAD)	10.1. De 0 a 2 m de diámetro 10 pulgadas /// Se instalo tuberia de 10" hasta conectar a la red por fuera de INFIBAGUE.	ML	33,6	
	10.2. Suministro de recebo en zanja compactada cada 15 cms medio mecánico /// se suministro recebo y se compacto en areas donde se realizaron las diferentes excavaciones.	M3/COMP	13	
	10.3. Anden en concreto e=0.1 m (incluye alistado y nivelación) /// Se termino de fundir las placas en concreto para reponer las demoliciones.	M2	71,83	
CONSTRUCCION POZO DE INSPECCION	11.1. Base y cañuela en concreto de 3000 PSI e=0,3 m /// Esta actividad ya se ejecuto	UND	1	

	11.2. Pañete interior /// Esta actividad ya se ejecuto	ML	1,5	
	11.3. Cilindro en ladrillo e=0,3m /// Se inicio y ejecuto esta actividad.	ML	1,5	
	11.4. Cono de reducción h=0.65m /// Se ejecuto dicha actividad	UND	1	
	11.5. Pasos en hierro de 3/4 con anticorrosivo c/0,4m /// De acuerdo al avance en el pozo se instalaron los pasos.	UND	5	
	11.6. Suministro e instalación de arotapa /// Se suministro e instalo	UND	1	
	11.7. Señalización en guadua cada 3 m en poli sombra h=2m /// se procedio a cerrar el area de trabajo y demarcarlo.	ML	67,2	
	11.8. Caja de Inspección 80*60*100 cms concreto de 2500 PSI tapa reforzada en concreto de 3000 PSI /// No se ha ejecutado dicha actividad.	UND	0	
	11.9. Cámara de caída diámetro de *8 pulgadas revestida en concreto,* malla con vena /// Esta actividad no se ha ejecutado	ML	0	
ENCHAPES	12.1. Guarda escoba en tablon /// Esta actividad no se ha ejecutado	ML	0	
	12.2. Enchape pared 20x20 /// Esta actividad no se ha ejecutado	M2	0	

PISOS	12.3. Piso duro piso o similar /// Esta actividad no se ha ejecutado	M2	0	
INSTALACIONES ELECTRICAS	13.1. Punto eléctrico salida luminaria y/o tomacorriente /// Se instalo la tuberia conduit y los tomas, interruptors y plafones de acuerdo al diseño.	UND	18	
CARPINTERIA DE ALUMINIO	14.1. Puerta en aluminio tipo liviano, con adaptador y pisa vidrio plano y Marco en Aluminio 1,00x2,00 m /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	
	14.2. Puerta en aluminio tipo liviano en perfil de 2x1, Con Adaptador y pisa vidrio Plano y Marco en Aluminio 0,80x2,00 m /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	
	14.3. Ventana en perfil 5020 con seguro media luna y vidrio de 4 mm 0,40x0,60 m /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	
OTROS	15.1. Loker 3 cuerpos 6 puertas de 1,80x90,30 estructura lamina lisa cold rolled calibre 0,20, frente puertas con manijas plásticas con punzonada y/o ventanas, porta candados y base con niveladores /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	
	15.2. Mesón en concreto de 3000 PSI y grano pulido #2 /// Esta actividad no se ha ejecutado	ML	0	
	15.3. Silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera, refuerzos en platina, acabados en pintura electrostática pulverizada, medidas: 1,50x.40x.43 /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	
	15.4. Estructura en tubo redondo cold silla para vestier Estructura en tubo redondo cold rolled 2", sentadero en malla cafetera, refuerzos en platina, acabados en pintura electroestática pulverizada medidas 1,00x.40x.41 /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	0	

ITEM NO PREVISTOS Y EJECUTADOS

	16.1. Columnas en concreto de 0,25 x 0,35 /// Esta actividad se ejecuto debido a recomendaciones del ing. Calculista para levantar el nuevo muro.	ML	20,3	
	16.2. Viga de amarre de 0,25 x 0,35 /// Esta actividad se ejecuto debido a recomendaciones del ing. Calculista para levantar el nuevo muro.	ML	37	
	16.3. Anclaje para soportes de cerchas reinstaladas /// Esta *actividad se ejecuto debido a* recomendaciones del ing Calculista para levantar el nuevo muro.	UND	7	
	16.4. Tapa sumidero tipo IBAL /// Se cambio la tapa metalica que se encontraba en mal estado.	UND	2	
	16.5. Muro en bloque H4 /// Por recomendación del ing. Calculista se remplazo el muro existente en ladrillo tolete el cual no tenia estructura y se evidencio con grietas que ponian en riesgo la estabilidad de este.	M2	41,84	
	16.6. De molicion muro sencillo e=0,12 /// Se demolio el muro existente por sugerencia del ing. Calculista el cual ponia en riesgo la estabilidad de la obra. No tenia estructura y presentaban grietas y/o dilataciones.	M2	55,5	
	16.7. Acero de refuerzo /// De acuerdo a las recomendaciones del ing calculista se fundieron vigas de cimentacion, columnas y viga de remate o cinta, con el respectivo refuerzo.	KG	501,07	

	16.8. Adecuacion de acometida hidraulica a tubo madre, incluye valvulas de 1" y 2" /// Durate el desarrollo de la obra fue necesario realizar arreglos a la acometida hidraulica.	UND	1	  
	16.9. Descole de pozo hacia caja exterior en pvc 10" corrugada /// Esta actividad no se ha ejecutado	UND	1	
	16.10. Caja de inspeccion 100 x 100 terminada ///	UND	3	
	16.11. Tablero de circuitos 30 amp /// Actividad ejecutada	UND	1	
	16.12. Red acometida electrica monofasica 2 #8 hasta entrada ///	ML	5	

INFIbagué	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUÉ - INFIBAGUÉ	Código: FOR-GC-005
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 01
	INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.	Vigente desde: 2018/02/06

6. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Como supervisor(es) del contrato, certifico(camos) que el contratista ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) ING. HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ — ARQ. MAURICIO ROSO PLAZAS

FIRMA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.

CONTRATO DE OBRA No. 80 DE 2018
Contratista: INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.

INFORME DE OBRA N° 1
ACTA PARCIAL No 001 DE 2.018

IBAGUE, TOLIMA
DICIEMBRE, 2018

ELABORÓ: Nombre: Ing. MAGALI REYES PATIÑO Cargo: Residente Interventoría Firma: Fecha: DICIEMBRE DE 2018	INGEOLOGIA SAS 9001958023-0	**APROBÓ:** Nombre: Ing. DAIRO DUEÑAS M. Cargo: Rep. Legal – Ingeologia SAS. Firma: Fecha: DICIEMBRE de 2018

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1. Antecedentes 3

2.2. Localización del Proyecto 4

2.3. Características técnicas y alcance del proyecto 4

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 5

3.1. Generalidades Contrato de Obra 5

3.2. Resumen actividades desarrolladas durante el periodo: 6

CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Contrato de obra **Nº 80 de 2018** suscrito con la INFIBAGUE, que contempla **CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE**, nos permitimos elaborar el presente informe que corresponde al periodo comprendido entre el 23 de Septiembre al 10 de diciembre de 2018, en el cual se da cumplimiento a las obligaciones contractuales.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Antecedentes

El proyecto se enmarca en la construcción del taller de podas y adecuaciones locativas en las instalaciones del instituto de financiamiento, promoción y desarrollo de Ibagué. INFIBAGUE, del municipio de IBAGUE – TOLIMA.
El taller de podas quedara localizado en el patio posterior de las oficinas del GPAD en el sitio en el cual funciona un parqueadero cubierto con teja de asbesto cemento.
La construcción del taller de poda se hará demoliendo y retirando la cubierta actual existente y la demolición de un muro de cerramiento que no cumple norma sismorresistente.

Para la ejecución del contrato se plantea la construcción de un muro cerramiento en bloque cerámico H4, construcción de cubierta en teja PVC sobre estructura metálica, muros divisorios en superboard, y adecuación de servicios sanitarios y redes internas al interior del taller de podas.

2.2. Localización del Proyecto

El contrato se ejecutara en las instalaciones de INFIBAGUE en la carrera quinta con calle 60 esquina, en la parte posterior de las oficinas del GPAD.

2.3. Características técnicas y alcance del proyecto

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia y estudios previos de las convocatorias de contratación para la ejecución del proyecto las actividades previstas son las siguientes:

- Construcción de redes de acueducto y alcantarillado para el taller de podas.
- Construcción del sistema de descole de alcantarillado de aguas negras mediante la construcción de un pozo de inspección y cambio de red principal hasta la caja externa.
- Demolición de muro cerramiento en ladrillo que no cumple norma sismorresistente.
- Retiro de cubierta en asbesto cemento existente.
- Construcción de cubierta en teja PVC sobre estructura metálica.
- Construcción de muros divisorios en superboard.
- Adecuación de red eléctrica para el taller de podas.
- Enchape de baños y pisos de vestier y baños.
- Instalacion de ornamentación en aluminio.
- Pintura interna y externa del taller.
- Instalación de canal de aguas lluvias en cubierta.
- Instalación de aparatos sanitarios.
- Dotación de closets y sillas para vestier.
- Construcción de mesón en baños e instalación de lavamanos.
- Limpieza y aseo general.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Generalidades Contrato de Obra

A continuación, incluimos la información general del proyecto en desarrollo, derivado del Contrato de Obra Nº 80 del 2018, en la cual se registra la parte administrativa y financiera del mismo, a saber:

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO Nº	1361 del 15 de noviembre de 2016	
OBJETO	"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DEL TALLER DE PODAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE - INFIBAGUE, PARA EL AREA OPERATIVA DE CONTROL DE VEGETACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE"	
CONTRATISTA	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS	
NIT.	900195023-0	
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO DUEÑAS MORALES	
CÉDULA CIUDADANÍA	93.385.314	
DIRECCIÓN PRINCIPAL	CARRERA 4 No 12-47 OFICINA 606	
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	INFIBAGUE IBAGUE	
TELÉFONO	Cel. 3118587090	
E-MAIL	ingenierodairo@hotmail.com	
ESTADO ACTUAL CONTRATO		En ejecucion.
FECHA INICIACIÓN		25 de septiembre de 2.018
PLAZO TOTAL		TRES MESES
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA		
VALOR INICIAL		$88.343.274,24
VALOR ACTA PARCIAL No 1		$ 65.101.922,29

3.2. Resumen actividades desarrolladas durante el periodo:

Durante el periodo comprendido entre el 25 de septiembre y el 10 de diciembre de 2018, se llevaron a cabo actividades de orden administrativo y técnico para el cumplimiento de la meta física propuesta, las cuales conllevan al cumplimiento del objeto contractual derivado del contrato de obra 80 de 2018. A continuación, se presenta el registro fotográfico de las labores adelantadas por el contratista.

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	1,01. Desmonte cubierta asbesto cemento



CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	1,02.Cargue manual retiro y disposicion final de sobrantes hasta 16 Kms





CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	1,02.Cargue manual retiro y disposicion final de sobrantes hasta 16 Kms





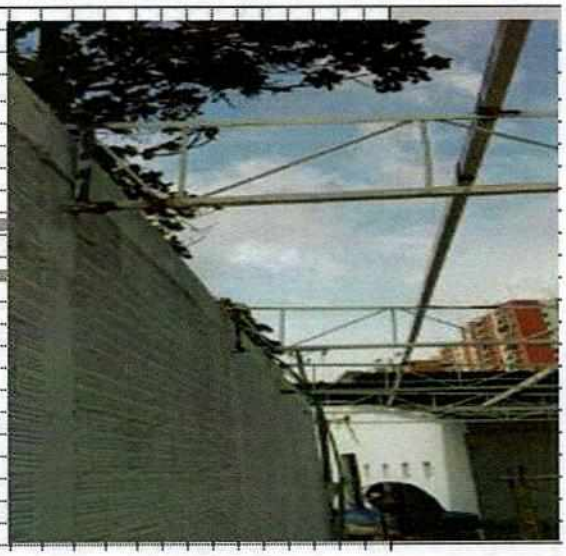
CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	4.01 TEJA TERMOACUSTICA





CAPITULO	1. PRELIMINARES	ITEM	4.02 CORREA LAMINADA CAL 18 (10 X 4) CM SENCILLA

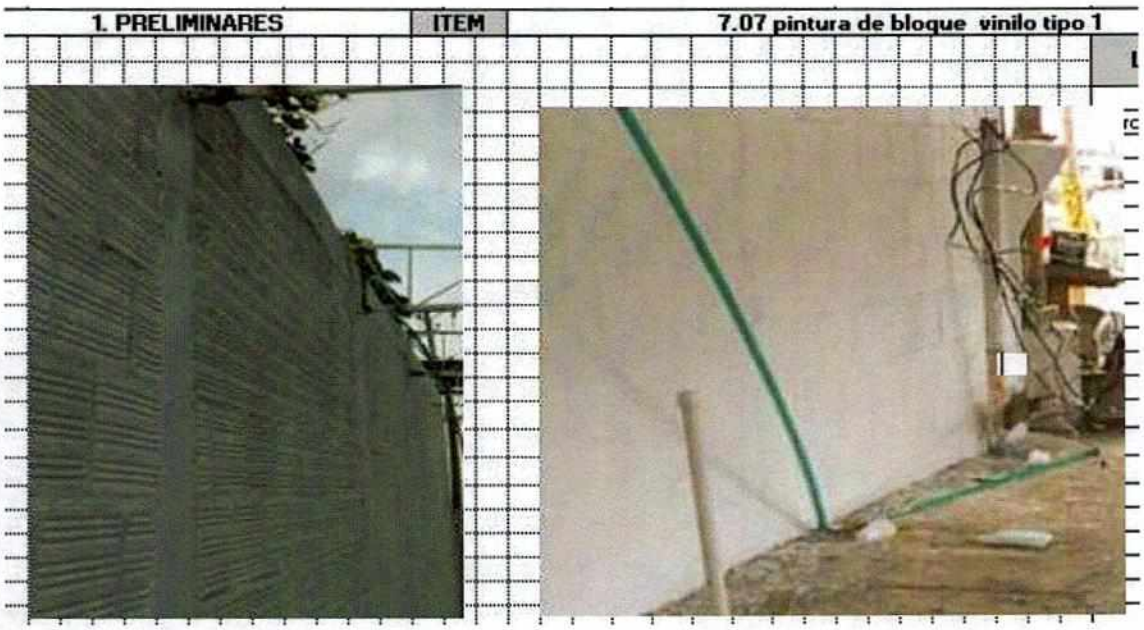




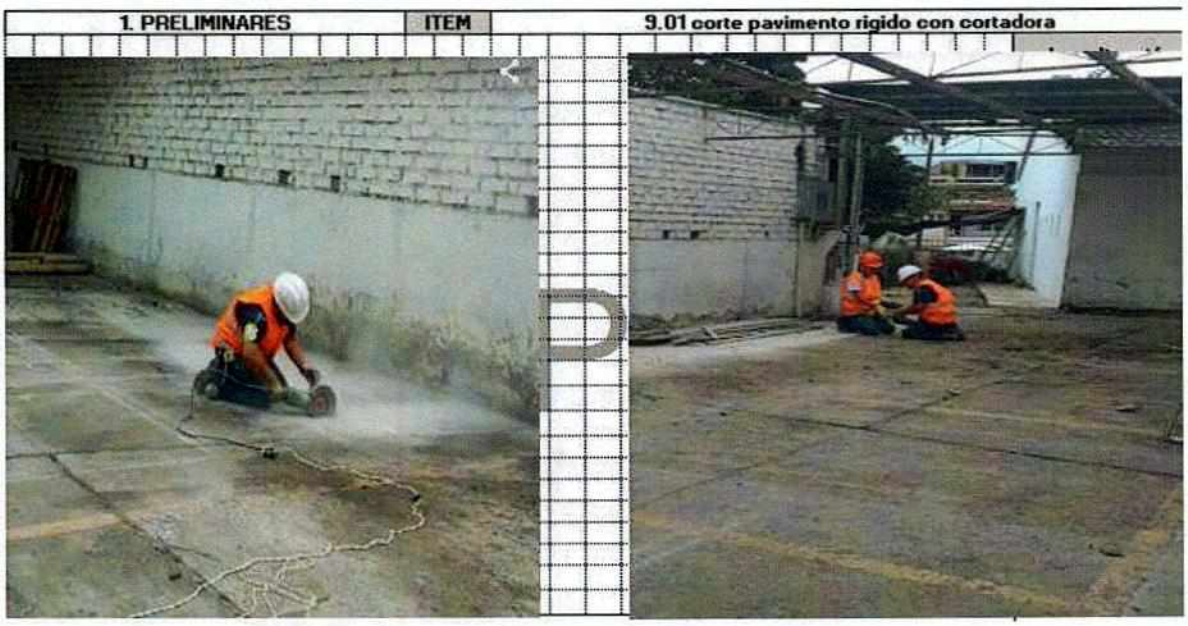

CAPITULO
1. PRELIMINARES
ITEM
7.03 Antocorrosivo cerchas


1. PRELIMINARES
ITEM
7.02 anticorrosivo correas


CAPITULO
1. PRELIMINARES
ITEM
7.03 Pintura para cerchas


1. PRELIMINARES
ITEM
7.07 pintura de bloque vinilo tipo 1


CAPITULO
1. PRELIMINARES
ITEM
7.08 pintura de muro exterior vinilo exterior

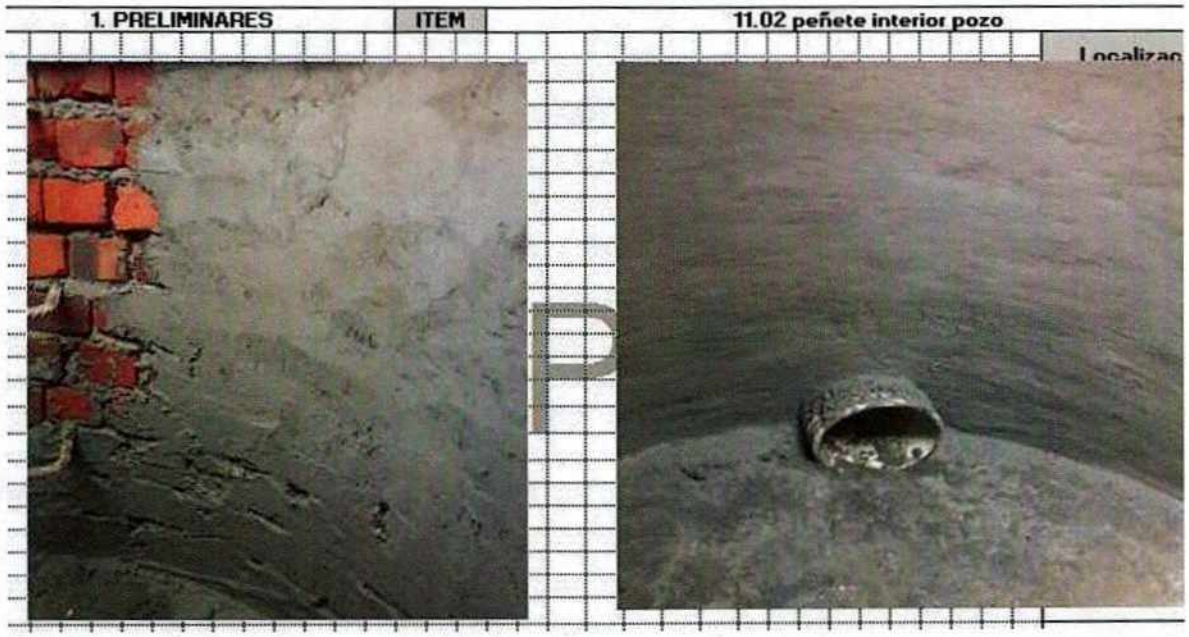

1. PRELIMINARES
ITEM
9.01 corte pavimento rigido con cortadora

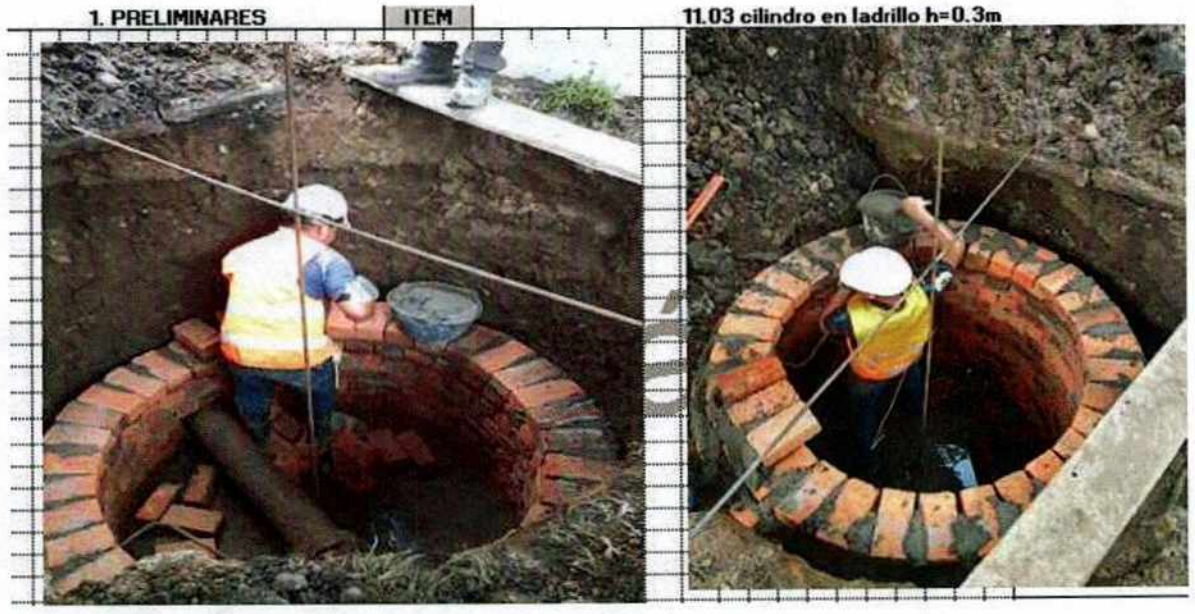

CAPITULO
1. PRELIMINARES
ITEM
9.02 rotura de concreto rigido


1. PRELIMINARES
ITEM
9.03 excavacion a mano 0 a 2m en seco


1. PRELIMINARES
ITEM
10.01 suministro e instalacion tuberia de 0 a 2m de d= 10 "

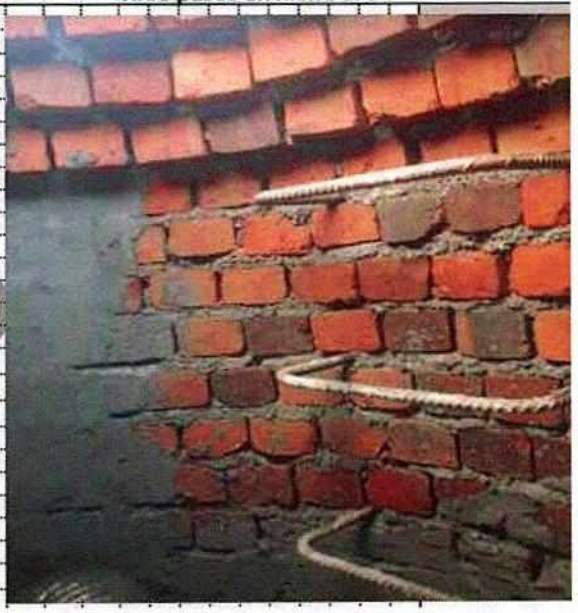

. PRELIMINARES
ITEM
10.03 anden en concreto e=0.1m
luye alistado y nivelacion
Localización


1. PRELIMINARES
ITEM
11.02 peñete interior pozo
Localizac


1. PRELIMINARES
ITEM
11.03 cilindro en ladrillo h=0.3m

1. PRELIMINARES	ITEM	11.05 pasos en hierro 3/4



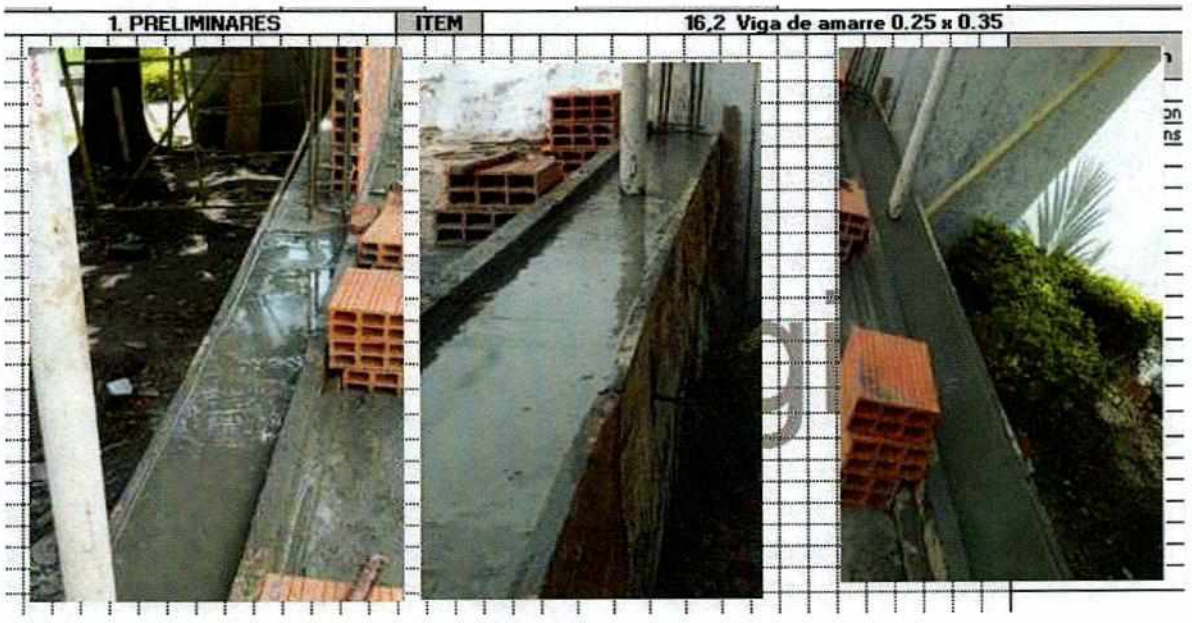


1. PRELIMINARES	ITEM	11.06 suministro e instalacion de arotapa vibrocompactada






1. PRELIMINARES
ITEM
16,10 Caja de inspeccion 100 x 100 terminada


1. PRELIMINARES
ITEM
16,2 Viga de amarre 0.25 x 0.35


16,4 Tapa para Sumidero tipo ibal

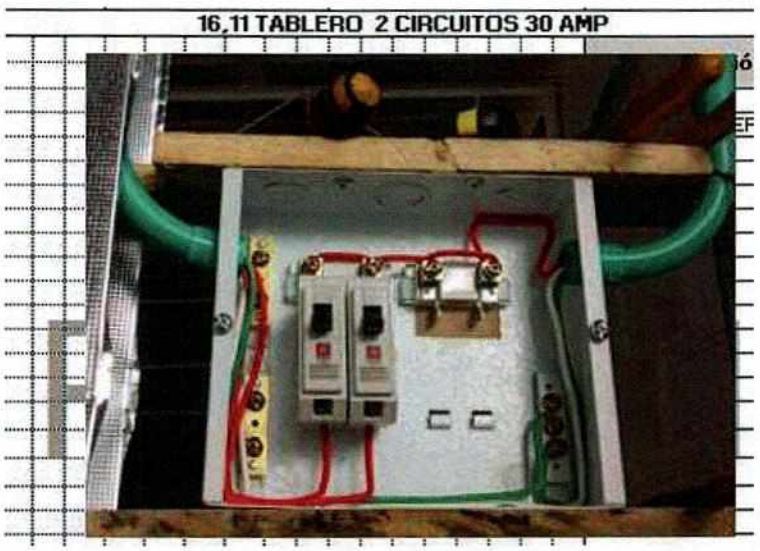

1. PRELIMINARES
ITEM
16,5 muro en bloque h4

1. PRELIMINARES	ITEM	16,6 Demolicion de muro sencillo e=0,12



ITEM	16,7 Acero de Refuerzo




16,11 TABLERO 2 CIRCUITOS 30 AMP
