PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA SUPERVISION EN INFRAESTRUCTURA

CONTRATO 077 DE 2023

INFORME 3 ABRIL 8 – MAYO 7

el 8 de febrero de 2023 se inició el contrato No 077 de 2023, el cual tiene por objeto: Acompañamiento a la supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de los convenios interadministrativos y contratos de obras públicas de la secretaria de infraestructura física en: pavimentos urbanos y rurales, programa de pavimentación por autoconstrucción, construcción y mantenimiento escenarios deportivos y edificaciones en general.

En este periodo del contrato 077 de 2023 se ha realizado apoyo permanente a todos los procesos encomendados, este apoyo a consistido en visitas física a las obras, revisión documental de las carpetas de los contratos y convenios, proyección de documentos y oficios, ajustes y acompañamientos que le han permitido al secretario de infraestructura tomar decisiones expeditas y prudentes, todas lo más acordes posible a la legislación y situación pertinente.

También se ha realizado el seguimiento y liquidación de contratos y convenios

Me permito describir los acompañamientos realizados durante el periodo 3 comprendido entre el 8 de abril y el 7 de mayo de 2023.

1. **CONTRATO 332 DE 2020** cuyo objeto: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE APARTADO – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL.

Esta obra se terminó totalmente y actualmente se actualizaron las pólizas, se revisó los documentos y estando en trámites de pago final para liquidación de la obra y posteriormente el convenio se encontró que la cuenta conjunta con invías de pago esta embargada y así mismo llego un oficio de un juzgado donde solicitan el embargo a los pagos del contratista.

		
Se aprecia terminación de la calzada en la totalidad del tramo de zungo arriba	Se observa la fundición de las cunetas pendientes.	Se aprecia la construcción completa de la calzada, cunetas y bordillos de la placa huella

2. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 287 DEL 2021**, cuyo objeto es: contrato interadministrativo de mandato sin representación para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia.

3. **CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 301 DE 2021,** cuyo objeto es: aunar esfuerzos para realizar la interventoría técnica, ambiental, administrativa y financiera para la construcción de placa huella en vías rurales para mejorar la conectividad vial y contribuir a alcanzar una paz estable y duradera en el municipio de apartado, Antioquia

Este contrato el 287 se firmó el 20 de agosto de 2021 y fue aprobado en el secop 2 por las partes (municipio de apartado y la empresa para el desarrollo urbano y hábitat del municipio apartado EDUH), e1 acta de inició se firmó el 30 de agosto de 2021, el 9 de septiembre se realiza otro si al contrato en el cual se reduce en tres (3) meses el plazo inicial de doce (12) meses a nueve (9) meses, quedando como fecha de terminación el 30 de mayo de 2022, se realizó adición de 4 meses quedando como fecha de terminación 30 de septiembre de 2022, este contrato cuenta con una interventoría 301 de 2021 firmado con la asociación de municipios del Urabá antioqueño ASOMURA, el 14 de septiembre de 2021 con un plazo de nueve (9) meses, fecha de inicio el 27 de septiembre y fecha de terminación actual el 30 de septiembre de 2022.

Estos contratos se encuentran en ejecución, en este periodo reportado de SEPTIEMBRE A OCTUBRE ya se han ejecutado actividades contractuales y de interventoría. En el frente del guineo llevan ejecutados aproximadamente 2.800 ml de pavimento y en el frente del reposo se han ejecutado los otros 2.000 ml.

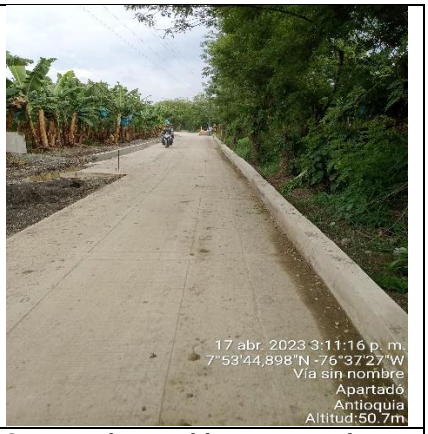
La interventoría envió los informes de reporte mensual por correo electrónico y luego presentaron el cuadro de cantidades ejecutadas físicamente ya que se requirieron para soportar la información que se subió al gesproy, las cantidades reportadas requieren de una verificación exhaustiva ya que se han tomado como avance parcial la supervisión en visitas de campo constato la ejecución de obras a la fecha.

Durante este periodo se tramitaron actas parciales por el 90% tanto a la ejecución de la obra como a la interventoría de la misma.

Se presentó para tramite una solicitud de adición por cerca de 450 millones de pesos para ejecución de unas obras adicionales con su respectiva interventoría, estas obras adicionales y extras son para la construcción de un muro de contención en gaviones que defenderá la obra construida la cual queda expuesta por socavación de base producto de las fuertes crecientes con la ola invernal que nos aqueja.

Durante este periodo de Noviembre – Diciembre se terminó la ejecución del tramo el reposo – San Martin el cual es de 2km y se avanzó sustancialmente en la terminación del tramo vía principal – el guineo del cual se han construido aproximadamente 3.5 de los 4km que se deben terminar.

Para este mes de abril periodo del 8 de abril al 7 de mayo de 2023, el contratista e interventoría solicitaron adición de tiempo toda vez que se hizo imposible la culminación de las actividades, la administración municipal concedió dicho plazo en adición de 2 meses a partir del 30 de abril quedando como nueva fecha de terminación el 30 de junio de 2023

		
Se aprecia la habilitación de la calzada en el tramo del guineo	Tramo de calzada pendiente por culminar.	Se aprecia el avance del pavimento en el tramo del guineo una calzada habilitada y otra por completar.

4. CONTRATO 332 DE 2021

Este contrato se encuentra terminado, la interventoría fue ejecutada por el instituto nacional de vías, actualmente se encuentran realizando ajustes a la obra por observaciones encontradas.

		
Visita a la obra, interventoría, contratista, supervisión y contraloría.	Medición de tramos construidos	Culminación de calzada en pavimento

5. Aparte del seguimiento a estos contratos asignados bajo la supervisión se realizó acompañamiento en otros aspectos del cumplimiento de funciones en la secretaria de infraestructura como son: acompañamiento a revisión de estructuras, visita a obras ejecutadas en el municipio, acompañamiento a eventos realizados por la administración.

Cronograma semanal del mes de ABRIL de 2023 programado

APOYO A LA SUPERVISION

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

	1					2					3					4				
	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO	RD	DN	EO	DN	VO
	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO	EO	DN	RD	DN	CO
	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU	CO	DN	DN	DN	JU

Convensión		
RD	Revisión Documental	Comprende la revisión de oficios, actas, apu, modificaciones, planos
VO	Visitas a Obras	Consiste en llegar hasta los lugares de las obras bajo encargo y constatar los avances fisicos y tecnicos
EO	Elaboración Oficios	Consiste en la proyección de oficios de respuestas, peticiones, informes y aprobaciones
CO	Comites	Reuniones técnicas de obras bajo encargo, con contratistas, interventores y personal de infraestructura
JU	Juntas	Reuniones internas de la SIF o con otras dependencias de orden administrativos
DN	Disponible alguna Necesidad	

ING. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
Contratista OPS 077 de 2023
Apoyo a la Supervisión

Cronograma de actividades ejecutadas en el mes de ABRIL de 2023

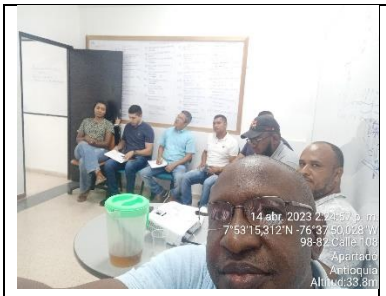
Abril 2023



Lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11 se asistio a las instalaciones de la secretaria y se realizo actividades	12	13 se realizo revision de la cuenta presentada por el contratista del contrato 332 de 2020,	14 se realizo visita a la placa del gas en compañia de contraloria	15	16
17 se realizo visita a placa huella del guineo	18 se asistio a las instalaciones de la secretaria y se proyecto oficio	19	20	21 se asistio a las instalaciones de la secretaria y se realizo trabajo administrativo	22	23
24	25 se asistio a las instalaciones de la secretaria y se proyecto oficio	26 se asistio a la inauguracioon de la 1ra etapa del urbanismo de la via lopez (alcalde y	27 se asistio a las instalaciones de la sif para realizacion de comites	28 se realizo revisión de documentación del contrato 332de 2021, en tramite para liquidar	29	30
1 festivo, dia del trabajo	2 se asistio a las instalaciones de la sif y se realizaron labores administrativas.	Notas				

Anexos

Comités administrativos SIF y otros

		
Comité en la sif para presentación de informes	Comités presenciales en la sif	Acompañamiento a inauguración del urbanismo vía López



FIRMA DEL CONTRATISTA

Ing. FRANCI STIVINTH GONZALEZ MORENO
C.C.79´599.713
Calle 101 # 109-74 apartado
Teléfono 3104143540
Email: sgmi12@gmail.com
