INFORME SEMANAL INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1009 – 2022 “REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022”



PERIODO 31

DEL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 7 DE ABRIL DE 2023

Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	FORMATO **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 1/04/2023 (dd-mm-aa) **AL** 7/04/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."

CONTRATISTA DE OBRA: BUILDING SAS **NIT** 804.002.715-3

INTERVENTOR: INPLAYCO SAS **NIT** 860.524.168-8

CONTRATO DE OBRA	
Valor Inicial	$ 3,600,000,000.00
Valor Adicional 1	$ 1,602,000,000.00
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5,202,000,000.00
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	6 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/03/2023


CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Valor Inicial	$ 432,000,000.00
Valor Adicional 1	$ 192,240,000.00
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 624,240,000.00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prorroga 1	2 Meses y 15 dias
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7 Meses 15 dias
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

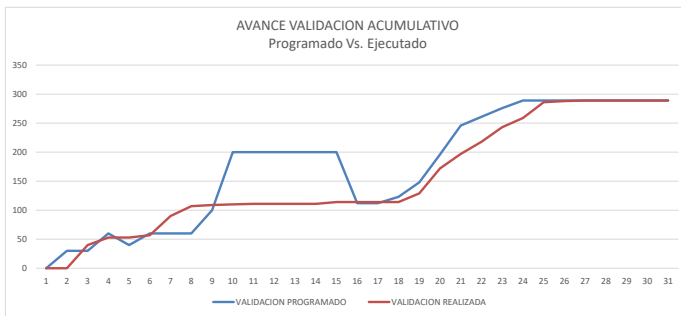



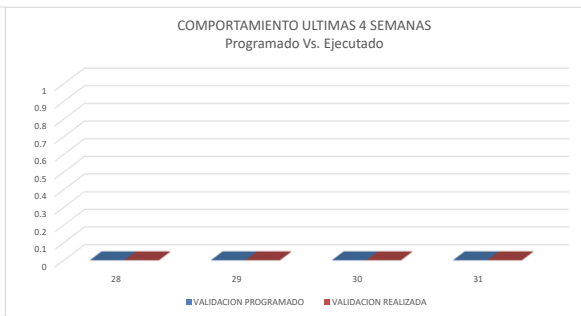


Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 28	Prog.	Ejec.	SEM 29	Prog.	Ejec.	SEM 30	Prog.	Ejec.	SEM 31	Prog.	Ejec.
Cantidad Validaciones	289	100.0%	289	100.0%	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	0.00%		0	0		0	0		0	0		0	0

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.


1. Se evidencia que a la fecha el Contratista de obra finalizo la etapa de validacion al 100% y a satisfaccion, dentro de las 291 viviendas adjudicadas al contrato,se encontraron 2 renuncias por lo cual se finaliza la etapa de validacion con 289 viviendas.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES

AVANCE FISICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

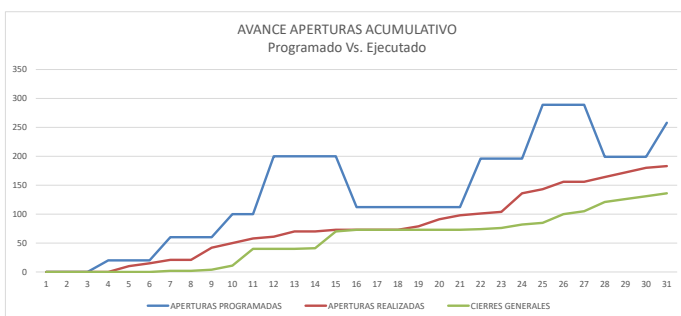



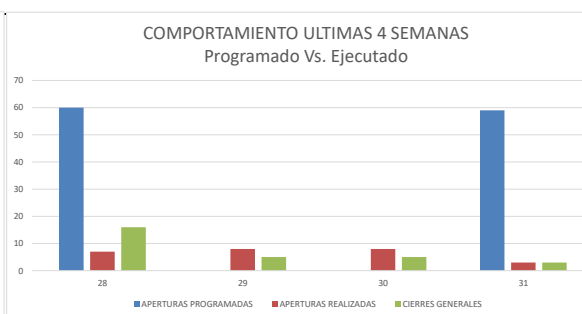

Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)							Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)				Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)											
	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retraso	Programado	Ejecutado	Adelanto	Retraso	SEM 28	Prog.	Ejec.	SEM 29	Prog.	Ejec.	SEM 30	Prog.	Ejec.	SEM 31	Prog.	Ejec.
Cantidad de Aperturas	258	89.3%	183	63.3%	0.0%	-25.95%	59	3	1.04%	0.00%		60	7		0	8		0	8		59	3

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.


1. El Contratista de obra presenta 258 aperturas según la programacion. De las cuales se realizo la apertura de 183 viviendas, esto teniendo en cuenta la reprogramacion presentada por ellos, por lo tanto esto presenta un atraso del 25,95% frente a la etapa de ejecucion.

2. Según la reprogramación de obra que presento el Contratista Building SAS, indica que a la fecha segun dicha programacion se deben tener 258 viviendas aperturadas de las cuales se aperturaron 183 viviendas, teniendo 136 mv entregados a satisfaccion y 47 viviendas en ejecucion. Debido al poco avance en la ejecucion del contrato que se esta presentando por el Contratista de obra se solicita dar inicio a viviendas para mitigar los atrasos que se estan presentando a la fecha y de esta manera evitar futuros incumplimientos.

3. Se debe tener en cuenta que para esta fecha el Contratista Building SAS presento plan de contingencia y reprogramación, con permiso del comité realizado el 28 de Marzo.

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJECUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)
(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))

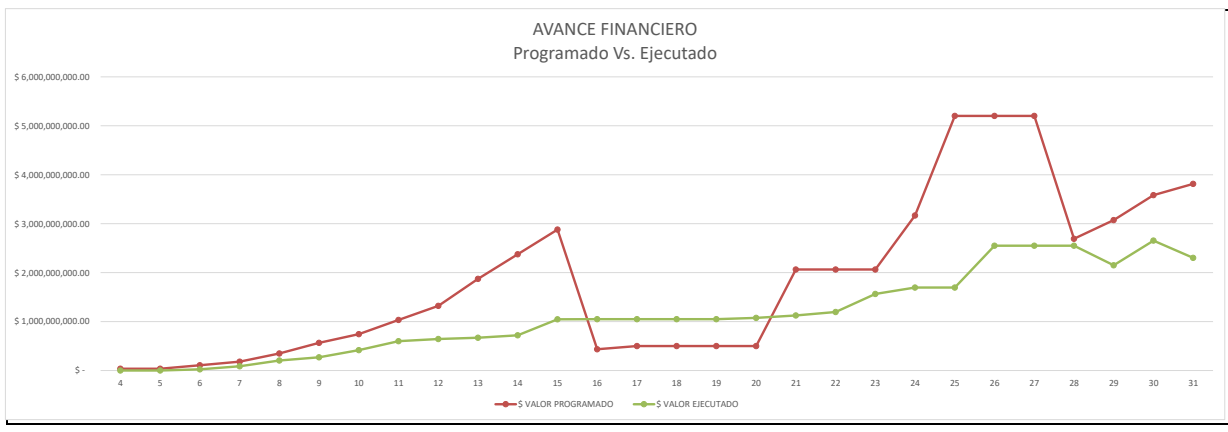

VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA **$ 358.216.718** VS. EJECUTADA $ 50.593.112,26

% AVANCE PROGRAMADO **6,89%** VS. % AVANCE EJECUTADO 0,97%

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA **$ 3.813.157.894,74** VS. EJECUTADA **$ 2.300.359.954,08**

% AVANCE PROGRAMADO **73,30%** VS. % AVANCE EJECUTADO **44,22%**

ATRAZO O ADELANTO GENERAL EN PESOS ($): **$ 1.512.797.940,66**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **42,02%**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atraso indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

1. Según la reprogramación vigente la fecha y flujo de caja presentados por el Contratista de obra, en el momento se esta presentando un atraso según lo ejecutado de $1.512.797.940,66 lo que hace referencia a un 42,02% de atraso frente al valor total del contrato.

2. Se debe tener en cuenta que el contratista de obra presento una programacion y flujo de caja ajustado según a la modificacion del contrato, por tal motivo se da la claridad de la disminucion de la inversion acumulada.

	FORMATO	
	INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 1/04/2023 (dd-mm-aa) **AL** 7/04/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 30	MVBF_793	Se hace recorrido por parte de contratista e interventoria, no se observa trabajadores en el predio. El beneficiario manifiesta inconforme por lo cual se levanta PQR con su consentimiento. Vivienda aperturada el 15-02	La interventoria notifica de manera verbal y escrita al contratista de obra frente a la inconformidad presentada. Realiza seguimiento el dia 23-03, por parte del contratista e interventoría, no se observa trabajadores en el predio. Su esposa Gladys Espinoza indica inconformidad. Se levanto PQR con su consentimiento el día 02-03-2023. Nuevamente se le solicita al contratista trabajadores en el predio. El 29-03-2023 Se hace seguimiento por parte del contratista e interventoría, no se observa trabajadores en el predio. El beneficiario no vive allí y el subcontista le informo al beneficiario que desocupara el predio un mes antes de la apertura y así lo hizo la familia. El beneficio refiere que lleva dos meses pagando arriendo y no tiene recursos para seguir cubriendo dicho arriendo. El contratista se compromete a disponer de nuevos maestros el día de mañana y le manifestó al beneficiario ayudarle con una parte de arriendo. El señor ARISTÓBULO indica, si no llegan maestros el día de mañana irá directamente a secretaria del hábitat.	ABIERTA
	MV_03352	Queja por inconformidad por la falta de gestión y seguridad verbal, por parte de la Secretaria del Hábitat en la ejecución del proyecto de mejoramiento de vivienda y afectación económica hacia mi persona, el pasado 22 de enero, mi mamá, quién es una persona discapacitada y de quién soy acudiente, fue seleccionada como beneficiaria del mejoramiento de vivienda. Durante este período he apreciado unas irregularidades en el desarrollo de este y por el cual me he visto afectada económicamente. La casa de mi mamá consta de 3 habitaciones, un baño, una cocina un vestíbulo, un cuadro de ropas y un garaje o sala comedor, el 90% de la casa se encuentra desocupada para contribuir en la agilidad y la buena ejecución de su proyecto, pero por el ritmo de trabajo que llevan hasta el momento estimo que este llevará mucho más tiempo del mencionado inicialmente, por lo menos de unos 3 meses, los cuales no tengo disponibles ya que mis deberes me impiden permanecer al frente de la ejecución de este proyecto a diario por 3 meses seguidos.	La Secretaria del Habitat realiza Traslado de Radicado 1-2022-MV_03352 CARMEN MERCEDES TORRES RICO TPM ALFONSO LÓPEZ LOCALIDAD DE USME SDQS 1563812023 se programa visita de verificación por parte del Contratista de Obra, interventoria y SDHT para el 18 de abril de 2023 a las 9:30 am.	ABIERTA
	MVBF_236	Visita social: Fallida	Se programa visitacon la beneficiaria del MVBF_236 para explicar ampliación de prórroga de ejecución de obra y programar fecha de apertura. Pero al momento de llegar a la vivienda no se encontró nadie, se logra comunicación telefónica con el conyugue de la beneficiaria quien manifiesta que ella salió de viaje el día 30 de marzo y regresa el sábado 8 de abril.	31/03/2023
	MVBF_1148	Los profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría acuden a la vivienda a petición de la beneficiaria para atender la POSVENTA. Durante la visita se detecta una filtración en la cubierta en la zona de la cocina y la habitación #3, causada por tejas mal amarradas. También se observa una baldosa hundida en el lavaplatos, lo que genera un estancamiento de agua en el mesón de la cocina. Se comunica a la beneficiaria que se designará un trabajador para atender estas solicitudes y se programará una visita de seguimiento para verificar las actividades realizadas.	Profesionales técnicos y sociales del contratista e interventoría realizaron varias visitas al predio para verificar la subsanación por parte del contratista de obra. Las fechas de las visitas fueron: 17/02/2023, 29/02/2023, 3/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023 y 24/03/2023. Sin embargo, estas subsanaciones no fueron realizadas. Se estableció una comunicación verbal con el Director de obra para garantizar el cierre efectivo de la misma. El 28/03/2023, el equipo social del contratista y la interventoria se dirigieron a la vivienda para verificar que los requerimientos de la beneficiaria fueron subsanados por el trabajador. Se levantó un acta de cierre de posventa y ambas partes firmaron como conformidad.	28/03/2023
	MVBF_0531	Se presentaba post venta, donde la beneficiaria indico que había filtración en sanitario y lavamanos.	Se acude a la vivienda para realizar cierre de post venta, lo cual se lleva a cabo en compañía de interventoría dado que se subsanaron actividades en ajuste de desagüe en lavamanos y punto hídrico en sanitario. La beneficiaria refiere encontrarse conforme.	29/03/2023
SEMANA 31	MVBF_236	Visita social: Fallida	El 05/04/2023, por correo certificado, se envía al beneficiario una citación para informarle sobre el proceso de prórroga y la posible ejecución de obra en su predio para el 10/04/2023 a las 10:00 A.M.	10/04/2023

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA 2	MVBF_801	Beneficiaria Amparo Tique Romero Identificada con C.C. 52152205, se recibe información de renuncia realizada directamente en la Secretaria Distrital de Hábitat.	1-2022-39168 - 22 /09/ 2022
	MVBF_1100	Beneficiaria Olga Lucia Lozano Cerquera Identificada con C.C. 26473801, Se recibe información de renuncia realizada directamente en la Secretaria Distrital de Hábitat.	1-2022-38912 - 22/09/2022
SEMANA 19	MVBF_1014	Beneficiaria Luis Hernando Rodriguez Identificado con C.C. 79.213.212 , Se recibe información de renuncia a traves del equipo social en terriorotio Bella Flor Ciudad Bolivar el 13/01/2023	INP- SDHT-1009-2022- 107- 18/01/2023
SEMANA 21	MVBF_ 1049	Beneficiaria Yamile Darley Londoño Cardona Identificada con C.C. 1.024503.785 , Se recibe información de renuncia a traves del equipo social en terriorotio Bella Flor Ciudad Bolivar el 24/01/2023	INP- SDHT-1009-2022- 107 - 27/01/2023
SEMANA			

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA 31	MVBF_106	Se realiza recorrido por parte técnica y social de la interventoría, la familia sigue manifestando incomodidad. Se abre PQR con el consentimiento de la familia. El contratista se compromete a llevar el nuevo personal de obra. Se recuerda que la familia se encuentra delicada de salud y los disgustos con los trabajadores ha agravado su estado de salud.	La interventoria el 03/04/2023 notifica de manera verbal y escrita al contratista de obra frente a la inconformidad presentada. Se realiza recorrido por parte técnica y social de la interventoría y contratista, la familia no se encuentra en el predio. Se observan trabajadores en la vivienda. Se le sugiere al contratista realizar llamada telefónica para indagar a la beneficiaria sobre los nuevos maestros.	ABIERTA
	MVBF_117	En reunión realizada el 18/03/2023 la Beneficiaria manifiesta que no se ha instalado el lavadero, el platero y la cocina no está bien y tiene un led con un corto.	El 05/04/2023 se realiza la visita al predio por parte de la interventoría y el contratista para realizar la entrega de la vivienda ya que el mejoramiento de vivienda se encuentra culminado, los pendientes se subsanaron y la familia refleja conformidad con las obras adelantadas. Se levanta acta para darle cierre a la queja presentada por la familia y se lace la entrega formal del mejoramiento	CERRADA

6. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:

1. ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: El contratista e interventoría realizaron atención al PAC (Punto de Atención al Ciudadano)los dias:
Bella Flor: Ciudad Bolívar
01/04/2023: Se acerca la señora Gladys hermana del beneficiario Emiliano Perez MVBF_1013 para informar que el beneficiario Solicita visita de los profesionales ya que presenta posible posventa en lavadero y sanitario, vivienda entregada el día 08-03-2023 del corte 3.
3/04/2023: Se acerca el señor Gilberto Infante Marino del MVBF_0990 quien solicito visita por parte de equipo técnico.
El Portal del Divino
03/04/2023: Se realiza atención a PAC, no se recibió ninguna novedad por parte de la comunidad ni beneficiarios.

2. ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACIONES: Esta actividad ya fue culminada por el contratista de obra.

3. ACOMPAÑAMIENTO APERTURAS DE OBRA: Durante este período se aperturaron tres (3) viviendas en el barrio el Portal del Divino en Usme.
MV_03262 -MV_03359 - MV_03399

4. ENTREGA DE VIVIENDAS: Durante el periodo se realizaron cinco (5) Entregas de Vivivenda en el Barrio Bella Flor de Ciudad Bolivar.
MVBF_066 - MVBF_117_ MVBF_850 - MVBF_1307- MVBF_0286

5. SEGUIMIENTOS RELEVANTES:
Se realiza seguimiento, atiende el beneficiario, se evidencia personal de obra, adelantando actividades en la vivienda. No se presentan dudas ni inquietudes en el momento del seguimiento.
Bella Flor Ciudad Bolivar
MVBF_530 -MVBF_1007 -MVBF_0679 - MVBF_0645 - MVBF_791 - MVBF_1465 - MVBF_0837 - MVBF_1276 - MVBF_0225 - MVBF_1496 - MVBF_0286 - MVBF_0287 - MVBF_1255

-Portal del Divino Usme:
MVBF_02931 - MV_02952 -MV_03352 - MV_03268 - MV_03352

No se evidencia personal en obra : MVBF_0789 - MVBF_1464 - MVBF_1424 -MV_03397

6. ALERTAS:
1. Desde el equipo técnico social de interventoría, se ha notado inconformidad por parte de subcontratistas que no han recibido dinero para poder ejecutar las viviendas y manifiestan que no van a recibir más casas. Los beneficiarios han escuchado las inconformidades de los subcontratistas y esto les ha generado preocupación sobre la ejecución de la obra en sus casas, ya que han visto que se han ejecutado obras en otras viviendas y temen que a ellos no se les vayan a ejecutar.
2. En un sondeo realizado por el equipo social, los beneficiarios de Bella Flor en Ciudad Bolivar han manifestado no estar dispuestos a que el contratsista de obra continúe la ejecucción de actividades durante la semana santa, por cuanto muchos de ellos saldrán de la ciudad y otros, por creencias religiosas, no permiten el ingreso durante los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de abril de 2023. Es por ello que el contratsista realizó trabajos hasta el 05/04/2023 y retomará actividades el 10/04/2023.

7. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

DISPOSICIÓN RCD M3		ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorización)	No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA
SEMANA 31	**0 M3**	N/A	N/A
MES	**ABRIL**		
SECTOR	**BELLA FLOR USME**		

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**19**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**90**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA
SEMANA 31	**0 M3**	Se evidencia la recolección de empaques de cemento y pegante cerámico en la bodega No se ha realizado disposición de RESPEL.
MES	**ABRIL**	
SECTOR	**BELLA FLOR USME**	

CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

Building SAS / INPLAYCO S.A.S.	FORMATO **INFORME SEMANAL DE INTEVENTORÍA** **PROCESO** EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 1/04/2023 (dd-mm-aa) **AL** 7/04/2023 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 994 de 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORIA No.** 1009 de 2022

• El personal operativo y administrativo recibió charlas con enfoques del componente de SST y ambiental como: Cuidado de manos, La importancia de estar hidratados, Efectos de la deforestación, Destino de los Residuos sólidos.
• Se realizó seguimiento a la implementación del procedimiento de instalación de cubiertas, no se ha presentado ninguna novedad. se diligencian los formatos de cubierta con sus respectivas inspecciones y charlas, hasta el momento se mantiene la superficie de trabajo inferior a 2mts.
• Actualmente se cuenta con 3 personas extranjeras activas debidamente legalizadas con PPT.
• En los acompañamientos realizados de SST-MA en los sectores de Usme y Bella Flor, se evidenció el uso de dotación y EPP y botas de seguridad.
• De acuerdo al cronograma de actividades y a las visitas técnico sociales se hacen inspecciones de las pulidoras y taladros verificando su estado previo al uso; se inspeccionan los andamios y escaleras multifuncionales y los EPP sean acordes y usados de manera permanente por el personal en las actividades en ejecución.
• Hubo retiro de personal Administrativo, por lo tanto se procede a solicitar paz y salvo.
• Se mantiene el acopio del RESPEL (bolsas de cemento, bolsas de pegante, tarros de pintura y tarros de anticorrosivos para entregar al Proveedor contactado para su disposición final) y RCD en la bodega hasta completar la cantidad requerida (minimo 6m3) para poder disponerlas en el sitio autorizado por la SDA
• Se realiza disposición de residuos ordinarios generados en el PAC y son recogidos por la empresa de servicios públicos autorizada en el sector.
• Durante las entregas de viviendas se puede evidenciar que estas quedan con el frente y el interior libre de escombros.
• El personal de interventoria adicional a las actividades en campo, realiza revision de soportes del mes de febrero que estaban pendientes, generando observaciones. se realizó charla sobre la actuación en primer auxilio en caso de un desmayo, indicando como se debe proceder en caso que se presente.

8. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						INTERVENTORIA					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	4	CAPACITACIONES REALIZADAS	4	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0	CAPACITACIONES PROGRAMADAS	2	CAPACITACIONES REALIZADAS	2	ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS	0
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			42	PERSONAL ADMINISTRATIVO	10						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA				14	
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA	0	PERSONAL OBRERO	0	PERSONAL ADMINISTRATIVO	0						

9. ANEXOS

ANEXO 1: CONSOLIDADO TECNICO

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los **DIEZ** (Día en letras) **10** (Día en números) días del mes del **ABRIL** (Mes en letras) de **2023** (Año de firma del informe)

Firma

Nombr (Nombre) Arq. CESAR A FUENMAYOR.
Cargo: Director de Interventoría

ANEXO 1

Consolidado Técnico

Proyecto mejoramiento de vivienda - AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL	Fecha	8-feb-23

BUILDING SAS

Contrato de Obra	**994 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		Fecha de Terminacion Inicial	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Objeto	**"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 – 2022"**	**Plazo Inicial**	CUATRO (4) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE MARZO DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**CINCO MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS ($5.202.000.000) M/Cte**

Gonzalo Liévano Hoyos -INPLAYCO S.A.S.

Contrato de interventoría	**1009 - 2022**	**Fecha de Inicio**	1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
		Fecha de Terminacion Inicial	31 DE ENERO DE 2023
Objeto	**"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 2 - 2022."**	**Plazo Inicial**	CINCO (5) MESES
		Plazo Prorroga 1	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Plazo Actualizado	SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS
		Fechade Terminacion Actual	15 DE ABRIL DE 2023
		Valor del contrato actualizado	**SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($624.240.000) M/Cte**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT							**Fase 2: Ejecución de obras**					
Territorio o barrio a intervenir	**Ciudad Bolívar**	**Barrios**	**Predios**	**Total Predios**	**Validacion**		**Fase 2: Ejecución de obras**					
					Validada	V/Por Validar	En Ejecución	Terminadas	Renuncias	Por Eiecutar	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
Arq. o Ing. Responsable	**Arq Leonardo Solano**	ALFONSO LOPEZ	91	291	91	0	31	22	0	38	**59.98%**	22
		BELLA FLOR	17		17	0	0	17	0	0		17
	Arq Luisa Franco		61		61	0	13	40	0	8		40
	Ing Martha Neira		60		59	0	7	47	1	5		47
	Arq. Edwin Baez		62		61	0	12	26	1	23		26
Subtotal			**291**	**291**	**289**	**0**	**63**	**152**	**2**	**74**		**152**

AVANCE DE EJECUCION SEMANAL												**% ACUMULADO**	**ABRIL**
Proyecto Ciudad Bolívar				**FASE I**		**Tiempo Programación**							SEMANA DEL 01 AL 07
No. Etiq.	**ID_DMV**	**Dirección**	**Nombres y apellidos**	Valor Inicial	Valor Liquidado	Fecha Validacion	Fecha inicio programada	Fecha inicio	Fecha Terminación Programada	Fecha Terminación	Estado de Ejecución		**SEMANA 31**
BARRIO BELLA FLOR													
GRUPO No. 1													
4	MVBF_1195	KR 27 BIS A 73D 87 SUR MJ	DOLY ARGENIS RIVERA AVIRAMA	$14,400,400.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	12 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	11 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
5	MVBF_1196	KR 27 BIS A 73D 83 SUR MJ	INES SOFIA REYES CASTRO	$14,369,650.00	$14,395,216.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	12 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
6	MVBF_1197	KR 27 BIS A 73D 79 SUR MJ 1	LEIDY ALEJANDRA PALACIOS REYES	$13,769,930.00	$14,370,476.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
7	MVBF_1200	KR 27 BIS A 73D 75 SUR	SANDRA PAOLA BEJARANO REYES	$14,396,371.00	$14,400,000.00	19 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
10	MVBF_1166	CL 73D BIS A SUR 27 28	MERCEDES VASQUEZ BONILLA	$14,399,376.00	$14,399,379.00	20 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
11	MVBF_1167	CL 73D BIS A SUR 27 22 MJ	NICOL JOHANA SUNCE GUARNIZO	$14,358,554.00	$14,400,000.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	21 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
12	MVBF_1149	CL 73D SUR 27 75	GUSTAVO MONROY FONSECA	$14,258,458.00	$14,399,470.00	20 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
13	MVBF_1155	CL 73D BIS A SUR 27A 50	ANA FELIZ DIAZ PATIÑO	$14,381,322.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
14	MVBF_1191	KR 27B 74A 06 SUR	CARMEN ELISA TOLOSA CEPEDA	$14,397,146.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	21 de octubre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
43	MVBF_1302	CL 73A SUR 26F 33 MJ	ANGIE YURLEY RUIZ VEGA	$14,381,643.00	$14,400,000.00	19 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
44	MVBF_1303	CL 73A SUR 26F 45 MJ	ANAYIBE CASTRO	$14,398,840.00	$14,400,000.00	19 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	4 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	7 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
47	MVBF_1264	CL 73B SUR 26F15 MJ	JOSÉ ALONSO MUÑOZ SCARPETTA	$14,373,000.00	$14,400,000.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	7 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	14 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
48	MVBF_1270	CL 73B SUR 26F 03	ANA AURORA BECERRA VARGAS	$14,372,322.00	$14,400,000.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	6 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	14 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
50	MVBF_1295	KR 26F 73B 16 SUR	VIRGELINA RODRIGUEZ	$14,398,427.00	$14,400,000.00	31 de octubre de 2022		21 de noviembre de 2022		13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
51	MVBF_1280	CL 73C SUR 26F 02	MARINA NAVAS ROJAS	$14,399,498.00	$14,400,000.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
101	MVBF_1187	KR 27B 74 14 SUR MJ	MARIA OLINDA SARMIENTO CASTRO	$13,396,482.00	$14,352,138.00	13 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	21 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
102	MVBF_1427	CL 74 SUR 27B 06	MARY LUZ ARREDONDO GONZALEZ	$14,400,000.00	$14,398,350.00	13 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	21 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
GRUPO No. 2													
8	MVBF_1198	CL 73D BIS A SUR 27 33 MJ	CARMEN ELVIRA REYES CARO	$14,400,000.00	$14,399,607.00	19 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	12 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
9	MVBF_1201	CL 73D BIS A SUR 27 39 MJ	MARIANA ALEXANDRA VELANDIA VASQUEZ	$14,400,000.00	$1,439,838.00	20 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	18 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%

15	MVBF_1148	CL 73 D SUR 27 45	LUZ MARINA PIRAGAUTA GRANADOS	$14,398,521.00	$14,398,521.00	28 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
16	MVBF_1130	CL 73D SUR 27 50	JUAN DE JESUS SEDANO AYALA	$14,394,664.00	$14,396,664.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	11 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
17	MVBF_1128	CL 73D SUR 27 62	ISMELDA PEREZ GARCIA	$14,392,074.00	$14,395,263.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
18	MVBF_1141	CL 73 D SUR 27 91	BLANCA FLOR RINCON	$14,397,445.00	$14,398,134.00	28 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	20 de octubre de 2022	1 de noviembre de 2022	25 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
19	MVBF_1121	CL 73 C BIS SUR 27 77	MARIA ELBA ARIAS BONILLA	$14,396,808.00	$14,400,000.00	26 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	18 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
20	MVBF_1110	CL 73 D SUR 27 86	FLOR TRIANA AVILA	$14,399,088.00	$14,397,014.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	18 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
21	MVBF_1108	CL 73C BIS SUR 27A 23	MARIA ODILIA MARTINEZ CABRERA	$14,390,758.00	$14,399,950.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	11 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
22	MVBF_1124	CL 73C BIS SUR 27A 11	HECTOR HERNANDO VELOSA	$14,000,000.00	$14,399,644.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	5 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	21 de octubre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
23	MVBF_1111	CL 73C BIS SUR 27 61 MJ	PAOLA ANDREA ORJUELA VIVAS	$14,000,000.00	$14,026,240.00	28 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	21 de octubre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
24	MVBF_1118	CL 73 C BIS SUR 27 55	LUIS ALBERTO CHITIVA CORTES	$14,394,090.00	$14,399,367.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	16 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
25	MVBF_1117	CL 73C BIS SUR 27 49	RAFAEL RODRIGUEZ ZAMORA	$14,398,893.00	$14,398,893.00	26 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	11 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
26	MVBF_1073	KR 27 A 73 46 SUR	LEOPOLDO LEON MORALES	$14,397,782.00	$14,397,074.00	28 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	11 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
27	MVBF_1072	KR 27A 73 38 SUR MJ	MARIA AURORA PEREZ AVELLA	$14,000,000.00	$14,268,863.00	25 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
56	MVBF_948	KR 26G BIS 72 G 11 SUR	ALEXANDRA PATRICIA LAVERDE CUADROS	$14,390,362.00	$14,392,796.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
57	MVBF_950	KR 27 72G 24 SUR	LUIS LIBARDO LONDOÑO VELAZQUEZ	$14,398,603.00	$14,398,603.00	19 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	11 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
58	MVBF_964	KR 27 72G 17 SUR	ANA SILVIA AGUILAR BARRERA	$14,392,970.00	$14,398,864.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
59	MVBF_0966	KR 27 72G 09 SUR	MELEIDY TORIFIO VALENCIA	$14,393,909.00	$14,398,643.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
60	MVBF_0952	KR 27 BIS 72G 10 SUR MJ	MAYERLY ELSY ARIAS GONZALEZ	$14,395,403.00	$14,392,809.00	18 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	1 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	10 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
61	MVBF_0984	KR 27 BIS 72G 11 SUR	INGRIT MAYERLY SALAMANCA VALLARINO	$14,396,904.00	$14,396,936.00	18 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
62	MVBF_983	KR 27 BIS 72G 15 SUR	HERIBERTO VARGAS CAPERA	$14,000,000.00	$14,000,000.00	18 de octubre de 2022	2 de marzo de 2023	12 de enero de 2023	15 de marzo de 2023	29 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
63	MVBF_0990	CL 72G SUR 27A 01 IN 2 MJ1	GILBERTO INFANTE MARINO	$14,394,679.00	$14,394,679.00	20 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	11 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
64	MVBF_0987	KR 27 BIS B 72G 16 SUR	QUERUBIN TIRADO MEDINA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	19 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
65	MVBF_0985	KR 27 BIS B 72G 08 SUR	JOSE DEMETRIO CRUZ VELANDIA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	19 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	23 de febrero de 2023	4 de abril de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
66	MVBF_0731	KR 27A 72D 02 SUR	MARIA DEL CARMEN VALLEJO RUANO	$14,400,000.00		19 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	21 de abril de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
67	MVBF_0719	KR 27A BIS 72D 08 SUR	URIEL CASALLAS MURCIA	$14,397,247.00	$14,383,897.00	19 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
68	MVBF_0727	KR 27A 72C 34 SUR MJ	SALOMON URREA BAQUERO	$14,398,620.00	$14,398,620.00	19 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
69	MVBF_0741	KR 27A 72C 22 SUR	MARIA ELIZABETH CEDANO BURBANO			28 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
70	MVBF_0694	CR 27A BIS 72D 05 SUR	ALEJANDRINO ESPAÑA GARCIA			30 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
103	MVBF_1424	CL 74 SUR 27B 36	CARLOS RODRIGUEZ	$14,400,000.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	23 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
104	MVBF_1462	CL 74A SUR 27B 25	ANGIE ESMERALDA ROJAS ALAYON	$14,400,000.00		13 de octubre de 2022	2 de marzo de 2023	27 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
105	MVBF_1464	CL 74A SUR 27B 55	MARIA ESCILDA CABEZAS GALINDEZ	$14,400,000.00		30 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	27 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
106	MVBF_1465	CL 74A SUR 27B 61	SANTIAGO OLAYA BOLAÑOS	$14,400,000.00		27 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	21 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	72.00%	2.00%
107	MVBF_1455	CL 74B SUR 27B 24	FLOR HERELIA ESCOBAR VARGAS			13 de octubre de 2022	2 de marzo de 2023		15 de marzo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
116	MVBF_0789	KR 27 72C 12 SUR	OSCAR HENRY MISNAZA RIVERA	$14,400,000.00		23 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	23 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	29 de abril de 2023	EJECUCION	0.00%	0.00%
117	MVBF_791	CR27 H 72C 34 SUR	MARIA LIGIA ROJAS	$14,400,000.00		23 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	23 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	29 de abril de 2023	EJECUCION	45.00%	45.00%
118	MVBF_0780	KR 27 72C 40 SUR	ELIZABETH GIRALDO DELGADO	$14,399,430.00	$14,400,000.00	19 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	17 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
119	MVBF_0793	KR 27 72C 70 SUR	ARISTOBULO TRIANA GARZON	$14,386,084.00		21 de septiembre de 2022		15 de febrero de 2023			EJECUCION	15.00%	0.00%

120	MVBF_0758	KR 27 72C 45 SUR	ARACELLY LIEVANO DE MAHECHA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	23 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
121	MVBF_0760	KR 27 72C 33 SUR	FERMIN MADRIGAL TIQUE	$14,400,000.00		20 de septiembre de 2022	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	**90.00%**	0.00%
122	MVBF_0749	KR 27 72C 27 SUR	ESTHER MARINA YARA TIQUE	$14,400,000.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	2 de marzo de 2023	7 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
123	MVBF_0761	KR 27 72C 21 SUR	GILDARDO MORALES VELEZ	$14,400,000.00		20 de septiembre de 2022	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	**90.00%**	20.00%
124	MVBF_0767	KR 27 BIS 72C 22 SUR	ROSALBA PACANCHIQUE DE MARTINEZ	$14,400,000.00	$14,400,000.00	21 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	17 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
125	MVBF_0730	KR 27 BIS 72C 15 SUR	MARIA ELVIA ARERO COTRINA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	6 de febrero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
126	MVBF_0737	KR 27 BIS 72C 27 SUR	EVANGELINA MADRIGAL TAPIA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	17 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
127	MVBF_0736	KR 27 BIS 72C 33 SUR	LUIS ALFONSO PIAY			25 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
128	MVBF_745	KR 27 BIS 72C 38 SUR MJ 1	OLGA LUCILA RIVEROS HIGUERA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	20 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	17 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
129	MVBF_0753	KR 27 BIS 72C 44 SUR	LUZ DARY ALONSO PACHON			20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
130	MVBF_770	KR 27 BIS 72C 50 SUR	HERMINIA FORERO BUSTOS			30 de enero de 2022	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
171	MVBF_113	KR 26G 75 A SUR 22	SANDRA PATRICIA SANABRIA	$14,400,000.00	$14,000,000.00	18 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	13 de febrero de 2023	1 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
172	MVBF_094	KR 26G 75A 08 SUR	ZOILA ROSA GONZALEZ CASTRO	$14,400,000.00	$14,400,000.00	16 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	27 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
173	MVBF_107	KR 26F 75A 31 SUR	CELINA CARAVALI GONZALEZ	$14,400,000.00	$14,400,000.00	19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
174	MVBF_106	KR 26F 75A 35 SUR	CARMEN SEMANATE	$14,400,000.00		17 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	24 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	**95.00%**	0.00%
177	MVBF_223	TV 26C BIS A 75B 45 SUR	OMAR FERNEY NIÑO	$14,400,000.00		19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	12 de abril de 2023	EJECUCION	**95.00%**	10.00%
178	MVBF_232	TV 26C BIS A 75B 93 SUR	HERMENCIA CHITIVA	$14,400,000.00	$14,000,000.00	19 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	13 de febrero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
179	MVBF_0294	TV 26C BIS 75C 16 SUR	MIGUELINA GOMEZ HOYOS	$14,400,000.00	$14,400,000.00	19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	24 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
185	MVBF_027	CL 76 SUR 26H 04	LEONOR CHISCO SARAY	$14,400,000.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
186	MVBF_022	KR 26H 75B 19 SUR MJ	MARTHA HELENA PARDO	$14,400,000.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
187	MVBF_117	KR 26G 75A 38 SUR	MARIA EUGENIA GONZALEZ	$14,400,000.00	$14,400,000.00	18 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	5 de abril de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	10.00%
188	MVBF_096	KR 26 G No. 75 A 26 SUR	MARISOL LATORRE DEVIA	$14,400,000.00		20 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	15 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		EJECUCION	**90.00%**	5.00%
GRUPO No. 3													
1	MVBF_1220	CL 73C BIS A SUR 26F 27 MJ	MARIA NOHEMY MATTA LOZANO	$14,398,932.00	$14,335,475.00	21 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	20 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
2	MVBF_1228	KR 27 73C 32 SUR	SANDRA YANETH REY VANEGAS	$13,947,172.00	$13,947,172.00	21 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	24 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
3	MVBF_1213	CL 73D BIS SUR 26G 02 MJ	NORMA CONSTANZA MELO	$14,399,302.00	$14,400,000.00	21 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	10 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
29	MVBF_1049	CL 73 SUR 27 43 MJ	YAMILE DARLEY LONDOÑO			19 de septiembre de 2022					RENUNCIA	**0.00%**	0.00%
30	MVBF_1083	KR 27 73B 15 SUR	ROSA ELENA GOMEZ QUINTERO	$14,374,413.00	$14,227,821.00	20 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
35	MVBF_1096	KR 27 BIS A 73 22 SUR	LUCILA TRUJILLO	$13,862,187.32	$14,399,456.00	20 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	31 de octubre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
37	MVBF_1061	KR 27 BIS A 73 31 SUR	FLORENTINO JUEZ BARRETO	$14,400,000.00	$14,391,266.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	10 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
38	MVBF_1052	KR 27A 73 26 SUR	OFELIA MEDINA ARCILA	$14,152,874.42	$14,382,156.00	19 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
40	MVBF_1068	KR 27A 73 06 SUR	LUIS ALIRIO CORREA LOPEZ	$14,003,597.43	$14,392,594.00	20 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
41	MVBF_1330	CL 73B SUR 26C 90	MAYERLY HERNANDEZ MENDEZ	$14,400,000.00	$14,400,000.00	21 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	11 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	9 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
42	MVBF_1324	CL 73 B SUR 26 C 74	PURIFICACION CORTES	$14,381,900.00	$14,288,616.00	19 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	11 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	3 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
45	MVBF_1314	CL 73B SUR 26F 38	MARIELA SANDOVAL VERA	$14,375,117.00	$14,375,375,117.00	19 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	2 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	30 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
46	MVBF_1315	CL 73B SUR 26F 32	MARIA TERESA MONTOYA DE BERMUDEZ	$14,359,021.00	$14,359,021.00	19 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	18 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
49	MVBF_1306	CL 73B SUR 26F 02 MJ	LUZ STELLA BETANCOURTH GIRALDO	$14,396,197.00	$14,397,769.00	27 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	4 de abril de 2023	24 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
52	MVBF_1276	CL 73C SUR 26F 38	ELIZABETH SEPULVEDA DIAZ	$14,385,765.00		20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	2 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**100.00%**	15.00%

53	MVBF_1240	CL 73 C BIS A SUR 26F 02 MJ 1	HEBERT FREDY ARIAS BELTRAN	$14,361,870.00	$14,361,870.00	13 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
54	MVBF_1255	CL 73C BIS A SUR 26C 90	DIANA ALEJANDRA ORJUELA VIVAS	$14,396,129.00		20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	30 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	30.00%	25.00%
55	MVBF_1234	CL 73C SUR 26F 03 MJ	WILLIANS GONZALEZ PEDROZA	$14,293,093.00	$14,293,093.00	20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	2 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	29 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
86	MVBF_0924	CL 73 SUR 26F 40	ROSALBA ROJAS ROJAS	$14,374,629.00	$14,374,629.00	19 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
87	MVBF_1343	CL 73 SUR 26F 09	AMANDA BERNAL ORTIZ	$14,372,084.00	$14,350,983.00	19 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
88	MVBF_1338	CL 73 SUR 26F 03 MJ	IRIS SOTO	$14,397,837.00	$14,397,384.00	19 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
89	MVBF_0925	CL 73 SUR 26F 16	MARIA EVA PULIDO CELIS	$14,385,749.00	$14,397,804.00	19 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	30 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
90	MVBF_894	KR 26F 72H 60 SUR	LUZ ANGELA RODRIGUEZ MESA	$14,323,880.00	$14,350,235.00	19 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	30 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
91	MVBF_1358	CL 73A SUR 26D 16	JOSE GERMAN GARAVITO YATE	$14,358,302.00	$14,377,649.00	19 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	31 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
92	MVBF_1362	CL 73A SUR 26D 08	ALICIA CARREÑO	$14,394,740.00	$14,394,740.00	1 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
93	MVBF_1363	CL 73A SUR 26D 04	MARIA CRISTINA QUIROGA RUGE			21 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
94	MVBF_1321	CL 73A SUR 26D 07	TEOFILDE FORERO AGUILAR	$14,308,128.00	$14,350,402.00	21 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
95	MVBF_1329	CL 73A SUR 26D 19	JULIO CESAR BUILES MURIEL	$14,309,042.00	$14,309,042.00	21 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	16 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
96	MVBF_1354	CL 73A SUR 26F 02	JISEL SARIME LOZANO CERQUERA	$14,389,630.00	$14,363,094.00	21 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	1 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
97	MVBF_1337	CL 73A SUR 26F 08 MJ	LUZ MIRIAM MARULANDA RODRIGUEZ	$14,307,907.00	$14,370,157.00	21 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	31 de octubre de 2022	1 de marzo de 2023	27 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
98	MVBF_1339	CL 73A SUR 26F 20 MJ	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ	$14,376,459.00	$14,376,459.00	21 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
99	MVBF_1307	CL 73 A SUR 26F 15	EMPERATRIZ RAMIREZ BOHORQUEZ	$14,394,361.00	$14,394,361.00	26 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	4 de abril de 2023	3 de abril de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
100	MVBF_1311	CL 73A SUR 26F 27	JULIA MARTINEZ SEGURA	$14,171,779.00	$14,365,252.00	26 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	12 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
146	MVBF_808	CL 72C SUR 26C 59	JOSE FERMIN ROCHA	$14,167,801.00		17 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	5.00%	0.00%
147	MVBF_805	CL 72 C SUR No. 26 C 69	MANUEL MONCADA FANDIÑO	$14,302,827.00	$14,400,000.00	12 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	25 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	24 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
148	MVBF_820	KR 26F 72D 14 SUR	LUIS CARLOS LOMBANA	$14,390,090.00	$14,343,761.00	12 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	29 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
149	MVBF_835	CL 72D BIS A SUR 26D 21	NURY ESPERANZA MELO	$14,194,616.00	$14,355,025.00	28 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
150	MVBF_0837	KR 26 D 72D 45 SUR	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	$14,399,708.00		13 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	13 de abril de 2023	EJECUCION	95.00%	2.00%
151	MVBF_0841	CL 72 D BIS A SUR 26C 79	ELIZABETH OSPINA CAICEDO	$14,360,668.00	$14,363,094.00	28 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	15 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
152	MVBF_0840	CL 72 F SUR 26C 74 MJ	MARIA HEMIR TAPIA HERNANDEZ	$14,396,907.00	$14,387,990.00	28 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	15 de noviembre de 2022	1 de marzo de 2023	23 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
153	MVBF_850	CL 72F SUR 26C 69	GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	$14,399,111.00	$14,399,111.00	17 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	10 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	3 de abril de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
154	MVBF_853	CL 72F SUR 26D 23	CINDY JASBLEIDY DUARTE MUÑOZ	$14,316,470.00	$14,391,855.00	28 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	100.00%	0.00%
155	MVBF_854	CL 72F SUR 26F 05	ANA LEONORA RUIZ MENDEZ	$14,363,897.00	$14,393,655.00	28 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	11 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	9 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
156	MVBF_0972	KR 27 BIS 72G 38 SUR	PABLO ENRIQUE CALDERON	$14,355,892.00	$14,355,892.00	13 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	13 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
157	MVBF_0953	KR 27 BIS 72G 34 SUR	LUIS MORENO VIUCHE	$14,400,000.00		12 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
158	MVBF_0938	KR 27 72G 68 SUR	BLANCA MARINA MARTINEZ	$14,376,352.00	$14,376,352.00	12 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	3 de febrero de 2023	1 de marzo de 2023	20 de febrero de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
159	MVBF_1347	KR 27 73 02 SUR	MARIA NANCY CANACUE ROMERO	$14,358,168.00	$14,358,168.00	16 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	7 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
160	MVBF_0946	CL 73 SUR 26G 08	DEYANIRA FRANCO MONTENEGRO	$14,353,419.00		16 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
189	MVBF_149	CL 75A BIS SUR 26F 53	LASTENIA PALACIOS MURILLO	$14,400,000.00		27 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
190	MVBF_145	CL 75A BIS SUR 26F 47	BERENICE RINCON TELLEZ	$14,398,800.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
191	MVBF_0183	CL 75A BIS SUR 26F 60	DORIS HERNANDEZ HERNANDEZ	$14,393,002.00	$14,399,947.00	19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	2 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	23 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
192	MVBF_241	KR 27 75 24 SUR	MARIA LUCIA BARREÑO AGUDELO	$14,400,000.00		26 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%

193	MVBF_235	CL 75A SUR 26F 60 MJ	JOSE SAUL MONROY MARTINEZ	$14,400,000.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
194	MVBF_172	CL 75A BIS SUR 26F 18 MJ	LAURENTINO BURGOS RINCON	$14,400,000.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
195	MVBF_236	CL 75 SUR 26F 29	LILIANA RENDON LOZANO	$14,289,634.00		7 de febrero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
196	MVBF_287	CL 74B BIS A SUR 26F 38	CARMEN ROSA GONZALEZ	$14,400,000.00		17 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	22 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	20 de abril de 2023	EJECUCION	**60.00%**	20.00%
197	MVBF_0286	CL 74B BIS A SUR 26F 28 MJ	RAQUEL MENDEZ PEÑA	$14,396,875.00	$14,396,875.00	17 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	4 de abril de 2023	ENTREDADA	**100.00%**	0.00%
198	MVBF_312	DG 74 B BIS A SUR 26 C 41	VIRGINIA CORTES PARDO	$14,297,836.00		26 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
175	MVBF_1496	TV 26C BIS A 75A 03 SUR	BLANCA ELVIRA RAMIREZ MONTES	$14,358,896.00		25 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	10 de abril de 2023	EJECUCION	**100.00%**	40.00%
176	MVBF_0225	TV 26C BIS B 75A 10 SUR	CARMEN ELENA SOCARRAZ QUIROZ	$14,374,569.00		25 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	28 de abril de 2023	EJECUCION	**60.00%**	5.00%
GRUPO No. 4													
28	MVBF_0975	KR 27 BIS B 72G 28 SUR	LUIS HERNANDO SALCEDO	$14,350,659.00	$14,381,817.00	21 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
31	MVBF_1084	KR 27 73B 09 SUR	FIDEL ANTONIO TELLEZ ESCARRAGA	$13,883,096.82	$14,389,392.00	21 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	13 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	9 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
32	MVBF_1078	KR 27 BIS A 73 64 SUR	MARIA NUBIA LOZANO CERQUERA	$14,309,596.00		20 de septiembre de 2022	16 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
33	MVBF_1080	KR 27 BIS A 73 34 SUR MJ	MARIA DEL ROSARIO BAEZ	$14,329,132.00	$14,397,966.00	21 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	10 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
34	MVBF_1081	KR 27 BIS A 73 28 SUR	MELQUISEDEC ORTIZ	$14,388,713.09	$14,388,713.09	19 de septiembre de 2022	16 de diciembre de 2022	1 de noviembre de 2022	1 de marzo de 2023	21 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
36	MVBF_1050	KR 27 BIS A 73 39 SUR MJ 1	FRANQUELINA BALLESTEROS	$14,396,471.00	$14,396,471.00	19 de septiembre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	21 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
39	MVBF_1048	KR 27A 73 18 SUR MJ	MARIA GLADYS TRIANA	$14,128,717.42	$14,028,825.00	21 de septiembre de 2022	13 de septiembre de 2022	7 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
71	MVBF_0979	KR 27 BIS 72G 27 SUR MJ	LUZ MARINA TRIBIÑO RAMIREZ	$14,397,127.18	$14,377,332.00	20 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	2 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	15 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
72	MVBF_1098	KR 27 BIS A 73 52 SUR	JULIO CESAR LEMUS ZULETA	$14,365,960.30	$14,398,854.00	18 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	2 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	17 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
73	MVBF_1045	KR 27A BIS 73 10 SUR	MARIELA CARDONA CARDONA	$14,000,000.00	$14,397,361.00	20 de octubre de 2022	13 de septiembre de 2022	2 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	18 de noviembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
74	MVBF_1000	KR 27A BIS 73 11 SUR MJ 1	JORGE ELIECER HUERTAS GIL	$14,000,000.00	$14,216,473.00	18 de octubre de 2022	16 de diciembre de 2022	11 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	06 de marzo de 2023 UNILATERAL	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
75	MVBF_1007	CL 73 SUR 27A 21	NUBIA HERRERA QUINTERO	$14,395,123.00		18 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	3 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	24 de Abril de 2023	EJECUCION	**55.00%**	10.00%
76	MVBF_1001	KR 27A BIS 73 23 SUR MJ	MARIA ELIA MENESES GOMEZ	$14,346,022.00	$14,398,500.00	18 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	26 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
77	MVBF_1014	KR 27A BIS 73 27 SUR	LUIS HERNANDO RODRIGUEZ								RENUNCIA	**0.00%**	0.00%
78	MVBF_1013	KR 27B 73A 16 SUR	EMILIANO PEREZ AVELLA	$14,000,000.00	$14,400,000.00	14 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	16 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
79	MVBF_0679	TV 27H 72D 14 SUR	POSIDIO HUERTA HUERTAS	$14,276,401.00		10 de enero de 2023		17 de febrero de 2023		20 de abril de 2023	EJECUCION	**85.00%**	5.00%
80	MVBF_675	KR 27 B 72D 23 SUR	CELIMO PADILLA VEGA	$14,391,503.00		14 de diciembre de 2022	16 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
81	MVBF_0677	KR 27B 72D 05 SUR	ANA GLADYS PACHON CHURQUE	$14,000,000.00	$14,400,000.00	14 de diciembre de 2022	16 de diciembre de 2022	16 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	27 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
82	MVBF_0715	KR 27B 72C 20 SUR	JORGE ENRIQUE QUINONES	$14,400,000.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
83	MVBF_676	KR 27B 72 D 11 SUR	AMPARO ARIAS OGONZALEZ	$14,322,160.00		14 de diciembre de 2022	16 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
84	MVBF_0669	KR 27B 72D 29 SUR	MARIA CLAUDINA MRTINEZ	$14,363,595.00	$14,396,067.00	12 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	24 de enero de 2023	15 de marzo de 2023	10 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
85	MVBF_1076	KR 27 BIS A 73 40 SUR MJ	ESPERANZA CASTILLO ALTURO	$14,394,860.00	$14,394,860.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	13 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
108	MVBF_0558	CL 73C SUR 27B 26	MONICA ANDREA CRISTANCHO QUIMBAYO	$14,388,142.00		20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
109	MVBF_552	CLL 73C SUR 27B 62	ORFANIDES LOSADA PERDOMO	$14,332,564.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
110	MVBF_549	CL 73 C SUR 27 B 78	MILLER ALEJANDRO HURTADO SAENZ	$14,400,000.00		23 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
111	MVBF_0540	CL 73B SUR 27C 29	LUZ STELLA FRANCO DIAZ	$14,399,549.00		20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
112	MVBF_567	CL 73B SUR 27C 24	FLORENTINO PICO BASTILLA	$14,360,147.00		20 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
113	MVBF_605	DG 73A BIS SUR 27C 28	MISAEL MACANA	$13,521,594.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
114	MVBF_0592	DG 73A BIS SUR 27C 34	MARIA HELENA BAQUERO MACANA	$14,337,299.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%

115	MVBF_0570	TV 27H 73A 36 SUR	JOSE ANTONIO MOYA ZAMORA	$14,400,000.00		27 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	27 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
131	MVBF_536	CL 73B SUR 27B 21	CLAUDIA MARTINEZ CLAVIJO	$14,397,978.00	$14,397,978.00	20 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	29 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
132	MVBF_530	CL 73B 27B 33 MJ	OMAR MEDINA ORTEGA	$14,387,568.00	$14,398,736.00	27 de octubre de 2022	16 de marzo de 2023	3 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	3 de abril de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	10.00%
133	MVBF_0531	CL 73B SUR 27C 05	INES DIAZ	$14,245,243.00	$14,398,250.00	28 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	16 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
134	MVBF_589	CL 73B SUR 27B 34	LUISA FERNANDA TAPIERO TRUJILLO	$14,000,000.00	$14,398,607.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
135	MVBF_588	CL 73B SUR 27B 40	JANETH MEDINA DIAZ	$14,000,000.00	$14,398,700.00	27 de octubre de 2022	18 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
136	MVBF_0595	DG 73A SUR 27C 57 MJ	ANA DELIA GONZALEZ MATEUS	$14,378,163.00		17 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	24 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
137	MVBF_631	TV 27H 73 34 SUR	LEIDY SABOGAL RAMIREZ	$14,000,000.00	$14,400,000.00	12 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	24 de enero de 2023	15 de marzo de 2023	22 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
138	MVBF_0657	DG 73 BIS SUR 27B 36	SERGIO TORO	$14,326,254.00		16 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	24 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
139	MVBF_660	DG 73 SUR 27B 13 MJ	CUSTODIA LUGO QUESADA	$14,000,000.00		12 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	24 de enero de 2023	15 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	EJECUCION	**100.00%**	0.00%
140	MVBF_645	DG 73 SUR 27B 11	MARIA SIXTA HURTADO	$14,369,445.00		12 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	23 de febrero de 2023	4 de abril de 2023	**25 de abril de 2023**	EJECUCION	**80.00%**	10.00%
141	MVBF_0622	DG 73 BIS SUR 27B 03	MARIBEL HURTADO	$14,320,363.00		16 de enero de 2023	16 de marzo de 2023	28 de marzo de 2023	4 de abril de 2023		EJECUCION	**0.00%**	0.00%
142	MVBF_650	DG 73 SUR 27B 59	JULY ANDREA SANCHEZ ALONSO	$14,355,020.00	$14,400,000.00	10 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	24 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
143	MVBF_0649	DG 73 SUR 27B 53	OLGA MARIA ALONSO MORENO	$14,321,453.00	$14,389,117.00	10 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
144	MVBF_683	DG 73 SUR 27B 54	JOSE ALFONSO MORA AREVALO	$14,376,746.00	$14,400,000.00	10 de enero de 2023	16 de diciembre de 2022	24 de enero de 2023	1 de marzo de 2023	28 de febrero de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
145	MVBF_585	CL 73A SUR 27B 17	ANDREA HERRERA RANGEL	$14,372,232.00		19 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
161	MVBF_0157	CL 75 SUR 27 33	ANA MILENA ABAUNZA	$14,313,319.00		7 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
162	MVBF_158	CL 75 SUR 27 39	ISABELINA PATIÑO	$14,396,597.00		30 de enero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
163	MVBF_154	CL 75 SUR 27 A 05	CLAUDIA SMIT LUCAS TANGARIFE	$14,321,901.00		30 de enero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
164	MVBF_0155	CL 75A SUR 27 22	SONIA MILENA GIRALDO HERRERA	$14,399,290.00		8 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
165	MVBF_075	CL 75A SUR 27 27	JAIDI RIAÑOS	$14,350,715.00		9 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
166	MVBF_085	CL 75A SUR 27 63	LUCIA HERRERA QUINTERO	$14,400,000.00		6 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
180	MVBF_0072	CL 74A BIS A SUR 27 22	JORGE LUIS PEREZ IBAÑEZ	$14,390,307.00		6 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
181	MVBF_071	CL 75A BIS A SUR 27 28	JOSE JAVIER OLARTE MAHECHA	$14,390,771.00		6 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
182	MVBF_058	CL 75A BIS A SUR 27 64	BEATRIZ BRYITH CANGREJO	$14,387,211.00		6 de febrero de 2023	2 de marzo de 2023		15 de marzo de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
183	MVBF_047	CL 75B SUR 27 52	ANIBAL MORENO	$14,351,775.00		31 de enero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
184	MVBF_046	CL 75B SUR 27 58	MAGDALENA LEMUS CHAPARRO	$14,399,729.00		1 de febrero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
167	MVBF_054	CL 75A BIS SUR 27 15	MAYERLY SANCHEZ MENDOZA	$14,400,000.00	$14,400,000.00	1 de febrero de 2023	2 de marzo de 2023	13 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	15 de marzo de 2023	ENTREGADA	**100.00%**	0.00%
168	MVBF_066	CL 75A BIS SUR 27 39	GUMERSINDO SOLER SILVA	$14,393,928.00	$14,400,000.00	30 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	3 DE ABRIL DE 2023	ENTREGADA	**100.00%**	5.00%
169	MVBF_089	CL 75A BIS SUR 27 46	MARIA CONSUELO PEREZ	$14,276,981.00		1 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
170	MVBF_087	CL 75A BIS SUR 27 58	MARIA RUTH CORTES LOSADA	$14,324,429.00		1 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
199	MVBF_0482	CL 73D BIS SUR 27F 14	MARIA DAISSY BEJARANO	$14,392,964.00		9 de febrero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
200	MVBF_495	CL 73D BIS SUR 27M 52	MARIA FABIOLA GUEVARA ISAZA	$14,382,974.00		9 de febrero de 2023	16 de marzo de 2023		4 de abril de 2023		VALIDADA	**0.00%**	0.00%
BARRIO ALFONSO LOPEZ													
GRUPO No. 1													
	MV_03049	CL 111A SUR 8 61 ESTE	MARTHA JANETH DIAZ GUEVARA	$14,368,209.00		8 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03061	CL 112 SUR 8 75 ESTE	JOSE LISANDRO COLO OYOLA	$14,398,413.00	$14,399,062.00	20 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03062	KR 8A ESTE 112 15 SUR	ALVARO ANDRES MUÑOZ GUTIERREZ	$9,430,540.00	$11,082,270.00	23 de enero de 2023	5 de abril de 2023	4 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	25 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%

	MV_02928	CL 112 SUR 8A 68 ESTE	JOSE JACINTO CANTE	$14,397,681.00	$14,999,687.00	27 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_02931	CL 112 SUR 8A 56 ESTE	ETELVINA CAMACHO VELASCO	$14,158,285.00		26 de enero de 2023	5 de abril de 2023	14 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	51.52%	8.95%
	MV_02940	CL 112 SUR 8A 26 ESTE	GLORIA AIDE HIDALGO ALONSO	$14,396,181.00	$14,399,671.00	26 de enero de 2023	5 de abril de 2023	27 de febrero de 2023	26 de abril de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_02942	CL 112 SUR 8A 10 ESTE	MARIA EUGENIA BEJARANO CIFUENTES	$10,969,538.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	4 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	14 de abril de 2023	EJECUCION	99.95%	0.10%
	MV_02952	CL 111A SUR 8A 29 ESTE	MARTHA MORENO TORRES	$14,399,164.00		8 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	13 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	28 de abril de 2023	EJECUCION	63.94%	23.87%
	MV_02953	CL 111A SUR 8A 35 ESTE	HERMINDA CIPACON CIPACON	$14,399,260.00		8 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	21 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_02962	CL 111A SUR 8A 69 ESTE	HEBER TUMAL TUMAL	$14,370,687.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	21 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_02963	CL 111A SUR 8A 81 ESTE	NUBIA OLIVA LUJAN MONTAÑO	$14,390,459.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	20 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_02967	CL 111 SUR 8A 89 ESTE	JOSE JOAQUIN CAMARGO MORALES	$14,012,240.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	21 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_02968	CL 111A SUR 8A 93 ESTE	MARIA MERCEDES ARIAS DE GARCIA	$14,378,214.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	20 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_02969	CL 111A SUR 8A 97 ESTE	FLORMABEL DIAZ GONZALEZ			20 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_02977	CL 112 SUR 8C 86 ESTE	BENJAMIN TIQUE LONDOÑO	$14,388,013.00		25 de abril de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03014	CL 112 SUR 9 48 ESTE	DELFA SUAREZ RUEDA			20 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03015	CL 112 SUR 9 44 ESTE	JUDY ESPERANZA MARTINEZ CARDENAS			20 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03016	CL 112 SUR 9 40 ESTE	NOHEMY GALLEGO ARIAS				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03017	CL 112 SUR 9 30 ESTE	YOLANDA RODRIGUEZ			20 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03019	CL 112 SUR 9 22 ESTE	MARCO ANTONIO ROBAYO				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03086	CL 112A SUR 8A 08 ESTE	OSWALDO ALONSO ACEVEDO SALAMANCA	$14,399,892.00	$14,399,069.00	20 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03095	CL 112 SUR 8A 33 ESTE	NIKOLL MARCELA IBARRA ESPINOSA	$14,383,554.00		27 de enero de 2023	5 de abril de 2023	22 de febrero de 2023	26 de abril de 2023	11 de abril de 2023	EJECUCION	100.00%	0.06%
	MV_03098	CL 112 SUR 8A 43 ESTE	ANA YANETH PEÑA VERANO	$14,390,874.00		23 de enero de 2023	5 de abril de 2023	2 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	25 de abril de 2023	EJECUCION	99.50%	0.17%
	MV_03101	CL 112 SUR 8A 55 ESTE	EDGAR RINCON CASTAÑEDA	$14,393,346.00		23 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	28 de abril de 2023	EJECUCION	98.73%	5.00%
	MV_03103	CL 112 SUR 8A 67 ESTE	MARGOTH SANCHEZ MENDOSA	$14,396,185.00	$14,396,819.00	26 de enero de 2023	5 de abril de 2023	22 de febrero de 2023	26 de abril de 2023	10 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03120	CL 112A SUR 8C 68 ESTE	MARIA NELY PAMO ANDRADE	$13,803,834.00			5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03129	CL 112A SUR 8C 14 ESTE	JESUS MARIA PULIDO BERNAL			17 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03130	CL 112 SUR 8C 13 ESTE	JAIRO ALBERTO SIERRA CELY	$14,375,988.00			5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03171	CL 113 SUR 8A 66 ESTE	JOSE RICARDO TRIANA	$14,398,633.00	$14,399,821.00	16 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03213	CL 113 SUR 8C 04 ESTE	JAIRO JONNY SILVA	$14,361,701.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03216	CL 112A SUR 8C 17 ESTE	JOSE LUIS RODRIGUEZ CANO	$14,360,271.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03288	CL 113 SUR 8A 57 ESTE	MARTHA INES MADRIGAL MALAMBO	$14,398,147.00	$14,394,584.00	16 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	10 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03290	CL 113 SUR 8A 67 ESTE	MARIA VISITACIÓN TARAZONA VARGAS	$14,387,507.00	$14,391,019.00	16 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	10 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03374	CL 114 SUR 8C 33 ESTE	VICTOR MANUEL ALDANA LESMES			16 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03401	CL 114A SUR 8B 41 ESTE	ANA CECILIA ALEJO SECHAGUA	$14,391,276.00		2 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_02761	CL 111A SUR 10B 09 ESTE	LUIS CARLOS JEJEN JEJEN			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_02995	CL 111A SUR 8C 31 ESTE	DIANA MARLENE SANCHEZ VIRVIESCAS	$14,307,605.00		16 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03000	CL 111A SUR 8C 61 ESTE	NUBIA YISETH MARTINEZ ZABALA			20 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03005	CL 111A SUR 8C 85 ESTE	URIEL CLAROS CHAVARRO	$14,395,073.00		16 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03018	CL 112 SUR 9 26 ESTE	JESUS ANTONIO LEGUIZAMON MUNEVAR			20 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%

	MV_03024	CL 111A SUR 9 09 ESTE	LISBETH MARIA CARDENAS GARCIA				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03042	CL 111A SUR 10 17 ESTE	SMITH RUEDA SANCHEZ			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03139	KR 9 ESTE 112 09 SUR	LUIS JOSE GRAJALES VALENCIA	$13,939,075.00			5 de abril de 2023	25 de abril de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03188	CL 112A SUR 8A 25 ESTE	CHERLY OSORIO MORA	$14,382,682.00		17 de enero de 2023	5 de abril de 2023	4 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	14 de abril de 2023	EJECUCION	98.37%	0.02%
	MV_03201	CL 112A SUR 8A 87 ESTE	ANGELINA ORTIZ CARVAJAL	$14,398,920.00	$14,398,635.00	19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03218	CL 112A SUR 8C 35 ESTE	BEATRIZ ELLIS ESCORCIA	$14,358,928.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	21 de abril de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03241	CL 112A SUR 8D 21 ESTE	LERVIS DARIS GOMEZ ORTEGA			16 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	27 de abril de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03243	CL 112A SUR 9 07 ESTE	BLANCA AURORA NIÑO CASALLAS	$14,398,956.00		9 de marzo de 2023	27 de abril de 2023	4 de mayo de 2023	14 de mayo de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03247	CL 112A SUR 9 33 ESTE	MESIAS ROMERO GARCIA			20 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03248	CL 112A SUR 9 39 ESTE	JOSE ISIDRO BENAVIDES JIMENEZ				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03262	CL 114 SUR 8B 36 ESTE	CLAUDIA LILIANA TOVAR SASA	$14,390,459.00		8 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	10 de abril de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MV_03268	CL 114 SUR 8 38 ESTE	MARTHA CECILIA BARRETO QUINA	$14,352,706.00		30 de enero de 2023	5 de abril de 2023	21 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	17 de abril de 2023	EJECUCION	91.08%	27.60%
	MV_03271	CL 114 SUR 8 18 ESTE	SANDRA YASMIN CASTILLO BELTRAN	$14,396,636.00		30 de enero de 2023	5 de abril de 2023	20 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	0.00%	0.00%
	MVAL_03020	CL 112 SUR 9 16 ESTE	YULI CAROLINA MARTINEZ AMADO			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_02749	CL 111 SUR 10B 25 ESTE	FERLEIN MATEUS HERNANDEZ			3 de marzo de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03031	CL 111A SUR 9 51 ESTE	GLORIA PATRICIA GALLEGO				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03067	CL 112A SUR 8A 88 ESTE	MARTHA ARANDA	$14,397,071.00	$14,399,500.00	19 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	24 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03116	CL 112A SUR 8D 14 ESTE	NELSON RODRIGUEZ ROJAS			16 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_03123	CL 112A SUR 8C 50ESTE	FANY LEONOR LOPEZ RIVERA	$14,238,044.00			5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03189	CL 112A SUR 8A 27 ESTE	NIDIA YOLIMA ZAPATA RODRIGUEZ	$14,379,137.00	$14,037,515.00	17 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	17 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	10 de marzo de 2023	ENTREGADA	100.00%	0.00%
	MV_03190	CL 112A SUR 8A 35 ESTE	LIGIA BERNAL DE LEYTON	$14,299,536.00		17 de enero de 2023	5 de abril de 2023	21 de marzo de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	40.64%	10.26%
	MV_03211	CL 113 SUR 8C 08 ESTE	GRACIELA CRUZ DIAZ	$14,339,891.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03229	CL 113 SUR 8D 58 ESTE	LUIS ANTONIO GARCIA MORENO			13 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03231	CL 113 SUR 8D 40 ESTE	ISMAEL GAONA				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03239	CL 112A SUR 8D 15 ESTE	LUCILA OCHOA DE VEGA			13 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03258	CL 114A SUR 8B 66 ESTE	GIOVANNY ANDRES MEDINA	$14,394,238.00		1 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03270	CL 114 SUR 8 26 ESTE	BETTY PAYAN ACEVEDO	$14,399,717.00		30 de enero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03300	CL 114 SUR 8 44 ESTE	FABIOLA ALVARADO SANCHEZ	$10,632,668.00		30 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023	14 de abril de 2023	EJECUCION	98.16%	2.00%
	MV_03339	CL 113 SUR 8D 97 ESTE	SIXTO ABILIO PERALTA RINCON			17 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03352	CL 114 SUR 8B 09 ESTE	CARMEN MERCEDES TORRES RICO	$14,399,965.00		1 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	13 de marzo de 2023	26 de abril de 2023	26 de abril de 2023	EJECUCION	89.87%	26.82%
	MV_03359	CL 114 SUR 8B 57 ESTE	JAZMIN ALONSO MENDEZ	$12,341,384.00		6 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_02748	KR 10B BIS ESTE 111 06 SUR	ANGELMIRA FUENTES FUENTES			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03215	CL 112A SUR 8C 11 ESTE	ANA BETULIA MESA LOPEZ	$14,354,604.00		10 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03344	CL 114A SUR 8B 30 ESTE	ARCANGEL DE JESUS ROJAS LONDOÑO	$14,396,324.00		2 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03150	CL 112A SUR 9 04 ESTE	MARTHA RUBIO DELGADO				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03317	CL 114 SUR 9 38 ESTE	JOSE DIAZ CRUZ				5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03041	CL 111A SUR 10 11 ESTE	ELENA ULCUNCHE VARGAS				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%

	MV_03187	CL 112A SUR 8A 21 ESTE	VIRGINA GARCIA MORENO	$14,398,145.00		17 de enero de 2023	2 de marzo de 2023	14 de febrero de 2023	15 de marzo de 2023		ENTREGADA	99.02%	0.02%
	MV_03232	CL 113 SUR 8D 22 ESTE	MONICA LILIANA GUERRERO RUBIO				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03314	CL 114 SUR 9 78 ESTE	CARMEN ELISA DAVILA MARTINEZ				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03320	CL 114 SUR 8D 20 ESTE	MYRIAM NOVA GONZALEZ				5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03321	KR 8D ESTE 113 20 SUR	JHULHTZAI GUEVARA OÑATE				5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03397	CL 114A SUR 8B 59 ESTE	LUZ STELLA AYA LOPEZ	$14,395,865.00		2 de febrero de 2023	5 de abril de 2023	23 de febrero de 2023	26 de abril de 2023		EJECUCION	81.55%	8.57%
	MV_03399	CL 114A SUR 8B 47 ESTE	JORGE ELIECER TABARES GARCIA	$14,392,935.00		2 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_03125	CL 112A SUR 8C 44 ESTE	CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ TORRES			17 de febrero de 2023	5 de abril de 2023				VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_03328	CL 113 SUR 8D 25 ESTE	LUZ NELLY CARDONA JURADO				27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_03403	CL 114A SUR 8B 21 ESTE	FELISA ALEJO ARDILA	$14,399,522.00		2 de febrero de 2023	5 de abril de 2023		26 de abril de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MV_03040	CL 111A SUR 10 07 ESTE MJ	YAMIL TOVAR INFANTE			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_03072	CL 112A SUR 8A 62 ESTE	GERMAN SASCRITAN GONZALEZ			21 de febrero de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_02786	CL 110 SUR 9 70 ESTE	JUAN GABRIEL ALBERTO MOLANO MADRIGAL			3 de marzo de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%
	MVAL_00105	KR 6 ESTE 100 B 10 SUR	HERNAN MORENO HERNANDEZ			3 de marzo de 2023	27 de abril de 2023		14 de mayo de 2023		VALIDADA	0.00%	0.00%

ANEXO 2

Registro fotográfico componente social

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES SOCIALES			
			
Actividad: Seguimiento de obra MV_02931 USME Fecha: 03/04/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_02952 USME Fecha: 03/04/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_03352 USME Fecha: 03/04/2023	Actividad: Apertura de obra MV_03262 USME Fecha: 04/04/2023
			
Actividad: Apertura de obra MV_03359 USME Fecha: 04/04/2023	Actividad: Apertura de obra MV_03399 USME Fecha: 04/04/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_03397 USME Fecha: 04/04/2023	Actividad: Seguimiento de obra MV_03268 USME Fecha: 04/04/2023
			
Actividad: Seguimiento de obra MV_03352 USME Fecha: 04/04/2023	Atención al PAC Fecha:03/04/2023		
