DEPARTAMENTO DE SUCRE
GOBERNACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN
PARA
INFORME DE INTERVENTORÍA No. 1

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 1 DE MARZO DE 2023

CONTRATO No. LP-SID-008-2022

OBJETO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE

RAFAEL HERRERA PANZZA
Ingeniero de apoyo a la Supervisión

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

21 DE ABRIL DE 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Ficha Técnica del Contrato de Interventoría

NUMERO DE CONTRATO	No. CM-SID-056-2022
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS DEL BARRIO NUEVO MAJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($47.371.500).
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSÉ ALFREDO CARRASQUILLA MONTERROZA
TIPO DE PROCESO	MÍNIMA CUANTÍA
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES.
FECHA ACTA DE INICIO	30-ENERO-2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE ABRIL DE 2023
ESTADO DEL PROYECTO	EJECUCION
% DE ANTICIPO	**0%**
% DE EJECUCION	**33%**


LOCALIZACION DEL PROYECTO



Figura 2. Localización del proyecto en el Municipio de Sincelejo
Fuente Google Earth Pro.

A continuación, se relacionan cada uno de los tramos viales a intervenir ubicados en el barrio Nuevo Majagual del municipio de Sincelejo, con su respectiva dirección y coordenada geográfica:

N°	DIRECCIÓN	LONGITUD	COORDENADAS	
1	Calle 27, entre transversal 25c y 25d	56	9°17'43.79"N-75°24'5.97"O	9°17'45.20"N-75°24'4.72"O
2	Transversal 25c, entre calles 27d y 27	63	9°17'42.92"N-75°24'3.92"O	9°17'43.85"N-75°24'5.77"O
3	Transversal 25b, entre calles 27d y 27	55	9°17'44.04"N-75°24'3.38"O	9°17'44.80"N-75°24'5.00"O

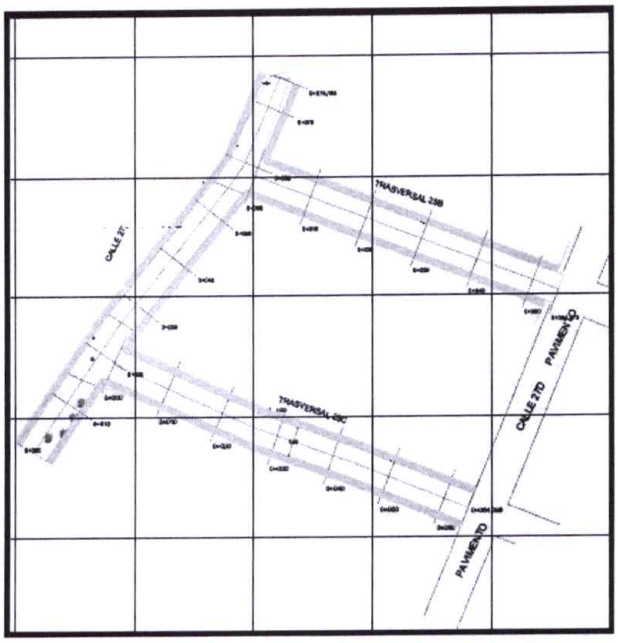

Las vías por intervenir se encuentran ubicadas en el barrio Nuevo Majagual en la zona urbana del municipio de Sincelejo, Dicha vía, en la actualidad tiene deficiencia en su infraestructura vial, no cuenta con una estructura de pavimento adecuada para el tránsito de la zona.


ALCANCE DEL PROYECTO


Metas físicas:


- **PAVIMENTO**: 211 ml de pavimento en concreto rígido de ancho =5 mts, e=0.20
- **ALCANTARILLADO**: 183 ml de tubería PVC de 8" y 38 domiciliarias en tubería de PVC 6".
- **ACUEDUCTO**: 203 ml de tubería de 3" PEAD y 38 domiciliarias en tubería de ½" PEAD.


REGISTRO FOTOGRAFICO




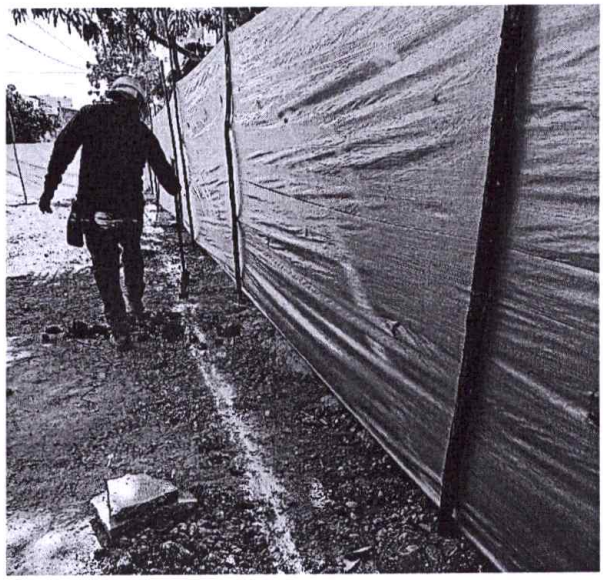

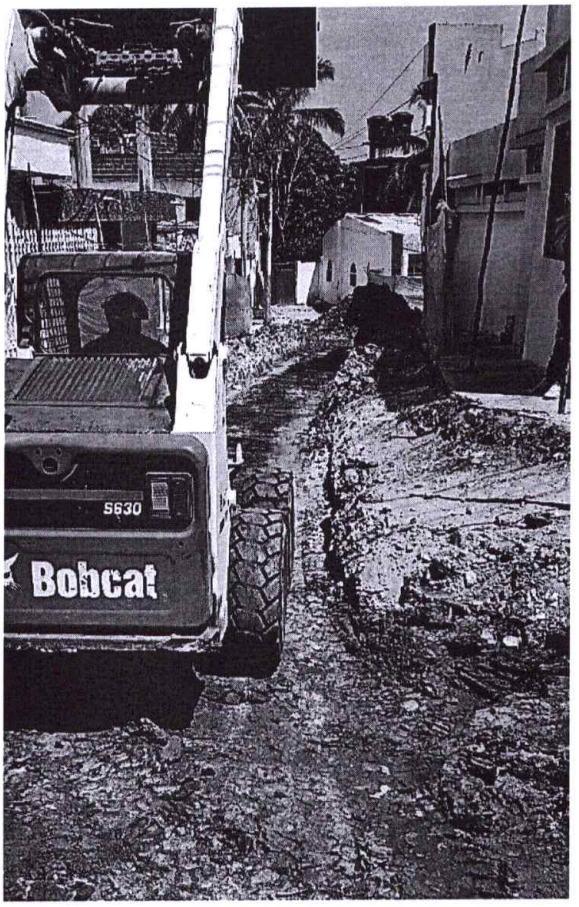

S630
Bobcat

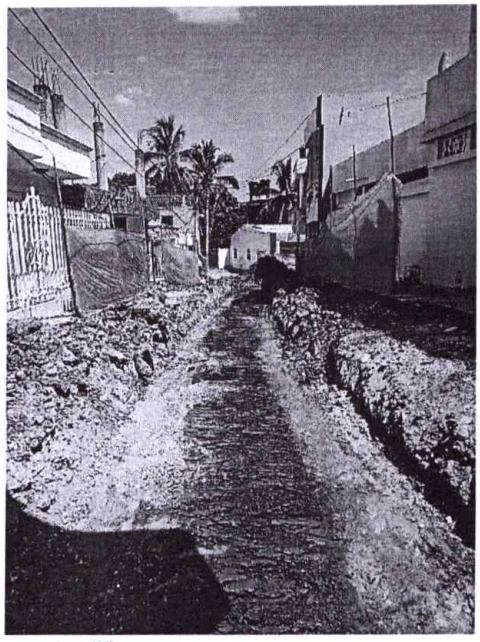


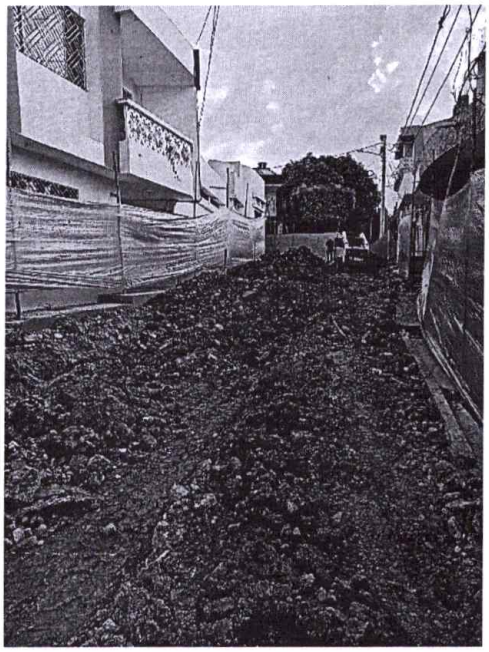


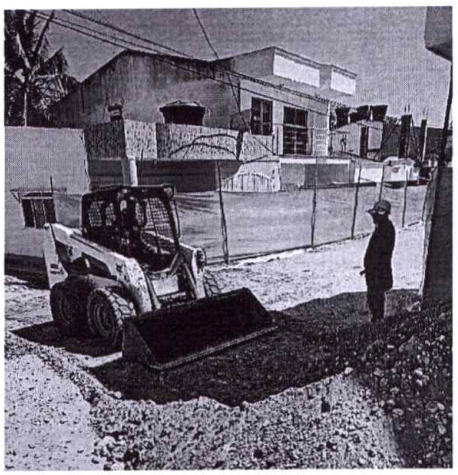





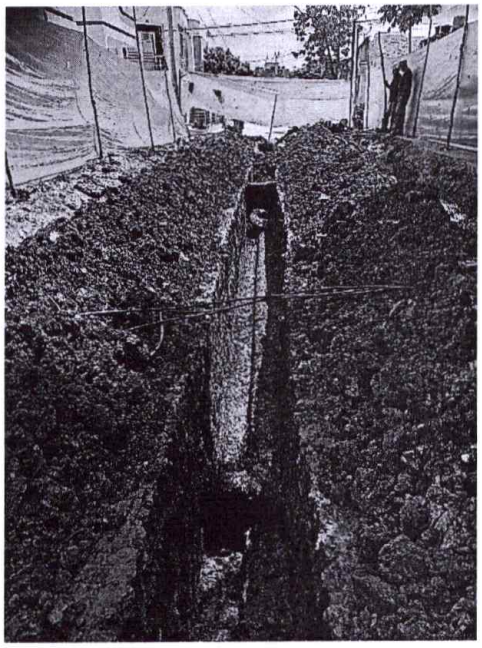


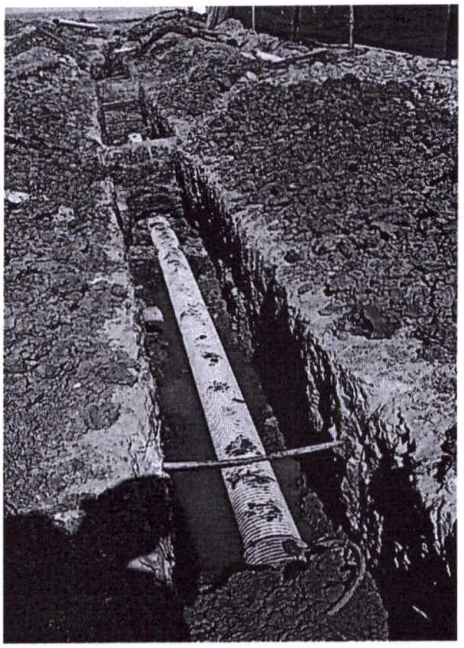

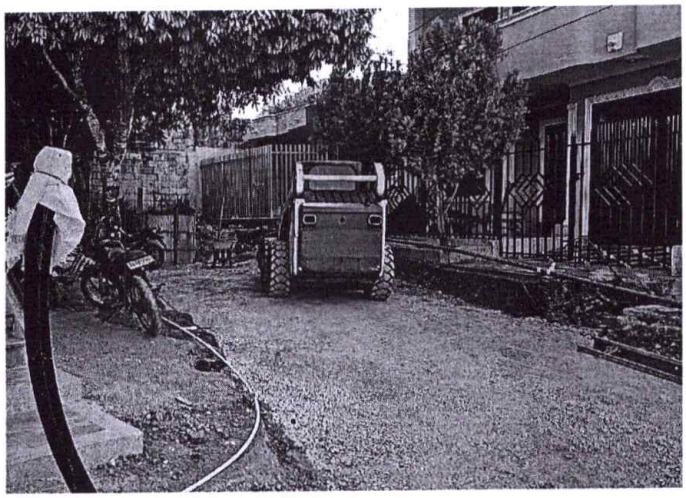

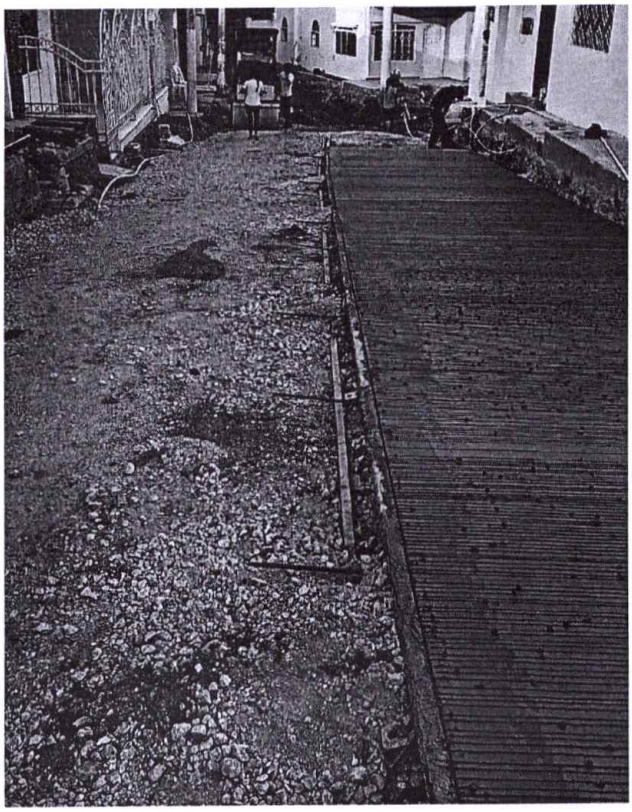

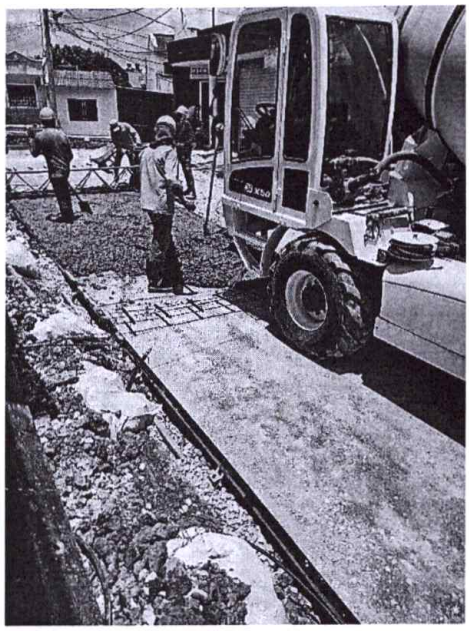

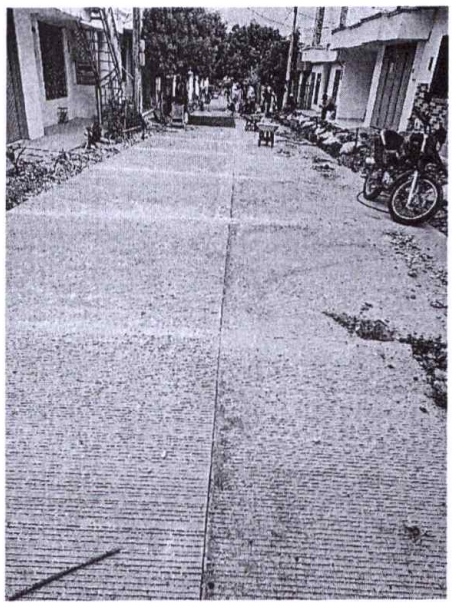

CONCLUSIONES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS HASTA LA FECHA POR LA INTERVENTORÍA: En visitas realizadas a la obra se ha evidenciado la presencia de ingeniero residente y se constató el seguimiento técnico y de control de calidad de las actividades de la obra como:

- Obras de alcantarillado sanitario(excavaciones, rellenos, instalaciones de tuberías principal y acometidas, construcción de pozos de inspección)
- Obras de Acueducto (excavaciones, rellenos, instalaciones tuberías de presión de 3" PVC, acometidas domiciliarias)
- Excavaciones para calzada de pavimento incluye retiro de material
- Mejoramiento con piedra rajón + balasto con espesor de 30 cm.
- Instalación de Geotextil
- SubBase granular con espesor de 20 cm
- Pavimento en concreto Hidráulico con espesor de 20 cm incluye la colocación de dovelas de 1" y acero de transferencia de ½".
- Bordillos en concreto a lado y lado de la vía

El contratista de interventoría presentó los informes semanales y el informe mensual No. 1 de interventoría, correspondiente al periodo del 30 de enero al 1 de marzo de 2023el cual fue aprobado por la supervisión.

El contratista de interventoría presentó a la Secretaría de Infraestructura el acta parcial de interventoría No. 1 de fecha 19 de abril de 2023, correspondiente al periodo del 30 de enero al 1 de marzo de 2023.

El acta parcial de interventoría No. 1 presentada por el contratista fue avalada y firmada por la supervisión de la Secretaría de Infraestructura.

Una vez revisada el acta parcial de obras No. 1 y las memorias de cantidades de obra anexas y de acuerdo con las obras evidenciadas en las visitas de la supervisión a la obra de los frentes de trabajo, se da concepto favorable

ESTADO DEL CONTRATO: Actualmente el contrato se encuentra en ejecución, teniendo como fecha de vencimiento el 29 de abril de 2023

RAFAEL HERRERA PANZZA
Ingeniero de apoyo a la supervisión
Secretaría de Infraestructura
