ING. FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA

INFORME DE INTERVENTORÍA N° 02

PERÌODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORÌA N° 141 DE 2022

“INTERVENTORÌA TÈCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÒN CON PERSONA JURÌDICA DE DERECHO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA”



Mayo de 2023

ÍNDICE DE MODIFICACIONES, REVISIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE DEL ESTUDIO:
INFORME DE INTERVENTORÍA N° 02, CORRESPONDIENTE AL PERÌODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ARIL DE 2023

	Nombre:	Firma:
ELABORÓ:	Ing. Milagro Camargo Arévalo	
REVISÓ Y APROBÓ:	Ing. Fabián Alfredo Hugueth Molina Contratista	

REVISIÓN / FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
	Entrega del documento a la alcaldía del distrito de Turbo (Antioquia.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÒN 4
CAPITULO I. FICHA TÈCNICA 6
1.1.INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO 6
CAPITULO 02. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO 8
2.1.LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO 8
2.2.BENEFICIOS POR LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO 8
2.2. BENEFICIOS POR LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO 8
2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURNTE EL PRESENTE PERIODO 9
2.4. CARACTERISTICAS TÈCNICAS DE LA OBRA 10
CAPÌTULO 3. INFORMACIÒN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÌA 11
3.1. DESCRIPCIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 11
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 11
3.1.2. GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA INTERVENTORÍA 12
3.1.3. GESTIÒN JURÌDICA DE LA INTERVENTORÌA 13
3.1.4. ENTREGA DE EPP 13
3.1.5. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL EN CONTRATO DE LA INTERVENTORÌA 13
3.2. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MNSUAL DE LA INTERVENTORÌA 13
3.2.1. SEGUIMENTO A LA INVERSIÒN DEL ANTICIPO 13
3.2.2. PLAN DE CARGA 14
CAPÌTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

INTRODUCCIÓN

Este Informe Mensual de Interventoría N° 02, describe el avance y las acciones adelantadas durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2023, en la ejecución el Convenio de Asociación No. 332 del 14 de octubre de 2021 suscrito entre el Municipio de Turbo y la Corporación Rosalba Zapata Cardona, cuyo objeto es **REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE TURBO,EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.**

Así mismo, hace parte de este informe el contrato de interventoría No. 141 de 2022, celebrado con el Distrito de Turbo(Contratante) y Fabián Alfredo Hugueth Molina (Contratista), cuyo objeto es la realización de la "**INTERVENTORÌA TÈCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÒN CON PERSONA JURÌDICA DE DERECHO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"**

En el cuerpo del presente documento se presenta el seguimiento de las acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero, con el fin de garantizar los procesos constructivos que redundan en la calidad de las obras, de tal forma que, al ser puestas al servicio, presten a la comunidad la utilidad para lo cual fueron diseñadas.

De igual manera, contiene todas las actividades desarrolladas por el Contratista, siguiendo las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás normas vigentes e inherentes al proyecto, verificando que las obras de construcción y conservación se ejecuten en un todo.

El informe se compone de cuatro (4) capítulos, el primero corresponde a la introducción general, del segundo (2) al cuarto (4) corresponden a los diferentes acápites de control y vigilancia por parte de la interventoría, se incluyen conclusiones y recomendaciones.

A su vez, cada acápite contiene una descripción general; información del contrato de obra y de Interventoría, que incluye el estado general de los contratos, las actividades desarrolladas. Finalmente se exponen conclusiones y recomendaciones a seguir.

Información general del contrato

- ✓ El Acta de Inicio del Contrato se suscribió en fecha 3 de noviembre de 2021.
- ✓ Plazo de ejecución: Dos (2) meses

✓ El 20 de diciembre de 2022 se suscribió, por parte de la Alcaldía Distrital, la Corporación Rosalba Zapata Cardona, y la interventoría el Acta de suspensión

✓ El 13 de marzo se suscribió el Acta de Reinicio, esto debido a que se subsanaron los motivos por los cuales se suspendió la ejecución de las obras.

✓ En fecha 23 de marzo de 2023 se realizó Otro sì No. 1 al Convenio de asociación No. 332 de 2021, mediante el cual se amplía el plazo de ejecución de las obras por Un (1) mes y quince (15) días. Para un plazo total de tres (3) meses y quince (15) días.

.

CAPITULO 1. FICHA TÉCNICA

1.1 INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

PROYECTO	**CONVENIO DE ASOCIACIÒN CON PERSONA JURÌDICA DE DERECHO PRIVADO SIN ÀNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE TURBO**
CONTRATO N°	DE ASOCIACIÒN No. 332 del 14 de octubre de 2021
CONTRATISTA	CORPORACIÒN ROSALBA ZAPATA CARDONA
NIT.	890.181.138-5
REPRESENTANTE LEGAL	**JORGE ELIECER VASQUEZ VANCES**
DIRECCIÓN Y TELÉFONO CONTRATISTA	Carrera 106 No. 108B-38. Barrio Ortiz Teléfono: 828-51-00. Apartadó- Antioquia

1.2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto	**CONVENIO DE ASOCIACIÒN CON PERSONA JURÌDICA DE DERECHO PRIVAO SIN ÀNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA EN EL DISTRITO DE TURBO**
Contrato N°	DE ASOCIACIÒN No. 332 del 14 de octubre de 2021
Otrosíes	Otro si No. 01. De fecha 23 de marzo de 2023, mediante el cual se adiciona tiempo, un (1) mes y 15 días para un plazo total de Tres (3) meses y Quince (15) días.


Contratista	CORPORACIÒN ROSALBA ZAPATA CARDONA
NIT.	890.981.138-5
Representante Legal	**JORGE ELIECER VASQUEZ VANCES**
Valor del Contrato	MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/L ($1.180.351.330,00). EL DISTRITO DE TURBO APORTARÀ LA SUMA DE OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M.L. ($828.245.931). LA CORPORACIÒN ROSALBA ZAPATA CARDONA APORTARTÒ LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($354.105.399)
Garantía	Garantía Única 3190382-3 Expedida por Suramericana
Porcentaje de Obra Ejecutado (del 1 de abril al 30 de abril de 2023)	89%

CAPITULO 2. DESCRIPCIÒN DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACIÒN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el distrito de Turbo, en el sector denominado “El Estadio”.

Imagen No. 01. Localización geográfica del proyecto

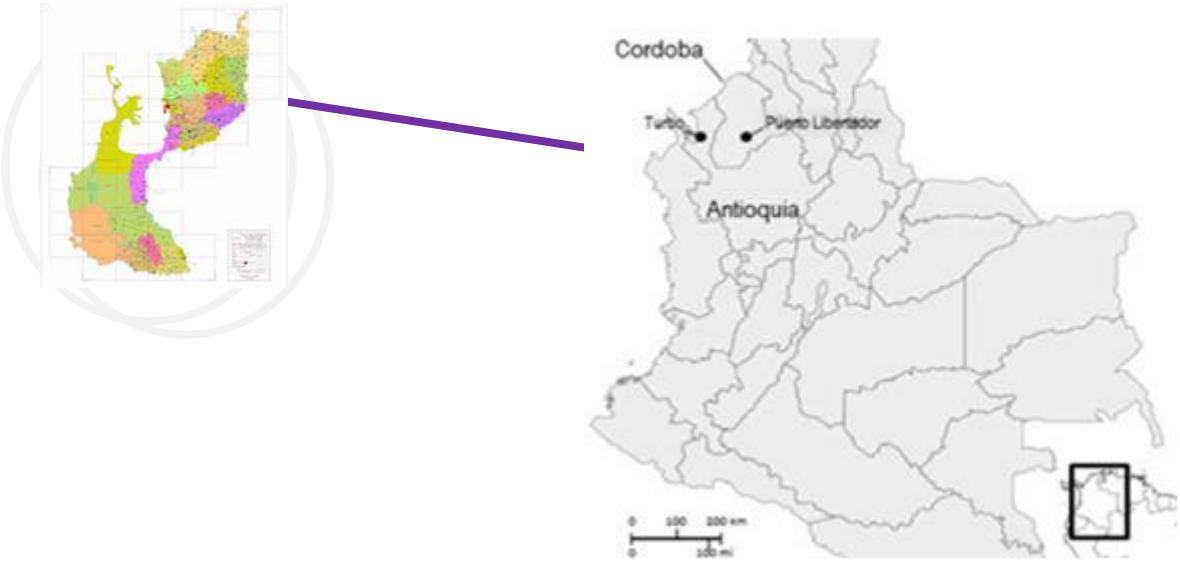

2.2. BENEFICIOS POR LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO

Con la ejecución de los colectores de acueducto y alcantarillado en el sector del Estadio para la ejecución de proyectos de vivienda nueva que se construirán, ayudan a que los habitantes de la urbanización que se ejecutará en un futuro denominada **“DORA YABUR”,** tengan calidad de vida , esto es debido a que con las redes del acueducto se garantiza el suministro de agua potable para el consumo humano, y las redes del alcantarillado, permiten evacuar las aguas residuales y pluviales, hacia una planta de tratamiento evitando su acumulación e impidiendo la propagación de enfermedades relacionadas con aguas contaminadas; es decir las obras que se ejecutan certifican la habitabilidad de las vivienda mejorando la calidad de vida de los futuros habitantes de la citada urbanización.

2.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE PERÌODO

✓ Se continuó con la instalación de la tubería de alcantarillado, para lo cual se realizaron las excavaciones pertinentes en el tramo comprendido desde la cámara de inspección – MH No. 11 al No. 12.

✓ Se instaló la tubería de diámetro de 20 pulgadas que corresponde a 500 mm, en una longitud de 75,45 ml.

✓ Se culminó la construcción de las cámaras de inspección, realizando las cañuelas de conducción en el fondo de los manholes, instalando los conos de reducción y las tapas de cierre

✓ Se perfiló la vía de acceso, realizando el paisajismo al lugar.


✓ Se inició la unión de la tubería PE 100PN 10 200mm con termofusiòn.

Instalación tubería de 20 pulga, tramo comprendido entre el Mh 11 y Mh 12	Unión de tubería PE 100-PN 10 de Φ200mm con termofusiòn
	
Terminación de Cámaras de Inspección	Paisajismo del lugar
	

Avance de obra acumulado hasta el 30 de abril de 2023 es del 89%

2.4. CARACTERÍSTICAS TÈCNICAS DE LA OBRA

Imagen 02. Diseño del acueducto

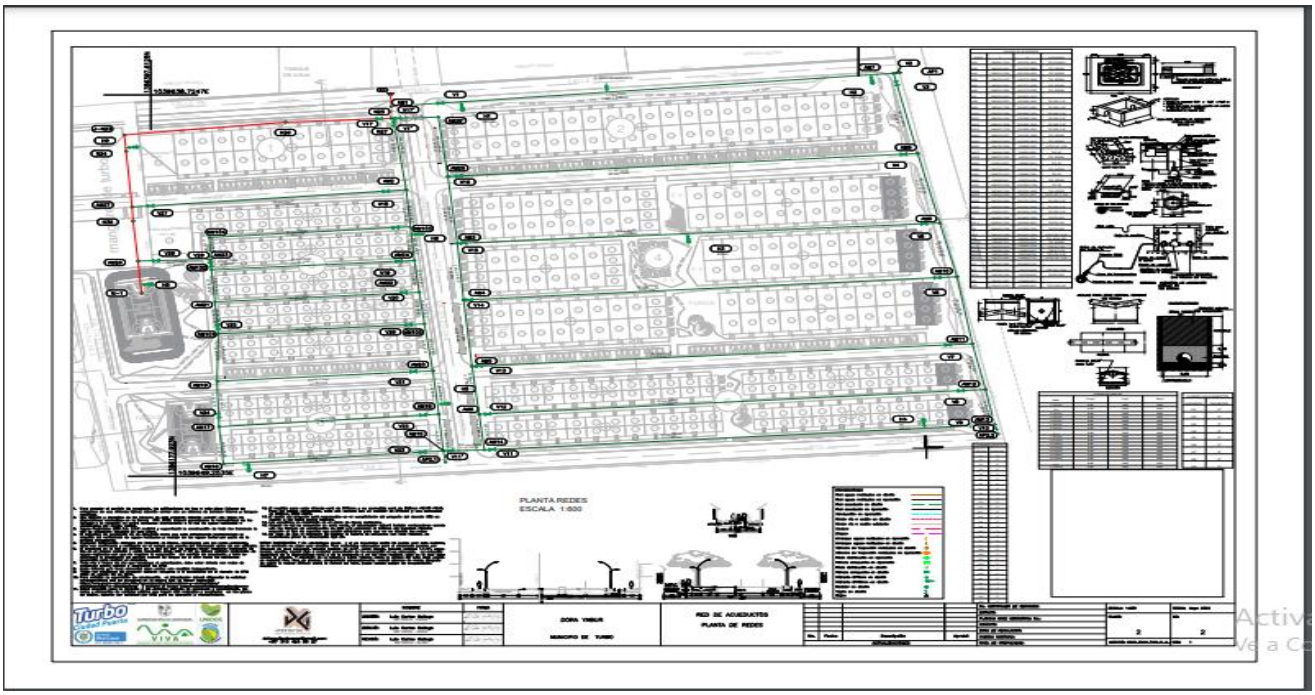

CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto	INTERVENTORÌA TÈCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÒN CON PERSONA JURÌDICA DE DERECHO SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÒN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE VIVIENDA"
Contrato	No. 141 del 6 de mayo de 2022
Otrosíes	Otrosí modificatorio y adición en tiempo Nro. 01 al Contrato de Interventoría Nro. 141 del 06 de mayo de 2022.
Interventor	Ing. Fabián Alfredo Hugueth Molina
NIT.	8.726.352-3
Valor del Contrato	$36.110.000,00
Plazo Inicial del Contrato	Dos Meses
Plazo actual	Dos meses y Veintiséis días
Fecha de Inicio del Contrato	16 de mayo de 2022
Valor Anticipo	N. A.
Garantías	Póliza de Garantía única de cumplimiento No. 560-47-994000152500- Aseguradora Solidaria
Teléfonos	311 4065589
Correo Electrónico	ingfabianhuguethmolina@gmail.com
Ingeniera Residente	Milagro Camargo Arévalo

3.1. DESCRIPCIÒN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÌA

El objetivo principal de esta Interventoría es el seguimiento y control integral a las obras que se ejecutan mediante el convenio de asociación No. 332 de 2021.

Esta interventoría realiza efectivamente los procesos y actividades necesarias que permitan realizar un control y seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista.

Como parte de nuestras funciones por área de gestión se cumplió con los siguientes objetivos específicos:

3.1.2 GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORÍA.

Se siguieron los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de obra y del Contrato de Interventoría, que implicaron la interacción con el Contratista. Lo anterior involucra el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente entre las partes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción y verificación de informes, entre otros.

Se emiten además por parte de la interventoría los siguientes oficios realizados durante el período del presente informe.

Tabla No. 01. Correspondencia enviada

FECHA	OBJETO	ENVIADO A
13/04/2023	Presentación de cuenta de cobro 01 y acta de costo 01 del contrato de Interventoría	Jhon Jairo Rodríguez Salazar – Secretario de Infraestructura Distrital
17/04/2023	Solicitud alcance del proyecto de redes de alcantarillado.	Jhon Jairo Rodríguez Salazar – Secretario de Infraestructura Distrital

Durante este período se realizaron reuniones con representantes de la empresa Aguas Regionales, operadora de las redes de conducción de agua potable y de tuberías de alcantarillado, con la finalidad de legalizar los cambios indicados por ellos, requeridos para poder llevar a cabo de manera óptima las acciones pertinentes a su labor.

Es por esto, y teniendo en cuenta que los diseños de los colectores de acueducto y alcantarillado aprobados por Aguas Regionales se vencieron en el mes de diciembre del año 2022, se presentaron ante esta entidad, unos nuevos diseños, que básicamente son iguales a los anteriormente aprobados, pero que requieren de ajustes, que como se indicó anteriormente, sugeridos por Aguas Regionales y que son necesarios para la operatividad de las redes

En los nuevos diseños se incluyeron los cambios solicitados relacionados con las cámaras de inspección de concéntricos a excéntricos, a excepción del MH No. 4 , que es el inicial.

Con relación a las redes de acueducto, se incluyeron los cambios solicitados por Aguas Regionales, como son:

- Cambiar la tubería PE 100-PN 10 de Φ225 mm, por tubería PE 100-PN 10 de Φ 200 mm, en una longitud de 433 ml.
- Incluir el suministro, transporte y colocación de un codo PEAD DN 200 x 90º PE 100 RDE 17 PN 10
- Suministro, transporte y colocación de 14 unidades de tapón PEAD DN 200 PE 100 RDE 17 PN 10
- Suministro, transporte y colocación de 18 unidades de tee PEAD DN 200 PE 100 RDE 17 PN 10
- Suministro, transporte y colocación de 17 unidades de niple de 1m en tubería PE 100 PN-10 de 200 mm

3.1.3. GESTIÓN JURÍDICA DE LA INTERVENTORÍA.

En el período correspondiente al presente informe el Contratista ejecutó sus actividades de acuerdo con lo establecido en el marco de la condición del Contrato, dando así cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

3.1.4. ENTREGA DE EPP:

Se evidenció que los trabajadores en la ejecución de la obra contaban y usaban la línea de vida, botas de seguridad, gafas; esta interventoría les recuerda el uso adecuado y el cuidado de los mismos.

3.1.5. PERSONAL CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL EN CONTRATO DE LA INTERVENTORIA

Durante el periodo del 1 al 30 de abril de 2023 , la interventoría trabajó con el personal que se relaciona en el anexo No. 1 del presente informe.

3.2. OTROS DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO MENSUAL INTERVENTORÍA.

3.2.1. Seguimiento a la inversión del anticipo.

El seguimiento a la inversión del anticipo **NO APLICA** en el presente informe debido a que no se ha otorgado anticipo a esta interventoría

3.2.2.Plan de carga

Se presenta plan de carga aprobado por la alcaldía del distrito de Turbo mediante Otro Sì de fecha 23 de marzo de 2023.

Imagen No. 03. Resumen Plan de Cargas actualizado del contrato de Interventoría N° 141 de 2022.

CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	PRIMA REGIONAL	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*((2)+(3))*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL					
1	Ingeniero Civil Residente de Interventoria Turbo	$ 4,300,000.00	$ -	2	$ 8,600,000.00
1	Topografo inspector	$ 2,900,000.00	$ -	1	$ 2,900,000.00
1	Residente SST	$ 2,900,000.00	$ -	1	$ 2,900,000.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO					
1	Auxiliar de oficina	$ 1,000,000.00	$ -	2	$ 2,000,000.00
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO					
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					$ 16,400,000.00
				FACTOR MULTIPLICADOR (7)	**1.95**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					**$ 31,980,000.00**
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS					
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA					
1	Papeleria y copias	MES	$ 500,000.00	2	$ 1,000,000.00
2	Alquiler de Computadores Turbo	MES	$ 150,000.00	2	$ 600,000.00
COSTO DE MUESTREO, ANÁLISIS DE LABORATORIO - ENSAYOS					
3	Ensayo de densidad de subbase in situ (1) uno por cada 50 m por capa no mayores de 40 cm	UNIDAD	$ 50,000.00	1	$ 150,000.00
2	Ensayo de laboratorio Proctor modificado para material de subbase dos (2) por cada cantera utilizada y cada 200m en terreno natural	UNIDAD	$ 45,000.00	1	$ 90,000.00
1	Diseño de mezcla de concreto 21 MPA uno (1) por cada cantera	UNIDAD	$ 700,000.00	1	$ 700,000.00
2	Ensayo de laboratorio de resistencia del concreto uno cada 20 m3	UNIDAD	$ 45,000.00	1	$ 90,000.00
OTROS COSTOS					
1	Arriendo Oficinas (amoblada) Turbo incluye pago de servicios públicos.	MES	$ 500,000.00	3	$ 1,500,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					**$ 4,130,000.00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					**$ 36,110,000.00**
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					**$ -**
				VALOR TOTAL BASICO	**$ 36,110,000.00**
				IVA = 19% * (E) = (F)	
				COSTO TOTAL = (E) + (F)	**$ 36,110,000.00**

CAPÌTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Al contratista de la obra se le realizan las siguientes recomendaciones:

Mantener en la obra la señalización necesaria para delimitar las labores constructivas y las necesarias para informar a los transeúntes del lugar, que en esta área se están ejecutando obras .

En el proceso constructivo que se realice para la ejecución del alcantarillado se ejecutan excavaciones; es por esto, que es preciso se adopten precauciones para impedir el derrumbamiento de cualquier zanja de más de 1,2 m de profundidad. Es por esto que se requiere se dé cumplimiento a las especificaciones técnicas emanadas de la Empresas Públicas de Medellín, en relación con lo siguiente:

"En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes, atendiendo lo indicado en la especificación NEGC 202…"

Es importante resaltar la responsabilidad que tiene el contratista para el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, y disponer de las acciones necesarias, con la finalidad de evitar riesgos a los cuales podrían exponerse los trabajadores de la obra en la realización de actividades, como es el caso puntual, la instalación de las tuberías.


Teniendo en cuenta que, a la fecha de corte del presente informe, el avance acumulado de las obras asciende al 89%, es oportuno organizar las pruebas que se requieren para el recibo de las obras, por lo tanto, es necesario que el contratista informe a la empresa Aguas Regionales, para que delegue a un representante de esta empresa con el fin que asista a la realización de las pruebas, como se indica en los documentos técnicos elaborados por ellos para tal fin.

ANEXOS

ANEXO No. 01. ESTADO DEL CLIMA EN TURBO- ANTIOQUIA

A continuación, se enuncia el estado del clima en el municipio de Turbo, desde el 1 de abril al 30 de abril de 2023.

Imagen 04. Estado del Clima

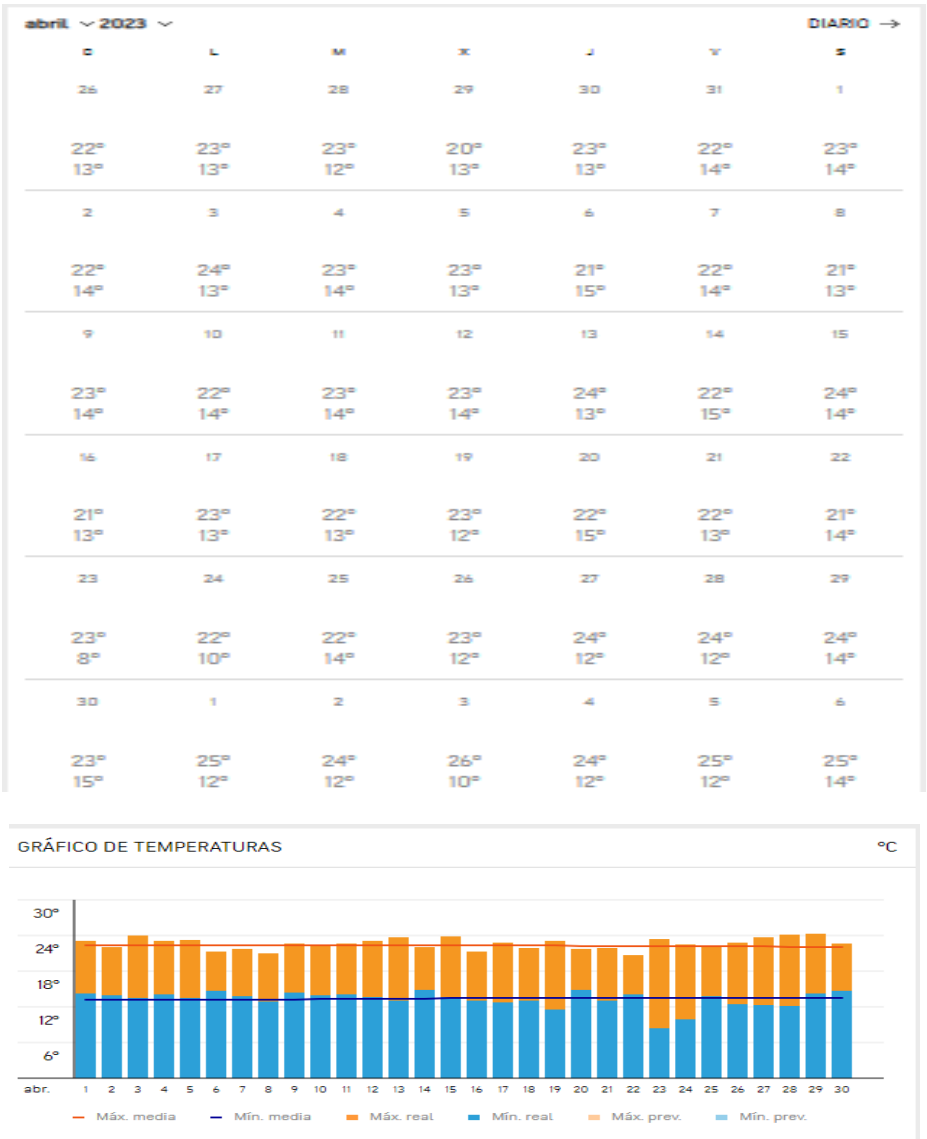

Fuente: https://www.accuweather.com/es/co/turbo/106983/march-weather/106983?year=2023

ANEXO No.0 2. PERSONAL DEL CONTRATISTA

CIUDAD APARTADÒ (2 AFILIADOS)				
No.	**DOC**	**CÈDULA DE CIUDANÌA**	**NOMBRE**	**TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL**
1	CC	15368488	ARBELAEZ CASTRILLON CESAR AUGUSTO	$ 774.000,00
3	CC	8428253	SANTANA VELASQUEZ ANGELICA MARIA	$ 619.20000
SUCURSAL : COLECTOR DORA YABUR (7 AFILIADOS)				
5	CC	71976387	ARANGO RODRIGUEZ JOSÈ OMAR	$ 350.200,0
6	CC	6705275	CAICEDO CUESTA FRANCISCO	$ 89.600,00
7	CC	1075089678	CÒRDOBA PEREA WLADIMIR	$ 182.500,00
8	CC	71976023	MOSQUERA CAICEDO JESUS ENRIQUE	$ 350.800,00
9	CC	1019107190	SANTANA MISAL JOSE ALVEIRO	$ 182.400,00
10	CC	1038806030	SILVA HINCAÌE JOVANNY HUMBERTO	$ 182.500,00
11	CC	1027942503	VASQUEZ PEÑA DIEGO	$ 359.200,00

Se anexa planilla de pago de la seguridad Social de los trabajadores enunciados

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900869300	1	D.C.I. ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 97A N°104-04	APARTADO-ANTIOQUIA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2057226991	9450531482	E	2023/05/03	2023/05/02	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$8,838,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (10 Afiliados)																							**$15,600,001**	**$2,496,100**			**$15,600,001**	**$624,100**			**$15,522,667**	**$621,000**			**$15,600,001**		**$520,500**		**$0**	**$0**		**$4,261,700**
Centro de Trabajo: RIESGO1 (6 Afiliados)																							**$8,780,001**	**$1,404,900**			**$8,780,001**	**$351,300**			**$8,702,667**	**$348,200**			**$8,780,001**		**$45,700**		**$0**	**$0**		**$2,150,100**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (6 Afiliados)																							**$8,780,001**	**$1,404,900**			**$8,780,001**	**$351,300**			**$8,702,667**	**$348,200**			**$8,780,001**		**$45,700**		**$0**	**$0**		**$2,150,100**
1	CC	1001027633	CARMONA JIMENEZ VALENTINA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
2	CC	1028010844	CUADRADO FABRA ADRIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
3	CC	43091206	GAÑAN GAÑAN MARIA LIBIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	Si	$284,500
4	CC	43140945	MADERA BRAVO OSMERIS DEL CARMEN											X							23030 1	2	$77,334	$12,400	EPS040	2	$77,334	$3,100	CCF03	0	$0	$0	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$15,500
5	CC	43140945	MADERA BRAVO OSMERIS DEL CARMEN																		23030 1	28	$1,082,667	$173,300	EPS040	28	$1,082,667	$43,400	CCF03	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	0.522%	$5,700	28	$0	$0	Si	$265,800
6	CC	43623020	OSORIO RODRIGUEZ YALILE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF03	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
7	CC	1017259851	VELASQUEZ SEPULVEDA RUBEN DARIO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro de Trabajo: RIESGO5 (4 Afiliados)																							**$6,820,000**	**$1,091,200**			**$6,820,000**	**$272,800**			**$6,820,000**	**$272,800**			**$6,820,000**		**$474,800**		**$0**	**$0**		**$2,111,600**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																							**$6,820,000**	**$1,091,200**			**$6,820,000**	**$272,800**			**$6,820,000**	**$272,800**			**$6,820,000**		**$474,800**		**$0**	**$0**		**$2,111,600**
8	CC	15368488	AGUILAR ATILIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
9	CC	98543273	ARBELAEZ CASTRILLON CESAR AUGUSTO							X											23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF03	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	8428253	DIAZ ZUÑIGA MIGUEL FRANCISCO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
11	CC	1007853332	SANTANA VELASQUEZ ANGELICA MARIA																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF03	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA CNO (5 Afiliados)																							**$5,800,001**	**$928,100**			**$5,800,001**	**$232,100**			**$4,340,091**	**$173,800**			**$5,800,001**		**$325,900**		**$0**	**$0**		**$1,659,900**
Centro de Trabajo: RIESGO5 (5 Afiliados)																							**$5,800,001**	**$928,100**			**$5,800,001**	**$232,100**			**$4,340,091**	**$173,800**			**$5,800,001**		**$325,900**		**$0**	**$0**		**$1,659,900**
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																							**$5,800,001**	**$928,100**			**$5,800,001**	**$232,100**			**$4,340,091**	**$173,800**			**$5,800,001**		**$325,900**		**$0**	**$0**		**$1,659,900**
12	CC	8048440	CABARCA BEDOYA YORIS DE JESUS																	X	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,092,092	$43,700	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$356,500
13	CC	1027942155	CANO FLOREZ DAISURIDIANE																		23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$12,100
14	CC	1027942155	CANO FLOREZ DAISURIDIANE												X						23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF03	0	$0	$0	14-11	29	$1,121,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$224,400
15	CC	71946728	GUISAO DAVID WILDEMAN DE JESUS																	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,089,675	$43,600	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$356,400
16	CC	71241616	PALOMINO ESPITIA EDINSON MANUEL																	X	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,087,983	$43,600	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$356,400
17	CC	71945055	VALDERRAMA MACHADO WILMER																	X	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS040	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,031,674	$41,300	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$354,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: OBRA LOS ALMENDROS (4 Afiliados)																						$4,558,667	$729,400			$4,558,667	$129,600			$4,695,611	$135,100			$4,558,667		$225,600		$0	$0		$1,219,700
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)																						$4,558,667	$729,400			$4,558,667	$129,600			$4,695,611	$135,100			$4,558,667		$225,600		$0	$0		$1,219,700
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)																						$4,558,667	$729,400			$4,558,667	$129,600			$4,695,611	$135,100			$4,558,667		$225,600		$0	$0		$1,219,700
18	CC	4855240	CUESTA MENA ELISMELI																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
19	CC	1001668304	ESPITIA GUERRA LUIS GABRIEL		X														X	230201	1	$38,667	$6,200	EPS040	1	$38,667	$1,600	CCF03	1	$175,611	$7,100	14-11	1	$38,667	6.960%	$2,700	1	$0	$0	Si	$17,600
20	CC	71252818	HIGUITA GUISAO ABEL ANTONIO																	25-14	12	$880,000	$140,800	EPS010	12	$880,000	$35,200	CCF03	12	$880,000	$35,200	14-11	12	$880,000	6.960%	$61,300	12	$0	$0	Si	$272,500
21	CC	71252818	HIGUITA GUISAO ABEL ANTONIO									X								25-14	18	$1,320,000	$211,200	EPS010	18	$1,320,000	$0	CCF03	18	$1,320,000	$0	14-11	18	$1,320,000	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$211,200
22	CC	15609229	SOTO PACHECO NEMESIO JOSE																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLECTOR DORA YABUR (7 Afiliados)																						$5,142,668	$823,000			$5,722,668	$229,000			$6,167,336	$247,000			$5,722,668		$398,600		$0	$0		$1,697,600
Centro de Trabajo: RIESGO5 (7 Afiliados)																						$5,142,668	$823,000			$5,722,668	$229,000			$6,167,336	$247,000			$5,722,668		$398,600		$0	$0		$1,697,600
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (7 Afiliados)																						$5,142,668	$823,000			$5,722,668	$229,000			$6,167,336	$247,000			$5,722,668		$398,600		$0	$0		$1,697,600
23	CC	71976387	ARANGO RODRIGUEZ JOSE OMAR	X	X														X	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS037	29	$1,121,334	$44,900	CCF03	29	$1,205,112	$48,300	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$350,800
24	CC	6705275	CAICEDO CUESTA FRANCISCO		X														X		0	$0	$0	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$649,278	$26,000	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$89,600
25	CC	1075089678	CORDOBA PEREA WLADIMIR		X														X	230301	15	$580,000	$92,800	ESSC24	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$649,278	$26,000	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$182,400
26	CC	71976023	MOSQUERA CAICEDO JESUS ENRIQUE	X	X														X	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF03	29	$1,205,112	$48,300	14-11	29	$1,121,334	6.960%	$78,100	29	$0	$0	Si	$350,800
27	CC	1019107190	SANTANA MISAL JOSE ALVEIRO		X														X	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$649,278	$26,000	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$182,400
28	CC	1038806030	SILVA HINCAPIE JOVANNY HUMBERTO		X														X	230301	15	$580,000	$92,800	EPS010	15	$580,000	$23,200	CCF03	15	$649,278	$26,000	14-11	15	$580,000	6.960%	$40,400	15	$0	$0	Si	$182,400
29	CC	1027942503	VASQUEZ PEÑA DUEGO																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF03	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total		**Afiliados(26)**																				$31,101,337	$4,976,600			$31,681,337	$1,214,800			$30,725,705	$1,176,900			$31,681,337		$1,470,600		$0	$0		$8,838,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900869300	1	D.C.I. ARQUITECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 97A N°104-04	APARTADO-ANTIOQUIA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2057226991	9450531482	E	2023/05/03	2023/05/02	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0	$8,838,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				25	$4,976,600	$0	$0	$4,976,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,847,000	$0	$0	$1,847,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,297,800	$0	$0	$2,297,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$831,800	$0	$0	$831,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,470,600	$0	$0	$1,470,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$1,470,600	$0	$0	$1,470,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,176,900	$0	$0	$1,176,900
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	26	$1,176,900	$0	$0	$1,176,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				26	$1,214,800	$0	$0	$1,214,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	12	$593,800	$0	$0	$593,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$310,500	$0	$0	$310,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	$187,300	$0	$0	$187,300
TOTAL				**26**	**$8,838,900**	**$0**	**$0**	**$8,838,900**

ANEXO No. 03. RELACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OBRA

RETROEXCAVADORA	
MOTOBOMBAS	Veintiún días
HERRAMIENTAS MENORES	

ANEXO No. 04. RELACIÒN DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÌA

Se anexa plantilla de pagos de la seguridad social

	NOMINA	MES Y AÑO DE LA NOMINA: 01 al 30 de abril 2023			
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	1 (Día)	mayo (Mes)	2023 (Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1036 de 2022

INTERVENTOR: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA

MES Y AÑO DE LA NOMINA: 01 al 30 de abril 2023

1097037121

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA PEREIRA MARSELLA K19+000 A L ALTURA DE LA VEREDA LA CEJA MUNICIPIO MARSELLA DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CON OCASIÓN DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA MEDIANTE DECRETO 1041 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2020. CONVENIO 1120 DE 2021 INVIAS - DEPARTAMENTO DE RISARALDA

"INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON PERSONA JURÍDICA DE DERECHO SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL ESTADIO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA".

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	DEDICACIÓN	DIAS / COTIZADOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. DEDUCCIONES		TOTAL DEVENGADO	OBSERVACIONES
								EPS	PENSIÓN		
1	MILAGROS CAMARGO AREVALO	32,655,052	Residente de Interventoría	$ 4,300,000.00	100%	30	$ 4,300,000.00	$ 172,000	$ 172,000	$ 3,956,000	
2	ANDERSON RAMIRO TEHERAN ZAPATA	71.352.255	Profesional Ambiental	$ 1,160,000.00	100%	30	$ 1,160,000.00	$ 46,400	$ 46,400	$ 1,067,200	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES							$ 5,460,000.00	$ 218,400.00	$ 218,400.00	$ 5,023,200.00	

Firma

Nombre: FABIAN ALFREDO HUGUETH MOLINA
Representante Legal de Interventoría

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8726352		HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	cl 3 9 24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4200035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2073152483	9450781684	E	2023/05/12	2023/05/10	BANCOLOMBIA	0	$1,690,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BARRANQUILLA (2 Afiliados)							$5,460,000	$873,600			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$218,400			$5,460,000		$380,100		$0	$0		$1,690,500
Centro de Trabajo: POSITIVA (2 Afiliados)							$5,460,000	$873,600			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$218,400			$5,460,000		$380,100		$0	$0		$1,690,500
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (2 Afiliados)							$5,460,000	$873,600			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$218,400			$5,460,000		$380,100		$0	$0		$1,690,500
1	CC	32655052	CAMARGO AREVALO MILAGRO DEL CARMEN		25-14	30	$4,300,000	$688,000	EPS010	30	$4,300,000	$172,000	CCF07	30	$4,300,000	$172,000	14-23	30	$4,300,000	6.960%	$299,300	30	$0	$0	Si	$1,331,300
2	CC	71352255	TEHERAN ZAPATA ANDERSON RAMIRO		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF07	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(2)**						$5,460,000	$873,600			$5,460,000	$218,400			$5,460,000	$218,400			$5,460,000		$380,100		$0	$0		$1,690,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 8726352		HUGUETH MOLINA FABIAN ALFREDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BARRANQUILLA	cl 3 9 24	BARRANQUILLA-ATLANTICO	4200035	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2073152483	9450781684	E	2023/05/12	2023/05/10	BANCOLOMBIA	0	$1,690,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$873,600	$0	$0	$873,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$688,000	$0	$0	$688,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$380,100	$0	$0	$380,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$380,100	$0	$0	$380,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$218,400	$0	$0	$218,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	2	$218,400	$0	$0	$218,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$218,400	$0	$0	$218,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$172,000	$0	$0	$172,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				2	$1,690,500	$0	$0	$1,690,500

ANEXO 05. REGISTRO FOTOGRÀFICO

RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE ACUEDUCTO

Instalación Tubería de 20	
	
Durante el presente período se instaló la tubería de 20 pulgadas desde la Cámara de inspección – MH No. 11 al 12, en una longitud de 75,40 ml.	
Unión termofusiòn tubería PE 100 PN-10 de 200 mm	
	
Serealizaron las uniones de la tuberia PE 100 PN-10 de 200mm con termofusiòn, al igual que los accesorios.	
Conformación de la vía de acceso	





Se conformó la vía de acceso, dando continuidad a la vía y mejorando el paisajismo al sector.

Terminación a la construcción de las Cámaras de Inspección





Se dejaron totalmente terminados las cámaras de inspección, realizando las cañuelas, colocando los conos de reducción y las tapas de cierre.
