BOGOTÁ	**ALCALDIA DE BOGOTA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANGATIVA** **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022**	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO VERSION FECHA 5 4 PAGINA: DE: 1 5

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORIA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INCOL-ALEPH	INTERVENTOR:	GEODINAMICA S.A.
CONTRATO No:	402-2022	CONTRATO No:	496-2022
VALOR INICIAL:	$ 2.272.158.031,00	VALOR INICIAL:	$ 272.694.419,00
VALOR ADICIONAL:	NR	VALOR ADICIONAL:	N.R.
VALOR ACTUALIZADO:	$ 2.272.158.031,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 272.694.419,00
FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022	FECHA DE INICIO:	jueves, 15 de diciembre de 2022
FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023	FECHA TERMINACION:	lunes, 14 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL:	8 MESES	PLAZO INICIAL:	8 MESES
PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:		PLAZO ESTUDIOS Y DISEÑOS:	
PLAZO CONSTRUCCION:		PLAZO CONSTRUCCION:	
PLAZO ADICIONAL:	NR	PLAZO ADICIONAL:	NR
PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES	PLAZO ACTUALIZADO:	8 MESES

2. INFORME AVANCE (PROGRAMADO / EJECUTADO)

SEMANA No 16 DEL jueves, 30 de marzo de 2023 AL miércoles, 5 de abril de 2023

PLAZO TRANSCURRIDO DESDE ACTA DE INICIO 112 DIAS PLAZO FALTANTE EJECUCION CONTRATO 130 DIAS


PLAZO TRANSCURRIDO OTRO SÍ PLAZO FALTANTE EJECUCION OTRO SÍ CONTRATO

De acuerdo con el cronograma preliminar presentado por el Consultor, a la fecha de corte del presente informe se tiene un porcentaje de avance del 10,44%, pero el Consultor debería tener ejecutado un 34%, lo cual representa un atraso del 23,56%.

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico programado	3	34
Porcentaje de avance financiero programado	0	0
Valor de avance financiero programado	0	0

	SEMANAL	ACUMULADO
Porcentaje de avance físico ejecutado	0,06	10,44
Porcentaje de avance financiero ejecutado	0	0
Valor de avance financiero ejecutado	0	0

GRAFICO DE AVANCE FISICO PROGRAMADO vs EJECUTADO

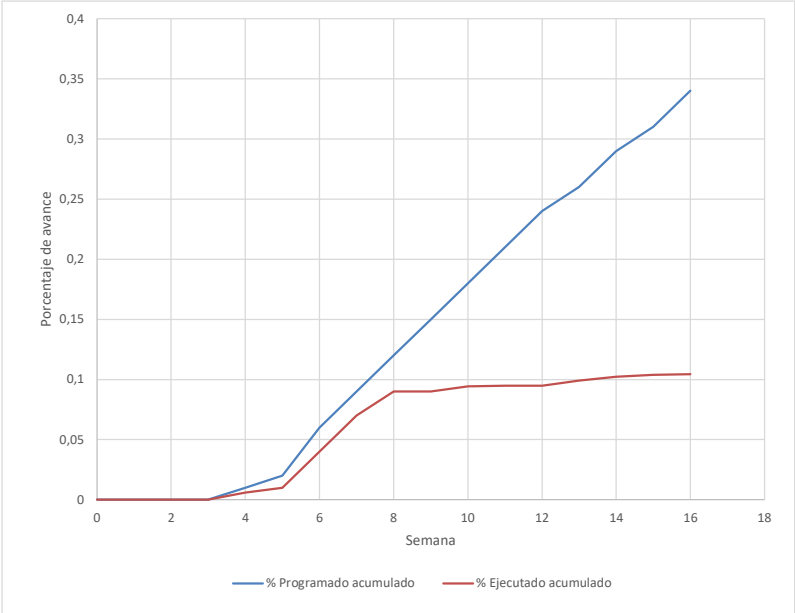

Los segmentos viales que constituyen el paquete N°1 que corresponden al 30% del total de los 140 contractuales, son los que se muestran en el siguiente cuadro.

BOGOTÁ	**ALCALDIA DE BOGOTA** **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA** **GEODINAMICA INGENIERIA S.A.** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA** **CONTRATO DE INTERVENTORIA No 496-2022**	Alcaldía Local de Engativá	CODIGO VERSION FECHA 5 4 PAGINA: 2 DE: 5

No	CIV	EJE	DESDE	HASTA	BARRIO	UPZ	AREA CALZADA (M2)	KM/CARRIL
1	10000499	CALLE 66	CARRERA 126	CARRERA 127	EL GACO	74 - ENGATIVA	274,98	0,09
2	10000541	CALLE 67	CARRERA 124A	CARRERA 125	EL GACO	74 - ENGATIVA	201,2	0,07
3	10000583	CALLE 67	CARRERA 124	CARRERA 124A	EL GACO	74 - ENGATIVA	132,6	0,04
4	10000609	CALLE 66	CARRERA 125	CARRERA 126	EL GACO	74 - ENGATIVA	471,0	0,16
5	10000623	CALLE 67	CARRERA 123B	CARRERA 124	EL GACO	74 - ENGATIVA	114,9	0,04
6	10000676	CALLE 67	CARRERA 123A	CARRERA 123B	EL GACO	74 - ENGATIVA	113,6	0,04
7	10000725	CALLE 67	CARRERA 123	CARRERA 123A	EL GACO	74 - ENGATIVA	112,1	0,04
8	10000792	CALLE 67	CARRERA 122ABIS	CARRERA 123	EL GACO	74 - ENGATIVA	111,6	0,04
9	10001981	CALLE 63K	CARRERA 119A	CARRERA 119B	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	143,0	0,05
10	10002047	CALLE 63K	CARRERA 119	CARRERA 119A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	131,2	0,04
11	10002068	CARRERA 120B	CALLE 63B	CALLE 63C	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	237,5	0,08
12	10002252	CALLE 63K	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	290,2	0,10
13	10002294	CARRERA 119	CALLE 63G	CALLE 63H	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	146,8	0,05
14	10002344	CALLE 63K	CARRERA 117A	CARRERA 118A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	154,5	0,05
15	10002403	CALLE 63D	CARRERA 119	CARRERA 119A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	100,1	0,03
16	10002432	CALLE 63K	CARRERA 117	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	157,1	0,05
17	10002476	CALLE 63G	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	228,8	0,08
18	10002480	CARRERA 119A	CALLE 63B	CALLE 63D	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	411,8	0,14
19	10002547	CALLE 63F	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	314,6	0,10
20	10002591	CALLE 64A	RANSVERSAL 113	CARRERA 116C	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	413,7	0,14
21	10002609	CALLE 63D	CARRERA 118A	CARRERA 119	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	235,3	0,08
22	10002679	CALLE 63D	CARRERA 118A	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	91,5	0,03
23	10002751	CALLE 63D	CARRERA 117	CARRERA 117A	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	87,0	0,03
24	10002764	CALLE 63F	CARRERA 115	CARRERA 117	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	184,6	0,06
25	10002858	CALLE 63F	CARRERA 114	CARRERA 115	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	145,9	0,05
26	10002938	CALLE 63F	CARRERA 114	CARRERA 113F	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	161,4	0,05
27	10003009	CALLE 63F	CARRERA 113D	CARRERA 113F	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	175,6	0,06
28	10003094	CALLE 63F	CARRERA 113C	CARRERA 113D	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	183,5	0,06
29	10003258	CALLE 63F	CARRERA 113B	CARRERA 113C	SABANAS DEL DORADO	74 - ENGATIVA	406,5	0,14
30	10010476	CARRERA 120BIS	CALLE 64B	S.E	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	37,8	0,01
31	10010477	CARRERA 120BIS	CALLE 64B	CALLE 64C	ENGATIVA ZONA URBANA	74 - ENGATIVA	62,2	0,02
32	10001359	CL 76	KR 110CBIS	KR 111	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	147,6	0,05
33	10001437	CL 76	KR 110C	KR 110CBIS	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	144,9	0,05
34	10001502	CL 76	KR 110B	KR 110C	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	132,2	0,04
35	10001639	CL 76	KR 110	KR 110B	GARCES NAVAS SUR	73 - GARCES NAVAS	204,7	0,07
36	10001843	CARRERA 109	CALLE 75F	CALLE 76	GARCES NAVAS	73 - GARCES NAVAS	165,4	0,06
37	10002222	CALLE 73	CARRERA 109A	CARRERA 110	VILLA AMALIA	73 - GARCES NAVAS	219,9	0,07
38	10002483	CALLE 73	CARRERA 108	CARRERA 108A	VILLA AMALIA	73 - GARCES NAVAS	225,3	0,08
39	10003636	CALLE 70C	CARRERA 110	CARRERA 110A	BOLIVIA	73 - GARCES NAVAS	277,3	0,09
40	10004479	CARRERA 99	CALLE 73	CALLE 74A	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	552,0	0,18
41	10004687	CARRERA 100	VENIDA CALLE 72	CALLE 73	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	749,5	0,25
42	10005043	CARRERA 99C	DIAGONAL 72	AVENIDA CALLE 72	EL CEDRO	73 - GARCES NAVAS	868,1	0,29

OBJETO DE CONTRATO:

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA".

Las actividades de Topografía al primero de Marzo de 2023 se resumen en el siguiente cuadro:

Avance actividades topografia al 23 de marzo de 2023

	CIV	GPS	POLIGONAL		AJUSTE		AJUSTE NIVELACION		INSPECCION POZOS		LEVANTAMIENTO	
			SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1	10002764	X	X		X		X		X		X	
2	10002858	X	X		X		X		X		X	
3	10002938	X	X		X		X		X		X	
4	10003009	X	X		X		X		X		X	
5	10003094	X	X		X		X		X		X	
6	10003258	X	X		X		X		X		X	
7	10002403	X	X		X		X		X		X	
8	10002480	X	X		X		X		X		X	
9	10002068	X	X		X		X		X		X	
10	10002609	X	X		X		X		X		X	
11	10002432	X	X		X		X		X		X	
12	10002344	x	x		x		x		x		x	
13	10002252	x	x		x		x		x		x	
14	10002047	x	x		x		x		x		x	
15	10001981	x	x		x		x		x		x	
16	10002294	x	x		x		x		x		x	
17	10002476	x	x		x		x		x		x	
18	10002547	x	x		x		x		x		x	
19	10002751	x	x		x		x		x		x	
20	10002679	x	x		x		x		x		x	
21	10002591	x	x		x		x		x		x	
22	10010477	x	x		x		x		x		x	
23	10010476	x	x		x		x		x		x	
24	10000609	x	x		x		x		x		x	
25	10000499	x	x		x		x		x		x	
26	10000541	x	x		x			x	x		x	
27	10000583	x	x		x			x	x		x	
28	10000623	x	x		x			x	x		x	
29	10000676	x	x		x			x	x		x	
30	10000725	x	x		x			x	x		x	
31	10000792	x	x		x			x	x		x	
32		x	x		x			x		x	x	
33	10003636	x	x		x			x		x	x	
34	10002222	x	x		x			x		x	x	
35	10011775	x	x		x			x		x	x	
36	10002483	x	x		x			x		x	x	
37	10001639	x	x		x			x		x	x	
38	10001502	x	x		x			x		x	x	
39	10001437	x	x		x			x		x	x	
40	10001359	x	x		x			x		x	x	
41	10011067	x		x	x			x		x	x	
42	10001843	x		x	x			x		x	x	
43	10004479	x		x	x			x		x	x	
44	10004687	x	x		x			x		x	x	
45	10005043	x	x		x			x		x	x	
46	10005129	x	x		x			x		x	x	
47	10005190	x	x		x			x		x	x	
48	10005140	x	x		x			x		x	x	
49	10005280	x	x		x			x		x	x	
50	10004916	x	x		x			x		x	x	
51	10005558	x	x		x			x		x	x	
52	10005374	x		x		x		x		x	x	
53	10004903	x		x		x		x		x	x	

Nota: A la fecha febrero 22-2023 se encuentran materializados y calculados los puntos GPS del 1 al 32

3. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Mediante el oficio 56-23-GDING-PROY187, la Interventoría envió al IDU solicitud del información de ciertos CIVs que aparecen sin información de reserva en la plataforma.
2. Mediante el oficio 57-23-GDING-PROY187, la Interventoría contesta el oficio enviado el 30 de abril del 2023, por un posible incumplimiento por parte de la consultoría.
3. Por medio del oficio 0098-23 la consultoría envía las hojas de vida de Yury Cely Pardo y Cindy Paola Guevara para su revisión y aprobación
4. Por medio de un correo electrónico se recibió la metodología de tránsito para su respectiva revisión
5. Mediate el oficio 0099-23 la consultoría remite el cronograma V 1,2 para su revisión.
6. Mediante el oficio 0101-23 la consultoría remite la remisión del informe RAI de urbanismo para la revisión por parte de nuestros especialistas.
7. Por medio del oficio 0098-23 la consultoría remite la metodología de urbanismo para su revisión.
8. El 31/03/2023 la alcandía de Engativá remite instrucciones para llevar los documentos en físico.
9. El 31/03/2023 la alcandía de Engativá remite una solicitud de información del CIV 10003973,
10. El 03/04-2023 la consultoría remite el oficio 104-23 para la revisión del estado actual de los siguientes CIVs CIV 10000332, 10000353, 10000354.
11. La consultoría por medio del oficio 105-23 da respuesta al posible incumplimiento que presenta el contrato.

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENTE SEMANA

1. 10 de abril quedo pendiente por parte de la consultoria enviar GPPS las carteras de topografias y SKL
2. L a consultoria quedo por enviar los diasnosticos.
3. la exploracion del subsuelo quedo de iniciar el lunes 10 de abril.
4.

5. RESUMEN GENERAL ESTADO DEL CONTRATO

- A la fecha del presente informe el Consultor continúa con el levantamiento topográfico de los segmentos viales e inició el procesamiento de datos. El avance a la fecha de corte es del 10,44%, presentando un atraso del 23,56% con respecto a las actividades programadas. Si se tiene en cuenta el avance solicitado en el anexo técnico, el cual es del 30%, a la fecha de corte del presente informe, el Consultor presenta un atraso del 19,56%.

COORDINADOR DE INTERVENTORIA		EFRAIN ARAUJO	
