ALCALDÍA MUNICIPAL DE FIRAVITOBA – BOYACÁ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS E INFRAESTRUCTURA



INFORME

CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ)

FECHA: MARZO 2023


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ)
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO 2023

1. GENERALIDADES DEL CONVENIO/CONTRATOS

<table>
<tr><td>Objeto:</td><td colspan="4">“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ”.</td></tr>
<tr><td>UBICACIÓN DEL PROYECTO:
(si es urbano: Dirección exacta y barrios, si es rural: vereda y breve descripción para llegar)</td><td colspan="4">- Dirección actual de la nomenclatura y localización: Vereda Tintal
- Coordenadas geográficas:

<table>
<tr><th colspan="4">COORDENADAS POLIGONAS 30*40 PREDIO LAS SAUZAS</th></tr>
<tr><th>V</th><th>PUNTO</th><th>NORTE</th><th>ESTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>P1</td><td>1.119.626.700</td><td>1.120.929.852</td></tr>
<tr><td>2</td><td>P2</td><td>1.119.649.096</td><td>1.120.962.995</td></tr>
<tr><td>3</td><td>P3</td><td>1.119.608.367</td><td>1.120.953.599</td></tr>
<tr><td>4</td><td>P4</td><td>1.119.630.823</td><td>1.120.986.788</td></tr>
</table>

- Número de Matrícula Inmobiliaria: 095-94087
- No. Catastral: 15272000000130334000
- Propietario actual: Municipio de Firavitoba

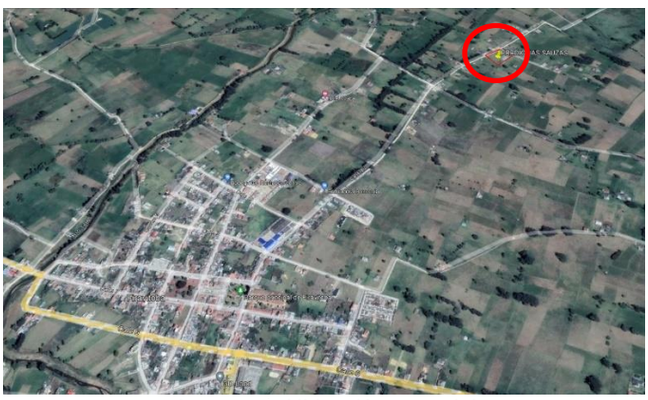
Imagen 1. Ubicación espacial</td></tr>
<tr><td rowspan="4">VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO</td><td colspan="2">VALOR TOTAL CONVENIO</td><td colspan="2">$1.470.717.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">APORTES MIN – INTERIOR</td><td colspan="2">$1.470.717.000</td></tr>
<tr><td colspan="2">APORTES DEL MUNICIPIO</td><td colspan="2">$0,00</td></tr>
<tr><td colspan="2">OTROS APORTES</td><td colspan="2">$0,00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SUPERVISORES ANTERIORES</td><td>NOMBRE</td><td>DESDE</td><td colspan="2">HASTA</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td rowspan="2">APOYO A LA SUPERVISIÓN</td><td>NOMBRE</td><td>DESDE</td><td colspan="2">HASTA</td></tr>
<tr><td>N/A</td><td>N/A</td><td colspan="2">N/A</td></tr>
<tr><td>REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL</td><td colspan="4">-</td></tr>
<tr><td>FECHA DE APROBACIÓN DE POLIZA INICIAL</td><td colspan="4">28 de diciembre de 2022</td></tr>
</table>

FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO	27 de diciembre de 2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCION DEL CONVENIO	28 de diciembre de 2022	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
	N/A	FECHA: DD/MM/AAAA
POLIZA SEGÚN ACTUACION (Vigencia nueva del amparo)	-	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRA	$1.323.645.000	
VALOR DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$147.072.000	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

Convenio interadministrativo (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	al suscribir y/o legalizar el acta de inicio del convenio	acta de inicio	28 de diciembre de 2022	$588.286.800
SEGUNDO DESEMBOLSO	La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de la obra	30%	-	$367.679.250
TERCER DESEMBOLSO	La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra	70%	-	$367.679.250
CUARTO DESEMBOLSO	La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra	100%	-	$147.071.700)
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$588.286.800**

3. POLIZA CONVENIO

NOMBRE ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
600-47-994000066915 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO	$ 294.143.400	27/12/2022	21/01/2024

4. INFORMACION CONTRATACION DERIVADA

El Municipio cumpliendo con el numeral 11 de la cláusula segunda del presente convenio adelanta la gestión administrativa, contractual y financiera para realizar la contratación de obra e interventoría.

Detalle del Proceso Número: MF-LP-001-2023 – Bajo la modalidad llave en mano.

Proceso de licitación pública No. MF-LP-001-2023 cuyo objeto es: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
MF-LP-001-2023 – Bajo la modalidad llave en mano.	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	$1.323.645.000
Estado	Convocado	
PUBLICACION PROCESO	31 de enero 2023	
LINK PROCESO		
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-1-227808&g-recaptcha-response=03AKH6MREF-XgA6p8JZsjsjW43R8mLcL_MpktuMYZjw8ISbltd0ELVxj8056V1FBchVHmPAZZZRGCNx2N99c266TRD4lyXgrrzBkw1xJ4XBjLrJ6LI6SIj4zoGiltNJq6bRNFlDtaegoQ_dlmftbgNuqesHFoWSEtXvzTGDl-HYX8Rxpneo-F-0g6GE9wOBZaH-s_8xnmTFdKA_smM0nxWASA389xfPgH8LodGTcr3l5B0q7AgakifoBgeRj_03HHrP2cdPphdf_ultI4Y1AEnGK35uf2vVIstUR32pcpDrqqRyf7g6oR0prwrgbNq9E-g0UnLL7ToyrSvimsGQ77wtUg5GZ3J8Cc1s7FJ_Qy83nbzZCGHv_a8hc99UzVMWkuHSDMXv7UAg0X3eddC94TOgeLjLGVH1z-LwjzmV77P3MKsif9H9NJ8dmAlbzvOZlYUen47etVUoYdHJYEZ1FWc3jhphpiF5qTvpsE1ciVnF0-6XwicC0QeKbeJTMfZucv6SnbmlOBmGkgrpdlnZVpPOun_GQIMCV96M0yiwC9OsAjg10Cd0xtbWtU		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	UNION TEMPORAL COBING FIRA	
Fecha del contrato	27/03/2023	
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA	
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA
Fecha de terminación del Contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		-
POLIZA No.		-
FECHA DE LA POLIZA		-

DETALLE DEL PROCESO NÚMERO: MFCM-001-2023

Proceso de concurso de méritos abierto No. MF-CM-001-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**	**VALOR**
Concurso de méritos abierto No. MF-CM-001-2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	$ 147.072.000
Estado	Convocado	
PUBLICACION PROCESO	13 de febrero 2023	
LINK PROCESO		
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=23-15-13510051&g-recaptcha-response=03AKH6MRFp4KtkmtFLtkoiW5XRpQMgbSsv1wwCma3B2AwEdn05xEgrk1udfOAd9GuZ6X4ciN1jihZPDkFLzEzFfivK31Kf0YXcmBROT35ygRJbqW2hRMOF0mcozJKaXsrzlqov-Vo0zNgWbZyIwf6lsSSa4kfiWxQy9o5AFFgc7Nxad2vmEHr0o7V8qLXdrTJtVgyGU4XzNlb8SMYdvMbd3jqfeylrsmzSc6Q1kQiFljvmAI4TykRRv--C1UfIE-JUWoTPaAJ6uKKxn0uVrzaIPGFAGzLT-94TRZBH2M2RAuU1NOWhQyrsI8I6RdDNYeFz4zuFR4AWzitMACea-F9KLgSynGm4WIMWoiEDoTDMU27HpjSASKxJUehtQaonopVknOUCa5FFiywqQtWWvYYXRfQWNONu0IaME1iFhIbNZ_i2tPo0_ej7hq8uHvdmY4vEFgvUIA_MzvfwYJvW4nktU7gwDtJZo0S0cZ6YpV5JdZ1Be9FzocH5JRyZxEBuE-kyN9NJGbHG2uIG7U1T_gQvpDKQKcSU7qEKDayOEaQV7Izh9smQtBg4iRM		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista		
Fecha del contrato	29/03/2023	
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA	
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRORROGA	DD/MM/AAAA
	SUSPENSION	DD/MM/AAAA
	REINICIO	DD/MM/AAAA
Fecha de terminación del Contrato	DD/MM/AAAA	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA		-
POLIZA No.		-
FECHA DE LA POLIZA		-

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE INFORMES DEL MUNICIPIO:	DICIMEBRE 2022 – informe No.1 - Diciembre
	ENERO 2023 – informe No.2 - Enero
	FEBRERO 2023 – informe No.3 - Febrero
	MARZO 2023 – informe No.4 - Marzo
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	**FECHA:** -

INFORME FINANCIERO		
ITEM	**FECHA**	**VALOR**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	28/02/2023	$ 588.858.097,95

Se adjunta como soporte certificación de saldos y rendimientos.

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO											
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:						PORCENTAJE (%)					
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA						0,0%					
% EJECUTADO DE OBRA						0,0%					
% EJECUCION CONVENIO						42,86 %					
% AVANCE DE OBRA	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**
	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
% AVANCE DE CONVENIO	**M1**	**M2**	**M3**	**M4**	**M5**	**M6**	**M7**	**M8**	**M9**	**M10**	**M11**
	14,29%	28,57%	42,86%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

7. INFORME DE ACTIVIDADES

Que en el marco del Convenio Interadministrativo No. CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ), cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ", me permito informar lo siguiente:

Qué Se celebró No. CONVENIO 2315 – 2022 - SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVENIENCIA CIUDADANA – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA (BOYACÁ) el día 27 de diciembre 2022.

Que el día 28 de diciembre 2022 se realizó la respectiva aprobación de pólizas y firma de acta de inicio del convenio No. CONVENIO 2315 – 2022.

PROCESO NÚMERO: MF-LP-001-2023

Que el día 31 de enero 2023 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I, el Proceso Número: MF-LP-001-2023, Bajo la modalidad llave en mano cuyo objeto es: ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, con cada uno de los respectivos soportes, anexos y formatos según pliego tipo, para lo cual se adjunta a la presente el cronograma del proceso precontractual.

Junto con el respectivo aviso a convocatoria.

Que el día 17 de febrero la entidad se realizó la adenda No.002 debido a que se presentaron inconvenientes presupuestales para la apropiación de los recursos razón por la cual el cronograma de los procesos debió extenderse con la finalidad de poder disponer de los recursos siendo estos necesarios para realizar la apertura de los procesos de obra e interventoría.

Que el día 24 de febrero se realiza la apertura del proceso MF-LP-001-2023 mediante resolución No. 049 y la respectiva publicación del respectivo pliego definitivo de condiciones.

Que el día 27 de febrero se llevó acabo la respectiva audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación de riesgos previsibles.

El día 07 de marzo de 2023 según cronograma del proceso se realiza el respectivo cierre del proceso teniendo como conclusión la presentación de un único oferente.

El día 14 de marzo se realiza la respectiva evaluación de criterios jurídicos, técnicos, financieros, organizacionales y de capacidad residual, obteniendo como resultado un oferente Hábil.

El día 22 de marzo se emite el informe de evaluación final y orden de elegibilidad dando como resultado y recomendación de adjudicación al oferente UNION TEMPORAL COBING FIRA.

El día 22 de marzo se emite resolución de adjudicación No. 084 del contrato de obra publica No. MF-LP-001-2023.

El día 27 de marzo 2023 se firma contrato de obra publica No. MF-LP-001-2023.

PROCESO NÚMERO: MFCM-001-2023

Que el día 13 de febrero 2023 se publicó en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP I, el Proceso Número: MFCM-001-2023 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA “ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. con cada uno de los respectivos soportes, anexos y formatos, para lo cual se adjunta a la presente el cronograma del proceso precontractual.

Junto con el respectivo aviso a convocatoria.

Que el día 06 de marzo se realiza la apertura del proceso MF-CM-001-2023 mediante resolución No. 064 y la respectiva publicación del respectivo pliego definitivo de condiciones.

El día 10 de marzo de 2023 según cronograma del proceso se realiza el respectivo cierre del proceso teniendo como conclusión la presentación de un único oferente.

El día 15 de marzo se realiza la respectiva evaluación de criterios jurídicos, técnicos, financieros y organizacionales, obteniendo como resultado un oferente Hábil.

El día 25 de marzo se emite el informe de evaluación final y orden de elegibilidad dando como resultado y recomendación de adjudicación al oferente INTEROBRAS SC S.A.S.

El día 27 de marzo se emite resolución de adjudicación No. 105 del contrato consultoría No. MFCM-001-2023.

El día 29 de marzo 2023 se firma contrato consultoría No. MFCM-001-2023.

8. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

9. REGISTRO FOTOGRAFICO

PROCESO NÚMERO: MF-LP-001-2023

Detalle del Proceso Número: MF-LP-001-2023

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FIRAVITOBA

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Licitación Pública
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	No
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
Familia	[7210] Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
Clase	[721015] Servicios de apoyo para la construcción
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Cuantía a Contratar	$ 1,323,645,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Obra
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación

Fuente	Otro Recurso	Valor
Presupuesto General de la Nación – PGN		$1,323,645,000

Códigos BPIN

Código	Año
2021152720003	2023

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	20230110	$ 1,323,645,000

Ubicación Geográfica del Proceso

Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION	PDF	680 KB	1	23-03-2023 04:04 PM
Acta de la audiencia de adjudicación	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN	PDF	1.42 MB	1	23-03-2023 03:56 PM
Documento Adicional	CONSOLIDADO INFORME FINAL	PDF	142 KB	1	23-03-2023 03:56 PM
Documento Adicional	INFORME FINAL DE FACTORES DE PONDERACION	PDF	214 KB	1	23-03-2023 03:56 PM
Informe de evaluación	INFORME DE EVALUACION	PDF	560 KB	1	14-03-2023 06:06 PM
Adendas	ADENDA 3	PDF	169 KB	1	10-03-2023 11:54 PM
Documento Adicional	PLANILLA DE RECEPCION DE OFERTAS	PDF	408 KB	1	07-03-2023 12:25 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE	PDF	157 KB	1	07-03-2023 11:03 AM

CRONOGRAMA DEL PROCESO NÚMERO: MF-LP-001-2023

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Publicación de los estudios y documentos previos	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	agotado	SECOP I; Contratacion.mfiravitoba@gmail.com, en la calle calle 7 #4-35, segundo piso oficina de contratación Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación MF-LP-001-2023.
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i http://www.firavitoba-boyaca.gov.co/
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NA	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Publicación del Pliego de Condiciones	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Audiencia de asignación de Riesgos	agotado	**De manera virtual en el link que oportunamente se comunicará a los interesados**
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	agotado	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Plazo máximo para la expedición de Adendas	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Fecha de cierre	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	agotado	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	14 de marzo 2023	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo	14 marzo hasta 16 de marzo 2023 a las 5:00 pm	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

para presentación de subsanaciones)		
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	19 de marzo 2023	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	22 de marzo 2023	Firavitoba, en la calle calle 7 #4-35, segundo piso oficina de contratación
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	22 de marzo 2023	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Firma del Contrato	23 de marzo 2023	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Tres (03) días hábiles siguientes	Firavitoba, en la calle calle 7 #4-35, segundo piso oficina de contratación
Aprobación de Garantías	Dia siguiente	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

PROCESO No. MFCM-001-2023

Detalle del Proceso Número: MFCM-001-2023

BOYACÁ - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FIRAVITOBA

Información General del Proceso	
Tipo de Proceso	Concurso de Méritos Abierto
Estado del Proceso	Adjudicado
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Documentos tipo	No
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Grupo	[F] Servicios
Segmento	[80] Servicios de Gestion, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios Administrativos
Familia	[8010] Servicios de asesoría de gestión
Clase	[801016] Gerencia de proyectos
Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar	INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA "ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Cuantía a Contratar	$ 147,072,000
Moneda de Pago	Peso Colombiano
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios
Tipo de Gasto	Inversión

Fuentes de Financiación			
	Fuente	Otro Recurso	Valor
	Presupuesto General de la Nación – PGN		$147,072,000

Códigos BPIN		
	Código	Año
	2021152720003	2023

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso		
Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuantía del respaldo presupuestal
CDP	20230111	$ 147,072,000


Acto de Adjudicación	RESOLUCION DE ADJUDICACION		189 KB	1	28-03-2023 09:42 PM
Informe de evaluación	CONSOLIDADO DE INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION Y ESTABLECIMIENTO DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD		139 KB	1	25-03-2023 02:45 AM
Documento Adicional	ASIGNACIÓN DE PUNTAJES DEFINITIVO		156 KB	1	25-03-2023 02:45 AM
Documento Adicional	INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURIDICO		392 KB	1	15-03-2023 06:47 PM
Documento Adicional	ACTA DE CIERRE		403 KB	1	10-03-2023 11:56 PM
Documento Adicional	PLANILLA DE RECEPCION DE OFERTAS		445 KB	1	10-03-2023 11:56 PM
Pliegos de Condiciones definitivos	PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS		1.33 MB	1	06-03-2023 04:54 PM
Acto que ordena Apertura del Proceso	RESOLUCION DE APERTURA		219 KB	1	06-03-2023 04:54 PM

CRONOGRAMA DE PROCESO No. MFCM-001-2023

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación de convocatoria publica	13 de febrero de 2023	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Publicación de los Estudios Previos y el Proyecto de Pliegos de Condiciones	13 de febrero de 2023	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Observaciones al proyecto pliego de condiciones	Desde el día 13 febrero al 20 de febrero de 2023, 5:00 pm	Oficina de Contratación - Instalaciones de la Alcaldía Municipal de Firavitoba/ contratacion.mfiravitoba@gmail.com
Plazo Para presenter solicitudes para limitar a MIPYMES	20 de febrero de 2023 hasta 5:00 pm	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Respuesta a observaciones	21 de febrero de 2023	En la página web, www.contratos.gov.co.
Posible fecha Acto de apertura del proceso y publicación de pliego de condiciones definitivo	22 de febrero de 2023	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Plazo máximo para expedir adendas al proceso	23 de febrero de 2023, a partir de las 5:00 pm	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Lugar y fecha límite para presentar ofertas	Desde la publicación hasta el día 27 de febrero de 2023 a las 8.00 am	Oficina de Contratación- Instalaciones de la Alcaldía
Cierre del proceso	el día 27 de febrero de 2023 a las 8.00 am	Oficina de Contratación- Instalaciones de la Alcaldía
Evaluación de requisitos habilitantes	Desde el día 27 al 28 de febrero de 2023	Comité evaluador
Solicitud aclaración de oferta por parte del comité evaluador	el día 01 de marzo 2023	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Publicación de informe de evaluación	2 de marzo de 2023	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co

Traslado y Plazo para entregar documentos faltantes y subsanables y traslado para presentar observaciones a la evaluación	Desde el 3 al 7 de marzo de 2023 hasta las 5:00 pm	Oficina de Contratación- Instalaciones de la Alcaldía
Respuesta de observaciones a informe de evaluación	El día 8 de marzo de 2023 hasta las 3:00 pm	Página del Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co.
Acto administrativo por medio el cual se adjudica el contrato	El día 9 de marzo de 2023	Oficina de Contratación - Instalaciones de la Alcaldía
Suscripción de contrato	Tres (03) días siguiente al acto administrativo de adjudicación	Oficina de Contratación - Instalaciones de la Alcaldía

10. CRONOGRAMA CONVENIO

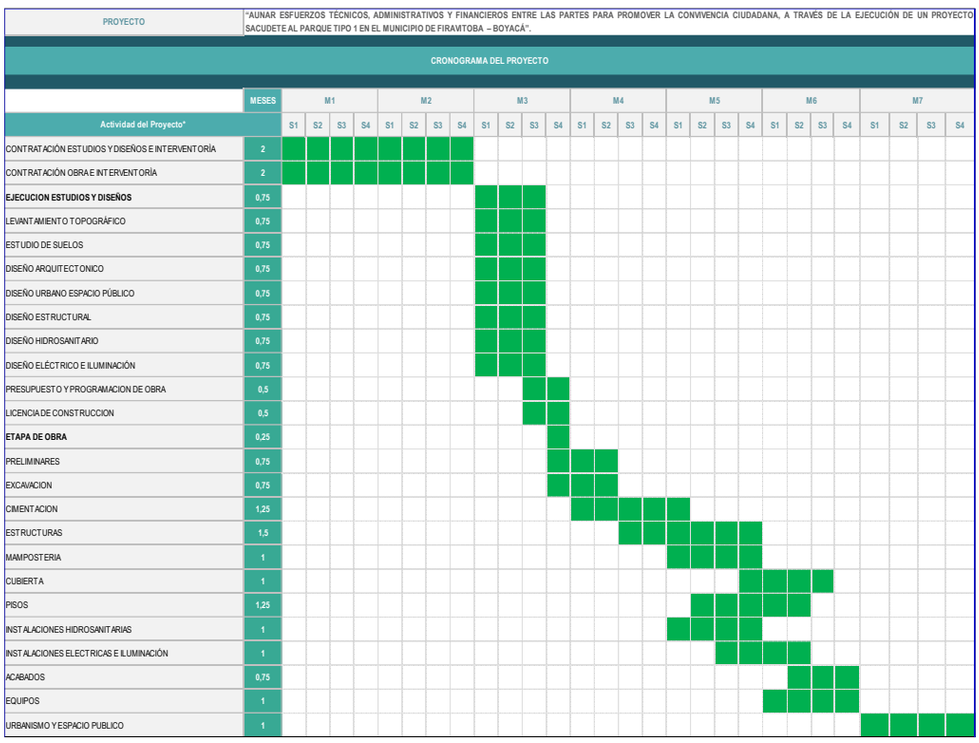

ANGELICA MARIA GONZALEZ CAMARGO
SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

Bancolombia

Sogamoso, 25 de febrero de 2022

Señores
A QUIEN INTERESE.
Ciudad

Cordial saludo


BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el **MUNICIPIO DE FIRAVITOBA** identificado con Nit. Número **891.856.288** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Denominación
CUENTA AHORROS	358-000031-98	2022/02/25	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE

El manejo de este (os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 7751780 de Sogamoso o en nuestra sucursal Sogamoso.

Atentamente,



Gerson David Alvarez Piragua
Asesor Móvil
Oficina Sogamoso
Tel. 311 638 2148

Grupo Bancolombia

*__Importante__: esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE FIRAVITOBA
NIT: 891856288

Número de Cuenta: 35800003198
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 31-03-2023 10:39:15
Fecha y Hora Consulta: 31-03-2023 10:39:15

Impreso por: 1055312451

Saldo Efectivo Actual: $588,858,097.95	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $588,858,097.95

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2023/02/28	ABONO INTERESES AHORROS	SOGAMOSO				225,274.42

RESOLUCIÓN Nº 084
(22 de marzo de 2023)

Por medio de la cual se adjudica la LICITACIÓN PÚBLICA No MF-LP-001-2023 cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA-BOYACA

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario 1082 de 2015 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 24, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, enuncia: "Los actos administrativos que se expidan en la actividad contractual o con ocasión de ella, salvo los de mero trámite, se motivarán en forma detallada y precisa e igualmente lo serán los informes de evaluación, el acto de adjudicación y la declaratoria de desierto del proceso de escogencia".

Que la secretaria de planeación, obras e infraestructura mediante Estudio Previo determinó la necesidad y la oportunidad de llevar a cabo el proceso de contratación LICITACION PÚBLICA No MF-LP-001-2023 cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**", por un valor de MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($1.323.645.000) M/CTE.

Que el día 31 de ENERO de 2023 se publicó estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, aviso público, aviso de convocatoria, anexo 1,2,3,4, anexo 2- cronograma, formato 1-14, formato 3- experiencia, formulario 1- formulario de presupuesto oficial- matriz 1- indicadores financieros y organizaciones, matriz 2 de riegos.

Que mediante resolución N°049 de fecha 24 de febrero de 2023 por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de licitación pública bajo la modalidad llave en mano No. **MF-LP-001-2023.**

Que en el PROCESO DE LICITACION PÚBLICA No **MF-LP-001-2023.** dentro de los términos establecidos en el cronograma de actividades, presento propuesta UNION TEMPORAL COBING FIRA, representado legalmente por JHOAN CAMILO SAENZ ROJAS identificado con cedula de ciudadania N° **7.182.662** de Tunja (Boyacá).

Que el proponente; UNION TEMPORAL COBING FIRA, cumplió con los requisitos habilitantes y una vez aplicados los criterios de calificación, por lo que la propuesta se encuentra favorable para el municipio de Firavitoba, por lo que el Comité Asesor y Evaluador, recomienda al ordenador del gasto una vez se encuentre en firme el informe de evaluación adelantar la audiencia pública de adjudicación, en favor del oferente citado.

Que el informe de evaluación cobró firmeza, por lo que en cumplimiento del cronograma del proceso contractual el día 22 de marzo de 2023 se celebró la audiencia pública de adjudicación, en cumplimiento del numeral 10

Powered by CamScanner

de la Ley 80 de 1993, en la cual el Comité Asesor y Evaluador concluyó que la oferta que cumple con los requisitos habilitantes y de calificación corresponde al proponente UNION TEMPORAL COBING FIRA, representado legalmente por JHOAN CAMILO SAENZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° **7.182.662** de Tunja(Boyacá), por lo tanto es la oferta más favorable en los aspectos técnicos, jurídicos, económicos y financieros para el municipio de Firavitoba.

Que por lo anterior se acoge la recomendación del comité y se procede a adjudicar el proceso de Licitación Pública MF-LP-001-2023 cuyo objeto es **"ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 DEL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, al proponente UNION TEMPORAL COBING FIRA, representado legalmente por JHOAN CAMILO SAENZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° **7.182.662** de Tunja- (Boyacá),

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso UNION TEMPORAL COBING FIRA, representado legalmente por JHOAN CAMILO SAENZ ROJAS identificado con cedula de ciudadanía N° **7.182.662** de Tunja (Boyacá), por un valor de **MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($1.323.542.600,00) M/CTE.**

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al proponente favorecido.

ARTICULO TERCERO: Publicar en la página www.colombiacompra.gov.co el contenido de la presente *Resolución*

ARTICULO CUARTO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno en sede administrativa, *conforme a lo señalado en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.*

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

PUBLÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Firavitoba, a los 22 días del mes de marzo de 2023.

EMILIANO ALFONSO CHAPARRO FONSECA
Alcalde Municipal de Firavitoba

Proyectó: Danna Puerto.
Asesor oficina de contratación

Powered by CamScanner
