INFORME MENSUAL 0 7

GRUPO No. 1

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022.”



MARZO 2023

Arq. EDGAR EDUARDO ROA CASTILLO

Director Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

b. Contrato de interventoría

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

c. Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.

d. Soluciones adoptadas

e. Recomendaciones pertinentes

f. De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.

g. Estado del tiempo mes de SEPTIEMBRE DE 2022

h. Reporte técnico general mensual

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.

i. Pólizas

4. ASPECTOS SOCIALES

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.

b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.

c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

1. ASPECTOS GENERALES

a. Contrato de obra

CLASE: CONTRATO DE OBRA

NÚMERO: CTO de obra 999-2022

CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**	
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ Nit: 900.372 .215-7	
REPRESENTANTE	JORGE HERNANDO PINZÓN CASTIBLANCO	
OBJETO CONTRACTUAL	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 – 2022."	
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 914 DEL 14 DE JULIO DE 2020	
DIRECCIÓN:	Calle 12ª 68C-03 Bogotá D.C.	
TELÉFONOS:	7430070 EXT 405-406-908	dirlicitaciones.familiamic@gmail.com; obracivil.gepm@gmail.com
SUPERVISOR	FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON	

Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	$ 1.602.000.000
Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	$ 5.202.000.000
Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prorroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	1 Mes
Plazo Actualizado	7,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/03/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	15/04/2023
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

b. Contrato de interventoría

CLASE: CONTRATO DE INTERVENTORÍA

NÚMERO: CTO # 1008 DE 2022

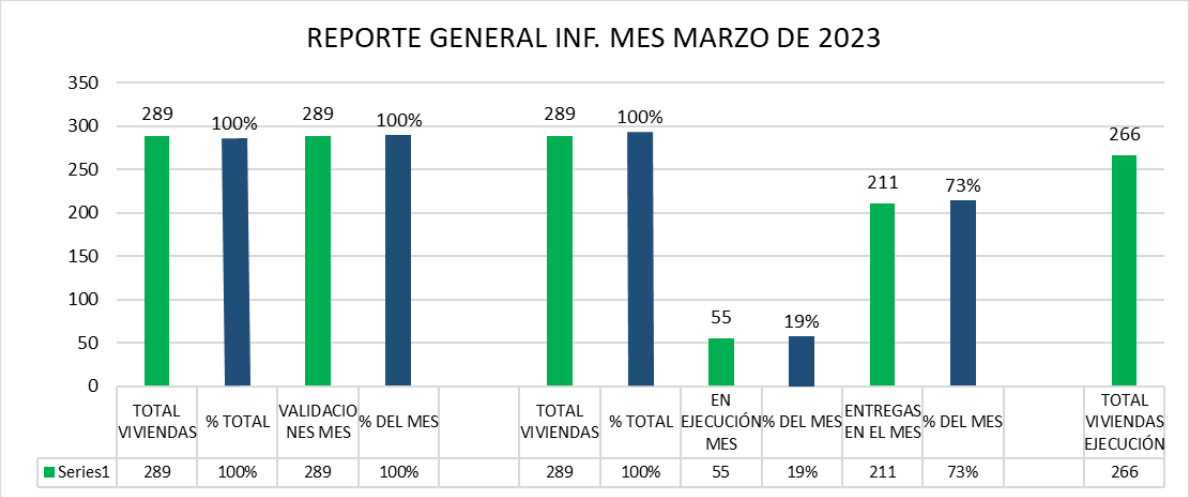
CONTRATANTE:	**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22
IDENTIFICACIÓN:	N.I.T.: 901,627224-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO ZAMUDIO
OBJETO CONTRACTUAL	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."
DIRECCIÓN:	Carrera 96A No. 130B - 11 Piso 4, Bogotá D.C
TELÉFONOS:	(601)9296772- 3208939583 consorciointervivienda22@gmail.com
SUPERVISOR	FRANCISCO JULIAN FORERO RINCON

Valor Inicial	$ 432.000.000,00
Valor Adicional 1	$ 192.240.000,00
Valor Adicional 2	N.A.
Valor Actualizado	$ 624.240.000,00
Plazo Inicial	5 Meses
Plazo Prórroga 1	2,5 Meses
Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	7,5 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 1	15/04/2023
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	15/04/2023

2. ASPECTOS TÉCNICO

a. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico, general

En el desarrollo de las actividades en el mes de MARZO DE 2023, se presentaron los siguientes indicadores que muestran el comportamiento en la validación y avance de obra, es importante indicar que así las viviendas se encuentren validada no indica que se encuentren en ejecución.



b. Descripción y porcentaje (%) de avance técnico por vivienda.

Para cada una de las viviendas, en el mes del presente informe se registran los siguientes indicadores en relación con las 266 viviendas en desarrollo, estos datos muestran el avance general.

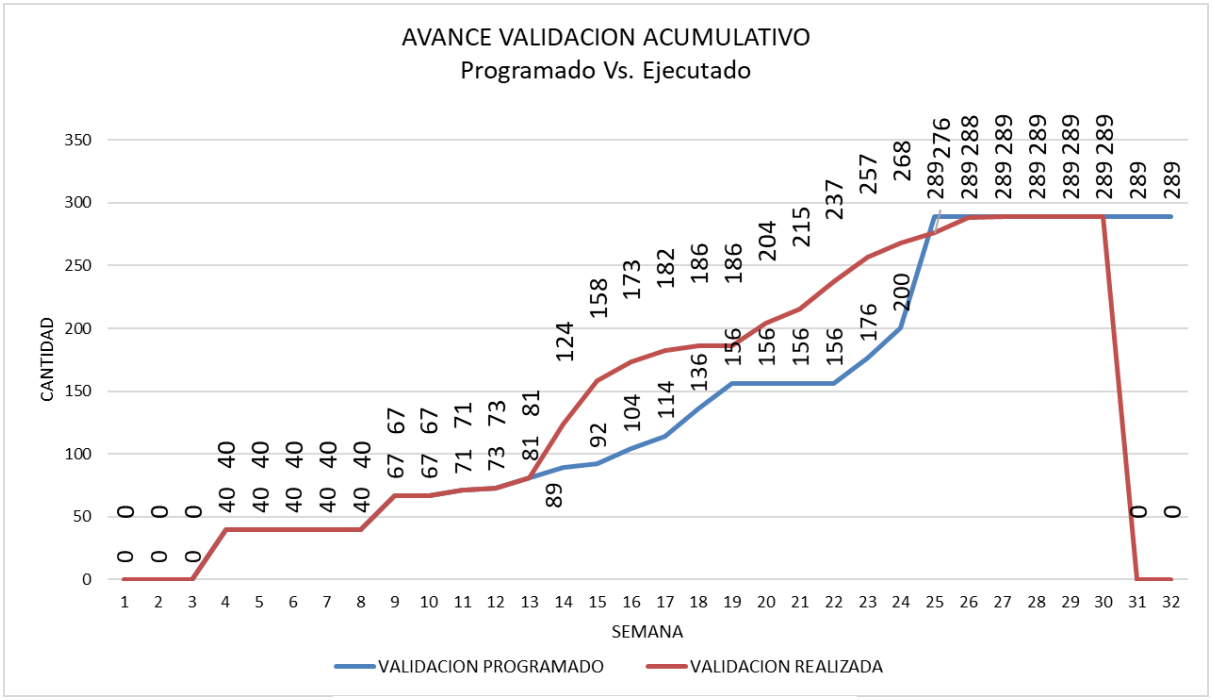
0%	23
1% AL 50%	31
51% AL 99%	24
100%	211
TOTAL VIVIENDAS	289

Programación de obra:

De acuerdo con ajuste en la reprogramación de obra generada por la prórroga 2 que fue expuesta por el contratista, para el presente informe se expone lo siguiente:

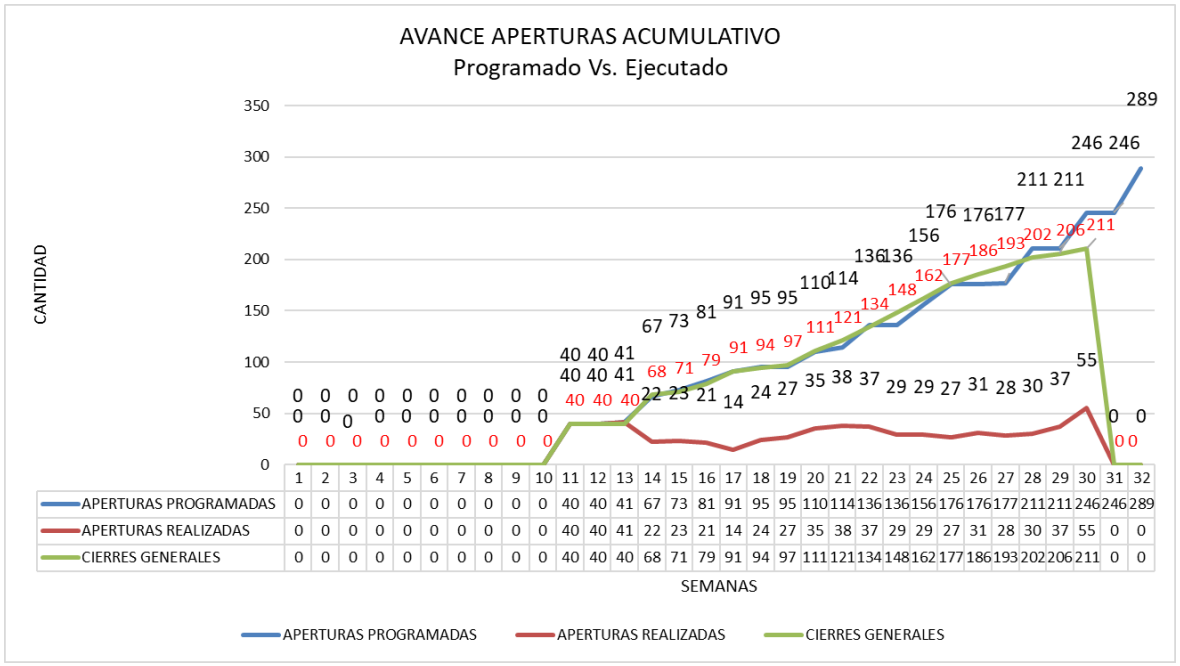
1. Para el mes de MARZO de 2023 se tiene programado según la reprogramación de obra el desarrollo de las 289 validaciones, estas se realizaron en su totalidad.

MVAL_00164	MV_00236	MV_1081	MV_1234	MV_1394	MV_01560	MVAL_03788	MV_02833
MV_00333	MV_00231	MV_1146	MV_1220	MV_0049	MV_00082	MVAL_03831	MVAL_02834
MV_00332	MV_00247	MV_1151	MV_01223	MV_00038	MVAL_00085	MVAL_03827	MV_02835
MV_00350	MV_00248	MV_1141	MV_1228	MVAL_00040	MVAL_00064	MVAL_03825	MV_02838
MV_00352	MVAL_00249	MV_0109	MV_1230	MV_00046	MV_00062	MVAL_03834	MV_02823
MV_00360	MV_00218	MV_1136	MV_1231	MV_00001	MV_00060	MVAL_03823	MV_02888
MV_00335	MV_00220	MV_0115	MV_1236	MV_00002	MV_1512	MV_02712	MV_02816
MVAL_00381	MV_00222	MVAL_0116	MV_01238	MV_00004	MV_1589	MV_02731	MV_02893
MV_00367	MV_00224	MV_1132	MV_1240	MVAL_00005	MV_01513	MV_02725	MVAL_02812
MV_00404	MV_00297	MV_1131	MV_01244	MV_00009	MV_01514	MV_02721	MV_02895
MV_00402	MV_00211	MV_1129	MV_01247	MVAL_00011	MV_01518	MV_02718	MV_02896
MVAL_00401	MVAL_00209	MV_1162	MV_1213	MV_14683	MV_00310	MV_02742	MV_02864
MV_00398	MVAL_00178	MV_01123	MV_01215	MVAL_00091	MV_00364	MV_02758	MV_02873
MVAL_00389	MVAL_00174	MVAL_0127	MV_1359	MV_00092	MVAL_03418	MV_02757	MV_02875
MV_00391	MV_00172	MVAL_00013	MV_01363	MV_00098	MVAL_03487	MV_02752	MVAL_07525
MVAL_00434	MV_00171	MV_0015	MV_01366	MV_00102	MVAL_03478	MV_02756	MVAL_07527
MVAL_00441	MV_00159	MV_01167	MV_01368	MV_00071	MVAL_03509	MV_02921	MVAL_07528
MV_00417	MV_00158	MV_1166	MVAL_01253	MV_00069	MVAL_03513	MVAL_02900	MVAL_07532
MV_00419	MV_00165	MV_1179	MVAL_01257	MV_00068	MVAL_03514	MV_02901	MVAL_07537
MV_00420	MVAL_0149	MV_01176	MV_1349	MV_00075	MVAL_03508	MV_02902	MVAL_07543
MV_00425	MVAL_0140	MV_01175	MV_1343	MV_00076	MVAL_03505	MV_02904	
MV_00423	MV_1051	MV_1174	MV_1344	MV_00066	MVAL_03530	MV_02905	
MV_00451	MV_1056	MV_01112	MV_01435	MV_00106	MVAL_03616	MV_02857	
MV_00452	MV_1060	MV_01114	MV_1433	MV_1201	MVAL_03614	MV_02788	
MV_00453	MV_1062	MV_1122	MV_01430	MV_0021	MVAL_03628	MV_02852	
MV_00316	MV_1064	MV_1120	MV_01428	MVAL_0022	MVAL_03651	MV_02842	
MV_00314	MV_1032	MV_1109	MV_1427	MV_01367	MVAL_03652	MV_02791	
MV_00311	MV_01035	MV_1020	MV_0028	MV_01265	MVAL_03714	MV_02848	
MV_00317	MV_01041	MV_1028	MV_1423	MV_01266	MVAL_03721	MV_02844	
MV_00306	MV_1043	MV_00329	MV_01530	MV_01268	MVAL_03697	MV_02798	
MV_0320	MV_1095	MV_01191	MV_01526	MV_01270	MVAL_03684	MV_02797	
MV_00303	MV_1103	MV_01192	MV_01557	MV_01271	MVAL_03737	MV_02795	
MV_00302	MV_01105	MV_01196	MV_01573	MV_1374	MVAL_03751	MV_02784	
MV_00271	MV_1069	MV_1197	MV_01570	MV_0026	MVAL_03756	MV_02782	
MV_00274	MV_1072	MV_1198	MV_01566	MV_0030	MVAL_03763	MV_02780	
MV_00279	MV_1075	MV_1200	MVAL_01563	MV_1426	MVAL_03778	MV_02826	
MV_00280	MV_1076	MV_1206	MV_1391	MV_01425	MVAL_03777	MV_02771	
MV_14691	MV_1079	MV_1180	MV_01400	MV_01420	MVAL_03802	MV_02765	
MV_00282	MV_1080	MV_0025					



VALIDACIONES- MARZO

2. Para el mes de marzo se tiene programado la ejecución de 246 viviendas según la reprogramación, de lo anterior, al presente informe hay 266 viviendas entre entregas y en ejecución.



APERTURA- EJECUCIÓN- MARZO

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%
MV_00364	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%
MV_1201	ENTREGADA	100,00%
MV_1206	ENTREGADA	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	100,00%
MV_0021	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0022	EN EJECUCION	95,00%
MV_0025	ENTREGADA	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	100,00%
MV_0026	ENTREGADA	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%
MV_0030	EN EJECUCION	40,00%
MV_1426	EN EJECUCION	95,00%
MV_01425	ENTREGADA	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%
MV_01420	ENTREGADA	100,00%
MV_02838	ENTREGADA	100,00%
MV_02816	EN EJECUCION	40,00%
MV_02835	EN EJECUCION	30,00%
MV_02921	EN EJECUCION	70,00%

MV_02921	EN EJECUCION	70,00%
MV_02771	EN EJECUCION	60,00%
MV_02798	EN EJECUCION	95,00%
MV_02823	EN EJECUCION	20,00%
MV_02893	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_03508	EN EJECUCIÓN	60,00%
MVAL_03514	EN EJECUCION	40,00%
MVAL_03616	EN EJECUCION	15,00%
MVAL_03778	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_03788	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_03418	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_03478	EN EJECUCION	5,00%
MVAL_03487	EN EJECUCION	95,00%
MVAL_03505	EN EJECUCION	45,00%
MVAL_03509	EN EJECUCION	20,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%
MV_01265	ENTREGADA	100,00%
MV_01266	EN EJECUCIÓN	95,00%
MV_01268	ENTREGADA	100,00%
MV_01270	ENTREGADA	100,00%
MV_01271	ENTREGADA	100,00%
MV_1374	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%
MV_01400	ENTREGADA	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%
MV_01514	ENTREGADA	100,00%
MV_1512	ENTREGADA	100,00%
MV_00038	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	100,00%

MVAL_00011	ENTREGADA	100,00%
MV_00082	ENTREGADA	100,00%
MV_00085	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00064	ENTREGADA	100,00%
MV_00062	ENTREGADA	100,00%
MV_14683	ENTREGADA	100,00%
MV_00060	ENTREGADA	100,00%
MV_00069	ENTREGADA	100,00%
MV_00075	ENTREGADA	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	100,00%
MV_02757	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02742	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02752	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%
MV_00310	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%
MV_01080	ENTREGADA	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	10,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	100,00%
MV_00106	ENTREGADA	100,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	100,00%
MV_01367	ENTREGADA	100,00%

MV_01368	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	100,00%
MV_01560	ENTREGADA	100,00%
MV_01570	ENTREGADA	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	100,00%
MVAL_03530	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03614	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03737	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03751	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03777	EN EJECUCIÓN	48,00%
MVAL_03823	EN EJECUCIÓN	95,00%
MVAL_03825	ENTREGADA	62,00%
MVAL_03827	EN EJECUCIÓN	58,00%
MVAL_03831	EN EJECUCIÓN	17,00%
MVAL_03834	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03651	EN EJECUCIÓN	65,00%
MVAL_03652	EN EJECUCIÓN	56,00%
MVAL_03721	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03756	EN EJECUCIÓN	45,00%
MVAL_03684	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03763	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_03628	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%

[illegible]	[illegible]	[illegible]
MV_1109	ENTREGADA	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%
MV_1433	ENTREGADA	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	100,00%
MV_01518	ENTREGADA	100,00%
MV_01513	ENTREGADA	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	100,00%
MV_00071	ENTREGADA	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	100,00%
MV_02731	EN EJECUCIÓN	95,00%
MV_02833	ENTREGADA	100,00%
MVAL_02834	ENTREGADA	100,00%
MV_02848	ENTREGADA	100,00%
MV_02857	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02864	ENTREGADA	100,00%
MV_02875	ENTREGADA	100,00%
MV_02895	ENTREGADA	100,00%
MV_02901	EN EJECUCIÓN	25,00%
MV_02904	EN EJECUCIÓN	60,00%
MV_02905	EN EJECUCIÓN	95,00%
MVAL_02812	ENTREGADA	100,00%
MV_02782	EN EJECUCIÓN	0,00%
MV_02842	EN EJECUCIÓN	30,00%
MV_02844	EN EJECUCIÓN	30,00%
MV_02888	EN EJECUCIÓN	40,00%
MV_02896	ENTREGADA	100,00%
MVAL_07525	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_07527	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_07528	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_07532	EN EJECUCIÓN	0,00%
MVAL_07550	EN EJECUCIÓN	0,00%

c. *Exposición de las situaciones de orden técnico que se hayan presentado en la ejecución del contrato y que merezcan atención por parte de la entidad.*

Para el presente informe NO se presentó inconvenientes desde el orden técnico que merezcan atención.

d. *Soluciones adoptadas*

Para el presente informe NO se presentó inconvenientes desde el orden técnico que merezcan atención.

e. *Recomendaciones pertinentes*

Para el presente informe, se genera recomendaciones al contratista para dar continuidad a las ejecuciones de cada una de las viviendas dejando registro de modificaciones, cambios o ajustes que posteriormente puedan generar alguna queja o reclamo, también se solicita se dé respuesta a las solicitudes de la interventoría.
Así mismo se solicita se lleve un registro de las adecuaciones o mantenimientos o ajustes que se realicen a las viviendas, ya sea por que se generaron reprocesos en las actividades, o por daños y/o cambios de materiales.

f. *De no presentarse dichas situaciones de orden técnico, se deberá informar sobre la no existencia de estas durante el periodo.*

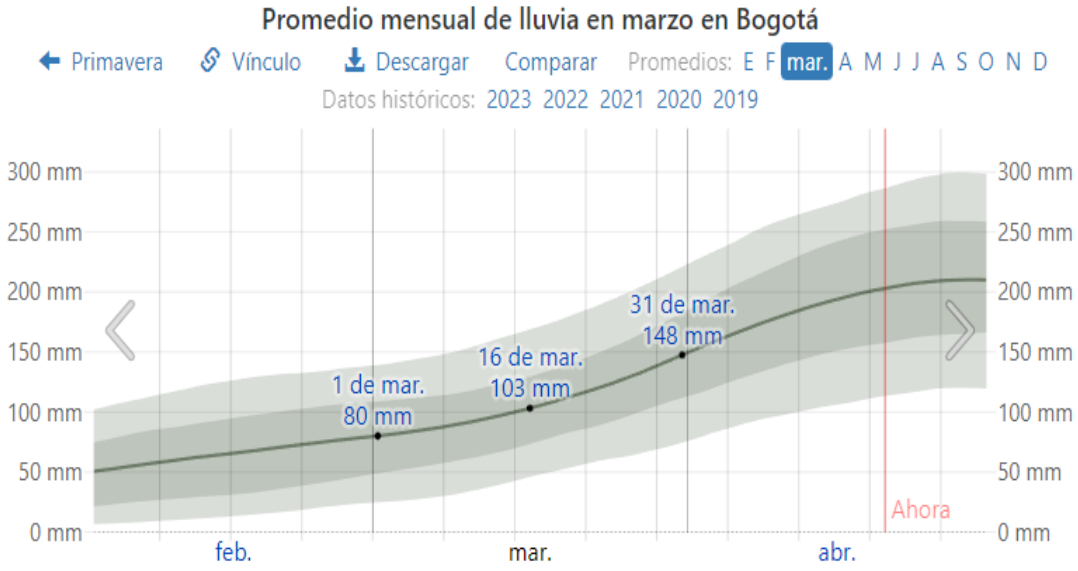
Se exponen en los puntos anteriores.

g. Estado del tiempo mes de MARZO DE 2023

Lluvia

Para mostrar la variación durante el mes y no sólo el total mensual, mostramos la precipitación de lluvia acumulada durante un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado alrededor de cada día.

El promedio de lluvia durante un periodo de 31 días en una escala móvil en marzo en Bogotá aumenta muy rápidamente, comenzando el mes con 80 milímetros, cuando rara vez excede 139 milímetros o es menos de 25 milímetros, y terminando el mes con 148 milímetros, cuando rara vez excede 221 milímetros o es menos de 74 milímetros.



La lluvia promedio (línea sólida) acumulada en un periodo de 31 días en una escala móvil, centrado en el día en cuestión, con las bandas de percentiles del 25º al 75º y del 10º al 90º. La línea delgada punteada es la precipitación de nieve promedio correspondiente

https://es.weatherspark.com/m/23324/3/Tiempo-promedio-en-marzo-en-Bogot%C3%A1-Colombia

h. Reporte técnico general mensual

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Valida	V/Modificad	En Ejecución	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G1		EL NUEVO PORTAL	15	70	15	0	14	0	15	100,00%	15
		NUEVO PORVENIR	36		36	0	14	3	33	98,06%	33
		EL PORTAL DEL DIVINO	8		8	0	0	7	1	52,50%	1
		EL REFUGIO I Y II	11		11	0	0	10	0	26,82%	0
Subtotal			**70**		**70**	**0**	0	**20**	**49**	**69,34%**	**49**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Valida	V/Modificad	En Ejecución	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G2		EL NUEVO PORTAL	5	71	5	0	4	0	5	100,00%	5
		NUEVO PORVENIR	27		27	0	20	1	26	99,80%	26
		EL TRIANGULO	19		19	0	9	0	19	100,00%	19
		EL PORTAL DEL DIVINO	20		20	0	0	3	0	0,00%	0
Subtotal			**71**		**71**	**0**	0	**4**	**50**	**74,95%**	**50**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Valida	V/Modificad	En Ejecución	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G3		NUEVO PORTAL	16	71	16	0	11	1	15	93,75%	15
		NUEVO PORVENIR	35		35	0	14	0	35	100,00%	35
		EL REFUGIO	20		20	0	0	16	1	22,30%	1
Subtotal			**71**		**71**	**0**	0	**17**	**51**	**72,02%**	**51**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Valida	V/Modificad	En Ejecución	Terminadas	% de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
G4		EL NUEVO PORTAL	18	77	18	0	0	0	18	100,00%	18
		PORTAL DE LA VEGA	6		6	0	0	0	6	100,00%	6
		NUEVO PORVENIR	23		23	0	0	0	23	100,00%	23
		EL TRIANGULO	6		6	0	0	0	6	100,00%	6
		EL PORTAL DEL DIVINO	17		17	0	0	9	8	69,12%	8
		COMPOSTELA	7		6	0	0	5	0	0,00%	0
Subtotal			**76**		**76**	**0**	**0**	**14**	**61**	78,19%	**61**

Fase 1: Validación de la información entregada por el la SDHT								Fase 2: Ejecución de obras			
Territorio o barrio a intervenir	USME	Barrios	Predios	Total Predios	Validación			Ejecución			
					Validada	V/Por Validar	V/Modificada	En Ejecución	Terminadas	% Promedio de Avance	Acta de Entrega a Satisfacción
CONSOLIDADO		EL NUEVO PORTAL	54	289	54	0	29	1	53	98%	53
		PORTAL DE LA VEGA	6		6	0	0	0	6	100%	6
		NUEVO PORVENIR	121		121	0	48	4	117	99%	117
		EL TRIANGULO	25		25	0	9	0	25	100%	25
		EL PORTAL DEL DIVINO	45		45	0	0	19	9	41%	9
		COMPOSTELA	7		7	0	0	5	0	0%	0
		EL REFUGIO	31		31	0	0	26	1	25%	1
Subtotal			**289**		**289**	**0**	**86**	**55**	**211**	**66%**	**211**

Proyecto mejoramiento de vivienda – AVANCE EJECUCIÓN SEMANAL DURANTE EL MES DE MARZO

MVAL_00389	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00391	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00434	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00441	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00417	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00419	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00420	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00425	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00423	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00451	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00452	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00453	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00316	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00314	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00364	ENTREGADA	25,00%	50,00%	85,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0149	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0140	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1051	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1056	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1060	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1062	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1064	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1032	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01035	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01041	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1043	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1095	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1103	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01105	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1197	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1198	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1201	ENTREGADA	80,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_1206	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1180	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0021	ENTREGADA	10,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0022	EN EJECUCION	0,00%	10,00%	10,00%	70,00%	95,00%
MV_0025	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1234	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1220	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01223	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1228	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1230	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1427	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0026	ENTREGADA	40,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0028	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0030	EN EJECUCION	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	40,00%
MV_1426	EN EJECUCION	5,00%	60,00%	80,00%	85,00%	95,00%
MV_01425	ENTREGADA	30,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1423	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01420	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02838	ENTREGADA	5,00%	30,00%	60,00%	80,00%	100,00%
MV_02816	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	40,00%
MV_02835	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	30,00%
MV_02921	EN EJECUCION	5,00%	5,00%	5,00%	40,00%	70,00%
MV_02771	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	40,00%	60,00%
MV_02798	EN EJECUCION	5,00%	5,00%	5,00%	60,00%	95,00%
MV_02823	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	20,00%
MV_02893	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03508	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	60,00%
MVAL_03514	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	40,00%
MVAL_03616	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	15,00%
MVAL_03697	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03778	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%

MVAL_03788	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03418	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03478	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
MVAL_03487	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	5,00%	50,00%	95,00%
MVAL_03505	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	45,00%
MVAL_03509	EN EJECUCION	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%
MVAL_00164	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00333	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00332	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00350	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00404	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_0116	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1132	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1131	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1129	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1162	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01123	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0127	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00013	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0015	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01167	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1166	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1179	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01176	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01175	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01265	ENTREGADA	78,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01266	EN EJECUCIÓN	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
MV_01268	ENTREGADA	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01270	ENTREGADA	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01271	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1374	ENTREGADA	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01563	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1391	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_01400	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1394	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0049	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01514	ENTREGADA	0,00%	25,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1512	ENTREGADA	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00038	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00040	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00046	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00001	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00002	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00004	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00005	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00009	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00011	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00082	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00085	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00064	ENTREGADA	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00062	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_14683	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00060	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00069	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00075	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00076	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00066	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02756	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02757	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02765	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02780	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02784	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02788	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02797	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02902	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02725	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MV_02718	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02712	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02721	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02742	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02752	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02758	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02795	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02826	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02852	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02873	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_02900	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00311	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00317	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00306	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0320	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00303	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00302	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00271	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00274	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00279	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00280	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_14691	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00282	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00236	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00231	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00232	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00310	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_1069	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1072	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1075	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1076	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01238	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01079	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_01080	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01081	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1136	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0115	ENTREGADA	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
MV_001151	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1141	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00106	ENTREGADA	0,00%	76,00%	98,00%	100,00%	100,00%
MV_01146	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_0109	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1236	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1240	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01244	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01247	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1213	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01215	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1359	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01363	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01366	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01367	ENTREGADA	8,00%	26,00%	53,00%	86,00%	100,00%
MV_01368	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01253	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_01257	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01530	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01526	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01557	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01573	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01560	ENTREGADA	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01570	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01566	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_03513	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03530	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03614	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03737	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03751	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

MVAL_03777	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	22,00%	48,00%
MVAL_03823	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	18,00%	85,00%	95,00%
MVAL_03825	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	62,00%	62,00%
MVAL_03827	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,00%
MVAL_03831	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,00%
MVAL_03834	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03651	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%
MVAL_03652	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,00%
MVAL_03714	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03721	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03756	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	38,00%	45,00%
MVAL_03802	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03684	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03763	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_03628	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_00352	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00360	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00335	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00381	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00367	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00402	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00401	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00398	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00249	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00248	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00218	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00220	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00222	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00224	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00297	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00159	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00158	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00165	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00211	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MVAL_00209	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00178	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00172	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00171	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1174	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01112	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01114	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1122	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1120	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1109	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1020	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1028	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00329	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01191	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01192	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01196	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1200	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1349	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1343	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1344	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1433	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01430	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01428	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01518	ENTREGADA	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01513	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_1589	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_01435	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MVAL_00091	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00092	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00098	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00102	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00071	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_00068	ENTREGADA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

MV_02731	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%
MV_02833	ENTREGADA	0,00%	0,00%	28,00%	100,00%	100,00%
MVAL_02834	ENTREGADA	0,00%	3,00%	35,00%	70,00%	100,00%
MV_02848	ENTREGADA	0,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02857	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02864	ENTREGADA	0,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02875	ENTREGADA	35,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%
MV_02895	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
MV_02901	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	25,00%
MV_02904	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%
MV_02905	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	95,00%
MVAL_02812	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	65,00%	100,00%
MV_02782	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MV_02842	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
MV_02844	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
MV_02888	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%
MV_02896	ENTREGADA	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
MVAL_07525	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07527	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07528	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07532	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07537	VALIDADA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MVAL_07550	EN EJECUCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_01514 USME / NUEVO PORVENIR



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega alcoba con pañete y pintura en muros, enchape de piso	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega vivienda con cubierta nueva en toda el área	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Cubierta entregada con estructura metálica nueva y tejas traslucidas	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Cocina entregada con mesón nuevo, enchape de piso, muros y pintura.	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_00106 USME / NUEVO PORTAL



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega alcoba con enchape de piso, pintura en muros y cielo raso pvc	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega alcoba con enchape de piso, pintura en muros y cielo raso pvc	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega zona de lavado con enchape de muros y piso, lavadero nuevo	



FECHA	miércoles, 15 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Se entrega vivienda con cubierta nueva, con estructura metálica	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_03756 USME / EL REFUGIO



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Pañete de muros en cocina	



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Pañete de muros en zona de lavado	



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Alistado de piso y pañete de muros en zona de lavado	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_03777 USME / EL REFUGIO



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Pañete de muros en sala	



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Pañete en alcoba	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_03823 USME / EL REFUGIO



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de cubierta en todo el área	



FECHA	martes, 14 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de muros en baño	



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de cocina	



FECHA	jueves, 16 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Enchape de muros de zona de lavado	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02895 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cocina después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, zona de ropas después de intervención	

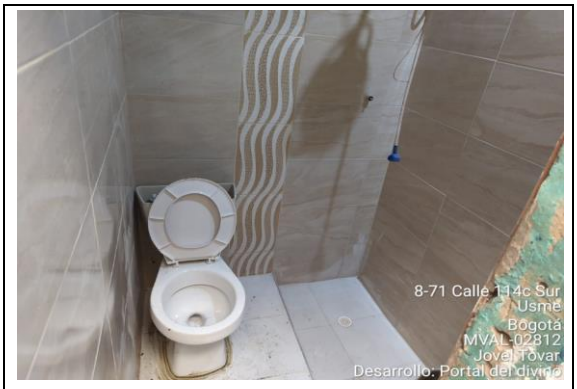


FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, baño después de intervención	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02812 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	jueves, 23 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de enchape de baño	



FECHA	jueves, 23 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de cielo raso en zona social	



FECHA	jueves, 23 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de cielo raso, enchape de piso y pintura sobre muros en habitación #2	



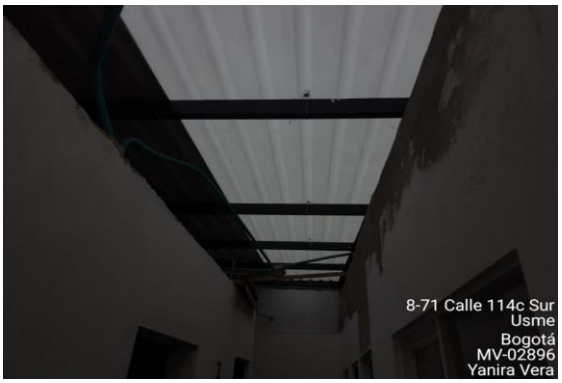
FECHA	jueves, 23 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Instalación de cielo raso, enchape de piso y pintura sobre muros en habitación #3	

FECHA	
DESCRIPCION	

FECHA	
DESCRIPCION	

REGISTRO FOTOGRAFICO

MV_02842 USME / EL PORTAL DEL DIVINO



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cubierta después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, baño después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, cocina después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, zona de ropas después de intervención	



FECHA	viernes, 24 de marzo de 2023
DESCRIPCION	
Entrega, habitación #1 después de intervención	

FECHA	
DESCRIPCION	

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a. Presentación de las situaciones constitutivas de incumplimiento por parte del contratista de obra, si fuere el caso.

Para el mes del presente informe se registran las siguientes situaciones de un posible incumplimiento por parte del contratista:

- A la fecha del presente informe, el contratista, que si bien a mejorado sus procesos técnicos y administrativos, debe estar atento al cumplimiento de la documentación requerirá para el ingreso del personal, así como el manejo de los escombros de obra.
- Si bien el contratista se encuentra en un retraso en la entrega de las viviendas, en el comité del 28 de marzo se solicita por parte de la supervisión y la interventoría se haga entrega de carácter urgente de un plan de choque por parte del contratista, que permita nivelar las viviendas entregadas, así como el cumplimiento de la totalidad de entregas al 15 de abril. El contratista a esta solicitud informa su compromiso total en el desarrollo del proyecto y hará llegar el documento a la brevedad.

b. Constancia de la entrega de las certificaciones del Sistema de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales, (anexar las respectivas planillas de pago de todo el personal utilizado en obra tanto de obra como de interventoría).

- VER ANEXO OBRA (1)
- VER ANEXO INTERVENTORÍA (2)

c. Información sobre los requerimientos que, en el periodo informado, se hayan hecho al contratista de obra. Se allegará copia de estos y de sus repuestas, si fuere el caso.

- VER ANEXO OFICIOS RADICADOS AL CONTRATISTA (3)
    d. Información sobre la vigencia de las garantías que amparan el contrato.
        i. Pólizas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7	CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2022	08/04/2023	$720,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2022	08/12/2025	$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/12/2022	08/06/2023	$720,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/08/2022	08/04/2023	$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$720,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ ********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

26

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7	CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

26

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

27

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (10,501,643.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(2,000,062.00)	$ ******(12,526,706.00)	$ **(3,600,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

27

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-003A RRDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(334,246.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(64,076.00)	$ *********(401,323.00)	$ ****(400,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2180977

STEFANYDIAZ 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍNITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2022	19/04/2023	$720,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/08/2022	19/12/2025	$360,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2022	19/06/2023	$720,000,000.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/08/2022	19/04/2023	$1,080,000,000.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/12/2022	19/12/2024	$720,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ *********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

30

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101267234	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22		NIT: 901.627.224-3
DIRECCIÓN: CR 96 A 130 B 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO**	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	20/10/2023	$124,848,000.00	$86,400,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2022	20/04/2025	$124,848,000.00	$86,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2022	20/04/2026	$62,424,000.00	$43,200,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE ADICIONA A SUMA DE $ 192.240.000 Y SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****128,453.00	$ ******8,000.00	$ ******25,926.00	$ **********162,379.00	$ *****312,120,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

30

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101267234	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

RICARDOVALENZUELA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON NUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELÉFONO: 2180577 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN:	CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN:	CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN:	CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN:	CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081350	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

.

BENEFICIARIOS TERCEROS APECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	20/04/2023	$200,000,000.00	$200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,095.00	$ *******3,000.00	$ ******15,978.00	$ **********100,074.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM **OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6015330** **RICARDOVALENZUELA** 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081350	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RICARDOVALENZUELA 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 900.372.215-7**

DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., **GARANTIZA:**

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 999 DE 2022, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023, POR LO ANTERIOR SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,000.00	$ *******3,000.00	$ ******38,570.00	$ **********241,570.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTA, D.C. | SUCURSAL: ANTIGUO COUNTRY | COD.SUC: 21 | NO.PÓLIZA: 21-40-101194351 | ANEXO: 5

FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2022 | VIGENCIA DESDE: 01/09/2022 00:00 | VIGENCIA HASTA: 15/03/2023 23:59 | TIPO MOVIMIENTO: ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. — IDENTIFICACIÓN NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT — IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	15/03/2023	$400,000,000.00	$400,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600
BENEFICIARIO:	ADICIONAL:		



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,000.00	$ ******3,000.00	$ *****38,570.00	$ **********241,570.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1100513143668 2(3900)000000241570(96)20230901

REFERENCIA PAGO: 1100513143668-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	01	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7	CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	02/05/2023	$1,040,400,000.00	$720,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2022	01/01/2026	$520,200,000.00	$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/01/2023	02/07/2023	$1,040,400,000.00	$720,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/09/2022	02/05/2023	$1,080,000,000.00	$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/01/2023	01/01/2025	$1,040,400,000.00	$720,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 999 DE 2022, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $1.602.000.000 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023, POR LO ANTERIOR SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO EN EL ANEXO CAUSA PRIMA Y SE AMPLIA LA VIGENCIA EN EL ANEXO DE PRORROGA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,524,400.00	$ **********0.00	$ *****669,636.00	$ ********4,194,036.00	$ ****4,721,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330 STEFANYDIAZ 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTA, D.C. | SUCURSAL: ANTIGUO COUNTRY | COD.SUC: 21 | NO.PÓLIZA: 21-44-101391146 | ANEXO: 5

FECHA EXPEDICIÓN: 16/12/2022 | VIGENCIA DESDE: 01/09/2022 00:00 | VIGENCIA HASTA: 01/01/2026 23:59 | TIPO MOVIMIENTO: ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. | IDENTIFICACIÓN: NIT: 900.372.215-7 | DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT | IDENTIFICACIÓN: NIT: 899.999.061-9 | DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 3581600

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,524,400.00	$ **********0.00	$ *****669,636.00	$ ********4,194,036.00	$ ****4,721,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO: LHM SEGUROS LTDA. | CLAVE: 205033 | % DE PART.: 100.00

DISTRIBUCION COASEGURO: NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005131436629(3900)000004194036(96)20231216

REFERENCIA PAGO: 1100513143662-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	01	01	2026	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.372.215-7
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.			
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ 2

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.372.215-7
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.			
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT			
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	15/07/2023	$1,040,400,000.00	$1,040,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2022	15/03/2026	$520,200,000.00	$520,200,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/01/2023	15/09/2023	$1,040,400,000.00	$1,040,400,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/09/2022	15/07/2023	$1,080,000,000.00	$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	01/01/2023	01/01/2025	$1,040,400,000.00	$1,040,400,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 999 DE 2022, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE $1.602.000.000 Y SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 15 DE MARZO DE 2023, POR LO ANTERIOR SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO EN EL ANEXO CAUSA PRIMA Y SE AMPLIA LA VIGENCIA EN EL ANEXO DE PRORROGA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,869,270.00	$ ******8,000.00	$ *****356,681.00	$ *********2,233,951.00	$ ****4,721,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM **OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330** **STEFANYDIAZ** 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:



VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,869,270.00	$ ******8,000.00	$ *****356,681.00	$ ********2,233,951.00	$ ****4,721,400,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11005131436636(3900)000002233951(96)20230901

REFERENCIA PAGO: 11005131436636

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	12	2022	01	09	2022	00:00	15	03	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7	CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2022	08/04/2023	$720,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2022	08/12/2025	$360,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	08/12/2022	08/06/2023	$720,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	08/08/2022	08/04/2023	$1,080,000,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$720,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ ********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

39

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7	CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9	CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

39

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
18	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV	08/08/2022	08/12/2022	$400,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

STEFANYDIAZ 2

40

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	IDENTIFICACIÓN	NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ (10,501,643.00)	$ ****(25,000.00)	$ *(2,000,062.00)	$ ******(12,526,706.00)	$ **(3,600,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

STEFANYDIAZ 1

40

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2025	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO:	ADICIONAL:
899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-003A RRDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***(334,246.00)	$ *****(3,000.00)	$ ****(64,076.00)	$ *********(401,323.00)	$ ****(400,000,000.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2180977 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	08	08	2022	00:00	08	12	2022	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍNITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/08/2022	19/04/2023	$720,000,000.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/08/2022	19/12/2025	$360,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	19/12/2022	19/06/2023	$720,000,000.00	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/08/2022	19/04/2023	$1,080,000,000.00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19/12/2022	19/12/2024	$720,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **10,501,643.00	$ ******25,000.00	$ ***2,000,062.00	$ *********12,526,706.00	$ ****3,600,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-44-101391146	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-44-101391146

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

43

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101267234	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22		NIT: 901.627.224-3
DIRECCIÓN: CR 96 A 130 B 11	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.767-1
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO**	3581600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2022	20/10/2023	$124,848,000.00	$86,400,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	01/09/2022	20/04/2025	$124,848,000.00	$86,400,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/09/2022	20/04/2026	$62,424,000.00	$43,200,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE ADICIONA A SUMA DE $ 192.240.000 Y SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****128,453.00	$ ******8,000.00	$ ******25,926.00	$ **********162,379.00	$ *****312,120,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-101933

RICARDOVALENZUELA 1

43

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101267234	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101267234

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

RICARDOVALENZUELA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

44

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.	NIT: 900.372.215-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 12 A NRO. 68 C - 03	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 999-2022 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. GRUPOS 1 2022.

ASEGURADO: GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S. Y BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT
BENEFICIARIOS: BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE MODIFICA LA VIGENCIA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA QUEDANDO A PARTIR DEL 19 DE AGOSTO DE 2022.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN EN VIGOR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****334,246.00	$ *******3,000.00	$ ******64,076.00	$ **********401,323.00	$ ******400,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
LHM SEGUROS LTDA.	205033	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELÉFONO: 2180577 STEFANYDIAZ 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

44

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	19/08/2022	19/12/2022	$400,000,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

45

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	ANTIGUO COUNTRY	21	21-40-101194351	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	08	2022	19	08	2022	00:00	19	12	2022	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ S.A.S.		NIT: 900.372.215-7
DIRECCIÓN: CL 12 A NRO. 68 C - 03	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7430070

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT		NIT: 899.999.061-9
DIRECCIÓN: CL 52 NRO. 13 - 64	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3581600

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA D.C. SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

21-40-101194351

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

STEFANYDIAZ 3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

45

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081350	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008 DE 2022 REFERENTE A REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARA DISTRITAL DEL HBITAT. GRUPOS 1 - 2022.

.

BENEFICIARIOS TERCEROS APECTADOS

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	01/09/2022	20/04/2023	$200,000,000.00	$200,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRROROGA No. 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1008-2022 SE AMPLIA EL PLAZO EN DOS MESES (2) Y QUINCE DIAS (15)

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******81,095.00	$ *******3,000.00	$ ******15,978.00	$ **********100,074.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJO	93106	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-40-101081350	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	12	2022	01	09	2022	00:00	20	04	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	NIT: 901.627.224-3

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 96 A 130 B 11	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	9296772

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT	NIT: 899.999.767-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 52 NRO. 13 - 64	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3581600

BENEFICIARIO: 899999767 - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	900457115-5	35.00
ANZA INGENIERIA S.A.S	900893208-0	65.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-40-101081350

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. ASPECTOS SOCIALES

a. Registro de atención a la comunidad y seguimiento a los mismos Peticiones, Quejas y Reclamos - PQR.
b. Matriz de seguimiento al cumplimiento del plan de acompañamiento social.
c. Documento que contenga avances, logros y dificultades cualitativas y cuantitativas de la ejecución de obra.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

FECHA	1/04/2023	**PERIODO No.**	7	DEL	**1/03/2023**	AL	**31/03/2023**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1 - 2022."
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Territorio USME

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	1008-2022	CONTRATO No.:	999-2022
PLAZO INICIAL:	5 Meses	PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de septiembre de 2022
**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	**FECHA DE SUSPENSIÓN:	0
**FECHA DE REINICIACIÓN:	0	**FECHA DE REINICIACIÓN:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de enero de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN:	0
PLAZO ACTUALIZADO:	0	PLAZO ACTUALIZADO:	0
PLAZO TRANSCURRIDO:	0	PLAZO TRANSCURRIDO:	0
VALOR INICIAL :	$ 432.000.000	VALOR INICIAL :	$ 3.600.000.000
VALOR ADICION(ES):	0	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ -	VALOR ACTUALIZADO:	$ -
VALOR ANTICIPO:	0	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 432.000.000	VALOR POR PAGAR:	$ 3.600.000.000
SUPERVISOR:	CAMILA CORTÉS DAZA	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA INICIO	FECHA REAL DE FINALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO	
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	Validación	0/01/1900	0/01/1900	
	ENTREGA A LA INTERVENTORÍA DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)			

***** Inserte las filas que requiera según el número de hitos; teniendo en cuenta que como mínimo se deberán establecer 5 hitos adicionales a los obligatorios de inicio y terminación. Los hitos aprobados por la interventoría se socializarán con el supervisor del contrato para su Vo. Bo. Los Hitos aprobados por la interventoría y SDHT solo se podrán modificar previa novedad contractual que así lo requiera. La matriz de seguimiento hace parte del presente documento.**

3. ASPECTOS GENERALES INFORME SOCIAL

Registre los avances y novedades técnicas, sociales, administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus aspectos en la fase de validación y ejecución de obra.

Fase de validación y apropiación:

4. COMPONENTE SOCIAL - AVANCE SOCIAL DE CADA UNIDAD DE VIVIENDA
Componente Social: Registre aquí en relación con el componente social, las reuniones con la familias beneficiarias programadas por el contratista de obra para el desarrollo de las jornadas de capacitación a las familias beneficiadas con el propósito de buscar la sostenibilidad de la obra, las reuniones de avance de obra organizada por el contratista de obra conforme a lo establecido en el anexo técnico de obra y la relación de los SDQS de la comunidad y las respectivas respuestas. Durante la semana reportada se realizaron las siguientes acciones en el componente social:
BARRIO O TERRITORIO: NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA, EL PORTAL DEL DIVINO, EL REFUGIO I Y II
INFORME QUE COMPRENDE AL MES No.__7__ DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023
SOCIALIZACIONES
VALIDACIONES REALIZADAS
01/03/2023 **MVAL_03721 JUAN ALBERTO CALZADA** Se realiza validación de vivienda con componente técnico y social de obra e interventoría, quien recibe es la persona autorizada, Gloria Montaño. Identificando un hogar monoparental conformada por el beneficiario y su hijo quien es menor de edad, la vivienda consta de dos plantas, el componente económico es asumido por el beneficiario, se identifica como información significativa que el señor Juan es victima del conflicto armado y pertenece a grupo etnico afrodescendiente. Se realiza diligenciamiento de caracterización desde componente social, se indaga a la autorizada sobre sus prioridades en la vivienda y se brinda información general sobre las intervenciones.
01/03/2023 **MVAL_ 07525 MARIA GLADYS MONASTOQUE, DESARROLLO COMPOSTELA:** Familia Nuclear, no trabaja porque ya es de la tercera edad, beneficiario indica que la zona es peligrosa debido a la invasión, Beneficiaria indica que va estar pendiente de la obra se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
01/03/2023 **MVAL_ 07532 BERTA QUINTERO, DESARROLLO COMPOSTELA:** Familia Unipersonal, beneficiario trabaja como independiente haciendo trabajos de costuras, estado civil viuda, se realiza caracterización social y se toma información técnica y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
01/03/2023 **MVAL_ 07543 JORGE SALCEDO, DESARROLLO COMPOSTELA**: Familia monoparental, beneficiario trabaja de manera independiente, actualmente esta soltera, solo vive con su hijo, los dos aportan económicamente a la vivienda, se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
02/03/2023 **MVAL_ 07527 DAVID FUENTES HERNÁNDEZ, DESARROLLO COMPOSTELA:** Familia Nuclear, trabaja con su esposa como independiente, beneficiario indica que la zona es peligrosa debido a la invasión, se realiza caracterización social y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
02/03/2023 **MVAL_ 07528 MARIA BERENICE AYALA, DESARROLLO COMPOSTELA:** Familia Unipersonal, beneficiaria no trabaja debido a que es de la tercera edad y tiene algunas complicaciones medicas, estado civil viuda, beneficiario indica que la zona es peligrosa debido a la invasión, se realiza caracterización social y se toma información técnica y reconocimiento de la vivienda a nivel estructural y estado actual. Se aclaran dudas en cuanto el mejoramiento.
02/03/2023 **,MVAL_07550 SANDRA GOMEZ:** Familia Extensa, beneficiaria es empleada y viuda, vive actualmente con su hija menor, vive con su madre que tiene una complicación medica y debe cuidarla. Se presentan profesionales se indica motivo de la validación la caracterización a cargo del área social y toma de medidas de la casa a cargo de la parte técnica.
07/03/2023 **MVAL_07537, MARIA MIRIAM GARCIA ALONSO, DESARROLLO COMPOSTELA:** Familia Extensa, beneficiaria convive en unión libre con su actual pareja, trabajan independientes los dos sostienen el hogar, vive actualmente con su hija y su nieta, la beneficiaria manifiesta pertenecer a la JAC del barrio. Se presentan profesionales se indica motivo de la validación la caracterización a cargo del área social y toma de medidas de la casa a cargo de la parte técnica.

VALIDACIONES FALLIDAS
01/03/2023 **MV_07537, MARIA MYRIAM GARCIA ALFONSO:** Se realiza visita a la vivienda, no había nadie. 03/03/2023 **MV_07537, MARIA MYRIAM GARCIA ALFONSO:** No se pudo realizar la validación porque no estaba la beneficiaria, vía telefónica informo que en la casa se encontraba la hija y que atendería la visita, sin embargo, la hija de la beneficiaria fue grosera y manifestó que ella no iba a atendernos.
BARRIO O TERRITORIO: NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA, EL PORTAL DEL DIVINO, EL REFUGIO I Y II
APERTURAS DURANTE EL MES DEL INFORME
01/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** Se realiza apertura de obra con la beneficiaria, se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta, ciuchilas, a demás de la cocina y el baño. La señora Mariela se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
01/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA** Se realiza apertura de obra con la beneficiaria, se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta, enchape de mesón y muros de cocina de la cocina, enchape y combo sanitario en baño y cambio de lavadero. La señora Diana se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
01/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza apertura de obra con la beneficiaria, se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta, pañete en dos habitaciones, demolición y fundición de mesón de cocina, baño completo y hall de la entrada. La señora Concepción se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
02/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza apertura de obra con la beneficiaria, se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta, preparación de muros. pintura y enchape de la vivienda, intervención en cocina y baño. La señora Maria se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
02/03/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS COLMENARES** Se realiza apertura de obra con la persona autorizada (Olga) se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta, cuchillas, cielo raso en doa habitaciones, cocina y baño. La señora Olga se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
02/03/2023 **MV_01514 ANA JULIA GURIERREZ** Se realiza apertura de obra con la persona autorizada (esposos de la beneficiaria) se socializa carta de trato digno, se diligencia acta de inicio, la parte técnica expone el presupuesto y refiere que las actividades a ejecutar son el desmonte y monte de cubierta. La persona autorizada se muestra de acuerdo y firma a conformidad. Se deja la bitacora en la casa e ingresa personal de obra.
02/03/2023 **MV_02838 SEGUNDO MARCELINO MENDOZA** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia de la beneficiaria, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: Enchape de piso, pañete y pintura de sala comedor, enchape de piso y pintura en muros de la cocina(no se realizara mesón), habitaciones 1 y 2 completas.
02/03/2023 **MV_02798 MARIA ELODIA NIÑO** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia de la beneficiaria, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: cambio de cubierta, cocina y baño completos (enchape, pañete y pintura).
02/03/2023 **MV_02921 HUMBERTO AVILA CRUZ**, Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia de la beneficiaria, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: cocina, baño, sala comedor completos (enchape de piso, pañete y pintura), puerta de baño y combo sanitario.
03/03/2023 **MV_02833, MARIA CRISTINA MONSALVE CAICEDO, DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Habitación 2 y 3: pañete, pintura, cielo raso pvc, Habitación 1: Alistado, enchape piso, guarda escobas, Sala: Demolición de piso, alistado piso, enchape piso, pintura, cielo raso pvc. Zona ropas: lavadero nuevo, pintura, cielo raso pvc, Estudio: cielo raso pvc, pintura, preparación piso, alistado, enchape, guardaescobas, Cocina: Demolición de enchape piso y muros, alistado, enchape piso, enchape muros, lavaplatos, mas griferia, Baño: demolición enchape piso, y muros, enchape piso, alistado, enchape muros, puerta, combo sanitario.
03/03/2023 **MVAL_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO**, Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Habitación 1, 2 y 3 preparación, alistado, enchape piso, guarda escobas, cielo raso pvc, bala led, pintura muros, Sala: preparación, alistado, enchape piso, guarda escobas, cielo raso pvc, bala led, pintura muros, Cocina: Mesón en concreto más enchape mesón, demolición piso, alistado piso, enchape piso, pintura muros, cielo raso, bala led, Baño: cambio de combo, pintura, cielo raso pvc, bala led, Zona ropas: Demolición piso, alistado, enchape piso, guarda escobas, pintura, cielo raso pvc, bala led, lavadero nuevo, enchape muros, Hall: Demolición piso, alistado piso, enchape piso, pintura, guarda escobas, cielo raso pvc, bala led,
09/03/2023 **MV_0022 REINEL DÍAZ SABOGAL** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: alistado y enchape de pisos, enchape de muro y mesón en el área de la cocina, pañete, estuco y pintura en muros de la cocina, enchape de pisos y muros, instalación de combo sanitario y puerta en baño, alistado, enchape de pisos y pañete, estuco y pintura en muros de las habitaciones 1, PVC en las todas las áreas..
10/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza apertura de vivienda se firma la documentación correspondiente y el área técnica expone que las áreas a intervenir son el cambio de cubierta en toda la vivienda, pintura con preparación en muros, instalación de lavadero y enchape en salpicadero, además del cambio de la puerta del baño. El señor Luis Gabriel, siendo el autorizado manifiesta conformidad y se responsabiliza del retiro y disposición de las tejas en asbesto. Se deja la bitácora en la vivienda e ingresa personal de obra.
10/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza apertura de vivienda se firma la documentación correspondiente y el área técnica expone que las áreas a intervenir son pañete y pintura en muros, alistado de pisos, intervención completa en baño, enchape en mesón de cocina y paredes y pisos de esta área, además de enchape de salpicadero en zona de lavado. La beneficiaria manifiesta conformidad. Se deja la bitácora en la vivienda e ingresa personal de obra.

10/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN** Se realiza apertura de vivienda , se firma documentación correspondiente y el área técnica expone que las áreas a intervenir son; pañete en área de patio e instalación de lavadero, pintura en las habitaciones menos en una que no se abordara por una situación de humedad, enchape de piso en la vivienda, adecuación de puntos hidraúlicos del baño e instalación de combo sanitario, intervención en la cocina e instalación de cielo raso en pvc en cocina, baño. {area social y habitaciones intervenidas. El beneficiario manifiesta conformidad, se hace entrega de la bitácora e ingresa personal de obra a la vivienda.
14/03/2023 **MV_02771 HERMENEGILDO PEDRAZA MORENO** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: cubierta, habitacion 1enchape de piso, pañete y pintura,, cocina enchape de piso, meson, pañete y pintura, y baño con enchape de piso de muros y pañete y pintura.
14/03/2023 **MV_02835 GRACIELA SANCHEZ MILAGUY** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: habitaciones 1-2-3 enchape de piso, pañete y pintura, sala comedor enchape de piso, pañete y pintura, cocina enchape de meson y muro, istalacion de puerta de baño.
14/03/2023 **MV_02816 BLANCA NIDIA GUTIERREZ** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: habitacion 1 y 2 , sala comedor y cocina pisos, pañete y pintura, baño instalacion de puerta.
14/03/2023 **MV_02823 MARIA NUBIA CALERO** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: habitacion 1 y 2 enchape de piso, pañete y pintura, cocina enchape de piso, meson, pañete y pintura, sala enchape de piso, pintura y baño con enchape de piso de muros y pañete y pintura.
14/03/2023 **MV_03514 CLARA INES SANTANA** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: cubierta completa, pintura y pvc en todas las areas.
14/03/2023 **MV_03487 ROBERTO CUERVO** Se realiza visita de apertura de la vivienda, en presencia del beneficiario, se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora, se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, y así mismo las actividades a desarrollar, las cuales son: cubuerta completa, pintura y pvc en habitacion 1.
14/03/2023 **MV_02905, NORFI URBINA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta cambio completo, baño: demolición piso baño, alistado, enchape piso, enchape muros en todo el baño, combo sanitario, puerta, pañete muros, pintura, cocina: demolición de mesón, mesón en concret,o alistado, enchape piso, enchape mesón, salpicadero y pared más grifería, pintura, sala: alistado enchape piso, guarda escobas, pañete y pintura.
14/03/2023 **MV_02901, MARÍA DORIS GAONA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cocina alistado preparación en chape piso me sobren concreto el chape mesón lavaplatos más grifería enchapes salpicadero cielo raso PVC, Habitación uno y dos preparación alistado enchape piso guarda escobas y el raso PVC bala LED, habitación tres preparación alistado piso enchape piso guarda escobas cielorraso PVC bala led. Baño: demolición enchape alistado en chape piso en chapémuros en todo el baño combo sanitario puertas y el raso PVC bala led, zona de ropas: preparación alistado el chape piso guarda escobas en chapemuros en salpicadero y pared colindante con el baño, sala preparación alistado enchape piso guarda escoba cielo raso PVC bala led, fachada pintura.
14/03/2023 **MV_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Habitación 1 2 y 3, preparación alistado enchape piso guardaescobas pintura cielo raso PVC va la letra sala preparación alistado enchape piso cuerda escobas pintura cielo raso PVC Hall preparación alistado en chape piso guarda escobas pintura cielo raso PVC bala LED baño preparación alistado enchape piso en chapemuros combos sanitario puerta hacia lo raso PVC va la LED soné ropas preparación alistado chape piso lavadero nuevo pintura enchape salpicadero del lavadero cocina demolición de mesón mesón nuevo echapes salpicadero mesón preparación alistado en chape piso guarda escobas lavaplatos más grifería cielo raso PVC va la led pintura
14/03/2023 **MV_02895, WILSON BERTIZ DEL VALLE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cambio de cubierta completa, Baño: demolición piso cabina, preparación, alistando, enchape piso, enchape muros completo, puerta y pintura, Habitación 1 y 2 con cocina: cielo raso PVC y pintura, Habitación 3, baño, Hall, zona de ropas, sala: pintura.
14/03/2023 **MV_02896, YANIRA VERA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO,** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: CAMBIO COMPLETO CUBIERTA, Baño: cambio combo sanitario, pañete faltante, enchape completo 1.80, Cocina: enchape mesón, demolición enchape salpicadero, enchape salpicadero, pintura, lavaplatos y pintura, Hab 1 2 y 3: pintura, cielo raso PVC, bala led, Sala, Hall: pintura, Zona de ropas: enchape salpicadero lavadero, pintura

21/03/2023 **MV_02731, HOLANDA CAICEDO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta, cambio de cubierta completa, cocina: demolición y chape de salpicadero enchape de mesón enchape salpicadero enchape de mesón lavaplatos más grifería baño demolición de piso alistado enchape piso enchape muros completo a una altura de 1,80 cambio combo sanitario, puerta, cielo raso PVC bala LED sala: pintura cielo raso PVC más bala LED habitación cielo raso PVC más bala led pintura.
22/03/2023 **MVAL_00310, LUIS ALBERTO ALVARADO, DESARROLLO NUEVO PORVENIR:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Baño completo, combo sanitario, puerta, pintura, cocina: mesón, enchape muro y enchape piso, resane general de muros, pintura general, habitación: N.1, N.2 Y N.3, cielo raso PVC, pintura, hall: cielo raso PVC.
22/03/2023 **MVAL_03628, INGRID VERGARA, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: cambio de cubierta completa, cocina: mesón completo, enchape muro y enchape salpicadera: baño: cambio combo, pañete, enchape muro, pintura, puerta.
22/03/2023 **MVAL_03763, GONZALO CARDENAS, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Área cocina: demolición enchape existe, enchape pisos pared, pintura, área social: enchape piso, guarda escobas y pintura, hab, 1 y 2 enchape pisos, pintura, área baño: combo sanitario pintura, enchape piso y pared completo, zona ropas lavadero: enchape salpicadera y piso, hall: enchape piso y pintura.
22/03/2023 **MVAL_03831, FRANCO MELO, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: cambio de cubierta completa, habitación N.1: Estuco, pintura, cielo raso pvc, zona de lavado: lavadero nuevo, enchape muro, enchape pisos, pintura
22/03/2023 **MV_02904, BERNICE VALENCIA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cielo raso en toda la zona de la casa menos en la zona de ropas, pintura sobre pañete en toda la vivienda, cocina: demolición de mesón, mesón en concreto, enchapado en toda la cocina a una altura 2.27, lavaplatos más grifería, demolición de pisos, alistado, enchape piso, Zona de ropas: lavadero nuevo, enchape de muros, salpicadero, Sala: pañete, alistado, enchape, guarda escobas.
22/03/2023 **MV_02842 LUIS GABRIEL ROJAS, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: cambio completo de cubierta, cocina: pañete, demolición de mesón, mesón en concreto, enchape muros, alistado, enchape piso, lavaplatos, grifería, Sala: Pañete, alistado, enchape piso, guarda escobas, pintura, habitación N.1, pañete, alistado, enchape piso, guarda escobas, pintura, Hall: alistado, enchape piso, guarda escobas, pintura, pañete, baño: alistado, enchape piso, enchape muros a una altura de 1.80, combo sanitario, puerta, zona ropas: alistado, enchape pisos, guarda escobas, pañete y pintura.
23/03/2023 **MV_02844, MARIA ESPERANZA USUGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: Cambio de cubierta completa, enchape en pisos, en habitación N.1, N.2, Hall, sala y Cielo raso PVC en habitación.
24/03/2023 **MV_02857, JOSÉ YESID GALINDO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cocina: alistado, enchape piso, demolición mesón, mesón concreto, lavaplatos más grifería pañete enchapa en muros de cocina a una altura 1.80, zona de ropas: pañete, alistado, enchape piso, guarda escobas, lavadero nuevo, enchape salpicadero, pintura, baño: enchape muros en todo el baño a una altura 1,80 alistado, enchape piso, combo sanitario, puerta, habitación N.1 y N.2 desmonte piso, alistado, enchape piso, guarda escobas, pintura muros, Hall: alistado, enchape piso, guarda escobas, pañete, pintura, sala: alistado, enchape, sala: alistando, enchape, guarda escobas, pintura y pañete, garaje: alistando, enchape guarda escobas.
24/03/2023 **MVAL_03505, ANA SIERRA, DESARROLLO REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: cubierta completa, cocina: alistado, pañete, mesón, lavaplatos más grifería, baño: alistado, pañete, enchape, combo sanitario y puerta. la vivienda no lleva cielo raso PVC, enchape en cocina pisos y muros.
24/03/2023 **MVAL_03616, MARÍA ROCIO QUEMBA, DESARROLLO REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: cubierta en el área construida, baño: completo con puerta, cocina completa, sala comedor y habitación: alistado, pañete, pintura y enchape piso, vivienda sin cielo raso pvc

24/03/2023 **MVAL_03508, ANA SILVIA TORRES, DESARROLLO REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: Cubierta: media cubierta, habitación N1 y N2, alistado, pañete, pintura y enchape piso, baño: alistado, enchape, pintura, combo sanitario, pañete en cuchillas y pintura
27/03/2023 **MV_02888, MARIELA GARCÍA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: CUBIERTA: COMPLETA, COCINA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MESON, ENCHAPE MURO, ENCHAPE MESÓN, ZONA DE ROPAS: LAVADERO NUEVO, ENCHAPE SALPICADERA BAÑO: DEMOLICIÓN ENCHAPE, COMBO SANITARIO, PUERTA.
27/03/2023 **MV_02782, MANUEL GONZÁLEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: CUBIERTA PARTE FRONTAL: HABITACIÓN N3 Y N4 PAÑETE, ALISTANDO PISO, ENCHAPE PISO, PINTURA, BAÑO: PAÑETE, ALISTADO PISO, ENCHAPE, COMBO SANITARIO, PUERTA. ZONA DE LAVADO: LAVADERO NUEVO, PAÑETE Y ENCHAPE SALPICADERA.
28/03/2023 **MVAL_03418, MARÍA ISABEL DÍAZ, DESARROLLO REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: PISOS EN TODAS LAS ÁREAS EXCEPTO BAÑO, CIELO RASO PVC EN LAS DOS HABITACIONES Y BAÑO, ENTREPAÑO DEL MESON ENCHAPADO, Y PUERTA DE BAÑO
29/03/2023 **MVAL_03778, DILSA YASMIN BERNAL, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: PAÑETE EN MUROS, ALISTANDO, ENCHAPE Y PINTURA, EN HABITACIONES N1 Y N2. HALL, ZONA DE LAVADO Y BAÑO Y ÁREA SOCIAL BAÑO: COMBO SANITARIO PUERTA.
29/03/2023 **MVAL_03737 SALOMÓN VARGAS** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son; el cambio de cubierta con estructuras y accesorios, fundicion de mesón sin entrepaño en cocina, griferia y lavaplatos. enchape de piso en baño, cambio de combo sanitario e instalación de puerta. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
29/03/2023 **MVAL_03684 JOSÉ SUÁREZ PÉREZ** Se realiza apertura de vivienda en presencia de la autorizada donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son; enchape de pisos, estuco y pintura en sala, comedor, habitaciones 1 , 2, hall y en el baño. Cielo raso en habitaciones y baño; además de cambio de combo sanitario, enchape en muros e instalación de puerta de baños. Al encontrar conformidad por parte de la persona autrizada se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MVAL_07550, SANDRA PATRICIA MUÑOZ, DESARROLLO COMPOSTELA:** Se realiza visita de apertura en compañía del beneficiario, en donde se explica el presupuesto inicial de obra, se hace entrega de la carta del buen trato, se socializa el acta de inicio, se hace entrega de la bitácora y se firma la documentación correspondiente. Adicionalmente, el equipo social menciona las recomendaciones generales para la realización de las actividades y trato a tener con el personal de obra. Por último, el equipo técnico indica cuales son las áreas para intervenir, que para este MV. Tales como: CUBIERTA: CAMBIO DE CUBIERTA COMPLETA, BAÑO: DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EXISTENTE, ALISTADO, ENCHAPE DE MUROS, COMBO SANITARIO, CIELO RASO PVC EN HABITACION N.1, N.2 Y N.3 Y SALA, PINTURA EN HABITACION N.1, N.2 Y N.3.
30/03/2023 **MV_02893 LUIS ROBERTO PÉREZ RINCÓN** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son; el cambio de cubierta con estructuras y accesorios, instalación de PVC, pisos enchape, guardaescoba y pintura en toda la vivienda. Intervención completa en cubierta (mesón enchape, pintura, lavaplatos), intervención completa en baño (cambio de combo, enchape, pintura e instalación de puerta). Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MV_02742 CRISTOBAL GALINDO** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MV_02757 GUILLERMO LEON SORIA** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MV_02752 EVIDALIA RUIZ** Se realiza apertura de vivienda en presencia de la beneficiaria, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades. Al encontrar conformidad por parte de la beneficiaria se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MVAL_03788 OVIDIO PRIETO** Se realiza apertura de vivienda en presencia de la autorizada donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son; pañete en tres habitaicones, pisos, guardaescobas y pintura. intervención completa en cocina (meson, enchape, lavaplatos, pintura), en la zona de baño enchape, instalación de puerta, cambio de combo. Además de pisos, guardaescobas y pintura en hall y zona de la sala Al encontrar conformidad por parte de la persona autrizada se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
30/03/2023 **MVAL_03509 LUIS EDUARDO CESPEDES** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.

31/03/2023 **MVAL_03614 YERSON SAMIR GARCÍA GAITAN** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son;pañete y pintura en habitaciones 1 y 2, sala comedor, hall, cocina y baño. Baño completo con enchapes, cambio de combo, enchapes e instalación de puerta. Cocina completa con medón lavaplatos, enchapes y pintura. en zona de lavado se enchapará el salpicadero, , se harán mochetas e instalará lavadero. además de contemplar enchape de piso en habitaciones y hall.. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
31/03/2023 **MVAL_03530 BLANCA MYRIAM GALINDO PÉREZ** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades como son pañetes en muros de la vivineda, cocina completa, baño completo y pvc en zona de la sala. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
31/03/2023 **MVAL_03721 JUAN ALBERTO CALZADA MONTAÑO** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
31/03/2023 **MVAL_03751 BERTHA SILVIA MORA BARAJAS** Se realiza apertura de vivienda en presencia del beneficiario, donde se firma el acta técnico social de inicio, se socializa y firma la carta del trato digno, se expone el presupuesto y las actividades priorizando el cambio de cubierta. Al encontrar conformidad por parte del beneficiario se hace anotación en bitácora y se firma documentación, se presenta e ingresa personal de obra a la vivienda y se deja bitácora en la casa.
31/03/2023 **MVAL_07525 DAVID STEVEN PUENTES HERNANDEZ** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Se cambiará cubierta completa, baño completo, combo sanitario, puerta de madera, cocina completa, sala enchape piso, pintura, habitación 1 y 2 pintura, enchape piso, se pondrá PVC en todas las áreas.
31/03/2023 **MVAL_07528 MARIA BERENICE AYALA SARMIENTO** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: media cubierta, enchape piso sala, pintura, cocina completa, combo sanitario, habitación 1 y 2 enchape piso, pintura, zona de ropas enchape piso, pintura sin PVC en ningún área.
31/03/2023 **MVAL_07532 BERTHA SOFIA QUINTERO GALLEGO** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: cubierta completa, combo sanitario, en habitación 1 enchape piso, pintura, PVC.
31/03/2023 **MVAL_07525 MARIA GLADYS MONASTOQUE HUERTAS** Se realiza apertura donde indican algunas recomendaciones a nivel general sobre el mejoramiento y los cuidados de sus objetos de valor y personales. Se presenta el personal a ejecutar obra y las actividades a realizar. Se despejan sobre el presupuesto. Se entrega carta de trato digno y bitácora. Informando ubicación de PAC, horarios, días de atención y números de contacto. Actividades a realizar: cubierta completa.
BARRIO O TERRITORIO: NUEVO PORTAL, TRIANGULO, NUEVO PORVENIR,PORTAL DE LA VEGA, EL PORTAL DEL DIVINO, EL REFUGIO I Y II
SEGUIMIENTOS SOCIALES
02/03/2023 **MV_00062 LUZ MARINA CASTILLO** Se realiza seguimiento identificando que se encuentran realizando actividades de instalación de cielo raso, la parte técnica verifica actividades y deja los pendientes identificados para programar entrega de la vivienda- Se aborda a la beneficiaria quien manifiesta conformidad, niega novedades.
03/03/2023 **MV_00064 ALBA REMISSIO** Se realiza seguimiento de obra identificando que continuan con actividades de pintura, la parte técnica realiza seguimiento correspondiente y según los pendientes, se programa entrega de vvivienda.
03/03/2023 **MV_1374 NORA ELIZABETH VACCA** Se realiza seguimiento de obra identificando que continuan con actividades de instalación de cielo raso, la parte técnica realiza seguimiento correspondiente y según los pendientes, se programa entrega de vvivienda.
03/03/2023 **MV_1512 WILLIAM EDUARDO GONZALEZ** Se realiza seguimiento de obra identificando que continuan con actividades pintura, la parte técnica realiza seguimiento correspondiente y según los pendientes, se programa entrega de vvivienda.
03/03/2023 **MV_02875 LUIS CARLOS MORENO, DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape sala comedor, cocina: inicio de mesón, baño: pañete en muros e inicio enchapa, habitación N1 pañete, no se encontraba la persona encargada en la vivienda
03/03/2023 **MV_00364 LUZ MIRIAM ARGUELLO** se evidencia avance de obra estructura para cielo raso en habitación 1, sala comedor, cocina y hall. por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
03/03/2023 **MV_01420 MARIA INES CORREA** se evidencia avance de obra en instalación de cielo raso en cocina, hall, habitación 1, sala comedor. por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
03/03/2023 **MV_0030 FLOR MARINA MORENO** se evidencia avance de obra en alistado de muros para pañete en sala comedor, cocina y baño. por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
03/03/2023 **MV_1201 YINA MARCELA MIRANDA** se evidencia avance de obra en habitación 1 y 2 pintura, enchape de muros en cocina y baño, boca puertas. por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_01268 ÁNGELA PAOLA BERMÚDEZ** Se realiza seguimiento en la vivienda identificando que se encuentran avanzando en actividades de pintura, la persona autorizada niega inquietudes, no se presentan novedades sociales.
06/03/2023 **MV_01270 ROSENDA MACÍAS DE CARO** Se realiza seguimiento de vivienda idenitficando que el personal de obra se encuentra instalado PVC en habitaciones, en la vivienda se encuentran a la espera del lavadero para la instalación.
06/03/2023 **MV_1374 NORA ELIZABETH VACCA ARIAS** Durante el seguimiento no se encuentra el maestro dentro de la vivienda, sin embargo se logra identificar que se encunetran en la fase final, motivo por el cual la parte técnica propone seguimiento final para verificar el cumplimiento a totalidad de las actividades.

06/03/2023 **MV_01265 MARÍA JASMIN ROJAS ROJAS** Se realiza seguimeinto identificando que continuan avanzando actividades de obra en zona de la cocina y del patio, se aborda a la beneficiaria quien niega novedades.
06/03/2023 **MV_01514 ANA JULIA GUTIERRES** Se realiza seguimiento identificando que ingreso material a la vivienda, los maestros se encuentran avanzando en alistado de piso en cocina, se aborda al autorizado quien manifiesta conformidad con inicio de actividades.
06/03/2023 **MV_1512 WILLIAM EDUARDO GONZALEZ** Se realiza seguimientode vivienda identificando que el maestro se encuentra ejecutando las solicitudes emitidas por la parte técnica para dar cumplimiento a las actividades propuestas a ejecutar en la vivienda.
06/03/2023 **MV_0030 FLOR MARINA MORENO** se evidencia avance de obra en alistado de pisos en habitacion 1, sala comedor, cocina, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_0026 ANA VERONICA SALCEDO** se evidencia avance de obra en enchape de meson de cocina, enchape de piso en sala y habitacion, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_0021 SHIRLEY VALENCIA** se evidencia avance de obra en enchape de muro de cocina, enchape de piso en habitación 1 y baño, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/04/2023 **MV_01425 HERNANDO CANIZALEZ** se evidencia avance de obra en pañete de muros de alcoba 1, cocina y sala comedor, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_1201 YINA MARCELA MIRANDA** se evidencia avance de obra enchape de piso y pintura en habitacion 1 y 2, hall y cocina, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_00364 LUZ MIRIAM ARGUELLO** se evidencia avance de obra en enchape de muro de cocina, enchape de piso y muros del baño, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_02848, SILDANA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia proceso de avance en pañete en habitación N2, se le informa a la beneficiaria la importancia de levantar los electrodomesticos, para que no se le vayan a dañar durante el desmonte de la cubierta, Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
06/03/2023 **MV_02875, LUIS CARLOS MORENO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia proceso de avance de obra en baño y cocina con pañete e inicio de enchape, Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
07/03/2023 **MV_01518, ROSA DELIA LÓPEZ, DESARROLLO NUEVO PORVENIR:** Se evidencia terminados en sala, cocina, patio, hall y pintura. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
07/03/2023 **MV_01367 SANDRA MERA** Se realiza seguimeinto con parte técnica quien brinda claridad a inquietudes manifestadas por la beneficiaria, se observa al personal de obra realizando actividades, se idnetifica que haya claridad por parte de la señora Sandra.
08/03/2023 **MV_02875, LUIS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia pañete en habitación, terminado de enchape en baño y montura de inodoro, cocina enchapada con meson enchapado. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
08/03/2023 **MV_02864, RAFAEL VEGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de desmonte de cubierta e inicio de instalación de cubierta, sin novedades por parte del área Social.
08/03/2023 **MV_02848, SILDANA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de desmonte de cubierta e inicio de instalación de cubierta y alistado de piso en habitación N2. Sin novedades por parte del área Social.
09/03/2023 **MV_01266 VICTOR BAQUERO** Se realiza seguimiento identificando que falta instalar el lavadero, ademas se deja registro en la bitácora en el cual la parte técnica deja estipulados los compromisos para dar terminación a las actividades propuestas.
09/03/2023 **MV_01265 MARÍA JASMIN ROJAS ROJAS** Se realiza seguimiento a la vivienda identificando que se terminaron actividades en área de la cocina, la parte técnica realiza anotación en botacora con compromisos para dar cumplimiento a las actividades propuestas.
09/03/2023 **MV_01270 ROSENDA MACÍAS DE CARO** Se realiza seguimiento identifiando al maestro finalizando actividades, se observa la instalación del lavadero y la parte tecnica realiza verificación para programar entrega.
09/03/2023 **MV_01268 ÁNGELA PAOLA BERMÚDEZ** Se realiza seguimiento con el componente técnico quien realiza verificación y se programa entrega, Se aborda a la persona autorizada quien niega novedades.
09/03/2023 **MV_000106 DEMOFILO CRISTIANO** Se realiza seguimeinto abordando a la persona autorizada quien niega novedades, se observa la instalación de la cubierta en la vivienda..
09/03/2023 **MV_01367 SANDRA MERA** Se realiza seguimiento identificando que se encuentra enchapando el área social, se aborda a la beneficiaria quien niega novedades y manifiesta conformidad.
10/03/2023 **MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de alistado de piso habitación N1. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MV_02875, LUIS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de instalación de lavamanos en baño, terminación de enchape en el entrepaño de meson. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MV_02864, RAFAEL VEGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de pañete en muros divisoriosinternos, montura de estructura para cielo raso. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MV_02848, SILDANA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de levante de cuchillas y amarre de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/04/2023 **MV_01425 HERNANDO CANIZALEZ** se evidencia avance de obra en enchape de pisos de hall, zona de ropas, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MV_0026 ANA VERONICA SALCEDO** se evidencia avance de obra instalacion de combo sanitario, bocapuertas y retoque de pintura, vivienda al 90 %, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MV_ 1426 MARIA EDILMA DUEÑAS** se evidencia avance de obra en enchape de muro y mesón de cocina, pañete de muros, enchape de piso e instalación de estructura de cielo raso en habitación 1, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
10/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** Se realiza seguimiento identificando que el personal de obra ha adelantado actividades en zona de baño y patio, durante la visita se observan interviniendo el mesón y enchape de muro en cocina. La parte técnica

13/03/2023 **MV_0030 FLOR MARINA MORENO** no hay vanace de obra puesto que se suspendio por perdida de herramientas de los maestos de obra, desde el Componente social se llego acuerdo sobre retomar actividades y que la beneficiaria asuma la responsabilidad del cuidado de los materiales y herramientas que estan en la vivienda durante la ejecucion de la obra.
14/03/2022 **MV- 1230 MARLEN PUERTO DESARROLLO** se realiza seguimiento al PQR, en este momento sigue abierto debido a que se han presentado lluvias y no se ha podido cambiar la canal, desde el área social se le explico a la beneficiaria y se dejó compromiso de realizar los arreglos en la semana del 18 al 24 de marzo 2023.
14/03/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS** Se realiza seguimiento de vivienda identificando que no han ingresado ni material, ni maestros; motivo por el cual se procede a hacer anotación en bitácora y se solicita al contratista gestionar la ejecución de obras
14/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** Se realiza seguimiento idnetificando que se llevo a cabo la instalación de cubierta, se aborda a la beneficiaria quien niega novedades.
14/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** Se realiza seguimieto a la vivienda identificando que se continuan avanzando actividades en el área de la cocina, enchape de mesón y al aborar a la beneficiaria la parte técnica ex`pne que se relaizaran modificaciones en el presupuesto por actividades de mampostería.
14/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza seguimeinto a la vivienda identificando que no se han iniciado obras, no se ha ingresado material ni personal de obra, durante la visita no se encuentra nadie al interior de la vivienda.
14/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza seguimeinto a la vivienda identificando que no se han iniciado obras, no se ha ingresado material ni personal de obra, durante la vivita no se encuentra nadie al interior de la vivienda.
14/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza seguimeinto identificando que hay material (arena) sin embargo no se cuenta con presencia de maestros, se hace anotación en bitácora para que el contratista gestione y solicite el inicio de actividades de forma inmediata.
14/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimeinto a la vivienda identificando que no se han iniciado obras, no se ha ingresado material ni personal de obra, durante la visita no se encuentra nadie al interior de la vivienda.
14/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN** Se realiza seguimeinto a la vivienda identificando que no se han iniciado obras, no se ha ingresado material (solo se observan bultos de arena fuera de la casa) ni personal de obra, durante la visita no se encuentra nadie al interior de la vivienda.
14/03/2023 **MV_000106 DEMOFILO CRISTIANO** Se realiza seguimiento identificando que no se cuenta con la presencia de beneficiarios, desde el exterior se puede evidenciar que los maestros ejecutaron las actividades solicitadas por la parte técnica.
15/03/2023 **MV_00364 LUZ MIRIAM ARGUELLO** se evidencia avance de obra en pañete y pintura de muros en todas las areas, por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
15/03/2023 **MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape y guarda escobas habitación N 1,. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
15/03/2023 **MV_02833, MARÍA CRISTINA MONSALVE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de demolición enchape baño, inicio enchape en cocina, Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
16/03/2023 **MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape y guarda escobas habitación N 1 y N.2, con pintura en muros. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
16/03/2023 **MV_02833, MARIA CRISTINA MONSALVE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape en cocina y mesón, alistado de piso en área social. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
16/03/2023 **MV_02895, WILSON BERTIZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** .Se le aclara el presupuesto al beneficiario, por dudas de los valores de las actividades, de igual manera se cambian actividades de cielo raso pvc, por enchape completo de cocina. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
16/03/2023 **MV_02875, LUIS CARLOS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape piso en patio de ropas, lavadero nuevo, enchap de pisos en habitación N1 y N2, pintura en habitación N1, cocina, montura de estructura de cielo raso en baño, sala y habitación N1. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
16/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** Se realiza seguimiento identificando que se pintaron los perfoles y se realizan actividades de encoroce, no se encuentra la beneficiaria en el hogar.
16/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** Se realiza seguimiento evidenciando que se continuan ejecutando actividades de enchape en baño, la parte técnica realiza verificación correspondiente, la beneficiaria niega novedades.
16/03/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS** Se aborda a la beneficiaria tras identificar que no ha ingresado material, ni maestros a la vivienda, nuevamente se realiza solicitud al contratista para la gestión oportuna con respecto al inicio de obras.
16/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza seguimeinto identificando que hay material para intervenir cubierta, sin embargo no se cuenta con presencia de maestros se deja anotación en la bitácora.
16/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimeinto a la vivienda identificando que no se han iniciado obras, no se ha ingresado material ni personal de obra, durante la visita no se encuentra nadie al interior de la vivienda. Se notifica a la parte contratista.
16/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza seguimeinto observando inicio de obras en área social con avance de pañetes, la beneficiaria niega novedades y expone conformidad.
16/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ** Se identifica personal de obra aanzando en actividades de pañete, no se cuenta con presencia de beneficiario en la vivienda para el momento de la visita.
16/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realzia seguimeinto en el cual se aborda a la beneficiria quien niega que haya ingresado material o personal de obra a la vivienda, motivo por el cual se hace reporte en bitácota y se solicita a la parte contratista cooperación para el avance e intervención oportuna en las viviendas.

16/03/2023 **MV_03614 YERSON SAMIR GARCIA GAITAN** Se realiza visita para verificar cumplimiento por parte del beneficiario en el levantamiento de muros para permitir el acceso al subsidio de mejoramiento de vivienda.
17/03/2023 **MV_02835, GRACIELA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de pañete en habitación y sala en muros**.** Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
21/03/2023 **MV_02798, MARIA ELOINA NIÑO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencian actividades de cambio de cubierta, pañete en cocina, se construye primera losa del mesón
21/03/2023 **MV_ 02835, GRACIELA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencian actividades de pañete completo habitación n1, sala comedor, demolición enchape cocina.
21/03/2023 **MV_02771, HERMENEGILDO PEDRAZA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de pañete en área de cocina. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
22/03/2023 **MV_02905, NORFI URBINA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de cambio de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
22/03/2023 **MVAL_03823, DIANA MUNERA, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se evidencia actividades de terminados de enchape en cocina, baño, y cambio completo de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
22/03/2023 **MVAL_03825, MARIELA HENAO, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se evidencia actividades de cambio de cubierta, enchape de cocina, baño, armado de mesón. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
22/03/2023 **MVAL_03827, RAÚL COLMENARES, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se evidencia actividades de cambio de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de Enchape baño y combo sanitario, pintura en habitaciones, PVC en habitaciones cocina y sala comedor. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02838, SEGUNDO MARCELINO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de pañete muros en tienda, enchape pisos, en habitación n1 y n2. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02895, WILSON BERTIZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape en cocina, baño, y salpicadero de lavadero y terminado de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02896, YANIRA VERA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape en cocina, baño, y salpicadero de lavadero y terminado de cubierta. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de enchape en baño, se entregan áreas terminadas de habitación N1 y N2. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
23/03/2023 **MV_02833, CRISTINA MONSALVE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia actividades de terminado de enchape en baño, combo sanitario, cielo raso PVC en habitaciones. r. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
21/03/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS** Se presenta situación manifestada por la persona autorizada quien expone que la cubierta de la vivienda fue desmontada sin contar con el material para realizar la instalación, motivo por el cual la casa quedo descubierta durante la noche causando ingreso de agua por lluvias, pese a que la persona autorizada negó que se hayan presentado daños materiales, se solicita al contratista realizar una gestión adecuada para evitar situaciones que puedan afectar a los beneficiarios. Se deja anotación en bitácora.
21/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** Se realiza seguimiento identificando que continúan enchapando la zona de la cocina, hay avance del mesón. No se encuentra a la beneficiaria en la vivienda durante la visita. Sin novedad social.
21/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** Se realiza seguimiento en la cual la parte técnica hace recomendaciones al maestro para la culminación de actividades. Se observa que falta la puerta del baño impidiendo que se pueda programar la entrega de la vivienda.
21/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN** Se realiza visita a la vivienda, sin embargo no se encuentra al beneficiario ni a los maestros impidiendo el acceso y seguimiento correspondiente.
21/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza seguimiento, identificando que ingresaron material a la vivienda, sin embargo la beneficiaria niega que los maestros hayan asistido para dar inicio a obras, motivo por el cual se hace anotación en la bitácora y se solicita al contratista gestionar el inicio de obras en la vivienda debido a que se supero el tiempo designado para dar inicio a obras.
21/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza seguimiento observando que se avanzaron obras de instalación de cubierta, durante la visita no se cuenta con la presencia de la beneficiaria, sin embargo el maestro presente continua ejecutando obras.
21/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimiento, sin embargo se observa que la vivienda se encuentra sin personal ni personas responsables de la vivienda, los vecinos exponen que en la mañana ingresaron material pero no se han iniciado actividades de obra en la vivienda.
21/03/2023 **MV_01266 VICTOR BAQUERO** Se realiza seguimiento, exponen que llego el lavadero que era uno de los pendientes, sin embargo no se encuentra el beneficiario y las personas que residen en la casa impiden el ingreso a la vivienda.
21/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza seguimiento evidenciando avance en enchape de piso en habitaciones,, el maestro presente se encuentra enchapando la cocina y al abordar a la beneficiaria expone conformidad y niega novedades.

21/03/2023 **MV_01367 SANDRA MERA** Se realiza seguimiento, no se encuentra al maestro presente y al abordar a la beneficiaria esta manifiesta que a solicitud de ella se detuvieron obras por motivos personales que impedían su estancia en la vivienda, sin embargo en acuerdo con el maestro se retomaran actividades de obra para culminar detalles y programar la entrega de la vivienda.
23/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO** Se realiza seguimiento identificando que se terminaron actividades de enchape en baño y se encuentran enchapando la cocina, se aborda a la beneficiaria quien expresa conformidad con las actividades ejecutadas en la vivienda.
23/03/2023 **MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES** Se realiza seguimiento y se impide la entrega de la vivienda ante la ausencia de la puerta de baño, sin embargo se hace liberación de espacios para promover el bienestar de la beneficiaria.
23/03/2023 **MVAL_03827 RAÚL URÍAS** Se realiza seguimiento y se hace reporte en la bitácora solicitando al contratista gestionar para la distribución de material y herramientas para evitar retrasos de obra dentro de la vivienda; debido a que no hace falta una teja para culminar la instalación de la cubierta e insumos para continuar con la ejecución.
23/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza seguimiento y se encuentra a la beneficiaria quien expone que a su vivienda se acercan maestros para retirar el material ingresado y trabajar en actividades de otras viviendas, motivo por el cual se hace anotación en bitácora solicitando nuevamente al contratista cooperación y mejorar la gestión para evitar la predisposición por parte de la beneficiaria.
23/03/2023 **MVAL_03831 FRANCO GUILLERMO MELO** Se realiza seguimiento identificando que se iniciaron actividades de obra previas a la apertura de la vivienda, motivo por el cual se realiza reporte en la bitácora según reportes verbales del beneficiario y maestros. Se observa que se instalo media cubierta.
23/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza seguimiento a la vivienda, identificando al maestro enchapando el área de la cocina, no se identifican novedades sociales por parte de la beneficiaria.
23/03/2023 **MVAL_03763 GONZALO CÁRDENAS** Se realiza seguimiento identificando que el personal de obra estuvo en la vivienda, los beneficiarios manifiestan conformidad.
23/03/2023 **MVAL_03628 INGRID VERGARA** Se realiza seguimiento identificando que el personal de obra estuvo en la vivienda, los beneficiarios manifiestan conformidad.
23/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCIÓN PRIETO BERNAL** Se realiza seguimiento identificando que continúan avanzando en la cubierta de la vivienda, la beneficiaria manifiesta conformidad y niega novedades.
23/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimiento identificando personal de obra en la vivienda quien avanzó en instalación de la cubierta, sin embargo en el reporte de la bitácora se expone la necesidad de que el contratista gestione para la distribución oportuna de materia e insumos, debido a que se observa que falta una teja impidiendo el avance y continuidad de la obra.
27/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza seguimiento por parte de interventoria, identificando que se encuentra el personal de obra avanzando en actividades de enchape de pisos y se adelantan actividades en la zona de baño. No se identifican novedades del componente social, la señora concepción manifiesta conformidad con avance de actividades.
27/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimiento por parte de interventoria, identificando que se llevo a cabo el cambio de cubierta, sin embargo se impide llevar a cabo anotación ya que no se encuentran personas al interior de la vivienda.
27/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN** Se realiza seguimiento, sin embargo se identifica que nuevamente la vivienda se encuentra sin personas a su interior, impidiendo revisar adelantos de obra.
27/03/2023 **MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ** Se realiza seguimiento de vivienda identificando que se llevó a cabo el enchape total en la zona de la cocina y se avanza en actividades de pintura. Se aborda a la beneficiaria quien niega novedades.
27/03/2023 **MVAL_03628, INGRID VERGARA** Se realiza seguimiento identificando que se llevo a cabo el desmonte de la cubierta y el personal de obra esta instalando perfiles, se aborda a la señora Ingrid quien refiere conformidad con inicio de obras, niega novedades.
27/03/2023 **MVAL_03763, GONZALO CARDENAS** Se realiza seguimiento identificando que se ingreso material a la vivienda, sin embargo no hay maestros presentes.
27/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza seguimiento identificando que se llevo a cabo el cambio de cubierta, sin embargo para el momento de la visita no se encuentra al personal de obra en la vivienda, se aborda a la beneficiaria quien solicita la presencia del personal para dar continuidad a las actividades y evidenciar el avance.
27/03/2023 **MVAL_03831, FRANCO MELO** Se realiza seguimiento por parte de interventria identificando que se llevo a cabo el desmonte de la mitad de la cubierta, y se encuentran levantando cuchillas, el beneficiario niega novedades.
27/03/2023 **MVAL_03827, RAÚL COLMENARES** Se realiza seguimiento de interventoria en compañía de los contratistas y se establece contacto con el señor Raul Colmenares a quien desde el componente técnico se le da claridad de las actividades y se abordan inquietudes referentes a las obras, se identifica conformidad por parte del beneficiario y la persona autorizada.
27/03/2023 **MVAL_03825, MARIELA HENAO** Se realiza seguimiento identificando que se culmino con las actividades de enchape en zona de la cocina, la parte técnica realiza verificaciones correspondientes y abordan al maestro para programar entrega de la vivienda. Desde el component4e social se aborda a la beneficiaria quien manifiesta gratitud y ocnformidad con avances.
28/03/2023 **MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN** Se realiza seguimiento en compañ ía de la parte técnica de obra identificando que el personal continua avanzando con pañetes en cocina y stán enchapando el área del baño, durante la visita no se identifica la presencia del beneficiario en la vivienda. Se solicita al contratista establecer comunicación con el beneficiario para que deje la bitácora accesible debido a su ausencia y el impedir encontrar esta para realizar los registros pertinentes.

28/03/2023 **MV_02901, MARIA DORIS GAONA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: montura de estructura para cielo raso PVC, alistado de pisos en habitación N1 y N2. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
28/03/2023 **MV_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: enchape muros de cocina y montura de cielo raso PVC, en habitaciones, sala comedor. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
28/03/2023 **MVAL_03487, JOSÉ CUERVO, DESARROLLO REFUGIO 1 Y 2:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: cocina: pañete muros, inicio de enchape en salpicadero e inicio de construcción de mesón, Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_02844, MARÍA ESPERANZA USUGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: habitación: enchape en habitación N1, e inicio de enchape en habitación N2. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_02905, NORFI URBINA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: habitación: enchape en pisos en habitación N1, enchape de pisos en sala comedor y cocina, y enchape muros y mesón en cocina, e instalación de cubierta con su respectiva perfileria. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_02901, MARÍA DORIS GAONA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: montura de estructura para cielo raso PVC, enchape de salpicadero en zona de lavadero e inicio de enchape en pisos, habitación N1 y N2 con enchape en pisos. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: emboquilaje de cocina, instalación de lavaplatos, enchape de baño en muros y pisos, pendiente poyo por enchape, en instalación de cenefa y puerta . Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_02888, MARIELA GARCÍA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: enchape de baño en muros y pisos, pendiente poyo por enchape, en instalación de cenefa, cocina: inicio de enchape en muros, demolicion de mesón, . Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_ 03514, CLARA INES SANTANA, EL REFUGUIO 1 Y 2 :** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: Pintura en habitación N1 y N2, montura de estructura para cielo raso PVC, inicio de pintura zona de ropas, cubierta completa. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_ 03505 ANA SIERRA, EL REFUGUIO 1 Y 2:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: Construcción de muro divisorio entre cocina y baño, inicio de construcción de mesón. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_03508, ANA SILVIA TORRES, DESARROLLO EL REFUGIO 1 Y 2:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: Habitación N1 pañete en muros enchape piso y guarda escobas, pañete en cuchillas, baño: alistado, pañete en muros, enchape muros, inicio enchape en piso. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
29/03/2023 **MVAL_03831, FRANCO MELO** Se realiza seguimeinto en compañía del contratista verificando la instalación de la cubierta faltante, sin novedad social.
29/03/2023 **MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO** Se realiza seguimiento de obra con la parte contratista e interventoria, identificando que se llevaron a cabo algunas adecuaciones la cubierta, sin embargo para el momento de la viisita no hay personal de obra ejecutando actividades.Se deja reporte en la bitácora.
29/03/2023 **MVAL_03825, MARIELA HENAO** Se realiza seguimiento identificando que se instalo puerta de baño y solo queda la instalación de flanches como compromiso asignado por la parte técnica para proceder con la entrega de la casa. Se programa entrega para el día viernes, la beneficiaria niega novedades sociales.
29/01/2023 **MVAL_03827, RAÚL COLMENARES** Se realiza seguimiento identificando que se llevo a cabo actividad de pintura en habitaciones, solo queda como compromiso la instalación de PVC, sin embargo el maestro niega disponibilidad de este en bodega. Motivo por el cual se solicita al contratista proveer de insumos necesarios para evitar retrasos en las actividades de obra en la vivienda.
29/03/2023 **MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL** Se realiza seguimiento de vivienda identificando que el personal de obra se encuentra pañetando el hall y fundiendo el mesón de la cocina, además de enchapar el piso de esta áres, se observa el enchape de muros instalado. Adicionalmente la parte técnica verifica intalación de lavamanos y enchape en zona de baño, se aborda a la beneficiaria quien exopne conformidad con avances de obra en la vivienda.
29/03/2023 **MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA** Se realiza seguimiento observando al personal de obra culminando actividades de obra, sin embargo se identifica que la puerta del baño no ha sido entregada, motivo por el cual se impide programar la entrega posterior a la revisión realizada por la parte técnica. La persona autorizada no se encuentra presente durante la visita.
29/03/2023 **MVAL_03628, INGRID VERGARA,** Se realiza seguiminto identificando que se instalo la cubierta correspondiente a la primera planta de la vivienda, se observa que el material utilizadopara la fundición del mesón de la cocina no cumple con los criterio motivo por el cual se hace anotación en bitácora y se solicita al contratista gestionar para promover la buena ejecución de actividades, al contar con parte contratista durante la visita se resuelven dudas de la beneficiaria, identificando claridad y conformidad.
30/03/2023 **MV_02823, MARIA NUBIA CALERO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: Habitación N1 pañete en muros y alistado en pisos, pañete en en zona de ropas. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
30/03/2023 **MV_02835, GRACIELA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: Habitación principal: enchape en pisos y guarda escobas, pañete y pintura en muros, se entrega espacios a satisfacción de la beneficiaria, inicio de alistado en habitación N2, pañete en sala y zona de lavado. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.
30/03/2023 **MV_02771, HERMENEGILDO PEDRAZA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se evidencia maestros en obra desarrollando actividades de: desmonte de cubierta, pañete en zona de cocina, montaje de cubierta completa. Por parte del Componente social no se evidencia novedad alguna.

30/01/2023 **MV_02816 BLANCA NIDIA GUTIÉRREZ** Se realiza seguimeinto a la vivienda, identificando a los maestros avanzar en actividades de pañete y enchape de piso, a parte técnica contratista genera reporte en bitácora de avance de obra.
30/01/2023 **MV_02921 HUMBERTO AVILA** Se realiza seguimiento en la vivienda identificando que el personal de obra se encuentra instalando la cubierta, la parte técnica contratista diligencia en la bitácora el avance de obra, posteriormente se aborda al beneficiario quien niega n
31/03/2023 **MV_00310 LUIS ALBERTO ALVARADO SANDOVAL** Se realiza seguimiento de vivineda donde se expone el cambio de actividades solicitadas por la persona auotirzada con respecto al a necesidad de cambio de cubierta, se asiste por parte de interventoria y contratistabrindando claridad y resolviendo dudas manifestadas por la autorizada, se observa que hay material dentro de la vivienda, hay conformidad y se realiza reporte en bitacora.
ENTREGAS
01/03/2023 **MV_00082 DORA LIBIA MORENO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
02/03/2023 **MV_00060 HECTOR ALIRIO BOHORQUEZ** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la persona autorizada de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
02/03/2023 **MV_01271 LUZ STELLA PEÑA** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
03/03/2023 **MV_00062 LUZ MARINA CASTILLO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
03/03/2023 **MVAL_01420 MARIA INES CORREA**: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
06/03/2023 **MVAL_00064 ALBA MARÍA REMISSIO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
09/03/2023 **MV_1374 NORA ELIZABETH VACCA ARIAS** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
09/03/2023 **MV_1512 WILLIAM EDUARDO GONZALEZ** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la persona autorizada de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
10/03/2023 **MVAL_01268 ANGELA PAOLA BERMÚDEZ** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
10/03/2023 **MVAL_01270 ROSENDA MACIAS DE CARO** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
10/03/2023 **MV_01265 MARÍA JASMIN ROJAS ROJAS** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
10/03/2023 **MV_ 01518, ROSA DELIA LÓPEZ, DESARROLLO NUEVO PORVENIR:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
13/03/2023 **MVAL_0021 SHIRLEY VALENCIA** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
13/03/2023 **MVAL_0026 ANA VERONICA SALCEDO** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
15/03/2023 **MV_00106 DEMOFILO CRISTIANO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte del beneficiario de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda a confromidad
15/03/2023 **MVAL_1201 YINA MARCELA MIRANDA** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoría a satisfacción de la propietaria de la vivienda en mención, se firman las actas finales, se entrega manual de uso y mantenimiento de las obras y el kit ecológico, vivienda libre de escombros.
16/03/2023 **MV_01425, HERNANDO CANIZALEZ, DESARROLLO NUEVO PORVENIR:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
16/03/2023 **MV_02848, SILDANA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
16/03/2023 **MV_02864, RAFAEL VEGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
16/03/2023 **MV_01514 ANA JULIA GUTIERRES** Se hace entrega de vivienda a la persona autorizada, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria lo cual es manifestado por el autorizado con respecto de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
17/03/2023 **MV_02875, LUIS CARLOS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.

23/03/2023 **MV_00364 LUZ MIRYAN ARGUELLO** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
23/03/2023 **MV_01367 SANDRA MILENA MERA QUICENO** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
24/03/2023 **MV_02833, MARIA CRISTINA MONSALVE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
24/03/2023 **MV_02895, WILSON BERTIZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
24/03/2023 **MV_02896, YANIRA VERA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO:** Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
28/03/2023 MV_MV_02838, SEGUNDO MENDOZA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
30/03/2023 MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
30/03/2023 MV_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO: Se realiza la respectiva entrega por parte del Contratista e Interventoria a satisfaccion de la propietaria en mencion a satisfaccion.
31/03/2023 **MVAL_03825 MARIELA HENAO** Se hace entrega de vivienda, tras la ejecución de actividades previamente propuestas, se identifica conformidad por parte de la beneficiaria de las intervenciones ejecutadas. Se realiza firma de documentación, socialización de manuales de uso y entrega de kit ecológico; se hace entrega de la vivienda.
RENUNCIAS
NO SE PRESENTARON RENUNCIAS EN EL TRANSCURSO DEL MES
PQRS
03/03/2023MV_1230 MARLENE PUERTA LOPEZ mediante radicado 1-2023-8319 del 1 de marzo de 2023 se recibe el siguiente PQRS "YO, MARLENE PUETA LOPEZ, IDENTIFICADO CON C.C 41.661.411 expedida en la ciudad de bogota domiciliada en la cra 7 este #99- 16 barrio nuevo porvenir localidad de usme de la ciudad de bogotaen ejercicio del derecho de peticion , que consangrsa el articulo 23 de la cosntitucion nacional y las dispociciones pertinentes del codigo contensioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente "estuve en el programa de mejoramiento de vivienda pero las mejoras no quedaron completas, no echaron los pisos, no pañertaron, no terminaron el tejado la casa es de 12 metros de fondo y solo colocaron 6 metros de tejado, el baño quedo incompleto y la cisterna me la entregaron en malas condiciones (como de segunda ya que el arbolito se le sale el aguay falto pintar, por lo tanto tengo el baño cerrado por que no funciona con normalidad, a la alcoba solo le dejaron el tejado, la dejaron en obra negra y cuando llueve se pasa el agua y se me inunda la habitacion, solicito a la entidas SDHT termine de manera oportuna la obra que dejo incompleta ya que no tengo condiciones de calidad de vida para vivir"
08/03/2023 MV_ 1230 MARLEN PUERTA LÓPEZ se realizo visita a la vivienda en compañía de la secretaria de hábitat por derecho de petición presentado por la beneficiaria en donde manifestó no estar de acuerdo con las actividades que se le realizaron y con otras que según ella quedaron inconclusas. Se le explico a la señora Marlen los alcances del presupuesto y las obras realizadas, dejando como compromisos subsanar actividades en los filos y marco de la puerta del baño, cambio de canal por una de mayor capacidad.
23/03/2023 SE REALIZA SEGUIMIENTO A PRQS MV_1230, MARLENY PUERTAS, DESARROLLO NUEVO PORVENIR, NO SE ENCONTRÓ A LA BENEFICIARIA EN LA VIVIENDA, LA COORDINADORA SOCIAL DEL CONTRATISTA DEJA NÚMERO TELEFÓNICO A UN VECINO PARA QUE PUEDA HABER COMUNICACIÓN, YA QUE LE NÚMERO DE LA BENEFICIARIA, ENVIA LAS LLAMADAS A BUZÓN
29/03/2023 CIERRE DE PQRS A SATISFACCIÓN DE LA BENEFICIARIA, MV_1230, MARLENE PUERTAS, DESARROLLO NUEVO PORVENIR En atención a lo requerido por la beneficiaria Marlene Puerta López MV_1230 la cual remite un derecho de petición con radicado 1-
El día 21 de marzo de 2023 se radica derecho de petición a la SDHT bajo radicado 1-2023-12957 "yo José Mauricio salcedo con numero de cedula 19418037 poniendo en conocimiento por qué tendría que posponer el subsidio que me ha otorgado la SDH, es por el motivo que me faltan 11 metros de cimientos a un costado con sus respectivas paredes y piso y en el momento no tengo la posibilidad económicamente para levantar estos cimientos que me ha requerido el ingeniero de obra para hacer estas mejoras, no quiero renunciar al subsidio que me ha otorgado la SDHT por lo tanto si fuera posible en cambio de la mejora hacer estos cimientos que me hacen falta ya que estos son los que me han detenido en el progreso de la vivienda ubicada en la CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE" ; se radica PQRS el dia 27 de marzo de 2023 a la interventoria bajo radicado 2-2023-28200 se programa vivita al predio del beneficiario para el dia 30/03/2023 estableciendo lo siguiente se realiza visita al Beneficiario JOSE MAURICIO SALCEDO MVAL_07543 ubicado en la dirección CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE de la localidad de Usme, barrio Compostela III. Desde el contratista de obra se realiza un primer acercamiento a la vivienda el día 1 de marzo del 2023, se realiza la visita de validación con la interventoría, donde se evidencia que la vivienda comparte los muros de los vecinos, solo tiene uno propio, que es el de la sala, se evidenció que la vivienda cuenta con grandes necesidades una de ellas cambio de cubierta, intervención en baño, cocina, pisos etc. Se le hizo la sugerencia al beneficiario de realizar la actividad de subir los muros en el perímetro de la vivienda para poder desarrollar el mejoramiento, él expresó que iba a realizar las actividades correspondientes y que iba hacer un muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda para después colocar la mampostería encima del muro, de esta forma poder realizar el mejoramiento y abarcar en gran medida las necesidades del beneficiario. El día 30 de marzo del 2023 se realiza acercamiento por parte del contratista de obra GEPM interventoria CONSORCIO INTERVIVIENDA junto con la SDHT para evaluar el derecho de petición del beneficiario, el contratista presenta el presupuesto de obra le explica las actividades que se podrían desarrollar en la vivienda, teniendo en cuenta el alcance del contrato, se evalúan las actividades junto con la Secretaria Distrital del Hábitat, pero el beneficiario manifiesta no estar de acuerdo porque él quiere hacer una desplanación en la habitación 1 y 2, realizar el muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda, la Secretaria Distrital del Hábitat, toma la decisión de dejar esta vivienda para el próximo mejoramiento con el fin de darle tiempo al beneficiario de subsanar estas actividades y que no pierda el subsidio, la vivienda es retirada del contrato.
DESISTIMIENTO (APLAZAMIENTO)

30/03/2023 MVAL_07543, JORGE SALCEDO, DESARROLLO COMPOSTELA, EN COMÚN ACUERDO CON LA SECRETARIA DEL HABITAT Y A SOLICITUD DEL BENEFICIARIO SE APLAZA EJECUCIÓN DE OBRA TENIENDO EN CUENTA QUE EL BENEFICIARIO DESEA HACER UNA MODIFICACION ESTRUCTURAL EL SU VIVIENDA Y SOLICITO QUE SE DIERAN DIAS PARA PODER REALIZARLA INTERVENCION, TENIENDO EN CUENTA QUE POR TIEMPOS NO ES POSIBLE DAR LA ESPERAL NO SE EJECUTARA LA VIVIENDA EN CONTRATO DE OBRA N° 999, RAZON POR LA CUAL DESDE LA SDTH SE INFORMA AL BENEFICIARIO QUE SU MEJORAMIENTO QUEDARA APLAZADO Y SERA OTORGADO EN LOS PROXIMOS MESES A UN NUEVO CONTRATISTA DE OBRA

PAC

PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Se establece que el punto de atencion quedara ubicado en la Carrera 7B Este No 97G-25 Sur y sera atendido los dias martes, jueves y sabados en el horario de 8:30 am a 12:00 pm Durante este mes se brindo atencion a la comunidad; Desde la profesional social del contratista de obra e interventoría realizan atención a la comunidad los días 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 de marzo de 2023, donde se acerca comunidad en general a realizar preguntas acerca del subsidio de mejoramiento de vivienda, el cual se direcciona a la comunidad a que se acerquen al super CADE de yomasa o a la secretaria Distrital de Hábitat para obtener mayor información ya que nosotros somos los contratistas de obra y de igual forma se acerca beneficiarios a realizar preguntas acerca de las actividades de obra que se están ejecutando en la vivienda.

HISTORIAS DE VIDA

NO SE PRESENTARON RENUNCIAS EN EL TRANSCURSO DEL MES

5. CASOS ESPECIALES COMPONENTE SOCIAL - CONFLICTOS Y ANÓMALIAS

INFORME QUE COMPRENDE EL MES No. 7 DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023

La beneficiaria María Miriam García, ubicada en el barrio Compostela III dirección CARRERA 10D BIS ESTE 81B 23 SUR MVAL_07537. Primer intento de validación se realiza 01/03/2023 no se encontraba nadie en el predio se realizó contacto telefónico acordando cita el 03/03/2023 beneficiaria informa dejara a cargo a alguien para este acercamiento. Cumpliendo cita acordada se realiza nuevamente contacto telefónico beneficiaria informa que su hija está en la vivienda se insiste varias veces con la finalidad de realizar la validación hija de beneficiaria abre la ventana indica que no está la beneficiaria y ella no nos atenderá no permite dar ningún tipo de información sobre esta visita. Se realiza nuevamente contacto telefónico con la beneficiaria informando la actitud de su hija y solicitando a quien deje a cargo tenga la disponibilidad para permanecer durante el proceso de validación, apertura y obra siendo cordial y atento a este proceso, dirigiéndose al personal de una forma respetuosa. Ella informa el martes 07/03/2023 atenderá la validación e informará quien quedará a cargo del proceso de mejoramiento de vivienda.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA - PLAN DE MEJORA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
N.A		

6. Actas de reunión con la comunidad y listados de asistencia o soporte de las diferentes acciones según corresponda (cuando aplique).

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR: Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en las semanas correspondientes al periodo del informe.

SE ACERCAN AL PAC BENERICIARIOS INFORMANDO QUE DEDAS LAS LLUVIAS SE ESTAN PRESENTANDO FILTRACIONES POR LAS CUBIERTAS INSTALADAS

Beneficiario JOSE MAURICIO SALCEDO MVAL 07543 ubicado en la dirección CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE de la localidad de Usme, barrio Compostela III. Desde el contratista de obra se realiza un primer acercamiento a la vivienda el día 1 de marzo del

2023, se realiza la visita de validación con la interventoría, donde se evidencia que la vivienda comparte los muros de los vecinos, solo tiene uno propio, que es el de la sala, se evidenció que la vivienda cuenta con grandes necesidades una de ellas cambio de cubierta, intervención en baño, cocina, pisos etc. Se le hizo la sugerencia al beneficiario de realizar la actividad de subir los muros en el perímetro de la vivienda para poder desarrollar el mejoramiento, él expresó que iba a realizar las actividades correspondientes y que iba hacer un muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda para después colocar la mampostería encima del muro, de esta forma poder realizar el mejoramiento y abarcar en gran medida las necesidades del beneficiario.
El día 30 de marzo del 2023 se realiza acercamiento por parte del contratista de obra GEPM interventoria CONSORCIO INTERVIVIENDA junto con la SDHT para evaluar el derecho de petición del beneficiario, el contratista presenta el presupuesto de obra le explica las actividades que se podrían desarrollar en la vivienda, teniendo en cuenta el alcance del contrato, se evalúan las actividades junto con la Secretaria Distrital del Hábitat, pero el beneficiario manifiesta no estar de acuerdo porque él quiere hacer una desplanación en la habitación 1 y 2, realizar el muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda, la Secretaria Distrital del Hábitat, toma la decisión de dejar esta vivienda para el próximo mejoramiento con el fin de darle tiempo al beneficiario de subsanar estas actividades y que no pierda el subsidio, la vivienda es retirada del contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

Imagen

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

BASE DE DATOS SEGUIMIENTO DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS EJECUCION DE OBRAS
SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Nº	Nº CONSECUTIVO DEL	MV - ID	FECHA APERTURA	FECHA CIERRE	NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE	LOCALIDAD	TCO	BARRIO	DIRECCION	TELEFONO DE CONTACTO	TIPO DE SOLICTUD				DESCRIPCION DEL ASUNTO Y/O SITUACION	RECOMENDACIÓN / TRAMITE Y/O RESPUESTA
											P	Q	R	S		
1		MV_01400	9/11/2022	16/11/2022	ARGENIS MOSQUERA	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 7 ESTE 102 SUR 25	3208111323	X				Mediante radicado 1-2022-45155- interpuesto ante la SDHT La beneficiaria remite carta refiriendo lo siguiente "respetados señores, La presente tiene como fin saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias, a su vez, de manera muy respetuosa quiero solicitar de su ayuda respecto a que Salí beneficiada con el programa de mejoramiento de vivienda, pero en el momento de la visita, no me han comunicado con anterioridad y no me ha sido posible estar en casa debido a que soy madre cabeza de familia y estoy en mis obligaciones de trabajo. Me gustaría solicitar, que para el día de la visita, me sea informado con un día de anticipación, así puedo solicitar un permiso en mi lugar de trabajo y poder atenderles a ustedes para la respectiva visita. Agradezco su colaboración…	se informa al contratista que la beneficiaria interpone petición ante la SDHT bajo radicado 1-2022-45155, se solicita se obtenga comunicación con la beneficiaria y le sea informada la fecha en que se realizara la respectiva validación por parte del área social y técnica del contratista e interventoría.
2		MV_1146	5/12/2022	14/12/2022	ALEXI CONSTANZA ROJAS LEON	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 6 ESTE 100 10 SUR	3208848352		X			A través de radicado 1-2022-48387 recepcionado ante la SDHT la beneficiaria refiere lo siguiente: Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo seria para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entones quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto porcentaje, entonces que quedaba de 14 millones y que se arreglaba el piso dependiendo de hasta donde alcanzara el presupuesto. Solicito por favor aclaren mis dudas	una vez recepcionado el PQRS se informa al contratista; por parte de interventoría se esta a la espera que el contratista informe la fecha en que se realizara la respectiva apertura se programa con el contratista que se efectuara la apertura la fecha 9 di diciembre de 2022.
3		MV_00068	19/12/2022	23/12/2022	JESUS ALFREDO VASQUEZ	USME	ALFONSO LOPEZ	EL TRIANGULO	DIG 100 D SUR Nº 6 - 26 ESTE	3115619163	X				Mediante radicado1-2022-49209 la SDHT recibe la siguiente petición: Yo Jesús Alfredo Vásquez identificado con C.C 70.600.012 fui notificado para mejoramiento de vivienda. A la fecha no me han informado para que mes me hagan o realicen las mejoras de mi predio, ubicado en el barrio el triangulo de la comuna de Alfonso lopez; petición que es remitía a la Interventoría bajo radicado 2-2022-76653	por parte de interventoría se solicita al contratista informar al beneficiario la fecha en la cual se llevara a cabo la respectiva validación por parte técnica y social de contratista e interventoría y así poder aclarar dudas al beneficiario
4		MV_00274	8/02/2023	15/02/2023	EMETERIO HERRERA SUAREZ	USME	ALFONSO LOPEZ	EL NUEVO PORTAL	DG 98 B SUR 6F 28 ESTE	3118877564	X				Mediante radicado 1-2023-3616 del 27 enero de 2023 se recibe la siguiente petición le presente es para pedir el favor una visita por motivo de infraestructura ya elaborad, con la cual tenemos varios inconvenientes les agradezco la atención prestada	se programa visita de atención el día 14 de febrero de 2023.

5		MV_01514	8/02/2023	9/10/2023	ANA JULIA GUTIERREZ DURAN	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 7 ESTE 104 58 SUR	3115188265	X				Mediante radicado 1-2023-4684 del 6 de febrero de 2023 se recibe la siguiente PQRS. Fuimos notificados del subsidio de mejoramiento de vivienda en julio del 2022 pero hasta la fecha no nos han visitado solicitamos ordenar a quien corresponda diligenciar la correspondiente visita.	se programa junto con el contratista visita de validación es importante aclarar que esta vivienda pertenece a la adición generada en grupo 1
6		MV_1230	3/03/2023	29/03/2023	MARLENE PUERTA LOPEZ	USME	ALFONSO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	KR 7 ESTE #99 -16	3185632715			X		mediante radicado 1-2023-8319 del 1 de marzo de 2023 se recibe el siguiente PQRS "YO, MARLENE PUETA LOPEZ, IDENTIFICADO CON C.C 41.661.411 expedida en la ciudad de bogota domiciliada en la cra 7 este #99- 16 barrio nuevo porvenir localidad de usme de la ciudad de bogotaen ejercicio del derecho de peticion , que consangrsa el articulo 23 de la cosntitucion nacional y las dispociciones pertinentes del codigo contensioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente "estuve en el programa de mejoramiento de vivienda pero las mejoras no quedaron completas, no echaron los pisos, no pañertaron, no terminaron el tejado la casa es de 12 metros de fondo y solo colocaron 6 metros de tejado, el baño quedo incompleto y la cisterna me la entregaron en malas condiciones (como de segunda ya que el arbolito se le sale el aguay falto pintar, por lo tanto tengo el baño cerrado por que no funciona con normalidad, a la alcoba solo le dejaron el tejado, la dejaron en obra negra y cuando llueve se pasa el agua y se me inunda la habitacion, solicito a la entidas SDHT termine de manera oportuna la obra que dejo incompleta ya que no tengo condiciones de calidad de vida para vivir"	Por parte de la SDHT se solicita realizar visita el dia 8 de marzo de 2023
7		MVAL_07543	27/03/2023	30/03/2023	JOSE MAURICIO SALCEDO	USME	ALFONSO LOPEZ	COMPOSTELA	CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE"	3234896797	X				El día 21 de marzo de 2023 se radica derecho de petición a la SDHT bajo radicado 1-2023-12957 "yo José Mauricio salcedo con numero de cedula 19418037 poniendo en conocimiento por qué tendría que posponer el subsidio que me ha otorgado la SDH, es por el motivo que me faltan 11 metros de cimientos a un costado con sus respectivas paredes y piso y en el momento no tengo la posibilidad económicamente para levantar estos cimientos que me ha requerido el ingeniero de obra para hacer estas mejoras, no quiero renunciar al subsidio que me ha otorgado la SDHT por lo tanto si fuera posible en cambio de la mejora hacer estos cimientos que me hacen falta ya que estos son los que me han detenido en el progreso de la vivienda ubicada en la CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE"	SE PROGRAMA VISITA DE ATENCION PARA EL DIA 30/03/2023

SEGUIMIENTO OBRA	SEGUIMIENTO INTERVENTORIA	RESPUESTA DE CIERRE Y SOPORTE O TRAMITE ADELANTADO	ESTADO	
			ABIERTO	CERRADO
El día jueves 10 de noviembre se realiza llamada telefónica a la beneficiaria ARGENIS MOSQUERA, quien manifiesta que dejo autorización a su hijo EDISON ALEJANDRO LOPEZ, para poder realizar la respectiva visita de validación	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A VALIDACION LLEVADA A CABO EL DIA 16/11/2022	MV_01400ARGENIS MOSQUERA ROBAYO El día 16-11-2022 se realiza visita de validación a la vivienda de la beneficiaria Argenis, en el cual la beneficiaria deja poder de autorización a su hijo Edison Alejandro López Mosquera, donde se diligencia la ficha de caracterización social y la parte técnica realiza medidas de las áreas a intervenir. Dando atención al radicado 1-2022-45155		X
El día 14 de diciembre se reemite oficio a la interventoría para dar respuesta a la beneficiaria	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO PARA APERTURA DE VIVIENDA Y SE REALIZA OFICIO EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, LA VIVIENDA ES APERTURADA EN LA FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2022	En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato		X
el día 22 de diciembre de 2022 se realiza llamada telefónica al beneficiario donde se le informa al señor Jesús Alfredo Vásquez que el día 23 de diciembre de 2022 se realizara la respectiva validación	se solicita al contratista indicar las fechas de validación de este predio informando que se realizaría la respectiva validación del 21 al 23 de diciembre	El día 23 de diciembre se realiza la validación en el predio se le comunica al beneficiario que el contratista realizara llamada telefónica con el fin de informar fecha de inicio de actividades en su vivienda.		X
por parte del área técnica del contratista se realiza seguimiento a la petición y se informa a la interventoría que el día 13 de febrero se llevaría a cabo el arreglo de los flanches de la zona posterior de la vivienda	Se solicita al contratista realizar seguimiento a la vivienda con anterioridad a la visita programada el 14 de febrero.	el día 14 de febrero se lleva a cabo atención a la petición 1-2023-3616 por parte de SDHT, Contratista e interventoría , se realiza atención visual y recorrido y se estableció que el contratista ejecuto las siguientes actividades: se asegura flanche en parte posterior de la vivienda costado izquierdo, este es asegurado contra el muero del vecino, se agrega una parte de teja arquitectónica la cual es amarrada al perfil instalado para evitar que el tejado se pueda levantar; en la visita la esposa del beneficiario refiere que la grifería del lavaplatos presenta una gotera, el contratistarealizar el cambiose procede a dar cierre a la postventa.		X

el día 08 de febrero de 2023 se realiza llamada telefónica a la beneficiaria donde se le informa que el día 09 de febrero de 2023 se realizara la respectiva validación	se solicita al contratista informar la fecha en que se llevara a cabo la validación correspondiente.	Se realiza validación de vivienda con componente técnico y social de obra e interventoría, se establece comunicación con el señor José, esposo de la señora Ana, identificando familia nuclear conformada por la beneficiaria (67 años), su esposo (67 años) e hijo (24 años). Se conoce que los ingresos y gastos son compartidos por la beneficiaria y su hijo, la persona autorizada expone interés en participar en charlas de la SDHT con el fin de aprender, niegan situaciones de vulnerabilidad en la vivienda. Se realiza diligenciamiento de caracterización desde componente social, se indaga al beneficiario sobre sus prioridades en la vivienda y se brinda información general sobre las intervenciones. se explica que una vez se valla a dar apertura a su vivienda el contratista les notificara		*x*
el dia 8 de marzo se realiza vivita a la vivienda de la beneficiaria estableciendo compromisos los cuales quedaron establecidos para realizar el dia 10 de marzo sin embargo teniendo en cuenta el clima y dado a que se tienen que realizar el cambio de una canal esta fecha puede cambiar ya que por la epoca de invierno no es posible subir a la cubierta.	por parte de interventoria se realiza acompañamiento se esta a la espera de que se realicen las actividades correspondientes para poder dar cierre al PQRS.	08/03/2023 MV_ 1230 MARLEN PUERTA LÓPEZ se realizo visita a la vivienda en compañía de la secretaria de hábitat por derecho de petición presentado por la beneficiaria en donde manifestó no estar de acuerdo con las actividades que se le realizaron y con otras que según ella quedaron inconclusas. Se le explico a la señora Marlen los alcances del presupuesto y las obras realizadas, dejando como compromisos subsanar actividades en los filos y marco de la puerta del baño, cambio de canal por una de mayor capacidad.		*X*
SE PROGRAMA VISITA DE SEGUIMIENTO PARA EL DIA 30 DE MARZO DE 2023	SEREALIZA VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION A PQRS ESTABLECIDO EL DIA 30 DE MARZO DE 2023	se radica PQRS el dia 27 de marzo de 2023 a la interventoria bajo radicado 2-2023-28200 se programa vivita al predio del beneficiario para el dia 30/03/2023 estableciendo lo siguiente se realiza visita al Beneficiario JOSE MAURICIO SALCEDO MVAL_07543 ubicado en la dirección CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE de la localidad de Usme, barrio Compostela III. Desde el contratista de obra se realiza un primer acercamiento a la vivienda el día 1 de marzo del 2023, se realiza la visita de validación con la interventoría, donde se evidencia que la vivienda comparte los muros de los vecinos, solo tiene uno propio, que es el de la sala, se evidenció que la vivienda cuenta con grandes necesidades una de ellas cambio de cubierta, intervención en baño, cocina, pisos etc. Se le hizo la sugerencia al beneficiario de realizar la actividad de subir los muros en el perímetro de la vivienda para poder desarrollar el mejoramiento, él expresó que iba a realizar las actividades correspondientes y que iba hacer un muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda para después colocar la mampostería encima del muro, de esta forma poder realizar el mejoramiento y abarcar en gran medida las necesidades del beneficiario. El día 30 de marzo del 2023 se realiza acercamiento por parte del contratista de obra GEPM interventoria CONSORCIO INTERVIVIENDA junto con la SDHT para evaluar el derecho de petición del beneficiario, el contratista presenta el presupuesto de obra le explica las actividades que se podrían desarrollar en la vivienda, teniendo en cuenta el alcance del contrato, se evalúan las actividades junto con la Secretaria Distrital del Hábitat, pero el beneficiario manifiesta no estar de acuerdo porque él quiere hacer una desplanación en la habitación 1 y 2, realizar el muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda, la Secretaria Distrital del Hábitat, toma la decisión de dejar esta vivienda para el próximo mejoramiento con el fin de darle tiempo al beneficiario de subsanar estas actividades y que no pierda el subsidio, la vivienda es retirada del contrato.		*X*

DESCRIPCIÓN			CARACTERIZACIÓN SOCIAL						ENTREGA VIVIENDAS		ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE OBRA		HISTORIA DE VIDA		IMPLEMENTACION DE METODOLOGIA			PQRS					
MV	BENEFICIARIO	BARRIO	SI	NO	INFORMACION DE INICIO DE OBRA	OBSERVACIÓN	FECHA DE VALIDACION DE LA VIVIENDA	FECHA DE APERTURA DE LA VIVIENDA	FECHA DE CIERRE DE LA VIVIENDA	SE ENTREGA MANUAL DE USO	SE ENTREGA CANECAS	SI	NO	SI	NO	FECHA INICIAL FASE 1	FECHA FASE 2	FECHA FINAL FASE 3	PQRS	RESPUESTA	TIEMPO RESPUESTA PQRS	VISITA SOCIAL	OBSERVACIONES
MV_0015	MARIA FIDELIA REYES BEJARANO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	22/10/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_0021	SHIRLEY VALENCIA COLLAZOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	21/02/2023	13/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_0025	MARIA HELENA REYES BEJARANO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	4/01/2023	9/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_0109	GEDUAR ORLANDO HORMAZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	18/01/2023	10/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_0115	MARIA ALCIRA PRIETO BUITRAGO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	20/01/2023	10/02/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_0140	EDILSA FLOREZ MOTAVITA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	4/11/2022	7/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_0149	TITO RAFAEL NUÑEZ CHAPARRO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	23/11/2022	15/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1020	BLANCA MARINA SILVA SORACA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/11/2022	30/12/2022	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1043	LUIS HERNANDO BOHORQUEZ LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1051	SECUNDINO AGUILLON JAIMES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	18/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								18/11/22 Se lleva a cabo apertura de MV_1051 SECUNDINO AGUILLON JAIMES sin aprobación de Interventoría a razón de no contar con personal con documentación en regla, motivo por el cual se hara seguimiento en compañía de la coordinadora social a la vivienda para verificar la presencia de personal aprobado y material en plazo máximo de tres días, además de abordar al beneficiario y reconocer conformidad con presupuesto y claridad de la información brindada por parte contratista, en caso de que no solucionen se oficiara por el actuar inadecuado y sin aprobación. (DESARROLLO NUEVO PORVENIR)
MV_1056	OVIDIO ALMECIGA VARGAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1060	CLARA INES AVENDAÑO LEON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	1/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1062	CONCEPCION VARELA VARELA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1069	LUIS GERARDO BOHORQUEZ SANCHEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1072	JOSE LAUDELINO RAMIREZ BUITRAGO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1075	XIMENA MARTINEZ PEREA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	8/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1076	CLARA EMILIA ANTONIO PEÑA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/11/2022	21/11/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1079	MARIA AMPARO GOMEZ CHIQUIZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1095	MARIA LIBIA BELTRAN QUINTERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	16/01/2023	15/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1109	ANA MARIA ARIZA MARTIN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	29/12/2022	13/01/2023														
MV_1129	JUAN ANTONIO PEREZ PARADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	2/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								

MV_1131	HEIDY YURANI MUÑOZ ORTIZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	14/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1132	ANA CECILIA MARTINEZ RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1136	OLGA PINEDA BUSTAMANTE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	20/01/2023	15/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1141	HERNANDO GONZALEZ MONCADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	18/01/2023	9/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1151	DONALDO HERNANDEZ PARDO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	9/12/2022	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1162	ANGEL MIGUEL SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	10/11/2022	29/11/2022	15/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1166	CRISTIAN DAVID PEÑA RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	10/11/2022	2/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1180	JOSE ANTONIO FLOREZ SUSA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	17/01/2023	14/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1197	ANGELA MARIA AGUDELO PEÑA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	22/12/2022	11/01/2023														
MV_1198	CRISOSTOMO BECERRA GOMEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1200	SANDRA MILENA VARGAS CARRILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	9/12/2022	27/12/2022	16/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1228	LUZ FABIOLA RAMIREZ MANRIQUE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1230	MARLENE PUERTA LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	23/01/2023	SI	SI	X			X				mediante radicado 1-2023-8319 del 1 de marzo de 2023 se recibe el siguiente PQRS "YO, MARLENE PUETA LOPEZ, IDENTIFICADO CON C.C 41.661.411 expedida en la ciudad de bogota domiciliada en la cra 7 este #99- 16 barrio nuevo porvenir localidad de usme de la ciudad de bogotaen ejercicio del derecho de peticion ; que consangrsa el articulo 23 de la constitucion nacional y las disposiciones pertinentes del codigo contensioso administrativo, respetuosamente solicito lo siguiente "estuve en el programa de mejoramiento de vivienda pero las mejoras no quedaron completas, no echaron los pisos, no pañetaron, no terminaron el tejado la casa es de 12 metros de fondo y solo colocaron 6 metros de tejado, el baño quedo incompleto y la cistema me la entregaron en malas condiciones (como de segunda ya que el arbolito se le sale el aguay falto pintar, por lo tanto tengo el baño cerrado por que no funciona con normalidad, a la alcoba solo le dejaron el tejado, la dejaron en obra negra y cuando llueve se pasa el agua y se me inunda la habitacion, solicito a la entidas SDHT termine de manera oportuna la obra que dejo incompleta ya que no tengo condiciones de calidad de vida para vivir"	EL DIA 8 DE MARZO DE 2023 se realiza visita de la SDHT, CONTRATISTA GEPM E INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVIVIENDA 22 al predio MV_1230 MARLEN PUERTA LÓPEZpara poder atender derecho de peticion interpuesto por la beneficiaria en la vivtala señora Marlene manifestó no estar de acuerdo con las actividades que se le realizaron y con otras que según ella quedaron inconclusas. Se le explico a la señora Marlen los alcances del presupuesto y las obras realizadas, dejando como compromisos subsanar actividades en los filos y marco de la puerta del baño, cambio de canal por una de mayor capacidad. 29/03/2023 CIERRE DE PQRS A SATISFACCIÓN DE LA BENEFICIARIA, MV_1230, MARLENE PUERTAS, DESARROLLO NUEVO PORVENIR En atención a lo requerido por la beneficiaria Marlene Puerta López MV_1230 la cual remite un derecho de petición con radicado 1-2023-8319 a la entidad la secretaria Disritral de Hábitat el dia 01de marzo de 2023 El dia 27 el contratista de obra, realiza acercamiento a la vivienda donde se presenta al maestro de obra que estará encargado de realizar las subsanaciones y se explica nuevamente las actividades que se van a realizar entre las que se encuentran contempladas: cambio de la canal y filos del vano de la puerta del baño. Así mismo el dia 29 de marzo se realiza nuevamente visita para dar cierre a la PQRS a satisfacción de la beneficiaria.	21 DIAS		
MV_1231	FIDELIGNA RODRIGUEZ CICLIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	9/12/2022	22/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1240	BLANCA LILIA RUIZ GOMEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_0127	BELLANIRA PRIETO CUBILLOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_0320	MIGUEL BASILIO MADRIGAL GIRON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_1028	MARGARITA SALAMANCA TRIANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	7/12/2022	23/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1032	ARGENIS RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/11/2022	16/01/2023	17/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1080	HECTOR MARTIN AREVALO BRICEÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	9/12/2022	6/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1081	ROSALIA GOMEZ ROMAN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	21/11/2022	16/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1120	JOHN RICARDO BOHORQUEZ RODRIGUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	26/10/2022	17/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1122	LEOPOLDO FLOREZ CRUZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	17/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1179	JAIRO MATEUS HERNANDEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura efectuada por el contratista	10/11/2022	24/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1201	YINA MARCELA MIRANDA TORRES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	26/12/2022	14/02/2023	15/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_1206	ELVIA MENDOZA SANCHEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	5/01/2023	23/01/2023	SI	SI	X			X								

MV_1220	MARTA ISABEL GARCIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	3/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1234	MARIA SACRAMENTO PUENTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	17/01/2023	20/01/2023	2/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1236	ROSALVINA URIBE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	13/01/2023	9/02/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_0022	REINEL DIAZ SABOGAL	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/01/2023	9/03/2023															
MV_0026	ANA VERONICA SALCEDO MELO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	21/02/2023	13/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_0028	ELIZABETH ARBOLEDA PINZON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	20/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_0030	FLOR MARINA MORENA DE ACOSTA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	28/02/2023															
MV_0049	BENJAMIN QUIROGA QUIROGA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	10/01/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_0116	MARIA EUGENIA GOMEZ OROZCO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	19/12/2022	18/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1064	MARIA HELENA MARQUEZ SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/10/2022	23/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_1103	SOCORRO OJEDA MEJIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	27/12/2022	14/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1146	ALEXI CONSTANZA ROJAS LEON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	9/12/2022	6/01/2023										Hace un tiempo mi casa, salió beneficiada para el mejoramiento de vivienda, iniciando noviembre se acercaron a la casa funcionarios de la secretaria de Hábitat incluyendo un arquitecto, quedamos en que el arreglo sería para el piso 4 ya que es el más que requiere el mejoramiento, dijeron que si lo arreglaban, pero que tenía que contar con los servicios públicos básicos, se hicieron los arreglos que ellos exigían para poder tener el beneficio, dijeron que daban un plazo máximo de 20 días, que ellos llegaban el día 21 de noviembre y no llegaron ese día, en el transcurso de ese mismo día me comunique y me dijeron que tuviera paciencia ya que no tenían ni materiales ni maestros, que antes del 31 de diciembre tenía que llegar en cualquier momento, entonces quiero saber que ha pasado con este proceso, también quiero que me aclaren por favor, de cuanto es el subsidio ya que dijeron que eran 18 millones pero que a ese valor le descontaban cierto porcentaje, entonces que quedaba de 14 millones y que se arreglaba el piso dependiendo de hasta donde alcanzara el presupuesto. Solicito por favor aclaren mis dudas.	En atención al requerimiento solicitado el día 28 de noviembre de 2022 por la beneficiaria Alexi Constanza Rojas León del barrio nuevo porvenir, MV_1146 ubicado en la Kr 6 este # 100-10 sur; el componente social del contratista se permite informar que la validación del predio se realizó el día 31 de octubre de 2022 y esa visita fue atendida por el esposo de la beneficiaria, el señor Carlos Corredor a quien se le informó todo lo relacionado al mejoramiento de vivienda, a partir del momento de validación hasta la entrega del mismo, también se dio claridad a lo relacionado con el presupuesto asignado las viviendas; en vista que el apartamento del 4to piso se encontraba en obra negra y en estado inhabitable, se priorizo para ser intervenido; explicándole al beneficiario que no se pueden realizar obras en cada uno de los pisos de la vivienda y que no se realizan obras estructurales. Al momento de la validación el apartamento priorizado no contaba con instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas; también le hacia falta una parte de la cubierta, por lo tanto, el área técnica le sugirió al encargado de la vivienda realizar estas actividades antes de iniciar el mejoramiento de vivienda el cual se podía tardar aproximadamente 20 días, no sin antes informarle a la familia la fecha establecida para el inicio de obra. El día 21 de noviembre la beneficiaria se comunica con la residente social encargada, con la inquietud relacionada a la fecha de inicio de obra; la profesional social le informa a la beneficiaria que cuando se cuente con el personal y el material para la vivienda, se le informara la fecha de inicio y se presentaran los maestros; se le recuerda que no se establecen fechas fijas desde la validación ya que el inicio de obra depende de factores como la disposición de material y personal. También se le recuerda que los para este proyecto, los mejoramientos de vivienda deben ser terminados en su totalidad al 31 de diciembre de 2022; por lo tanto, las obras se iniciaran a mas tardar en el mes de diciembre. La beneficiaria, solicita que la comunicación sea directa con el esposo, ya que, por motivos laborales, no puede acceder a su teléfono celular, se actualizan los datos con el número telefónico del Señor Carlos Corredor, para informarle la fecha de inicio de obras. El día martes 6 de septiembre, la residente social le informa a la beneficiaria que la apertura de obra se realizará el día 9 de diciembre. Dando cumplimiento al compromiso, se realiza la apertura de obra el día mencionado, diligenciando las actas correspondientes, se entrega la bitácora de obra y la carta al trato digno; el área técnica por su parte explica el presupuesto asignado y las actividades a ejecutar en la vivienda y se presenta el personal de obra. Se firman los documentos a conformidad del señor Carlos corredor.			
MV_1174	FLOR MARIA MORENO SUAREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	11/11/2022															
MV_1213	HECTOR JULIO ALFONSO BOHORQUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	31/01/2023	13/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1343	YOLANDA RUIZ CARRILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	18/01/2023	3/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1344	IRMA ADELA TORRES TIQUE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.		5/01/2023	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1349	NELIDA ESTHER HERNANDEZ PASTRANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	4/01/2023	19/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1359	GERARDO ESCARRAGA OLIVARES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/02/2023	15/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1374	NORA ELIZABETH VACCA ARIAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	22/12/2022	16/02/2023	9/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_1391	JOSE LISANDRO MENDIVELSO ROMERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	3/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1394	LUCY PINEDA DE LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	10/01/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_1423	DIANA CAROLINA RONCANCIO VALDES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/01/2023	19/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								

MV_1426	MARIA EDILMA DUEÑAS PERALTA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/01/2023	24/02/2023															
MV_1427	CEBELINDA GARCIA CORONADO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/01/2023	14/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_1433	KELLY YOHANA LOPEZ ROMERO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	18/01/2023	2/02/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_00013	HECTOR GONZALEZ TRIANA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/10/2022	22/11/2022	5/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00040	ANA MERCEDES GOMEZ HERNANDEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	26/01/2023	15/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00068	JESUS ALFREDO VASQUEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/12/2022	6/02/2023	27/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00069	MARIA CLEMENCIA CORTES GUEVARA	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/01/2023	14/02/2023	23/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00071	LUIS ALFREDO GONZALEZ MORENO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	1/02/2023	28/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00075	BLANCA CECILIA CHAPARRO PATIÑO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/01/2023	13/02/2023	23/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00076	HILDA RUBY MORENO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00159	GLORIA CAPERA ACEVEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/11/2022		9/12/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00164	NOHEMI PEREZ RIAÑO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00165	PABLO ANTONIO GORDILLO MARCELO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	29/11/2022	4/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_00211	GLORIA JEANETH VILLAMIL HURTADO	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00218	JULIO ALFONSO MURILLO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	24/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00220	ALICIA COTRINA CASTILLO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	24/10/2022	15/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00247	DIOSELINA FAJARDO ORTIZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00248	POLONIO EDUARDO DIAZ PASTOR	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/11/2022	12/12/2022	30/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00329	NELLY ESPERANZA LEGUIZAMON GUTIERREZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/11/2022	18/01/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01167	RAMIRO CASTILLO TRUJILLO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	19/12/2022	23/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01238	BEATRIZ CRUZ PAYANENE	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	22/11/2022	9/12/2022	NO	NO	X			X								ENTREGA UNILATERAL
MV_01420	MARIA INES CORREA VALENCIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	21/02/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01557	DIEGO GIRALDO POSADA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/12/2022	25/01/2023	13/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01560	JULIO ROBERTO BALLEN BALLEN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	3/02/2023	28/02/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_01563	ANA LUCIA ARIAS SANTIBAÑEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/12/2022	13/01/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01566	MARTHA CECILIA GIL BERNAL	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2023	25/01/2023	18/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_14683	HERNANDO REMICIO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	10/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00002	LUIS SENEN CASTAÑEDA	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	20/01/2023	17/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00004	JORGE HERNANDO CABRA GALEANO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	25/01/2023	8/02/2023	SI	SI	X			X								

MV_00009	LUZ MARINA ALONSO HERNANDEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	31/01/2023	22/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00158	MARIA HILDA CASTAÑO FERNANDEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	16/01/2023	26/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_00172	ROSALBA SERRANO QUIROGA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	29/11/2022														
MV_00224	VICTOR JULIO SILVA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00231	ALEYDA ROJAS LOZANO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00303	LUZ ADRIANA RIVERA VERA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	15/10/2022	SI	SI		x		X								Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00311	MARIA ADRIANA BOHORQUEZ MEDINA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	5/12/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00332	NELCY TRUJILLO CUBILLOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	11/10/2022	SI	SI	X		x									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00335	BEATRIZ CORTES PRIETO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	27/09/2022	8/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00350	GRACIELA GOMEZ CONTRERAS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/10/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00352	ROSANA ALDANA MACHUCA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	5/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00360	ARNOLDO RAMOS GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	21/10/2022	17/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00381	HERLINDA HERNANDEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	4/10/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00398	CESAR POMPILIO VELASQUEZ PEÑA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/09/2022	25/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_00401	ERALDO EFREY AGUILAR GUERRERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	7/10/2022	5/12/2022	27/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00419	DIANA PATRICIA CUCAITA RIOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_00420	ALVARO ANTONIO URREGO ROMERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	16/01/2023	9/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01035	MYRIAM ALEJANDRA ORTIZ NIÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	13/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_01041	JOSE FRAAN AICEDO TORRES ORTEGON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/10/2022	19/12/2022	23/02/2022	SI	SI	X			X								
MV_01114	GINETH DIAZ QUIROGA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	29/11/2022	20/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_01123	RUBIEL UFRACIO SOTO MARROQUIN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	19/12/2022	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01223	MARIA OTILIA CORTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/12/2022	13/12/2022	20/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_01271	LUZ STELLA PEÑA VALENCIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	26/12/2022	16/02/2023	2/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01366	JESUS ANTONIO ROJAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	18/01/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01428	MARIA MAGDALENA HERNANDEZ DIAZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	25/01/2023	6/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01435	NELLY FANDIÑO DIAZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/02/2023	14/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_00001	BLANCA CECILIA CONTRERAS DE GORDO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	19/01/2023	2/02/2023	SI	SI	X			X								

MV_00038	MARIA GEORGINA LEMUS DE CHAPARRO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	17/01/2023	31/01/2023	SI	SI	X			X							
MV_00046	LUZ ASTRID CRUZ DUARTE	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	18/01/2023	7/02/2023	SI	SI	X			X							
MV_00066	OSCAR AGUDELO ROA	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/01/2023	16/02/2023	23/02/2023	SI	SI	X			X							
MV_00082	DORA LIBIA MORENO GONZALEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	2/02/2023	1/03/2023	SI	SI	X			X							
MVAL_00085	MARIA LUISA CORTES TIBATA	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/12/2022	10/02/2023	28/02/2023	SI	SI	X			X							
MV_00098	MARCO FIDEL BARRERO NIÑO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	27/01/2023	22/02/2023	SI	SI	X			X							
MV_00102	LUZ MIRYAM CABRA GALEANO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	8/02/2023	23/02/2023	SI	SI	X			X							
MV_00171	BLANCA LUCILA PIÑEROS GOMEZ	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/10/2022	18/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X							
MV_00222	NUBIA IRIS RODRIGUEZ RUBIO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	28/10/2022	15/11/2022	SI	SI	X			X							
MVAL_00249	SANDRA GUZMAN BORDA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	15/09/2022	5/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X							
MV_00271	LUIS ARMANDO DIMATE VARGAS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	SI	SI	X			X							Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00274	EMETERIO HERRERA SUAREZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X							
MV_00279	CLAUDINA GARZON COPETE	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	4/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X							
MV_00302	MARIA CRISTINA FRAILE	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	24/10/2022	16/11/2022	SI	SI	X			X							
MV_00306	ALBA MIRIAM TELLEZ DE CAMACHO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X							Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00314	JULIO ENRIQUE CUENCA CAICEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	5/10/2022	8/11/2022	SI	SI	X			X							
MV_00316	PAULINA RAMOS RODRIGUEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	27/09/2022	31/10/2022	SI	SI	X			X							Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00317	LUCILA HERRERA BERNAL	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	10/11/2022	SI	SI	X			X							
MV_00333	DIANA PATRICIA MASMELA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	5/10/2022	28/10/2022	SI	SI	X			X							Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MVAL_00389	LUZ MARIA JURADO DE VACA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	10/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X							
MV_00391	ARACELY PALACIOS IBAÑEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	26/10/2022	SI	SI	X			X							Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00402	MARIA DEYANIRA ARDILA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	4/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X							
MVAL_00434	HUGO ANTONIO SALCEDO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	23/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X							

MVAL_00441	MARIA HENAO QUINTERO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/09/2022	27/09/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_01105	FABIOLA CLAROS CLAROS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/11/2022	17/11/2022	30/11/2022	SI	SI	X			X								
MVAL_01253	MARIA BETHY ESCOBAR TIMARAN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	17/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01363	OMAR MAYUSA CATAÑEDA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	18/01/2023	30/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01430	MARIA RESURRECCIÓN DIAZ DE FANDIÑO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	19/01/2023	2/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_14691	ISRAEL ANGEL OROZCO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/11/2022	13/12/2022	29/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_00106	DEMOFILO CRISTIANO FERNANDEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/12/2022	21/02/2023	15/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_00153	JENNY ROCIO LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	4/11/2022	RENUNCIA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE														Se realiza apertura de la vivienda el dia 4 de noviembre sin embargo la beneficiaria presento inconvenientes familiares razon polr la cual renuncia al subsidio el dia 28 de no
MV_01175	ROSA DELIA CAVIDES CALDERON	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	31/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X								
MV_01176	MARIA CARMENZA TAPIERO ASCENCIO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/10/2022	7/12/2022	28/12/2022	SI	SI	X			X								
MV_01191	ROSA MARIA LESMES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/10/2022	27/12/2022	13/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01192	ALBA LUCIA SANTAMARIA MENDOZA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	11/101/2023	20/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01196	MARINA MANRIQUE MARQUEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/10/2022	16/01/2023	2/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01215	NANCY STELLA RODRIGUEZ GARCIA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	31/01/2023	16/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01244	MARIA INES CABALLERO PUENTES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	3/01/2023	27/01/2023	SI	SI	X			X								
MV_01247	MARISOL PATIÑO PINTO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	11/10/2023	8/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01265	MARIA JASMIN ROJAS ROJAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	21/02/2023	10/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01266	VICTOR MANUEL BAQUERO ROJAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	17/02/2023															
MV_01268	ANGELA PAOLA BERMUDEZ NOVOA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	26/12/2022	27/02/2023	10/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01270	ROSENDA MACIAS DE CARO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	22/12/2022	21/02/2023	10/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01367	SANDRA MILENA MERA QUICENO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	21/02/2023	23/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01368	JOSE ABUNDIO GONZALEZ BUSTOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	3/02/2023	16/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01400	ARGENIS MOSQUERA ROBAYO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/11/2022	6/01/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01425	HERNANDO CANIZALEZ LOPEZ	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/01/2023	24/02/2023	16/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01526	JUDID ZAMORA CALVERA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/12/2022	24/01/2023	10/02/2023	SI	SI	X			X								
MV_01570	SARA MEDINA VARGAS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	23/01/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_01573	MARIA DE JESUS BARRERA ESPINOSA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	3/02/2023	16/02/2023	SI	SI	X			X								

MVAL_00005	MARIA NOHEMA BURGOS ESPEJO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/12/2022	1/02/2023	10/02/2023	SI	SI	X			X									
MV_00060	HECTOR AURIO BOHORQUEZ BAUTISTA	EL TRIANGULO	X			Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	13/02/2023	2/03/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_00064	ALBA MARIA REMISSIO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	3/02/2023	6/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_00092	ORFELINA VARGAS QUINTERO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	27/01/2023	22/02/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_00174	MARIA NATIVIDAD FONTECHA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	10/11/2022	5/12/2022	SI	SI	X			X									
MVAL_00178	LUZ MYRIAM VARGAS VIJALBA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/10/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MVAL_00209	MARINA LOPEZ RIVERA	PORTAL DE LA VEGA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/10/2022	4/11/2022	2/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_00062	LUZ MARINA CASTILLO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	10/02/2023	3/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_00280	BENJAMIN MONROY PARRA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/09/2022	9/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00417	MARTHA CECILIA AGUDELO GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	25/10/2022	11/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_01112	ANGELA MARIA PULIDO PERDOMO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/10/2022	17/11/2022																
MVAL_01257	NELSON FACUNDO DIAZ TORRES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/12/2022	13/01/2023	30/01/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_00091	DIANA YANET SUESCA GOMEZ	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	21/12/2022	25/01/2023	7/02/2023	SI	SI	X			X									
MV_00236	JOSE ALVARO GUZMAN	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	4/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00282	MARCO ANTONIO VEGA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	1/11/2022	18/11/2022	SI	SI	X		X										
MV_00367	MARIA ELVIA PARRA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	27/09/2022	28/10/2022	SI	SI	X			X									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00404	CAMILA EUGENIA ACOSTA CHACON	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MVAL_00011	LEIDY JOHANNA VELASQUEZ ANGULO	EL TRIANGULO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	16/12/2022	1/02/2023	15/02/2023	SI	SI	X			X									
MV_00423	LUIZ RODRIGUEZ	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	22/09/2022	18/10/2022	SI	SI	X			X									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_00425	JOSE HUMBERTO SALAZAR BUENO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	12/09/2022	29/11/2022	9/12/2022	SI	SI	X			X									
MV_00452	FERNELI TAPIERO DUCUARA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	26/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00297	LAURA MARIA OSORIO DE ACOSTA	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	11/10/2022	28/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00451	EVA GONZALEZ ALFONSO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	25/10/2022	18/11/2022	SI	SI	X			X									
MV_00453	SANDRA ANDREA MARTINEZ CUBILLOS	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	13/09/2022	22/09/2022	21/10/2022	SI	SI	X			X									Se realizo entrega de vivienda a satisfaccion
MV_01530	WILBER CANO RAMOS	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	28/12/2022	25/01/2023	10/02/2023	SI	SI	X			X									
ADICION																								
MV_02756	DEIBY ALEXANDER RODRIGUEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				7/02/2023																	
MV_02757	GUILLERMO LEON SORIA NAGLES	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	7/02/2023	30/03/2023																
MV_02765	NELLY VELASQUEZ RAMIREZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				9/02/2023																	

MV_02780	WILLIAM ALDANA BARBOSA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				7/02/2023																
MV_02784	JUAN JESUS SILVIO CHICAIZA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				9/02/2023																
MV_02788	NURI ANDREA QUINCHE MORA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				7/02/2023																
MV_02797	MARY BEL PEDRAZA CASTELLANOS	EL PORTAL DEL DIVINO	X				9/02/2023																
MV_02902	OSCAR ERNESTO BERNAL CORTES	EL PORTAL DEL DIVINO	X				28/02/2023																
MV_01514	ANA JULIA GUTIERREZ DURAN	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	9/02/2023	2/03/2023	16/03/2023	SI	SI	X		X										
MV_02725	CECILIO DUCUARA TAPIA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				28/02/2023																
MV_02718	ANA MARISOL AGUIRRE MENDIETA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				14/02/2023							X									
MV_02712	MANUEL FAURICIO RUBIANO LLOPEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				9/02/2023																
MV_02721	LUIS HUMBERTO ANGEL MENDEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				14/02/2023																
MV_02742	CRISTOBAL GALINDO RUBIO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	30/03/2023																
MV_02752	EVIDALIA RUIZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	7/02/2023	30/03/2023						X									
MV_02758	NOHORA INES SERRANO CRIALES	EL PORTAL DEL DIVINO	X				7/02/2023																
MV_02795	NANCY VALBUENA CHICANGANA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				9/02/2023																
MV_02826	JOSE MARTIN MARTINEZ VALIENTE	EL PORTAL DEL DIVINO	X				14/02/2023																
MV_02852	GUILLERMO MORA ARDILA	EL PORTAL DEL DIVINO	X				7/02/2023																
MV_02873	DIOSELINA ARIAS SANCHEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X				28/02/2023																
MVAL_02900	CARLOS ALBERTO GOMEZ BELTRAN	EL PORTAL DEL DIVINO	X				28/02/2023																
MV_01518	ROSA DELIA LOPEZZ TORRES	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/01/2023	16/02/2023	10/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_01513	EDELMIRA PULIDO MORENO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/01/2023	14/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X									
MV_1589	JOSE DAVID AGUDELO CASTRO	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	30/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	SI	SI	X			X									
MV_1512	WILLIAM EDUARDO GONZALEZ MEDINA	NUEVO PORVENIR	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	25/01/2023	16/02/2023	09/0372023	SI	SI	X			X									
MV_02731	HOLANDA PATRICIA CAICEDO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	21/03/2023																
MV_02833	MARIA CRISTINA MONSALVE CAICEDO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	3/03/2023	24/03/2023	SI	SI	X			X									
MVAL_02834	RUBIELA APONTE	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	3/03/2023																
MV_02848	SILDANA SANCHEZ SAAVEDRA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	23/02/2023	16/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_02857	JOSE YESID GALINDO MARTINEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	24/03/2023																
MV_02864	RAFAEL EDUARDO VEGA MENDOZA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	23/02/2023	16/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_02875	LUIS CARLOS PERDOMO SILVA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/01/2023	21/02/2023	17/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_02895	WILSON BERTIZ DEL VALLE VERA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	14/03/2023	24/03/2023	SI	SI	X			X									
MV_02901	MARIA DORIS GAONA LOPEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/01/2023	14/03/2023																
MV_02904	BERENICE VALENCIA MEDINA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/01/2023	22/03/2023																
MV_02905	NORFI URBINA POPO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	14/03/2023						X									
MVAL_02812	JOVEL TOVAR INFANTE	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	14/03/2023																
MV_02782	MANUEL ROSARIO GONZALEZ HINESTROZA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	20/01/2023	27/03/2023						X									SE POSTULA VIVIENDA PARA H.V EL DIA 20/01/2023
MV_02838	SEGUNDO MARCELINOMENDOZA BARREÑO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	2/03/2023																
MV_02842	LUIS GABRIEL ROJAS	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	22/03/2023																
MV_02844	MARIA ESPERANZA USUGA TUBERQUIA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	23/03/2023																

MV_02888	MARIELA GARCIA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	27/03/2023						X									
MV_02816	BLANCA NIDIA GUTIERREZ RODRIGUEZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	14/03/2023															
MV_02835	GRACIELA SANCHEZ MILAGUY	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	14/03/2023															
MV_02921	HUMBERTO AVILA CRUZ	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	2/03/2023															
MV_02771	HERMENEGILDO SAUL PEDRAZA MORENO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	14/03/2023															
MV_02798	MARIA ELOINA NIÑO NIÑO	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	2/03/2023															
MV_02823	MARIA NUBIA CALERO CORRALES	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	14/03/2023															
MV_02893	LUIS ROBERTO PEREZ RINCON	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	31/01/2023	30/03/2023						X									
MVAL_03508	ANA SILVIA TORRES BECERRA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	24/03/2023															
MVAL_03514	CLARA INES SANTANA MARTINEZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	14/03/2023															
MVAL_03616	MARIANA ROCIO QUEMBA RUIZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/02/2023	24/03/2023															
MVAL_03697	YADIRA SANCHEZ	EL REFUGIO I Y II	X				3/02/2023																
MVAL_03778	DILSA YASMIN BERNAL MAHECHA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/02/2023	29/03/2023															
MVAL_03788	OVIDIO PRIETO YATE	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/02/2023	30/03/2023															
MV_00364	LUZ MIRYAN ARGUELLO	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/02/2023	24/02/2023	23/03/2023	SI	SI	X			X								
MV_02791	JOSE DAVID SANTA ORTIZ	EL PORTAL DEL DIVINO	RENUNCIA EL 25 DE FEBRERO DE 2023																				09/02/2023 MV_02791 JOSE DAVID SANTA ORTIZ en repetidas ocaciones se realizaron contacto telefonico con el beneficiario, el señor insiste en que no desea reunirse con los profesionales de secretaria de habitat puesto que en las anteriores visitas le informaron que a el no le podian realizar mejoramentos, se le explico desde el area tecnica y social cuales podrian ser las actividades a desarrollar, se realizo visita y fue atendida por la esposa quien manifiesta que el señor es bastante problematico y que desean dejar las cosas asi.
MV_02896	YANIRA TERESA VERA	EL PORTAL DEL DIVINO	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	27/01/2023	14/03/2023	24/03/2023	SI	SI	X			X								
MVAL_03418	MARIA ISABEL DIAZ HERNANDEZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/02/2023	28/03/2023															
MVAL_03478	CRISTINA IBAÑEZ VASQUEZ	EL REFUGIO I Y II	X				1/02/2023																
MVAL_03487	ROBERTO CUERVO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	14/03/2023															
MVAL_03505	ANA SIERRA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	24/03/2023															
MVAL_03509	LUIS EDUARDO CESPEDES PEDRAZA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/02/2023	30/03/2023						X									
MVAL_03513	CESAR ENRIQUE MONROY LEON	EL REFUGIO I Y II	X				23/02/2023																
MVAL_03530	BLANCA MYRIAM GALINDO PEREZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/02/2023	31/03/2023															
MVAL_03614	YERSON SAMIR GARCIA GAITAN	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/02/2023	31/03/2023															
MVAL_03737	SALOMON VARGAS CASTRO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	29/03/2023															
MVAL_03751	BERTHA SILVIA MORA BARAJAS	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	31/03/2023															
MVAL_03777	CLAUDIA PATRICIA GAMA HERNANDEZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	10/03/2023															
MVAL_03823	DIANA CAROLINA MUNERA PUENTES	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	1/03/2023															

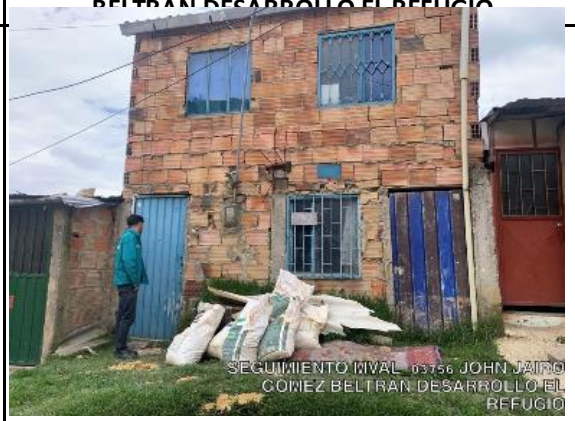
MVAL_03825	MARIELA HENAO FAJARDO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	1/03/2023						X								
MVAL_03827	RAUL URIAS COLMENARES GUAYANA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	2/03/2023														

MVAL_03831	FRANCO GUILLERMO MELO MARTINEZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	22/03/2023															
MVAL_03834	MARIA JOANA GIRALDO LOPEZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	19/01/2023	2/03/2023						X									
MVAL_03651	CONCEPCION PRIETO BELTRAN DE CLAVIJO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	1/03/2023						X									
MVAL_03652	MAURICIO RIVERA GAMA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	14/02/2023	10/03/2023															
MVAL_03714	CARLOS ARTURO TELLEZ	EL REFUGIO I Y II	X				24/02/2023																
MVAL_03721	JUAN ALBERTO CALZADA MONTAÑO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/03/2023	31/03/2023															
MVAL_03756	JOHN JAIRO GOMEZ BELTRAN	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/02/2023	10/03/2023															
MVAL_03802	ADRIANA FERNANDA LARA PRIETO	EL REFUGIO I Y II	X				14/02/2023																
MV_00310	LUIS ALBERTO ALVARADO SANDOVAL	EL NUEVO PORTAL	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/02/2023	22/03/2023															
MVAL_03684	JOSE DAVID SUAREZ PEREZ	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/02/2023	29/03/2023															
MVAL_03763	GONZALO CARDENAS AVILA	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	23/02/2023	22/03/2023															
MVAL_03628	INGRID ALEJANDRA VERGARA NIÑO	EL REFUGIO I Y II	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	24/02/2023	22/03/2023															
MVAL_ 07525	MARIA GLADYS MONASTOQUE	COMPOSTELA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/03/2023	31/03/2023															
MVAL_ 07525	DAVID STEVEN PUENTES	COMPOSTELA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/03/2023	31/03/2023															
MVAL_ 07528	MARIA BERENICE AYALA	COMPOSTELA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	1/03/2023	31/03/2023															
MVAL_ 07532	BERTA SOFIA QUINTERO	COMPOSTELA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	2/03/2023	31/03/2023															
MVAL_ 07537	MARIA MYRIAM GARCIA ALFONSO	COMPOSTELA					7/03/2023																
MVAL_ 07543	JORGE SALCEDO	COMPOSTELA	DESISTIMIENTO (APLAZAMIENTO)				2/03/2023											El día 21 de marzo de 2023 se radica derecho de petición a la SDHT bajo radicado 1-2023-12957 *"yo José Mauricio salcedo con numero de cedula 19418037 poniendo en conocimiento por qué tendría que posponer el subsidio que me ha otorgado la SDH, es por el motivo que me faltan 11 metros de cimientos a un costado con sus respectivas paredes y piso y en el momento no tengo la posibilidad económicamente para levantar estos cimientos que me ha requerido el ingeniero de obra para hacer estas mejoras, no quiero renunciar al subsidio que me ha otorgado la SDHT por lo tanto si fuera posible en cambio de la mejora hacer estos cimientos que me hacen falta ya que estos son los que me han detenido en el progreso de la vivienda ubicada en la CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE"*	se radica PQRS el dia 27 de marzo de 2023 a la interventoria bajo radicado 2-2023-28200 se programa visita al predio del beneficiario para el dia 30/03/2023 estableciendo lo siguiente se realiza visita al Beneficiario JOSE MAURICIO SALCEDO MVAL_07543 ubicado en la direccion CL 81B BIS SUR 10F 16 ESTE de la localidad de Usme, barrio Compostela III. Desde el contratista de obra se realiza un primer acercamiento a la vivienda el dia 1 de marzo del 2023, se realiza la visita de validación con la interventoria, donde se evidencia que la vivienda comparte los muros de los vecinos, solo tiene uno propio, que es el de la sala, se evidenció que la vivienda cuenta con grandes necesidades una de ellas cambio de cubierta, intervención en baño, cocina, pisos etc. Se le hizo la sugerencia al beneficiario de realizar la actividad de subir los muros en el perimetro de la vivienda para poder desarrollar el mejoramiento, el expresó que iba a realizar las actividades correspondientes y que iba hacer un muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda para después colocar la mampostería encima del muro, de esta forma poder realizar el mejoramiento y abarcar en gran medida las necesidades del beneficiario. El día 30 de marzo del 2023 se realiza acercamiento por parte del contratista de obra GEPM interventoria CONSORCIO INTERVIVIENDA junto con la SDHT para evaluar el derecho de petición del beneficiario, el contratista presenta el presupuesto de obra le explica las actividades que se podrían desarrollar en la vivienda, teniendo en cuenta el alcance del contrato, se evalúan las actividades junto con la Secretaria Distrital del Hábitat, pero el beneficiario manifiesta no estar de acuerdo porque el quiere hacer una desplanación en la habitación 1 y 2, realizar el muro de contención en piedra en el perímetro de la vivienda, la Secretaria Distrital del Hábitat, toma la decisión de dejar esta vivienda para el próximo mejoramiento con el fin de darle tiempo al beneficiario de subsanar estas actividades y que no pierda el subsidio, la vivienda es retirada del contrato.			DESISTIMIENTO (APLAZAMIENTO)
MVAL_ 07550	SANDRA PATRICIA GOMEZ	COMPOSTELA	X		SI	Apertura en la cual se socializan actividades de obra con presupuesto inicial a conformidad del beneficiario, recomendaciones sociales, explicación y entrega de Bitácora de obra y firma de formatos.	3/03/2023	30/03/2023															

01/03/2023 MV_ 07525 MARIA GLADIS MONASTOQUE, DESARROLLO COMPOSTELA	01/03/2023 MV_ 07532 BERTA QUINTERO, DESARROLLO COMPOSTELA	01/03/2023 MV_ 07543 JORGE SALCEDO, DESARROLLO COMPOSTELA:
		
01/03/2023 MVAL_03721 JUAN ALBERTO CALZADA DESARROLLO EL REFUGIO	**02/03/2023 MV_ 07528 MARIA BERENICE AYALA, DESARROLLO COMPOSTELA**	**02/03/2023 MV_07550, SANDRA GOMEZ MUÑOZ, DESARROLLO COMPOSTELA**
		

01/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO	01/03/2023 MVAL_03823 DIANA CAROLINA MUNERA DESARROLLO EL REFUGIO	01/03/2023 MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO DESARROLLO EL REFUGIO
		
02/03/2023 MV_02921 HUMBERTO AVILA CRUZ DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO	02/03/2023 MV_02838 SEGUNDO MARCELINO MENDOZA DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO	02/03/2023 MV_02798 MARIA ELODIA NIÑO DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO
		

02/03/2023 MV_01514 ANA JULIA GURIERREZ DESARROLLO EL TRIÁNGULO	02/03/2023 MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO DESARROLLO EL REFUGIO I Y II	02/03/2023 MVAL_03827 RAÚL URÍAS COLMENARES DESARROLLO EL REFUGIO I Y II
		
03/03/2023 MV_02833, MARIA CRISTINA MONSALVE CAICEDO, DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO	**03/03/2023 MVAL_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO EL PORTAL DEL DIVINO**	**09/03/2023 MV_0022 REINEL DÍAZ SABOGAL DESARROLLO NUEVO PORVENIR**
		

14/03/2023 MVAL_03834 MARÍA JOANA GIRALDO DESARROLLO EL REFUGIO I Y II	**14/03/2023 MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ DESARROLLO EL REFUGIO**	**14/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO**
		
14/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLO EL REFUGIO	**14/03/2023 MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN DESARROLLO EL REFUGIO**	**14/03/2023 MV_000106 DEMOFILO CRISTIANO DESARROLLO NUEVO PORVENIR**
		

PAC 18/03/2023	23/03/2023 MV_02812, JOVEL TOVAR, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO	23/03/2023 MV_02838, SEGUNDO MARCELINO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO
		
23/03/2023 MV_02895, WILSON BERTIZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO	**23/03/2023 MV_02896, YANIRA VERA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**	**23/03/2023 MV_02834, RUBIELA APONTE, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**
		

21/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLO EL REFUGIO	**21/03/2023 MV_01266 VICTOR BAQUERO DESARROLLO NUEVO PORVENIR**	**21/03/2023 MVAL_03777 CLAUDIA PATRICIA GAMMA HERNÁNDEZ DESARROLLO EL REFUGIO**
		
21/03/2023 MV_01367 SANDRA MERA DESARROLLO NUEVO PORVENIR	**23/03/2023 MVAL_03825 MARIELA HENAO FAJARDO DESARROLLO EL REFUGIO**	**23/03/2023 MV_000106 DEMOFILO CRISTIANO DESARROLLO NUEVO PORVENIR**
		

23/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO	23/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLO EL REFUGIO	27/03/2023 MVAL_03825, MARIELA HENAO, DESARROLLO EL REFUGIO
		
27/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO	**27/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLO EL REFUGIO**	**27/03/2023 MVAL_03756 JOHN JAIRO GOMEZ BELTRÁN DESARROLLO EL REFUGIO**
		

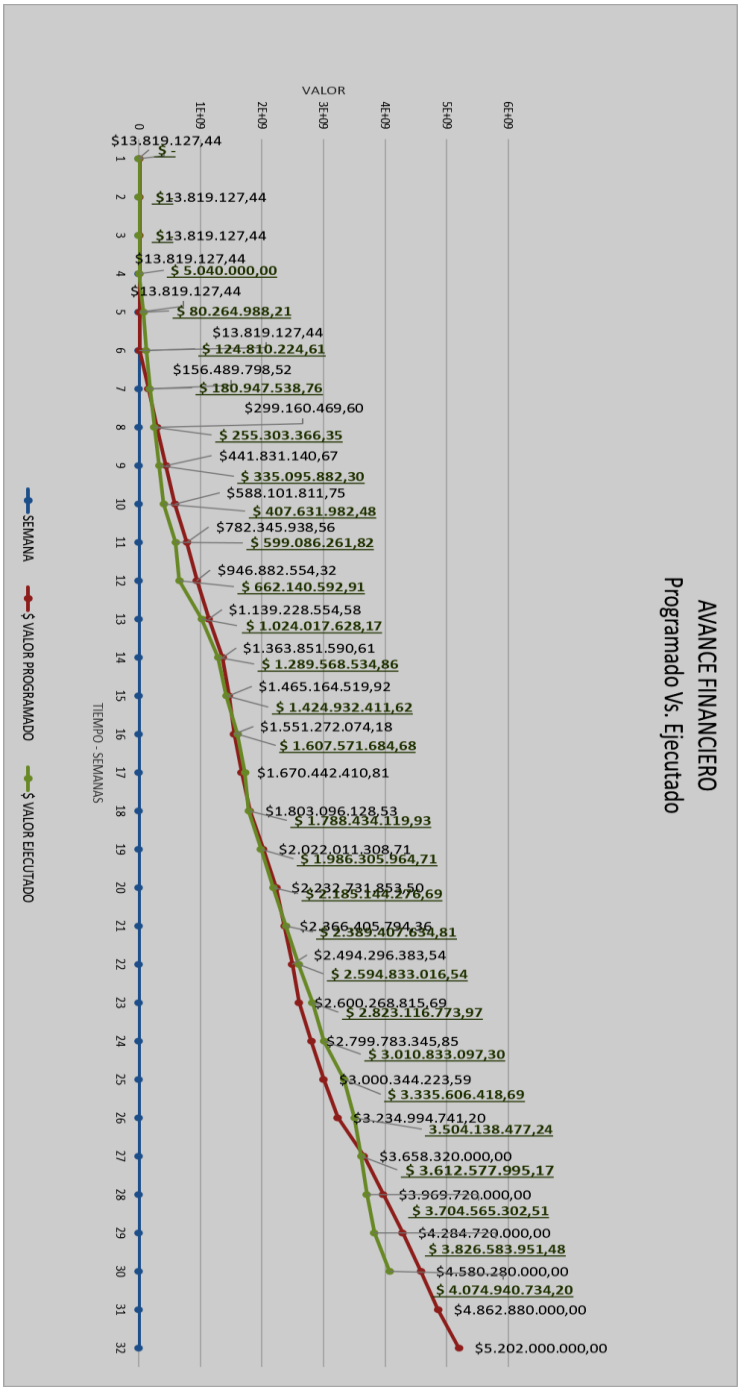
29/03/2023 MVAL_03651 CONCEPCION PRIETO BERNAL DESARROLLO EL REFUGIO	29/03/2023 MVAL_03652 MAURICIO RIVERA GAMA DESARROLO EL REFUGIO	29/03/2023 MVAL_03628, INGRID VERGARA, DESARROLLO EL REFUGIO
		
29/03/2023 MVAL_02844, MARÍA ESPERANZA USUGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO	**29/03/2023 MVAL_02905, NORFI URBINA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**	**29/03/2023 MVAL_02901, MARÍA DORIS GAONA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**
		

16/03/2023 MV_01425, HERNANDO CANIZALEZ, DESARROLLO NUEVO PORVENIR	16/03/2023 MV_02848, SILDANA SÁNCHEZ, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO	16/03/2023 MV_02864, RAFAEL VEGA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO
		
16/03/2023MV_01514 ANA JULIA GUTIERRES DESARROLLÓ NUEVO PORVENIR	**17/03/2023 MV_02875, LUIS CARLOS PERDOMO, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**	**MV_02896, YANIRA VERA, DESARROLLO PORTAL DEL DIVINO**
		

5. ASPECTOS PRESUPUESTALES

a. Información relacionada con la ejecución de los recursos asignados al contrato de obra.

A la fecha del presente informe, se presenta el siguiente estado financiero.



Relación financiera informe

RELACIÓN FINANCIERA APROX. MES DE MARZO

INVERSIÓN SEMANAL		
PROGRAMADA		EJECUTADA
$ 295.560.000,00		$ 248.356.782,72
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
5,68%		4,77%
INVERSIÓN ACUMULADA		
PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 4.580.280.000,00		$ 4.074.940.734,20
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
88,05%		78,33%
ATRASO O ADELANTO EN PESOS ($):		**-$ 505.339.265,80**
ATRASO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%)		**-9,71%**

b. Información relativa a los pagos realizados y los saldos pendientes de pago.

Para el presente informe se generó el corte No. 1,2,3,4,5 y No. 6 con los siguientes indicadores:

91

CORTE DE OBRA N°1		CORTE DE OBRA N°2		CORTE DE OBRA N°3		CORTE DE OBRA N°4		CORTE DE OBRA N°5		CORTE DE OBRA N°6		
40		26		38		41		32		36		
	$565.227.399,00		$374.931.626,00		$545.305.924,00		$588.344.948,00		$450.110.801,00		$513.585.895,00	
	$141.306.850,00		$93.732.907,00		$136.326.481,00		$147.086.237,00		$112.527.700,00		$128.396.474,00	
	$706.534.249,00		$468.664.533,00		$681.632.405,00		$735.431.185,00		$562.638.501,00		$641.982.369,00	
	$211.960.275,00		$140.599.360,00		$204.489.722,00		$220.629.356,00		$168.791.550,00		$133.529.737,00	
	$494.573.974,00		$328.065.173,00		$477.142.683,00		$514.801.829,00		$393.846.951,00		$508.452.632,00	

c. Información relativa al manejo y a la amortización del anticipo, si fuere el caso.

Para el presente contrato ya se generó el total de desembolso “**CTO de obra 999-2022”**

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22	**INFORME HSE** **MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT

INFORME INTERVENTORÍA SISO

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME
DESDE	1/03/2023	"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 1-2022."	7
HASTA	31/03/2023		

CONTRATISTA

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades, para dar cumplimiento al plan de trabajo, a continuación, un resumen de las actividades

1.El contratista realiza recorrido con el area social y técnica, realizando acompañamientos en las validaciones y aperturas de MV
2.Se realiza charla semanal
3.El contratista realizó inspecciones y charlas
4.El contratista realiza reunión con la interventoría

1..Se realiza recorrido y acompañamientos a las validaciones y aperturas de los mv, en compañia de la parte técnica y Social, de interventoría y contratista
2.Se realiza recorridos por mv´s en ejecución de obra para inspección de orden y aseo, epp, personal, etc.
3.Se realiza el informe semanal
4. La interventoría reliza reunión con el contratista
5. Se entregan los formatos de los MV´S libres de escombro
6. La interventoría realiza reunión interna
7.Se le solicta al contratista los mapas de evacuación de los m´s que faltan por intervenir, asi mismo, los numeros de emergencias y sitios cercanos (Medevac), de la zona donde se encuentran los mv´s y que hacer en caso de emergencia, sismo, terremoto,incendio y demás, y pegarlos en la bitacora. El contratista tendrá plazo para darle cumplimiento a esto el lunes 03 de abril de 2023

CAPACITACIÓN Y CHARLAS CONTRATISTA
Charla Orden y aseo en el ligar de trabajo y porte y uso de EPP, Charla Cuidados de herramientas y pertenencias y riesgo público; atracos y robos, Charla separación y manejo de escombros y orden y aseo para prevención de accidentes y Charla manejo de vocabulario entre compañeros y tener el material de construcción bajo techo
CAPACITACIÓN Y CHARLAS INTERVENTORÍA
Charla necesidad de proteger los pies, Charla obediencia de las normas SST, Charla de actividades inseguras y factores humanos que causan accidentes y Charla socialización de Medevac y que hacer en caso de emergencia, terrenoto, sismo, incendio y otros
3.GESTIÓN AMBIENTAL
*Se reitera nuevamente al contratista, de relizar el correcto manejo de residuos como lo especifica el PMA, y se realiza las observaciones repetitivas, con los residuos en las fachadas de los MV´S, ya que duran semanas enteras, así mismo, se solicita al contratista,el certificado de disposición final de los tarros de pegante y las bolsas de pegacort, que se llevo el gestor con el resto de residuos peligrosos.

2.1. Generación y Disposición de Residuos Sólidos

Tipo de Residuo		Cantidad m3	Sitio de Disposición	Observaciones
SEMANAL	**ESCOMBRO**	**14m3**	**CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO**	**N/A**
MENSUAL	**ESCOMBRO**	**14m3**	**CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO**	DE ESTA CANTIDAD NO HAN SIDO ENTREGADOS LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL, SÓLO FUE ENVIADO EL CORREO
PROYECTO	**ESCOMBRO**	**68m3**	**CEMEX-ESCOMBRERA TUNJUELO**	N/A
SEMANAL RESIDUOS PELIGROSOS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SEMANAL RESIDUOS PELIGROSOS	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
MENSUAL RESIDUOS PELIGROSOS	**CANECAS DE PINTURA Y BOLSAS DE CEMENTO**	**1,4 m3**	**EVOLIA**	N/A
PROYECTO RESIDUOS PELIGROSOS	**ESCOMBRO**	**1,4 m3**	**EVOLIA**	N/A

4. Gestión en SST

Se realiza revisión de documentación de personal para aprobación e ingreso, se realizan charlas y capacitaciones, se realizan dferentes tipos de inspecciones, en dichas inspecciones se encuentra personal sin aprobación, personal sin dotación, de todos los hallazgos encontrados, se informa al contratista, para que subsane, el contratista, divulga el Medevac y señalización de rutas de evacuación de MV´S.

4.1. Índices

Valor	Horas Hombre Trabajadas Contratista	Horas Hombre Capacitación		Horas Hombre Trabajadas Interventoría	Días Ausentismo por Enfermedad General	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos	Ausentismo por Accidentes de Trabajo
		CONTRATISTA	INTERVENTORIA					
Total Semana 1	**2544**	2	1	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 2	**2544**	2	1	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 3	**2544**	2	1	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total semana 4	**2544**	2	1	**624**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total Mensual	**10.176**	8	4	**2.496**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.1.1.Incidendentalidad

	Casos COVID Confirmados	Casos COVID Sospechosos	Fatalidades	Casos Con Daños A propiedad	Incidente Ambiental	Incidente Vehicular	Casi Accidentes	Casos Con días Perdidos	Casos con Trabajo restringido	Casos Con Días de Incapacidad (tratamiento medico)	Incapacidad casos COVID Confirmados	Días de aislamiento casos COVID Sospechosos
SEMANAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
MENSUAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PROYECTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. Registro Fotográfico	
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 1	
	
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS	INSPECCIÓN DE DOTACIÓN

	
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES	**ENTREGA DE DOTACIÓN**
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 2	
	
REVISIÓN INTERNA TOMA DE REGISTRO, PARA FORMATO LIBRE DE ESCOMBRO	**INSPECCIÓN DE DOTACIÓN**

	
ANOTACIONES EN BITACORA DE HALLAZGOS Y VISITAS	**ACOMPAÑAMIENTO A ENTREGAS**
ACTIVIDADES DE LA SEMANA 3	
	
PERSONAL NO APROBADO Y SIN DOTACIÓN	**INVASIÓN DE ABEJAS EN MV A INTERVENIR, SE LLAMA A BOMBEROS**

	
SEÑALIZACIÓN DE RCD	**INSPECCIÓN INTERNA ORDEN Y ASEO**

ACTIVIDADES DE LA SEMANA 4	
	
VISITA INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO BODEGA	VISITA INSPECCIÓN ORDEN Y ASEO BODEGA
	
RUTA DE EVACUACIÓN MVAL 03509	SOCIALIZACIÓN MV 02893 MEDEVAC

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

INFORME SST-A
Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DEL HÁBITAT

CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD

ACTIVIDADES						GESTIÓN AMBIENTAL			No. HORAS HOMBRE CAPACITACIONES					Reportes de incidentes en el componente social y técnico.								
PROYECTO / DEPARTAMENTO	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRATO	NUMERO DE TRABAJADORES	HORAS HOMBRE TRABAJADAS	ESCOMBROS (Cantidad m3)	RESIDUOS PELIGROSOS (Kg)	CONSUMO DE AGUA (m3), para las actividades de mejoramiento de vivienda	PROFESIONALES	TECNICOS	OPERATIVOS (Subcontratistas, maestros y auxiliares)	PROVEEDOR	TOTAL	LUGAR O ÁREA DE TRABAJO	FECHA DEL ACCIDENTE	No. DÍAS INCAPACIDAD	No. ACCIDENTE REGISTRABLE	FECHA DE INVESTIGACIÓN	DESCRIPCION DEL ACCIDENTE	RELACION DE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	LECCIÓN APRENDIDA	PLAN DE ACCIÓN Y FECHA
INTERVENTORIA I CONTRATISTA:			REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPOS 1 - 2022.	53	2544	3m3	800,13m3	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				53	2544	N/A	N/A	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				53	2544	N/A	N/A	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			
				53	2544	N/A	N/A	N/A	1	0	1	0	2	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A			

ELABORO: JAQUELINE ALARCÓN - PROFESIONAL SISO

INDICADORES SST- CONTRATO No. 999 DE 2022	
HORAS HOMBRE SEMANAL	2544
HORAS HOMBRE ACUMULADAS MES	10176
HORAS HOMBRE ACUMULADAS TOTAL	65328
No. INCIDENTES REGISTRABLES	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD	0
No. DÍAS DE INCAPACIDAD ACUMULADOS MES	0
HORAS CAPACITACIONES SEMANAL	2
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO MENSUAL	14
HORAS CAPACITACIONES ACUMULADO TOTAL	79

GESTIÓN AMBIENTAL	
ESCOMBROS (Cantidad m3) Semanal	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas mes)	0
ESCOMBROS (Cantidad acumuladas Proy)	68 m3
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad Kg semanal)	0
RESIDUOS PELIGROSOS (Cantidad acumuladas mes)	0
CONSUMO DE AGUA (m3) Semanal	0
CONSUMO DE AGUA (m3), Mensual	0

INFORME SST-A
Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

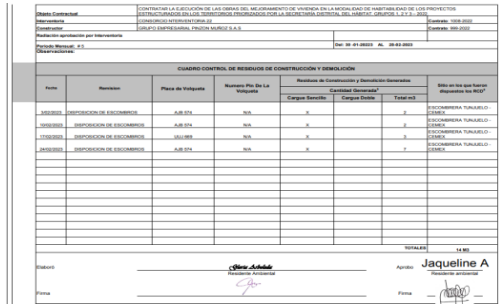
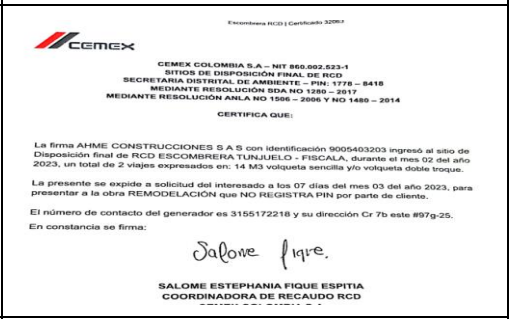
RELACIÓN DE: CHARLAS CAPACITACIONES	REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Charla necesidad de proteger los pies				
Charla Orden y aseo en el ligar de trabajo y porte y uso de EPP				

Charla obediencia de las normas SST				
Charla Cuidados de herramientas y pertenencias y riesgo público; atracos y robos				
Charla Actividades inseguras y factores humanos que causan accidentes				


Charla Separación y manejo de escombro y orden y aseo para prevenir accidentes				
Charla socialización de Medevac y que hacer en caso de emergencia, terrenoto, sismo, incendio y otros				
Charla manejo de vocabulario entre compañeros y tener el material de construcción bajo techo				

SEGUIMIENTO AMBIENTAL
FECHA: DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

SEMANA 1

ACTIVIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	SI NO CUMPLE ¿POR QUE?	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.3. Diligenciamiento formato de recolección de escombros	CUMPLE	La interventoría solicita al contratista semanalmente el formato de control de residuosl, siendo entregado esta semana el anexo del total del mes de febrero que comprende 14m3 y que lo acompaña el certificado de disposición final de cemex, y el de la primera semana de marzo que corresponde a 3m3 aprox	
5.3.1.cumplir con toda la normatividad legal Colombiana dispuesta para el manejo de los RCD llevándola hasta del gestor y dar su disposición final.	CUMPLE	El contratista hace entrega a la interventoría esta semana, del certificado de disposición final correspondiente al mes de febrero, equivalente a dos viajes de 7m3, para una totalidad de 14 m3.	
5.3.1. Separar y clasificar el material de demolición.	CUMPLE	En recorrido esta semana realizado por la interventoría, se evidencia que en la gran mayoria de mv´s, separan bien el material de demolición, escombro y se encuentra apilado en lonas como evidencia la foto	

105

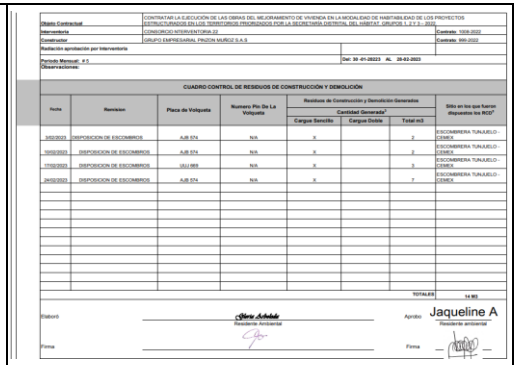
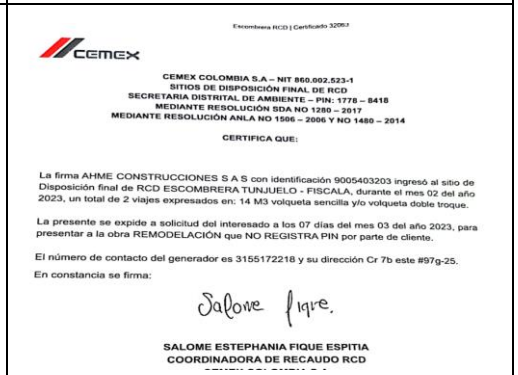
5.3.1. Los escombros deben ser apilados en lonas al interior de las viviendas, en caso tal de ser recogidos el mismo día, se dispondrán al exterior de la casa sin obstaculizar el paso de los peatones en los andenes	NO CUMPLE	En recorridos a los diferntes MVS, como se eviencia en el registro fotográfico, nuevamente la interventoría evidencia que las lonas de escombro se encuentran frente a las viviendas, obstaculizando en su totalidad el paso peatonal por semanas enteras, generando que la gengte tenga que caminar por las calles exponiendose a accidentes viales, se hace el debido reporte, para que el contratista envie el personal que se encarga de recoger este material.	
5.3.1.Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo, así como el conductor y ayudante de la volqueta deben cumplir con sus afiliaciones del SG-SST	CUMPLE	La interventoría solicito en el inicio del proyecto, la docuemntación de las personas encargadas de esta tarea así, como el formato de entrega de dotación, por lo tanto el contratista mensualmente anexa la planilla con dicho personal, y la interventoría en recorridos se serciora, que el personal (conductores) sean quienes fueron desigandos para esa tarea y tengan la documentación y su planilla en orden	
5.3.2. Las volquetas que movilicen material sobrante de demoliciones deberán cumplir las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá.	CUMPLE	La interventoría solicita la documentación de conductores como licencia de transito, cedula y tarjeta de propiedad si aplica, para corroborar la competencia de conductor, así mismo en campo se encarga de solicitar los documentos de quien esta manejando, para corroborar que si sea el personal aprobado para este ejercicio., tambien mensualmente se solcita el pago de parafiscales de los conductores que realizan esta actividad.	


5.3.2. No se dispondrá de material en el exterior de la vivienda, solo cuando se va hacer la respectiva recogida del RCD sin obstaculizar el paso de los peatones por los andenes.	NO CUMPLE	Nuevamente se eviencia MV´S, con la fachada de escombros que duran hasta una semana, obstruyendo el paso de peatones e incomodando a la comunidad, muchas veces esto tambien retrasa el diligenciamiento del formato de libre de escombros, que como interventoría debemos entregar para anexo de las carpetas finales, dando fé de que esta si esta libre tanto dentro como fuera de la obra	
5.3.5. Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.	NO CUMPLE	Esta semana el contrarista hizo entrega del certificado de disposición final de los resiudos peligrosos correspondiente al mes de febrero, pero el certificado es de fecha 10 de marzo de 2023, sin embargo, no se adjuntan las licencias de los gestores que realizaron dicha disposición, solicitadas por la intervebtoría desde el comienzo del proyecto y mensualmente de manera reiterativa, asi mismo, sólo adjuntan certificado de bolsas de cemento y canecas de pintrura, faltando los certificados de las bolas de pegacort y tarros de pegamento de tubería.	

NOTA: ITEMS TOMADOS DEL PMA, RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA INTERVENTORÍA

SEMANA 2

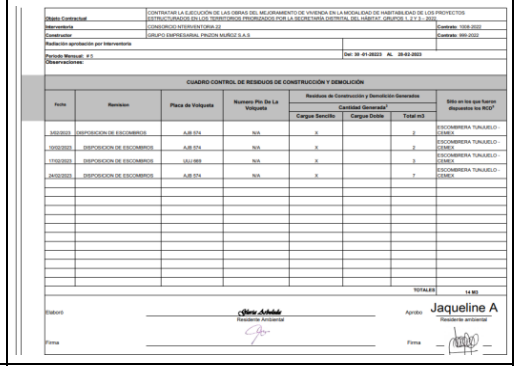
ACTIVIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	SI NO CUMPLE ¿POR QUE?	REGISTRO FOTOGRÁFICO

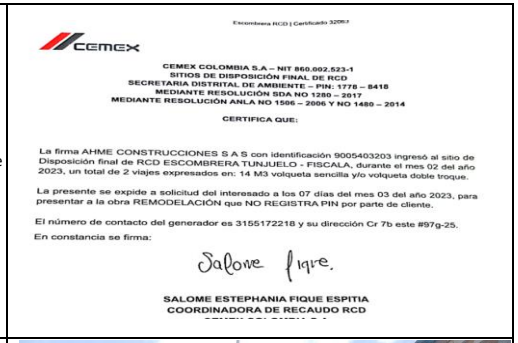
5.3. Diligenciamiento formato de recolección de escombros	CUMPLE	La interventoría solicita al contratista semanalmente el formato de control de residuos, pero esta semana no se entrega el formato de segumiento, por que no se realizo disposición de RCD	
5.3.1.cumplir con toda la normatividad legal Colombiana dispuesta para el manejo de los RCD llevándola hasta del gestor y dar su disposición final.	CUMPLE	El contratista hace entrega a la interventoría esta semana, del certificado de disposición final correspondiente al mes de febrero, equivalente a dos viajes de 7m3, para una totalidad de 14 m3.	
5.3.1. Separar y clasificar el material de demolición.	NO CUMPLE	En recorrido esta semana realizado por la interventoría, se evidencia en la gran mayoria de mv´s, que el material esta revuelto, que usan las bolsas de cemento y pegacort, para guardar escombros, volviendo de nuevo a fallar en la separación y la clasificación de estos mismos	

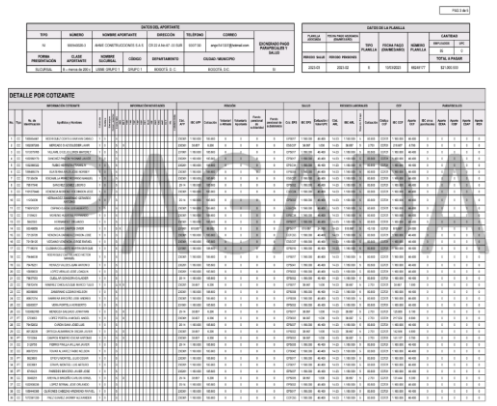

5.3.1. Los escombros deben ser apilados en lonas al interior de las viviendas, en caso tal de ser recogidos el mismo día, se dispondrán al exterior de la casa sin obstaculizar el paso de los peatones en los andenes	NO CUMPLE	En recorridos a los diferntes MVS, nuevamente la interventoría evidencia que las lonas de escombro se encuentran frente a las viviendas, obstaculizando en su totalidad el paso peatonal por semanas enteras, generando que la gengte tenga que caminar por las calles exponiendose a accidentes viales, se hace el debido reporte, para que el contratista envie el personal que se encarga de recoger este material.	
5.3.1.Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo, así como el conductor y ayudante de la volqueta deben cumplir con sus afiliaciones del SG-SST	CUMPLE	La interventoría solicito en el inicio del proyecto, la documentación de las personas encargadas de esta tarea así, como el formato de entrega de dotación, por lo tanto el contratista mensualmente anexa la planilla con dicho personal, y la interventoría en recorridos se serciora, que el personal (conductores) sean quienes fueron desigandos para esa tarea y tengan la documentación y su planilla en orden	
5.3.2. Las volquetas que movilicen material sobrante de demoliciones deberán cumplir las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá.	CUMPLE	La interventoría solicita la documentación de conductores como licencia de transito, cedula y tarjeta de propiedad si aplica, para corroborar la competencia de conductor, así mismo en campo se encarga de solicitar los documentos de quien esta manejando, para corroborar que si sea el personal aprobado para este ejercicio., tambien mensualmente se solcita el pago de parafiscales de los conductores que realizan esta actividad.	

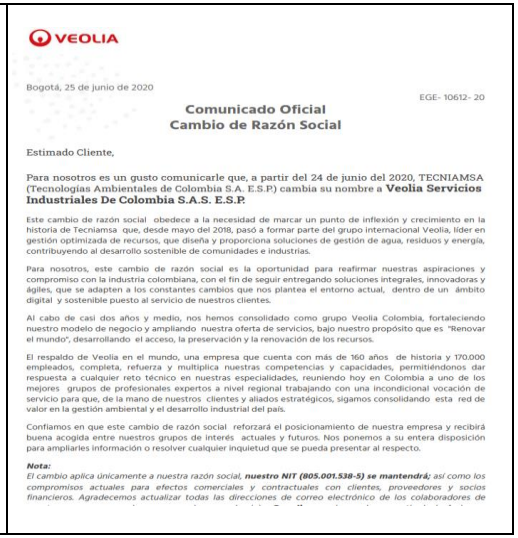
5.3.2. No se dispondrá de material en el exterior de la vivienda, solo cuando se va hacer la respectiva recogida del RCD sin obstaculizar el paso de los peatones por los andenes.	NO CUMPLE	Nuevamente se eviencia MV´S, con la fachada de escombros que duran hasta una semana, obstruyendo el paso de peatones e incomodando a la comunidad, muchas veces esto tambien retrasa el diligenciamiento del formato de libre de escombros, que como interventoría debemos entregar para anexo de las carpetas finales, dando fé de que esta si esta libre tanto dentro como fuera de la obra	
5.3.5. Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.	NO CUMPLE	Esta semana el contrarista hizo entrega de las licencias ambientales del dispositor final, sin embargo aún no han sido entregados los certificados de las bolsas de pegacort y tarros de pegamento de tubería.	 VEOLIA Bogotá, 25 de junio de 2020 EGE- 10612- 20 **Comunicado Oficial** **Cambio de Razón Social** Estimado Cliente, Para nosotros es un gusto comunicarle que, a partir del 24 de junio del 2020, TECNIAMSA (Tecnologías Ambientales de Colombia S.A. E.S.P.) cambia su nombre a **Veolia Servicios Industriales De Colombia S.A.S. E.S.P.** Este cambio de razón social obedece a la necesidad de marcar un punto de inflexión y crecimiento en la historia de Tecniamsa que, desde mayo del 2018, pasó a formar parte del grupo internacional Veolia, líder en gestión optimizada de recursos, que diseña y proporciona soluciones de gestión de agua, residuos y energía, contribuyendo al desarrollo sostenible de comunidades e industrias. Para nosotros, este cambio de razón social es la oportunidad para reafirmar nuestras aspiraciones y compromiso con la industria colombiana, con el fin de seguir entregando soluciones integrales, innovadoras y ágiles, que se adapten a los constantes cambios que nos plantea el entorno actual, dentro de un ámbito digital y sostenible puesto al servicio de nuestros clientes. Al cabo de casi dos años y medio, nos hemos consolidado como grupo Veolia Colombia, fortaleciendo nuestro modelo de negocio y ampliando nuestra oferta de servicios, bajo nuestro propósito que es "Renovar el mundo", desarrollando el acceso, la preservación y la renovación de los recursos. El respaldo de Veolia en el mundo, una empresa que cuenta con más de 160 años de historia y 170.000 empleados, completa, refuerza y multiplica nuestras competencias y capacidades, permitiéndonos dar respuesta a cualquier reto técnico en nuestras especialidades, reuniendo hoy en Colombia a uno de los mejores grupos de profesionales expertos a nivel regional trabajando con una incondicional vocación de servicio para que, de la mano de nuestros clientes y aliados estratégicos, sigamos consolidando esta red de valor en la gestión ambiental y el desarrollo industrial del país. Confiamos en que este cambio de razón social reforzará el posicionamiento de nuestra empresa y recibirá buena acogida entre nuestros grupos de interés actuales y futuros. Nos ponemos a su entera disposición para ampliarles información o resolver cualquier inquietud que se pueda presentar al respecto. ***Nota:*** *El cambio aplica únicamente a nuestra razón social,* ***nuestro NIT (805.001.538-5) se mantendrá;*** *así como los compromisos actuales para efectos comerciales y contractuales con clientes, proveedores y socios financieros. Agradecemos actualizar todas las direcciones de correo electrónico de los colaboradores de*

SEMANA 3


ACTIVIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	SI NO CUMPLE ¿POR QUE?	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.3. Diligenciamiento formato de recolección de escombros	CUMPLE	La interventoría solicita al contratista semanalmente el formato de control de residuos, pero esta semana no se entrega el formato de segumiento, por que no se a alacando la cantidad para la recolecccion de de residuos, por lo tanto no se ha realziado recogida de escombro.	 CUADRO CONTROL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Objeto Contractual: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1, 2 Y 3 - 2022 Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORIA 22 — Contrato: 1008-2022 Constructor: GRUPO EMPRESARIAL PINZÓN MUÑOZ S.A.S — Contrato: 999-2022 Radicación aprobación por Interventoría: Periodo Mensual: #1 — Del: 30-01-2023 Al: 28-02-2023 Observaciones: Fecha / Remision / Placa de Volqueta / Numero Pin De La Volqueta / Residuos de Construcción y Demolición Generados — Cantidad Generada* (Cargue Sencillo / Cargue Doble / Total m3) / Sitio en los que fueron dispuestos los RCD* 24/02/2023 DISPOSICION DE ESCOMBROS AJB 574 N/A X 7 ESCOMBRERA TUNJUELO - CEMEX TOTALES 14 M3 Elaboró: Residente Ambiental — Aprobó: Jaqueline A, Residente ambiental Firma: — Firma:

5.3.1.cumplir con toda la normatividad legal Colombiana dispuesta para el manejo de los RCD llevándola hasta del gestor y dar su disposición final.	CUMPLE	El contratista hace entrega a la interventoría de los certificados de disposición final de manera mensual por lo tanto, el vale del registro corresponde al mes de febrero	 Escombrera RCD | Certificado 32063 CEMEX CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1 SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418 MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017 MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014 CERTIFICA QUE: La firma AHME CONSTRUCCIONES S A S con identificación 9005403203 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO - FISCALA, durante el mes 02 del año 2023, un total de 2 viajes expresados en: 14 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque. La presente se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes 03 del año 2023, para presentar a la obra REMODELACIÓN que NO REGISTRA PIN por parte de cliente. El número de contacto del generador es 3155172218 y su dirección Cr 7b este #97g-25. En constancia se firma: Salome Fique. SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA COORDINADORA DE RECAUDO RCD
5.3.1. Separar y clasificar el material de demolición.	CUMPLE	En recorrido esta semana realizado por la interventoría, se evidencia en la gran mayoria de mv´s, que el material se encuentra apilado en lonas y en las fachadas de la casa.	
5.3.1. Los escombros deben ser apilados en lonas al interior de las viviendas, en caso tal de ser recogidos el mismo día, se dispondrán al exterior de la casa sin obstaculizar el paso de los peatones en los andenes	NO CUMPLE	En recorridos a los diferentes MVS, nuevamente la interventoría evidencia que las lonas de escombro se encuentran frente a las viviendas, obstaculizando en su totalidad el paso peatonal por semanas enteras, como se evidencia en la imagen el escombro se encuentra casi en la mitad de la calle, obstryendo el paso petanoal y de vehiculos	

5.3.1.Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo, así como el conductor y ayudante de la volqueta deben cumplir con sus afiliaciones del SG-SST	CUMPLE	La interventoría solicito en el inicio del proyecto, la documentación de las personas encargadas de esta tarea así, como el formato de entrega de dotación, por lo tanto el contratista mensualmente anexa la planilla con dicho personal, y la interventoría en recorridos se serciora, que el personal (conductores) sean quienes fueron desigandos para esa tarea y tengan la documentación y su planilla en orden	
5.3.2. Las volquetas que movilicen material sobrante de demoliciones deberán cumplir las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá.	CUMPLE	La interventoría solicita la documentación de conductores como licencia de transito, cedula y tarjeta de propiedad si aplica, para corroborar la competencia de conductor, así mismo en campo se encarga de solicitar los documentos de quien esta manejando, para corroborar que si sea el personal aprobado para este ejercicio., tambien mensualmente se solcita el pago de parafiscales de los conductores que realizan esta actividad.	
5.3.2. No se dispondrá de material en el exterior de la vivienda, solo cuando se va hacer la respectiva recogida del RCD sin obstaculizar el paso de los peatones por los andenes.	NO CUMPLE	Nuevamente se eviencia MV´S, con la fachada de escombros que duran hasta una semana, obstruyendo el paso de peatones e incomodando a la comunidad, muchas veces esto tambien retrasa el diligenciamiento del formato de libre de escombros, que como interventoría debemos entregar para anexo de las carpetas finales, dando fé de que esta si esta libre tanto dentro como fuera de la obra	

5.3.5. Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.	NO CUMPLE	Esta semana el contratista tampoco hizo entrega de las certificdos fattantes de los frascos de pegante y bolsas de pegacort, tampoco, fue posible que el contratista le diera a la interventoria una cita, para verificar el estado de las bodegas y verificar que estan resguardando los residuos que se generan actualmente,	 VEOLIA Bogotá, 25 de junio de 2020 EGE- 10612- 20 **Comunicado Oficial** **Cambio de Razón Social** Estimado Cliente, Para nosotros es un gusto comunicarle que, a partir del 24 de junio del 2020, TECNIAMSA (Tecnologías Ambientales de Colombia S.A. E.S.P.) cambia su nombre a **Veolia Servicios Industriales De Colombia S.A.S. E.S.P.** Este cambio de razón social obedece a la necesidad de marcar un punto de inflexión y crecimiento en la historia de Tecniamsa que, desde mayo del 2018, pasó a formar parte del grupo internacional Veolia, líder en gestión optimizada de recursos, que diseña y proporciona soluciones de gestión de agua, residuos y energía, contribuyendo al desarrollo sostenible de comunidades e industrias. Para nosotros, este cambio de razón social es la oportunidad para reafirmar nuestras aspiraciones y compromiso con la industria colombiana, con el fin de seguir entregando soluciones integrales, innovadoras y ágiles, que se adapten a los constantes cambios que nos plantea el entorno actual, dentro de un ámbito digital y sostenible puesto al servicio de nuestros clientes. Al cabo de casi dos años y medio, nos hemos consolidado como grupo Veolia Colombia, fortaleciendo nuestro modelo de negocio y ampliando nuestra oferta de servicios, bajo nuestro propósito que es "Renovar el mundo", desarrollando el acceso, la preservación y la renovación de los recursos. El respaldo de Veolia en el mundo, una empresa que cuenta con más de 160 años de historia y 170.000 empleados, completa, refuerza y multiplica nuestras competencias y capacidades, permitiéndonos dar respuesta a cualquier reto técnico en nuestras especialidades, reuniendo hoy en Colombia a uno de los mejores grupos de profesionales expertos a nivel regional trabajando con una incondicional vocación de servicio para que, de la mano de nuestros clientes y aliados estratégicos, sigamos consolidando esta red de valor en la gestión ambiental y el desarrollo industrial del país. Confiamos en que este cambio de razón social reforzará el posicionamiento de nuestra empresa y recibirá buena acogida entre nuestros grupos de interés actuales y futuros. Nos ponemos a su entera disposición para ampliarles información o resolver cualquier inquietud que se pueda presentar al respecto. ***Nota:*** *El cambio aplica únicamente a nuestra razón social,* ***nuestro NIT (805.001.538-5) se mantendrá;*** *así como los compromisos actuales para efectos comerciales y contractuales con clientes, proveedores y socios financieros. Agradecemos actualizar todas las direcciones de correo electrónico de los colaboradores de*

SEMANA 4

ACTIVIDAD	CUMPLE/NO CUMPLE	SI NO CUMPLE ¿POR QUE?	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.3. Diligenciamiento formato de recolección de escombros	CUMPLE	Esta semana el contratista envía el correo, a la escombrera cemex solicitando los certificados de disposición final, copiando en el mismo correo a la interventoría, como veedor del proceso, evidenciando, que hiceron disposición de 14m3, en lo que lleva corrido del mes de marzo-	 ---------- Forwarded message --------- De: **Grupo 1 Habitat** <habitatgrupo1.tel012022@gmail.com> Date: mar. 28 mar 2023 a la(s) 12:09 Subject: CERTIFICADOS DE DISPOSICION FINAL MARZO 2023 To: Certificaciones RCD <certificacionesrcd@cemex.com> Cordial saludos, me permito enviar el siguiente vale del mes de Marzo del año 2023, para que por favor me colaboren con el certificado de disposición final. Quedo atenta. Att: ANGY LORENA OROZCO MONTILLA profesional SST-AM **5 archivos adjuntos**· Analizado por Gmail Vale 2.pdf · Vale 1.pdf · 200709 AUTORIZ... · SOLICITUD DE CE... · FOLIOS 2023.pdf
5.3.1.cumplir con toda la normatividad legal Colombiana dispuesta para el manejo de los RCD llevándola hasta del gestor y dar su disposición final.	NO CUMPLE	El contratista para el cierre de este informe, no entrega la certificación correspondiente al mes de marzo de 2023, copia a la interventoría en correo enviado a cemex escombrera, para informar de la solciitud de este mismo.	N/A
5.3.1. Separar y clasificar el material de demolición.	CUMPLE	En recorrido esta semana realizado por la interventoría, se evidencia en la gran mayoria de mv´s, que el material se encuentra apilado en lonas y en las fachadas de la casa y que ya no estan usando las bolsas de cemento o pegacort como bolsas para escombros,	

5.3.1. Los escombros deben ser apilados en lonas al interior de las viviendas, en caso tal de ser recogidos el mismo día, se dispondrán al exterior de la casa sin obstaculizar el paso de los peatones en los andenes	CUMPLE	En recorridos a los diferentes MVS, la interventoría evidencio la recogida de escombros, subsanando los hallazgos presentados la semana pasada	
5.3.1.Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo completo, así como el conductor y ayudante de la volqueta deben cumplir con sus afiliaciones del SG-SST	NO CUMPLE	Para el cierre de este informe, no se ha presentado la planilla de este personal, igualmente, el contratista tiene plazo de pagar su planilla los primeros 5 días de cada mes, osea que la engtrega se realizaría en el mes de abril.	N/A
5.3.2. Las volquetas que movilicen material sobrante de demoliciones deberán cumplir las normas establecidas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad de Bogotá.	CUMPLE	La interventoría solicita la documentación de conductores como licencia de transito, cedula y tarjeta de propiedad si aplica, para corroborar la competencia de conductor, así mismo en campo se encarga de solicitar los documentos de quien esta manejando, para corroborar que si sea el personal aprobado para este ejercicio., tambien mensualmente se solcita el pago de parafiscales de los conductores que realizan esta actividad.	

5.3.2. No se dispondrá de material en el exterior de la vivienda, solo cuando se va hacer la respectiva recogida del RCD sin obstaculizar el paso de los peatones por los andenes.	CUMPLE	Esta semana se evidencia, que los sitios críticos que se encontraron la semana pasada, fueron limpiados y se recogio el escombro, en una esquina critica donde se entorpecia hasta el paso de vehiculos.	
5.3.5. Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general separando los residuos químicos y disponiéndose de forma temporal en lonas para su recolección y llevar ente encargado de dar su disposición final a estos residuos químicos.	NO CUMPLE	Esta semana se solicita de nuevo al contratista los certificados de disposión final de los tarros de pegante y bolsas de pegacort, y aun no han sido entregados, sin embargo se realizó visita ala bodega donde esta ubicado el punto de acopio identificando esta vez, canecas de pintura, bolsas de cemento , de pegacort y tarros de pegante de tyberia debidamente apilados y separados y con demarcación donde se diferencia cada tipo de residuo	

CONSORCIO INTERVIVIENDA 22

INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31DE MARZO DE 2023

CONTRATO: 1008 DE 2022
CONTRATISTA: GPEM

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COOSALUD	COLFONDOS	COLPATRIA	NO	SI	
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	COMPENSAR	COLFONDOS	COLPATRIA	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA	NO	SI	PENDIENTE PAZ Y SALVO
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRIA	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	NO	SI	
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
8	YULI ASTRID ESPITIA	1.023.874.373	20/09/2022	20/09/2022	SI	N/A	COMPENSAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	SI		
9	JOSÉ DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	1/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
10	DANIELA SANCHEZ MOLINA	1.015.463.608	19/09/2022	19/19/2022	SI	N/A	COMPENSAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
11	MARYELENA NIVIAYO CAICEDO	53.066.964	26/09/2022	26/09/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PROTECCION	COLPATRÍA	SI		
12	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	20/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	SALUD TOTAL	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
13	ANGIE LORENA OROZCO MONTILLA	1.110.568.316	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
14	SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	SANITAS	SKANDIA	COLPATRIA	SI		
15	YENY SANGUINO ROMERO	1.032.367.907	20/11/2022	20/11/2022	SI	N/A	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA	SI		
16	FERNANDO MORENO	3.199.429	15/09/2022	2/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
17	EDINSON VENECIA	72.120.789	19/09/2022	3/09/2022	N/A	SI	CAJACAPI	PORVENIR	POSITIVA	SI		
18	LUIS OSPINO	1.192.910.231	19/09/2022	5/09/2022	N/A	SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
19	NELSON ZAMBRANO	80.368.960	29/09/2022	6/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
20	ORLANDO HERNANDEZ	5.842.300	20/09/2022	7/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
21	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	19/09/2022	8/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
22	YOEDINSON VENENCIA	1.101.879.446	19/09/2022	9/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	SI		
23	JUAN HERAZO VALDEZ	79.416.251	15/09/2022	3/10/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	SI		
24	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	23/09/2022	11/09/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
25	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	22/09/2022	13/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
26	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	14/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
27	JORGE VIZCANO	72.158.125	23/09/2022	15/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
28	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	23/09/2022	16/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
29	WHINYER ALBERTO PINILLA	1.014.222.210	22/09/2022	17/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	NO	SI	
30	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	18/09/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
31	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	26/09/2022	19/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
32	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	27/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
33	ADRIAN ALEXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	23/09/2022	21/09/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PROTECCION	POSITIVA	NO	SI	
34	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	26/08/2022	24/09/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
35	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	28/09/2022	27/09/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	SI		
36	LUIS MERGAREJO	1.045.309.207	7/10/2022	7/10/2022	N/A	SI	MUTUALSER	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
37	DALADIER CUELLAR	79.637.053	29/09/2022	7/10/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
38	JESUS RAMON CASTILLO	PT 6745683	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
39	RAFAEL JOSÉ CASTILLO	PT 6745484	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
40	SERGIO JESUS CASTILLO	PT 7063564	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
41	OSCAR ORTEGA	80.128.209	21/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
42	RICHARD NAZAREHT CARRASQUEL	PT 7423807	24/10/2022	5/11/2022	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
43	ALCIDEZ JOSÉ RODRIGUEZ LUJANO	6726606	5/10/2022	3/10/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
44	YEISON FERNANDEZ	1.030.657.753	18/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PROTECCION	POSITIVA	NO	SI	
45	JOSÉ ANDRES BARRERA BRICEÑO	80801214	4/10/2022	5/10/2022	N/A	SI	COMPENSAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
46	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1.033.687.438	10/11/2022	11/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	NO	SI	
47	JOHANA TELLEZ	1.022.971.647	22/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
48	CRISTIAN JHOJANS YARA DELGADO	1.006.903.745	22/11/2022	23/11/2022	N/A	SI	SURA	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
49	JOSE HUMBERTO CARO SUAREZ	79. 057.097	18/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
50	JHON STEVEN ORTEGÓN BLANCO	1.001.271.233	18/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	NO	SI	
51	FREDI OSBALDO BOHORQUEZ CHACÓN	79.716.256	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI		PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
52	FRANKLIN GUSTAVO QUIÑONES MESA	87.432.481	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	NO	SI	
53	JOSÉ NORVEY VILLA PUENTES	80.253.880	22/11/2022	23/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
54	OSCAR ALBERTO ACOSTA MALPICA	79.913.452	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	POSITIVA	NO	SI	
55	JOSÉ ANDRES DÍAZ ORTIZ	1.022.992.366	21/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
56	CRISTIAN ANDRES SILVA RAMÍREZ	1.001.271.816	21/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	ENTREGO PAZ Y SALVO
57	WILLIAM JAVIER FIERRO PINILLA	3.129.576	23/11/2022	24/11/2022	N/A	SI	NO PRESENTA	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
58	JULIO EPIEYU MONTIEL	PT 5623699	26/11/2022	27/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
59	LUIS EPIAYU MONTIEL	PT 6353981	27/11/2022	27/11/2022	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
60	YORGELIS CALVO TORRES	PT 2832993	2/11/2022	16/01/2023	N/A	SI	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
61	JIOVANNY JOSÉ PAREDES BRICEÑO	PT 6647515	19/12/2022	24/01/2023	N/A	SI	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	SI		
62	LUIS TELLEZ MEDINA	3.166.236	26/01/2023	26/01/2023	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
63	LUIS CARLOS MENDOZA GOMEZ	17.971.346	25/07/2022	26/01/2023	N/A	SI	ALIANSALUD	PORVENIR	POSITIVA	NO	SI	
64	JOSÉ ADONAY CALDERÓN VARGAS	192.343	3/02/2023	6/02/2023	N/A	SI	SALUD TOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	NO	SI	
65	EDWUIN ANDRES VARGAS HERRERA	1.006.158.053	3/02/2023	6/02/2023	N/A	SI		PORVENIR	POSITIVA	SI		

RELACIÓN DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS AFILIADOS A SEGURIDAD SOCIAL												
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	Fecha de afiliación	Fecha de Ingreso	Personal afiliado Administrativos	Personal afiliado (operativo: maestros y auxiliares)	EPS	PENSION	ARL	ESTADO ACTUAL		OBSERVACIONES
										ACTIVO	RETIRADO	
66	LUIS ALBERTO VARGAS HERRERA	1.193.492.533	3/02/2023	6/02/2023	N/A	SI	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	SI		
67	JHONATAN VARGAS	1.193.499.046	13/02/2023	14/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
68	JOSE JIMENEZ	79.806.500	13/02/2023	14/02/2023	N/A	SI	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	NO	SI	
69	JOSE ROVELO	79.769.383	10/02/2023	11/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
70	JOSÉ HELI DURAN CASTAÑEDA	80.380.434	29/01/2023	1/02/2023	N/A	SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
71	VICTOR ALEJANDRO RIZO MIRANDA	1,066,097,223	2/11/2022	1/02/2023	N/A	SI	MUTUAL SER	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
72	HUMBERTO BORDA LOPEZ	79.815.559	24/12/2022	1/02/2023	N/A	SI	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
73	OSBAR BERNAL	80.778.371	10/02/2023	11/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	PROTECCION	POSITIVA	SI		
74	ANJEL ORTEGA	80.811.761	10/02/2023	11/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
75	DANY VILLEGAS	PT 5709178	10/02/2023	11/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
76	LESCARLOS BAUTISTA	1.003.124.440	10/02/2023	11/02/2023	N/A	SI	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	SI		
77	JHON RAMOS	80.748.603	13/02/2023	14/02/2023	N/A	SI	COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
78	OVIER AGUIAR	93.349.859	15/02/2023	16/02/2023	N/A	SI	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA	SI		
79	OSNAIDER SIERRA	1.101.449.072	15/02/2023	16/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	PORVENIR	POSITIVA	SI		
80	OSCAR CAYCEDO FAJARDO	1.032.373.665	20/02/2023	21/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
81	KEVIN CAICEDO	1.072.497.081	20/02/2023	21/02/2023	N/A	SI	SALUDTOTAL	COLFONDOS	POSITIVA	SI		
82	VICTOR BLANCO	PT 6683921	3/10/2022	10/02/2023	N/A	SI	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
83	ENDER ROJAS	PT 2100970	3/10/2022	10/02/2023	N/A	SI	CAPITAL SALUD	PORVENIR	POSITIVA	SI		
RESULTADOS:					15	68	0	0	0	53	30	

INFORME SISO

Fecha: MENSUAL DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONTRATO: 1008-2022
CONTRATISTA:

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
1	DALIA CARDENAS	52.855.409	1/09/2022	17/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	
2	GINA PAOLA GONZALES ESPINOSA	1.014.241.364	1/09/2022	27/04/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
3	GLORIA ESPERANZA ARBOLEDA ARIAS	52.455.174	1/09/2022	29/08/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
4	JESUS ANDRES MELO GACHANCIPA	79.690.448	1/09/2022	12/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	
5	LAURA MARCELA DIMATE GONZALEZ	1.030.528.681	1/09/2022	16/12/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
6	LINA MARCELA COLORADO CASTRO	1.019.022.812	1/09/2022	NO TIENE EXAMEN VIGENTE	SI	N/A	N/A	N/A	NO	SI	NO SE HA ENTREGADO PAZ Y SALVO
7	SEIDY YURANI SANCHEZ AGUAS	1.022.442.609	1/09/2022	7/09/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
8	YULI ASTRID ESPITIA	1.023.874.373	20/09/2022	17/09/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
9	JOSÉ DIONISIO CARDENAS BOLIVAR	79.511.489	1/09/2022	1/09/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
10	DANIELA SANCHEZ MOLINA	1.015.463.608	19/19/2022	4/10/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
11	MARYELENA NIVIAYO CAICEDO	53.066.964	26/09/2022	14/10/2021	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
12	SHIRLEY KARINA SACHICA	1.090.459.349	1/09/2022	3/01/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
13	ANGIE LORENA OROZCO MONTILLA	1.110.568.316	20/11/2022	18/04/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
14	SEBASTIAN GONZALEZ	1.022.402.058	20/11/2022	9/05/2023	SI	N/A	N/A	N/A	SI		
15	YENI SANGUINO ROMERO	1.032.367.907	20/11/2022	4/01/2022	SI	N/A	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
16	FERNANDO MORENO HUERTAS	3.199.429	23/09/2022	27/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
17	EDINSON VENECIA	72.120.789	1/09/2022	15/10/2021	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
18	LUIS ALBERTO ESPINO OJEDA	1.192,910,231	3/09/2022	5/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
19	NELSON ZAMBRANO	80368960	29/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
20	ORLANDO HERNANDEZ	5842300	20/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
21	YHONAR JAVIER SANCHEZ	1.122.992.170	19/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
22	YOEDINSON VENECIA	1.101.879.446	19/09/2022	14/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
23	FREDDY PEÑA PAEZ	80.148.026	23/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
24	GERARDO HERNANDEZ	115.241.309	22/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
25	HERIBERTO VERA	93.083.537	23/09/2022	20/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
26	JORGE VIZCANO	72.158.125	23/09/2022	28/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
27	JOSE GUILLERMO MARTINEZ	79.666.136	23/09/2022	24/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
28	WHINYER PINILLA	1.014.222.210	22/09/2022	28/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
29	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	26/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
30	ROBERT SALAZAR CARREÑO	16.701.602	26/09/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
31	ESLEIDER JAHIR MERCADO	1.002.067.206	27/09/2022	20/04/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
32	ADRIAN ALREXANDER RODRIGUEZ	1.022.999.566	23/09/2022	22/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
33	VICTOR RODRIGUEZ	79.444.038	26/08/2022	0/01/1900	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
34	RODRIGO ESCAMILLA	72.120.459	28/09/2022	5/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
35	LUIS MERGAREJO	1.045.309.207	7/10/2022	7/10/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
36	DALADIER CUELLAR	79.637.053	7/10/2022	13/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
37	JESUS RAMON CASTILLO	PT 6745683	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
38	RAFAEL JOSÉ CASTILLO	PT 6745484	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
39	SERGIO JESUS CASTILLO	PT 7063564	24/10/2022	26/09/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
40	OSCAR ORTEGA	80.128.209	24/11/2022	22/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
41	RICHARD NAZAREHT CARRASQUEL	PT 7423807	5/11/2022	10/10/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
42	JUAN ANTONIO HERAZO VALDES	79.476.251	3/10/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
43	ALCIDEZ JOSÉ RODRIGUEZ LUJANO	6726606	3/10/2022	8/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
44	JOSÉ ANDRES BARRERA BRICEÑO	80801214	5/10/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
45	NORBERTO AMAYA ALVAREZ	1.033.687.438	11/11/2022	9/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
46	YEISON FERNANDEZ	1.030.657.753	24/11/2022	25/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
47	JOHANA TELLEZ	1.022.971.647	22/11/2022	18/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
48	CRISTIAN JHOJANS YARA DELGADO	1.006.903.745	23/11/2022	18/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
49	JOSE HUMBERTO CARO SUAREZ	79. 057.097	19/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
50	JHON STEVEN ORTEGÓN BLANCO	1.001.271.233	19/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
51	FREDI OSBALDO BOHORQUEZ CHACÓN	79.716.256	24/11/2022	21/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
52	FRANKLIN GUSTAVO QUIÑONES MESA	87.432.481	24/11/2022	21/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
53	JOSÉ NORVEY VILLA PUENTES	80.253.880	23/11/2022	NO PRESENTA	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
54	OSCAR ALBERTO ACOSTA MALPICA	79.913.452	24/11/2022	16/11/2022	N/A	SI	SI	N/A	NO	SI	

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO	PERSONAL		Personal Trabajos en Alturas		ESTADOL ACTUAL		OBSERVACIONES
					Administrativo	Operativo: maestros y auxiliares	APTO	NO APTO	ACTIVO	RETIRADO	
55	JOSÉ ANDRES DÍAZ ORTIZ	1.022.992.366	22/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
56	CRISTIAN ANDRES SILVA RAMÍREZ	1.001.271.816	22/11/2022	17/11/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
57	WILLIAM JAVIER FIERRO PINILLA	3.129.576	24/11/2022	19/11/2022	N/A	SI	SI	N/A	SI		
58	JULIO EPIAYU MONTIEL	PT 5623699	27/11/2022	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
59	LUIS EPIAYU MONTIEL	PT 6353981	27/11/2022	6/04/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
60	YORGELIS CALVO TORRES	PT 2832993	16/01/2023	5/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
61	JIOVANNY JOSÉ PAREDES BRICEÑO	PT 6647515	24/01/2023	7/03/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
62	LUIS TELLEZ MEDINA	3.166.236	6/01/2023	25/07/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
63	LUIS CARLOS MENDOZA GOMEZ	17.971.346	6/01/2023	25/07/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
64	JOSÉ ADONAY CALDERÓN VARGAS	192.343	6/02/2023	21/02/2022	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
65	EDWUIN ANDRES VARGAS HERRERA	1.006.158.053	6/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
66	LUIS ALBERTO VARGAS HERRERA	1.193.492.533	6/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
67	JOSÉ HELI DURAN CASTAÑEDA	80.380.434	1/02/2023	21/12/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
68	VICTOR ALEJANDRO RIZO MIRANDA	1,066,097,223	1/02/2023	29/10/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
69	HUMBERTO BORDA LOPEZ	79.815.559	1/02/2023	21/12/2022	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
70	JHONATAN VARGAS	1.193.499.046	14/02/2023	14/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
71	JOSE JIMENEZ	79.806.500	14/02/2023	01/02/203	N/A	SI	N/A	N/A	NO	SI	
72	JOSE ROVELO	79.769.383	11/02/2023	01/02/203	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
73	OSBAR BERNAL	80.778.371	11/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
74	ANJEL ORTEGA	80.811.761	11/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		

RELACIÓN PERSONAL CON EXÁMENES MÉDICOS											
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**C.C.**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE EXAMEN MÉDICO DE INGRESO/ PERIODICO**	**PERSONAL**		**Personal Trabajos en Alturas**		**ESTADOL ACTUAL**		**OBSERVACIONES**
					Administrativo	**Operativo: maestros y auxiliares**	**APTO**	**NO APTO**	**ACTIVO**	**RETIRADO**	
75	DANY VILLEGAS	PT 5709178	11/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
76	LESCARLOS BAUTISTA	1.003.124.440	11/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
77	JHON RAMOS	80.748.603	14/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
78	OVIER AGUIAR	93.349.859	16/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
79	OSNAIDER SIERRA	1.101.449.072	16/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
80	OSCAR CAYCEDO FAJARDO	1.032.373.665	21/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
81	KEVIN CAICEDO	1.072.497.081	21/02/2023	1/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
82	VICTOR BLANCO	PT 6683921	10/02/2023	3/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
83	ENDER ROJAS	PT 2100970	10/02/2023	4/02/2023	N/A	SI	N/A	N/A	SI		
101											
102											
103											
104											
105											
RESULTADOS:					**15**	**68**	**2**	**0**	**61**	**22**	

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO CONTRATO 999 DE 2022

REALIZADO POR	GLORIA ARBOLEDA ARIAS	FECHA	ene-23	PERIODO EJECUCION	01 ENERO - 30 MARZO 2023

PLAN DE TRABAJO SG SST		AÑO 2023												
		2-8 ene	9-15 ene	16-22 ene	23-29 ene	30-5 feb	6-12 feb	13-19 feb	20-26 feb	27-5 mar	6-112 mar	13-19 mar	20-26 mar	27-31 mar
		Ejecución												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SOCIALIZACION A LA COMUNIDAD (BENEFICIARIOS DEL PROYECTO)	Contratista		P											
			E											
CHARLAS INFORMATIVAS SST Y AMBIENTALES	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
CAPACITACIONES	Contratista			P				P				P		
				E				E				E		
DILIGENCIAMIENTO DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS (SI SE REQUIRE)	Contratista													
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
		E		E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
INDUCCION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO - POLITICAS SST, POLITICA AMBIENTAL (SI SE REQUIRE)	Contratista													
INDUCCION AL PERSONAL OPERATIVO - POLITICAS SST, POLITICAS Y PLAN AMBIENTAL,	Contratista	P				P				P				
						E				E				
INFORME MENSUAL	Contratista	P				P				P				P
		E				E						E		E
INSPECCCION EXTINTOR, CAMILLA Y BOTIQUIN	Contratista				P				P				P	
					E							E	E	

INSPECCION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
REALIZACION O VERIFICACIÓN DE LOS EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE PRE-NGRESO	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
				E	E		E	E	E	E	E	E	E	E
RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, REVISION DE VALES Y PIN DE VOLQUETA	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
REPORTE , SEGUIMIENTO DE ACCIDENTE LABORALES (CUANDO OCURRA EL EVENTO)	Contratista													
SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE CUBIERTA - DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO DE CAMBIO DE CUBIERTAS	Contratista				P				P				P	
					E				E			E		
VERIFICACION DE AFILIACION Y PAGOS AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES	Contratista	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
			E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
DOCUMENTO SUJETO A CAMBIO, DE ACUERDO A LA LOGISTICA DEL AREA TECNICA Y SOCIAL														
P	**Programado**	**Actividades programadas**	15	15	7	8	8	6	7	8	8	6	7	8	7
E	**Ejecutado**	**Actividades ejecutadas**	3	4	7	8	7	6	7	7	7	6	10	7	7
% CUMPLIMIENTO PROGRAMA SEMANAL			20,00%	26,67%	100,00%	100,00%	87,50%	100,00%	100,00%	87,50%	87,50%	100,00%	142,86%	87,50%	100,00%

DEL PROYECTO PRECONSTRUCCIÓN Y EJECUCION	
programadas	110
ejecutadas	86
% proyecto	78,18%

Fecha: MENSUAL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023					
	NOMBRE	**PERMISO DE TRABAJO**	**UBICACIÓN**	**OBSERVACIÓN**	**ESTADO**
1	ROBERT SALAZAR	16.701.602	ROTATIVO		ACTIVO
2	ANGEL SALGE RODRIGUEZ	5.084.025	ROTATIVO		RETIRADO
3	MIGUEL ANGEL LOPEZ PORTILLA	5.763.050	ROTATIVO		ACTIVO
4	JESUS RAMON CASTILLO	PT 6745683	ROTATIVO		ACTIVO
5	RAFAEL JOSÉ CASTILLO	PT 6745484	ROTATIVO	ENTREGO PAZ Y SALVO	RETIRADO
6	SERGIO JESUS CASTILLO	PT 7063564	ROTATIVO	ENTREGO PAZ Y SALVO	RETIRADO
7	RICHARD NAZAREHT CARRASQUEL	PT 7423807	ROTATIVO	ENTREGO PAZ Y SALVO	RETIRADO
8	JULIPO EPIAYU MONTIEL	PT 5623699	ROTATIVO		ACTIVO
9	LUIS EPIAYU MONTIEL	PT 6353981	ROTATIVO		ACTIVO
10	YORGELIS CALVO TORRES	PT 2832993	ROTATIVO		ACTIVO
11	JIOVANNY JOSÉ PAREDES BRICEÑO	PT 6647515	ROTATIVO		ACTIVO
12	DANY VILLEGAS	PT 5709178	ROTATIVO		ACTIVO
13	VICTOR BLANCO	PT 6683921	ROTATIVO		ACTIVO
14	ENDER ROJAS	PT 2100970	ROTATIVO		ACTIVO
15					
16					
17					
18					
19					
20					

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ACTIVIDAD SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 03 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ORDEN Y ASEO, 06 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MV LIBRE DE ESCOMBRO PARA ENTREGA, 10 DE MARCO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRASIEGO DE ESCOMBRO, 01 DE MARZO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, 18 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	LIMPIEZA DE FACHADA, 18 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL EN RECORRIDO ENCONTRADO SIN DOTACIÓN, 15 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CAPACITACIONES OPERATIVOS, 15 DE MARZO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ACTIVIDAD SEPARACIÓN DE RESIDUOS, 03 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	ORDEN Y ASEO, 06 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MV LIBRE DE ESCOMBRO PARA ENTREGA, 10 DE MARCO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	TRASIEGO DE ESCOMBRO, 01 DE MARZO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS, 18 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	LIMPIEZA DE FACHADA, 18 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	PERSONAL EN RECORRIDO ENCONTRADO SIN DOTACIÓN, 15 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	CAPACITACIONES OPERATIVOS, 15 DE MARZO DE 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	VERIFICACIÓN ORDENY ASEO, 23 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	FACHADA CON ESCOMBRO, 22 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	RECOLECCIÓN DE ESCOMBRO, 23 DE MARO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MV LIBRE DE ESCOMBRO PARA ENTREGA, 21 DE MARZO DE 2023

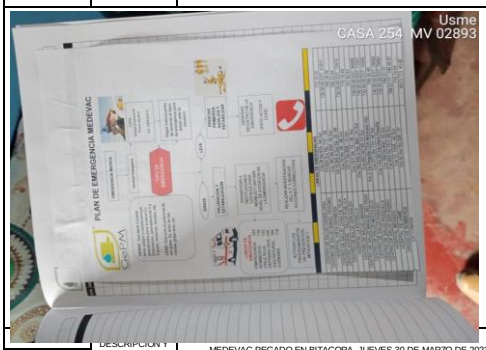
REGISTRO FOTOGRAFICO



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEÑALIZACIÓN RUTA DE EVACUACIÓN , JUEVES 30 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	SEÑALIZACIÓN RIESGO ELECTRICO, MV 02893, 30 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MEDEVAC PEGADO EN BITACORA, JUEVES 30 DE MARZO DE 2023



	DESCRIPCIÓN Y FECHA:	MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2023
