INFORME DE OBRA N°1

OBJETO: “REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA”

CONTRATO N° SA-SI-001-2023

ALCALDÍA DE YARUMAL

MUNICIPIO DE YARUMAL

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

DEL 21 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO DE 2023

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción....4

1. CONTRATISTA.... 5
1.1. CONTROL ADMINISTRATIVO.... 5
1.1.1. Contrato de Obra.... 5
1.1.2. Pólizas.... 5
1.1.3. Comunicaciones.... 6
1.1.4. Seguimiento al avance de obra.... 6
1.2. CONTROL FINANCIERO.... 7
1.2.1. Presupuesto.... 7
1.3. CONTROL TÉCNICO.... 8
1.3.1. Decisiones técnicas.... 8
1.3.2. Actividades ejecutadas.... 8
1.4. RECURSOS.... 9
1.4.1. Recurso humano.... 9
1.4.2. Equipos.... 10

ANEXOS
Anexo N°1: COPIA DE LAS ACTAS DE COMITÉ.... 11
Anexo N°2: REGISTRO FOTOGRÁFICO.... 15
Anexo N°3: ACTA DE OBRA No. 1.... 19
Anexo N°4: SEGURIDAD SOCIAL.... 27

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra 5
Tabla 2. Relación de Pólizas del Contratista, valor asegurado y vigencia 5
Tabla 3. Estados financieros del Contratista.....7
Tabla 4. Actividades realizadas durante el periodo del presente informe 9
Tabla 5. Personal en Obra del Contratista.....10
Tabla 6. Relación del Personal.....10
Tabla 7. Relación de Equipos en Obra 10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Avance del Plazo VS Avance de Obra.....7

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Yarumal realizó la adjudicación del contrato No. SA-SI-001-2023 del proyecto que tiene como objeto "REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA" al Contratista de Obra LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN; proyecto que contempla el mantenimiento y mejoramiento de los diferentes espacios de la infraestructura educativa considerada como patrimonio material de los yarumaleños. Se contempla el mejoramiento y la adecuación de los tejados, la pintura de los diferentes elementos arquitectónicos y estructurales, la adecuación y mejoramiento del comedor escolar, el mejoramiento de los servicios sanitarios y el mantenimiento de las redes eléctricas.

La supervisión de este contrato está a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física del Municipio, quienes realizan directamente las actividades de auditoría y supervisión y garantizan el cumplimiento de los pliegos y demás normas aplicables.

A continuación, se presenta el resumen del Contrato de Obra y la descripción de las actividades ejecutadas por el Contratista, así como también, toda la información técnica, administrativa, legal y financiera del proyecto como está contemplado en el contrato.

1. CONTRATISTA

1.1. CONTROL ADMINISTRATIVO

1.1.1. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	SA-SI-001-2023
OBJETO	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YARUMAL
CONTRATISTA	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN
REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN
VALOR DEL CONTRATO	$279.953.032
PLAZO	Tres (3) meses y quince (15) días
FECHA DE INICIO	21 de febrero de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	05 de junio de 2023

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra

1.1.2. Pólizas

PÓLIZAS CONTRATISTA	VALOR ASEGURADO	INICIO	FINAL
Cumplimiento N° 65-44-101218377	$55.990.606,40	25/01/2023	10/11/2023
Estabilidad y Calidad N° 65-44-101218377	$83.985.909,60	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la entrega a satisfacción del proyecto	
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales N° 65-44-101218377	$13.997.651,60	25/01/2023	10/05/2026
Responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento N° 65-40-101069053	$232.200.000,00	25/01/2023	10/05/2023

Tabla 2. Relación de Pólizas del Contratista, valor asegurado y vigencia

Las pólizas de la *Tabla 2* fueron tomadas por el Contratista a favor del Municipio de Yarumal y los terceros afectados según sea el caso, con la aseguradora Seguros del Estado S.A.

1.1.3. Comunicaciones

El Supervisor realizó varias observaciones y/o recomendaciones al Contratista durante este periodo de ejecución de obra, las cuales quedaron plasmadas en correo electrónico y en los comités de obra realizados.

El Supervisor solicitó al Contratista vía comité de obra lo siguiente:

- APU's para la ejecución de actividades de obra extra identificadas en visita de campo.
- Balance presupuestal y proyección de obra con las actividades a realizar y actualización de las cantidades de obra.

El Contratista realizó la entrega de los soportes de afiliación a la seguridad social y ARL de todo su personal operativo y administrativo vía correo electrónico antes de empezar con las labores, los cuales fueron verificados en campo por el Supervisor.

Como soporte se adjuntan:

- Anexo 1. Copia de las Actas de Comité

1.1.4. Seguimiento al avance de obra

A partir de la firma del Acta de inicio el 21 de febrero de 2023 el Contratista cuenta con un total de tres (3) meses y quince (15) días (un total de 104 días) hasta la fecha límite de entrega el 05 de junio de 2023. Para la fecha de entrega del presente informe el Contratista ha trabajado un total de 23 días, que representa el 22.11% de avance del plazo total.

Según el Acta de Obra No. 01 que tiene la misma fecha del presente informe el avance de obra presupuestal está en un 25.48% del presupuesto total. Según lo

anterior, como muestra la *Figura 1*, el Contratista cuenta con un porcentaje de más del 3% a favor en avance de obra con respecto al avance del plazo. Se concluye que para la fecha del presente informe, el tiempo de entrega está dentro de lo estimado.

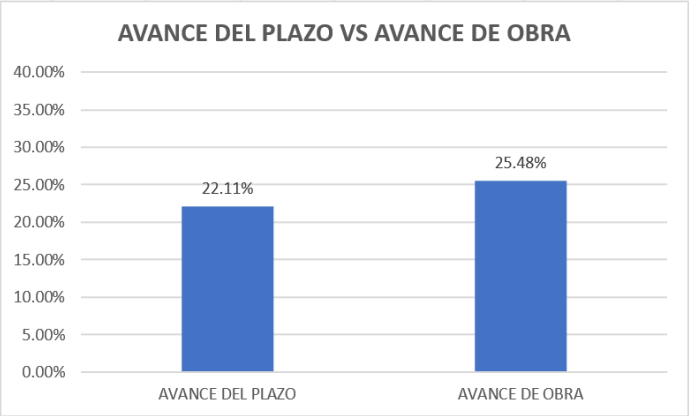


Figura 1. Avance del Plazo VS Avance de Obra

1.2. CONTROL FINANCIERO

1.2.1. Presupuesto

Dado que las condiciones de algunas actividades del presupuesto cambiaron en el desarrollo de la obra, como se mencionó arriba en la sección de comunicación y como se constata en el Acta de Comité No. 1 (Ver Anexo 1), se solicitó al Contratista realizar los APU de dichos ítems modificados o de nueva obra generadas, necesarias para el desarrollo del proyecto. Los cuales deberán ser revisados y aprobados por el Supervisor del Municipio. Toda obra adicional será incluida dentro de un Acta de Cambio de Obra, para garantizar el balance del proyecto y evitar sobrepasar el monto contractual establecido.

DESCRIPICIÓN PAGOS	PORCENTAJE	VALOR
CONTRATO INICIAL	100,00%	$279.953.032,00
ACTA DE OBRA No. 1	25,48%	$71.338.436,79
TOTAL ACUMULADO	25,48%	$71.338.436,79
SALDO PENDIENTE	74,52%	$208.614.595,21

Tabla 3. Estados financieros del Contratista

1.3. CONTROL TÉCNICO

1.3.1. Decisiones técnicas

- Mejorar las condiciones de adherencia del tejado sobre la superficie de manto asfáltico en alta pendiente, instalando un envarillado en madera para soporte de las tejas, permitiendo con ello evitar el rodamiento o desplazamiento de las mimas y por ende las posibles goteras.
- Sobre la Losa de cubierta de la parte trasera de la institución, no realizar el vaciado de mortero y la aplicación del manto asfáltico de aluminio para impermeabilizar la losa. En cambio realizar un techo al nivel más bajo posible con sus actividades complementarias que garantice el no ingreso de agua o la aparición de humedades sobre el cielo de los salones interiores subyacentes.
- Realizar una nueva acometida sanitaria para la cocina del restaurante, ya que la existente presenta taponamiento y es muy antigua.
- Realizar el cambio de 11 inodoros que se identificaron en pésimas condiciones y muy antiguos.

1.3.2. Actividades ejecutadas

ITEM	DESCRIPCION
1	**VARIOS**
1.04	Revisión general de bombas y accesorios en sanitarios incluye abastos, bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
1.09	Acabado mediacaña para pisos, muros y cielos en restaurante escolar
2	**CUBIERTA**
2.01	Reparacion de cubierta mediante suministro de un 30% de tejas de barro nuevas, remocion de tejas averiadas, limpieza de canoas y reacomodacion de elementos en buen estado para garantizar que no se presenten goteras
2.02	Suministro, transporte y colocación de ruana en lamina galvanizada, con desarrollo necesario para evitar filtraciones en cubierta.

3	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**
3.03	Suministro, transporte e instalación de viga-columna en madera 10x10cm para cubierta
3.04	Reparacion de chambrana en madera y macana con elementos similares a los existentes
4	**ACABADOS ESCUELA Y RESTAURANTE ESCOLAR**
4.01	Pintura tipo 1 sobre pared y cielos, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir
4.02	Barniz y esmalte en vigas y tablilla de techos y cielos, incluye adecuación de la superficie a intervenir
4.03	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas, zocalos y espacios que lo requieran, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir
4.04	Pintura tipo esmalte sobre chambrana a dos manos, incluye adecuación de la superficie a intervenir
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**
5.01	Suministro, transporte y colocación de sanitario economico comun. Incluye desmonte del aparato existente
5.02	Suministro, transporte y colocación de sanitario infantil. Incluye desmonte del aparato existente
5.16	Suministro, transporte y colocación de orinal
5.2	suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 3"

Tabla 4. Actividades realizadas durante el periodo del presente informe

Las actividades realizadas durante el periodo que comprende el presente informe se listan en la *Tabla 4.* Para mayor detalle y como soporte de los elementos construidos ver:

- Anexo 2: Registro Fotográfico
- Anexo 3: Acta de Obra No. 1

1.4. RECURSOS

1.4.1. Recurso humano

A continuación, se muestra el recurso humano con el que el Contratista cuenta para el desarrollo de las actividades:

PERSONAL ADMINISTRATIVO	CANTIDAD
Residente de Obra	1
Apoyo al Residente	1
Maestro de Obra	1
PERSONAL OPERATIVO	
Oficial de obra	2
Ayudante de obra	3

Tabla 5. Personal en Obra del Contratista

Cédula	Nombre	Cargo
15326333	Leonardo Favio Correa Roldán	Residente
1042766322	Edwin Alejandro Roldán Zabala	Apoyo Res.
15325035	Carlos Alberto Rivera Loaiza	Maestro
1042773175	David Alejandro Meza Rojas	Oficial
15325023	Juan Fernando Zapata Cano	Oficial
15320650	Juan de Dios Zabala Palacio	Ayudante
1193124502	Santiago Meza Rojas	Ayudante
1023724127	Alejandro Zapata Villa	Ayudante

Tabla 6. Relación del Personal

Para verificar el pago de la seguridad social de todos los colaboradores del Contratista ver: Anexo 4: Seguridad Social

1.4.2. Equipos

EQUIPO	CANTIDAD
Cuerpos de andamios	30
Herramienta menor	n/a
Taladro roto-percutor	1
Compresor y pistola	1
Escaleras	2

Tabla 7. Relación de Equipos en Obra

Cordialmente,



LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN

Contratista

ANEXO N° 1.

ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

ACTA COMITE DE OBRA N°01

ASUNTO: AVANCE DE OBRA	**Reunión Ordinaria No. 01 de 2023**

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
NO DE CONTRATO	SA-SI-001-2023
NOMBRE DEL CONTRATANTE	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN
NOMBRE DEL INTERVENTOR	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE MARIA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL-ANTIOQUIA
FECHA	MARZO (08) de 2023.
HORA	4 pm
FECHA DE INICIO	ENERO 27 DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	ABRIL 30 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS M.C. 279.953.032

ORDEN DEL DIA

1. **ANALISIS Y AVANCE DE EJECUCION DE LAS OBRAS**
2. **ANALISIS DE LAS OBRAS EXTRAS PRESENTADAS EL 01 DE MARZO DE 2023**
3. **BALANCE DEL CONTRATO**

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

DESARROLLO

1. Inicia la reunión con intervención del Secretario de Infraestructura solicitando al contratista el avance de las obras a la fecha y los inconvenientes que se han presentado a la fecha

   A lo que el contratista responde que se han ejecutado las obras acordes al presupuesto de la obra, a la fecha se han realizado la instalación de los inodoros, sanitaria, pintura de la edificación resanes, entre otros.

   De igual manera se solicito garantizar la estabilidad de los inodoros y sanitarios dado que por ser utilizado por el alumnado se puede presentar mayores riesgos de daño, también se solicitó dar cumplimiento a las especificaciones establecidas en cada uno de los ítem del contrato.

2. El secretario solicita realizar un balance del contrato a las actividades que se ejecutando.

   De acuerdo a los ítems de mantenimiento de cubierta y de impermeabilización d cubierta el contratista propone los siguientes obras extras que permitan de esta manera una mayor estabilidad en el tiempo.

   - Mejorar las condiciones de adherencia del tejado sobre la superficie de manto asfáltico en alta pendiente, instalando un envarillado en madera para soporte de las tejas, permitiendo con ello evitar el rodamiento o desplazamiento de las mimas y por ende las posibles goteras.
   - Sobre la Losa de cubierta de la parte trasera de la institución, no realizar el vaciado de mortero y la aplicación del manto asfáltico de aluminio para impermeabilizar la losa. En cambio, realizar un techo al nivel más bajo posible con sus actividades complementarias que garantice el no ingreso de agua o la aparición de humedades sobre el cielo de los salones interiores subyacentes.
   - Realizar una nueva acometida sanitaria para la cocina del restaurante, ya que la existente presenta taponamiento y es muy antigua.
   - Realizar el cambio de 11 inodoros que se identificaron en pésimas condiciones y muy antiguo.

El contratista presento dichos APU el día 01 de marzo a lo cual desde la secretaria se les realizo el respectivo análisis, y los cuales se envía observaciones para corregir.

CONCLUSIONES

El municipio procederá a evaluar los APUS, acorde a las observaciones planteadas, para aprobar y el contratista se compromete a realizar el balance financiero.

Se da por terminada a las 5:00pm del día ocho (08) de marzo de 2023 en las oficinas de la secretaria de planeación del municipio de Yarumal, Antioquia

Atentamente,

LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
Secretario Infraestructura

LEONARDO CORREA ROLDAN
Contratista.

CLAUDIA PATRICIA GUIRALES PULGARIN
Profesional de Apoyo Sec Infraestructura

ANEXO N° 2.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.



Fotografía 1. Reparación de columna, viga y chambrana madera



Fotografía 4. Acometida nueva cocina



Fotografía 2. Resane de zócalos



Fotografía 5. Zócalo mediacaña nuevo para comedor escolar




Fotografía 3. Demolición y excavación para acometida nueva cocina




Fotografía 6. Reparación de chambrana madera

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

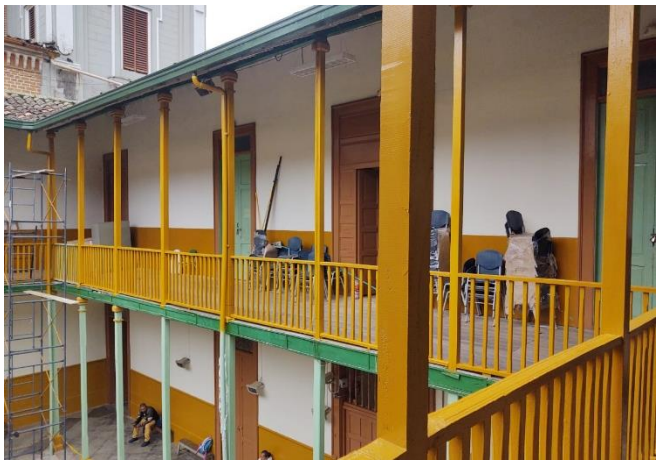

Fotografía 7. Pintura de chambranas

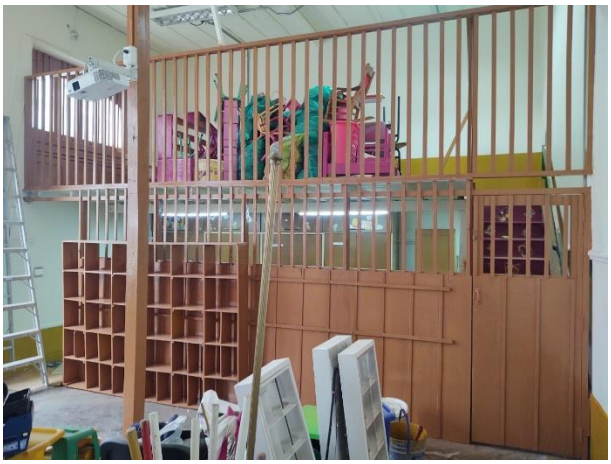

Fotografía 10. Pintura de mesanine



Fotografía 8. Pintura de puertas baños e inodoros nuevos



Fotografía 11. Inodoros infantiles nuevos




Fotografía 9. Pintura de cielos en tablilla machimbre y alfardas



Fotografía 12. Pintura de zócalos

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

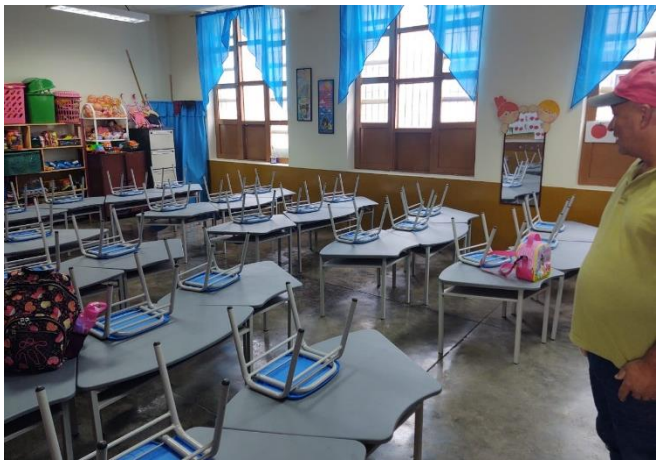

Fotografía 13. Pintura de ventanales internos



Fotografía 14. Pintura de columnas, chambranas, puretas, zócalos y muros



Fotografía 15. Mantenimiento de tejado



Fotografía 16. Mantenimiento de tejado



Fotografía 17. Cambio e impermeabilización de ruanas



Fotografía 18. Estado anterior de las ruanas

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

ANEXO N° 3.

ACTA DE OBRA No. 1

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

MUNICIPIO DE YARUMAL	**OBJETO: REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS A LA SEDE ROSENDA TORRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA.**
	CONTRATO Nº SA-SI-001-2023
	CONTRATISTA: LEONARDO FAVIO CORREA ROLDÁN
	SUPERVISOR: LUCAS EDILSON MUÑOZ MORENO
	PLAZO: TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
	VALOR CONTRATADO: $279.953.032
	FECHA ACTA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2023

OBRA PRESUPUESTADA						ACTA 01		ACUMULADO	
CONTRATADO						FECHA: 16-03-2023			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR CONTRATADO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**	**CANTIDAD ACUMULADA**	**VALOR ACUMULADO**
1	**VARIOS**								
1.01	Suministro, transporte e instalacion de bajantes PVC Ø 3"-4"	ml	85.00	$ 28,057.00	$2,384,845.00		$0.00	0.00	$0.00
1.02	suminsitro, transporte e instalacion de llave de medio paso pvc Ø 1/2"	und	1.00	$ 33,666.00	$33,666.00		$0.00	0.00	$0.00
1.03	Desmonte, limpieza, adecuacion y reinstalacion de tanque de reserva existente y retiro de tanque inservible	und	1.00	$ 132,470.00	$132,470.00		$0.00	0.00	$0.00
1.04	Revisión general de bombas y accesorios en sanitarios incluye abastos, bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	und	5.00	$ 45,901.00	$229,505.00	5.00	$229,505.00	5.00	$229,505.00
1.05	Impermeabilizacion con manto asfaltico de aluminio, que incluye desmonte impermeabilizante existente, limpieza, recintes, resanes, emboquillados y tragantes del sistema de drenaje existente en losa del bloque de la unidad sanitaria	m2	50.00	$ 50,621.00	$2,531,050.00		$0.00	0.00	$0.00
1.06	Construcción de muro ladrillo hueco perforación horizontal e:0,10m, altura 0-3,0m, para cuchillas y restaurante escolar	m2	35.00	$ 81,621.00	$2,856,735.00		$0.00	0.00	$0.00
1.07	Revoque liso sobre pared	m2	50.00	$ 21,143.00	$1,057,150.00		$0.00	0.00	$0.00
1.08	Demolición, adecuación de superficies y resanes en revoque impermeabilizado para reparación de zócalos H: 0,40m	ml	60.00	$ 27,550.00	$1,653,000.00		$0.00	0.00	$0.00
1.09	Acabado mediacaña para pisos, muros y cielos en restaurante escolar	ml	45.00	$ 57,241.00	$2,575,845.00	53.90	$3,085,289.90	53.90	$3,085,289.90
1.1	lavado profundo con hidrolavadora para diferentes superficies	m2	50.00	$ 17,735.21	$886,760.42		$0.00	0.00	$0.00
1.2	suministro e instalacion de ruana en lamina calibre 26 de 25cm de ancho	m	30.00	$ 35,161.25	$1,054,837.50		$0.00	0.00	$0.00
1.3	mortero 1:4 impermeabilizado hasta 0,08m de espesor, con mezcla de impermeabilizante fluido tipo sika	m3	3.00	$ 628,661.25	$1,885,983.75		$0.00	0.00	$0.00
1.4	impermeabilizacion de superficies Bitualum Adhesivo 2.2mm, incluye lavado y preparación de superficies con hidolavadora	m2	10.00	$ 69,354.06	$693,540.63		$0.00	0.00	$0.00
1.5	impermeabilizacion de superficies con emulsión	m2	10.00	$ 34,604.06	$346,040.63		$0.00	0.00	$0.00
1.6	impermeabilizacion con Cinta Impermeabilizante Tapa Goteras autoadhesiva	m	25.00	$ 41,305.73	$1,032,643.23		$0.00	0.00	$0.00

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

1.7	suministro de malla electrosoladada d84	m2	10.00	$ 10,785.21	$107,852.08		$0.00	0.00	$0.00
2	**CUBIERTA**								
2.01	Reparacion de cubierta mediante suministro de un 30% de tejas de barro nuevas, remocion de tejas averiadas, limpieza de canoas y reacomodacion de elementos en buen estado para garantizar que no se presenten goteras	m2	650.00	$ 57,184.00	$37,169,600.00	120.00	$6,862,080.00	120.00	$6,862,080.00
2.02	Suministro, transporte y colocación de ruana en lamina galvanizada, con desarrollo necesario para evitar filtraciones en cubierta.	ml	30.00	$ 55,701.00	$1,671,030.00	30.00	$1,671,030.00	30.00	$1,671,030.00
2.03	Suministro, transporte y colocación de tablilla zapan y manto asfaltico para cubierta, similar a las existentes.	m2	83.00	$ 58,662.25	$4,868,966.37		$0.00	0.00	$0.00
3	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**								
3.01	Reparacion de ventana de madera con acabados y cortes similares a los existentes.	m2	25.00	$ 119,000.00	$2,975,000.00		$0.00	0.00	$0.00
3.02	Suministro, transporte e instalación de puerta en madera similar a la existente, con todos sus componentes, chapas y demas elementos para garantizar su correcta instalacion y funcionamiento	und	1.00	$ 4,749,268.00	$4,749,268.00		$0.00	0.00	$0.00
3.03	Suministro, transporte e instalación de viga-columna en madera 10x10cm para cubierta	m	25.00	$ 64,437.00	$1,610,925.00	7.70	$496,164.90	7.70	$496,164.90
3.04	Reparacion de chambrana en madera y macana con elementos similares a los existentes	m	12.00	$ 96,077.00	$1,152,924.00	4.32	$415,052.64	4.32	$415,052.64
3.05	Suministro e instalación de vidrios para ventanas de 4mm, Incluye retiro y disposición de elementos deteriorados ademas pisavidrios en madera	m2	30.00	$ 116,600.00	$3,498,000.00		$0.00	0.00	$0.00
3.06	Suministro e instalacion de puertas para baño de 0,60 a 0,80 x 2,10 de altura en lámina galvanizada	und	6.00	$ 550,504.17	$3,303,025.00		$0.00	0.00	$0.00
3.07	enchape piso pared para baños	m2	80.00	$ 78,387.50	$6,271,000.00		$0.00	0.00	$0.00
4	**ACABADOS ESCUELA Y RESTAURANTE ESCOLAR**								
4.01	Pintura tipo 1 sobre pared y cielos, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	4,696.00	$ 13,759.00	$64,612,264.00	1368.04	$18,822,862.36	1368.04	$18,822,862.36
4.02	Barniz y esmalte en vigas y tablilla de techos y cielos, incluye adecuación de la superficie a intervenir	m2	1,584.00	$ 14,834.00	$23,497,056.00	208.64	$3,094,965.76	208.64	$3,094,965.76
4.03	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas, zocalos y espacios que lo requieran, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	m2	1,580.00	$ 16,901.00	$26,703,580.00	677.89	$11,457,018.89	677.89	$11,457,018.89
4.04	Pintura tipo esmalte sobre chambrana a dos manos, incluye adecuación de la superficie a intervenir	m	60.00	$ 18,549.00	$1,112,940.00	53.60	$994,226.40	53.60	$994,226.40
5	**INSTALACIONES SANITARIAS**								
5.01	Suministro, transporte y colocación de sanitario economico comun. Incluye desmonte del aparato existente	und	6.00	$ 324,126.00	$1,944,756.00	11.00	$3,565,386.00	11.00	$3,565,386.00
5.02	Suministro, transporte y colocación de sanitario infantil. Incluye desmonte del aparato existente	und	4.00	$ 539,815.00	$2,159,260.00	4.00	$2,159,260.00	4.00	$2,159,260.00
5.03	suministro e instalacion de accesorios codo sanitario de 2"	und	6.00	$ 9,795.60	$58,773.58		$0.00	0.00	$0.00

5.04	suministro e instalacion de accesorios sanitario codo 45° de 2"	und	4.00	$ 11,795.60	$47,182.39		$0.00	0.00	$0.00
5.05	suministro e instalacion de accesorios codo de 3" 45°	und	5.00	$ 18,848.81	$94,244.07		$0.00	0.00	$0.00
5.06	suministro e instalacion de accesorios codo de 3"	und	5.00	$ 15,448.81	$77,244.07		$0.00	0.00	$0.00
5.07	suministro e instalacion de accesorios codo de 4"	und	4.00	$ 18,748.81	$74,995.26		$0.00	0.00	$0.00
5.08	suministro e instalacion de accesorios codo de 4" 45°	und	5.99	$ 25,848.81	$154,906.26		$0.00	0.00	$0.00
5.09	suministro e instalacion de accesoriosYee de 4" a 3"	und	2.00	$ 41,034.85	$82,069.70		$0.00	0.00	$0.00
5.1	suministro e instalacion de accesorios reduccion de 4" a 2"	und	4.00	$ 44,034.85	$176,139.40		$0.00	0.00	$0.00
5.11	suministro e instalacion de accesoriosYee de 4"	und	3.00	$ 51,034.85	$153,104.55		$0.00	0.00	$0.00
5.12	suministro e instalacion de accesoriosYee de 3" a 2"	und	4.00	$ 23,695.60	$94,782.39		$0.00	0.00	$0.00
5.13	suministro e instalacion de accesoriosYee de 2"	und	2.00	$ 15,695.60	$31,391.19		$0.00	0.00	$0.00
5.14	suministro e instalacion de accesoriosYee de 3"	und	3.00	$ 25,695.60	$77,086.79		$0.00	0.00	$0.00
5.15	desmonte de tuberias de cualquier dimensión incluye excavaciones y demoliciones simples	m	15.00	$ 14,500.00	$217,500.00		$0.00	0.00	$0.00
5.16	Suministro, transporte y colocación de orinal	und	6.00	$ 306,704.00	$1,840,224.00	4.00	$1,226,816.00	4.00	$1,226,816.00
5.17	suministro e instalacion de tuberia 1/2" alta presion, 13.5-315 psi incluye accesorios	ml	26.00	$ 13,707.40	$356,392.30		$0.00	0.00	$0.00
5.18	suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 2"	ml	15.00	$ 20,982.40	$314,735.94		$0.00	0.00	$0.00
5.19	suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 4"	m	15.00	$ 35,157.40	$527,360.94		$0.00	0.00	$0.00
5.2	suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 3"	m	15.00	$ 27,500.00	$412,500.00	12.00	$330,000.00	12.00	$330,000.00
6	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**								
6.01	Mantenimiento de salidas eléctricas 110W (plafón/lámpara), tomacorrientes y suiches, incluye: caja y aparato (toma-plafón - suiche). Y colocacion de ductos donde se requiera en tuberia EMT	und	35.00	$ 34,067.00	$1,192,345.00		$0.00	0.00	$0.00
6.02	Suministro e instalación de bombillo LED tipo UFO 40W estos elementos deben ofrecer garantía de durabilidad	und	5.00	$ 53,004.45	$265,022.23		$0.00	0.00	$0.00
6.03	Suministro e instalación de lámparas led herméticas LED 2x18 w para cocina, estos elementos deben ofrecer garantía de durabilidad	und	3.00	$ 170,000.00	$510,000.00		$0.00	0.00	$0.00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS	$213,519,518.65	C.D. ACTA 01	$54,409,657.85	C.D. ACUMULADO	$54,409,657.85
				A.U. (31%)	$66,433,513.36	A.U. ACTA 01	$16,928,778.94	A.U. ACUMULADO	$16,928,778.94
				TOTAL COSTOS	**$279,953,032.00**	**TOTAL ACTA 01**	**$71,338,436.79**	**TOTAL ACUMULADO**	**$71,338,436.79**
				PORCENTAJE EJECUTADO	100.00%	25.48%		25.48%	

MEMORIAS DE CÁLCULO														
ACTA N°	ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	UND	CANT	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	DIAMETRO o # BARRA	ÁREA (m2)	VOLUMEN (m3)	PESO (kg)	TOTAL UNIDAD	OBSERVACIONES
1	1.04	Revisión general de bombas y accesorios en sanitarios incluye abastos, bombas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Baño de niñas	und	5.00								5.00	
												TOTAL	5.00	
1	1.09	Acabado mediacaña para pisos, muros y cielos en restaurante escolar	Restaurante escolar	ml	1.00			53.90					53.90	
												TOTAL	53.90	
1	2.01	Reparacion de cubierta mediante suministro de un 30% de tejas de barro nuevas, remocion de tejas averiadas, limpieza de canoas y reacomodacion de elementos en buen estado para garantizar que no se presenten goteras	Ala frontal	m2	1.00					120.00			120.00	
												TOTAL	120.00	
1	2.02	Suministro, transporte y colocación de ruana en lamina galvanizada, con desarrollo necesario para evitar filtraciones en cubierta.	Sobre techo detrás de fachada frontal	ml	1.00			30.00					30.00	
												TOTAL	30.00	
1	3.03	Suministro, transporte e instalación de viga-columna en madera 10x10cm para cubierta	Patio trasero corredor segundo piso	m	1.00			7.70					7.70	
												TOTAL	7.70	
1	3.04	Reparacion de chambrana en madera y macana con elementos similares a los existentes	segundo piso patio trasero	m	1.00			4.32					4.32	
												TOTAL	4.32	
1	4.01	Pintura tipo 1 sobre pared y cielos, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	Muros acceso principal	m2	1.00	3.10		12.20		37.82			37.82	
1	4.01		Descuento de puertas, ventanas y vanos acceso ppal	m2	-1.00	3.80	1.80			6.84			-6.84	
1	4.01		Cielo acceso principal	m2	1.00		2.97	6.10		18.12			18.12	
1	4.01		Muros corredor patio inferior	m2	1.00	3.10		75.30		75.30			75.30	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos patio inferior	m2	-1.00					55.17			-55.17	
1	4.01		Cielo corredor patio inferior	m2	1.00		2.45	65.50		160.48			160.48	
1	4.01		muros Salón 1 (Baño profesores 1er piso)	m2	1.00	3.90		17.10		66.69			66.69	

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

1	4.01		muros Salón 1 (Baño profesores 1er piso)	m2	1.00	1.30		3.65		4.75			4.75	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 1 (Baño profesores 1er piso)	m2	-1.00					8.79			-8.79	
1	4.01		Muros Salón 4 (salón de profesores)	m2	1.00	3.90		29.70		115.83			115.83	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 4 (salón de profesores)	m2	-1.00					25.00			-25.00	
1	4.01		Cielo Salón 4 (profesores)	m2	1.00		5.90	8.95		52.81			52.81	
1	4.01		Muros Salón 5 (preescolar abajo)	m2	1.00	3.90		29.40		114.66			114.66	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 5 (preescolar abajo)	m2	-1.00					20.30			-20.30	
1	4.01		Cielo Salón 5 (preescolar abajo)	m2	1.00		5.90	8.80		51.92			51.92	
1	4.01		Cuelo mesanine Salón 5 (preescolar abajo)	m2	1.00		2.00	5.90		11.80			11.80	
1	4.01		Muros Salón 6 (cómputo)	m2	1.00	3.90		27.40		106.86			106.86	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 6 (bilbioteca)	m2	-3.00	3.00	1.80			5.40			-16.20	
1	4.01		Cielo Salón 6 (bilbioteca)	m2	1.00		6.00	7.70		46.20			46.20	
1	4.01		Muros Salón 7 (clases)	m2	1.00	3.90		29.40		114.66			114.66	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 7 (clases)	m2	-2.00	3.00	2.35			7.05			-14.10	
1	4.01		Muros Salón 8 (preescolar arriba)	m2	1.00	2.35		31.80		74.73			74.73	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Salón 8 (preescolar arriba)	m2	-1.00					23.18			-23.18	
1	4.01		Cielo Salón 8 (preescolar arriba)	m2	1.00		5.90	10.00		59.00			59.00	
1	4.01		Muros Restaurante	m2	1.00	2.35		61.80		145.23			145.23	
1	4.01		Descuento puertas, ventanas y vanos Restaurante	m2	-1.00					28.02			-28.02	
1	4.01		Cielo Restaurante	m2	1.00					72.98			72.98	
1	4.01		Muros escalas	m2	1.00	3.10	7.00			21.70			21.70	ambos lados de la escalera
1	4.01		Muros corredor patio superior	m2	1.00	1.55		19.60		30.38			30.38	
1	4.01		Descuento de puertas, ventanas y vanos corredor patio superior	m2	-1.00					9.07			-9.07	

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

1	4.01		Cielo corredor patio superior	m2	1.00		2.60	15.00		39.00			39.00	
1	4.01		Muros Salón 9 (enfermería)	m2	1.00	4.35		17.10		74.39			74.39	
1	4.01		Descuento de puertas, ventanas y vanos Salón 9 (enfermería)	m2	-1.00					8.91			-8.91	
1	4.01		Muros corredor patio inferior segundo piso	m2	1.00	3.55		75.30		75.30			75.30	
1	4.01		Descuento de puertas, ventanas y vanos corredor patio inferior segundo piso	m2	-1.00					41.99			-41.99	
1	4.01		Muros Salón 11	m2	1.00	4.35		18.20		79.17			79.17	
1	4.01		Descuento de puertas, ventanas y vanos salón 11	m2	-1.00					24.15			-24.15	
												TOTAL	1368.04	
1	4.02	Barniz y esmalte en vigas y tablilla de techos y cielos, incluye adecuación de la superficie a intervenir	techo corredor patio inferior segundo piso	m2	1.08		2.45	65.50		160.48			172.84	
1	4.02			m2	1.08		2.45	6.10		14.95			16.10	
1	4.02			m2	1.08		3.00	6.10		18.30			19.71	
												TOTAL	208.64	
1	4.03	Pintura tipo esmalte base aceite sobre puertas, zocalos y espacios que lo requieran, a dos manos, incluye resane de grietas menores y adecuación de la superficie a intervenir	Zócalo patio inferior	m2	1.00	1.60		65.50		104.80			104.80	
1	4.03		Descuento de puertas o vanos, Zócalo patio inferior	m2	-1.00					37.01			-37.01	
1	4.03		zócalo acceso principal	m2	1.00	1.60		8.05		12.88			12.88	
1	4.03		zócalo Salón 1 (baños profesores)	m2	1.00	0.80		17.10		13.68			13.68	
1	4.03		zócalo Salón 1 (baños profesores)	m2	1.00	0.80		3.65		2.92			2.92	
1	4.03		zócalo Salón 4 (salón de profesores)	m2	1.00	0.80		27.94		22.35			22.35	
1	4.03		zócalo Salón 5 (preescolar abajo)	m2	1.00	0.80		33.54		26.83			26.83	
1	4.03		zócalo Salón 6 (cómputo)	m2	1.00	0.80		22.12		17.70			17.70	
1	4.03		zócalo Salón 7 (clases)	m2	1.00	0.80		24.70		19.76			19.76	
1	4.03		zócalo Salón 8 (preescolar arriba)	m2	1.00	0.80		30.04		24.03			24.03	
1	4.03		zócalo corredor patio superior	m2	1.00	1.60		14.40		23.04			23.04	
1	4.03		zócalo restaurante	m2	1.00	0.80		48.70		38.96			38.96	
1	4.03		zócalo escalas	m2	2.00	1.60		7.00		11.20			22.40	
1	4.03		zócalo Salón 9 (enfermería)	m2	1.00	0.80		15.34		12.27			12.27	
1	4.03		zócalo patio inferior segundo piso	m2	1.00	1.60		58.63		58.63			58.63	
1	4.03		zócalo salón 11	m2	1.00	0.80		12.30		9.84			9.84	

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

1	4.03		Puerta de acceso a patio	m2	2.00	3.80	2.35			8.93			17.86	
1	4.03		Puerta Salón 1 (baño profes)	m2	2.00	3.80	1.76			6.69			13.38	
1	4.03		Puerta Salón 2 (clases)	m2	2.00	3.80	1.76			6.69			13.38	
1	4.03		Puerta Coordinación	m2	2.00	3.80	1.76			6.69			13.38	
1	4.03		Puertas y divisiones Salón 6 (cómputo)	m2	6.00	3.80	1.76			6.69			40.13	
1	4.03		Puertas y divisiones Salón 7	m2	4.00	3.80	2.35			8.93			35.72	
1	4.03		Divisiones y mesanine Salón 5 (preescolar)	m2	2.00	3.50	5.90			20.65			41.30	
1	4.03		Puerta Salón 8 (preescolar arriba)	m2	2.00	2.80	1.40			3.92			7.84	
1	4.03		Puerta Restaurante a patio superior	m2	2.00	2.10	1.20			2.52			5.04	
1	4.03		Puerta Salón 9 (enfermería)	m2	2.00	3.80	1.76			6.69			13.38	
1	4.03		Puerta acceso Salón 11	m2	2.00	3.80	2.35			8.93			17.86	
1	4.03		Puertas internas Salón 11	m2	4.00	1.76	3.80			6.69			26.75	
1	4.03		Puertas baños niños	m2	42.00	2.00	0.70			1.40			58.80	
												TOTAL	677.89	
1	4.04	Pintura tipo esmalte sobre chambrana a dos manos, incluye adecuación de la superficie a intervenir	Chambranas patio inferior segundo piso	m	1.00			53.60					53.60	
												TOTAL	53.60	
1	5.01	Suministro, transporte y colocación de sanitario economico comun. Incluye desmonte del aparato existente	Inodoros en baños de niños	und	11.00								11.00	
												TOTAL	11.00	
1	5.02	Suministro, transporte y colocación de sanitario infantil. Incluye desmonte del aparato existente	Inodoros en baños de niños	und	4.00								4.00	
												TOTAL	4.00	
1	5.16	Suministro, transporte y colocación de orinal	En baños niños	und	4.00								4.00	
												TOTAL	4.00	
1	5.2	suministro e instalacion de tuberia sanitaria de 3"	Acometida nueva cocina	m	12.00								12.00	
												TOTAL	12.00	

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

ANEXO N° 4.

SEGURIDAD SOCIAL

Carrera 87D No: 45-40. Apto 401. Medellín
Cel: 320-6746304
E-mail : leonardocorrearoldan@yahoo.com.

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-02-09, 10:46:11 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 61343256

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** febrero de 2023

PAGADO 09/02/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN		
Documento	CC15326333	**Dirección**	CR 87D #45 - 40
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	5074806
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15326333	LEONARDO FAVIO CORREA ROLDAN	03	00																	0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.200.000	$ 400.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0	$ 0	$ 512.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 912.000	$ 0	$ 912.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-03-10, 02:26:09 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 61785891

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 09/03/2023 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ICCONO		
Documento	NI900541997	**Dirección**	CR 87D #45 - 40 INT 401
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5074806
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CORREA ROLDAN LEONARDO FAVIO	**Identificación**	CC 15326333
Total Afiliados	33	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000757340	JUAN PABLO OCAMPO OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1001989307	DEIMER FELIPE AREIZA GARCIA	01	00	X																0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 812.000	$ 130.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 1002147650	OMAR ALEXIS CORREA ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1002206480	VICTOR MANUEL ARANGO HOLGUIN	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 928.000	$ 148.500	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 928.000	$ 37.200	6,960	$ 928.000	$ 64.600	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500
CC 1007835497	NEIDER ANTONIO TAPIAS CHAVARRIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1023625155	CRISTIAN CAMILO ARANGO MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023702295	NEIDER DARIO CARDONA QUIROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023702362	MANUELA QUIROZ GOMEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF04) COMFAMA	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 1023702525	JULIAN ABAD SERNA HIDALGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023724127	ALEJANDRO ZAPATA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1038099826	FRDYS DAVID MARTINEZ CLETO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1042773175	DAVID ALEJANDRO MEZA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1042773537	YEISON ALEXANDER VASQUEZ ZAMARRA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1193124502	SANTIAGO MEZA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15271574	PEDRO JOSUE JIMENEZ LOAIZA	01	00	X	X															0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 541.334	$ 86.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 541.334	$ 21.700	6,960	$ 541.334	$ 37.700	(CCF04) COMFAMA	$ 541.334	$ 21.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.800
CC 15320650	JUAN DE DIOS ZABALA PALACIO	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 657.334	$ 105.200	(EPS010) EPS SURA	$ 657.334	$ 26.300	6,960	$ 657.334	$ 45.800	(CCF04) COMFAMA	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 15325023	JUAN FERNANDO ZAPATA CANO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 657.334	$ 105.200	(EPS010) EPS SURA	$ 657.334	$ 26.300	6,960	$ 657.334	$ 45.800	(CCF04) COMFAMA	$ 657.334	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.600
CC 15325035	CARLOS ALBERTO RIVERA LOAIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15327323	JHON ALVEY OSORIO VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 09/03/2023 **Empresa NI900541997 ICCONO** **Planilla Nro: 61785891** **Periodo Cotización: febrero de 2023** **Periodo Servicio: marzo de 2023**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3482513	HUMBERTO DE JESUS RIVERA ZAPATA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF04) COMFAMA	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 3664304	FABRIANI ESTEBAN MARTINEZ ARANGO	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 193.334	$ 31.000	(EPS010) EPS SURA	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100
CC 71330961	WILDER ANTONIO USUGA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71410251	MIGUEL JOSE ARANGO ZAPATA	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 618.667	$ 99.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF04) COMFAMA	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 71411717	OMAR EDUARDO PATIÑO YEPES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71411802	CARLOS ALFONSO MAZO GONZALEZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 618.667	$ 99.000	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 618.667	$ 24.800	6,960	$ 618.667	$ 43.100	(CCF04) COMFAMA	$ 618.667	$ 24.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.700
CC 78077608	ALEXIS DE JESUS LOPEZ CONEO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8005400	RODRIGO ALCIDES LOPEZ GALLEGO	01	00	X																0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 928.000	$ 148.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 928.000	$ 37.200	6,960	$ 928.000	$ 64.600	(CCF04) COMFAMA	$ 928.000	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500
CC 8128907	MARIANO HUMBERTO ATEHORTUA MACIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 94477928	JHOND JAIRO SANCHEZ GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 9777877	ALVARO BURITICA SEPULVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 98460397	EDGAR DE JESUS VELASQUEZ MACHADO	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 889.334	$ 142.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 889.334	$ 35.600	6,960	$ 889.334	$ 61.900	(CCF04) COMFAMA	$ 889.334	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.400
CC 98677726	EDGAR GIRALDO MARTINES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 98764787	WILMAR COSSIO VELASQUEZ	01	00		X															0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 193.334	$ 31.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 193.334	$ 7.800	6,960	$ 193.334	$ 13.500	(CCF04) COMFAMA	$ 193.334	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.798.673	$ 30.798.673	$ 30.798.673	$ 30.798.673	$ 4.928.300	$ 1.232.700	$ 2.145.200	$ 1.232.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.538.900	$ 0	$ 9.538.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1042766322 sucursal 2, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-02	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	185.600	0	185.600
Período salud:	2023-02	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	145.000	0	145.000
Planilla Nro.:	25821026 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	6.100	0	6.100
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2023-03-07	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1957807454	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 336.700

PAGADO
