ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: ALCALDIA LOCAL DE BOSA

FECHA: 15 de marzo de 2023 **LUGAR:** ALCALDIA LOCAL DE BOSA

OBJETO DE LA REUNIÓN: INCLUSIÓN DE 4 CIV (8007607, 8007667, 8007715, 30000616) AL CONTRATO DE OBRA 336 DE 2022

HORA DE INICIO: **HORA DE FINALIZACIÓN:**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
LIZETH JAHIRA GONZALEZ VARGAS		X					X			Alcaldesa Local de Bosa	alcalde.bosa@gobiernobogota.gov.co	7750462	
DIEGO ALEXANDE BARRETO G			X						X	Apoyo a la supervisión	alexander.barreto@gobiernobogota.gov.co	3124667430	
JUAN EDIDSON VARGAS MESA			X						X	Apoyo a la supervisión	edidson.vargas@gobiernobogota.gov.co	3012988897	
MAGALY MALAVER		X							X	Director Interventoría (AYMCO SAS)	residentebosa@aimingenieros.com.co	3006082050	
DAYSSE PAOLA ALARCON F			X						X	Residente Interventoría (AYMCO SAS)	residentebosa@aimingenieros.com.co	3004183126	
LUIS FELIPE CASTRO		X							X	Representante Legal (CONSTRUCTORA CAMACON)	bosa336.2022@gmail.com	3212062337	
CARLOS BERNAL		X							X	Director obra (CONSTRUCTORA CAMACON)	bosa336.2022@gmail.com	3212062337	
JORGE ORLANDO VARGAS			X						X	Residente obra (CONSTRUCTORA CAMACON)	bosa336.2022@gmail.com	3212062337	
MARIA MARLENY FLOREZ ARENAS		X							X	Representante Legal Interventoría (AYMCO SAS)	residentebosa@aimingenieros.com.co	57(4) 4400040	

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en reunión con el contratista de obra CONSTRUCTORA CAMACON e Interventoría AYM CONSULTORIA SAS, se permiten referirse a la inclusión de los siguientes CIV´s: 8007607, 8007667, 8007715, 30000616, las cuales se encuentran a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Bosa, mediante gestiones adelantadas ante el Instituto de Desarrollo Urbano, identificado de la siguiente manera:

Contrato de Obra Pública No. 336-2022

Los segmentos viales relacionados en los cuadro a continuación, se encuentran actualmente en estado de Reserva al Fondo de Desarrollo Local de Bosa, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 336-2022 cuyo objeto contractual: *"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO".*

Calle 57ª BIS A Sur entre Carrera 81G y Carrera 81 F BIS

CIV	VIA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL
8007607	Calle 57ª Bis Sur	Carrera 81 G	Carrera 81 F BIS	V-9E

La inclusión del CIV 8007607, resulta de la necesidad de dar continuidad a las actividades de obra ejecutadas sobre los segmentos viales 8017987 y 8007803, del sector del Gran Britalia, asignados previamente para el Contrato de Obra Pública No. 336-2022; al no incluir este segmento vial, las obras ejecutadas con el contrato 336-2022, sobre la calle 57 a bis sur, quedarían expuestas por la no continuidad de la carpeta de rodadura, debido al cambio en la transición del pavimento hidráulico a material granular tipo recebo, adicionalmente el manejo de aguas de escorrentía quedaria descargando al segmento vial no intervenido, generando un problema social en el sector.

Calle 57ª BIS A Sur entre Carrera 81 F BIS y Carrera 81D

CIV	VIA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL
8007667	Calle 57ª Bis Sur	Carrera 81 F BIS	Carrera 81D	V-9E

La inclusión del CIV 8007667, resulta de la necesidad de dar continuidad a las actividades de obra ejecutadas sobre los segmentos viales 8007666, 8007714, 8017987, y 8007803, asignados previamente para el Contrato de Obra Pública No. 336-2022, al no incluir este segmento vial, las obras ejecutadas con el contrato 336-2022, sobre la calle 57ª bis sur, quedarían expuestas por la no continuidad de la carpeta de rodadura, debido al cambio en la transición del pavimento hidráulico a material granular tipo recebo, adicionalmente el manejo de aguas de escorrentía quedaría descargando al segmento vial no intervenido, generando un problema social en el sector.

Calle 57ª BIS Sur entre Carrera 81G y Carrera 81 D

CIV	VIA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL
8007715	Calle 57ª Bis Sur	Carrera 81 G	Carrera 81 D	V-9E

La inclusión del CIV 8007715, resulta de la necesidad de dar continuidad a las actividades de obra ejecutadas sobre los segmentos viales 8007764, 80014 y 8007854, segmentos para el Contrato de Obra Pública No. 336-2022, al no incluir este segmento vial, las obras ejecutadas con el contrato 336-2022, sobre la calle 57ª sur, quedarían expuestas por la no continuidad de la carpeta de rodadura, debido al cambio en la transición del pavimento hidráulico a material granular tipo recebo, adicionalmente el manejo de aguas de escorrentía quedaría descargando al segmento vial no intervenido, generando un problema social en el sector.

Calle 71 BIS Sur entre Carrera 87C y Transversal 87J

CIV	VIA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL
30000616	Calle 71 bis Sur	Carrera 87c	Transversal 87J	V-9

La inclusión del CIV 30000616, se dio debido a solicitud del FDLB, para dar continuidad a las vías que ya se encuentra pavimentadas como son la carrera 87C y transversal 87J, mejorando las condiciones de transitabilidad del sector de Remanso I, así mismo minimizar los riesgos de inseguridad en el sector.

Se aclara que estos CIV´s se está incluyendo en la presente fecha 15 de marzo de 2023 toda vez que, los cuatro (4) CIV´s no fueron contemplados dentro de los 58 CIV´s priorizados contractualmente, por las razones expuestas anteriormente, resulta la necesidad de esta inclusión, por la cual se solicita tener en cuenta los tiempos para la ejecución de los segmentos viales el cual no fue contemplado inicialmente dentro del plazo contractual del contrato.

Adicional a lo anterior de acuerdo al balance presentado y radicado No. 2023-571-000681-2 en el FDLB de fecha 19 de enero de 2023, el contrato cuenta con los recursos financieros para la ejecución de los cuatro (4) CIV´s, utilizando los destinados para acciones de movilidad, los cuales ascienden a $ 1.036.207.181, los cuales se utilizarían para la ejecución de estos cuatro nuevos CIV´s.

Lo anterior de acuerdo con el anexo técnico en cual cita en el ítem Actividades Especiales "…"

"Adicionalmente a las actividades mencionadas, referente a la construcción de los 49 CIV´s de malla vial y espacio público, a través de este contrato podrán adelantarse actividades especiales sobre cualquiera de los segmentos que hagan parte de la malla vial de la localidad dentro de la zona objeto del contrato, sin importar si se encuentra priorizado inicialmente o no. Así como la atención de emergencias y/o reparaciones puntuales y/o acciones de movilidad de acuerdo a las necesidades que se presenten. Para estas actividades podrá o no hasta el 10% del costo del contrato, en caso de que no se utilicen parte o la totalidad de estos recursos para este ítem, los mismos deberán utilizarse en actividades de construcción que complementen o amplíen las metas físicas que hagan parte del objeto principal del contrato, sin embargo, estará sujeto a las condiciones y disposiciones del contrato y el Fondo de Desarrollo Local, sin que esto altere la meta física y el alcance del proyecto". Por lo anterior no se incurrirá en costos adicionales para el contrato de obra 336-2022 e interventoría 342-2022.

Con la inclusión de estos segmentos viales, el alcance contractual sera la ejecución de sesenta y dos (62), de acuerdo a los siguientes hechos:

Inicialmente se priorizaron cuarenta y nueve (49) segmentos viales, posteriormente se realizó la inclusión de tres (3) CIV's el 06 de diciembre de 2022 por medio de una Acta de inclusión de los sectores de Gualoche, Islandia y el Remanso para los CIV 7007150, 7004389 y 50008413 respectivamente, puesto que, se contaba con los recursos necesarios, viabilidad técnica, continuidad e interés de la comunidad. Posteriormente, se incluyeron seis (6) CIV del Remanso: 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782 y 7003809 el 23 de diciembre de 2022, a través del Acta Modificatoria No. 1 la cual solo tuvo en cuenta una adición presupuestal. Ahora, por último, se realizará la inclusión de cuatro (4) segmentos viales 8007607, 8007667, 8007715 y 30000616, los cuales cuentan con las condiciones óptimas mencionadas anteriormente para formar parte del contrato.

Dentro de lo tratado entre las partes, se identificó que los cuatro (4) CIV´s, cuentan con Estudios y Diseños para su ejecución, insumos aportados por el contrato de Consultoría No. 254 DE 2018 Consorcio Bosa 2018, y que, en virtud de lo anterior, estos ya fueron entregados a la Interventoría y contratista para que se realicen las revisiones pertinentes dentro de la intervención de la malla vial.

Los CIV´s señalado con anterioridad, se encuentran actualmente en Reserva al Fondo de Desarrollo Local de Bosa priorizados mediante el proceso de Licitación **FDLBOSALIC 003-2022 (71742)** cuyo objeto contractual: *"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO""*.

Es claro para las partes involucradas en la presente acta, que toda la planeación y logística para la construcción de los segmentos viales incluidos en la presente acta, será responsabilidad del contratista y la respectiva supervisión por parte de la interventoría, sin que esto lo exima del cumplimiento de los tiempos de ejecución contractuales o se vea involucrada la calidad de las obras ejecutadas.

Para la interventoría es claro que la supervisión de las obras obedece a condiciones de inclusión de segmentos viales, por lo cual no será objeto de costos adicionales por el mayor alcance, objeto de la inclusión.

Mediante la presente, se acuerda entre el Fondo de Desarrollo Local de Bosa, Contratista e Interventoría la inclusión de la reserva de los CIV´s: 8007607, 8007667, 8007715, 30000616.

La presente acta se diligencia a los quince (15) días del mes de marzo de 2023, firmada por parte del contratista, interventoria y entidad FDLB.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

1	Presentar reprogramación de obra, incluidos los costos de los 4 CIV´s nuevos.	Contratista	Adjunta al acta


Elaborada por: Daysse Paola Alarcón Figueroa.

Fecha de la próxima reunión: N/A Lugar de la próxima reunión: N/A

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CONTRATO NO. 336-FDLB-2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
1		**CONTRATO FDLB-336-2022**	**433,5 días**	**mié 17/08/22**	**jue 14/12/23**		**$ 806.938.942,00**
2		**APROPIACION Y REVISION DE DISEÑOS**	**28,38 días**	**mié 17/08/22**	**vie 16/09/22**		**$ 0,00**
3		**8007667**	**167,88 días**	**jue 20/04/23**	**mié 25/10/23**		**$ 131.018.838,00**
4		Inspección y lavado de redes de alcantarillado	2 días	jue 20/04/23	vie 21/04/23		$ 2.739.208,00
5		Replanteo general	3 días	jue 20/04/23	lun 24/04/23	4CC,2	$ 231.599,00
6		Demolición de andenes, pavimentos y demás elementos	4 días	lun 24/04/23	jue 27/04/23	5	$ 400.145,00
7		Excavación mecánica de la vía	6 días	jue 27/04/23	jue 04/05/23	6	$ 512.475,00
8		Excavación manual para andenes, cajas de inspección y redes hidráulicas	10 días	jue 27/04/23	mar 09/05/23	6	$ 2.959.995,00
10		Excavación para redes de acueducto	1 día	jue 27/04/23	vie 28/04/23	6	$ 0,00
11		Excavación para redes de alcantarillado sanitario	15 días	jue 27/04/23	lun 15/05/23	6	$ 209.946,00
9		Transporte y disposición final de material producto de demoliciones y	10 días	mar 09/05/23	vie 19/05/23	7,8,10FF,1	$ 10.542.314,00
22		Instalación de geotextil para andenes y ví	3 días	lun 12/06/23	jue 15/06/23	7,21	$ 5.176.066,00
12		Instalación de accesorios de redes de acueducto	5 días	jue 27/04/23	mié 03/05/23	10CC	$ 389.494,00
13		Reparación y/o conctrucción de acometidas de acueducto	7 días	jue 27/04/23	vie 05/05/23	10CC	$ 2.631.839,00
14		Instalación de tubería de redes de alcantarillado sanitario	10 días	jue 27/04/23	mar 09/05/23	11CC	$ 10.733.956,00
17		Instalación de accesorios de redes de alcantarillado sanitario	5 días	jue 27/04/23	mié 03/05/23	11CC	$ 1.545.845,00
18		Construcción, reparación y/o renivelación de pozos de inspección	8 días	jue 27/04/23	sáb 06/05/23	11CC	$ 7.015.026,00
15		Construcción de cajas de inspección	12 días	jue 27/04/23	jue 11/05/23	14CC	$ 3.891.597,00
19		Instalación de rellenos para redes de alcantarillado sanitario	8 días	jue 11/05/23	vie 19/05/23	14CC,15	$ 6.161.408,00
16		Construcción de sumideros	9 días	jue 11/05/23	lun 22/05/23	15	$ 7.018.988,00
20		Mejoramiento de la subrasante	7 días	jue 01/06/23	jue 08/06/23	19	$ 5.932.075,00
21		Nivelación y compactación de la subrasar	3 días	jue 08/06/23	lun 12/06/23	20	$ 121.405,00
23		Instalación de prefabricados para la vía	6 días	jue 15/06/23	jue 22/06/23	22	$ 5.721.041,00
24		Instalación de rellenos granulares para la vía - Subbase granular Clase B	16 días	jue 22/06/23	lun 10/07/23	23	$ 2.120.900,00

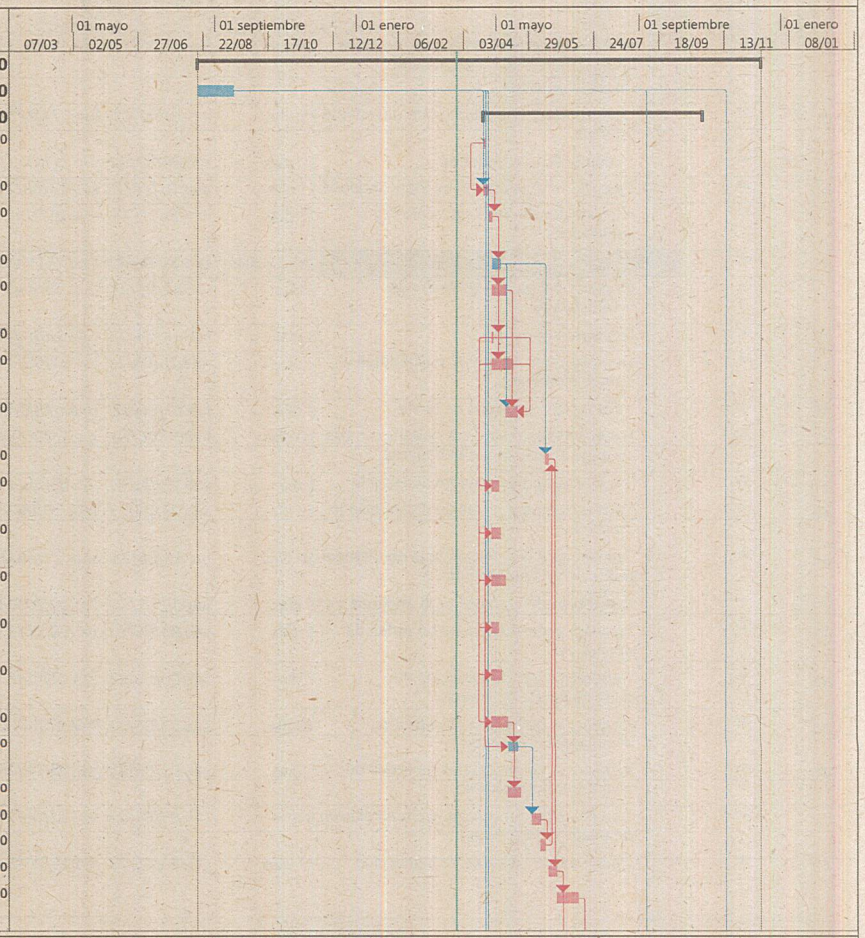


Reprogramación No. 1 del Con
De acuerdo con el Acta modific

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CONTRATO NO. 336-FDLB-2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
25		Instalación de rellenos granulares para los andenes - Subbase granular reciclada Clase B	15 días	jue 22/06/23	sáb 08/07/23	23	$ 8.304.524,00
26		Construcción de estructura de pavimento para vía	25 días	lun 10/07/23	lun 07/08/23	24	$ 20.633.913,00
27		Construcción de andenes	20 días	sáb 08/07/23	lun 31/07/23	25	$ 20.190.269,00
28		Ejecución de acabados de vía y andenes	11 días	mar 01/08/23	sáb 12/08/23	27	$ 2.126.136,00
29		Implementación de demarcación y señalización	15 días	lun 09/10/23	mié 25/10/23	28	$ 3.708.674,00
30		**8007607**	**165,63 días**	**sáb 22/04/23**	**mié 25/10/23**		**$ 123.571.678,00**
31		Inspección y lavado de redes de alcantarillado	2 días	sáb 22/04/23	mar 25/04/23		$ 2.564.561,00
32		Replanteo general	3 días	sáb 22/04/23	mié 26/04/23	31CC,2	$ 204.985,00
33		Demolición de andenes, pavimentos y demás elementos	4 días	mié 26/04/23	lun 01/05/23	32	$ 457.766,00
34		Excavación mecánica de la vía	6 días	jue 01/06/23	mié 07/06/23	33	$ 479.806,00
35		Excavación manual para andenes, cajas de inspección y redes hidráulicas	10 días	lun 05/06/23	jue 15/06/23	33	$ 2.944.281,00
37		Excavación para redes de acueducto	1 día	sáb 03/06/23	lun 05/06/23	33	$ 0,00
38		Excavación para redes de alcantarillado sanitario	15 días	sáb 03/06/23	mar 20/06/23	33	$ 196.570,00
36		Transporte y disposición final de material producto de demoliciones y	10 días	jue 15/06/23	mar 27/06/23	34,35,37F	$ 10.087.539,00
49		Instalación de geotextil para andenes y ví	3 días	jue 06/07/23	lun 10/07/23	34,48	$ 4.850.181,00
39		Instalación de accesorios de redes de acueducto	5 días	sáb 03/06/23	jue 08/06/23	37CC	$ 445.136,00
40		Reparación y/o conctrucción de acometidas de acueducto	7 días	sáb 03/06/23	lun 12/06/23	37CC	$ 3.007.816,00
41		Instalación de tubería de redes de alcantarillado sanitario	10 días	sáb 03/06/23	mié 14/06/23	38CC	$ 10.366.786,00
44		Instalación de accesorios de redes de alcantarillado sanitario	5 días	sáb 03/06/23	jue 08/06/23	38CC	$ 1.766.680,00
45		Construcción, reparación y/o renivelación de pozos de inspección	8 días	sáb 03/06/23	lun 12/06/23	38CC	$ 3.586.863,00
42		Construcción de cajas de inspección	12 días	sáb 03/06/23	vie 16/06/23	41CC	$ 4.447.539,00

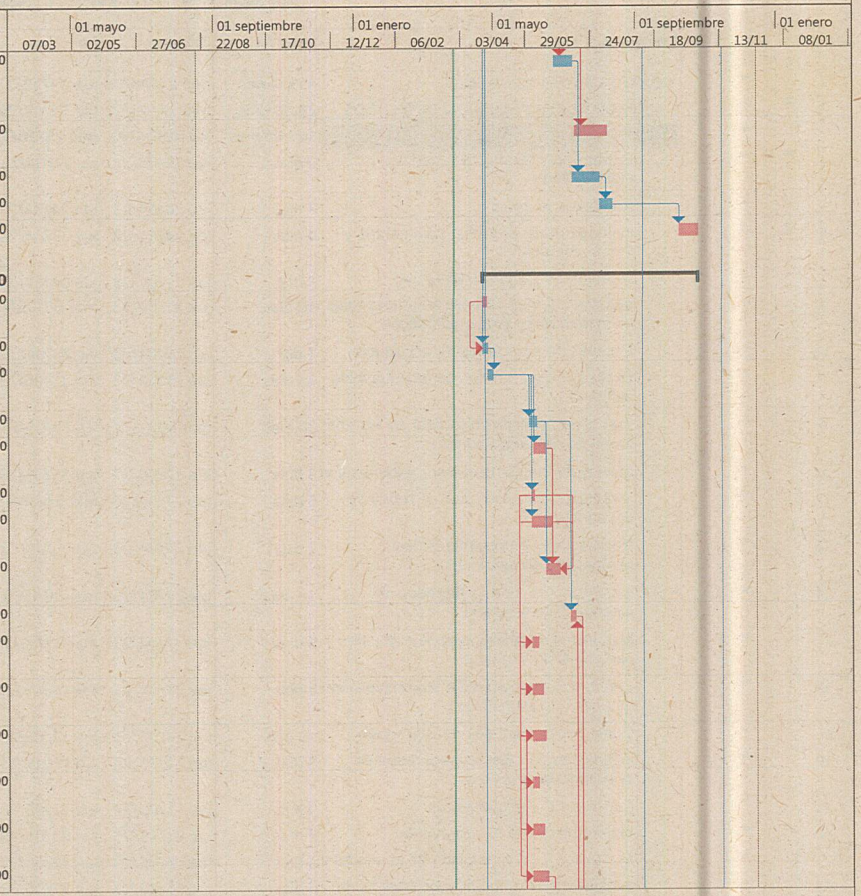


Reprogramación No. 1 del Con
De acuerdo con el Acta modific

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CONTRATO NO. 336-FDLB-2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
46		Instalación de rellenos para redes de alcantarillado sanitario	8 días	vie 16/06/23	lun 26/06/23	41CC,42	$ 6.299.130,00
43		Construcción de sumideros	9 días	vie 16/06/23	mar 27/06/23	42	$ 7.018.988,00
47		Mejoramiento de la subrasante	7 días	lun 26/06/23	mar 04/07/23	46	$ 5.528.002,00
48		Nivelación y compactación de la subrasar	3 días	mar 04/07/23	jue 06/07/23	47	$ 113.665,00
50		Instalación de prefabricados para la vía	6 días	mar 11/07/23	lun 17/07/23	49	$ 5.568.797,00
51		Instalación de rellenos granulares para la vía - Subbase granular Clase B	16 días	lun 17/07/23	jue 03/08/23	50	$ 1.945.306,00
52		Instalación de rellenos granulares para los andenes - Subbase granular reciclada Clase B	15 días	lun 17/07/23	mié 02/08/23	50	$ 7.719.698,00
53		Construcción de estructura de pavimento para vía	18 días	jue 03/08/23	jue 24/08/23	51	$ 19.462.111,00
54		Construcción de andenes	20 días	jue 03/08/23	vie 25/08/23	52	$ 18.847.493,00
55		Ejecución de acabados de vía y andenes	11 días	vie 25/08/23	mié 06/09/23	54	$ 1.948.958,00
56		Implementación de demarcación y señalización	15 días	lun 09/10/23	mié 25/10/23	55	$ 3.713.021,00
57		**8007715**	**165 días**	**lun 24/04/23**	**mié 25/10/23**		**$ 237.323.386,00**
58		Inspección y lavado de redes de alcantarillado	2 días	lun 24/04/23	mar 25/04/23		$ 5.322.153,00
59		Replanteo general	3 días	lun 24/04/23	mié 26/04/23	58CC,2	$ 451.919,00
60		Demolición de andenes, pavimentos y demás elementos	4 días	mié 26/04/23	lun 01/05/23	59	$ 969.951,00
61		Excavación mecánica de la vía	6 días	jue 01/06/23	mié 07/06/23	60	$ 995.733,00
62		Excavación manual para andenes, cajas de inspección y redes hidráulicas	10 días	lun 05/06/23	jue 15/06/23	60	$ 6.157.766,00
64		Excavación para redes de acueducto	1 día	sáb 03/06/23	lun 05/06/23	60	$ 0,00
65		Excavación para redes de alcantarillado sanitario	15 días	sáb 03/06/23	mar 20/06/23	60	$ 407.934,00
63		Transporte y disposición final de material producto de demoliciones y	10 días	jue 15/06/23	mar 27/06/23	61,62,64F	$ 20.993.161,00
76		Instalación de geotextil para andenes y ví	3 días	jue 06/07/23	lun 10/07/23	61,75	$ 9.995.733,00
66		Instalación de accesorios de redes de acueducto	5 días	sáb 03/06/23	jue 08/06/23	64CC	$ 945.914,00
67		Reparación y/o conctrucción de acometidas de acueducto	7 días	sáb 03/06/23	lun 12/06/23	64CC	$ 6.391.609,00

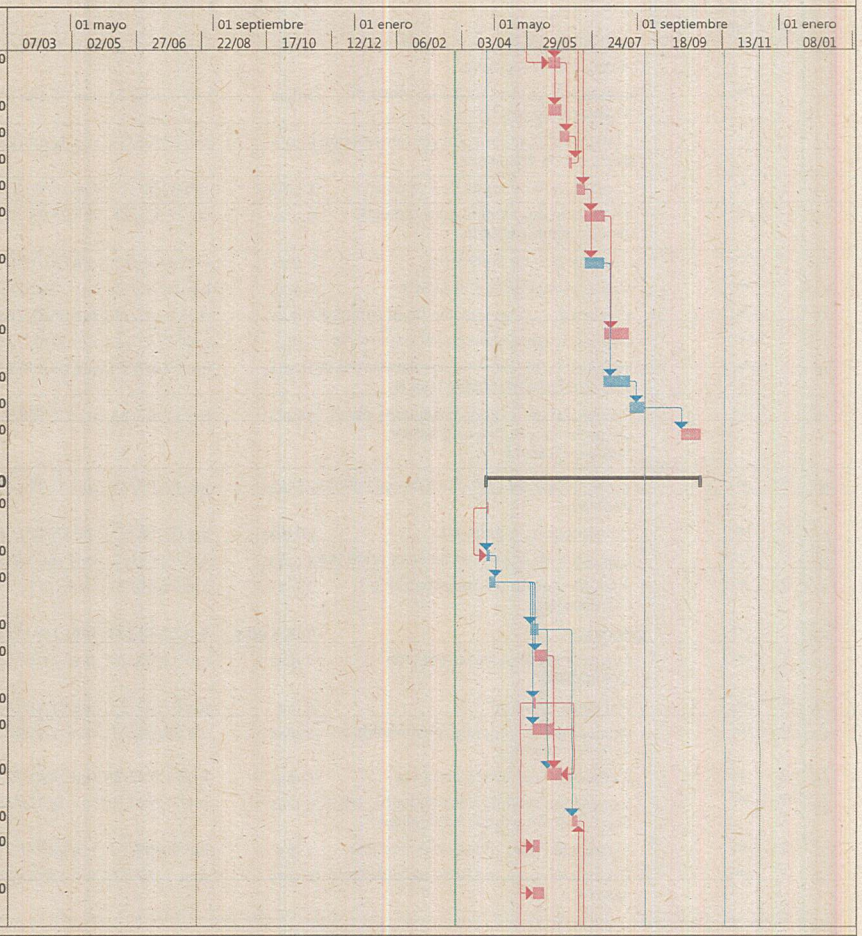


Reprogramación No. 1 del Con
De acuerdo con el Acta modific

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

CONTRATO NO. 336-FDLB-2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
68		Instalación de tubería de redes de alcantarillado sanitario	10 días	sáb 03/06/23	mié 14/06/23	65CC	$ 21.601.126,00
71		Instalación de accesorios de redes de alcantarillado sanitario	5 días	sáb 03/06/23	jue 08/06/23	65CC	$ 3.754.195,00
72		Construcción, reparación y/o renivelación de pozos de inspección	8 días	sáb 03/06/23	lun 12/06/23	65CC	$ 3.586.863,00
69		Construcción de cajas de inspección	12 días	sáb 03/06/23	vie 16/06/23	68CC	$ 9.451.021,00
73		Instalación de rellenos para redes de alcantarillado sanitario	8 días	vie 16/06/23	lun 26/06/23	68CC,69	$ 13.217.438,00
70		Construcción de sumideros	9 días	vie 16/06/23	mar 27/06/23	69	$ 7.018.988,00
74		Mejoramiento de la subrasante	7 días	lun 26/06/23	mar 04/07/23	73	$ 11.908.102,00
75		Nivelación y compactación de la subrasar	3 días	mar 04/07/23	jue 06/07/23	74	$ 235.885,00
77		Instalación de prefabricados para la vía	6 días	mar 11/07/23	lun 17/07/23	76	$ 10.545.557,00
78		Instalación de rellenos granulares para la vía - Subbase granular Clase B	16 días	lun 17/07/23	jue 03/08/23	77	$ 4.398.458,00
79		Instalación de rellenos granulares para los andenes - Subbase granular reciclada Clase B	15 días	lun 17/07/23	mié 02/08/23	77	$ 16.117.428,00
80		Construcción de estructura de pavimento para vía	25 días	jue 03/08/23	jue 31/08/23	78	$ 38.390.949,00
81		Construcción de andenes	20 días	jue 03/08/23	vie 25/08/23	79	$ 38.626.332,00
82		Ejecución de acabados de vía y andenes	11 días	vie 25/08/23	mié 06/09/23	81	$ 2.126.136,00
83		Implementación de demarcación y señalización	15 días	lun 09/10/23	mié 25/10/23	82	$ 3.713.035,00
84		**30000616**	**158,5 días**	**lun 22/05/23**	**mar 14/11/23**		**$ 315.025.040,00**
85		Inspección y lavado de redes de alcantarillado	2 días	lun 22/05/23	mar 23/05/23		$ 8.226.816,00
86		Replanteo general	1 día	jue 07/09/23	jue 07/09/23	85CC,2	$ 432.410,00
87		Demolición de andenes, pavimentos y demás elementos	3 días	vie 08/09/23	mar 12/09/23	86	$ 1.315.677,00
88		Excavación mecánica de la via	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	87	$ 1.539.212,00
89		Excavación manual para andenes, cajas de inspección y redes hidráulicas	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	87	$ 7.213.837,00
91		Excavación para redes de acueducto	1 día	lun 18/09/23	lun 18/09/23	87	$ 0,00
92		Excavación para redes de alcantarillado sanitario	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	87	$ 630.577,00

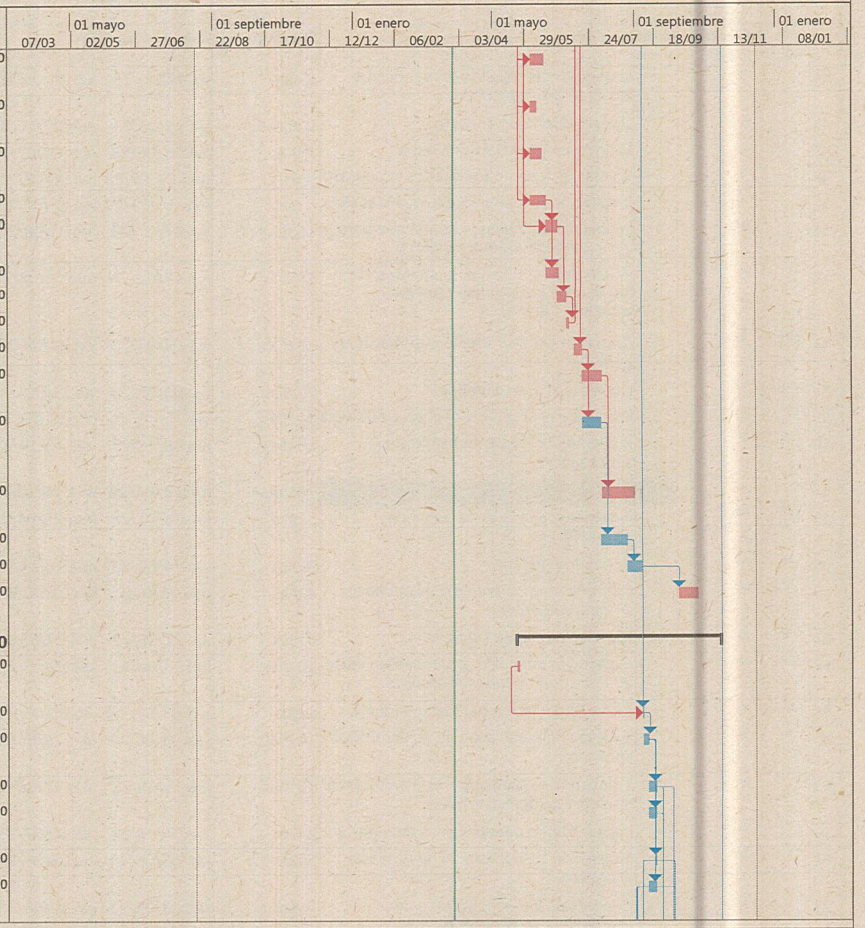


Reprogramación No. 1 del Con
De acuerdo con el Acta modific

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

CONTRATO NO. 336-FDLB-2022

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesor	Costo
90		Transporte y disposición final de material producto de demoliciones y	5 días	mar 19/09/23	sáb 23/09/23	88,89,91F	$ 29.274.423,00
103		Instalación de geotextil para andenes y ví	3 días	mié 04/10/23	vie 06/10/23	88,102	$ 13.259.768,00
93		Instalación de accesorios de redes de acueducto	5 días	lun 18/09/23	vie 22/09/23	91CC	$ 1.279.766,00
94		Reparación y/o conctrucción de acometidas de acueducto	6 días	lun 18/09/23	sáb 23/09/23	91CC	$ 8.647.471,00
95		Instalación de tubería de redes de alcantarillado sanitario	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	92CC	$ 32.671.384,00
98		Instalación de accesorios de redes de alcantarillado sanitario	5 días	mié 13/09/23	lun 18/09/23	92CC	$ 5.079.205,00
99		Construcción, reparación y/o renivelación de pozos de inspección	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	92CC	$ 7.173.725,00
96		Construcción de cajas de inspección	6 días	mar 12/09/23	lun 18/09/23	95CC	$ 12.786.675,00
100		Instalación de rellenos para redes de alcantarillado sanitario	6 días	mar 19/09/23	lun 25/09/23	95CC,96	$ 19.231.607,00
97		Construcción de sumideros	6 días	mar 19/09/23	lun 25/09/23	96	$ 7.018.988,00
101		Mejoramiento de la subrasante	3 días	mar 26/09/23	jue 28/09/23	100	$ 18.221.566,00
102		Nivelación y compactación de la subrasar	3 días	vie 29/09/23	mar 03/10/23	101	$ 364.623,00
104		Instalación de prefabricados para la vía	4 días	vie 06/10/23	mié 11/10/23	103	$ 15.364.071,00
105		Instalación de rellenos granulares para la vía - Subbase granular Clase B	4 días	mié 11/10/23	lun 16/10/23	104	$ 6.839.559,00
106		Instalación de rellenos granulares para los andenes - Subbase granular reciclada Clase B	4 días	mié 11/10/23	lun 16/10/23	104	$ 17.173.769,00
107		Construcción de estructura de pavimento para vía	14 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	105	$ 58.140.514,00
108		Construcción de andenes	14 días	lun 16/10/23	mar 31/10/23	106	$ 37.654.248,00
109		Ejecución de acabados de vía y andenes	5 días	mié 01/11/23	lun 06/11/23	108	$ 2.126.136,00
110		Implementación de demarcación y señalización	7 días	mar 07/11/23	mar 14/11/23	109	$ 3.359.013,00
111		**ENTREGA Y AJUSTES DEL CONTRATO**	27,25 días	mié 15/11/23	jue 14/12/23	2	$ 0,00

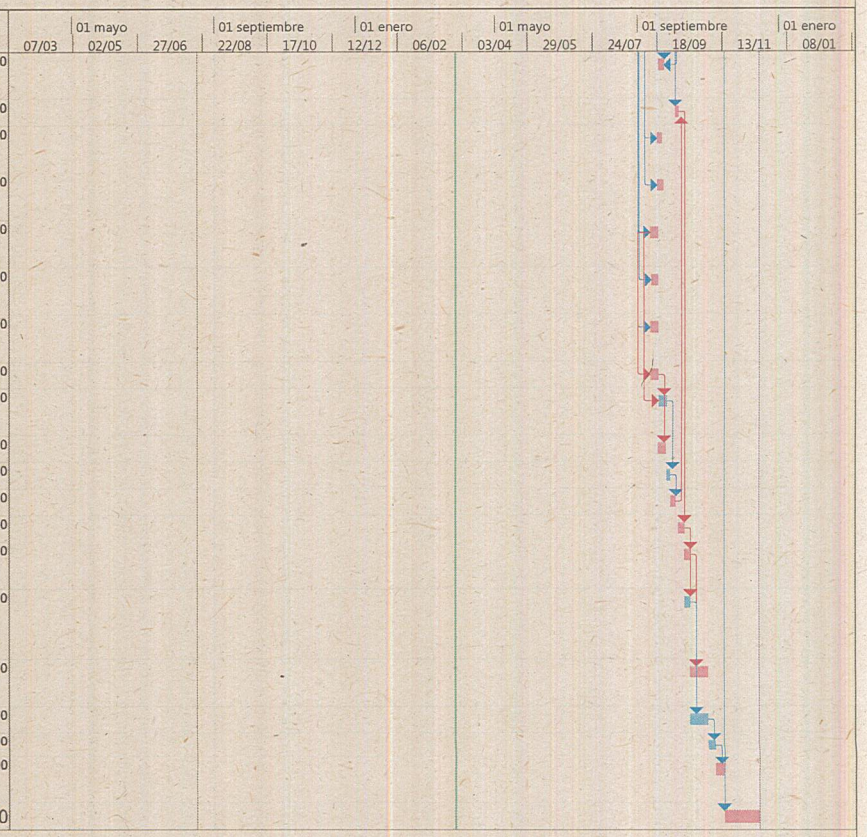

Reprogramación No. 1 del Con
De acuerdo con el Acta modific

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
