Bogotá D.C., 11 de mayo de 2023

FDLK-CABA-065-2023

Señores:
ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
YEIMY CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local de Kennedy
Calle 19 Sur No. 69A – 17
Att. Arq. Luis Felipe Peña Vargas
Apoyo a la Supervisión
E-mail: cdi.kennedy@gobiernobogota.gov.co
Bogotá D.C

Ref.**: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIN-819-2022 CUYO OBJETO ES "LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FDLK-LP-017-2022 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY".**

Asunto: Remisión Informe Semanal de Interventoría No. 12

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones del contrato de la referencia, estamos remitiendo el informe semanal No. 12, el cual corresponde al siguiente periodo:

- Informe Semanal No. 12 correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 7 de mayo de 2023.

Lo anterior se anexa en (17) Folios.

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ARQUITECTA ANDREA DEL PILAR RUBIO
Directora de Interventoría
CABA INTERVENTORÍA S.A.S

Copia: Archivo

1. Datos Generales

No.	CÓDIGO IDRD	UPZ	UNIDAD OPERATIVA	LOCALIZACIÓN	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021	ESCALA DE PARQUES
1	08-006	79	RIVERAS DE OCCIDENTE	CL 37S 91 48	NO	VECINAL
2	08-012	113	URBANIZACIÓN ALOHA (ANTES MARSELLA)	CL 7ABIS 71A 20	SI	VECINAL
3	08-096	79	UNIR 1 - ETAPA I SECTORES I Y II	CL 34AS 89C 38	NO	VECINAL
4	08-123	80	PINAR DEL RIO	CL 39AS 83A 16	NO	BOLSILLO
5	08-149	45	SAN ANDRÉS	CR 68H 43B 48S	NO	VECINAL
6	08-153	48	BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA	CL 56AS 78N 48	SI	VECINAL
7	08-186	82	DESARROLLO DEL CAMPO HERMOSO	CR 87I 33 61S	NO	VECINAL
8	08-189	45	VALENCIA LA CHUCUA	CR 72G 39C 20S	SI	VECINAL
9	08-190	45	URBANIZACIÓN BOMBAY	CL 39BBISAS 72G 27	SI	VECINAL
10	08-253	81	URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA	CL 45BISS 80I 30	NO	VECINAL
11	08-273	44	LAS AMÉRICAS SECTOR AVENIDA GALÁN	CL 2A 71D 92	SI	VECINAL
12	08-347	47	CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8	CR 78F 39 18S	SI	BOLSILLO
13	08-382	47	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14	CR 79C 41B 52S	NO	VECINAL
14	08-427	44	LAS AMÉRICAS	CR 71G A 54	SI	VECINAL
15	08-620	46	SANTA CATALINA I Y II SECTOR	CR 81F 11B 10	SI	VECINAL
16	08-681	82	DESARROLLO TAYRONA	CL 3 86D 15	NO	BOLSILLO

2. Contrato de Obra

CONTRATO No. COP-827-2022

Objeto:	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
Contratista:	Consorcio Parques EDC 2023

FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE INICIO DIAGNOSTICO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN
15-feb-23	7 MESES	14-sep-23	15-feb-23	1,5 MESES	31-mar-23	01-abr-23	5,5 MESES	14-sep-23

	Presupuesto Oficial	ACTA 1 Diagnósticos	ACTA 3 1 abril - 14 may	ACTA 4 15 may - 14 jun	ACTA 5 15 jun - 14 jul	ACTA 6 15 jul - 14 Ago	ACTA 7 15 Ago - 14 Sep
Costo Total Obras con A.I.U (21,86%) (A)	$ 2.284.875.000						
Costo Componente Ambiental y SST (B)	$ 68.391.500,00						
Costo Componente Social (C)	$ 17.444.104,00						
Costo Plan de Manejo de Transito (D)	$ 14.727.405,00						
Bolsa del Proyecto 2179 (E)	$ 99.034.740,00						
Ajustes por Cambio de Vigencia (F)	$ 39.375.000,00						
Subtotal Obras (A+B+C+D+E+F)	**$ 2.523.847.749,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
Costo de Diagnostico (G)	$ 71.842.861,00	$ 71.842.861					
Valor Total (A+B+C+D+E+F+G)	**$ 2.595.690.610,00**	**$ 71.842.861,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
% Presupuestal	**100%**	**2,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO No. CIN-819-2022


Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. FDLK-LP-017-2022
Contratista:	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

FECHA INICIO	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN	FECHA DE INICIO DIAGNOSTICO	PLAZO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA INICIO DE OBRA	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN
15-feb-23	7 MESES	14-sep-23	15-feb-23	1,5 MESES	31-mar-23	01-abr-23	5,5 MESES	14-sep-23

	Presupuesto Oficial	ACTA 1 Diagnósticos	ACTA 2 1 - 14 abril	ACTA 3 15 abril - 14 may	ACTA 4 15 may - 14 jun	ACTA 5 15 jun - 14 jul	ACTA 6 15 jul - 14 Ago	ACTA 7 15 Ago - 14 Sep
Valor Básico	$ 269.587.000	$ 7.461.560						
IVA (19%)	$ 51.221.530	$ 1.417.696						
Valor Total	**$ 320.808.530**	**$ 8.879.256**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% Presupuestal	**100,00%**	**2,77%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

4. Programación.

A continuación se presenta la curva de avance general del proyecto (Curva S).

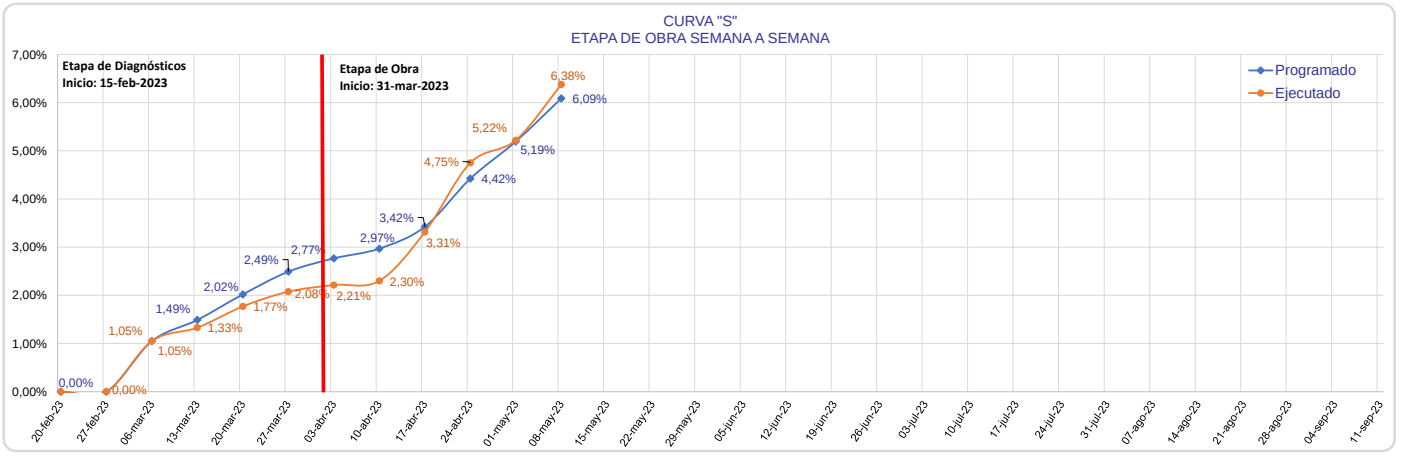

4.1 ETAPA DE DIAGNÓSTICOS

		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN Vs PROGRAMACIÓN			
DESCRIPCIÓN	VALOR	INICIO	TERMINACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
CONTRATO No. COP-827-2022	$ 2.595.690.610,00	mié 15/02/23	14-sep-23	6,09%	6,38%	0,29%	
ETAPA DE DIAGNÓSTICOS	$ 71.842.861,00	15-feb-23	30-mar-23	100,00%	100,00%	0,00%	
1. COMPONENTE TÉCNICO		mié 15/02/23	jue 30/03/23	100,00%	100,00%	0,00%	
2. COMPONENTE SOCIAL		mié 15/02/23	jue 30/03/23	100,00%	100,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN	VALOR	PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN Vs PROGRAMACIÓN			
		INICIO	TERMINACIÓN	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	OBSERVACIÓN
3. COMPONENTE AMBIENTAL		mié 15/02/23	jue 30/03/23	100,00%	100,00%	0,00%	
4. COMPONENTE SST		mié 15/02/23	mié 29/03/23	100,00%	100,00%	0,00%	
ETAPA DE OBRA	$ 2.319.698.457,44	31-mar-23	14-sep-23	3,72%	4,04%	0,32%	
1. SAN ANDRÉS	$ 46.605.848,06	lun 3/04/23	jue 22/06/23	37,07%	35,24%	-1,83%	
2. VALENCIA LA CHUCUA	$ 79.867.999,76	lun 3/04/23	mar 20/06/23	14,40%	12,49%	-1,91%	
3. URBANIZACIÓN BOMBAY	$ 150.553.761,16	lun 3/04/23	mié 21/06/23	28,33%	30,05%	1,72%	
4. LAS AMÉRICAS	$ 54.119.502,06	lun 3/04/23	jue 8/06/23	11,72%	14,03%	2,31%	
5. LAS AMÉRICAS SECTOR AVENIDA GALÁN	$ 221.417.133,61	mar 2/05/23	vie 4/08/23	0,31%	0,00%	-0,31%	
6. URBANIZACIÓN ALOHA (ANTES MARSELLA)	$ 62.117.603,67	mar 2/05/23	jue 3/08/23	2,79%	3,28%	0,49%	
7. CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14	$ 211.195.645,53	mar 2/05/23	mar 18/07/23	0,39%	1,01%	0,62%	
8. CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8	$ 218.570.957,28	mar 2/05/23	lun 24/07/23	2,36%	4,68%	2,32%	
9. BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA	$ 51.963.703,48	lun 5/06/23	mié 16/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
10. URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA	$ 123.933.355,24	lun 5/06/23	mié 9/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
11. PINAR DEL RIO	$ 203.039.874,79	lun 5/06/23	vie 8/09/23	0,00%	0,00%	0,00%	
12. RIVERAS DE OCCIDENTE	$ 307.382.458,40	lun 5/06/23	mié 16/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
13. SANTA CATALINA I Y II SECTOR	$ 218.246.549,54	mar 20/06/23	vie 15/09/23	0,00%	0,00%	0,00%	
14. UNIR 1 - ETAPA I SECTORES I Y II	$ 229.528.383,53	mar 4/07/23	vie 15/09/23	0,00%	0,00%	0,00%	
15. DESARROLLO DEL CAMPO HERMOSO	$ 120.715.207,61	mar 4/07/23	lun 11/09/23	0,00%	0,00%	0,00%	
16. DESARROLLO TAYRONA	$ 20.440.473,72	mar 4/07/23	lun 4/09/23	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL	$ 2.391.541.318,44						

OBSERVACIONES: ° Respecto a la etapa de obra, los porcentajes aquí reportados fueron verificados en obra y consolidados por las partes (contratista e interventoría).

5. Licencias:

Tipo de Licencia (PMT, Ambiental, ect):	PIN AMBIENTAL		PMT´S		PMT´S	
No.	22834	13-abr-23	COI No. 15	13-abr-23	COI No. 16	20-abr-23
Modificación No.	N/A		N/A		N/A	
Vigencia			14-abr-23	14-sep-23	21-abr-23	14-sep-23
Cumplimiento	Se inicia con la verificación		Se inicia con la verificación		Se inicia con la verificación	

OBSERVACIONES: El contratista presentó 4 PMT, los cuales fueron revisados por parte de la interventoría y se remitieron observaciones. Pendiente subsanación.

6. PAC 2022

CONTRATISTA

Diagnostico	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
$ 71.842.861	$ 14.942.084	$ 115.814.296	$ 325.086.060	$ 495.293.600	$ 842.453.216	$ 470.689.432
2,77%	0,58%	4,46%	12,52%	19,08%	32,46%	18,13%

LIQUIDACIÓN	TOTAL	SALDO
$ 259.569.061	**$ 2.595.690.610**	$ -
10,00%	**100,00%**	0,00%

INTERVENTORÍA

Diagnostico	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23
$ 8.879.256	$ 1.846.733	$ 14.313.807	$ 40.178.279	$ 61.214.696	$ 104.121.106	$ 58.173.799
2,77%	0,58%	4,46%	12,52%	19,08%	32,46%	18,13%

LIQUIDACIÓN	TOTAL	SALDO
$ 32.080.853	$ 320.808.530	$ -
10,00%	**100,00%**	0,00%

OBSERVACIONES: El PAC relacionado se realiza acorde con el flujo de caja presentado por parte del contratista, y respectando el 10% a la liquidación de ambos contratos.

SEGUIMIENTO AL COSTO - APU NO PREVISTOS

El contratista realizó la entrega de las actividades no previstas mediante correo electrónico el 15 de abril de 2023, se presentaron observaciones el 19 de abril, y se subsanaron las mismas por parte del contratista el 20 de abril, sin embargo y acorde al comité del 27 de abril de 2022, se debe justificar la inclusión del NP 01 Localización y Replanteo.

SEGUIMIENTO AL COSTO - PRESUPUESTO DE OBRA

De acuerdo con la reunión de inicio que se llevó a cabo en el Parque las Américas Av. Galán, el contratista presentó ajuste a la propuesta de intervención de dicho parque conforme a las directrices manifestadas por parte de la comunidad, pendiente divulgación y aprobación.

7. COMPONENTES:

COMPONENTE SST:

- Ver Informe SST

PERSONAL CLAVE

Gerente del proyecto	1
Director de Obra	1
Residente de Obra	1
Residente PMT	1
Geotecnista	1
Residente Ambiental	1
Residente SST	1
Residente Social	1
Topógrafo	1
Cadenero	1
Inspector de Obra	1
Auxiliar técnico	1
TOTAL	**12**

EQUIPO DE INTERVENTORÍA

Director de Interventoría	1
Residente de Interventoría	1
Profesional PMT	1
Ingeniero Ambiental	1
Profesional SST	1
Profesional Social	1
Topógrafo	1
Auxiliar Técnico	1
Inspector de Interventoría	1
Profesional de costos	1
Abogado	1
TOTAL	**11**

COMPONENTE TÉCNICO:

- Ver informe de gestión técnica

COMPONENTE CALIDAD:

- Se dio inicio en obra, de la verificación de los materiales de obra y procesos constructivos.

COMPONENTE AMBIENTAL:
- Se verificó los puntos de acopio

COMPONENTE SOCIAL:
- Ver informe de gestión social

COMPONENTE LEGAL:
- No se presentaron actividades para este componente durante esta semana

9. Observaciones:

Vo. Bo. Arq. Andrea Del Pilar Rubio Ramírez
Directora de interventoría
A25112003 - 52453159

Ing. Alfredo Callejas
Residente de Interventoría
25202-10793CND

COMPONENTE TÉCNICO

		PROGRAMACIÓN		EJECUCIÓN Vs PROGRAMACIÓN			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**INICIO**	**TERMINACIÓN**	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIÓN**
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	**$ 2.319.698.457,44**	**31-mar-23**	**14-sep-23**	**3,72%**	**4,04%**	**0,32%**	
1. SAN ANDRÉS	**$ 46.605.848,06**	**lun 3/04/23**	**jue 22/06/23**	**37,07%**	**35,24%**	**-1,83%**	
DEMOLICIONES	$ 2.714.688,60	mar 11/04/23	mié 21/06/23	100,00%	99,26%	-0,74%	
DESMONTES Y RETIROS	$ 84.510,00	mié 21/06/23	jue 22/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 9.291.581,45	vie 14/04/23	mié 21/06/23	69,58%	56,09%	-13,49%	
ESTRUCTURAS	$ 8.396.523,14	jue 25/05/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 1.515.078,50	mié 14/06/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CONFINAMIENTOS	$ 3.692.527,80	mié 10/05/23	jue 25/05/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 20.910.938,57	lun 3/04/23	jue 22/06/23	38,73%	40,75%	2,02%	
2. VALENCIA LA CHUCUA	**$ 79.867.999,76**	**lun 3/04/23**	**mar 20/06/23**	**14,40%**	**12,49%**	**-1,91%**	
DESMONTES Y RETIROS	$ 324.975,00	mar 11/04/23	mar 20/06/23	100,00%	18,74%	-81,26%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 823.048,70	sáb 15/04/23	mar 20/06/23	100,00%	90,74%	-9,26%	
PINTURA	$ 2.764.755,66	mar 16/05/23	mar 20/06/23	0,00%	16,72%	16,72%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 521.442,65	mié 10/05/23	mar 16/05/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CONFINAMIENTOS	$ 2.397.852,42	sáb 22/04/23	vie 5/05/23	100,00%	99,35%	-0,65%	
MOBILIARIO	$ 23.295.460,00	vie 5/05/23	mar 20/06/23	1,06%	0,00%	-1,06%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.057.251,00	sáb 10/06/23	mar 20/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 48.683.214,33	lun 3/04/23	mar 20/06/23	15,83%	9,40%	-6,43%	
3. URBANIZACIÓN BOMBAY	**$ 150.553.761,16**	**lun 3/04/23**	**mié 21/06/23**	**28,33%**	**30,05%**	**1,72%**	
DEMOLICIONES	$ 18.358.389,06	sáb 15/04/23	mié 21/06/23	100,00%	93,48%	-6,52%	
DESMONTES Y RETIROS	$ 221.814,00	mar 11/04/23	mié 21/06/23	100,00%	0,00%	-100,00%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 33.619.578,75	sáb 22/04/23	mié 21/06/23	54,03%	36,93%	-17,10%	
PINTURA	$ 4.697.787,42	vie 16/06/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y CICLORUTAS EN ASFALTO	$ 28.011.020,82	mié 24/05/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
MOBILIARIO	$ 13.808.245,50	lun 29/05/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.057.251,00	vie 16/06/23	mié 21/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 50.779.674,61	lun 3/04/23	mié 21/06/23	11,60%	30,86%	19,26%	
4. LAS AMÉRICAS	**$ 54.119.502,06**	**lun 3/04/23**	**jue 8/06/23**	**11,72%**	**14,03%**	**2,31%**	
DEMOLICIONES	$ 306.721,64	vie 14/04/23	jue 8/06/23	100,00%	87,20%	-12,80%	
DESMONTES Y RETIROS	$ 221.814,00	mar 11/04/23	jue 8/06/23	100,00%	0,00%	-100,00%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 3.887.839,35	mar 18/04/23	jue 8/06/23	55,01%	67,36%	12,35%	
ESTRUCTURAS	$ 3.337.575,78	mar 23/05/23	jue 8/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERÍA METÁLICA	$ 550.224,30	vie 26/05/23	jue 8/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 1.879.750,00	mié 31/05/23	mié 7/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CONFINAMIENTOS	$ 2.812.918,20	lun 15/05/23	mar 23/05/23	0,00%	36,48%	36,48%	
MOBILIARIO	$ 8.944.853,00	vie 14/04/23	jue 8/06/23	0,97%	0,97%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.057.251,00	mié 31/05/23	jue 8/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 31.120.554,79	lun 3/04/23	jue 8/06/23	12,31%	11,54%	-0,77%	
5. LAS AMÉRICAS SECTOR AVENIDA GALÁN	**$ 221.417.133,61**	**mar 2/05/23**	**vie 4/08/23**	**0,31%**	**0,00%**	**-0,31%**	Inicio semana 12
DEMOLICIONES	$ 409.518,56	jue 11/05/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	Si bien es cierto, se tenia previsto el inicio de este parque para el 2 de mayo, de acuerdo con la reunión de inicio realizada con la comunidad, la misma solicitó cambiar las actividades a ejecutar en este frente, por lo tanto, el contratista presentó nueva propuesta para su divulgación y definición.
DESMONTES Y RETIROS	$ 913.768,00	sáb 6/05/23	vie 4/08/23	15,79%	0,00%	-15,79%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 3.122.673,55	vie 19/05/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ESTRUCTURAS	$ 2.914.922,01	vie 16/06/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERÍA METÁLICA	$ 4.891.048,34	mié 19/07/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 1.550.417,80	mié 19/07/23	vie 28/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CONFINAMIENTOS	$ 3.754.833,48	jue 8/06/23	vie 16/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
MOBILIARIO	$ 3.003.097,00	vie 28/07/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.998.853,00	vie 28/07/23	vie 4/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 198.858.001,87	mar 2/05/23	vie 4/08/23	0,27%	0,00%	-0,27%	
6. URBANIZACION ALOHA (ANTES MARSELLA)	**$ 62.117.603,67**	**mar 2/05/23**	**jue 3/08/23**	**2,79%**	**3,28%**	**0,49%**	Inicio semana 12
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 13.795.208,45	sáb 6/05/23	lun 31/07/23	2,56%	1,31%	-1,25%	
PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERÍA METÁLICA	$ 8.413.358,80	sáb 15/07/23	lun 31/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	

CONFINAMIENTOS	$ 17.836.833,42	jue 29/06/23	sáb 15/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 3.997.706,00	lun 31/07/23	jue 3/08/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 18.074.497,00	mar 2/05/23	jue 3/08/23	7,63%	10,27%	2,64%	
7. CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14	**$ 211.195.645,53**	**mar 2/05/23**	**mar 18/07/23**	**0,39%**	**1,01%**	**0,62%**	Inicio semana 12
DEMOLICIONES	$ 1.334.795,00	mié 17/05/23	mar 18/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
DESMONTES Y RETIROS	$ 449.838,00	sáb 6/05/23	mar 18/07/23	15,79%	0,00%	-15,79%	
ESTRUCTURAS	$ 3.059.945,00	sáb 27/05/23	mar 18/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
PISOS, ENCHAPES Y CARPINTERÍA METÁLICA	$ 70.311.562,18	jue 22/06/23	mar 18/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 1.879.750,00	vie 7/07/23	jue 13/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.998.853,00	jue 13/07/23	mar 18/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 132.160.902,35	mar 2/05/23	mar 18/07/23	0,57%	1,61%	1,04%	
8. CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8	**$ 218.570.957,28**	**mar 2/05/23**	**lun 24/07/23**	**2,36%**	**4,68%**	**2,32%**	Inicio semana 12
DEMOLICIONES	$ 20.880.770,24	jue 11/05/23	lun 24/07/23	0,00%	27,40%	27,40%	
DESMONTES Y RETIROS	$ 577.974,00	sáb 6/05/23	lun 24/07/23	15,79%	0,00%	-15,79%	
EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 34.106.512,50	jue 18/05/23	lun 24/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
PINTURA	$ 5.343.247,68	jue 13/07/23	lun 24/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
EMPRADIZACIÓN Y ARBORIZACIÓN	$ 1.503.800,00	jue 13/07/23	mar 18/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CANCHAS, ZONAS DE JUEGOS Y COCLORUTAS EN ASFALTO	$ 31.859.641,28	jue 15/06/23	lun 24/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
CONFINAMIENTOS	$ 1.832.520,00	jue 15/06/23	vie 30/06/23	0,00%	0,00%	0,00%	
MOBILIARIO	$ 68.595.123,00	mié 21/06/23	lun 24/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
SEÑALIZACIÓN	$ 1.057.251,00	mar 18/07/23	lun 24/07/23	0,00%	0,00%	0,00%	
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	$ 52.814.117,58	mar 2/05/23	lun 24/07/23	9,60%	8,54%	-1,06%	
9. BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA	**$ 51.963.703,48**	**lun 5/06/23**	**mié 16/08/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
10. URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA	**$ 123.933.355,24**	**lun 5/06/23**	**mié 9/08/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
11. PINAR DEL RIO	**$ 203.039.874,79**	**lun 5/06/23**	**vie 8/09/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
12. RIVERAS DE OCCIDENTE	**$ 307.382.458,40**	**lun 5/06/23**	**mié 16/08/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
13. SANTA CATALINA I Y II SECTOR	**$ 218.246.549,54**	**mar 20/06/23**	**vie 15/09/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
14. UNIR 1 - ETAPA I SECTORES I Y II	**$ 229.528.383,53**	**mar 4/07/23**	**vie 15/09/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
15. DESARROLLO DEL CAMPO HERMOSO	**$ 120.715.207,61**	**mar 4/07/23**	**lun 11/09/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	
16. DESARROLLO TAYRONA	**$ 20.440.473,72**	**mar 4/07/23**	**lun 4/09/23**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Las actividades que se desarrollaron en este periodo:

08-149 SAN ANDRÉS:
- Instalación filtro en cajas de inspección
- relleno y compactado sub-base granular tramo 2
- relleno y compactado base granular tramo 1 y 2
- nivelación sendero.

08-189 VALENCIA LA CHUCUA:
- resane juntas bordillos
- resane general rotonda
- mantenimiento malla contraimpacto costado occidental
- atraque en recebo alrededor de rotonda

08-190 URBANIZACIÓN BOMBAY:
- instalación filtro cancha
- relleno y compactado sub-base tramo 1 y 2
- relleno y compactado base granular tramo 1

08-427 LAS AMÉRICAS:
- nivelación zona donde se instalaran juegos
- instalación de filtro
- relleno y compactación sub-base granular

08-347 SUPERMANZANA 8:
- Instalación de cerramiento
- demolición capa asfáltica

08-382 SUPERMANZANA 14:
- instalación cerramiento
- demolición base juego actual

08-012 URBANIZACION ALOHA:
- instalación cerramiento
- descapote
- movimiento de tierras

9. Observaciones: Dentro del periodo del presente informe no se presentaron actividades en el parque Américas sector av galán, de acuerdo con las solicitudes presentadas por parte de la comunidad

Verificación en Obra: Ing. José Orlando Peña
Residente de Obra
25202-333918 CND

Verificación en Obra: Ing. Alfredo Callejas
Residente de Interventoría
25202-10793CND

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-149 SAN ANDRES						
abr-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	0	0	4	4	0	
miércoles, 3 de mayo de 2023	0	0	4	4	0	
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-189 VALENCIA LA CHUCUA						
may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
miércoles, 3 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-190 URBANIZACION BOMBAY						
may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
miércoles, 3 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-427 LAS AMERICAS						
may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
miércoles, 3 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-347 SUPERMANZANA 8						
may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
miércoles, 3 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	

sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-382 SUPERMANZANA 14

may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
miércoles, 3 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

REGISTRO ESTADO DEL CLIMA

08-012 URBANIZACION ALOHA

may-23	REPORTE SEGÚN CANTIDAD DE HORAS					NOTAS / CONCLUSIONES DEL ESTADO DEL TIEMPO
	SECO	SOLEADO	NUBLADO	LLOVIZNA	LLUVIA FUERTE	
SEMANA 3						
lunes, 1 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FESTIVO
martes, 2 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
miércoles, 3 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
SEMANA 4						
jueves, 4 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE HA INICIADO OBRA
viernes, 5 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
sábado, 6 de mayo de 2023	0	4	4	0	0	
domingo, 7 de mayo de 2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DOMINGO

Observaciones:

Verificación en Obra: Ing. José Orlando Peña
Residente de Obra
25202-333918 CND

Verificación en Obra: Ing. Alfredo Callejas
Residente de Interventoría
25202-10793CND

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-149 PARQUE SAN ANDRÉS



Foto 1: instalación geotextil en cajas de inspección.



Foto 2: instalación



Foto 3: relleno y compactado base granular



Foto 4: compactación base granular



Foto 5: nivelación anden



Foto 6: relleno y compactado capa arena

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-190 PARQUE VALENCIA LA CHUCUA



Foto 1: resane sillas M-30



Foto 2: resane juntas bordillos



Foto 3: continuación resane juntas bordillos



Foto 4: mantenimiento malla contra impacto actual costado occidental



Foto 5: atraque en recebo



Foto 6: continuación resanes rotonda

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-190 PARQUE URBANIZACIÓN BOMBAY



Foto 1: Perfilado de cancha



Foto 2: instalación de geotextil en cancha



Foto 3: relleno y compactado capa sub-base granular



Foto 4: base granular tramo 1



Foto 5: compactación sub- base granular tramo 1



Foto 6: compactación base-tramo 1

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-427 PARQUE LAS AMÉRICAS



Foto 1: instalación de filtro



Foto 2: relleno de sub- base



Foto 3: compactación de sub base



Foto 4: Retiro RDC



Foto 5:



Foto 6:

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-347 SUPERMANZANA 8



Foto 1: instalación de cerramiento



Foto 2: demolición capa asfáltica



Foto 3: continuación demolición capa asfáltica



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-382 SUPERMANZANA 14



Foto 1: instalación cerramiento



Foto 2: demolición base juego infantil



Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY
CONTRATISTA	Consorcio Parques EDC 2023
INTERVENTORÍA	Clemente Alfredo Buitrago S.A.S

REGISTRO FOTOGRÁFICO 08-012 URBANIZACION ALOHA



Foto 1: instalación cerramiento



Foto 2: descapote



Foto 3: excavación retiro de tierra

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME SST
DESDE	01-may-23	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY	12
HASTA	07-may-23		


DESCRIPCIÓN

1. OBSERVACIONES

Se realizó cerramiento de los parques manzana 8 manzana 14 y parque Aloha.
Se realiza suministro de Dotación
Charla sobre el reporte de los accidentes laborales.

2. PERSONAL DE OBRA

PARQUES	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SA	DOM	OBSERV.
RIVERAS DE OCCIDENTE	0	0	0	0	0	0	0	
URBANIZACIÓN ALOHA (ANTES MARSELLA)	2	2	2	2	2	2	0	En ejecución
UNIR 1-ETAPA I SECTORES I Y II	0	0	0	0	0	0	0	
PINAR DEL RIO	0	0	0	0	0	0	0	
SAN ANDRÉS	2	2	2	2	2	2	0	En ejecución
BERTHA HERNÁNDEZ DE OSPINA	0	0	0	0	0	0	0	
DESARROLLO CAMPO HERMOSO, DESARROLLO PATIO BONITO II SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	
VALENCIA LA CHUCUA	3	3	3	3	3	3	0	En ejecución
URBANIZACIÓN BOMBAY	3	3	3	3	3	3	0	En ejecución
URBANIZACIÓN GRAN BRITALIA, DESARROLLO LA ESPERANZA, URBANIZACIÓN EL ALMENAR	0	0	0	0	0	0	0	
LAS AMÉRICAS SECTOR AVENIDA GALÁN	0	0	0	0	0	0	0	
CIUDAD KENNEDY SUPERMANZANA 8	2	2	2	2	2	2	0	En ejecución
CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL SUPERMANZANA 14	1	1	1	1	1	1	0	
LAS AMÉRICAS	2	2	2	2	2	2	0	En ejecución
SANTA CATALINA I Y II SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	
DESARROLLO TAYRONA	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	

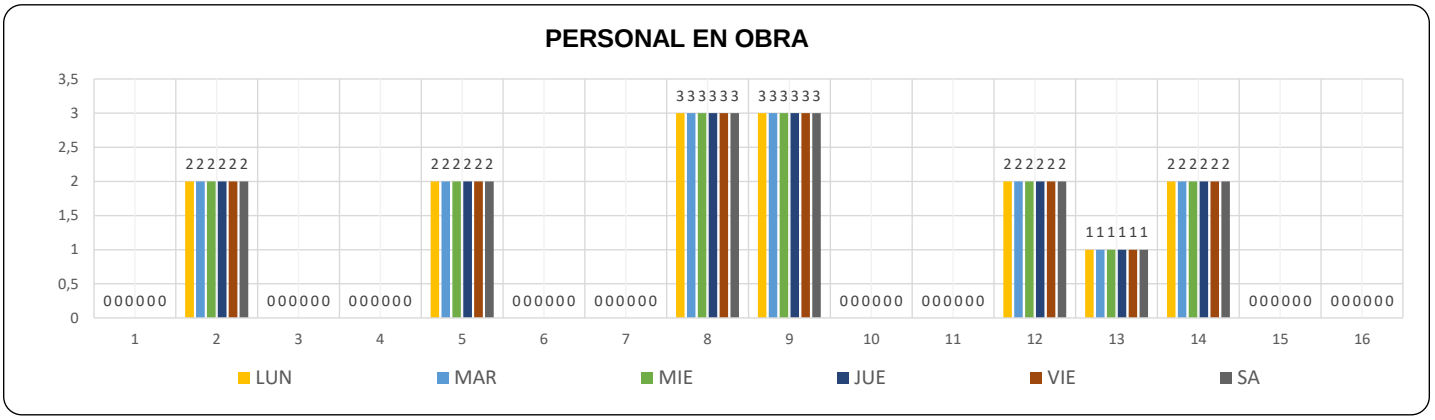

2.1 REGISTRO DE MAQUINARIA EN LA SEMANA

MAQUINARIA Y EQUIPO	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	OBS.
MACETA	10	10	10	10	10	10	10	
PUNTERO	10	10	10	10	10	10	10	
ALICATE	10	10	10	10	10	10	10	
DESTORNILLADOR DE PALA	10	10	10	10	10	10	10	
DESTORNILLADOR DE ESTRELLA	10	10	10	10	10	10	10	
MARTILLO DEMOLEDOR	10	10	10	10	10	10	10	
PALAS	10	10	10	10	10	10	10	
PICAS	10	10	10	10	10	10	10	
BARRAS	10	10	10	10	10	10	10	
ROTOMARTILLO	0	0	0	0	0	0	0	
MINICARGADOR	1	1	1	1	1	1	1	
PULIDORA	0	0	0	0	0	0	0	

VIBROCOMPACTADOR	0	0	0	0	0	0	0	
PLANTA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	
ROTOMARTILLO	0	0	0	0	0	0	0	
RETROEXCAVADORA	1	0	0	0	0	0	0	

2.2 CAPACITACIÓN

CHARLAS	BIOSEGURIDAD	CAPACITACIONES
cuando se debe hacer el reporte de accidentes laborales		

3. GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL (SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL)

3.1. INCIDENTALIDAD

	Fatalidades	Accidentes graves	Accidentes leves	Casos Con días Perdidos	Días perdidos por accidente de trabajo	Casos Con Días de Incapacidad ENFERMEDAD GENERAL
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Durante esta semana no se presentaron AT

3.2. CONDICIONES Y ACCIONES POR SUBSANAR

3.2.1 CONDICIÓN SUBESTÁNDAR


4. REGISTRO FOTOGRÁFICO SST



suministro de EPP



Adecuación de punto de hidratación

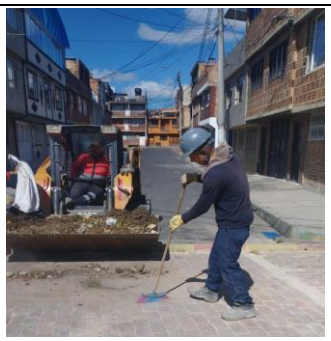

orden y aseo en área de trabajo



cerramiento de parques

Leidy Cardona Cáceres
Profesional SST interventoría

FECHA DEL INFORME		OBJETO DEL CONTRATO	INFORME SOCIAL
DESDE	01-may-23	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO PRIORIZADOS EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY	**12**
HASTA	07-may-23		

DESCRIPCIÓN

Actividades realizadas en la semana del 02 al 06 de mayo por el área social de interventoría:
• Verificación de las actividades programadas y ejecutadas por el componente social del contratista de obra.
• Se aprueba realiza el taller de sostenibilidad el día 02 de mayo a todos los estudiantes de bachillerato y los administrativos de la institución educativa.
• Se revisa el informe mensual del componente social de la firma contratista y se emiten observaciones por parte de la interventoría.
• Se realiza revisión al informe mensual del componente V1 y se envía aprobación.
• Se envía el informe mensual del componente social de la interventoría.

REGISTRO SOCIAL



Taller de sostenibilidad N°1



Taller de sostenibilidad N°1

Diana Marcela Ortiz
Residente Social interventoría
CIVILCO INGENIERÍA S.A.S
