En mi calidad de supervisor (a) del contrato que a continuación relaciono, hago constar el cumplimiento a cabalidad por parte del contratista, de las obligaciones y actividades contenidas en el mismo, razón por la cual se autoriza pago a favor del contratista

**DATOS GENERALES**:

| | |
|---|---|
| CONTRATO Nº: | **AC-84-2018** |
| TIPO DE CONTRATO | CONTRATO DE OBRA |
| VALOR | CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS m/cte. $179.853.152 |
| FORMA DE PAGO | PAGOS PARCIALES POR EJECUCION CONTRACTUAL, PREVIA ENTREGA DE UN INFORME DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCION DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR. |
| VALOR ANTICIPO – PAGO ANTICIPADO | N/A |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | **ECOHABITAT SAS** |
| C.C/ NIT: | 830.091.013-6 |
| OBJETO: | OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA |
| PLAZO | DOS (2) MESES |
| FECHA DE INICIO | 17 de Octubre -2018 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 16 de Diciembre 2018 |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR: | JHON JAIRO GOMEZ ARIAS |
| CARGO: | SUPERVISOR – GERENTE DE PROYECTOS |
| CDP - FECHA | 278-19-06-2018 |
| RP - FECHA | 435-06-08-2018 |
| PAGO PARCIAL NÙMERO | UNO (1) |

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:**

| CONTRATISTA PERSONA NATURAL __ | CONTRATISTA PERSONA JURÍDICA ___X__ |
|---|---|
| El contratista presentó planillas de pago de aportes a la Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales No.------- por el periodo de **2018** ---------- .<br>Valor facturado $<br>Base (40%) antes de IVA _____<br>Salud 12.5% $<br>Pensión 16%_____<br>ARL<br>NIVEL DE RIESGOS I 0,522% _$<br>NIVEL DE RIESGOS II 1.044% _____<br>NIVEL DE RIESGOS III 2,436% _____<br>NIVEL DE RIESGOS IV 4.350% _____<br>NIVEL DE RIESGO V 6,960 % _____<br>Cotización en Riesgos IV y V, debe ser asumida por la entidad contratante.<br>Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley<br>Verificado el monto de cada uno de los aportes en la planilla, se constató que se ajusta a la base de liquidación correspondiente al valor del contrato. | El contratista presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Representante Legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales), y Parafiscales al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, si aplica. Por el periodo de los últimos seis meses. |

**RESUMEN PAGOS:**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $179.853.152 | $179.853.152 |
| VALOR DE ESTE PAGO | $120.903.016 | $120.903.016 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 | $0 |
| VALOR PENDIENTE EJECUTAR | $58.950.136 | $58.950.136 |

## CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRATISTA FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATISTA PERSONA NATURAL

El contratista presentó planillas de pago de aportes a la Seguridad Social integral en Salud, Pensión y Riesgos [illegible] por el periodo de **2018** ----------.

Valor facturado $

Less (40%) any IVA _____

Salud (12.5%) $

Pensión (16%) _____

ARL

NIVEL DE RIESGOS I 0.522% $

NIVEL DE RIESGOS II 1.044% _____

NIVEL DE RIESGOS III 2.436% _____

NIVEL DE RIESGOS IV 4.350% _____

NIVEL DE RIESGO V 6.960 % _____

Cotización en Riesgos IV y V debe ser asumida por la entidad contratante

Los aportes [illegible] superior a 16 salarios mínimos, [illegible] pantes, tributan un aporte adicional sobre [illegible] ingresos base de cotización así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de un 1% destinado exclusivamente a subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de cuya tarifa la presente ley autorizó el monto de cada uno de los aportes en la planilla se cotizará que se ajusta a la base de liquidación correspondiente. Valor del contrato

CONTRATISTA PERSONA JURÍDICA ___X__

El contratista presentó certificación suscrita por el Revisor Fiscal o Representante Legal acreditando que se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensión y riesgos laborales), y Parafiscales al SENA ICBF y Caja de Compensación Familiar, si aplica. Por el periodo de los últimos seis meses

## RESUMEN PAGOS.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO | $179.853.152 | $179.853.152 |
| VALOR DE ESTE PAGO | $120.902.016 | $120.902.016 |
| VALOR PAGADO A LA FECHA | $0 | $ |
| VALOR PENDIENTE EJECUTAR | $58.950.136 | $58.950.136 |


**OBSERVACIONES:**

Se expide la presente constancia para efectos de pago PARCIAL__X__ FINAL __.

Fecha: 29 de noviembre del 2018



**FIRMA**
**NOMBRE LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**
**APODERADO ECOHABITAT SAS**
**CONTRATISTA**



**FIRMA**
**NOMBRE ARMANDO HENAO BURBOS**
**INTERVENTOR**



**FIRMA**
**JHON JAIRO GOMEZ ARIAS**
**SUPERVISOR** - Gerente de Proyectos Especiales

**ACTA DE OBRA No __**

DECLARACIÓN DE PAZ Y SALVO: (Del cumplimiento de las obligaciones contractuales)

Se declara el cumplimiento y paz y salvo de las obligaciones Contractuales por parte del CONTRATISTA.

CONTRATISTA
LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA
APODERADO ECOHABITAT SAS
C.C. 79322776 de Bogota D.C.

SUPERVISOR
JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Gerente de Proyectos
INFICALDAS

INTERVENTOR (este no aplica para interventoría)
ARMANDO HENAO BURBOS

Esta actã debe ir acompañada por los siguientes soportes:
CDP o Registro presupuestal del compromiso __ Giro (Si es de recursos regalías cuenta por pagar comprobante) ___ Obligación presupuestal comprobante __ Cuenta de cobro __ Plan de inversión del anticipo __ Certificado fiducia (obra) o Certificado bancario (interventoría) __ Cumplimiento aportes parafiscales___

Vo.Bo. Gerencia para giro del pago

# INFORME PARCIAL DE LOS CONTRATOS AC-84-2018 y IP-19-2018 DEL SUPERVISOR DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA

Rindo INFORME FINAL de todo el desarrollo de Obra de Interventoría donde intervinieron el Contratista de Obra ECOHABITAT S.A.S - AC-59-2018 "OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA " como la Interventoría Ing ARMANDO HENAO BURGOS- IP-19-2018, de los cuales hago parte en calidad de Supervisor.

**CONTRATO: AC-84 DEL 2018**
**CONTRATISTA ECOHABITAT S.A.S.**
**OBJETO**: OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA
**PLAZO: 2 MESES**
**Representante Legal**: ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON
**VALOR**: $179.853.152
**FECHA DE INICIO: 17 DE OCTUBRE**

**INTERVENTORIA: CONTRATO IP-19-2018**
**CONTRATISTA: ARMANDO HENAO BURGOS**
**VALOR: $ 11.938.400**
**PLAZO 2 MESES-**

**ACTIVIDADES REALIZADAS:**

**1-RETIRO DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES A SITIO DE ACOPIO.**

Adicional a los ítems contratados se considera un nuevo items corresponde al relleno en recebo Compactado en el fondo del foso donde se instalara el tanque séptico. la trampa de grasas y la caja de inspección, lo mismo en las zanjas para el tendido de la red sanitaria externa; decidieron al efectuar los cálculos mantener esta actividad al valor de la excavación pactado, y lo mismo para el relleno.

**2-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**

- Las redes hidrosanitarias presentan diámetros insuficientes y no tienen pendiente para la circulación
  de aguas sanitarias y residuales, se aumentó el diámetro de la tubería en 2" las residuales y en 4" las
- sanitarias y estas llevadas a los tanques sépticos en 6"
- La trampa de grasa se construirá para separar las aguas residuales de las sanitarias.
- El cauce que alimenta la bocatoma sufrió creciente y produjo desprendimiento de tierras lateralmente; presentando un escarpe aprox de 2 metros.

**1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS**
Instalación iluminación externa

**2. ESTUCO – PINTURA Y ACABADOS EXTERNOS.**

**3. CUBIERTA**

se programa adelantar el cambio de 100 m2 de teja de barro.

**4. .ASEO Y LIMPIEZA**

**Obras adicionales por requerimiento de Corpocaldas y cuando se hizo la convocatoria no se tenía conocimiento sobre:**

- Construir en la bocatoma un tanque en concreto según requerimiento de Corpocaldas y alguna barreras de proyección para corrección cauce.
- Estamos a la espera de valores y cantidades de estas obras adicionales sobre el requerimiento de Corpocaldas.

**Adicionales:** Elementos de trabajo en alturas para ejecución de actividades de cubiertas incluye dos torres de andamio convencionales de 4 secciones cada una, una línea de vida, arnés del personal y EPP en alturas y Coordinador de trabajo en alturas.

La Arrendataria del Parador la Esperanza, solicita cambio de SANITARIOS en baños, se requiere el cambio de algunas piezas para su buen funcionamiento y ya no existen en el mercado.

**TRABAJOS EN AREA DE COCINA Inspección área de Cocina:** Según informe del Interventor esta debe cumplir con las condiciones mínimas sanitarias para la realización y preparación de alimentos. Debe adecuarse con prioridad para el cumplimiento de la normatividad sanitaria, con mesón en granito pulido y enchape cerámico en muros.

De acuerdo a la solicitud recibida en Inficaldas el 3 de Diciembre por el Interventor ARMANDO HENAO BURGOS, de prorrogar y adicionar los Contratos del Parador Turística la Esperanza, basados en los requerimientos de Corpocaldas, para la valoración y la rehabilitación de la bocatoma y otras obras adicionales no previstas como instalación de filtros por presencia de aguas internas en la estructura del Parador Turístico la Esperanza y en la parte donde se instaló el tanque séptico y anaeróbico, los cuales tienen un costo aproximado de $ 53.027.987 para ejecutar las siguientes obras:

- Construcción filtro al interior del parador y bordeando el tanque séptico y anaeróbico por fuerte presencia de agua interna.
- Instalación de tubería sanitaria de 6" y sus accesorios.
- Instalación de tubería sanitaria de 4" y sus accesorios.
- Geotextil no tejido para el lecho de lodo
- limpieza del tanque séptico y anaeróbico.
- traslado de estos tanques hacia sitio que de mayor pendiente y sus correspondientes instalaciones sanitarias.
- Construcción del tanque y estructura bocatomas y obras de contención.

Se Informa que los contratos relacionados en el asunto vencen el 16 de diciembre DEL 2018; por lo cual le solicito ampliar hasta el 21 de diciembre 2018, prórroga a los CONTRATOS AC-84- 2018 e Interventoría IP-19-2018 por los requerimientos de **CORPOCALDAS**, para la valoración y rehabilitación de la bocatoma y otras obras adicionales no previstas en el contrato como instalación de filtros por presencia de aguas internas en la estructura del Parador Turístico la Esperanza, y en la parte donde se instaló el tanque séptico y anaeróbico los cuales tiene un costo aproximado para obras de $ 53.027.987 y para la Interventoría $ 3.519.923 y así dar por terminado los trabajos.

Diciembre 6 del 2018

**JHON JAIRO GOMEZ ARIAS**
SUPERVISOR
GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES

Bogota D.C., 23 de noviembre 2018

**SEÑORES**
**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS**
**Ciudad**

Yo, **ZANDRA MAYELY DÍAZ RINCÓN**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con la cédula de de ciudadanía N°52.093.561 de Bogotá, en mi calidad de Representante Legal de la Empresa **ECOHABITAT SAS,** identificada con el **NIT N°830091013-6**, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, me dirijo a ustedes para manifestarle por medio del presente escrito que confiero poder especial amplio y suficiente al Sr. **LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA,** mayor de edad, domiciliado y residente en esta misma ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía **N° 79.322.776** de Bogotá, para que sea él, quien firme en nombre de **ECOHABITAT SAS,** toda la documentación inherente del Contrato de obra No. **AC-84-2018** cuyo objeto es **"OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA"**, se autoriza y da poder para la firma de; Actas de Obra, Actas Parciales de Obra, Acta de Balance de Obra, Actas de Cortes de Obra, Actas de Fijación de ítems no previstos, Modificaciones y/o adiciones del Contrato, Análisis de Precios Unitarios, Memorias de Obra y en general todos los oficios y documentos necesarios para el buen desarrollo y términos legales del proyecto en mención.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, firmar, renunciar, reasumir y todas aquellas que tiendan al buen manejo y fiel cumplimiento de su gestión.

De Ustedes, atentamente,

**ZANDRA MAYELY DÍAZ RINCÓN**
**CC 52.093.561 de Bogotá**
**Representante Legal**
**ECOHABITAT SAS**

Acepto,

**LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**
**C. C. N° 79.322.776 de Bogotá**

COMUNICACIONES OFICIALES RECIBIDAS
Radicado: 01-02-20181130000001517
Fecha: 30/11/2018 04:24:56 p. m.
Usuario: xariasm
Persona / Contacto: ZANDRA MAYELY DIAZ RINCC
Entidad: ECOHABITAT
Numero de Oficio: N/A
Dependencia: OFICINA JURIDICA
Número de folios: 1

## DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

### Artículo 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1069 de 2015

43634

En la ciudad de Cota, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, el veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Única del Círculo de Cota, compareció:

ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0052093561, presentó el documento dirigido a INTERESADO y manifestó que la firma que aparece en el presente documento es suya y acepta el contenido del mismo como cierto.



-------- Firma autógrafa --------

16u2bv90s2mt
29/11/2018 - 15:23:42:566

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.


Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
JAQUELINE TORO LONDOÑO
NOTARIA (E)
Notaría Única del Círculo de Cota - Cundinamarca

JAQUELINE TORO LONDOÑO
Notaria Única del Círculo de Cota - Encargada

*Consulte este documento en www.notariasegura.com.co*
*Número Único de Transacción: 16u2bv90s2mt*

Notaría Única del Círculo de Cota - Cundinamarca

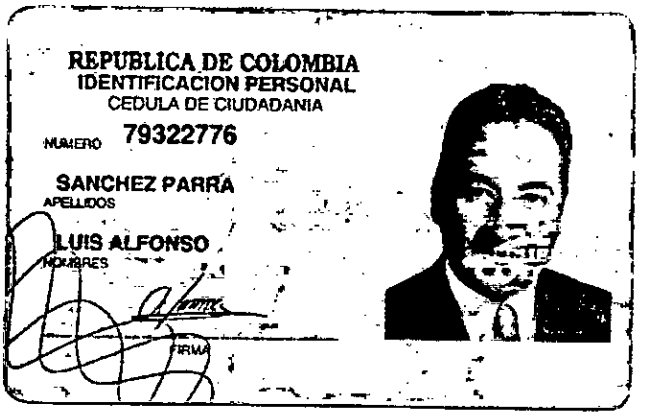


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79322776

SANCHEZ PARRA
APELLIDOS

LUIS ALFONSO
NOMBRES

FIRMA

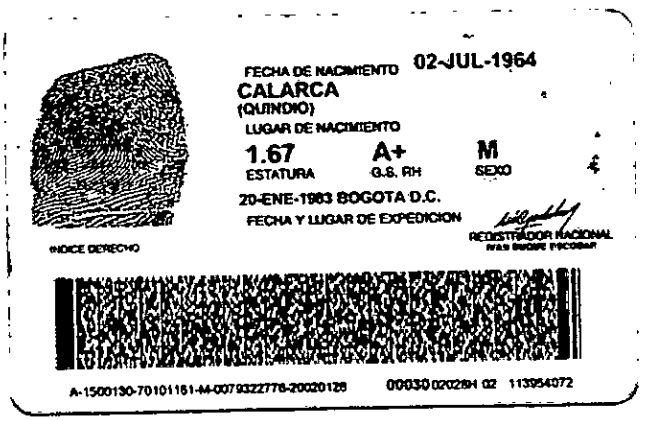

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-JUL-1964
CALARCA
(QUINDIO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

20-ENE-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500130-70101161-M-0079322776-20020128 0003302022941 02 113954072

constructora@ecohabitatsas.com
Telefax: 571 8965907
Móviles Oficina: 3108573157 - 3185558067
Calle 76 No 11 - 35 Local 2 Edificio los Nogales
Bogotá D.C. - Colombia

**ECOHÁBITAT S.A.S. NIT 830091013-6**

**www.ecohabitat.com.co**
"La bendición del Señor trae riquezas..." Prov 10:22

**I.V.A. RÉGIMEN COMÚN**
Act. Económica ICA 4112 1 (Tarifa 6,9x1000)
Resolución DIAN No. 18762007697896
Fecha: 2018/04/09 del No 1320 al 2000 Vigencia 24 meses

# FACTURA DE VENTA No. 1327

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 29 | 11 | 2018 | | | |

| Señores: | INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | NIT/C.C.: 890.806.006-3 |
|---|---|---|

| Dirección: | Calle 21 No. 23-22 Edificio Atlas piso 3 y 4 | Teléfono: | 6-8845639 | Ciudad: MANIZALES |
|---|---|---|---|---|

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE OBRA CIVIL<br>FACTURACION VALOR CORTE PARCIAL No. 1 EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. A.C 84-2018, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR OBRAS PARADOR TURÍSTICO LA ESPERANZA." | | | |
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO | 1 | $ 92.292.378 | $ 80.300.097 |
| ADMINISTRACION (25%) | 1 | $ 23.073.095 | $ 23.073.095 |
| IMPREVISTOS (2%) | 1 | $ 1.845.848 | $ 1.845.848 |
| UTILIDAD (4%) | 1 | $ 3.691.695 | $ 3.691.695 |
| PARA TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS:<br>***BANCO CAJA SOCIAL CUENTA DE AHORROS: 24044103835*** | | | |

| OBSERVACIONES: | | | |
|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | $ | 120.903.016 |
| | IVA 19% | $ | 0 |
| **SON:** CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DIEZ Y SEIS PESOS m/cte. | TOTAL | $ | 120.903.016 |

PEZAM IMPRESORES NIT 800185902-2 TEL4304419

Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio se cobrarán intereses de mora al tope máximo fijado por la Superintendencia Financiera. FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ECOHÁBITAT S.A.S

| Aceptada: Firma/sello | ECOHÁBITAT S.A.S. |
|---|---|
| NIT/C.C. Del cliente | |

| | INFICALDAS<br>PROCESO DE GESTION E PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA<br>AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES | CÓDIGO | 1410-F-99 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | FECHA | 29/11/2018 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

CONTRATO No: **AC-84-2018**

| | | % | TIPO PAGO: | ACTAS PARCIALES | NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO | 1327 | PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | N/A | | ACTA DE OBRA | No. 01 | | | 17 Octubre 2018 - 29 de Noviembre de 2018 |
| PAGO ANTICIPADO | | | ACTA DE INTERVENTORIA | | | | |
| | | | ACTA DE AJUSTE | | | | |
| DESEMBOLSO | | | PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| | | | OTRO | | | | |
| | | | CUAL? | | | | |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
***(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)***

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 278 | 19/06/2018 | RP | 435 | 06/08/2018 | VALOR AFECTADO | $ 120.903.016,00 |
| CDP | | | RP | | | VALOR AFECTADO | |
| CDP | | | RP | | | VALOR AFECTADO | |
| | | | | | | TOTAL ACTA | $ 120.903.016,00 |

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: N/A (BID, USAID, CAF, Etc...)

Firma
Nombre: ING. ARMANDO HENAO BURGOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: ING. JHON JAIRO ARIAS GOMEZ
Supervisor del proyecto (INFICALDAS)

Firma
Nombre: ARQ. LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA
Residente de Obra
Apoderado ECOHABITAT SAS

**INFICALDAS**
**PROCESO MISIONAL DE PROYECTOS**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**
**HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | INFICALDAS 1410-F-19 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| FECHA | 17/03/2017 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 30 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: _____

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ - PERIODO MES: _____

| | Día | Mes | Año | | | FIRMA | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | 30 | Noviembre | 2018 | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | JHON JAIRO GOMEZ ARIAS | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE) | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR | | | | NOMBRE DE QUIEN APRUEBA | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DE INFICALDAS | | | | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL PROYECTO (EN CASO DE | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL SUPERVISOR DEL PROYECTO | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL TESORERO | 30 | 11 | 2018 | NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE | | | |
| FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR INFICALDAS PARA | | | | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | | | |

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

## AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : AC-84-2018 DE ECOHABITAT S.A.S. NIT. 830.091.013-6

OBJETO. OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA

SUPERVISOR: JHON JAIRO GOMEZ ARIAS

**De acuerdo con la facultad otorgada, el __LUZ STELLA CARDONA MEZA _____ autoriza el pago a favor del -ECOHABITAT S.A.S.** por valor de : **$120.903.016 Letras: _ CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CERO DIEZ Y SEIS PESOS**
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No __1__ del periodo _____ y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto

Firma:
Nombre JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Matrícula No
SUPERVISOR DEL PROYECTO (INFICALDAS)

Firma
Nombre LUZ STELLA CARDONA MEZA
Matrícula No.
GERENTE GENERAL

Firma:
Nombre. EVER JOSE HERNANDEZ FERNANDEZ
Matrícula No
TESORERO

Original
Copia

| | INFICALDAS<br>PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL | CÓDIGO | 1410-F-98 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | FECHA | 08/09/2017 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

Contrato No. AC-84-2018 Contratista__ ECOHABITAT SAS

Objeto del Contrato: OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA

Acta No. 1 Valor basico $ $ 120.903.016,00 Periodo 29 de noviembre de 2018

Factura No. y fecha 1327 de 29 de noviembre de 2018 Valor incluido el iva $ $ 120.903.016,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

| Item | Ruta (codigo via) | Denominación (Carretera - Puente-Tunel) | Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento) | valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PARADOR TURISTICO LA | OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA | $ 120.903.016,00 | | | $ 120.903.016,00 |
| | | | $ - | | | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| | | | $ - | | | $ - |
| | TOTALES | | | $ - | $ - | $ 120.903.016,00 |

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| | DEPARTAMENTO 1 | CALDAS | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE MANIZALES | | | $ 120.903.016,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPARTAMENTO 1 | | | $ 120.903.016,00 |

| | DEPARTAMENTO 2 | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPARTAMENTO 2 | | | $ - |

| | DEPARTAMENTO 3 | | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DEPARTAMENTO 3 | | | $ - |

VALOR TOTAL BASICO $ 120.903.016,00

Firma
Nombre: ING. ARMANDO HENO BURGOS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: ING. JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Supervisor - Gerente de Proyectos
INFICALDAS

Firma
ARQ. LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA
Arq. Residente de Obra
ECOHABITAT SAS
Firma por Poder

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | OBJETO: OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA.<br><br>CONTRATO AC-84-2018<br>PLAZO INICAL: HASTA 16 DICIEMBRE DE 2018<br>PLAZO ADICIONAL:<br>PLAZO FINAL: | VALOR INCIAL TOTAL: $179.853.152 INCLUIDO IVA<br><br>VALOR ADICIONAL:<br><br>VALOR FINAL TOTAL: $179.853.152 INCLUIDO IVA | CONTRATISTA: ECOHABITAT SAS<br><br>INTERVENTORIA: ARMANDO HENAO BURGOS<br><br>SUPERVISIÓN: JHON JAIRO GOMEZ ARIAS (INFICALDAS) |

## ACTA DE RECIBO PARCIAL DE COSTOS DE CONTRATO DE OBRA No. 01

El día 29 de noviembre de 2018 en Manizales, se reunieron el Ing. Jhon Jairo Gomez Arias como supervisor del Contrato de obra por parte de INFICALDAS, el Ing. Armando Henao Burgos, como interventor del Contrato y el Arquitecto Luis Alfonso Sanchez Parra como Residente de Obra y Apoderado del Contratista, con el objeto de recibir los costos relacionados con el Acta Parcial No. 1 del Proyecto AC-84-2018 "OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA" durante el Periodo entre 17 de Octubre de 2018 y 29 de noviembre de 2018

| **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO** | | **valores** | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial | | $ 179.853.152,00 | |
| Valor Adicional | | | |
| Valor Total del Contrato (1+2) | | $ 179.853.152,00 | |
| Valor Pagado por Anticipo | | | |
| Actas Pagadas | | | |
| Valor que resta Por Pagar (3-4) | | $ 179.853.152,00 | |
| Valor Presente Acta | | $ 120.903.016,00 | |
| Amortización en esta Acta | | | |
| Otras Retenciones Acumuladas | | | |
| Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8) | | $ 120.903.016,00 | |
| Pagos Actas anteriores | | | |
| Valor Pagado a la Fecha | | | |
| Saldo por pagar del Presente Contrato | | $ 58.950.136,00 | |
| Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha | | 67% | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS | OBJETO: OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA.<br><br>CONTRATO AC-84-2018<br>PLAZO INICAL: HASTA 16 DICIEMBRE DE 2018<br>PLAZO ADICIONAL:<br>PLAZO FINAL: | VALOR INCIAL TOTAL: $179.853.152 INCLUIDO IVA<br><br>VALOR ADICIONAL:<br><br>VALOR FINAL TOTAL: $179.853.152 INCLUIDO IVA | CONTRATISTA: ECOHABITAT SAS<br><br>INTERVENTORIA: ARMANDO HENAO BURGOS<br><br>SUPERVISIÓN: JHON JAIRO GOMEZ ARIAS (INFICALDAS) |

**OBSERVACIONES:** El contratista de interventoría y la supervisión, mediante el presente documento, hacen constar que los servicios prestados fueron verificados por el supervisor delegado por parte de INFICALDAS.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de actividades por parte del contratista se ha realizado atendiendo los requerimientos y especificaciones establecidas por INFICALDAS.

Fecha: 29 de noviembre del 2018

**FIRMA** _____
**NOMBRE LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**
**APODERADO ECOHABITAT SAS**
**CONTRATISTA**

**FIRMA** _____
**NOMBRE ARMANDO HENAO BURBOS**
**INTERVENTOR**

**FIRMA** _____
**JHON JAIRO GOMEZ ARIAS**
**SUPERVISOR** - Gerente de Proyectos Especiales

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS
PROCESO GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-4-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 4 |
| PÁGINA | DE |
| FECHA | 29 (Día) / 11 (Mes) / 2018 (Año) |

UNIDAD EJECUTORA: INFICALDAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CALDAS | ACTA Nº: 1 | ACTA FINAL: SI [ ] NO [X] (Indicar con una X) | VALOR BÁSICO ACTA: $ 120 933 016,00 | MES: NOVIEMBRE

CONTRATO No: AC-84-2018 (Indique número y año)

OBJETO: OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ECOHABITAT SAS | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: IP-19-2018 | ING. ARMANDO PEÑAO

PLAZO INICIAL: DOS (2) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 17/10/2018 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 179.853.152,00 (Según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: UN (1) MESES (En meses segun las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2018 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $0,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 179.853.152

| No. DE ORDEN | GRUPO DE AJUSTE | ESPECIFICACIÓN GRAL. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS de Modificación No. ____ Última Acta de fecha ____ CANTIDAD | VALOR | OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD | VALOR | ACUMULADO CANTIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 1,01 | | | | INSTALACIONES PROVISIONALES CAMPAMENTO | M2 | 60,0 | $58.000,00 | $3.480.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 1,02 | | | | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | | $4.550,00 | $- | 134,50 | $ 611.975,00 | 134,50 | $ 611.975,00 | 134,50 | $ 611.975,00 |
| 1,03 | | | | CERRAMIENTO PROVISIONAL | ML | 140,0 | $19.300,00 | $2.702.000,00 | 70,00 | $ 1.351.000,00 | 70,00 | $ 1.351.000,00 | 70,00 | $ 1.351.000,00 |
| 1,04 | | | | DESMONTE/DEMOLICION REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS (INCLUYE APARATOS) | GL | 1,0 | $1.540.000,00 | $1.540.000,00 | 1,00 | $ 1.540.000,00 | 1,00 | $ 1.540.000,00 | 1,00 | $ 1.540.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $7.722.000,00 | | $3.502.975,00 | | $3.502.975,00 | - | $ 3.502.975,00 |
| 2 | | | | EXCAVACIONES Y LLENOS | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 2,01 | | | | EXCAVACIONES MATERIAL COMUN 0-2m | M3 | 337,5 | $23.000,00 | $7.762.500,00 | 458,40 | $ 10.543.203,00 | 458,40 | $ 10.543.203,00 | 458,40 | $ 10.543.203,00 |
| 2,02 | | | | LLENOS COMPACTADOS MATERIAL DE SITIO | M3 | 135,0 | $22.000,00 | $2.970.000,00 | 167,35 | $ 3.681.700,00 | 167,35 | $ 3.681.700,00 | 167,35 | $ 3.681.700,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $10.732.500,00 | | $14.224.903,00 | | $14.224.903,00 | - | $ 14.224.903,00 |
| 3 | | | | RETIRO DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES A SITIO DE ACOPIO | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 3,01 | | | | RETIROS | M3 | 202,5 | $16.900,00 | $3.402.000,00 | 46,00 | $ 772.800,00 | 46,00 | $ 772.800,00 | 46,00 | $ 772.800,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $3.402.000,00 | | $772.800,00 | | $772.800,00 | - | $ 772.800,00 |
| 4 | | | | ESTRUCTURA | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 4,01 | | | | CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) | M3 | 31,0 | $716.000,00 | $22.196.000,00 | 29,67 | $ 20.814.120,00 | 27,96 | $ 19.332.000,00 | 27,00 | $ 19.332.000,00 |
| 4,02 | | | | ACERO fy=420 MPa | KG | 2424,0 | $5.500,00 | $13.332.000,00 | 1.027,68 | $ 5.648.940,00 | 900,00 | $ 4.950.000,00 | 900,00 | $ 4.950.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $35.528.000,00 | | $26.463.060,00 | | $24.282.000,00 | - | $ 24.282.000,00 |
| 5 | | | | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | | | | | | $ - | | $ - | - | $ - |
| 5,01 | | | | TUBERIA PVC SANITARIA EN PLACAS Y DUCTOS 3" | ML | 10 | $22.000,00 | $220.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,02 | | | | TUBERIA PVC SANITARIA EN PLACAS Y DUCTOS 4" | ML | 72 | $29.000,00 | $2.088.000,00 | 225,50 | $ 6.539.500,00 | 225,50 | $ 6.539.500,00 | 225,50 | $ 6.539.500,00 |
| 5,03 | | | | ABRAZADERAS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍAS COLGANTES 2" | UN | 30 | $19.000,00 | $570.000,00 | 33,00 | $ 627.000,00 | 33,00 | $ 627.000,00 | 33,00 | $ 627.000,00 |
| 5,04 | | | | ABRAZADERAS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍAS COLGANTES 3" | UN | 40 | $19.000,00 | $760.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,05 | | | | ABRAZADERAS DE FIJACIÓN PARA TUBERÍAS COLGANTES 4" | UN | 60 | $19.000,00 | $1.140.000,00 | 109,00 | $ 2.071.000,00 | 109,00 | $ 2.071.000,00 | 109,00 | $ 2.071.000,00 |
| 5,06 | | | | PUNTO SANIATARIO PVC SANITARIO DE TANQUE | UN | 14 | $65.000,00 | $910.000,00 | 14,00 | $ 910.000,00 | 14,00 | $ 910.000,00 | 14,00 | $ 910.000,00 |
| 5,07 | | | | PUNTO SANITARIO PVC SANITARIO LAVAMANOS | UN | 17 | $65.000,00 | $1.105.000,00 | 17,00 | $ 1.105.000,00 | 17,00 | $ 1.105.000,00 | 17,00 | $ 1.105.000,00 |
| 5,08 | | | | PUNTO SANITARIO PVC SANITARIO ORINAL | UN | 4 | $65.000,00 | $260.000,00 | 4,00 | $ 260.000,00 | 4,00 | $ 260.000,00 | 4,00 | $ 260.000,00 |
| 5,09 | | | | PUNTO SANITARIO PVC SANITARIO DUCHA | UN | 2 | $65.000,00 | $130.000,00 | 2,00 | $ 130.000,00 | 2,00 | $ 130.000,00 | 2,00 | $ 130.000,00 |
| 5,1 | | | | PUNTO SANITARIO PVC SANITARIO LAVAPLATOS | UN | 3 | $65.000,00 | $195.000,00 | 3,00 | $ 195.000,00 | 3,00 | $ 195.000,00 | 3,00 | $ 195.000,00 |
| 5,11 | | | | PUNTO SANITARIO PVC DESAGÜE DE PISO 2" | UN | 3 | $65.000,00 | $195.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,12 | | | | TRAMPA DE GRASAS EN FIBRA DE VIDRIO | UN | 2 | $630.000,00 | $1.260.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,13 | | | | CAMARAS DE INSPECCIÓN 0.6m x 0.6m | UN | 6 | $420.000,00 | $2.520.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |
| 5,14 | | | | SISTEMA SÉPTICO DE 15000 LT | UN | 1 | $17.125.000,00 | $17.125.000,00 | 0,00 | $ - | - | $ - | - | $ - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TOTAL | | | | $28.476.000,00 | | | $11.837.500,00 | | $11.837.500,00 | - | $ 11.837.500,00 |
| 6 | | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | | | $ - | | | $ - | - | $ - |
| 6,01 | | | | salida lampara de emergencia | UN | 20 | $266.000,00 | $5.320.000,00 | 20,00 | $ 5.320.000,00 | 20,00 | $ 5.320.000,00 | 20,00 | $ | 5.320.000,00 |
| 6,02 | | | | salida de toma doble polo a tierra generales | UN | 15 | $122.000,00 | $2.196.000,00 | 15,00 | $ 1.830.000,00 | 15,00 | $ 1.830.000,00 | 15,00 | $ | 1.830.000,00 |
| 6,03 | | | | Salida antena de televisyon | UN | 20 | $50.000,00 | $1.000.000,00 | 20,00 | $ 1.000.000,00 | 15,00 | $ 750.000,00 | 15,00 | $ | 750.000,00 |
| 6,04 | | | | Caja llegada televisyon | UN | 1 | $320.000,00 | $320.000,00 | 1,00 | $ 320.000,00 | 1,00 | $ 320.000,00 | 1,00 | $ | 320.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $8.836.000,00 | | $8.836.000,00 | | $4.220.000,00 | - | $ | 8.220.000,00 |
| 7 | | | | ESTUCO Y PINTURAS Y ACABADOS EXTERNOS | | | | | | $ - | | $ - | - | $ | - |
| 7,01 | | | | RESANES-ESTUCO-PINTURA SOBRE SUPERFICIE EXISTENTE | M2 | 692,94031 | $20.400,00 | $14.135.982,00 | 692,94 | $ 14.135.982,00 | 623,00 | $ 12.709.200,00 | 623,00 | $ | 12.709.200,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $14.135.982,00 | | $14.135.982,00 | | $12.709.200,00 | - | $ | 12.709.200,00 |
| 8 | | | | CUBIERTA | | | | | | $ - | | $ - | - | $ | - |
| 8,01 | | | | RECORRIDO PARA MANTENIMIENTO DE CUBIERTA | M2 | 900,0 | $9.050,00 | $8.145.000,00 | 900,00 | $ 8.145.000,00 | 900,00 | $ 8.145.000,00 | 900,00 | $ | 8.145.000,00 |
| 8,01 | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJAS DE BARRO | M2 | 140,0 | $15.200,00 | $2.128.000,00 | 140,00 | $ 2.128.000,00 | 140,00 | $ 2.128.000,00 | 140,00 | $ | 2.128.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $10.273.000,00 | | $10.273.000,00 | | $10.273.000,00 | - | $ | 10.273.000,00 |
| 9 | | | | ASEO Y LIMPIEZA | | | | | | $ - | | $ - | - | $ | - |
| 9,01 | | | | ASEO Y LIMPIEZA FINAL DE OBRA | GL | 1 | $3.850.000,00 | $3.850.000,00 | 1,00 | $ 3.850.000,00 | - | $ - | - | $ | - |
| | | | | TOTAL | | | | $3.850.000,00 | | $3.850.000,00 | | $- | - | $ | - |
| 10 | | | | RETIRO DE ESCOMBROS | | | | | | $ - | | $ - | - | $ | - |
| 10,01 | | | | RETIRO DE ESCOMBROS | MD | 45 | $33.000,00 | $1.485.000,00 | 46,00 | $ 1.518.000,00 | 40,00 | $ 1.320.000,00 | 40,00 | $ | 1.320.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $1.485.000,00 | | $1.518.000,00 | | $1.320.000,00 | - | $ | 1.320.000,00 |
| 11 | | | | OTROS | | | | | | $ - | | $ - | - | $ | - |
| 11,01 | | | | TRANSPORTES | MES | 3 | $3.850.000,00 | $11.550.000,00 | 2,00 | $ 7.700.000,00 | 1,00 | $ 3.850.000,00 | 1,00 | $ | 3.850.000,00 |
| 11,02 | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA AL MONTACARGAS REF TB-12-150(12V/150AH/20HR) | UN | 1 | $1.300.000,00 | $1.300.000,00 | 1,00 | $ 1.300.000,00 | 1,00 | $ 1.300.000,00 | 1,00 | $ | 1.300.000,00 |
| | | | | TOTAL | | | | $12.850.000,00 | | $9.800.000,00 | | $5.150.000,00 | - | $ | 5.150.000,00 |
| | | | | TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | $ 137.292.482,00 | | $184.414.220,00 | | $92.292.378,00 | | $ | 92.292.378,00 |
| | | | | TOTAL COSTOS | | | | $ 137.292.482,00 | | $184.414.220,00 | | $92.292.378,00 | | $ | 92.292.378,00 |
| | | | | ADMINISTRACIÓN | | | 25% | $ 34.323.121,00 | 25% | $26.103.555,00 | 25% | $23.073.095,00 | 25% | $ | 23.073.095,00 |
| | | | | IMPREVISTOS | | | 2% | $ 2.746.850,00 | 2% | $2.088.284,00 | 2% | $1.845.848,00 | 2% | $ | 1.845.848,00 |
| | | | | UTILIDAD | | | 4% | $ 5.491.699,00 | 4% | $4.176.569,00 | 4% | $3.691.695,00 | 4% | $ | 3.691.695,00 |
| | | | | IVA SOBRE UTILIDAD | | | 0% | $ 0,00 | 0% | $- | 0% | $- | 0% | $ | - |
| | | | | COSTO TOTALPROYECTO | | | | $ 179.853.152,00 | | $136.782.628,00 | | $120.903.016,00 | | $ | 120.903.016,00 |
| | | | | SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A) | | | | $ 179.853.152 | | $ 136.782.628 | | $ 120.903.016 | | $ | 120.903.016 |
| | | | | PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA) (B) | | | | | | | | | | | |
| | | | | PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA ( C) | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C) | | | | $ 179.853.152,00 | | $ 136.782.628,00 | | $ 120.903.016,00 | | $ | 120.903.016 |
| | | | | VALOR IVA (OBRA) (E) | | | | $ - | | $ - | | $ - | | $ | - |
| | | | | VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E) | | | | $ 179.853.152,00 | | $ 136.782.628,00 | | $ 120.903.016,00 | | $ | 120.903.016 |
| | | | | REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G) | | | | | | | | | | | |
| | | | | IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H) | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H | | | | | | | | | | | |
| | | | | GESTION AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J) | | | | | | | | | | | |
| | | | | CARACTERIZACIÓN VIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | IVA CARACTERIZACIÓN VIAL | | | | | | | | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL | | | | $ 179.853.152 | | $ 136.782.628 | | $ 120.903.016 | | $ | 120.903.016 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 31% %
Utilidad 4% %

Valor Anticipo Otorgado
Valor Amortizado Presenta Acta
Valor Amortizado Acumulado

Registro Presupuestal No. 435 de Fecha 06.08.2018
Saldo del Registro
(Incluya el saldo descontando el valor de la presente acta)

**RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

| | VALOR BASICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 120.903.016,0 | $ - | $ 120.903.016,0 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS Y DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACION | | | |
| REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ - | $ - | $ - |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES | $ 120.903.016,0 | $ - | $ 120.903.016,0 |

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS: CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL DIEZ Y SEIS PESOS M/CTE

**RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)**

| G.P.P. | VALOR PRESENTE ACTA | VR. ACUMULADO |
|---|---|---|
| E | 0,00 | $ - |
| SB | 0,00 | $ - |
| B | 0,00 | $ - |
| P | 0,00 | $ - |
| OA | 0,00 | $ - |

**RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)**

| GRUPOS | VALOR PRESENTE ACTA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|
| PRELIMINARES | $ 3.562.975,00 | |
| EXCAVACIONES Y LLENOS | $ 14.224.903,00 | |
| RETIRO DE EXCAVACIONES Y SOBRANTES A SITIO DE ACOPIO | $ 772.800,00 | |
| ESTRUCTURA | $ 24.282.900,00 | |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | $ 11.837.500,00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT | 0.00 | $ - | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | $ 6.220.000,00 | |
| OV | 0.00 | $ - | ESTUCO Y PINTURAS Y ACABADOS EXTERNOS | $ 12.709.200,00 | |
| T | 0.00 | $ - | CUBIERTA | $ 10.273.900,00 | |
| | | | ASEO Y LIMPIEZA | $ - | |
| | | | RETIRO DE ESCOMBROS | $ 1.320.000,00 | |
| | | | OTROS | $ 5.150.000,00 | |
| | | | (N) Items no sujetos a ajuste | NA | NA |

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

NOTAS:

1 El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder

3 El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura

Para constancia de lo anterior firman

Firma
ASD. LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA
Ad. Residente de Obra
MP. 25790-47754 CND
ECOHABITAT SAS
Firma por Poder

Firma
Nombre: INGE ARMANDO HENAO BURGOS
Ing. Residente Interventoría
MP.:1702-20388 CLD

Firma
Nombre: ING JHON JAIRO GOMEZ ARIAS
Supervisor - Gerente de Proyectos
INTERVENTORIAS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Bogotá D.C., 29 de noviembre 2018

Señores
**INFICALDAS**
**Representante Legal**
Ciudad.

REF: Contrato IP-19-2018
**OBJETO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LAS "OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA" CONTRATISTA ECOHABITAT SAS NIT. 830.091.013-6**

Asunto: Cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

A la fecha se verifica que ECOHABITAT SAS, con contrato AC-84-2018, a la fecha ha tomado las medidas necesarias para llevar a cabo el cumplimiento del SG-SST por medio de:

- Recursos financieros, técnicos y humanos para ejecutar el SG-SST.
- Capacitaciones.
- Políticas SG-SST
- Vigilancia a las condiciones de salud de los Trabajadores.
- Identificación de Peligros y Riesgos.
- Plan de emergencias.
- Conformación de COPASST y de comité de CONVIVENCIA.
- Suministro y Control de los EPP.
- Los pagos de Seguridad social y parafiscales del presente mes.
- Inspecciones Diarias.
- Permisos de Trabajos en alturas.

Cordialmente,

**ING. ARMANDO HENAO BURGOS**
**Interventor Contrato AC-84-2018**
MP: 17202-20388 CLD

Copia. INFICALDAS. Atn. Ing. Jhon Jairo Gomez Arias. Supervisor.

Bogotá D.C., 29 de noviembre 2018

Señores
**INFICALDAS**
**Representante Legal**
Ciudad.

REF: Contrato IP-19-2018
**OBJETO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LAS "OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA" CONTRATISTA ECOHABITAT SAS NIT. 830.091.013-6**

Asunto: Cumplimiento normas Ambientales Vigentes

A la fecha se verifica que ECOHABITAT SAS, ha dado cumplimiento con la normatividad ambiental vigente concerniente al decreto 1076 de 2015 "Por medio de la cual se expide, el decreto único reglamentario, del sector ambiental y desarrollo sostenible" y resolución 0472 de 2007 "Por medio de la cual se reglamenta la gestión la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición –RCD y se dictan otras disposiciones".

Cordialmente,

**ING. ARMANDO HENAO BURGOS**
**Interventor Contrato AC-84-2018**
MP: 17202-20388 CLD

Copia. INFICALDAS. Atn. Ing. Jhon Jairo Gomez Arias. Supervisor.

Bogotá D.C., 29 de noviembre 2018

Señores
**INFICALDAS**
**Representante Legal**
Ciudad.

REF: Contrato IP-19-2018
**OBJETO:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y DE CALIDAD A LAS "OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA" CONTRATISTA ECOHABITAT SAS NIT. 830.091.013-6**

Asunto: Cumplimiento Componente Gestión Social

A la fecha se verifica que ECOHABITAT SAS, ha dado cumplimiento con la normatividad de todo lo relacionado con el componente social, en desarrollo del contrato AC-84-2018, cuyo objeto son la ejecución de **"OBRAS PARADOR TURISTICO LA ESPERANZA**

Cordialmente,

**ING. ARMANDO HENAO BURGOS**
**Interventor Contrato AC-84-2018**
MP: 17202-20388 CLD

Copia. INFICALDAS. Atn. Ing. Jhon Jairo Gomez Arias. Supervisor.

ECO HABITAT S.A.S
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

# CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Yo, **ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON.**, identificada con cédula de ciudadanía No. **52.093.561 de Bogotá D.C.**, en calidad de **Representante Legal**, manifiesto bajo la gravedad del juramento que **ECOHABITAT SAS NIT. 830.091.013-6**, ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607de 2012 y el Decreto 1828 de 2013, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la ley y/o los estatutos), durante los últimos seis (6) meses antes de la fecha de firma del presente, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Así mismo, manifestamos que actualmente estamos exonerados del pago de aportes parafiscales a favor del SENA e ICBF, de conformidad con lo previsto por la ley 1607 de 2012 en consecuencia con el decreto 0862 de 2013.

En constancia de lo anterior se Firma en la Ciudad de Bogota a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año 2018.

Cordialmente,

**ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON**
**R.L. ECOHABITAT S.A.S.**
**C.C. 52.093.561**

*"La bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov. 10:22*

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830091013-6 | ECOHABITAT SAS | Calle 76 No 11 17 -35 Local 2 | 3185556067 | gerencia@ecohabitatsas.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| 2018-11 | 2018-10 | E | 06/11/2018 | 31021559 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $4.652.900 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 400.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 205.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.300 | 7 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 814000337-1 | 31.300 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.300 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 992.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 1.042.000 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 634.000 | 5 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-4 | 59.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 59.200 | 1 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 859.200 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | | 909.800 | 2 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-28 | ARP Sura | 800256161-9 | 734.100 | | | | 734.100 | 0 | 0 | 734.100 | | | 7.341 | 734.100 | 10 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF11 | Comp Filar Caldas | 890806490-5 | 52.000 | 0 | 0 | 52.000 | 3 |
| CCF24 | Compensar Cali | 860066942-7 | 512.000 | 0 | 0 | 512.000 | 5 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 52.600 | 0 | 0 | 52.600 | 2 |

31021559

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830091013-6 | ECOHABITAT SAS | | Calle 76 No 11 17 -35 Local 2 | 3185558067 | gerencia@ecohabitatsas.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2018-11 | 2018-10 | E | 06/11/2018 | 31021559 | $4.652.900 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 3 | 636.600 | 636.600 |
| Pensión | 4 | 2.645.600 | 2.645.600 |
| Riesgos Laborales | 1 | 734.100 | 734.100 |
| CCF | 3 | 636.600 | 636.600 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 11 | 4.652.900 | 4.652.900 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830091013-6 | ECOHABITAT SAS | Calle 76 No 11 17 -35 Local 2 | 3185558067 | perencia@ecohabitatsas.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ, D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| 2018-11 | 2018-10 | E | 06/11/2018 | 31021559 | TOTAL A PAGAR | |
| | | | | | $4.652.800 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cot/Comp | Código | Extranjero | Cotiza exterior | Pensionado | SNO | INT | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1033727119 | GUZMAN VARGAS CAMILO ANDRES | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 800.000 | 176.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 800.000 | 32.000 | 14-28 | 800.000 | 5 | 96.709 | CCF11 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1057600738 | RINCON CRISTANCHO LEIDY JOHANA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.200.000 | 48.000 | 14-28 | 1.200.000 | 5 | 83.603 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1072708584 | DUARTE ZABALA ZANDRA YARA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 800.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 800.000 | 32.000 | 14-28 | 800.000 | 1 | 4.200 | CCF24 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 19331858 | SANCHEZ PARRA ORLANDO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 800.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 800.000 | 32.000 | 14-28 | 800.000 | 4 | 66.709 | CCF24 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 19455503 | SANCHEZ PARRA CARLOS ALBERTO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 373.334 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 373.334 | 15.000 | 14-29 | 373.334 | 5 | 26.009 | CCF11 | 373.334 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 52083581 | DIAZ RINCON ZANDRA MAYELY | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS008 | 5.000.000 | 200.000 | 14-28 | 5.000.000 | 1 | 26.103 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 74327254 | DIAZ PINZON JUAN DANIEL | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 373.334 | 59.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 373.334 | 15.000 | 14-28 | 373.334 | 5 | 26.009 | CCF11 | 373.334 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 79322776 | SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS008 | 5.000.000 | 200.000 | 14-28 | 5.000.000 | 5 | 346.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 94229079 | OVALLE RUIZ HECTOR | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESS018 | 781.242 | 31.300 | 14-28 | 781.242 | 5 | 84.403 | CCF56 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 94239933 | HERNANDEZ JHON | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 781.242 | 31.300 | 14-28 | 781.242 | 5 | 84.403 | CCF56 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830091013-6 | ECOHABITAT SAS | Calle 76 No 11 17 -35 Local 2 | 3185558067 | perencia@ecohabitatsas.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | 2018/10/04 | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 9 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2018-10 | 2018-09 | E | 04/10/2018 | 30435799 | 54.611.600 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

**TOTALES SALUD**

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 400.000 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 300 | 0 | 400.300 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 205.800 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 200 | 0 | 206.100 | 6 |
| ESSC18 | EPS-S Emssanar | 814000337-1 | 31.300 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 100 | 0 | 31.400 | 1 |

**TOTALES PENSIÓN**

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 1.117.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1 | 900 | 200 | 1.168.100 | 3 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 631.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 631.500 | 5 |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1 | 600 | 200 | 850.800 | 1 |

**TOTALES RIESGOS LABORALES**

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-26 | ARP Sura | 800256161-9 | 684.900 | | | | 684.900 | 1 | 600 | 685.500 | | | 6.849 | 685.500 | 8 |

**TOTALES CAJAS**

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 543.300 | 1 | 500 | 543.800 | 6 |
| CCF33 | Caja Fiar Magdalena | 891780093-0 | 31.300 | 1 | 100 | 31.400 | 1 |
| CCF56 | Comfenalco Valle | 890303093-5 | 62.600 | 1 | 100 | 62.700 | 2 |

**TOTALES PARAFISCALES**

| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

**TOTALES POR SUBSISTEMA**

| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 637.200 | 637.800 |
| Pensión | 3 | 2.648.000 | 2.650.400 |
| Riesgos Laborales | 1 | 684.900 | 685.500 |
| CCF | 3 | 637.200 | 637.900 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 10 | 4.607.300 | 4.611.600 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 830091013-6 | ECOHABITAT SAS | | Calle 76 No 11 17 -35 Local 2 | 3185558067 | gerencia@ecohabitatsas.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | B – menos de 200 c | | | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 9 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2018-10 | 2018-09 | E | 04/10/2018 | 30435799 | $4.611.600 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Ordenes | Salario | Extranjero | Cotiz. exterior | Pensionado | IRP | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | FAL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1023030391 | ROMERO SANCHEZ LAURA NATALY | 1 | 0 | | | 8 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 781.242 | 31.300 | 14-29 | 781.242 | 1 | 4.100 | CCF24 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 1033727119 | GUZMAN VARGAS CAMILO ANDRES | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 781.242 | 31.300 | 14-29 | 781.242 | 5 | 54.469 | CCF33 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1057600739 | RINCON CRISTANCHO LEIDY JOHANA | 1 | 0 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 1.200.000 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.200.000 | 48.000 | 14-29 | 1.200.000 | 5 | 83.600 | CCF24 | 1.200.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1072709504 | DUARTE ZABALA SANDRA YAIRA | 1 | 0 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 800.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 800.000 | 32.000 | 14-29 | 800.000 | 1 | 4.000 | CCF24 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 19331859 | SANCHEZ PARRA ORLANDO | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 800.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 800.000 | 32.000 | 14-29 | 800.000 | 5 | 55.700 | CCF24 | 800.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 52093581 | DIAZ RINCON ZANDRA MAYELY | 1 | 0 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS008 | 5.000.000 | 200.000 | 14-29 | 5.000.000 | 1 | 28.100 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 79322776 | SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 5.000.000 | 800.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | EPS008 | 5.000.000 | 200.000 | 14-29 | 5.000.000 | 5 | 349.000 | CCF24 | 5.000.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 84228079 | OVALLE BUÑOZ HECTOR | 1 | 0 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC18 | 781.242 | 31.300 | 14-29 | 781.242 | 5 | 54.469 | CCF56 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 84230935 | HERNANDEZ JOHN | 1 | 0 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 781.242 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS917 | 781.242 | 31.300 | 14-29 | 781.242 | 5 | 54.469 | CCF56 | 781.242 | 31.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANDREA MILENA VELANDIA SEPULVEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52707013 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 127888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS**

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Septiembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
127888-T
ANDREA MILENA
VELANDIA SEPULVEDA
C.C. 52707013
RESOLUCION INSCRIPCION 211
FECHA 2007/07/19
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ
138067

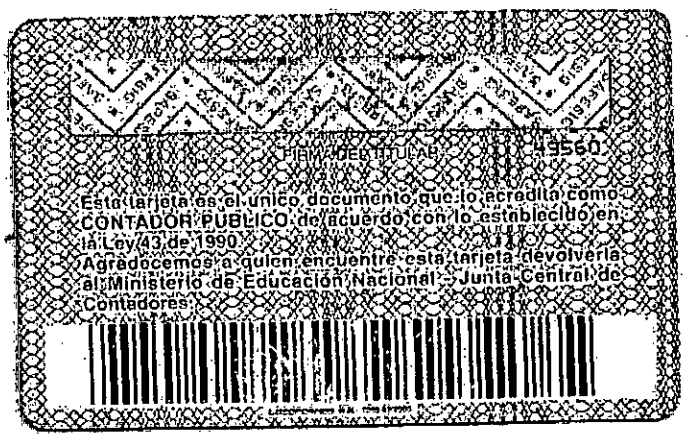

FIRMA DEL TITULAR
49560
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.707.013

VELANDIA SEPULVEDA

APELLIDOS

ANDREA MILENA

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1980

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-MAR-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500100-00006883 F-0527070133-20080425 0000161039A 1 1990007121

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 29 de noviembre de 2018, a las 18:20:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 52093561 |
| Código de Verificación | 5209356118112918 2020 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 29 de noviembre de 2018, a las 18:19:54, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 79322776 |
| Código de Verificación | 7932277618112918l954 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

# LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

## CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 29 de noviembre de 2018, a las 18:18:01, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|---|---|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 8300910136 |
| Código de Verificación | 8300910136181129181801 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 118590403

WEB
18:30:14


Bogotá DC, 29 de noviembre del 2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ECOHABITAT S.A.S. identificado(a) con NIT número 8300910136:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO
## No. 118590531

WEB
18:33:24


Bogotá DC, 29 de noviembre del 2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79322776:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

# CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

## CERTIFICADO ORDINARIO No. 118591196

WEB
18:49:25


Bogotá DC, 29 de noviembre del 2018

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ZANDRA MAYELY DIAZ RINCON identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 52093561:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

**ATENCIÓN :**
**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

ntecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO INSTITUCIÓN CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 18:50:09 horas del 29/11/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **52093561**
Apellidos y Nombres: **DIAZ RINCON ZANDRA MAYELY**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Volver al Inicio

Carrera 7ª Nº 10 - 41 (Palacio de Nariño) Bogotá DC

/antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO INSTITUCIÓN CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

**Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales**

**La Policía Nacional de Colombia informa:**
Que siendo las 18:51:28 horas del 29/11/2018, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79322776**
Apellidos y Nombres: **SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Volver al Inicio

ECO HABITAT S.A.S
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

Bogotá, 25 de octubre de 2018

Ingeniero
**ARMANDO HENAO BURGOS**
Manizales

**ASUNTO:** **RESPUESTA OBSERVACIONES BALANCE INICIAL CONTRATO DE OBRA A.C 84-2018 - OBRAS PARADOR TURISITICO LA ESPERANZA**

Respetado Ingeniero:

Atendiendo sus observaciones referentes al Balance preliminar del contrato que enviamos ayer, me permito precisar lo propio en los siguientes términos:

Inicialdas abrió un proceso de contratación publica sobre unos ítems genéricos, los cuales en su mayoría a nuestro juicio, no reflejan con claridad las especificaciones técnicas y condiciones de trabajo, que son necesarias para precisar el costo de los mismos y en consecuencia, una vez efectuado el trabajo de condiciones del lugar y necesidades prioritarias a atender, el resultado que se obtiene es que es mayor en valor y actividades las obras prioritarias necesarias no contempladas en el contrato, las mismas que se plasmaron como ítems en el contrato que nos vincula; al respecto nos referiremos así:

1. **PRELIMINARES:**

En este capítulo, consideramos que no es necesario ejecutar el ítem de instalación provisional de campamento, el ítem de cerramiento se reduce al 50% exclusivamente para las áreas de excavación, el ítem de localización y replanteo que no hace parte del contrato, requiere de ejecución, considerando los trabajos de instalación de tubería y del sistema externo de tratamiento.

El valor de los respectivos ítems y cantidades se reflejan en el balance enviado.

2. **EXCAVACIONES Y RELLENOS:**

En este capítulo, adicional a los ítems contratados se considera un nuevo ítem, que corresponde al relleno en recebo compactado que debe instalarse en el fondo del foso donde se instalara el tanque septico, la trampa de grasas y las cajas de inspección, lo mismo que las zanjas para el tendido de la red sanitaria externa. Es importante precisar, que se contrató un ítem genérico llamo excavaciones material comun de 0-2m obedeciendo muy seguramente a la excavación del foso donde se instalara el tanque septico, sin embargo, no se contempló la excavación y retiro de material necesario en la bocatoma para construir la contención de los dos costados de la misma excavación que por su ubicación y rigurosidad



Calle 76 No. 11 - 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

debe tener un precio superior al pactado en el ítem, no obstante, decidimos al efectuar los cálculos mantener para esta actividad el valor de excavación pactado; lo mismo para el ítem de rellenos compactados con material del sitio.

El valor de los respectivos ítems y cantidades se reflejan en el balance enviado.

**3. RETIROS DE SOBRANTES A SITIO DE ACOPIO:**

Sobre este capítulo se consideró de acuerdo a los cálculos la cantidad de material que estrictamente se requiere de retiro y acopio.

El valor de los respectivos ítems y cantidades se reflejan en el balance enviado.

**4. ESTRUCTURA:**

La Entidad contrato este capítulo, en términos genéricos, como concreto de resistencia 21MPA y acero 420MPA, las cantidades de estos ítems, de igual manera no se sabe de donde salieron ya que no existe un diseño sobre el cual se pueda corroborar dichas cantidades. Al momento de realizar la visita de pre-construcción y el recorrido adelantado con interventoría, el 17 de octubre, fecha de inicio de obra, se nos informó que era necesario, ejecutar en la bocatoma un trabajo de contención debido a los deslizamientos que habían ocurrido en este lugar, adicionalmente a la construcción del tanque de captación, según esquema obra de control entregado por el interventor

Al no existir diseños y ante la limitación de recursos, nuestra empresa recomienda, construir la contención en gaviones de 1x1x2 a una longitud en cada costado según se pudo corroborar de 15m, mediante sistema escalonado; la contención alcanzara una altura de 2m.

Las especificaciones de este ítem, lo mismo que las cantidades y valor, aparecen en el balance.

Sobre El concreto contratado y el acero, manifestamos que la cantidad que aparece en el balance, refleja solamente la cantidad para la obra de captación en la bocatoma, las tapas de la trampa de grasas y caja de inspección y la placa del lecho de lodos. Igual que con el ítem de hierros.

**5. INSTALACIONES HDROSANITARIAS:**

Es pertinente considerar que la Entidad no entrego un diseño, sobre el cual estén soportadas las cantidades de los ítems de este capítulo, sin embargo, nuestra Empresa de común acuerdo con el interventor propuso un trazado perimetral descolgado bajo placa con pendientes del 3% al 4%, definiendo que la red principal sanitaria, que conecta, sanitarios y orinales se construirá en diámetro de 6" y la red principal que conducirá las aguas de lavamanos, duchas y cocina se construirá en 4" hasta su descarga en la trampa de grasas, estas tuberías, serán fijadas bajo placa, mediante abrazaderas metálicas de graduación vertical, que se instalaran cada 1.5m en su recorrido acorde con recomendación técnica.

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

El ítem de trampa de grasas en fibra de vidrio, no se ejecutara acorde con lo definido con el interventor, modificándose el mismo, para construir, una trampa de grasas de doble compartimento, en bloque de cemento con grouting y pañete impermeabilizado, cuyas cantidades y valor aparecen en el balance, el ítem de cámaras de inspección de 60x60 no se ejecutara y en su reemplazo se construirán cajas de inspección en bloque de cemento con grouting y pañete impermeabilizado de 1mx1m.

El ítem de sistema séptico de 16.000 litros acorde con lo definido por el interventor, no se ejecutara, y en reemplazo del mismo se adelantara la utilización del tanque existente, lo que requiere de evacuación de su contenido con vactor, excavación para sacado del mismo y reinstalación del mismo en el nuevo foso, las cantidades y valores de estos trabajos están, incorporados en el balance entregado. Llamamos la atención sobre la necesidad de construir y/o modificar el lecho de lodos existente, ya que este, está mal construido y por ende no funciona y no le aporta al tren de proceso de tratamiento.

6. **INSTALACIONES ELECTRICAS:**

Sobre este capítulo, no tenemos objeción, solamente requerimos precisión del sitio donde se ejecutara cada ítem.

7. **ESTUCOS, PINTURA Y ACABOS EXTERNOS:**

En este capítulo, es necesario, considerar que en lo que respecta a pintura, se contrataron metros cuadrados y en el sitio se requiere de la ejecución de una buena cantidad de metros lineales que requieren de medición y pactar precio.

8. **CUBIERTA:**

Sobre este capítulo, manifestamos que realizada la inspección solamente programamos adelantar 100 m2 de cambio de teja de barro.

Sobre los demás capítulos e ítems del contrato no tenemos objeción.

Ahora bien, el interventor y la arrendataria del lugar, manifestaron la necesidad de suministrar e instalar push de descarga para los sanitarios, cambio de sifones para lavamanos y orinales y cambio de biscocho para los sanitarios, sobre este particular informamos que adelantadas las consultas con cerámica Italia, proveedor de los aparatos instalados, manifestó, que la línea de aparatos sanitarios, con que cuenta el parador turístico la esperanza, esta descontinuada desde hace 7 años aproximadamente y por ende en el mercado no se consiguen los push y al adaptarle otra marca no funciona. En consecuencia de lo anterior sugerimos, el suministro e instalación de sanitarios nuevos de línea comercial (Producto Nacional). Se debe tomar la decisión con prontitud al respecto del alcance sobre este particular.

Adelantamos la inspección del área de cocina, encontrando que esta área no cumple con la normatividad mínima sanitaria para la preparación de alimentos; por este hecho dimensionamos los traslados de mesones de lavaplatos, y la ejecución de la actividad de enchape cerámico de muros y construcción de media caña en granito pulido.

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

Se debe tomar la decisión a la mayor brevedad posible, sobre estos trabajos, cuyo valor y cantidades, están reflejados en el balance entregado.

Como se mencionó en alguna parte de este documento, nuestra empresa, adelanto la reubicación del sistema séptico de tratamiento anaeróbico, conformado por, punto de descarga, trampa de grasas, cajas de inspección, tanque séptico, sedimentador, línea de conducción, lecho de secado de lodos, y campo de infiltración, esta reubicación se hizo para lograr que el sistema funcione adecuadamente y la línea de conducción hasta el campo de infiltración permita una pendiente entre el 6% y 9%.

Se debe considerar que el esquema planteado por nuestra empresa, mantiene y reutiliza el mayor tramo de conducción hasta donde se deberá construir el campo de infiltración.

Llamamos la atención, sobre el hecho de que el sistema, deberá construirse y funcionar técnica y ambientalmente en todos sus componentes, ya que de lo contrario, la trazabilidad no funcionaria, sometiéndose al riesgo de sanciones por contaminación por vertimientos.

Las cantidades, especificaciones y valores aparecen en el balance remitido.

**SOBRE LO OBSERVADO POR USTED AL BALANCE:**

- Instalación Iluminacion Externa: Se atiende la instrucción de no instalarla.
- Elementos Trabajo en alturas: Atendiendo su observación efectuamos el descuento de 1 millón de pesos, constatado en balance adjunto.
- Transporte Trasiego a hombro de Hombre: Este valor disminuye, dada la instrucción de eliminar el ítem de gaviones.
- Construcción de Muros Gaviones: Debemos manifestar que esta obra fue planteada junto con el interventor en obra y que por instrucciones del mismo procedemos con la eliminación de la actividad dentro del balance.
- Suministro e instalación: Se acoge parcialmente las observaciones de ejecución, dado que solo se disminuye la cantidad contemplada para la ejecución de gaviones, se mantiene la cantidad, a utilizar en el campo de infiltración.
- Trampa de Grasas: No se comparte dicha observación y el precio se mantiene, dadas las especificaciones, medidas, y condiciones del sitio, bajo las cuales dicha trampa se construirá.
- Cajas de Inspección: No se comparte dicha observación y el precio se mantiene, dadas las especificaciones, medidas, y condiciones del sitio, bajo las cuales dichas cajas se construirán.
- Construcción Lecho de Secado de Lodos: Como lo mencionamos anteriormente, esta obra debe ser ejecutada para que el sistema de vertimiento de aguas residuales, funcione de manera correcta y cumpliendo normatividad técnica-ambiental, de lo contrario no se garantiza la funcionalidad de dicho sistema.
- Diseño de sistema Aeróbico: Debemos manifestar que, referente a su observación no compartimos dicho concepto, esto, teniendo en cuenta que la Entidad no entrego diseños, dimensionamientos, especificaciones, ni cálculo de cantidades, actividades, que no están contempladas dentro de nuestro contrato y que se deben ejecutar para el buen desarrollo y trazabilidad del mismo, así mismo, manifestamos y como usted bien sabe, toda actividad profesional debe ser retribuida. Por ende mantenemos nuestro cobro, realizando un descuento al mismo.
- Trabajos Área Cocina: Reiteramos y manifestamos, que los trabajos descritos para esta área y enmarcados dentro del balance enviado, son prioritarios para el cumplimiento de



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

normatividad sanitaria, para espacios donde el uso es la manipulación de alimentos, mas sin embargo dada su instrucción, esta es atendida y se elimina dicho ítem.

- Trabajos Área Baños Hombres y mujeres: Se atiende su instrucción de eliminación de ítems de, mantenimiento de área de lava traperos, donde referenciamos que las condiciones actuales implican riesgo para las personas que hacen uso del mismo, también se atiende la no ejecución de luminarias y la no ejecución de suministro e instalación de sanitarios nuevos, para este último reiteramos que él no ejecutarse implica que se mantengan los sanitarios existentes en la condición que se encuentran actualmente, dado que las piezas a cambiar para su buen funcionamiento ya no existen en el mercado.

Cabe resaltar, que para abrir los nuevos frentes de obra requeridos; es necesario la aprobación y legalización del balance adjunto al presente documento. Por ende solicitamos a la entidad se tramite lo pertinente.


Cordialmente,

**Arq. Luis Alfonso Sanchez Parra**
**Residente de Obra**
**Gerente de Proyectos**
**ECOHABITAT SAS**


ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

**INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE CALDAS**
**CONTRATO DE OBRA AC-84-2018**
"OBRAS MANTENIMIENTO PARADOR TURÍSTICO LA ESPERANZA"

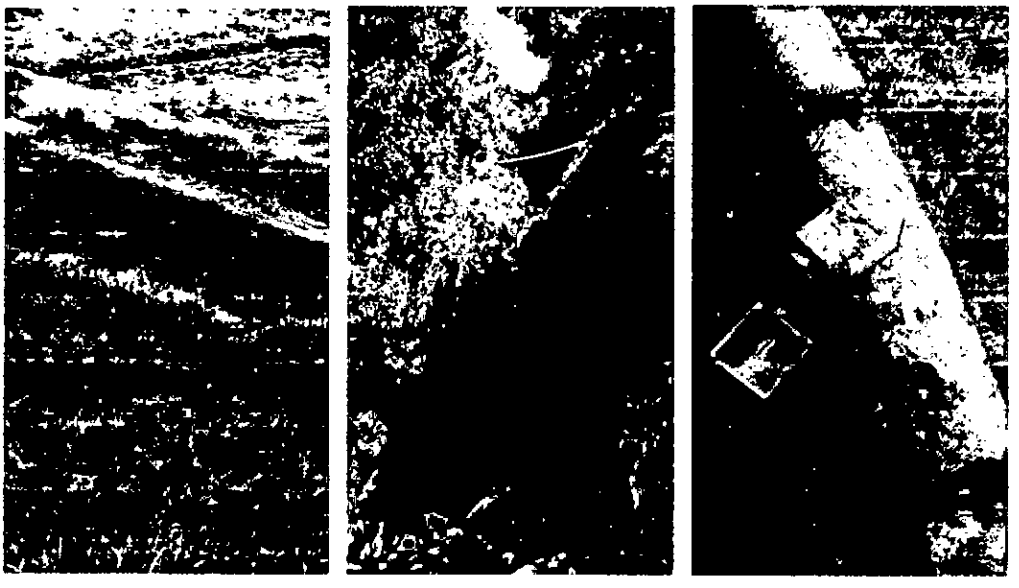

**DESCRIPCION:** Trabajos de localización y replanteo, instalaciones sépticas existentes.

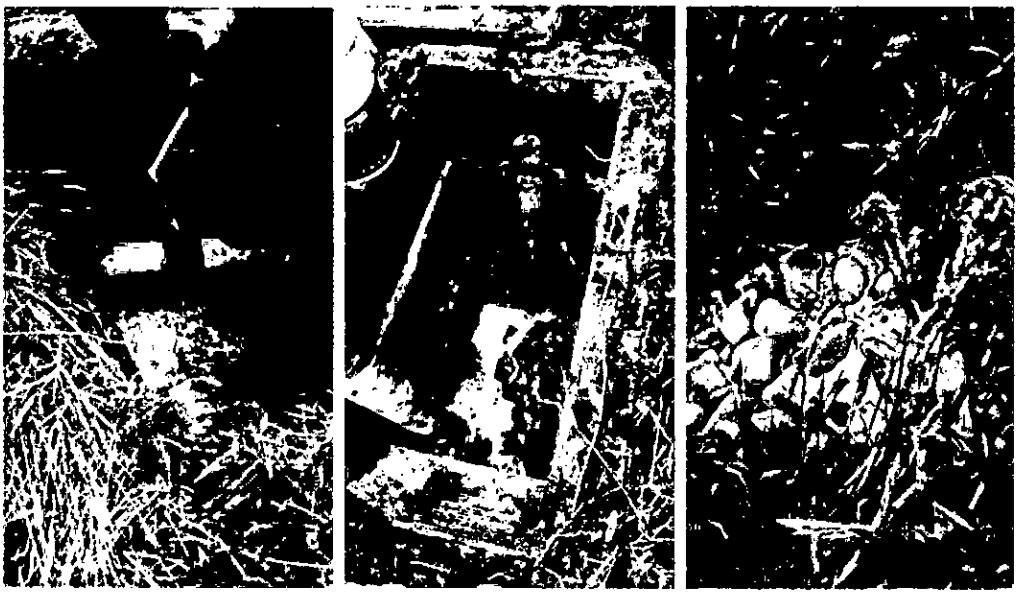


**DESCRIPCION:** Trabajos de localización y replanteo, instalaciones sépticas y sanitarias existentes. *bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov. 10:22*

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

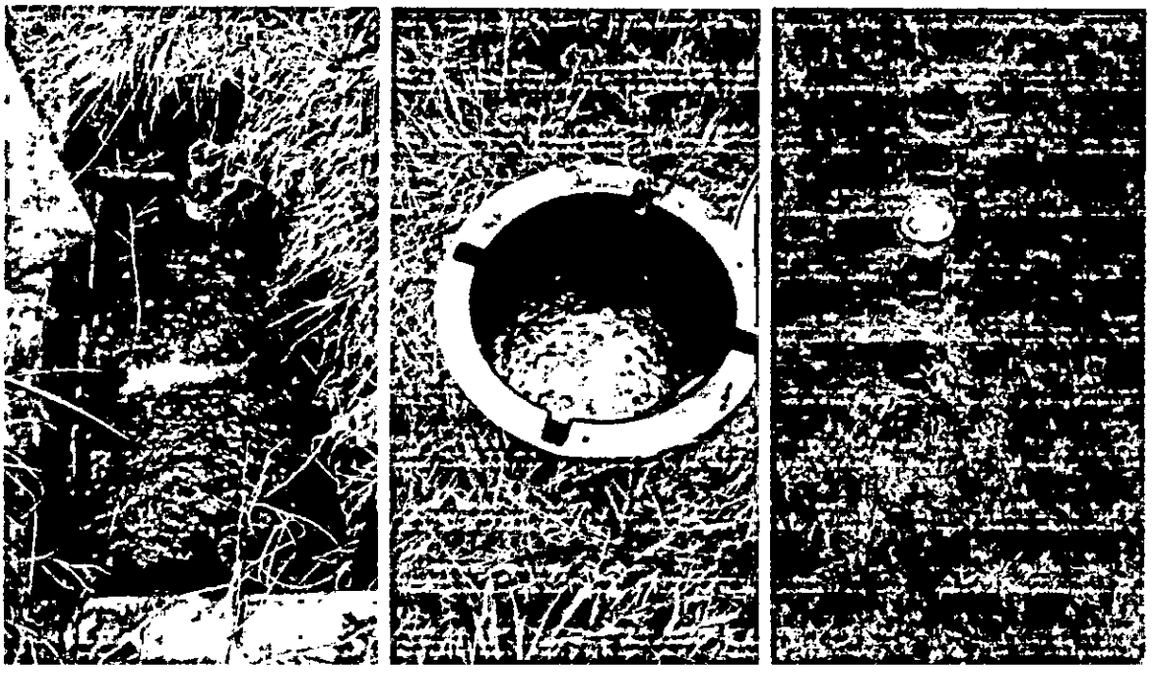

**DESCRIPCION:** Trabajos de localización y replanteo, instalaciones sépticas existentes.

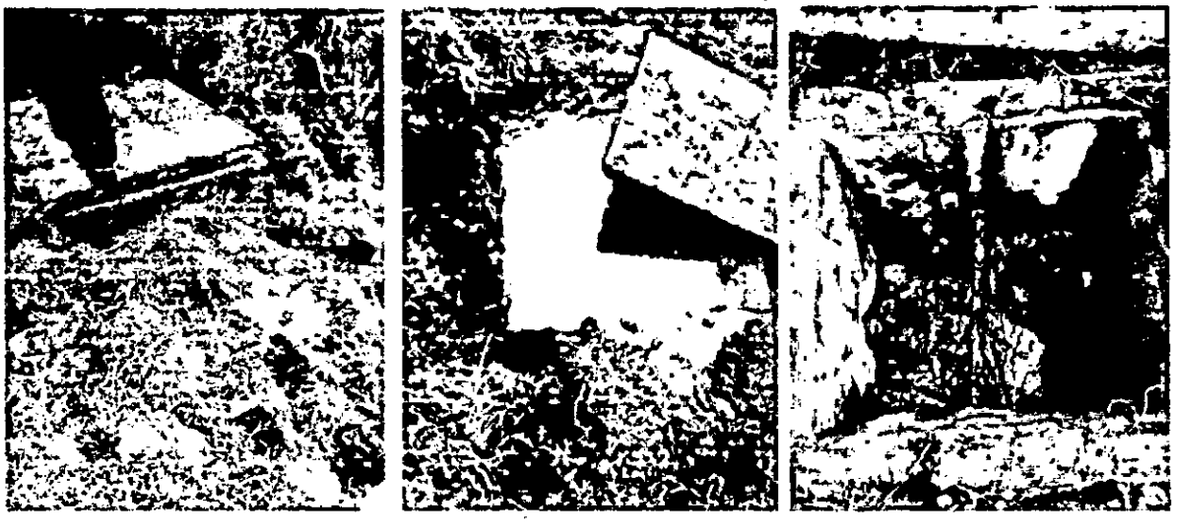

**DESCRIPCION:** Trabajos de localización y replanteo, instalaciones sépticas existentes.

*"La bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov. 10:22*

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

"La bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov. 10:22

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos de construcción cajas de inspección y trampa de grasas para sistema séptico nuevo.



**DESCRIPCION:** Trabajos de construcción cajas de inspección y trampa de grasas para sistema séptico nuevo.




**Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2**
**Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.**
**Telefax: +571 8965907**
**Celulares: 3108573157-3185558067**


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

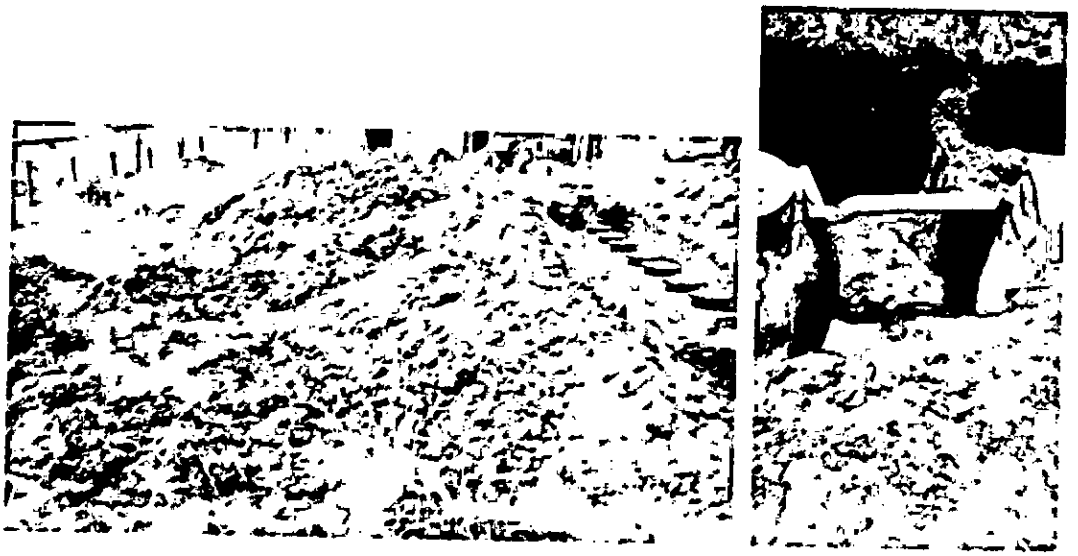

**DESCRIPCION:** Trabajos de excavación para traslado de tanque séptico.

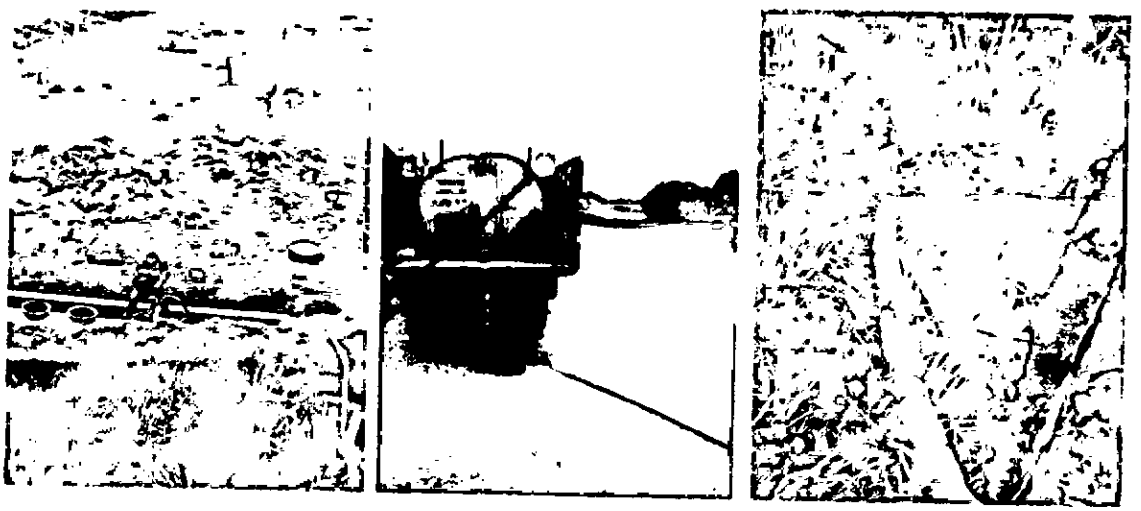

**DESCRIPCION:** Trabajos de vaciado con sistema vactor y disposición final de residuos de tanque séptico.




Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES GO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

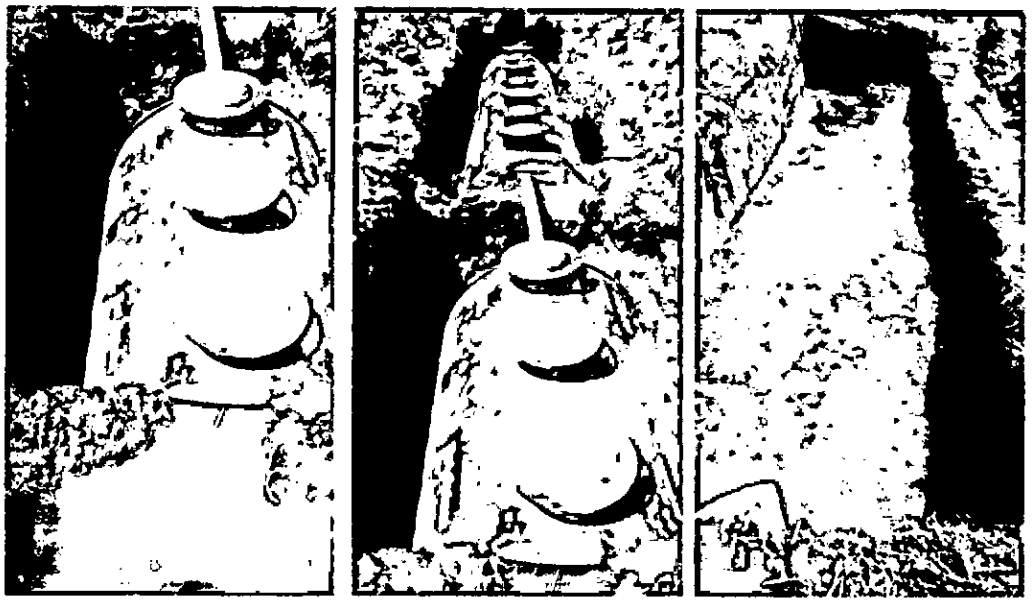

**DESCRIPCION:** Trabajos de excavación para traslado de tanque séptico.

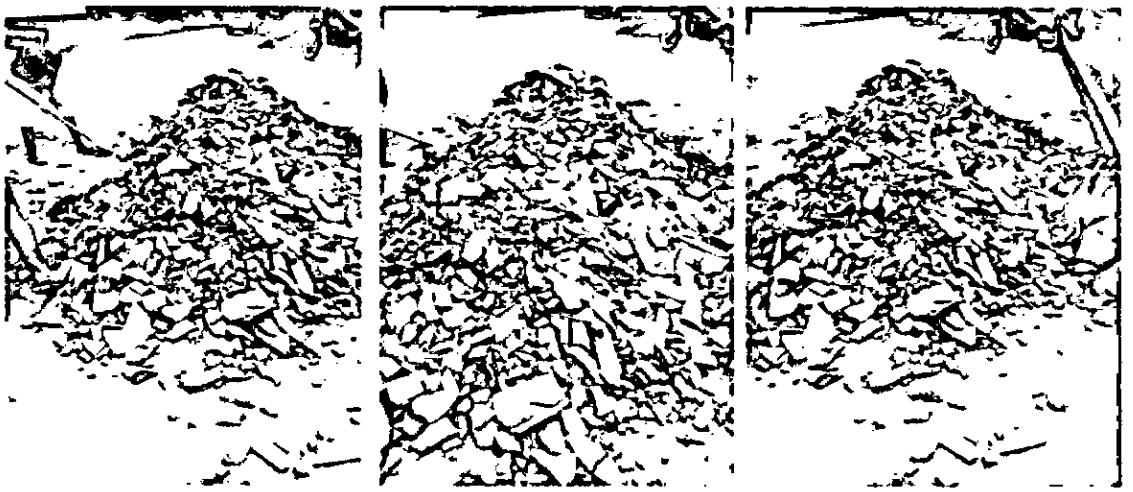

**DESCRIPCION:** Trabajos de traslado de escombros y disposición final de los mismos.



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos de adecuaciones de áreas sótano, verificación redes existentes.

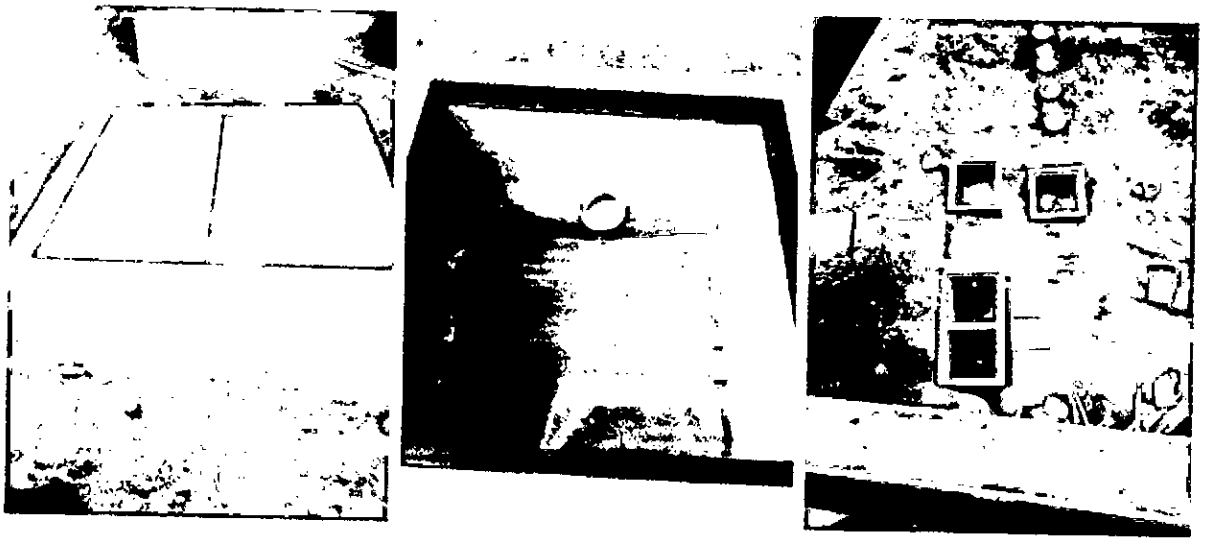

**DESCRIPCION:** Trabajos de construcción cajas de inspección y trampa de grasas sistema séptico nuevo.


*"La bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov 10:22*

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

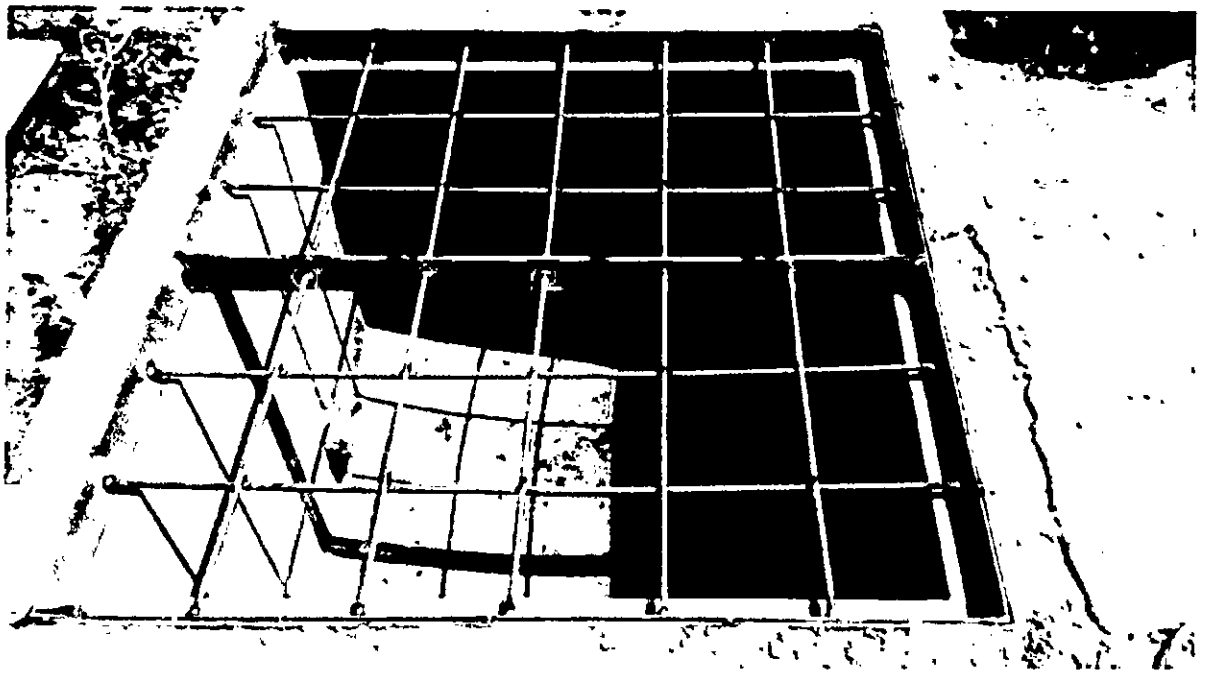

**DESCRIPCION:** Trabajos de carpintería metálica tapas trampa de grasas y cajas de inspección.

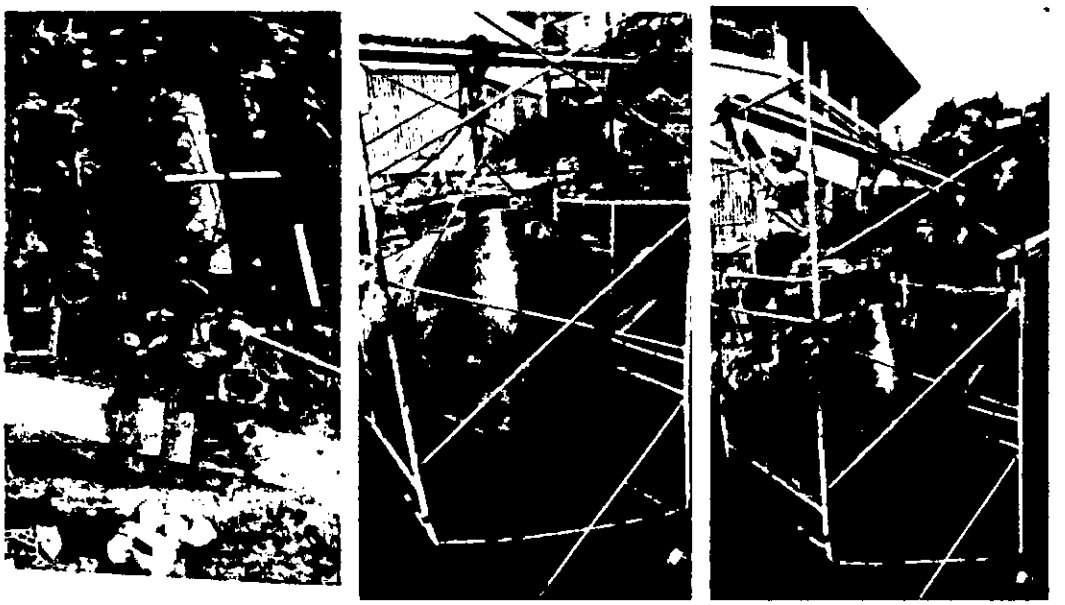

**DESCRIPCION:** Trabajos de traslado y reubicación tanque séptico de 15.000 lts, para sistema séptico nuevo.


*"Bendición del Señor es la que enriquece, y El no añade tristeza con ella" Prov. 10:22*

Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

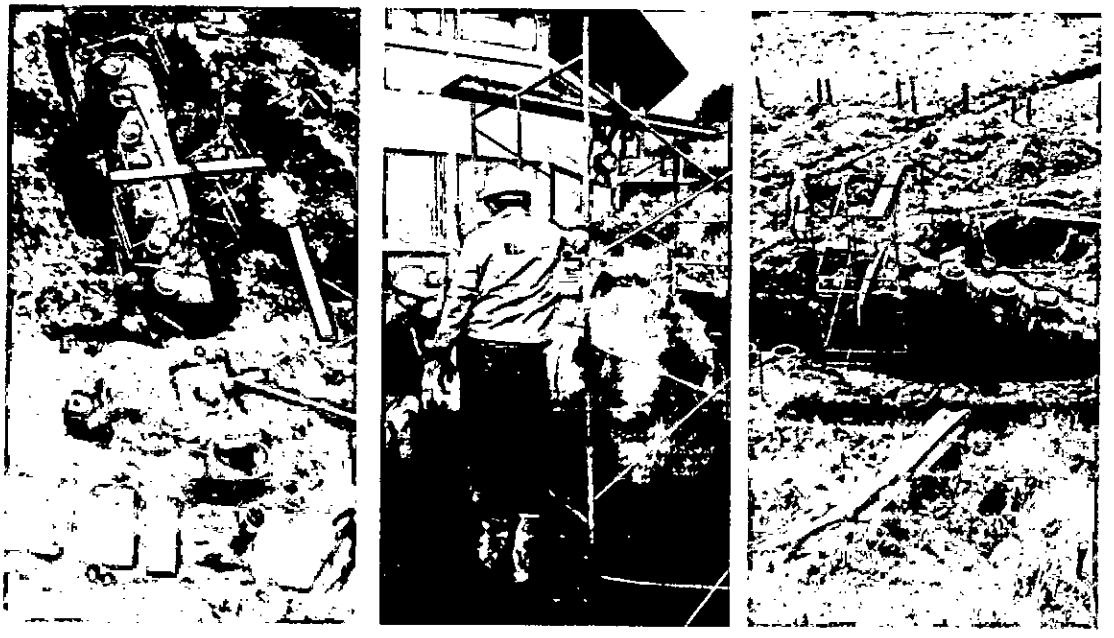

**DESCRIPCION:** Trabajos de traslado y reubicación tanque séptico de 15.000 lts, para sistema séptico nuevo.



**DESCRIPCION:** Trabajos de sustitución suelo para fondo de tanque, conformado por capa de lecho de piedra de rio, recebo compactado, geotextil no tejido, otra capa de recebo.



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos de sustitución suelo para fondo de tanque, conformado por capa de lecho de piedra de rio, recebo compactado, geotextil no tejido, otra capa de recebo.

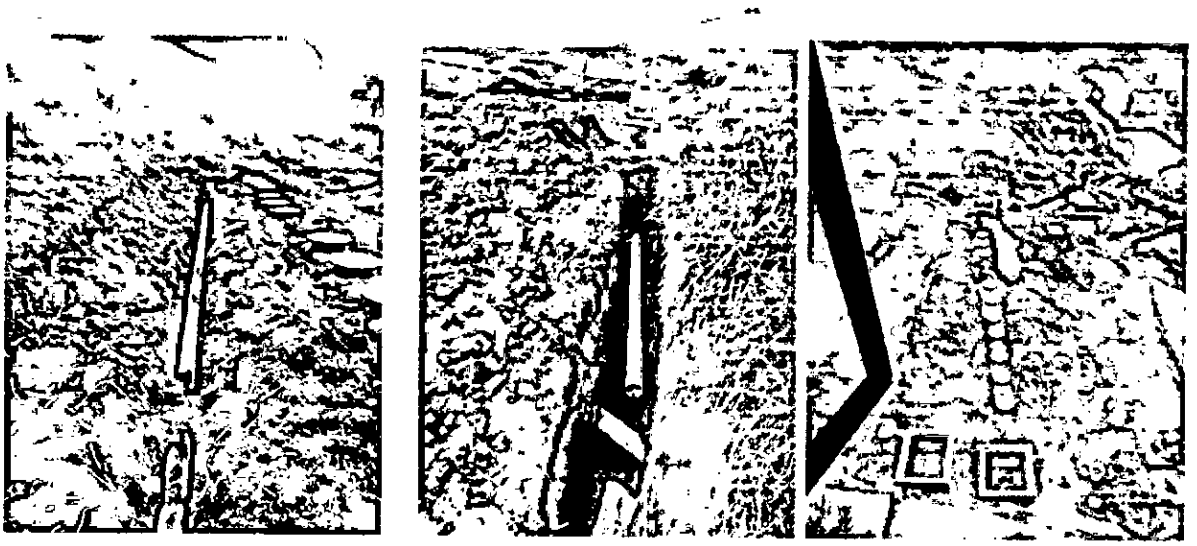

**DESCRIPCION:** Trabajos de rellenos en material común y construcción filtro por alto nivel freático.




Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES ECO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

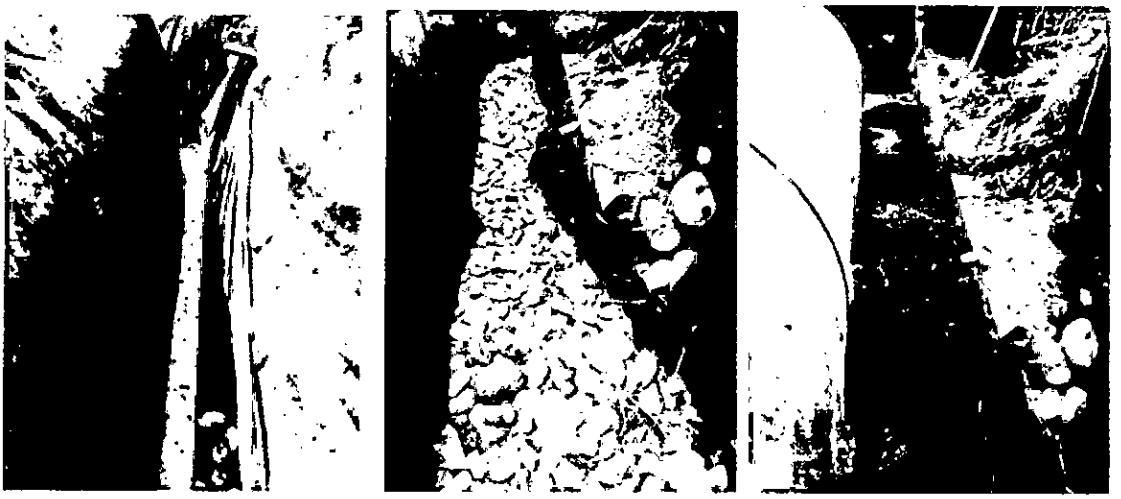

**DESCRIPCION:** Trabajos construcción filtro con material filtrante piedra de rio, geotextil no tejido y tubería sanitaria perforada, por alto nivel freático.

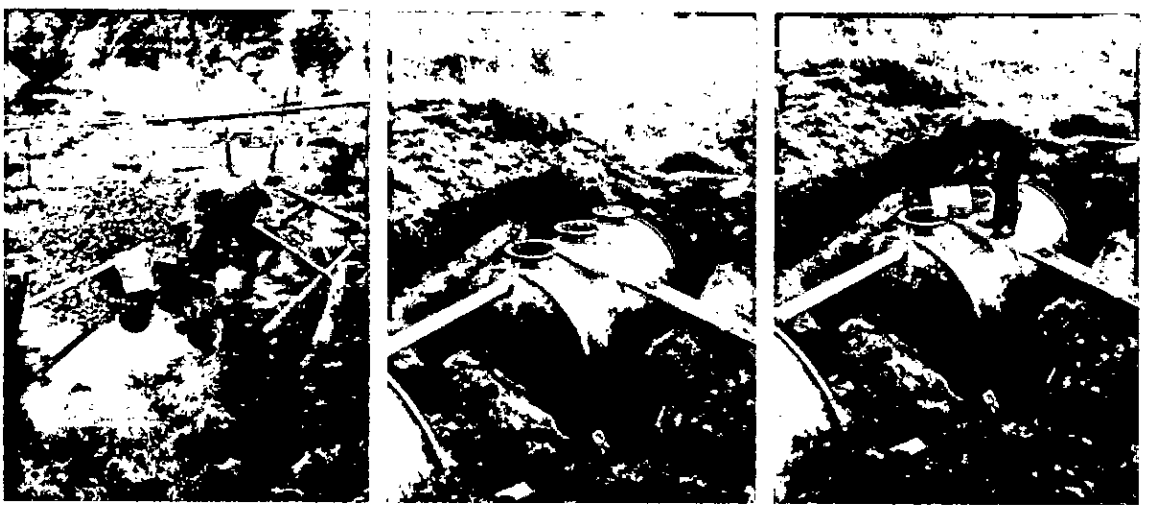

**DESCRIPCION:** Trabajos de vaciado tanque de filtración, remoción piedra filtrante, limpieza y llenado de tanque con la misma.



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos de vaciado tanque de filtración, remoción piedra filtrante, limpieza y llenado de tanque con la misma.



**DESCRIPCION:** Trabajos construcción filtro con material filtrante piedra de rio, geotextil no tejido y tubería sanitaria perforada, por alto nivel freático.



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos construcción redes sanitarias externas.

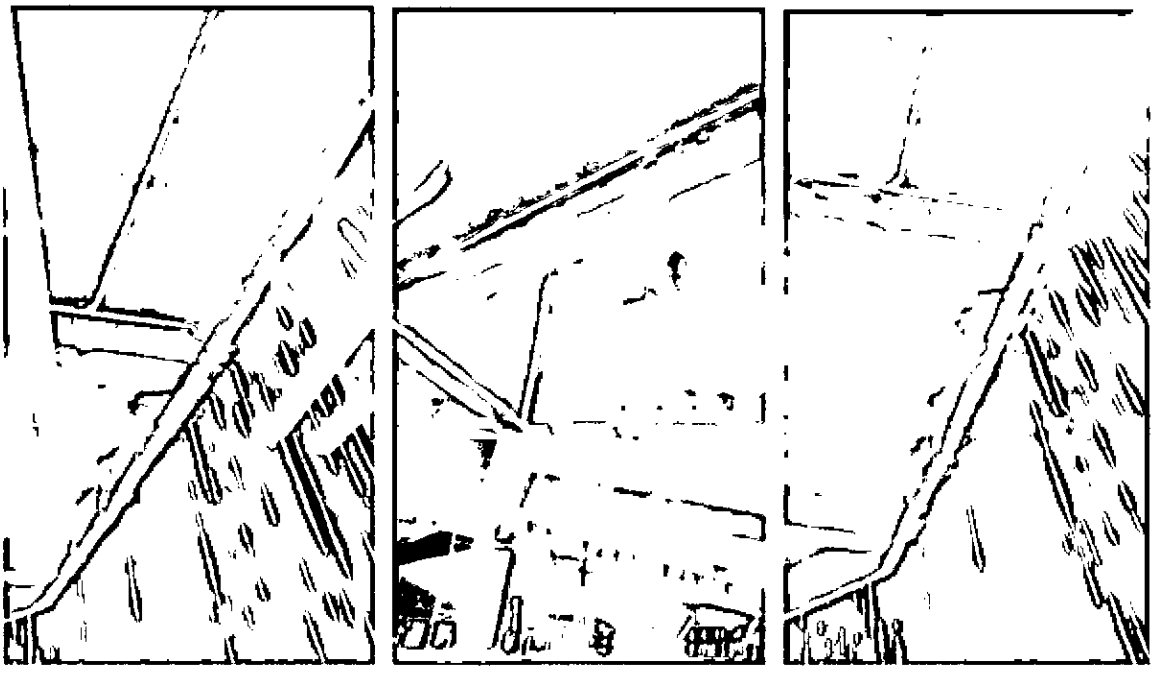

**DESCRIPCION:** Trabajos construcción redes sanitarias internas.




Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067


LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com

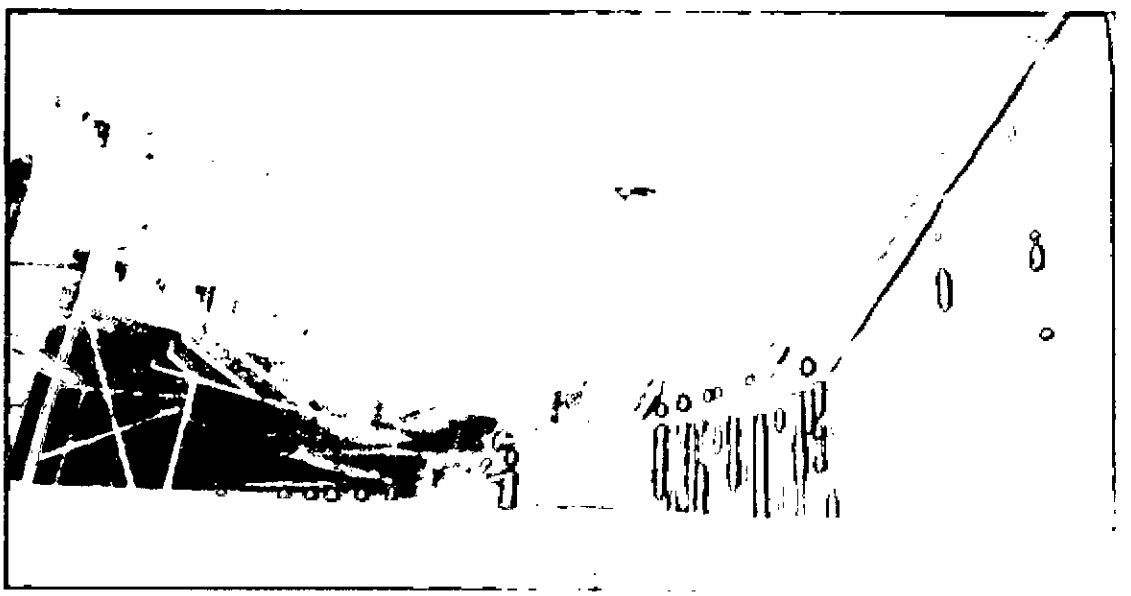

**DESCRIPCION:** Trabajos construcción redes sanitarias internas.

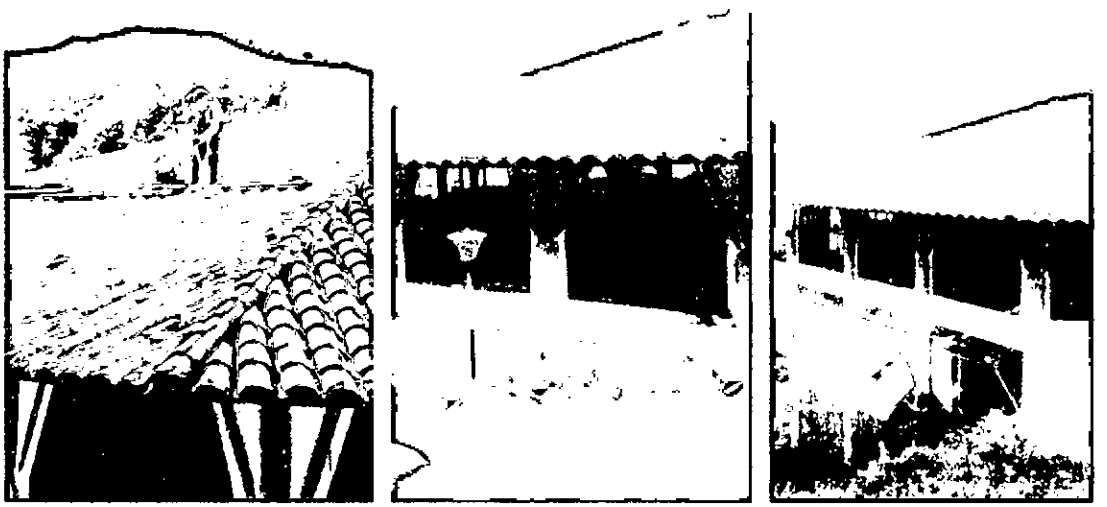

**DESCRIPCION:** Trabajos de mantenimiento cubierta, el cual consiste en limpieza de tejas de barro y sustitución de tejas deterioradas y/o rotas.



Calle 76 No. 11- 17 / 35 local 2
Edificio Torre Los Nogales, Bogotá D.C.
Telefax: +571 8965907
Celulares: 3108573157-3185558067

LA RESPUESTA ES CO COLOMBIA

ECO HABITAT s.a.s
CONSTRUIMOS UN MEJOR AMBIENTE

www.ecohabitat.com.co
constructora@ecohabitatsas.com
proyectos@ecohabitatsas.com
constructora.ecohabitat@gmail.com
contabilidad@ecohabitatsas.com



**DESCRIPCION:** Trabajos de mantenimiento cubierta, el cual consiste en limpieza de tejas de barro y sustitución de tejas deterioradas y/o rotas.

**Entrega**

**Arq. LUIS ALFONSO SANCHEZ PARRA**
**Residente de Obra**
**ECOHABITAT SAS**

Banco Caja Social

*HACE CONSTAR*

*Que el(los) cliente(s):*

***ECOHABITAT SAS*** *Identificado con* *NI8300910136*

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0114 CENTRO COMERCIAL NIZA, con las siguientes características:

***CUENTA DE AHORROS PYME***

| | | |
|---|---|---|
| *Número* | : | *24044103835* |
| *Fecha de Apertura* | : | *15 de abril de 2014* |
| *Condiciones de Manejo* | : | *Individual,1 Firmas(s), 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector* |
| *Estado* | : | *CUENTA ACTIVA* |

Esta constancia se expide con destino a: QUIEN INTERESE
Realizada en la oficina 0114 CENTRO COMERCIAL NIZA de la ciudad de BOGOTA, el día jueves, 23 de agosto de 2018.

Cordialmente,

***Efectuado por:***
L0B9M0A6 - LEIDY JOHANNA BARRERA MOLINA

Banco Caja Social S.A. 23 AGO 2018 AUTORIZADO

***FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS***

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social Establecimiento Bancario
