AUGUSTO TELLEZ AYALA

Factura Electrónica de Venta AUT - 51

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764043682429 de 31/01/2023 - 31/07/2023 autoriza AUT-38 a AUT-1000

AUGUSTO TELLEZ AYALA NIT 7553741
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/05/2023 10:13
Fecha de Vencimiento	06/12/2022 10:13
Fecha de Validación	10/05/2023 10:13
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AUGUSTO TELLEZ AYALA
CC	7553741
Obligación	IVA
Email	atain1012@yahoo.com
léfono	3157805442
Dirección	BRR VILLA JIMENA MZ 1 CA 9 ET 2
Ciudad, Depart.	ARMENIA, QUINDIO (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	MUNICIPIO DE CHINCHINA
NIT	890801133
Obligación	IVA
Email	hugot_asesor@hotmail.com
Teléfono	8402380
Dirección	CR 8CALL 11 CL ESQ
Ciudad, Depart.	CHINCHINA, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	41	ACTA DE REINICIO CONTRATO OBRA PUBLICA #562 CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS	1.0	EA	$19,098,227.00	IVA 0%	$19,098,227.00	$19,098,227.00
2	41	ADMINISTRACION ACTA REINICIO CONTRATO 562 CONSTRUCCION HUELLAS 23%	1.0	EA	$4,392,592.21		$4,392,592.21	$4,392,592.21
3	41	ACTA NRO UTILIDAD CONTRATO562 5%	1.0	EA	$954,911.35		$954,911.35	$954,911.35

3

Subtotal	$24,445,730.56
Total a Pagar	$24,445,730.56

idades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 522156f369736bebb3c87cfa8d95edbc750f17603ffc407e47fcb815625913cccd447174570e03c6de0f3166c4d25225
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

ACTA DE PAGO FINAL	
CONTRATO	Contrato de obra pública No. 562 de 2022
OBJETO	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".
CONTRATISTA	AUGUSTO TELLEZ AYALA IDENTIFICADA CON C.C. No. 7553741 DE ARMENIA (QUINDÍO)
CONTRATANTE	Administración Municipal de Chinchiná Representada Legalmente por el Dr. EDUARDO ANDRES GRISALES LOPEZ.
SUPERVISOR	ALBERTO URIBE VARON JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA.
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO PARA EFECTOS FISCALES EN LA VIGENCIA DEL AÑO 2023 SE ESTIMA EN LA SUMA DE **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($152.317.440).** IDENTIFICAN EL **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 11436** DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022, RUBRO 2.2.3.2.01.01.001.03.02 Autopistas, carreteras, calles CONV 1189 PLACA HUELLA, **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 22864** DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR ADICIÓN	EL VALOR DE LA ADICIÓN ES LA SUMA DE **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($7.682.560).** IDENTIFICAN EL **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): 30777** DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2023, RUBRO 16.04.2.3.2.01.01.001.03.02.24.004 Convenio 1189 Placa Huellas Sec Infraestr Depto, **REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): 41048** DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($160.000.000).**
VALOR DEL ACTA 1	SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS ($60.213.152). MCTE
VALOR DEL ACTA 2	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($75.341.117,44). MCTE
VALOR DEL ACTA FINAL	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($24.445.730,56). MCTE
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	15 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE REINICIO	28 DE MARZO DE 2023

PRORROGA	20 DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	03 DE MAYO DE 2023

En el mes de mayo de 2023 en la ciudad de Chinchiná (Caldas), en las instalaciones del Palacio Municipal, se reunieron el contratista y el supervisor, con el objeto de realizar acta de supervisión para el pago final del Contrato de obra pública No. 562 de 2022, con las siguientes especificaciones:

DESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**
1) Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos, invitación publica y el contrato, los cuales forman parte esencial del contrato; fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.	1) Se cumplió con el objeto y alcance del concreto de acuerdo con los estudios y documentos previos, invitación publica y el contrato, además de todos los documentos que hicieron parte del proceso.
2) Realizar ensayo de densidad en el sitio al material granular instalado.	2) Se realizaron los ensayos de densidad respectivos.
3) Realizar ensayo de concreto para placa pavimentos.	3) Se realizaron los ensayos de concretos correspondientes.
4) Instalar una valla informativa sobre la existencia de la obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas que le suministre el Municipio de Chinchiná.	4) Se realiza instalación.
5) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de la obra, diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: ingreso del personal, horarios de trabajo o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	5) Se adelantaron las gestiones necesarias para el ingreso del personal, horarios de trabajo e intervención del sitio de ejecución
6) Reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interventor, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad	6) Hasta el momento no se han detectado este tipo de actividades.

Para su aprobación se firma en Chinchiná en el mes de mayo de 2023 por los que en ella intervinieron.

ALBERTO URIBE VARON JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	**AUGUSTO TELLEZ AYALA** Contratista

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ACTA
5/05/2023

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

ACTA No. 3 (FINAL)

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	562 de 2022
CONTRATISTA:	AUGUSTO TELLEZ AYALA	**FECHA DE INICIO:**	18/11/2022
SUPERVISOR	ARQ. ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	**PLAZO FINAL:**	3/05/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			(+) Mayores Cantidades		(-) Menores Cantidades		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		CONDICIONES FINALES	
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	267,00	$ 32.900,00	$ 8.784.300,00			164,74	$ 5.419.946,00	0,00	$ -	98,97	$ 3.256.113,00	3,29	$ 108.241,00	102,26	$ 3.364.354,00
610,1	Llenos alrededor de estructuras con material de la excavación	m3	74,00	$ 45.700,00	$ 3.381.800,00			36,92	$ 1.687.244,00	26,09	$ 1.192.313,00	9,43	$ 430.951,00	1,56	$ 71.292,00	37,08	$ 1.694.556,00
320,3	Subbase Granular Clase C (incluye transporte)	m3	100,00	$ 114.700,00	$ 11.470.000,00	66,16	$ 7.588.552,00			84,67	$ 9.711.649,00	81,45	$ 9.342.315,00	0,04	$ 4.588,00	166,16	$ 19.058.552,00
630,4	Concreto clase D para cunetas	m3	47,00	$ 614.500,00	$ 28.881.500,00			15,20	$ 9.340.400,00	14,00	$ 8.603.000,00	0,00	$ -	17,80	$ 10.938.100,00	31,80	$ 19.541.100,00
630,4	Concreto clase D para placas	m3	24,00	$ 614.500,00	$ 14.748.000,00			1,87	$ 1.149.115,00	22,13	$ 13.598.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,13	$ 13.598.885,00
630,4	Concreto clase D para placas con aceleramte a 7 dias	m3	24,00	$ 745.200,00	$ 17.884.800,00	7,53	$ 5.611.356,00			0,00	$ -	28,31	$ 21.096.612,00	3,22	$ 2.399.544,00	31,53	$ 23.496.156,00
630,7	Concreto clase G placa huellas enrocado	m3	24,00	$ 454.300,00	$ 10.903.200,00			0,70	$ 318.010,00	9,15	$ 4.156.845,00	11,72	$ 5.324.398,00	2,43	$ 1.103.949,00	23,30	$ 10.585.190,00
640,1	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	138,00	$ 7.100,00	$ 979.800,00	39,17	$ 278.107,00			72,27	$ 513.117,00	93,25	$ 662.076,00	11,65	$ 82.715,00	177,17	$ 1.257.907,00
640,2	Malla de Refuerzo	Kg	1302,00	$ 16.200,00	$ 21.092.400,00			78,26	$ 1.267.812,00	522,39	$ 8.462.718,00	660,49	$ 10.637.938,00	50,86	$ 823.932,00	1.223,74	$ 19.824.588,00
900,3	Sobreacarreo en vehiculo automotor	m3/km	623,00	$ 1.400,00	$ 872.200,00	1127,58	$ 1.578.612,00			573,57	$ 802.998,00	736,02	$ 1.030.428,00	440,99	$ 617.386,00	1.750,58	$ 2.450.812,00
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP1	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 12.445,00		384,7850542	$ 4.788.650,00				$ -	156,00	$ 1.941.420,00	228,79	$ 2.847.230,00	384,79	$ 4.788.650,00
NP2	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3		$ 45.000,00		118,65	$ 5.339.250,00				$ -	118,40	$ 5.238.000,00	2,25	$ 101.250,00	118,65	$ 5.339.250,00
	COSTO DIRECTO				$ 118.698.000,00		$ 15.056.627,00		$ 19.182.527,00		$ 47.041.525,00		$ 58.660.248,00		$ 19.098.227,00		$ 125.000.000,00
	ADMINISTRACION	23,00%	$ 27.369.540,00						ADMINISTRACION	23,00%	$ 10.819.550,75	23,00%	$ 13.637.857,04	23,00%	$ 4.392.592,21	23,00%	$ 28.750.000,00
	UTILIDAD	5,00%	$ 5.949.900,00						UTILIDAD	5,00%	$ 2.352.076,25	5,00%	$ 2.943.012,40	5,00%	$ 954.911,35	5,00%	$ 6.250.000,00
	COSTO TOTAL				152.317.440						$ 60.213.152		$ 76.341.117,44		$ 24.445.730,56		$ 160.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FINAL DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 152.317.440
ADICION DE VALOR:	$ 7.682.560
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:	$ 160.000.000
MAYORES CANTIDADES (+)	$ 19.272.483
MENORES CANTIDADES (-)	$ 24.553.635
VALOR BALANCEADO DEL CONTRATO	$ 160.000.000

Firma
AUGUSTO TELLEZ AYALA
Representante Legal
Contratista

V.B.
ALBERTO URIBE VARON
Jefe Oficina de Infraestructura
Supervisión

DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE CHINCHINÁ
NIT-890.801.133-8
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ACTA
6/05/2023

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

ACTA No. 3 (FINAL)

OBJETO:	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"	**CONTRATO DE OBRA No.**	562 de 2022
CONTRATISTA:	AUGUSTO TELLEZ AYALA	**FECHA DE INICIO:**	18/11/2022
SUPERVISOR	ARQ. ALBERTO URIBE VARON - JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	**PLAZO FINAL:**	3/05/2023

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRATO			(+) Mayores Cantidades		(-) Menores Cantidades		ACTA 1		ACTA 2		ACTA 3		CONDICIONES FINALES	
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	267,00	$ 32.900,00	$ 8.784.300,00			164,74	$ 5.419.946,00	0,00	$ -	98,97	$ 3.256.113,00	3,29	$ 108.241,00	102,26	$ 3.364.354,00
610,1	Llenos alrededor de estructuras con material de la excavación	m3	74,00	$ 45.700,00	$ 3.381.800,00			36,92	$ 1.687.244,00	26,09	$ 1.192.313,00	9,43	$ 430.951,00	1,56	$ 71.292,00	37,08	$ 1.694.556,00
320,3	Subbase Granular Clase C (Incluye transporte)	m3	100,00	$ 114.700,00	$ 11.470.000,00	66,16	$ 7.588.552,00			84,67	$ 9.711.649,00	81,45	$ 9.342.315,00	0,04	$ 4.588,00	166,16	$ 19.058.552,00
630,4	Concreto clase D para cunetas	m3	47,00	$ 614.500,00	$ 28.881.500,00			15,20	$ 9.340.400,00	14,00	$ 8.603.000,00	0,00	$ -	17,80	$ 10.938.100,00	31,80	$ 19.541.100,00
630,4	Concreto clase D para placas	m3	24,00	$ 614.500,00	$ 14.748.000,00			1,87	$ 1.149.115,00	22,13	$ 13.598.885,00	0,00	$ -	0,00	$ -	22,13	$ 13.598.885,00
630,4	Concreto clase D para placas con acelerante a 7 dias	m3	24,00	$ 745.200,00	$ 17.884.800,00	7,53	$ 5.611.356,00			0,00	$ -	28,31	$ 21.096.612,00	3,22	$ 2.399.544,00	31,53	$ 23.496.156,00
630,7	Concreto clase G placa huellas encocado	m3	24,00	$ 454.300,00	$ 10.903.200,00			0,70	$ 318.010,00	9,15	$ 4.156.845,00	11,72	$ 5.324.396,00	2,43	$ 1.103.949,00	23,30	$ 10.585.190,00
640,1	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	138,00	$ 7.100,00	$ 979.800,00	39,17	$ 278.107,00			72,27	$ 513.117,00	93,25	$ 662.075,00	11,65	$ 82.715,00	177,17	$ 1.257.907,00
640,2	Malla de Refuerzo	Kg	1302,00	$ 16.200,00	$ 21.092.400,00			78,26	$ 1.267.812,00	522,39	$ 8.462.718,00	650,49	$ 10.537.938,00	50,86	$ 823.932,00	1.223,74	$ 19.824.588,00
900,3	Sobreacarreo en vehiculo automotor	m3/km	623,00	$ 1.400,00	$ 872.200,00	1127,58	$ 1.578.612,00			573,57	$ 802.998,00	736,02	$ 1.030.426,00	440,89	$ 617.396,00	1.750,58	$ 2.450.612,00
	ITEMS NO PREVISTOS																
NP1	CORTE DE PAVIMENTO	ML		$ 12.445,00		384,7650542	$ 4.788.650,00				$ -	156,00	$ 1.941.420,00	228,79	$ 2.847.230,00	384,79	$ 4.788.650,00
NP2	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3		$ 45.000,00		118,65	$ 5.339.250,00				$ -	116,40	$ 5.238.000,00	2,25	$ 101.250,00	118,65	$ 5.339.250,00
	COSTO DIRECTO				$ 118.998.000,00		$ 15.056.627,00		$ 19.182.527,00		$ 47.041.525,00		$ 58.860.248,00		$ 19.098.227,00		$ 125.000.000,00
	ADMINISTRACION			23,00%	$ 27.369.540,00					ADMINISTRACION	23,00% $ 10.819.550,75	23,00%	$ 13.537.857,04	23,00%	$ 4.392.592,21	23,00%	$ 28.750.000,00
	UTILIDAD			5,00%	$ 5.949.900,00					UTILIDAD	5,00% $ 2.352.076,25	5,00%	$ 2.943.012,40	5,00%	$ 954.911,35	5,00%	$ 6.250.000,00
	COSTO TOTAL				152.317.440						$ 60.213.152		$ 75.341.117,44		$ 24.445.730,56		$ 160.000.000,00

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO FINAL DE OBRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 152.317.440
ADICION DE VALOR:	$ 7.682.560
VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO:	$ 160.000.000
MAYORES CANTIDADES (+)	$ 19.272.483
MENORES CANTIDADES (-)	$ 24.853.635
VALOR BALANCEADO DEL CONTRATO	$ 160.000.000

Firma

AUGUSTO TELLEZ AYALA
Representante Legal
Contratista

V.B.

ALBERTO URIBE VARON
Jefe Oficina de Infraestructura
Supervisión


	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem: Excavaciones varias sin clasificar — Cantidad Total: 3,29

Croquis y Record Fotográfico

Récor Fotográfico de la Obra
(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)

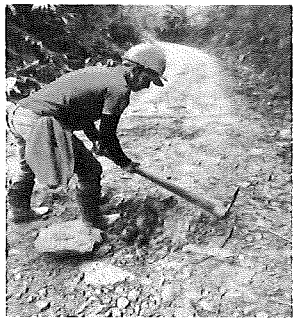



Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
	Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
CUNETA IZQUIERDA SECTOR LA VIRGEN				76,56	2,00	0,10	15,31	15,31
CUNETA DERECHA SECTOR LA VIRGEN				32,50	1,70	0,10	5,53	20,84
CUNETA EMPALME SECTOR LA VIRGEN				16,00	1,00	0,10	1,60	22,44
EXCAVACIÓN PLACA HUELLA				109,06	2,70	0,15	44,17	66,61
EXCAVACIÓN PARA SUSTITUCION DE TERRENO				75,86	4,70	0,10	35,65	102,26
CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-98,97	3,29

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:


Firma		
Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA	ALBERTO URIBE VARON
Fecha	AA 2023 MM 5 DD 5	AA 2023 MM 5 DD 5
Cargo	Contratista	Supervisor


	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Item:	Llenos alrededor de estructuras con material de la excavación	Cantidad Total:	1,56

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	CONFINAR CUNETA IZQUIERDA				29,80	0,69	0,30	6,17	6,17
	CONFINAR CUNETA DERECHA				36,50	0,44	0,30	4,82	10,99
	CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-9,43	17,16

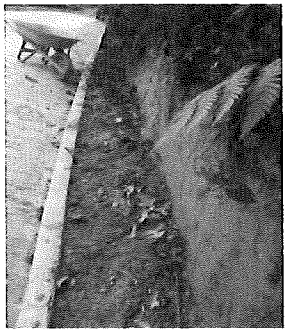

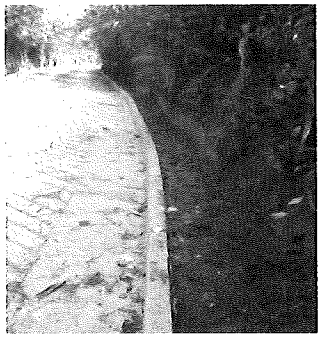

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:			
	Firma		
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA	ALBERTO URIBE VARON
	Fecha	AA 2023 MM 5 DD 5	AA 2023 MM 5 DD 5
	Cargo	Contratista	Supervisor

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Item:	Subbase Granular Clase C (Incluye transporte)	Cantidad Total:	0,04

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	PLACA HUELLA SECTOR LA VIRGEN				105,00	2,70	0,10	28,35	28,35
	CUNETAS SECTOR LA VIRGEN	2			109,06	0,70	0,10	15,27	43,62
	RAMPA SECTOR LA VIRGEN	2			2,03	2,70	0,10	1,10	44,71
	CUNETAS EMPALME SECTOR LA VIRGEN	1			16,00	0,70	0,10	1,12	45,83
	LLENO PARA SUSTITUCION DE TERRENO				75,86	4,70	0,10	35,65	81,49
	CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-81,45	0,04

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)


Observaciones:															
	Firma														
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA						ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5	AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista						Supervisor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Item:	Concreto clase D para cunetas	Cantidad Total:	17,80

Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	CUNETAS SECTOR LA VIRGEN	2			99,26	0,70	0,10	13,90	13,90
	SARDINEL CUNETA IZQUIERDA BAJANDO	1			99,26	0,10	0,20	1,99	15,88
	SARDINEL CUNETA DERECHA BAJANDO	1			96,16	0,10	0,20	1,92	17,80

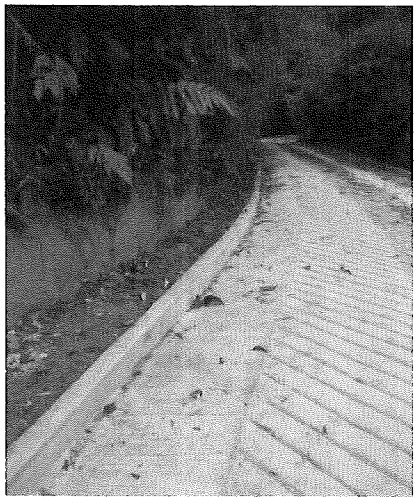


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA						ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5	AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista						Supervisor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	Concreto clase D para placas con acelerante a 7 días	Cantidad Total:	3,22

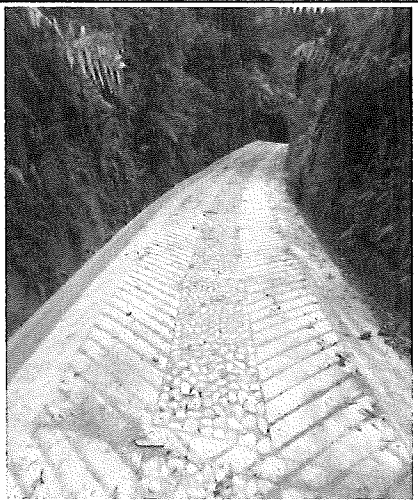Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	PLACA HUELLA SECTOR LA VIRGEN				94,49	1,80	0,15	25,51	25,51
	VIGAS SECTOR LA VIRGEN	45			2,70	0,15	0,25	4,56	30,07
	RAMPA SECTOR LA VIRGEN	2			1,80	2,70	0,15	1,46	31,53
	CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-28,31	3,22


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tubería etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:															
	Firma														
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA						ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5	AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista						Supervisor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	Concreto clase G placa huellas enrocado	Cantidad Total:	2,43

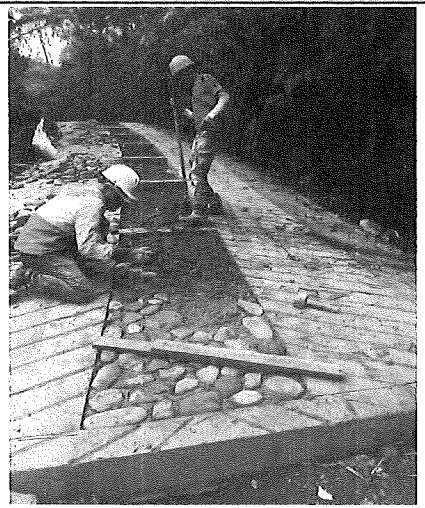Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Área	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	PLACA HUELLA SECTOR LA VIRGEN				94,49	0,90	0,15	12,76	12,76
	CUNETA ENROCADO PARA CONFINAMIENTO				30	0,31	0,15	1,40	14,15
	CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-11,72	2,43


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:																	
	Firma																
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA								ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5			AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista								Supervisor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	Acero de refuerzo Fy 4200	Cantidad Total:	11,65

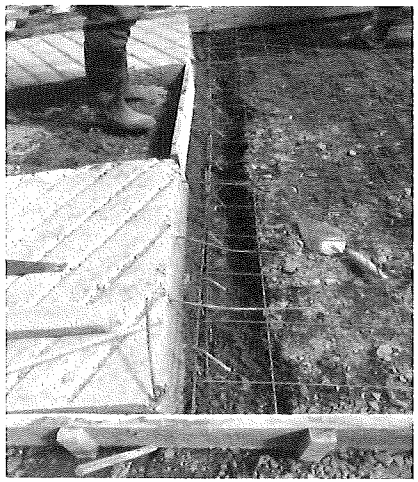Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Kilogramo	Cantidad	Volumen	Largo	Ancho	Kg/m		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	VIGAS LONGITUDINAL SECTOR LA VIRGEN		90		2,60		0,248	58,03	58,03
	VIGAS FLEJES SECTOR LA VIRGEN		630		0,30		0,248	46,87	104,90
	CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-93,25	11,65

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:																	
	Firma																
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA								ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5			AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista								Supervisor							


	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem: Malla de Refuerzo — Cantidad Total: 50,86

Croquis y Record Fotográfico

Récor Fotográfico de la Obra
(antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)

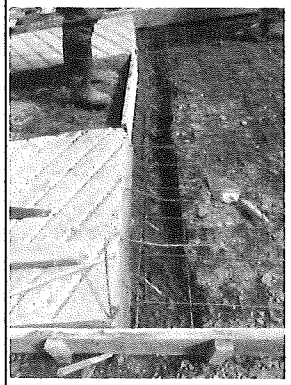



Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
	Kilogramo	Área	Volumen	Largo	Ancho	Kg/m2		
PLACA HUELLA SECTOR LA VIRGEN				94,49	1,80	2,075	352,92	352,92
RAMPA SECTOR LA VIRGEN	2			1,80	2,70	2,075	20,17	373,09
CUNETAS SECTOR LA VIRGEN	2			99,26	0,60	2,075	247,16	620,25
SARDINEL CUNETA IZQUIERDA BAJANDO	1			99,26	0,20	2,075	41,19	661,44
SARDINEL CUNETA DERECHA BAJANDO	1			96,16	0,20	2,075	39,91	701,35
CANTIDAD COBRADA ACTA N°2							-650,49	50,86

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)



Observaciones:

Firma		
Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA	ALBERTO URIBE VARON
Fecha	AA 2023 MM 5 DD 5	AA 2023 MM 5 DD 5
Cargo	Contratista	Supervisor

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	Sobreacarreo en vehículo automotor	Cantidad Total:	440,99

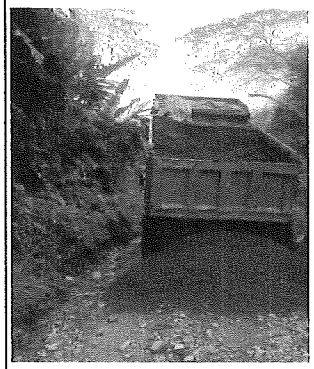Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Distancia	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
 	Concreto clase D para cunetas	17,80	13,50	1,41				338,82	338,82
	Concreto clase D para placas	3,22	13,50	1,41				61,29	400,12
	Concreto clase G placa huellas enrocado (CONCRETO)	1,46	13,50	1,41				27,75	427,87
	Concreto clase G placa huellas enrocado (PIEDRA)	0,97	13,50	1,00				13,12	440,99


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:																	
	Firma																
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA									ALBERTO URIBE VARON						
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5				AA	2023	MM	5	DD	5	
	Cargo	Contratista									Supervisor						

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	CORTE DE PAVIMENTO	Cantidad Total:	228,79

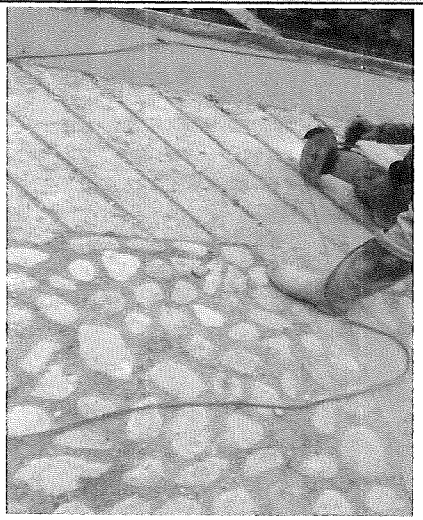Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Distancia	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	SECTOR LA VIRGEN								
	PLACA HUELLA	88,00			1,80			158,40	158,40
	CUNETA	44,00			1,60			70,39	228,79


Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:																
	Firma															
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA							ALBERTO URIBE VARON							
	Fecha	AA	2023	MM	5	DD	5		AA	2023	MM	5	DD	5		
	Cargo	Contratista							Supervisor							

	MEMORIAS DE CALCULOS Secretaria de Infraestructura Proceso Obras Públicas e Infraestructura	Código: R-SI-POI-047 Fecha: 18/02/2015 Versión: 001 Página 1 de 1

Contrato No.	562	Año	2022	Objeto	"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

Ítem:	RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	Cantidad Total:	2,25

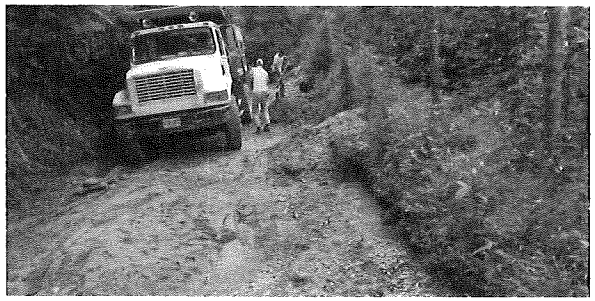Croquis y Record Fotográfico	Descripción	Unidad			Dimensiones			Valor Total (Cantidad Área Volumen)	Valor acumulada
		Cantidad	Distancia	Volumen	Largo	Ancho	Alto		
Récor Fotográfico de la Obra (antes de Iniciar, durante y al finalizar la Obra)									
	SECTOR LA NEVERA								
	Excavaciones varias sin clasificar	1,30		3,29				4,28	4,28
	Llenos alrededor de estructuras con material de la excavación	-1,30		1,56				-2,03	2,25

Nota: en la casilla de Unidad; Cantidad ejemplo si cantidad de tapas (und) o ml de tuberia etc, Area: Ejemplo cuando son metros cuadrados de pavimento (m^2), Volumen: Ejemplo cuando son metros Cubicos (m^3)

Observaciones:			
	Firma		
	Nombre	AUGUSTO TELLEZ AYALA	ALBERTO URIBE VARON
	Fecha	AA 2023 MM 5 DD 5	AA 2023 MM 5 DD 5
	Cargo	Contratista	Supervisor

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLACA HUELLAS	CRA 13 # 19 - 33	ARMENIA-QUINDIO	7406527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2075563044	9450828055	E	2023/05/10	2023/05/11	BANCOLOMBIA	1	$864,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$445,600	$600	$0	$446,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$31,000	$100	$0	$31,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$414,600	$500	$0	$415,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$194,000	$300	$0	$194,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$194,000	$300	$0	$194,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$111,600	$200	$0	$111,800
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	6	$111,600	$200	$0	$111,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$111,600	$300	$0	$111,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$100	$0	$46,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$63,600	$100	$0	$63,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$1,600	$100	$0	$1,700
TOTAL				6	$862,800	$1,400	$0	$864,200

2023/05/11 11:55 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7553741		TELLEZ AYALA AUGUSTO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PLACA HUELLAS	CRA 13 # 19 - 33	ARMENIA-QUINDIO	7406527	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2075563044	9450828055	E	2023/05/10	2023/05/11	BANCOLOMBIA	1	$864,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vfp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1093215104	CLAVIJO GREGORIO		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
2	CC	1098308835	GARCIA DIEGO		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	15907365	JARAMILLO JOSE		X																25-14	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
4	CC	1054990376	MORALES JEISSON		X																230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF43	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$13,500	5	$0	$0	SI	$60,100
5	CC	1098308683	OLARTE YEISON		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
6	CC	1054996666	ROBAYO ANDRES		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF43	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$2,700	1	$0	$0	SI	$12,100
Total	Afiliados(6)																						$2,784,002	$445,600			$2,784,002	$111,600			$2,784,002	$111,600			$2,784,002	$194,000		$0	$0		$862,800

2023/05/11 11:55 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 24607136		GOMEZ LOPEZ YULIETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 7 9 16	CIRCASIA-QUINDIO	3166433	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	49977479	9449977479	I	2023/05/10	2023/05/10	BANCO AV VILLAS	0	$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	24607136	GOMEZ LOPEZ YULIETH	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$80,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$80,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$80,800	$0	$0	$80,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$411,400	$0	$0	$411,400

2023/05/11 02:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1099708122		LLANO MORALES JENNIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 # 13-48	ARMENIA-QUINDIO	7896541	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2075927516	9449854831	I	2023/05/08	2023/05/11	BANCOLOMBIA	3	$331,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1099708122	LLANO MORALES JENNIFER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$700	$0	$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$700	$0	$186,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$600	$0	$145,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$600	$0	$145,600
TOTAL				1	$330,600	$1,300	$0	$331,900

2023/05/16 04:57 PM

INFORME FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Nro. 562 DE 2022

AUGUSTO TELLEZ AYALA

"CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"

PERIODO:
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 03 DE MAYO DE 2023

TABLA DE CONTENIDO


1. INTRODUCCION 3
2. INFORMACION DEL CONTRATO 4
3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO 5
   3.1 RESUMEN OBRAS EJECUTADAS 6
   4.1 GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 7
   4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO 8
5. INFORME FINANCIERO 15
   5.1 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA 15
   5.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL CUMPLIMIENTO Y SANCIONES 15
6. INFORME ADMINISTRATIVO 16
   6.1 CONTROL PERSONAL DE OBRA 16
   6.2 CONTROL PAGO DE APORTES PARAFISCALES 16
   6.3 CONTROL EQUIPO DE OBRA 16
   6.4 CONTROL MATERIAL DE OBRA 17
   6.5 CALIDAD DE OBRA 17
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

2. INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	562 de 2022
OBJETO	"CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PARTIDAS DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"
CONTRATISTA	AUGUSTO TELLEZ AYALA
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 152'317.440
VALOR ADICION	$ 7'682.560
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 160'000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Hasta el 31 de Diciembre de 2022
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 de Octubre de 2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN	12 de Octubre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN	18 de Noviembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	15 de Diciembre de 2022
FECHA DE REINICIO	28 de Marzo de 2023
PRORROGA	20 días Calendario
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de Mayo de 2023

3. LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

La ejecución del contrato de obra pública se llevará a cabo en la Vereda Partidas, Sector la Nevera y Sector La Virgen del municipio de Chinchiná, Departamento de Caldas.

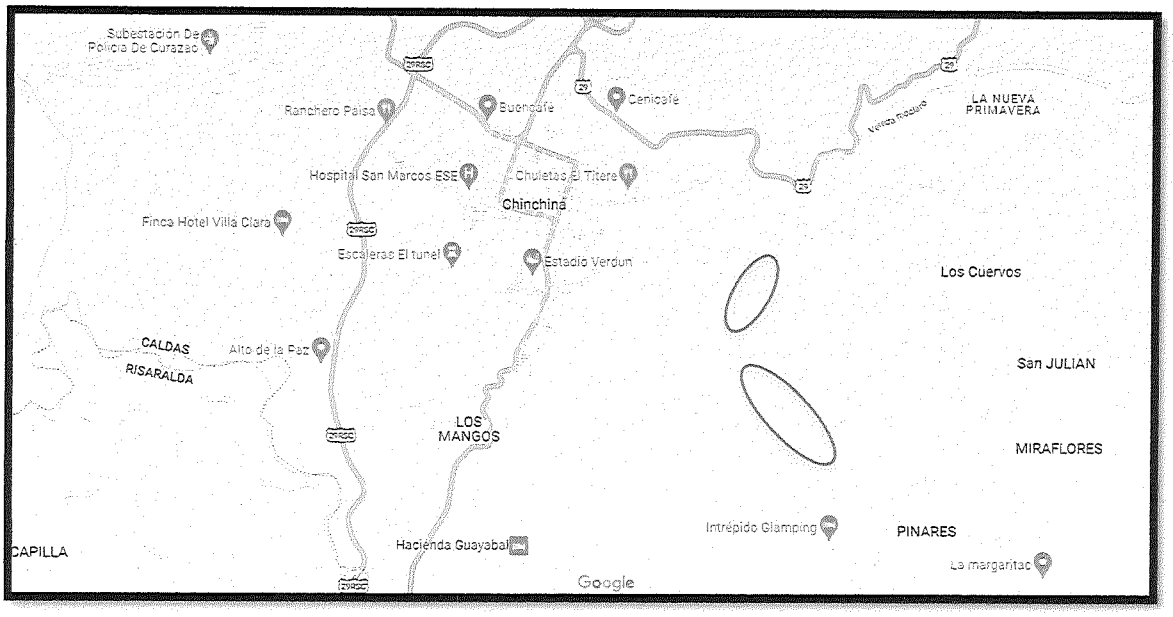



3.1 RESUMEN OBRAS EJECUTADAS

Las obras ejecutadas hasta el momento se describen en el cuadro presentado a continuación, estas cantidades son producto de lo físicamente realizado por el contratista y avalado por el supervisor:


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD ACTA 1	CANTIDAD ACTA 2	CANTIDAD ACTA FINAL	CANTIDAD TOTAL
600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	0	98,97	3,29	102,26
610,1	Llenos alrededor de estructuras con material de la excavación	m3	26,09	9,43	1,56	37,08
320,3	Subbase Granular Clase C (Incluye transporte)	m3	84,67	81,45	0,04	166,16
630,4	Concreto clase D para cunetas	m3	14	0	17,80	31,80
630,4	Concreto clase D para placas	m3	22,13	0	0,00	22,13
630,4	Concreto clase D para placas con acelerante a 7 días	m3	0	28,31	3,22	31,53
630,7	Concreto clase G placa huellas enrocado	m3	9,15	11,72	2,43	23,30
640,1	Acero de refuerzo Fy 4200	Kg	72,27	93,25	11,65	177,17
640,2	Malla de Refuerzo	Kg	522,39	650,49	50,86	1.223,74
900,3	Sobreacarreo en vehículo automotor	m3/ km	573,57	736,02	440,99	1.750,58
ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	Corte De Pavimento	Ml		156	228,79	384,79
NP2	Retiro De Material Proveniente De La Excavación	M3		116,4	2,25	118,65

4. INFORME TÉCNICO

4.1 GESTIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contratista conto con el equipo y el recurso humano necesario para desarrollar el objeto del contrato, de acuerdo con la programación y especificaciones técnicas exigidas; trabajando de la mano con el Municipio de Chinchiná para gestionar la parte técnica del proyecto y llevar a cabo la obra de la mejor manera.

El día 31 de octubre se realiza socialización en el primer tramo a intervenir con la comunidad, en el cual en compañía de esta y la supervisión del contrato se define tramo a ejecutar según necesidad de los habitantes del sector.

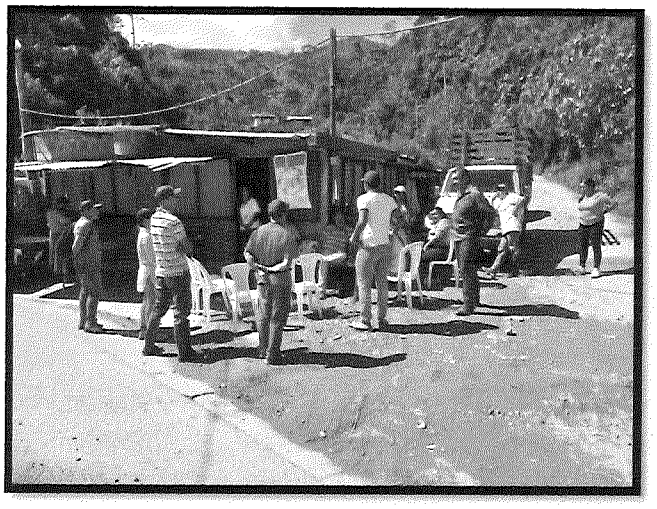



Es importante resaltar que se toma la decisión conjunta de no realizar ningún tipo de excavación en el sector debido a la gran cantidad de roca que se presenta en el terreno, adicional a esto debido a las lluvias fuertes que se han presentado en el sector, el tramo de vía presenta unas grandes socavaciones por las corrientes de agua las cuales son más representativas en los extremos y centro de la vía. Razón por la cual se inicia con actividad de lleno en material de subbase.

El día 28 de marzo de 2023 se inicial labores en el sector la virgen, en el cual en compañía de la comunidad y la supervisión del contrato se define tramo a ejecutar según necesidad de los habitantes del sector.


Es importante resaltar que se toma la decisión conjunta de excavar algunos lugares donde el terreno no se encuentra en buenas condiciones debido al no ser material natural del sector, motivo por el cual se requiere sustituir algunos tramos de subrasante con subbase granular, para de esta forma garantizar una mejor estabilidad de la estructura de la placa huella en interacción son su estructura de soporte.

Una vez realizado el respectivo balance de la obra en compañía de la supervisión, y al contar la entidad con un saldo del convenio, se decidió realizar la adición en recursos al contrato, lo que significa una mayor cantidad de metros con respecto a la placa de huella a la inicial contemplada en este lugar, beneficiando así mayormente la comunidad del sector.

Las obras finalizaron el día 3 de mayo de 2023 y fueron recibidas a satisfacción tanto por la comunidad en general como por la entidad contratante.

4.2 REGISTRO FOTOGRAFICO

A continuación, se anexa el registro fotográfico de las actividades ejecutadas hasta el momento en el desarrollo de la obra.

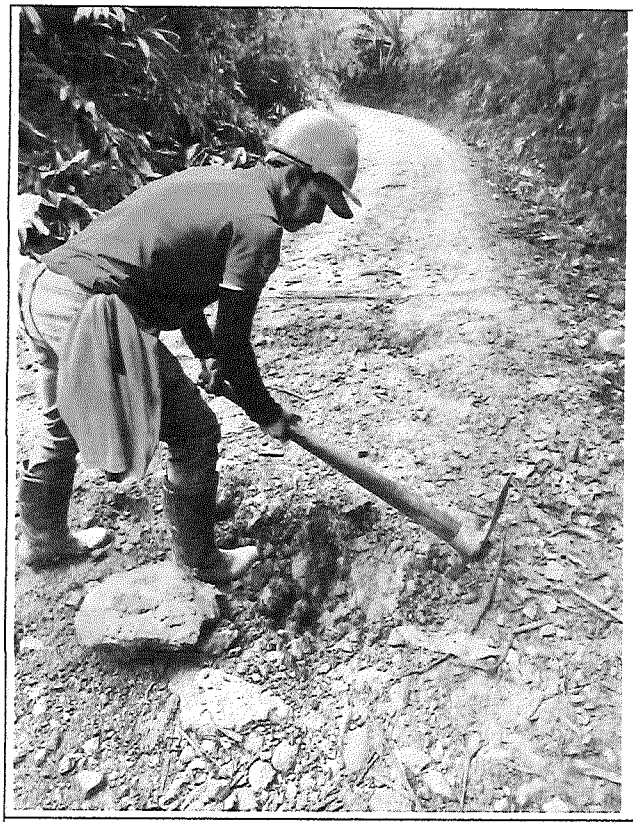

EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR




EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR



LLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN




LLENOS ALREDEDOR DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN

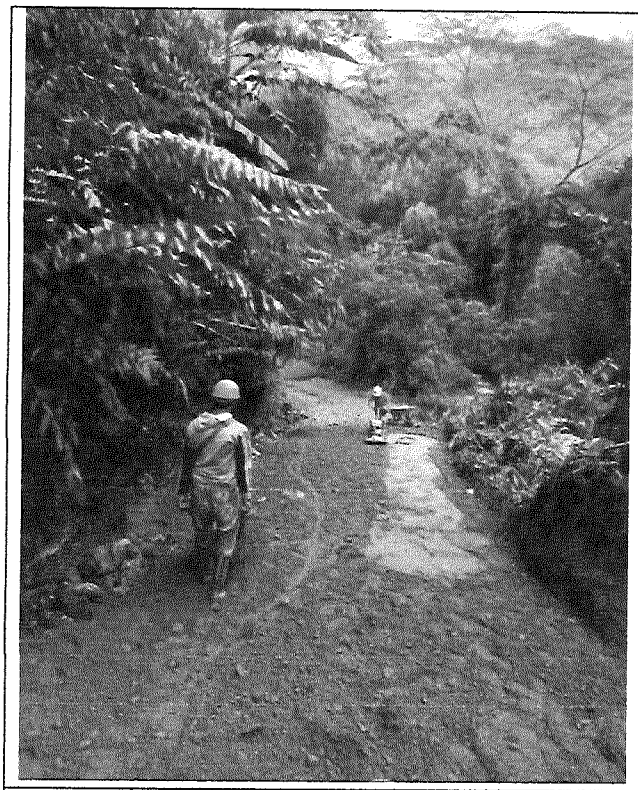

SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)




SUBBASE GRANULAR CLASE C (INCLUYE TRANSPORTE)

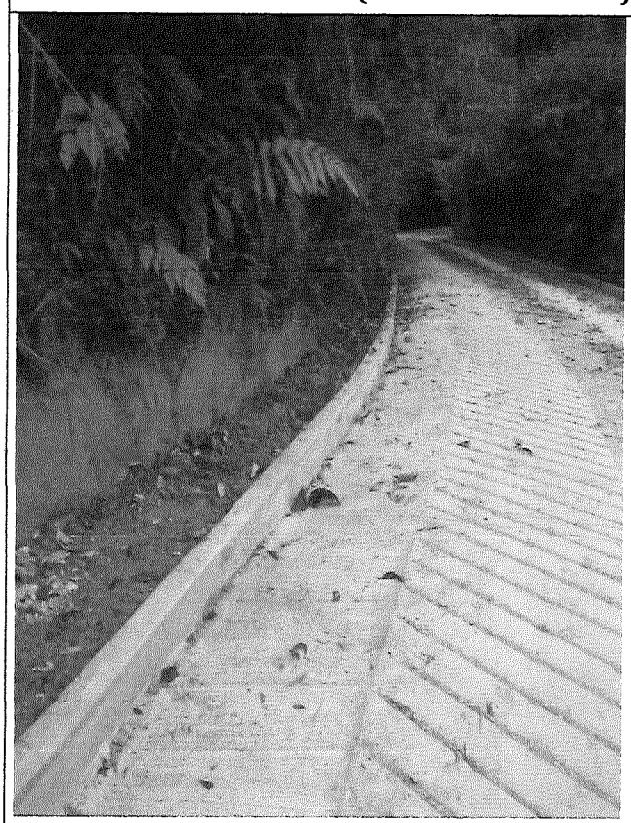

CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS




CONCRETO CLASE D PARA CUNETAS

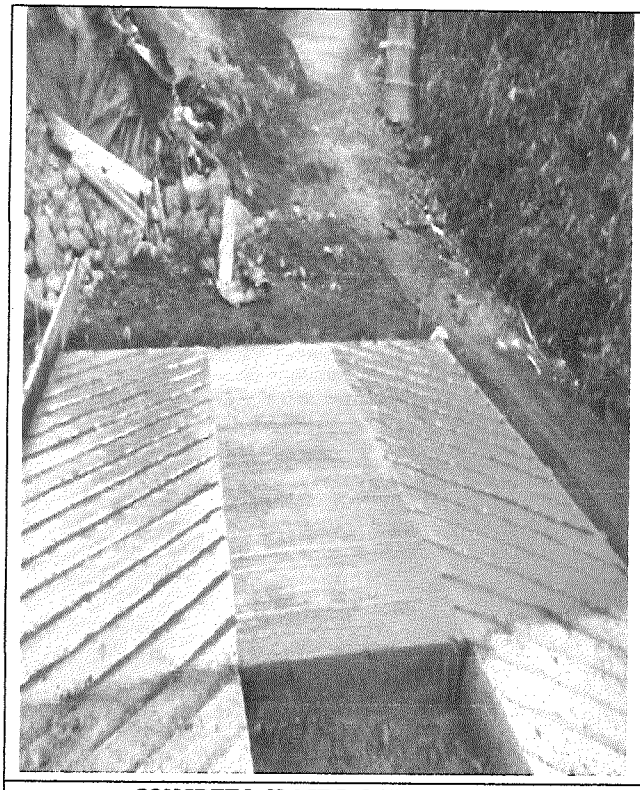


CONCRETO CLASE D PARA PLACAS




CONCRETO CLASE D PARA PLACAS

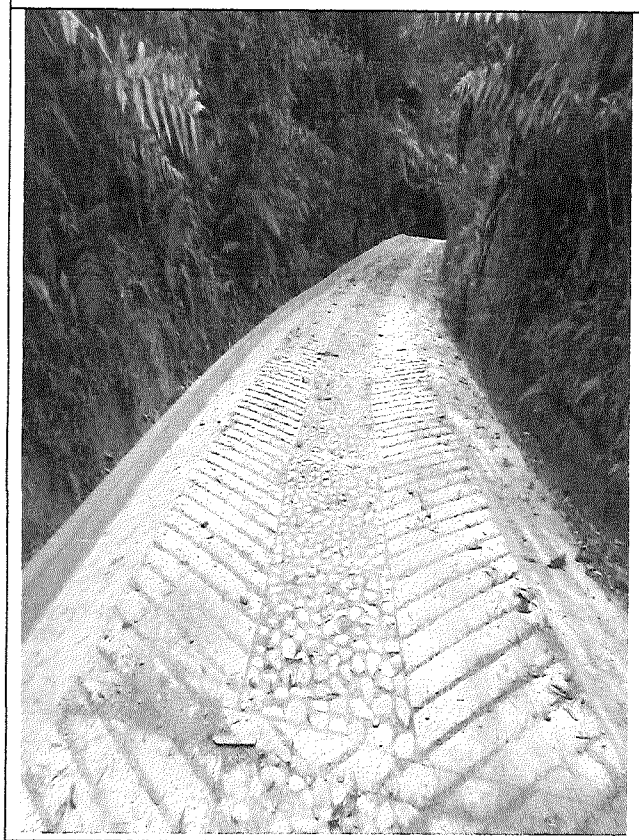


CONCRETO CLASE D PARA PLACAS CON ACELERANTE A 7 DÍAS

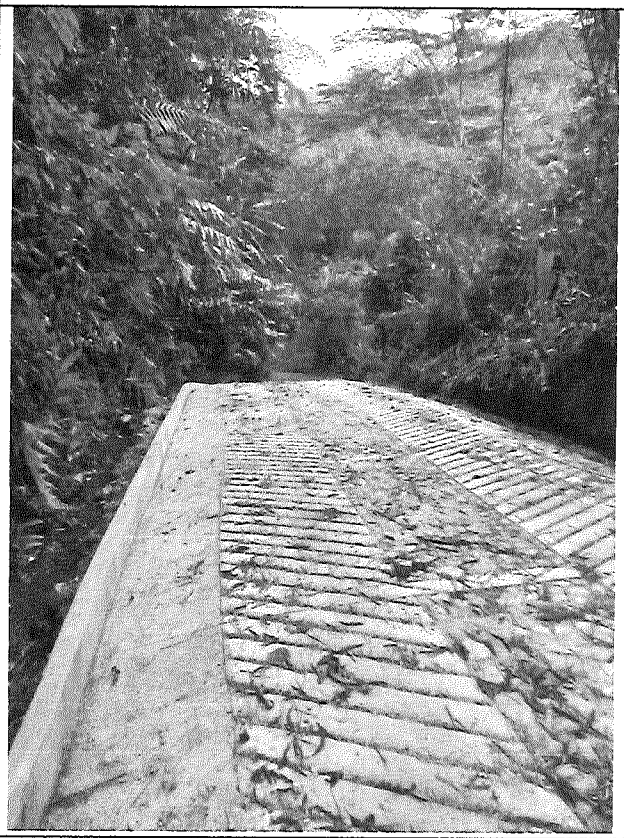


CONCRETO CLASE D PARA PLACAS CON ACELERANTE A 7 DÍAS

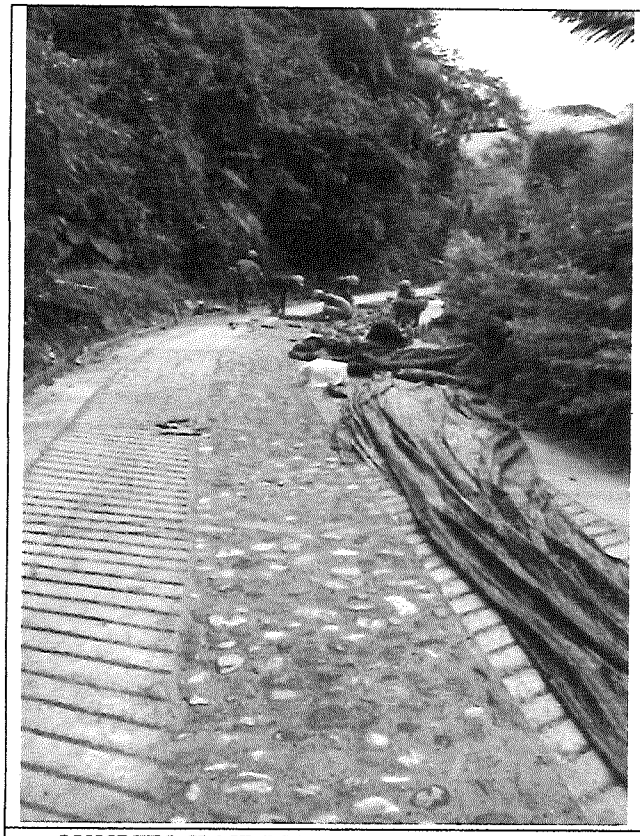

CONCRETO CLASE G PLACA HUELLAS ENROCADO

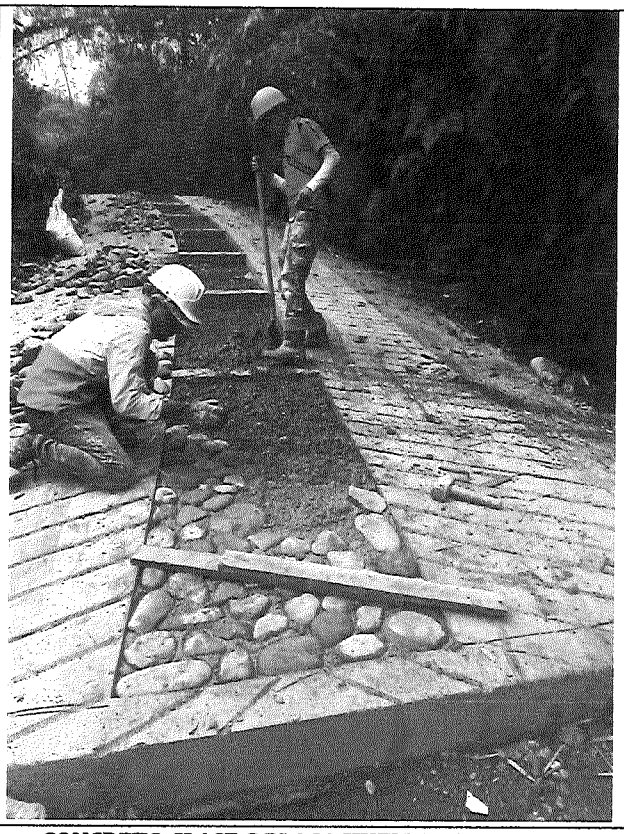

CONCRETO CLASE G PLACA HUELLAS ENROCADO

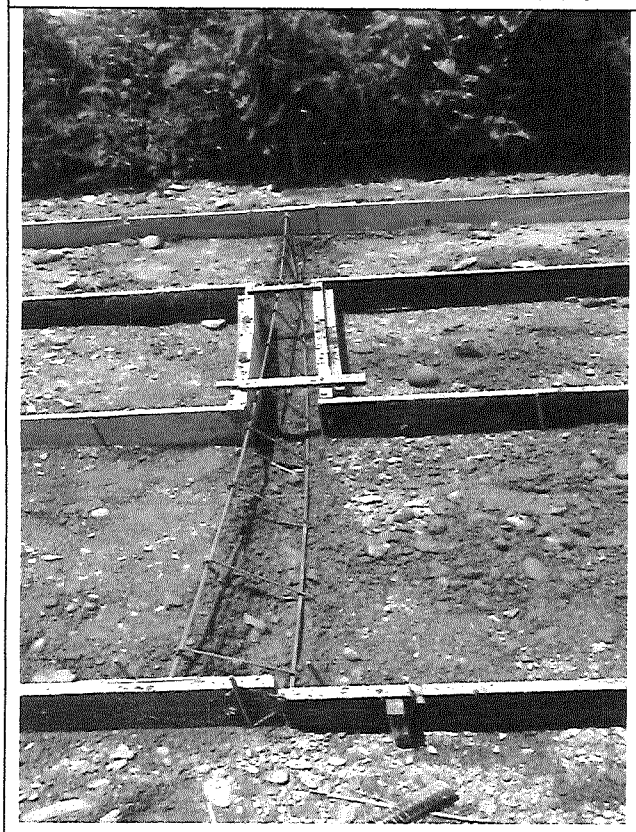


ACERO DE REFUERZO FY 4200




ACERO DE REFUERZO FY 4200




MALLA DE REFUERZO

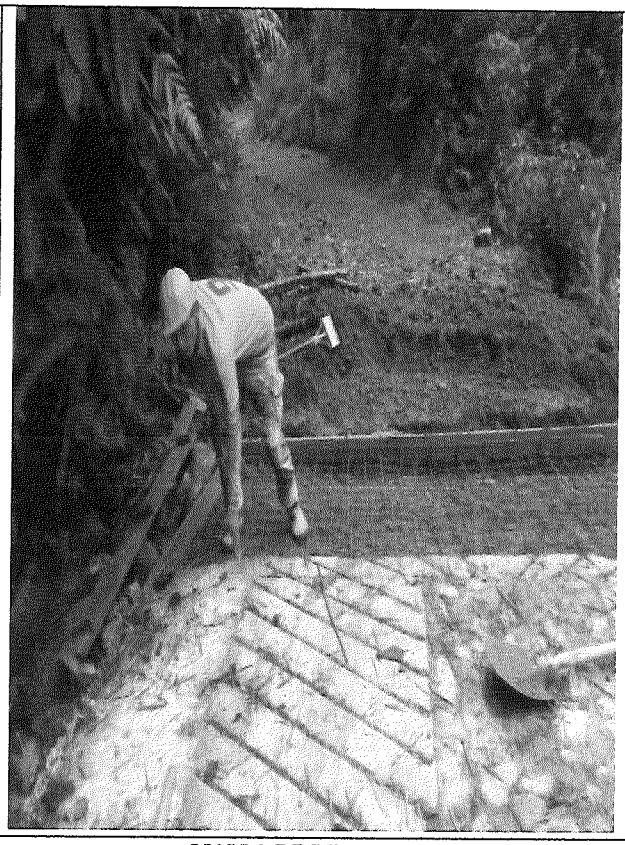

MALLA DE REFUERZO

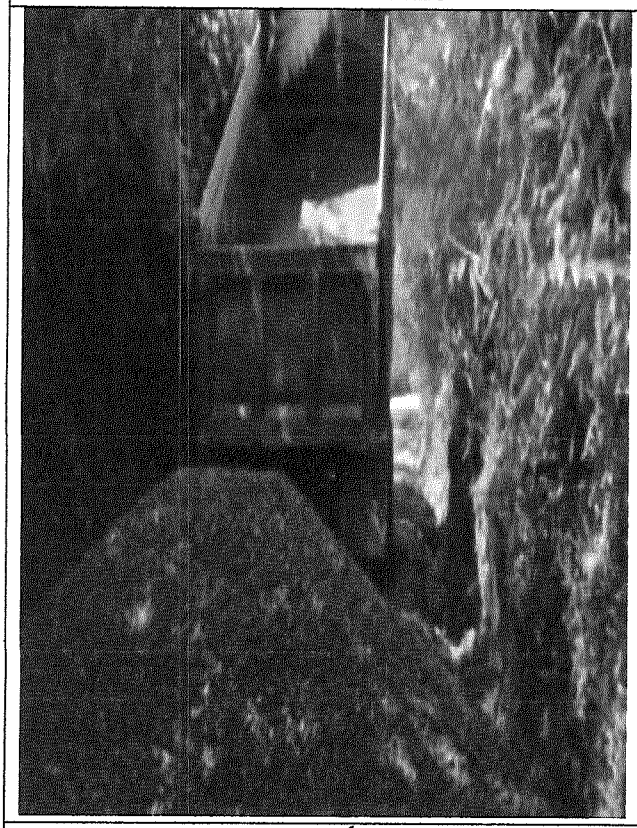

SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR

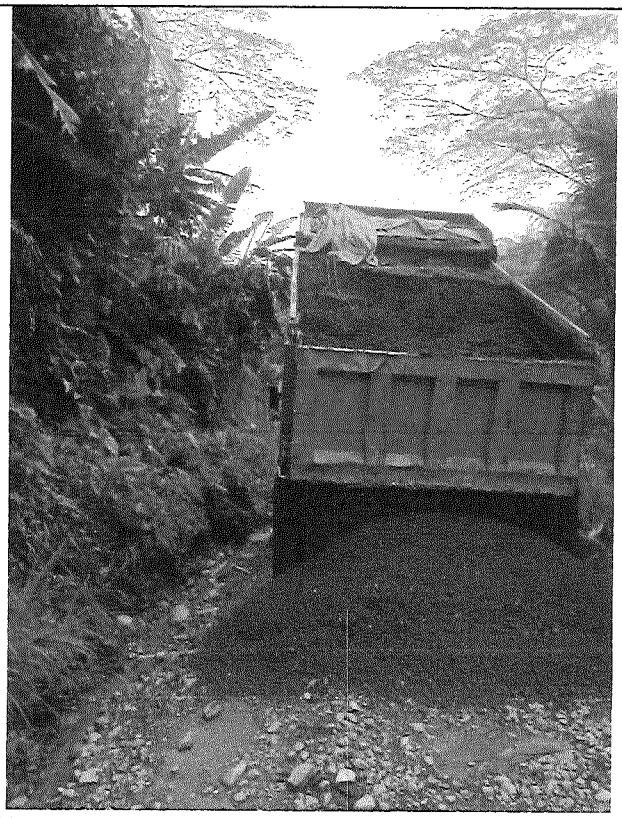


SOBREACARREO EN VEHÍCULO AUTOMOTOR




CORTE DE PAVIMENTO



CORTE DE PAVIMENTO

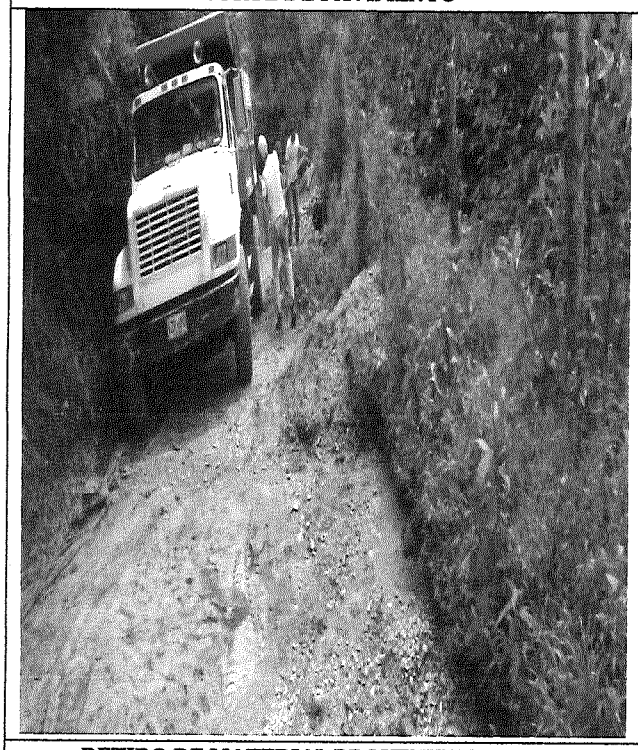

RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

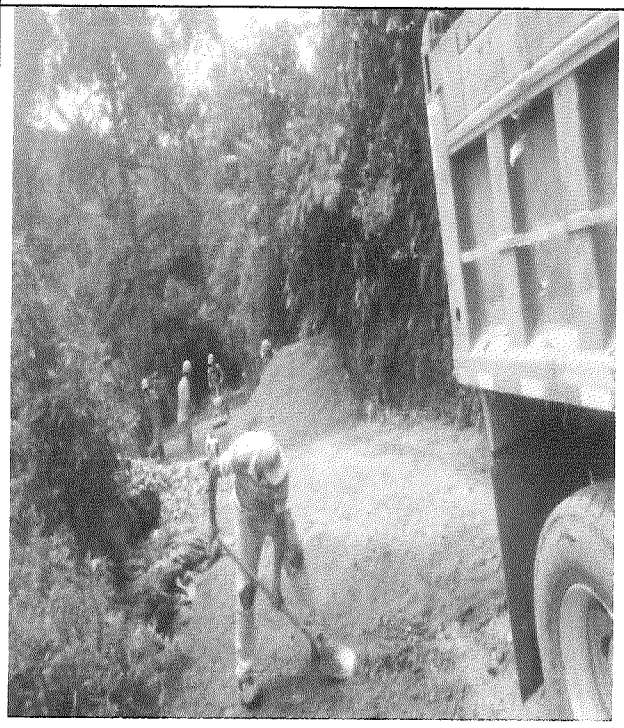

RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

5. INFORME FINANCIERO

5.1 RESUMEN DE PAGOS AL CONTRATISTA

Debido al método de pago establecido en el contrato, en el cual se estable "La Entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato."

Actualmente el contratista se encuentra tramitando el acta final por un valor de $ 24'445.730,56 (VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 152.317.440,00
ANTICIPO	N/A
ADICION	$ 7.682.560,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 160.000.000,00
ACTA DE OBRA N°1	$ 60.213.152,00
ACTA DE OBRA N°2	$ 75.341.117,44
ACTA DE OBRA FINAL	$ 24.445.730,56

5.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL CUMPLIMIENTO Y SANCIONES

Durante la ejecución de las obras, no se presentaron llamados de atención por parte de la entidad contratante, entidad alguna o comunidad en general.

6. INFORME ADMINISTRATIVO

6.1 CONTROL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal administrativo empleado en el contrato de obra N°562 de 2022:

NOMBRE	CARGO
FERNANDO ARTURO ANGELPELAEZ	DIRECTOR DE OBRA
JENNIFER LLANO MORALES	RESIDENTE DE OBRA
YULIETH GOMEZ	ASESOR SISO
CLAUDIA SOTO	SOCIAL

6.2 CONTROL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

El contratista de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, presentan certificado de cumplimiento con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.

6.3 CONTROL EQUIPO DE OBRA

El equipo utilizado durante la ejecución de la obra fue el siguiente:

DESCRIPCION
HERRAMIENTA MENOR
RANA
VIBRADOR DE CONCRETO
CONCRETADORA
TALADRO
PULIDORA
CORTADORA
VOLQUETA

6.4 CONTROL MATERIAL DE OBRA

DESCRIPCION
SUBBASE
ARENA
TRITURADO
CEMENTO
TABLA PARA FORMALETA
PUNTILLA
ACERO DE REFUERZO
MALLA ELECTROSOLDADA
ALAMBRE NEGRO
PLASTICO NEGRO
SEÑALIZACION
LONA VERDE

6.5 CALIDAD DE OBRA

Se realizaron los siguientes ensayos de calidad, los cuales fueron entregados en los anteriores informes:

- Densidad por método del cono de arena a la subbase instalada.
- Ensayo de resistencia a la flexión del concreto.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se ha cumplido hasta el momento a cabalidad con las obligaciones contractuales, tanto por parte del contratista como del contratante.

- Las obras fueron entregadas en perfecto estado y recibidas a satisfacción por parte de la entidad contratante y de la comunidad en general.

- Los lugares afectados por el desarrollo de la obra han sido entregados en igual o mejor condición de lo que se encontraba previo a las intervenciones.

AUGUSTO TELLEZ AYALA
CONTRATISTA DE OBRA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14892714254

(415)7707212489984(8020) 000001489271425 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 5 3 7 4 1	8	Impuestos y Aduanas de Armenia 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 5 3 7 4 1	1 9 8 5 1 2 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TELLEZ	AYALA	AUGUSTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

41. Dirección principal: BRR VILLA JIMENA MZ 1 CA 9 ET 2

42. Correo electrónico: belgomez45@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 4 0 6 5 2 7	3 1 5 7 8 0 5 4 4 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 8 1 2 1 5	4 2 9 0	1 9 9 8 1 2 2 5	4 2 1 0 4 1 1 2		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 2 4 8 5 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 22- Obligado a cumplir deberes formales a
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 31 / 20 : 27: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TELLEZ AYALA AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FINANCIERA JURISCOOP

EL SUSCRITO GERENTE DE FINANCIERA JURISCOOP COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

CERTIFICA QUE:

El señor **AUGUSTO TELLEZ AYALA** identificado con cédula de ciudadanía **No. 7.553.741**, tiene cuenta de ahorros con Financiera Juriscoop la cual se encuentra activa:

Cuenta de Ahorros No. 58500036652

Para constancia se firma a los veintiséis (26) días del mes de Abril de 2023.

P/A Shaperico Ramal Rodrigo

Oscar Alfredo Hernández Ladino
Gerente Oficina Armenia
